GOBIERNO DE CALDAS	ACTA RESUMEN Y ORDENACIÓN DEL GASTO No. 10 PARCIAL	Código: FO-GD-02-018 Versión: 27 Fecha de Modificacion: 20/11/2021

SECRETARÍA	INFRAESTRUCTURA	FECHA ACTA	viernes, 18 de octubre de 2024

Número Radicado en SECOP: Contrato, Convenio, Proceso o Constancia Art 19 Decreto 1510/2013	SECOP II: CM-SI-012-2023 (ID: CO1.PCCNTR.5373140)	Número Radicado Interno del Contrato:	03102023-1470
Numero de identificacion del contratista - NIT	901.754.250-9	No. Ficha BPIN (**Solo para proyectos Regalias Anexar copia**)	2022003170035

CONTRATISTA	CONSORCIO VIAL 2023 CONFORMADO POR SUACOR INGENIERIA SAS, NIT: 900.805.317-1 (10%) Y POR INGENENIERIA MANTENIMIENTO, CONSULTORIAS Y ASESORIAS DE COLOMBIA SAS - IMCA, NIT 900.063.967-1 (90%)
CONTRATO CEDIDO A:	N/A

CODIGO VIA	3302	NOMBRE DE LA VIA	AGUADAS-ARMA-LA PINTADA, MUNICIPIO DE AGUADAS
Actividad Económica	7112	Tipo de Contrato	INTERVENTORIA

Objeto del Contrato:	IINTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA RESULTANTE DEL PROCESO DE LICITACIÓN LP-SI-013-2023 (TRAMO VIAL LA PINTADA - ARMA - PUENTE BOCAS, EN EL MUNICIPIO DE AGUADAS)

Valor del Contrato	Valor Adiciónes	Valor Anticipo
$ 391.157.475,00	$ 293.190.208	N/A

APORTANTES	%	VALOR	TIPO DE ENTIDAD
Aporte Departamento:	100%	$ 684.347.683	PÚBLICA
Aporte Convenio No			

Duración Contrato: SEIS (6) MESES DESDE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO	Fecha de Iniciación	OCTUBRE 17 DE 2023
	Fecha de Terminación de ejecución	16 DE ABRIL DE 2024
	Prórrogas	DOS (2) MESES. HASTA JUNIO 16 DE 2024
	Prórroga	DOS (2) MESES. HASTA NOVIEMBRE 15 DE 2024

N° PEDIDO - RPC	VALOR ORDENADO	AMORTIZACIÓN	VALOR NETO	FONDO
4500024106	$ 94.876.496,00	$ 0	$ 94.876.496,00	6 - 0378
SPGR 11823				
			$ -	
VALOR ACTA	$ 94.876.496,00	0,00	$ 94.876.496,00	

RESUMEN DEL CONTRATO			RESUMEN DEL ANTICIPO		
Valor del Contrato:		$ 391.157.475,00	Valor del Anticipo:		N/A
Adición del Contrato		$ 146.595.104,00			
Adición del Contrato		$ 146.595.104,00			
Valor Acta Nro. 1	$ 20.145.729,00		Amortización Acta 1	$ 0,00	
Valor Acta Nro. 2	$ 20.145.729,00		Amortización Acta 2	$ 0,00	
Valor Acta Nro. 3	$ 20.145.729,00		Amortización Acta 3	$ 0,00	
Valor Acta Nro. 4	$ 35.123.149,00		Amortización Acta 4	$ 0,00	
Valor Acta Nro. 5	$ 16.116.582,00		Amortización Acta 5	$ 0,00	
Valor Acta Nro. 6	$ 56.265.433,00		Amortización Acta 6	$ 0,00	
Valor Acta Nro. 7	$ 20.145.729,00		Amortización Acta 7	$ 0,00	
Valor Acta Nro. 8	$ 18.761.112,00		Amortización Acta 8	$ 0,00	
Valor Acta Nro. 9	$ 6.352.858,00		Amortización Acta 9	$ 0,00	
Valor Acta Nro. 10	$ 94.876.496,00		Amortización Acta 9	$ 0,00	
Saldo del Contrato:	$ 376.269.137,00		Saldo por Amortizar:	$ 0,00	
Sumas iguales	$ 684.347.683,00	$ 684.347.683,00	Sumas iguales	$ 0,00	$ 0,00

OBSERVACION: El contrato 03102023-1470, fue suspendido en su plazo contractual a partir del dia 16 de mayo de 2024, prorrogandose esta suspension por treinta dias (hasta 16/06/2024. Prorroga 01 a suspension 01) y adicionalmente otros treinta dias ((hasta 16/07/2024. Prorroga 02 a suspension 01) reiniciandose a partir del dia 15 de agosto de 2024 con nueva fecha de terminacion el dia 14 de septiembre de 2024, prorrogandose su plazo en dos meses. El periodo de pago coresponde de septiembre 15 a octubre 14 de 2024

Nota: EL (LA) CONTRATISTA HA ACREDITADO EL PAGO DE LA SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y APORTES PARAFISCALES CONFORME A LAS NORMAS VIGENTES , EL CUAL HA SIDO VERIFICADO POR PARTE DEL ORDENADOR, SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR EN CUMPLIMIENTO DEL ARTICULO 23 DE LA LEY 1150 de 2007 PARAGRAFO 1° ("El servidor público que sin justa causa no verifique el pago de los aportes a que se refiere el presente artículo, incurrirá en causal de mala conducta, que será sancionada con arreglo al régimen disciplinario vigente." y del articulo 23 del Decreto 1703/2002 Cotizaciones en contratación no laboral para efectos de lo establecido en el artículo 271 de la Ley 100 de 1993, en los contratos en donde este involucrada la ejecución de un servicio por una persona natural en favor de una persona natural o persona jurídica de derecho público o privado, la parte contratante deberá verificar la afiliación y pago de aportes al Sistema General de Seguridad Social

Firma

Nombre: JORGE RICARDO GUTIERREZ CARDONA

Ordenador del Gasto

Firma

Nombre: ANDRES OSORIO BERMUDEZ

Supervisor contrato

Firma

Nombre

Interventor (a) - (NO APLICA)

doc.	100003336	Sociedad	GCAL	Ejercicio	2024
.docum.	18.10.2024	Fe.contab.	21.10.2024	Período	10
lc.impuestos	☐				
feren.	5000103-14				
neda doc.	COP				
t.cab.doc.	A10 CONS VIAL 2023 C1470				

Cl	Cuenta	Texto breve cuenta	Importe	Centro	Actividad	Área func.	Ce.coste	Asign.	Texto
70	1705010000	000005000103 0014	94.876.496	9-9999	N-ULO	9999		ALTA	A10 CONS VIAL 2023 C1470
50	5808010100	INCORPORACIO ACTIVOS	94.876.496	9-9999	N-ULO	9999	110601	ALTA	A10 CONS VIAL 2023 C1470

(98)

Orden de 1/4



CONSORCIO VIAL 2023
NIT 901.754.250-9
CRA 4 9 25 OF 504
Tel: (608) 3212004214
Neiva - Colombia
luismisuaza@hotmail.com

Factura electrónica de venta
No. FEV 13

Señores	DEPARTAMENTO DE CALDAS		
NIT	890.801.052-1	**Teléfono**	(000) 68982444 - Ext. 000
Dirección	Carrera 21 entre Calle 22 y 23	**Ciudad**	Manizales - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	18/10/2024, 09:53
Expedición	18/10/2024, 09:53
Vencimiento	17/10/2024

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total	Impto. Cargo
1	COSTO DE PERSONAL	1.00	69,864,318.63	19 %
2	PRIMAS DE LOCALIZACION	1.00	7,892,711.49	19 %
3	PROVISION OTROS COSTOS DIRECTOS	1.00	4,114,437.91	19 %
4	PROVISION OTROPS COSTOS REEMBOLSABLES	1.00	13,005,028.14	0 %

Total ítems: 4

Total Bruto	81,804,581.00
IVA 19%	13,071,915.00
Total a Pagar	94,876,496.00

Valor en Letras:
Noventa y cuatro millones ochocientos setenta y seis mil cuatrocientos noventa y seis pesos m/cte.

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Pago a crÃ©dito - Cuota No. 001 vence el 2024-10-17 por $ 94,876,496.00

Observaciones:
INTERVENTORÍA TECNICA, ADMISNISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA RESULTANTE DEL PROCESO DE LICITACION LP-SI-013-2022. EL CUAL TIENE POR OBJETO: MEJORAMIENTO Y PAVIMENTACION DEL TRAMO VIAL LA PINTADA – ARMA- PUENTE BOCAS, EN EL MUNICIPIO DE AGUADAS. COBRO 30% ACTA CONTRATO 1470 DE 2023 PERIODO 16 DE SEPTIEMBRE AL 15 DE OCTUBRE DE 2024. 15,60% AVANCE

Favor consignar a la cuenta bancaria No 24126208764 Ahorros banco caja social

Porcentaje de participación de los miembros:

SUACOR INGENIERIA S.A.S - NIT 900.805.317 - 10%
INGENIERIA, MANTENIMIENTO, CONSULTORIAS Y ASESORIAS DE COLOMBIA S A S - NIT 900.063.967 - 90%

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764058629201 aprobado en 20231024 prefijo FEV desde el número 1 al 50 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 7112 Actividades de ingeniería y otras actividades conexas de consultoría técnica Tarifa
CUFE: e5480d78588c1bbb48bdf7a61845b2cfcf5db5057df742849c3eeb23b8b276087d8397aeba0c8ab663788c21a6a23747

Banco Caja Social

FUNDACIÓN GRUPO SOCIAL

HACE CONSTAR

Que el(los) cliente(s):

CONSORCIO VIAL 2023 *Identificado con* *NI9017542509*

Actualmente posee(n) el siguiente producto, radicado en la oficina 0101 NEIVA, con las siguientes características:

CUENTA DE AHORROS PYME

Número	:	*24126208764*
Fecha de Apertura	:	*18 de septiembre de 2023*
Condiciones de Manejo	:	*Individual,2 Firmas(s), 0 Sello(s) húmedo(s) o de caucho, Sin protector*
Estado	:	*CUENTA ACTIVA*

Esta constancia se expide con destino a: INTERESADO
Realizada en la oficina 0101 NEIVA de la ciudad de NEIVA, el día lunes, 18 de septiembre de 2023.

Cordialmente,

Efectuado por:
D9C0B3E5 - DIANA CAROLINA CEDEÑO BELTRAN

FIRMA Y SELLOS AUTORIZADOS

Establecimiento Bancario VIGILADO

PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES LEGALES
ARTÍCULO 50 LEY 789 DE 2002
(PERSONAS JURÍDICAS)

Neiva, octubre 18 de 2024

Señores
GOBERNACION DE CALDAS
CARRERA 21 ENTRE CALLES 22 Y 23
MANIZALES - CALDAS

REFERENCIA: Contrato 03102023-1470

LUIS MIGUEL SUAZA BAHAMON identificado con la cedula de ciudadanía No **1075.217.148** de Neiva, actuando en calidad de representante legal de **SUACOR INGENIERIA SAS** identificada con **NIT 900.805.317-1**, bajo la gravedad de juramento, certifico el pago de los aportes de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y al Servicio Nacional de Aprendizaje, (Articulo 65 Ley 1819 de 2016), pagados por la compañía durante los últimos seis (6) meses contados a partir de la fecha de cierre del presente proceso de selección. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el Artículo 50 de la Ley 789 de 2002.



LUIS MIGUEL SUAZA BAHAMON
C.C. 1075.217.148 DE NEIVA
RL SUACOR INGENIERIA SAS

PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES LEGALES
ARTÍCULO 50 LEY 789 DE 2002
(PERSONAS JURÍDICAS)

Neiva, octubre 18 de 2024

Señores
GOBERNACION DE CALDAS
CARRERA 21 ENTRE CALLES 22 Y 23
MANIZALES - CALDAS

REFERENCIA: Contrato 03102023-1470

DORIAN ALBERTO BARRERO JARAMILLO, identificado con cedula de ciudadanía 7.709.729 NEIVA, en mi condición de representante legal de **INGENIERIA, MANTENIMIENTO, CONSULTORIAS Y ASESORIAS DE COLOMBIA-IMCA** identificada con NIT 905.063.800-1, bajo la gravedad de juramento, certifico el pago de los aportes de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y al Servicio Nacional de Aprendizaje, (Articulo 65 Ley 1819 de 2016), pagados por la compañía durante los últimos seis (6) meses contados a partir de la fecha de cierre del presente proceso de selección. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Atentamente,

DORIAN ALBERTO BARRERO JARAMILLO
R. L: INGENIERIA, MANTENIMIENTO, CONSULTORIAS
Y ASESORIAS DE COLOMBIA-IMCA

PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES LEGALES
ARTÍCULO 50 LEY 789 DE 2002
(PERSONAS JURÍDICAS)

Neiva, octubre 18 de 2024

Señores
GOBERNACION DE CALDAS
CARRERA 21 ENTRE CALLES 22 Y 23
MANIZALES - CALDAS

REFERENCIA: Contrato 03102023-1470

LUIS MIGUEL SUAZA BAHAMON identificado con la cedula de ciudadanía No **1.075.217.148** de Neiva, actuando en calidad de representante legal del **Consorcio Vial 2023** identificada con **NIT 901.754.250-9**, bajo la gravedad de juramento, certifico el pago de los aportes de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y al Servicio Nacional de Aprendizaje, (Articulo 65 Ley 1819 de 2016), pagados por la compañía durante los últimos seis (6) meses contados a partir de la fecha de cierre del presente proceso de selección. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el Artículo 50 de la Ley 789 de 2002.



LUIS MIGUEL SUAZA BAHAMON
C.C. 1075.217.148 DE NEIVA
RL Consorcio Vial 2023

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 1 Inscripción

4. Número de formulario 14948189207

(415)7707212489984(8020) 000001494818920 7

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
9 0 1 7 5 4 2 5 0	9	Impuestos y Aduanas de Neiva	1 3	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de identificación	27. Fecha expedición
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
CONSORCIO VIAL 2023

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Huila 4 1	Neiva 0 0 1

41. Dirección principal
CL 9 5 50 OF 202

42. Correo electrónico luismisuaza@hotmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3 2 1 2 0 0 4 2 1 4	

CLASIFICACIÓN

Actividad económica				Ocupación	
Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades			
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2	51. Código	52. Número establecimientos
7 1 1 2	2 0 2 3 0 8 0 3							

Responsabilidades, Calidades y Atributos

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código 7	1	4	4	8	5	5																			

07- Retención en la fuente a título de rent
14- Informante de exogena
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
55 - Informante de Beneficiarios Finales

Obligados aduaneros																				Exportadores					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
54. Código																						57. Modo			
																						58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [X] NO [ ] 60. No. de Folios: 1 1 61. Fecha 2023 - 09 - 18 / 09 : 15: 00

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.
Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre RODRIGUEZ MANCHOLA ESPERANZA
985. Cargo Analista V

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14948189207

(415)7707212489984(8020) 000001494818920 7

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	13. Buzón electrónico
9 0 1 7 5 4 2 5 0	9	Impuestos y Aduanas de Neiva	1 3

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza	2	63. Formas asociativas		64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados	
65. Fondos		66. Cooperativas		67. Sociedades y organismo extranjeros	
68. Sin personería jurídica	3	69. Otras organizaciones no clasificadas		70. Beneficio	1

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	0 4	
72. Número		
73. Fecha	2 0 2 3 0 8 0 3	
74. Número de notaría		
75. Entidad de registro	9 8	
76. Fecha de registro	2 0 2 3 0 8 0 3	
77. No. Matrícula mercantil		
78. Departamento	4 1	
79. Ciudad/Municipio	0 0 1	

Vigencia

80. Desde	2 0 2 3 0 8 0 3	
81. Hasta	2 0 9 9 1 2 3 1	

Composición del Capital

82. Nacional	1 0 0 %
83. Nacional público	0 . 0 %
84. Nacional privado	1 0 0 . 0 %
85. Extranjero	0 %
86. Extranjero público	0 . 0 %
87. Extranjero privado	0 . 0 %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

Estado y Beneficio

Ítem	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1				-
2				-
3				-
4				-
5				-

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario
Representación

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14948189207

(415)7707212489984(8020) 000001494818920 7

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 7 5 4 2 5 0	9	Impuestos y Aduanas de Neiva	1 3

Representación

1

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL PRIN 1 8	2 0 2 3 0 8 0 3

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadaní 1 3	1 0 7 5 2 1 7 1 4 8		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
SUAZA	BAHAMON	LUIS	MIGUEL

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

2

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL SUPL 1 9	2 0 2 3 0 8 0 3

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadan 1 3	7 7 0 9 7 2 9		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
BARRERO	JARAMILLO	DORIAN	ALBERTO

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

3

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

4

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

5

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario
Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14948189207

(415)7707212489984(8020) 000001494818920 7

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
9 0 1 7 5 4 2 5 0	9	Impuestos y Aduanas de Neiva	1 3	

Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

1

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
NIT 3 1	9 0 0 8 0 5 3 1 7	1	COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social: SUACOR INGENIERIA S.A.S

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
		1 0 2 0 2 3 0 8 0 3	

2

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
NIT 3 1	9 0 0 0 6 3 9 6 7	1	COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social: INGENIERIA, MANTENIMIENTO, CONSULTORIAS Y ASESORIAS DE COLOMBIA S A S

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
	9 0	2 0 2 3 0 8 0 3	

3

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

4

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

5

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 14885754629

(415)7707212489984(8020) 000001488575462 9

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 0 0 6 3 9 6 7	1	Impuestos y Aduanas de Neiva 1 3	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	27. Fecha expedición
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición 28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
INGENIERIA, MANTENIMIENTO, CONSULTORIAS Y ASESORIAS DE COLOMBIA S A S

36. Nombre comercial	37. Sigla
	I.M.C.A. DE COLOMBIA S A S

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Huila 4 1	Neiva 0 0 1

41. Dirección principal
CR 4 11 29 IN 2

42. Correo electrónico imcadecolombia@gmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3 1 3 2 1 0 0 7 8 5	3 1 5 3 0 4 1 4 9 4

CLASIFICACIÓN

Actividad económica				Ocupación	
Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades			
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2	51. Código	52. Número establecimientos
4 2 9 0	2 0 0 6 0 1 1 2	7 1 1 2	2 0 2 0 0 2 0 3					

Responsabilidades, Calidades y Atributos

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código 5	7	1 4	4 2	4 8	5 2	5 5																			

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
07- Retención en la fuente a título de rent
14- Informante de exogena
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico
55 - Informante de Beneficiarios Finales

Obligados aduaneros	Exportadores
54. Código (1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 / 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20)	55. Forma 56. Tipo Servicio 1 2 3; 57. Modo; 58. CPC

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2022 - 12 - 30 / 12 : 21: 00

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.
Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre BARRERO JARAMILLO DORIAN ALBERTO
985. Cargo Representante legal Certificado

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14885754629

(415)7707212489984(8020) 000001488575462 9

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
9 0 0 0 6 3 9 6 7	1	Impuestos y Aduanas de Neiva	1 3	

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza	2	63. Formas asociativas	1 2	64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados	
65. Fondos		66. Cooperativas		67. Sociedades y organismos extranjeros	
68. Sin personería jurídica		69. Otras organizaciones no clasificadas		70. Beneficio	1

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	0 1	0 1
72. Número	0 0 0 0 1	7
73. Fecha	2 0 0 6 0 1 1 1	2 0 1 5 1 1 2 3
74. Número de notaría		
75. Entidad de registro	0 3	0 3
76. Fecha de registro	2 0 0 6 0 1 1 2	2 0 1 5 1 1 2 6
77. No. Matrícula mercantil	0 0 0 0 1 5 5 8 4 1	1 5 5 8 4
78. Departamento	4 1	4 1
79. Ciudad/Municipio	2 3	2 3
Vigencia		
80. Desde	2 0 0 6 0 1 1 1	
81. Hasta	2 0 5 6 0 1 1 1	

Composición del Capital

82. Nacional	1 0 0 %
83. Nacional público	0 . 0 %
84. Nacional privado	1 0 0 . 0 %
85. Extranjero	0 %
86. Extranjero público	0 . 0 %
87. Extranjero privado	0 . 0 %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

Estado y Beneficio

Ítem	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1	7 9	2 0 1 6 0 1 0 1		-
2				-
3				-
4				-
5				-

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario
Representación

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14885754629

(415)7707212489984(8020) 000001488575462 9

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 0 0 6 3 9 6 7	1	Impuestos y Aduanas de Neiva	1 3

Representación

1

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL PRIN 1 8	2 0 1 3 0 9 1 2

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadaní 1 3	7 7 0 9 7 2 9		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
BARRERO	JARAMILLO	DORIAN	ALBERTO

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

2

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

3

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

4

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

5

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario
Revisor Fiscal y Contador

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14885754629

(415)7707212489984(8020) 000001488575462 9

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
9 0 0 0 6 3 9 6 7	1	Impuestos y Aduanas de Neiva	1 3	

Revisor Fiscal y Contador

Revisor fiscal principal

124. Tipo de documento	125. Número de identificación	126. DV	127. Número de tarjeta profesional

128. Primer apellido	129. Segundo apellido	130. Primer nombre	131. Otros nombres

132. Número de Identificación Tributaria (NIT)	133. DV	134. Sociedad o firma designada

135. Fecha de nombramiento

Revisor fiscal suplente

136. Tipo de documento	137. Número de identificación	138. DV	139. Número de tarjeta profesional

140. Primer apellido	141. Segundo apellido	142. Primer nombre	143. Otros nombres

144. Número de Identificación Tributaria (NIT)	145. DV	146. Sociedad o firma designada

147. Fecha de nombramiento

Contador

148. Tipo de documento	149. Número de identificación	150. DV	151. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadanía 1 3	7 7 2 4 2 9 7		1 2 0 7 9 0

152. Primer apellido	153. Segundo apellido	154. Primer nombre	155. Otros nombres
LIZCANO	ORDOÑEZ	JOHN	ALEJANDRO

156. Número de Identificación Tributaria (NIT)	157. DV	158. Sociedad o firma designada

159. Fecha de nombramiento
2 0 1 9 0 3 0 4

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 1 3 Actualización de oficio

4. Número de formulario 14863520503

(415)7707212489984(8020) 000001486352050 3

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
9 0 0 8 0 5 3 1 7	1	Impuestos y Aduanas de Neiva	1 3	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de identificación	27. Fecha expedición
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
SUACOR INGENIERIA S.A.S

36. Nombre comercial	37. Sigla:
	SUACOR INGENIERIA S.A.S.

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Huila 4 1	Neiva 0 0 1

41. Dirección principal
CL 9 5 CC SANTA ANA LC 314

42. Correo electrónico luismisuaza@hotmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3 2 1 2 0 0 4 2 1 4	

CLASIFICACIÓN

Actividad económica					Ocupación	
Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código 1 / 2	51. Código	52. Número establecimientos
4 2 9 0	2 0 1 4 1 2 2 9	4 3 1 1	2 0 1 4 1 2 2 9	2 5 1 2 / 4 2 2 0		

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	5	7	9	1	4	4	2	4	8	5	2	5	5													

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
07- Retención en la fuente a título de rent
09- Retención en la fuente en el impuesto
14- Informante de exogena
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico
55 - Informante de Beneficiarios Finales

Obligados aduaneros																					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
54. Código																					

Exportadores				
55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2022 - 09 - 13 / 21 : 11: 18

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.
Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre ACTUACIÓN DE OFICIO AUTOMÁTICA
985. Cargo

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14863520503

(415)7707212489984(8020) 000001486352050 3

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
9 0 0 8 0 5 3 1 7	1	Impuestos y Aduanas de Neiva	1 3	

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza	2	63. Formas asociativas	1 2	64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados	
65. Fondos		66. Cooperativas		67. Sociedades y organismos extranjeros	
68. Sin personería jurídica		69. Otras organizaciones no clasificadas		70. Beneficio	1

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	0 1	
72. Número		
73. Fecha	2 0 1 4 1 2 2 9	
74. Número de notaría		
75. Entidad de registro	0 3	
76. Fecha de registro	2 0 1 4 1 2 2 9	
77. No. Matrícula mercantil	0 0 0 0 0 2 6 3 6 5 9	
78. Departamento	4 1	
79. Ciudad/Municipio	0 0 1	

Composición del Capital

82. Nacional	1 0 0 %
83. Nacional público	0 . 0 %
84. Nacional privado	1 0 0 . 0 %
85. Extranjero	0 %
86. Extranjero público	0 . 0 %
87. Extranjero privado	0 . 0 %

Vigencia

80. Desde	2 0 1 4 1 2 2 9
81. Hasta	9 9 9 9 1 2 3 1

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control: Superintendencia de Sociedades — 5

Estado y Beneficio

Ítem	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1	8 1	2 0 1 8 0 8 2 1		-
2				-
3				-
4				-
5				-

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario
Representación

001

Página 3 de 3 **Hoja 3**

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14863520503

(415)7707212489984(8020) 000001486352050 3

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
9 0 0 8 0 5 3 1 7	1	Impuestos y Aduanas de Neiva	1 3	

Representación

1

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL PRIN 1 8	2 0 1 4 1 2 2 9

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadaní 1 3	1 0 7 5 2 1 7 1 4 8		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
SUAZA	BAHAMON	LUIS	MIGUEL

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

2

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL SUPL 1 9	2 0 1 4 1 2 2 9

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadan 1 3	1 0 7 5 2 2 4 1 5 9		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
CORTES	CERQUERA	HECTOR	MAURICIO

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

3

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

4

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

5

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901754250	9	CONSORCIO VIAL 2023	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	Calle 50 Carrera 25	AGUADAS-CALDAS	8860766	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-09	2024-10	989752430	9475617643	E	2024/10/11	2024/10/18	BANCO DAVIVIENDA	7	$4,998,400

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (9 Afiliados)						$16,059,050	$2,569,900			$16,059,050	$642,600			$16,059,050	$642,600			$16,059,050	$1,118,100		$0	$0
Centro de Trabajo: Principal (9 Afiliados)						$16,059,050	$2,569,900			$16,059,050	$642,600			$16,059,050	$642,600			$16,059,050	$1,118,100		$0	$0
Ciudad: AGUADAS Depto: CALDAS (9 Afiliados)						$16,059,050	$2,569,900			$16,059,050	$642,600			$16,059,050	$642,600			$16,059,050	$1,118,100		$0	$0
1	CC	4377250	ARIAS SOLORZANO FRANCISCO JAVIER	25-14	15	$1,304,940	$208,800	EPS005	15	$1,304,940	$52,200	CCF11	15	$1,304,940	$52,200	14-11	15	$1,304,940	$90,900	15	$0	$0
2	CC	1075224159	CORTES CERQUERA HECTOR MAURICIO	230201	15	$1,558,830	$249,500	EPS005	15	$1,558,830	$62,400	CCF11	15	$1,558,830	$62,400	14-11	15	$1,558,830	$108,500	15	$0	$0
3	CC	1003828965	MALLUNGO REINOSO JUAN SEBASTIAN	25-14	15	$650,000	$104,000	EPS005	15	$650,000	$26,000	CCF11	15	$650,000	$26,000	14-11	15	$650,000	$45,300	15	$0	$0
4	CC	1003812575	MEDINA CAMPOS IVONNE JULLIETH	230301	30	$1,334,424	$213,600	EPS005	30	$1,334,424	$53,400	CCF11	30	$1,334,424	$53,400	14-11	30	$1,334,424	$92,900	30	$0	$0
5	CC	1075246303	PERDOMO VARGAS EDGAR MAURICIO	25-14	30	$4,157,508	$665,300	EPS037	30	$4,157,508	$166,400	CCF11	30	$4,157,508	$166,400	14-11	30	$4,157,508	$289,400	30	$0	$0
6	CC	1075269669	POLANIA ANDRADE DANIEL ALBERTO	230301	15	$650,000	$104,000	EPS037	15	$650,000	$26,000	CCF11	15	$650,000	$26,000	14-11	15	$650,000	$45,300	15	$0	$0
7	CC	1075227937	POLANIA ANDRADE DIEGO MAURICIO	231001	30	$3,234,924	$517,600	EPS005	30	$3,234,924	$129,400	CCF11	30	$3,234,924	$129,400	14-11	30	$3,234,924	$225,200	30	$0	$0
8	CC	1075303068	VALENCIA SUAREZ ANGIE DAYANA	230301	15	$1,558,830	$249,500	EPS037	15	$1,558,830	$62,400	CCF11	15	$1,558,830	$62,400	14-11	15	$1,558,830	$108,500	15	$0	$0
9	CC	7730160	VITOVIZ ORTIZ JOSE ERLEY	230201	15	$1,609,594	$257,600	EPS037	15	$1,609,594	$64,400	CCF11	15	$1,609,594	$64,400	14-11	15	$1,609,594	$112,100	15	$0	$0
Total			**Afiliados(9)**			$16,059,050	$2,569,900			$16,059,050	$642,600			$16,059,050	$642,600			$16,059,050	$1,118,100		$0	$0

PLANILLA PAGADA

en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901754250	9	CONSORCIO VIAL 2023	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	Calle 50 Carrera 25	AGUADAS-CALDAS	8860766	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-09	2024-10	989752430	9475617643	E	2024/10/11	2024/10/18	BANCO DAVIVIENDA	7	$4,998,400

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				9	$2,569,900	$13,000	$0	$2,582,900
COLFONDOS	23100l	800,227,940	6	1	$517,600	$2,600	$0	$520,200
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	3	$978,100	$4,900	$0	$983,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	3	$567,100	$2,900	$0	$570,000
PROTECCION	230201	800,229,739	0	2	$507,100	$2,600	$0	$509,700
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				9	$1,118,100	$5,600	$0	$1,123,700
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	9	$1,118,100	$5,600	$0	$1,123,700
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				9	$642,600	$3,300	$0	$645,900
CONFAMILIARES	CCF11	890,806,490	5	9	$642,600	$3,300	$0	$645,900
EPS (ADMINISTRADORAS: 2)				9	$642,600	$3,300	$0	$645,900
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	4	$319,200	$1,600	$0	$320,800
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	5	$323,400	$1,700	$0	$325,100
TOTAL				**9**	**$4,973,200**	**$25,200**	**$0**	**$4,998,400**

PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA

GOBIERNO DE CALDAS

ACTA NRO DIEZ (10) PARCIAL AL CONTRATO DE OBRA NRO. 03102023-1470
RADICADO SECRETARIA JURIDICA Nro. 03102023-1470

Secretaria : INFRAESTRUCTURA

Fecha acta OCTUBRE 18 DE 2024

Concepto	Descripción			
No. Radicado Contrato de Obra	03102023-1470	Acto Administrativo:	N/A	
No. Pedido en SAP:	4500024106 - 4500025234 - 4500026164			
NIT o RUT:	901.754.250-9			
Contratista:	CONSORCIO VIAL 2023			
Representante Legal:	LUIS MIGUEL SUAZA BAHAMON			
Valor del Contrato ($):	$ 391.157.475,00	Aporte Departamento	$ 684.347.683,00	
Valor Adición	$ 146.595.104,00	Aporte otras entidades	N/A	
Valor Adición	$ 146.595.104,00	Aporte otras entidades	N/A	
Objeto del contrato	IINTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA RESULTANTE DEL PROCESO DE LICITACIÓN LP-SI-013-2023 (TRAMO VIAL LA PINTADA - ARMA - PUENTE BOCAS, EN EL MUNICIPIO DE AGUADAS)			
Disponibilidad presupuestal	3500022475	FONDO	0 - 0378	
Duración del contrato (Plazo):	SEIS (6) MESES DESDE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO			
Fecha de iniciación	OCTUBRE 17 DE 2023	Fecha de terminación	16 DE ABRIL DE 2024	
Prorroga 01 plazo	DOS MESES. HASTA JUNIO 16 DE 2024	Nueva fecha de terminación	16 DE JUNIO DE 2024	
Fecha de suspension	MAYO 16 DE 2024	Prorroga 01 a suspension 01	HASTA JUNIO 16 DE 2024	
Prorroga 02 a suspension 01	UN MES. HASTA JULIO 16 DE 2024	Fecha de reiniciacion	AGOSTO 15 DE 2024	
Nueva fecha de terminacion	SEPTIEMBRE 14 DE 2024	Prorroga 02 plazo	DOS (2) MESES	
Supervisor (e.) Departamento	ANDRES OSORIO BERMUDEZ			

PROVISION COSTOS DE PERSONAL

PERSONAL		SALARIO MENSUAL	APLICACIÓN MES	PLAZO	VALOR TOTAL
Ingeniero Director de Interventoria		6.469.849,00	0,50	1,00	3.234.925,00
Ingeniero Residente	Nivel 1	4.157.508,00	1,0	1,00	4.157.508,00
Ingeniero Auxiliar	Nivel 4	3.219.188,00	1,0	1,00	3.219.188,00
Profesional Ambiental	Nivel 4	3.117.660,00	1,0	1,00	3.117.660,00
Profesional Social - SYSO	Nivel 4	3.117.660,00	1,0	1,00	3.117.660,00
Topografo - Inspector		2.609.880,00	1,0	1,00	2.609.880,00
Cadeneros		1.160.000,00	2,0	1,00	2.320.000,00
Secretaria		1.334.424,00	1,0	1,00	1.334.424,00
SUMA			**A**		**23.111.245,00**
FACTOR MULTIPLICADOR > 2SMMLV			**B**		**1,90**
FACTOR MULTIPLICADOR <= 2SMMLV			**B1**		**2,20**
COSTO BASICO (SIN IVA)			**C=A*B / C=A*B1**		**42.071.960,00**
VALOR DEL IVA			**D=0,19*C**		**7.993.672,00**
VALOR PROVISION COSTOS DE PERSONAL (CON IVA)			**E=C+D**		**50.065.632,00**

PROVISIÓN PRIMAS DE LOCALIZACIÓN

CONCEPTO	VALOR MES	APLICACIÓN MES	PLAZO	VALOR PARCIAL
Prima Categoria 1 (Profesionales de Nivel 1 a 3)	1.265.654,00	1,00	1,00	1.265.654,00
Prima Categoria 2 (Funcionarios de Nivel 4 a 6)	949.240,00	4,00	1,00	3.796.960,00
VALOR TOTAL		**A**		**5.062.614,00**
FACTOR MULTIPLICADOR		**B**		**1,00**
COSTO BASICO (SIN IVA)		**C=A*B**		**5.062.614,00**
VALOR DEL IVA		**D=0,19*C**		**961.897,00**
VALOR PROVISION COSTOS DE PERSONAL (CON IVA)		**E=C+D**		**6.024.511,00**

PROVISION OTROS COSTOS DIRECTOS FIJOS

RECURSO	UND	VALOR	APLICACIÓN	PLAZO	VALOR PARCIAL
Equipos de Computación con licencias de software básico (windows, office y antivirus)	Mes	105.471,00	5,00	1,00	527.355,00
Edición de informes	Mes	163.480,00	1,00	1,00	163.480,00
Papelería, reproducción documentos, fotografías, videos, impresión de planos	Mes	105.471,00	1,00	1,00	105.471,00
Comunicaciones (teléfono,fax,correos)	Mes	105.471,00	1,00	1,00	105.471,00
Oficina, Dotación y Servicios Públicos	Mes	1.582.067,00	1,00	1,00	1.582.067,00
SUMA			**A**		**2.483.844,00**
FACTOR MULTIPLICADOR			**B**		**1,00**
COSTO BASICO (SIN IVA)			**C=A*B**		**2.483.844,00**
VALOR DEL IVA			**D=0,19*C**		**471.930,00**
VALOR PROVISION OCD (CON IVA)			**E=C+D**		**2.955.774,00**

PROVISION OTROS GASTOS REEMBOLSABLES

RECURSO	UND	VALOR	APLICACIÓN	PLAZO	VALOR PARCIAL
Vehículo con conductor y gastos de operación (4x4 de mas de 2,000 cc)	Mes	5.469.735,00	1,00	1,00	5.469.735,00
Ensayos de Laboratorio	Mes	2.651.600,00	1,00	0,0	0,00
Topografia (incluye Tránsito, nivel y elementos complementarios)	Mes	2.636.779,00	1,00	1,00	2.636.779,00
SUMA			**A**		**8.106.514,00**
FACTOR MULTIPLICADOR			**B**		**1,00**
COSTO BASICO (SIN IVA)			**C=A*B**		**8.106.514,00**
VALOR PROVISION OGR (CON IVA)			**C**		**8.106.514,00**

VALOR ESTIMADO DE LA INTERVENTORIA EJECUTADA. ETAPA DE EJECUCIÓN DE OBRAS		
CONCEPTO	VALOR MENSUAL	VALOR TOTAL
PROVISION COSTOS DE PERSONAL	42.071.960,00	42.071.960,00
PROVISIÓN PRIMAS DE LOCALIZACIÓN	5.062.614,00	5.062.614,00
PROVISION OTROS COSTOS DIRECTOS	2.483.844,00	2.483.844,00
PROVISION OTROS GASTOS REEMBOLSABLES	8.106.514,00	8.106.514,00
PROVISION IVA	9.427.499,00	9.427.499,00
VALOR TOTAL	67.152.431,00	67.152.431,00

VALOR INICIAL CONTRATO DE INTERVENTORIA	391.157.475,00
VALOR ADICIONAL 01 CONTRATO DE INTERVENTORIA	146.595.104,00
VALOR ADICIONAL 02 CONTRATO DE INTERVENTORIA	146.595.104,00
VALOR TOTAL CONTRATO DE INTERVENTORIA	684.347.683,00
VALOR EJECUTADO MES DIEZ (10) DE INTERVENTORIA6	67.152.431,00
SETENTA (70%) POR CIENTO DEL VALOR DEL CONTRATO	479.043.378,00
TREINTA (30%) FIJO A RECONOCER POR EJECUTADO INTERVENTORIA MES SEIS	20.145.729,00
SETENTA (70%) POR CIENTO POR AVANCE DE OBRA	74.730.767,00

Valor Acta PARCIAL	X	TOTAL	EQUIVALENTE AL 30% DEL VR MES 10 DE INTERVENTORÍA	$ 20.145.729,00
POR % AVANCE MES NRO.1	VALOR CONTRATO DE OBRA	VR. AVANCE OBRA	% EQUIVALENTE	$ 74.730.767,00
	$5.122.147.130,00	$799.093.417,00	15,60	
Amortización Anticipo				$0,00
Valor Ordenación del Gasto:				$94.876.496,00

RESUMEN DEL CONTRATO		
Valor Inicial del Contrato		391.157.475,00
Valor adicional 01		146.595.104,00
Valor adicional 02		146.595.104,00
Valor Acta No. 1:	20.145.729,00	
Valor Acta No. 2:	20.145.729,00	
Valor Acta No. 3:	20.145.729,00	
Valor Acta No. 4:	35.123.149,00	
Valor Acta No. 5:	16.116.582,00	
Valor Acta No. 6:	56.265.433,00	
Valor Acta No. 7:	20.145.729,00	
Valor Acta No. 8:	18.761.112,00	
Valor Acta No. 9:	6.352.858,00	
Valor Acta No. 10:	94.876.496,00	
Saldo del contrato	376.269.137,00	
Sumas Iguales	684.347.683,00	684.347.683,00

RESUMEN DEL ANTICIPO		
Valor del Anticipo:		0,00
Amortización del Anticipo Acta 1:	0,00	
Amortización del Anticipo Acta 2:	0,00	
Amortización del Anticipo Acta 3:	0,00	
Amortización del Anticipo Acta 4:	0,00	
Amortización del Anticipo Acta 5:	0,00	
Amortización del Anticipo Acta 6:	0,00	
Amortización del Anticipo Acta 7:	0,00	
Amortización del Anticipo Acta 8:	0,00	
Amortización del Anticipo Acta 9:	0,00	
Amortización del Anticipo Acta 10:	0,00	
Saldo por amortizar:	0,00	
Sumas Iguales:	0,00	0,00

SE HACE CONSTAR

Que **CONSORCIO VIAL 2023**, representada legalmente por la ingeniera **LUIS MIGUEL SUAZA BAHAMON** ejecuta parcialmente para el Departamento de Caldas el, **OBJETO DE ESTE CONTRATO DE OBRA A ENTERA SATISFACCION Y DENTRO DEL PLAZO PREVISTO.**

Dando cumplimiento al artículo 50 de la ley 789 de 2.002, modificado por el Articulo 1° de la ley 828 de 2.003 y al Articulo 27 del Decreto 2170 de 2.002, la suscrita Interventoría verificó el cumplimiento de éstas obligaciones por parte del contratista.

Firma
JORGE RICARDO GUTIERREZ CARDONA
Secretario de Infraestructura
Ordenador del Gasto

Firma
CONSORCIO VIAL 2023
Contratista

Firma
ANDRES OSORIO BERMUDEZ
Supervisor Depto

GOBIERNO DE CALDAS

RESUMEN DE ACTIVIDADES ACTA 10 PARCIAL

CONTRATO DE CONSULTORIA: 03102023-1470

OBJETO: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA RESULTANTE DEL PROCESO DE LICITACIÓN LP-SI-013-2023 (TRAMO VIAL LA PINTADA - ARMA - PUENTE BOCAS, EN EL MUNICIPIO DE AGUADAS)

CONTRATISTA: CONSORCIO VIAL 2023
SUPERVISOR (E.): ANDRES OSORIO BERMUDEZ

INTERVENTORIA CONTRTADA SEGÚN ESTUDIO PREVIO, PROPUESTA PRESENTADA

PROVISION COSTOS DE PERSONAL

	PERSONAL		SALARIO MENSUAL	APLICACIÓN MES	PLAZO	VALOR PARCIAL
-	Ingeniero Director de Interventoria		6.469.849,00	0,50	6,0	19.409.547,00
-	Ingeniero Residente	Nivel 1	4.157.508,00	1,0	6,0	24.945.048,00
-	Ingeniero Auxiliar	Nivel 4	3.219.188,00	1,0	5,0	16.095.940,00
-	Profesional Ambiental	Nivel 4	3.117.660,00	1,0	5,0	15.588.300,00
-	Profesional Social - SYSO	Nivel 4	3.117.660,00	1,0	5,0	15.588.300,00
-	Topografo - Inspector		2.609.880,00	1,0	5,0	13.049.400,00
-	Cadeneros		1.160.000,00	2,0	5,0	11.600.000,00
-	Secretaria		1.334.424,00	1,0	6,0	8.006.544,00
				SUMA	A	124.283.079,00
				FACTOR MULTIPLICADOR > 2SMMLV	B	1,90
				FACTOR MULTIPLICADOR <= 2SMMLV	B1	2,20
				COSTO BASICO (SIN IVA)	C=A*B / C=A*B1	242.019.813
				VALOR DEL IVA	D=0,19*C	45.983.764,00
				VALOR PROVISION COSTOS DE PERSONAL (CON IVA)	E=C+D	288.003.577,00

INTERVENTORIA EJECUTADA SEGÚN ESTUDIO PREVIO, PROPUESTA PRESENTADA

PROVISION COSTOS DE PERSONAL

	PERSONAL		SALARIO MENSUAL	APLICACIÓN MES	PLAZO	VALOR PARCIAL
-	Ingeniero Director de Interventoria		6.469.849,00	0,50	1,00	3.234.925,00
-	Ingeniero Residente	Nivel 1	4.157.508,00	1,0	1,00	4.157.508,00
-	Ingeniero Auxiliar	Nivel 4	3.219.188,00	1,0	1,00	3.219.188,00
-	Profesional Ambiental	Nivel 4	3.117.660,00	1,0	1,00	3.117.660,00
-	Profesional Social - SYSO	Nivel 4	3.117.660,00	1,0	1,00	3.117.660,00
-	Topografo - Inspector		2.609.880,00	1,0	1,00	2.609.880,00
-	Cadeneros		1.160.000,00	2,0	1,00	2.320.000,00
-	Secretaria		1.334.424,00	1,0	1,00	1.334.424,00
				SUMA	A	23.111.245,00
				FACTOR MULTIPLICADOR > 2SMMLV	B	1,90
				FACTOR MULTIPLICADOR <= 2SMMLV	B1	2,20
				COSTO BASICO (SIN IVA)	C=A*B / C=A*B1	42.071.960,00
				VALOR DEL IVA	D=0,19*C	7.993.672,00
				VALOR PROVISION COSTOS DE PERSONAL (CON IVA)	E=C+D	50.065.632,00

PROVISIÓN PRIMAS DE LOCALIZACIÓN

	CONCEPTO	VALOR MES	APLICACIÓN MES	PLAZO	VALOR PARCIAL
-	Prima Categoría 1 (Profesionales de Nivel 1 a 3)	1.265.654,00	1,00	6,00	7.593.924,00
-	Prima Categoría 2 (Funcionarios de Nivel 4 a 6)	949.240,00	4,00	5,00	18.984.800,00
			VALOR TOTAL	A	26.578.724,00
			FACTOR MULTIPLICADOR	B	1,00
			COSTO BASICO (SIN IVA)	C=A*B	26.578.724,00
			VALOR DEL IVA	D=0,19*C	5.049.958,00
			VALOR PROVISION COSTOS DE PERSONAL (CON IVA)	E=C+D	31.628.682,00

PROVISIÓN PRIMAS DE LOCALIZACIÓN

	CONCEPTO	VALOR MES	APLICACIÓN MES	PLAZO	VALOR PARCIAL
-	Prima Categoría 1 (Profesionales de Nivel 1 a 3)	1.265.654,00	1,00	1,00	1.265.654,00
-	Prima Categoría 2 (Funcionarios de Nivel 4 a 6)	949.240,00	4,00	1,00	3.796.960,00
			VALOR TOTAL	A	5.062.614,00
			FACTOR MULTIPLICADOR	B	1,00
			COSTO BASICO (SIN IVA)	C=A*B	5.062.614,00
			VALOR DEL IVA	D=0,19*C	961.897,00
			VALOR PROVISION COSTOS DE PERSONAL (CON IVA)	E=C+D	6.024.511,00

PROVISION OTROS COSTOS DIRECTOS FIJOS

	RECURSO	UN	VALOR	APLICACIÓN	PLAZO	VALOR PARCIAL
-	Equipos de Computación con licencias de software básico (windows, office y antivirus)	Mes	105.471,00	5,00	6,00	3.164.130,00
-	Edición de informes	Mes	163.480,00	1,00	6,00	980.880,00
-	Papelería, reproducción documentos, fotografías, videos, impresión de planos	Mes	105.471,00	1,00	6,00	632.826,00
-	Comunicaciones (teléfono,fax,correos)	Mes	105.471,00	1,00	6,00	632.826,00
-	Oficina, Dotación y Servicios Públicos	Mes	1.582.067,00	1,00	6,00	9.492.402,00
				SUMA	A	14.903.064,00
				FACTOR MULTIPLICADOR	B	1,00
				COSTO BASICO (SIN IVA)	C=A*B	14.903.064,00
				VALOR DEL IVA	D=0,19*C	2.831.582,00
				VALOR PROVISION OCD (CON IVA)	E=C+D	17.734.646,00

PROVISION OTROS COSTOS DIRECTOS FIJOS

	RECURSO	UN	VALOR	APLICACIÓN	PLAZO	VALOR PARCIAL
-	Equipos de Computación con licencias de software básico (windows, office y antivirus)	Mes	105.471,00	5,00	1,00	527.355,00
-	Edición de informes	Mes	163.480,00	1,00	1,00	163.480,00
-	Papelería, reproducción documentos, fotografías, videos, impresión de planos	Mes	105.471,00	1,00	1,00	105.471,00
-	Comunicaciones (teléfono,fax,correos)	Mes	105.471,00	1,00	1,00	105.471,00
-	Oficina, Dotación y Servicios Públicos	Mes	1.582.067,00	1,00	1,00	1.582.067,00
				SUMA	A	2.483.844,00
				FACTOR MULTIPLICADOR	B	1,00
				COSTO BASICO (SIN IVA)	C=A*B	2.483.844,00
				VALOR DEL IVA	D=0,19*C	471.930,00
				VALOR PROVISION OCD (CON IVA)	E=C+D	2.955.774,00

PROVISION OTROS GASTOS REEMBOLSABLES						
	RECURSO	UN	VALOR	APLICACIÓN	PLAZO	VALOR PARCIAL
-	Vehiculo con conductor y gastos de operación (4x4 de mas de 2,000 cc)	Mes	5.469.735,00	1,00	5,00	27.348.675,00
-	Ensayos de Laboratorio	Mes	2.651.600,00	1,00	5,00	13.258.000,00
-	Topografia (incluye Tránsito, nivel y elementos complementarios)	Mes	2.636.779,00	1,00	5,00	13.183.895,00
			SUMA	A		53.790.570,00
			FACTOR MULTIPLICADOR	B		1,00
			COSTO BASICO (SIN IVA)	C=A*B		53.790.570,00
			VALOR PROVISION OGR (CON IVA)	C		53.790.570,00

PROVISION OTROS GASTOS REEMBOLSABLES						
	RECURSO	UN	VALOR	APLICACIÓN	PLAZO	VALOR PARCIAL
-	Vehiculo con conductor y gastos de operación (4x4 de mas de 2,000 cc)	Mes	5.469.735,00	1,00	1,00	5.469.735,00
-	Ensayos de Laboratorio	Mes	2.651.600,00	1,00	0,00	0,00
-	Topografia (incluye Tránsito, nivel y elementos complementarios)	Mes	2.636.779,00	1,00	1,00	2.636.779,00
			SUMA	A		8.106.514,00
			FACTOR MULTIPLICADOR	B		1,00
			COSTO BASICO (SIN IVA)	C=A*B		8.106.514,00
			VALOR PROVISION OGR (CON IVA)	C		8.106.514,00

VALOR ESTIMADO DE LA INTERVENTORIA ETAPA DE EJECUCIÓN DE OBRAS			
	CONCEPTO	VALOR MENSUAL	VALOR TOTAL
	PROVISION COSTOS DE PERSONAL	57.011.716,07	288.003.576,00
	PROVISIÓN PRIMAS DE LOCALIZACIÓN	6.024.510,66	31.628.682,00
	PROVISION OTROS COSTOS DIRECTOS	2.955.774,36	17.734.646,00
	PROVISION OTROS GASTOS REEMBOLSABLES	10.758.114,00	53.790.570,00
	VALOR TOTAL	76.750.115,09	391.157.475,00

VALOR ESTIMADO DE LA INTERVENTORIA ETAPA DE EJECUCIÓN DE OBRAS			
	CONCEPTO	VALOR MENSUAL	VALOR TOTAL
	PROVISION COSTOS DE PERSONAL	50.065.632,00	50.065.632,00
	PROVISIÓN PRIMAS DE LOCALIZACIÓN	6.024.511,00	6.024.511,00
	PROVISION OTROS COSTOS DIRECTOS	2.955.774,00	2.955.774,00
	PROVISION OTROS GASTOS REEMBOLSABLES	8.106.514,00	8.106.514,00
	VALOR TOTAL	67.152.431,00	67.152.431,00

CONSORCIO VIAL 2023
EL CONTRATISTA

ANDRES OSORIO BERMUDEZ
EL SUPERVISOR (e.)

VALOR ACTA 10 PARCIAL	67.152.431,00
AMORTIZACION ANTICIPO	0,00
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA	67.152.431,00

CUENTA DE COBRO #140

Neiva Huila, 17 octubre 2024

CONSORCIO VIAL 2023
NIT: 901.754.250-9

DEBE A:

Nombre y Apellidos: MAUDI TATIANA MALLUNGO REINOSO

Documento de Identificación: C.C 1.083.839.326 Hobo

La suma de: **$2.552. 543.oo**

Dos millones quinientos cincuenta y dos mil quinientos cuarenta y tres pesos m/cte.

Por concepto de: ALQUILER DE VEHICULO 4X4 DE MAS DE 2.000 CC. CONDUCTOR, PLACAS JZY686 DE 1 AL 15 OCTUBRE 2024

Firma_____
Dirección: CLL 70/2 w 02 balcones de los hoyuelos torre 11 apto 602
Celular: 3212272304

Anexo: copia de aportes a seguridad social independiente

CUENTA DE COBRO #141

Neiva Huila, 17 Octubre 2024

CONSORCIO VIAL 2023
NIT: 901.754.250-9

DEBE A:

Nombre y Apellidos: MAUDI TATIANA MALLUNGO REINOSO

Documento de Identificación: C.C 1.083.839.326 Hobo

La suma de: **$2.917.912.oo**

Dos millones novecientos diecisiete mil ciento noventa y dos pesos m/cte.

Por concepto de: ALQUILER DE VEHICULO 4X4 DE MAS DE 2.000 CC. CONDUCTOR, PLACAS JZY686 DE 15 AL 30 SEPTIEMBRE 2024

Firma_____
Dirección: CLL 70 2 w 02 balcones de los hoyuelos torre 11 apto 602
Celular: 3212272304

Anexo: copia de aportes a seguridad social independiente

CUENTA DE COBRO #142

Neiva Huila,15 octubre 2024

CONSORCIO VIAL 2023
NIT: 901.754.250-9

DEBE A:

Nombre y Apellidos: MAUDI TATIANA MALLUNGO REINOSO

Documento de Identificación: C.C 1.083.839.326 Hobo

La suma de: **$1.230. 497.oo**

Millón doscientos treinta mil cuatrocientos noventa y siete pesos m/cte.

Por concepto de: ALQUIER DE EQUIPO DE TOPOGRAFIA (INCLUYE TRANSITO NIVEL Y ELEMENTO COMPLEMENTARIOS) DEL 1 AL 15 OCTUBRE 2024.

Firma_____
Dirección: CLL 70/2 w 02 balcones de los hoyuelos torre 11 apto 602
Celular: 3212272304

Anexo: copia de aportes a seguridad social independiente

CUENTA DE COBRO #143

Neiva Huila, 15 octubre 2024

CONSORCIO VIAL 2023
NIT: 901.754.250-9

DEBE A:

Nombre y Apellidos: MAUDI TATIANA MALLUNGO REINOSO

Documento de Identificación: C.C 1.083.839.326 Hobo

La suma de: **$1.230. 497.oo**

Millón doscientos treinta mil cuatrocientos noventa y siete pesos m/cte.

Por concepto de: ALQUIER DE EQUIPO DE TOPOGRAFIA (INCLUYE TRANSITO NIVEL Y ELEMENTO COMPLEMENTARIOS) DEL 15 AL 30 SEPTIEMBRE 2024

Firma_____
Dirección: CLL 70/2 w 02 balcones de los hoyuelos torre 11 apto 602
Celular: 3212272304

Anexo: copia de aportes a seguridad social independiente

GOBIERNO DE CALDAS	INFORME DE INTERVENTORIA/SUPERVISION 10 PARCIAL CONTRATO INICIAL DE CONSULTORIA NRO. 03102023-1470	Código: FO-FT-02-005 Versión: 07 Fecha de modificación: 19/01/2016

CONTRATO DE CONSULTORIA	03102023-1470	RADICADO SECRETARIA JURIDICA. NRO:	03102023-1470
OBJETO:	IINTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA RESULTANTE DEL PROCESO DE LICITACIÓN LP-SI-013-2023 (TRAMO VIAL LA PINTADA - ARMA - PUENTE BOCAS, EN EL MUNICIPIO DE AGUADAS)		
NOMBRE DEL CONTRATISTA	CONSORCIO VIAL 2023		
NOMBRE DEL SUPERVISOR	ANDRES OSORIO BERMUDEZ		
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO	SEIS (6) MESES DESDE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO	MODIFICATORIO 01 Y 02 PLAZO	DOS MESES (PRORROGA 01) DOS MESES (PRORROGA 02)
VALOR DEL CONTRATO (V. INICIAL + ADICIONAL 01+ ADICIONAL 02) INCLUIDO IVA (19%)	$ 684.347.683	PORCENTAJE % IVA	19
VALOR TOTAL	$ 684.347.683		

PROVISION COSTOS DE PERSONAL CONTRATADOS						PESO %	DIF.%
		SALARIO MENSUAL	APLICACIÓN MES	PLAZO	VALOR PARCIAL		
Ingeniero Director de Interventoria		6.469.849,00	0,50	10,0	32.349.245,00	0,73	55,37
Ingeniero Residente	Nivel 1	4.157.508,00	1,0	10,0	41.575.080,00		
Ingeniero Auxiliar	Nivel 4	3.219.188,00	1,0	9,0	28.972.692,00		
Profesional Ambiental	Nivel 4	3.117.660,00	1,0	9,0	28.058.940,00		
Profesional Social - SYSO	Nivel 4	3.117.660,00	1,0	9,0	28.058.940,00		
Topografo - Inspector		2.609.880,00	1,0	9,0	23.488.920,00		
Cadeneros		1.160.000,00	2,0	9,0	20.880.000,00		
Secretaria		1.334.424,00	1,0	10,0	13.344.240,00		
			A		216.728.057,00		
			B		1,90		
			B1		2,20		
			C=A*B / C=A*B1		422.050.581,00		
			D=0,19*C		80.189.610,00		
VALOR PROVISION COSTOS DE PERSONAL (CON IVA)			E=C+D		502.240.191,00		

PROVISION COSTOS DE PERSONAL EJECUTADOS						PESO %
		SALARIO MENSUAL	APLICACIÓN MES	PLAZO	VALOR PARCIAL	
Ingeniero Director de Interventoria		6.469.849,00	0,50	9,00	29.114.321,00	56,10
Ingeniero Residente	Nivel 1	4.157.508,00	1,0	9,00	37.417.572,00	
Ingeniero Auxiliar	Nivel 4	3.219.188,00	1,0	7,00	22.534.316,00	
Profesional Ambiental	Nivel 4	3.117.660,00	1,0	7,00	21.823.620,00	
Profesional Social - SYSO	Nivel 4	3.117.660,00	1,0	7,00	21.823.620,00	
Topografo - Inspector		2.609.880,00	1,0	7,00	18.269.160,00	
Cadeneros		1.160.000,00	2,0	7,00	16.240.000,00	
		1.334.424,00	1,0	9,00	12.009.816,00	
			A		179.232.425,00	
			B		1,90	
			B1		2,20	
			C=A*B / C=A*B1		322.594.957,00	
			D=0,19*C		61.293.042,00	
			E=C+D		383.887.999,00	

PROVISION PRIMAS DE LOCALIZACION CONTRATADAS					PESO %	DIF.%
CONCEPTO	VALOR MES	APLICACIÓN MES	PLAZO	VALOR PARCIAL		
Prima Categoria 1 (Profesionales de Nivel 1 a 3)	1.265.654,00	1,00	10,00	12.656.540,00	0,08	6,52
Prima Categoria 2 (Funcionarios de Nivel 4 a 6)	949.240,00	4,00	9,00	34.172.640,00		
		A		46.829.180,00		
		B		1,00		
		C=A*B		46.829.180,00		
		D=0,19*C		8.897.544,00		
VALOR TOTAL		E=C+D		55.726.724,00		

PROVISION PRIMAS DE LOCALIZACION EJECUTADAS					PESO %
	VALOR MES	APLICACIÓN MES	PLAZO	VALOR PARCIAL	
Prima Categoria 1 (Profesionales de Nivel 1 a 3)	1.265.654,00	1,00	9,00	11.390.886,00	6,60
Prima Categoria 2 (Funcionarios de Nivel 4 a 6)	949.240,00	4,00	7,00	26.578.720,00	
		A		37.969.606,00	
		B		1,00	
		C=A*B		37.969.606,00	
		D=0,19*C		7.214.225,00	
		E=C+D		45.183.831,00	

PROVISION OTROS COSTOS DIRECTOS FIJOS CONTRATADOS						PESO %	DIF.%
	UN	VALOR	APLICACIÓN	PLAZO	VALOR PARCIAL		
Equipos de Computación con licencias de software básico (windows, office y antivirus)	Mes	105.471,00	5,00	10,00	5.273.550,00	0,04	3,84
Edición de informes	Mes	163.480,00	1,00	10,00	1.634.800,00		
Papelería, reproducción documentos, fotografías, videos, impresión de planos	Mes	105.471,00	1,00	10,00	1.054.710,00		
Comunicaciones (teléfono,fax,correos)	Mes	105.471,00	1,00	10,00	1.054.710,00		
Oficina, Dotación y Servicios Públicos	Mes	1.582.067,00	1,00	10,00	15.820.670,00		
			A		24.838.440,00		
			B		1,00		
			C=A*B		24.838.440,00		
			D=0,19*C		4.719.304,00		

PROVISION OTROS COSTOS DIRECTOS FIJOS EJECUTADAS						PESO %
	UN	VALOR	APLICACIÓN	PLAZO	VALOR PARCIAL	
Equipos de Computación con licencias de software básico (windows, office y antivirus)	Mes	105.471,00	5,00	9,00	4.746.195,00	3,89
Edición de informes	Mes	163.480,00	1,00	9,00	1.471.320,00	
Papelería, reproducción documentos, fotografías, videos, impresión de planos	Mes	105.471,00	1,00	9,00	949.239,00	
Comunicaciones (teléfono,fax,correos)	Mes	105.471,00	1,00	9,00	949.239,00	
Oficina, Dotación y Servicios Públicos	Mes	1.582.067,00	1,00	9,00	14.238.603,00	
			A		22.354.596,00	
			B		1,00	
			C=A*B		22.354.596,00	
			D=0,19*C		4.247.373,00	

VALOR TOTAL	E=C+D	29.557.744,00	

	E=C+D	26.601.969,00	

PROVISION OTROS GASTOS REEMBOLSABLES CONTRATADOS						PESO %	DIF.%
RECURSO	UN	VALOR	APLICACIÓN	PLAZO	VALOR PARCIAL		
Vehiculo con conductor y gastos de operación (4x4 de mas de 2,000 cc)	Mes	5.469.735,00	1,00	9,00	49.227.615,00	0,14	9,34
Ensayos de Laboratorio	Mes	2.651.600,00	1,00	9,00	23.864.400,00		
Topografia (incluye Tránsito, nivel y elementos complementarios)	Mes	2.636.779,00	1,00	9,00	23.731.011,00		
			A		96.823.026,00		
			B		1,00		
			C=A*B		96.823.026,00		
		VALOR TOTAL	C		96.823.026,00		

PROVISION OTROS GASTOS REEMBOLSABLES EJECUTADOS						PESO %
	UN	VALOR	APLICACIÓN	PLAZO	VALOR PARCIAL	
Vehiculo con conductor y gastos de operación (4x4 de mas de 2,000 cc)	Mes	5.469.735,00	1,00	8,00	43.757.880,00	9,48
Ensayos de Laboratorio	Mes	2.651.600,00	1,00	0,00	0,00	
Topografia (incluye Tránsito, nivel y elementos complementarios)	Mes	2.636.779,00	1,00	8,00	21.094.232,00	
			A		64.852.112,00	
			B		1,00	
			C=A*B		64.852.112,00	
			C		64.852.112,00	

VALOR ESTIMADO DE LA INTERVENTORIA ETAPA DE EJECUCIÓN DE OBRAS			PESO %	DIF.%
CONCEPTO	VALOR	VALOR TOTAL		
PROVISION COSTOS DE PERSONAL	502.240.190,00	502.240.190,00	0,73	-0,73
PROVISION PRIMAS DE LOCALIZACION	55.726.724,00	55.726.724,00	0,00	0,00
PROVISION OTROS COSTOS DIRECTOS	29.557.744,00	29.557.744,00	0,00	0,00
PROVISION OTROS GASTOS REEMBOLSABLES	96.823.026,00	96.823.026,00	0,00	0,00
VALOR TOTAL	684.347.683,00	684.347.683,00	0,71	-0,71

	VALOR MENSUAL	VALOR TOTAL	PESO %
PROVISION COSTOS DE PERSONAL	383.887.999,00	383.887.999,00	
PROVISION PRIMAS DE LOCALIZACION	45.183.831,00	45.183.831,00	
PROVISION OTROS COSTOS DIRECTOS	26.601.969,00	26.601.969,00	
PROVISION OTROS GASTOS REEMBOLSBLES	64.852.112,00	64.852.112,00	
	520.525.911,00	520.525.911,00	

INFORMACIÓN DE CONTRATO	
CONTRATISTA	
VALOR DEL CONTRATO	$ 391.157.475
VALOR ADICIONAL	$ 146.595.104
VALOR ADICIONAL	$ 146.595.104
VALOR TOTAL	$ 684.347.683
PLAZO INICIAL	SEIS (6) MESES DESDE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO
FECHA INICIACION	OCTUBRE 17 DE 2023
FECHA TERMINACION	ABRIL 16 DE 2024
PRORROGA DE PLAZO	DOS MESES. HASTA 16/06/2024
FECHA DE SUSPENSION	MAYO 16 DE 2024
PRORROGA 01 A SUSPENSION	HASTA JUNIO 16 DE 2024
PRORROGA 02 A SUSPENSION	HASTA JULIO 16 DE 2024
FECHA REINICIACION	AGOSTO 16 DE 2024
NUEVA FECHA TERMIANACION	SEPTIEMBRE 14 DE 2024
PRORROGA 02 PLAZO	DOS MESES. HASTA 15/11/2024

INTERVENTORIA/SUPERVISION	EL CONTRATO NO CONTO CON INTERVENTORIA EXTERNA. LA SUPERVISION ESTA A CARGO DEL INGENIERO ANDRES OSORIO BERMUDEZ, PROFESIONAL UNIVERSITARIO ADSCRITO A LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DE LA GOBERNACION DE CALDAS

ACTIVIDADES REALIZADAS
INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA RESULTANTE DEL PROCESO DE LICITACIÓN LP-SI-013-2023 (TRAMO VIAL LA PINTADA - ARMA - PUENTE BOCAS, EN EL MUNICIPIO DE AGUADAS)

ANDRES OSORIO BERMUDEZ
Supervisor contrato

GOBIERNO DE CALDAS	INFORME DE INTERVENTORIA/SUPERVISION 10 PARCIAL AL CONTRATO DE CONSULTORIA 03102023-1470	Código: FO-FT-02-005 Versión: 07 Fecha de Modificación: 19/01/2016

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA

FECHA
OCTUBRE 18 DE 2024

ACTA NRO.	10 PARCIAL	INFORME AMBIENTAL DE INTERVENTORIA/SUPERVISION

CONTRATO	03102023-1470	CONSULTORIA	X	OBRA:	

NRO. CONTRATO RADICADO:	03102023-1470

OBJETO DEL CONTRATO:	IINTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA RESULTANTE DEL PROCESO DE LICITACIÓN LP-SI-013-2023 (TRAMO VIAL LA PINTADA - ARMA - PUENTE BOCAS, EN EL MUNICIPIO DE AGUADAS)
CONTRATISTA:	CONSORCIO VIAL 2023 CONFORMADO POR SUACOR INGENIERIA SAS, NIT: 900.805.317-1 (10%) Y POR INGENENIERIA MANTENIMIENTO, CONSULTORIAS Y ASESORIAS DE COLOMBIA SAS - IMCA, NIT 900.063.967-1 (90%)
SUPERVISOR	ANDRES OSORIO BERMUDEZ

PREGUNTAS	SI	NO	N/A	OBSERVACIONES
El personal que labora en la obra utiliza uniformes y equipos de protección personal			X	
Los vehículos que transportan los sobrantes y escombros de construcción cuentan con el distintivo en las puertas laterales donde se indica el nombre de contratista, la entidad contratante y la obra para la cual labora			X	
La vía en el sector donde se realizan las obras se encuentran libres de escombros			X	
Se acumulan escombros, sobrantes de excavación y materiales en zonas verdes o sobre las cunetas.			X	
Los escombros de construcción permanecen en la obra por más de 24 horas			X	
Se cubren los materiales almacenados temporalmente con un material impermeable			X	
Existe un cerramiento con malla fina sintética o doble cinta reflectiva para los materiales almacenados temporalmente en la obra			X	
Se lleva a cabo una recolección periódica de basuras y desperdicios			X	
Existe un cerramiento del frente de la obra con malla fina sintética o cinta reflectiva			X	
La obra cuenta con valla publicitaria			X	
Se instalaron vallas informativas al transito vehicular 100 metros antes de la llegada a la obra			X	
La disolución de la liga asfáltica se realiza con calentadores portátiles que utilicen gas como combustible o por el contrario debidamente adecuados con resistencias eléctricas			X	
En la obra se realizan quemas a cielo abierto			X	
Se mezclan concretos en plataformas metálicas o geotextil			X	
Las baterías de las máquinas son reemplazadas en un taller autorizado			X	
El cambio de aceites se realiza en la obra			X	
Se utilizan compresores neumáticos para la limpieza de la superficie de la obra			X	
El establecimiento de la maquinaria o el almacenamiento de combustibles se realizó en zonas públicas			X	
Las labores de reparación y mantenimiento de maquinaria se realiza en centros autorizados			X	
Se usan baños portátiles			X	
Se entrega volantes informativos para la comunidad			X	
Se tiene el manual de mínimas implicaciones ambientales en la obra			X	
Se afectan corredores de fauna nativa			X	
Se afecta el hábitat de fauna y flora propia de la región			X	
Se hace control de emisión de gases a equipos mecánicos utilizados en obra			X	
Se hace control a la posible quema de desechos de materiales provenientes de la obra			X	
Se hace control en vaciados de concreto (esparcimiento de partículas de cemento)			X	
Se hace control de desechos tóxicos que puedan generar contaminación del aire			X	
Se hace control de desechos orgánicos que puedan producir CO2 por descomposición			X	
se requiere concesión de aguas para aprovechamiento en la obra			X	
Se alteran los valores escénicos de la unidad paisajística de la región			X	

OBSERVACIONES:

ANDRES OSORIO BERMUDEZ
Supervisor contrato

CONSORCIO VIAL 2023

INFORME DE INTERVENTORÍA No. 09

CONTRATO N° 1470 de 2023



SEPTIEMBRE 15 OCTUBRE 14 DE 2024

Dirección: CARRERA 4 No. 9-25 OF: 504 CENTRO EDIFICIO DIEGO DE OSPINA
Correo Electrónico: consorciovial2023caldas@gmail.com
Neiva – Huila

CONTENIDO

pág.

INTRODUCCIÓN 7
CAPÍTULO 1. COMPONENTE TÉCNICO 8
1.1 Objetivos 8
1.1.1 Objetivo principal 8
1.1.2 Objetivos específicos 8
1.2 Descripción del proyecto 8
1.2.1 Localización del proyecto 9
1.2.2 Estado inicial de la vía 11
1.2.3 Localización fuentes de materiales 11
1.2.4 Características técnicas del proyecto 11
1.3 Información contrato de obra 11
1.4 Descripción resumida de las actividades ejecutadas en el mes. 12
1.4.1 Actividades de construcción semanales. 13
1.4.2 Actividades de control de calidad 14
1.5 Información financiera del contratista 14
1.5.1 Avance financiero contrato de obra 14
1.5.2 Estado de avance de inversión 15
1.5.3 Estado actual del contrato de obra 17
1.6 Inconvenientes 17
1.7 Estado general del tiempo 17
1.8 Comités técnicos de obra 18
1.9 Informes semanales de Interventoría 19
1.10 Información del contrato de interventoría 19
1.10 ORDENADOR DEL GASTO: 19
1.11 SUPERVISIÓN: Jorge Hernán Neira Díaz. 20
1.13 Descripción de las actividades realizadas por la Interventoría 20
1.14 Actividades topográficas 21
1.14.2 ARMA 21

1.14.3 La Pintada 23
1.14.4 METODOLOGÍA EMPLEADA EN EL TRABAJO 24
1.14.5 Acceso al Área de Estudio 24
1.14.6 Comisiones de Campo 25
1.14.7 Equipos Utilizados 25
1.14.8 Actividades realizadas 26
1.14.9. Anexo fotográfico 1 27
1.15 Información financiera de la interventoría 37
1.15.1 Avance financiero contrato de interventoría 37
1.16 Libro de obra 39
1.17 Registro fotográfico Componente Técnico. 39
CAPÍTULO 2. COMPONENTE AMBIENTAL 42
2.1. 43
2.2 Seguimiento y evaluación ambiental 44
2.2.1 Actividades ejecutadas interventoría periodo comprendido entre el 15 de Septiembre de 2024 al 14 de Octubre de 2024. 44
2.3 SEGUIMIENTO E IMPLEMENTACIÓN DEL PAGA 45
2.3.1 Personal que conforma la función encargada del cumplimiento paga.... 46
2.4 Programa adaptación guías ambientales 46
2.4.1 Programa de desarrollo y aplicación gestión ambiental 46
2.4.2 Conformación del grupo de gestión Socio-Ambiental 46
2.4.3 Capacitación al personal de Obra 47
2.5 Cumplimiento de requerimientos legales 47
2.6 Programa de actividades constructivas 48
2.6.1 Manejo Integral de Materiales de Construcción 48
2.6.2 Señalización de Frentes de Obra y sitios temporales 49
2.6.3 Manejo y disposición final de escombros, sobrantes de excavación y retiro de material sobrante. 49
2.6.4 Manejo y Disposición Final de residuos sólidos convencionales y especiales. 49
2.7 PROGRAMA GESTIÓN HÍDRICA 50
2.7.1 Manejo de Aguas Superficiales 50

2.7.2 Manejo de Residuos líquidos domésticos e industriales..... 50
2.8 Programa biodiversidad y servicios ecosistémicos..... 51
2.8.1 Manejo del descapote y cobertura vegetal 51
2.8.2 Protección de Fauna..... 51
2.9 Manejo de instalaciones 51
2.10 Instalación, funcionamiento y desmantelamiento de campamentos y sitios de acopio temporal. 51
2.11 Manejo de Maquinaria, equipos y vehículos. 51
2.12 CONCLUSIONES 51
Capítulo 3. SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 52
3.1 Aspectos generales de seguridad y salud en el trabajo 52
3.2 Aspectos generales normatividad 52
3.3 Registro de control de afiliaciones 53
3.4 Liquidaciones 53
3.5 Certificados de aptitud laboral (exámenes de ingreso) 53
3.6 Exámenes médicos de retiro (ordenes entregadas) 54
3.7 Registro de ausentismo 55
3.8 Reporte de ausentismo, accidentes e incidentes laborales 55
3.9 Comité paritario de seguridad y salud en el trabajo (COPASST)..... 55
3.10. Registro del plan de auditoría de seguridad y salud en el trabajo..... 56
3.11. Permisos de trabajo 56
3.12. Elementos de protección personal 56
3.13. Condiciones de orden, aseo y limpieza. 57
3.14. Señalización y demarcación 57
3.15. Inspecciones de seguridad 58
3.16. Atención de emergencias..... 58
3.16.1 Kit de Emergencias 58
3.17. Conformación de brigadas 58
3.18. Reporte de capacitaciones y charlas 58
3.19. Reporte de inducciones 58
3.20. Identificación de peligros y riesgos químicos. 59

3.21. Condiciones de salud y saneamiento. 59
3.22. Sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo interventoría 59
3.23. Manual del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. 60
3.24. Política de seguridad y salud en el trabajo..... 60
3.24.1. Política integral HSEQ 60
3.24.2 Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial. 61
3.25 Afiliación y cobertura a la seguridad social y parafiscales. 61
3.26. Certificados de aptitud laboral..... 62
3.26.1 Exámenes médicos de ingreso (ordenes entregadas) 62
3.26.2 Exámenes médicos de retiro (ordenes entregadas) 62
3.27. Registro de ausentismo 62
3.28. Comité paritario de seguridad y salud en el trabajo (COPASST) o vigía de SST..... 63
La interventoría da cumplimiento con la resolución 2013 de 1986. 63
3.29. Reporte e investigaciones y acciones correctivas para accidentes e incidentes laborales. 63
3.30. Elementos de protección personal y dotación..... 64
3.30.1 Entrega de dotación: 64
3.31. Condiciones de orden, aseo y limpieza 64
3.33. Inspecciones de seguridad 64
3.34. Atención de emergencias..... 64
3.35. Reporte de capacitaciones..... 64
3.36. Realización de pausas activas..... 65
3.37. Reporte de inducciones 65
Capítulo 4. PROGRAMA DE GESTIÓN SOCIAL..... 65
4.1 Programas 65
4.1.1. Capacitación y concientización para el personal de obra 65
4.1.2. Atención a la comunidad..... 65
4.1.3. Información y divulgación..... 66
4.1.4. Manejo de cultura vial y participación comunitaria 69
4.1.5. Contratación mano de obra..... 72
4.1.5. Contratación mano de obra..... 72

4.1.6. Contratación mano de obra de Interventoría 73
5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 78
5.3 Componente SST 78
5.4 Programa de gestión social 78
5.5 Plan de Manejo de Transito 78

LISTA DE IMÁGENES

Imagen 1. Localización del Departamento de Caldas 10
Imagen 2. Ubicación de la vía La pintada puente bocas – Arma municipio Aguadas 10

LISTA DE TABLAS

Tabla 1. Inversión Semanal Reprogramada 15
Tabla 2. Costo directo total ejecutado. 16
Tabla 3. Registro del clima del 15 septiembre del 2024 al 14 de octubre del 2024 18
Tabla 4 Personal de Obra activo que conforma el PAGA. 46
Tabla 5. Relación de personal que ingresa en el periodo analizado. 53
Tabla 6. Relación de prácticas de exámenes. 55
Tabla 7. Relación de accidentes. 55
Tabla 8. Relación de entrega EPP Y DOTACIÓN 57
Tabla 9. Relación de ausentismo. 62
Tabla 10. Consolidado de manejo de infraestructura de predios y de servicios. ..69

INTRODUCCIÓN

El 29 de septiembre de 2019, se lleva a cabo la firma del contrato 1457 DE 2023, celebrado entre El Departamento de Caldas y Consorcio Agudas Vial VC, cuyo objeto es el "MEJORAMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DEL TRAMO VIAL LA PINTADA – ARMA- PUENTE BOCAS, EN EL MUNICIPIO DE AGUADAS".

A fin de realizar el adecuado seguimiento y control al contrato de obra anteriormente citado, se suscribe el contrato 1470 de 2023 cuyo objeto es la "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA RESULTANTE DEL PROCESO DE LICITACIÓN LP-SI-013-2022. EL CUAL TIENE POR OBJETO: MEJORAMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DEL TRAMO VIAL LA PINTADA – ARMA- PUENTE BOCAS, EN EL MUNICIPIO DE AGUADAS".

Mensualmente esta Interventoría presenta a la entidad contratante, el resumen de avance de obra y las actividades ejecutadas por el contratista en el proyecto con la descripción de los inconvenientes, pormenores y metas alcanzadas del periodo, a fin de mantener informada a la entidad coordinadora y contratante de todas las decisiones que se han venido tomando en los comités técnicos de obra durante el desarrollo del proyecto.

El presente informe corresponde a las actividades realizadas a partir del 14 septiembre al 15 de octubre de 2024.

CAPÍTULO 1. COMPONENTE TÉCNICO

1.1 Objetivos

1.1.1 Objetivo principal

Proporcionar una mejor infraestructura de pavimentación y generar buenas condiciones de transitabilidad, movilidad y conectividad de la red vial Departamental.

1.1.2 Objetivos específicos

- Mejorar la condición del pavimento de aquellas vías de mayor importancia en el orden departamental.
- Expandir la red vial del Departamento que se encuentra en buen estado, independientemente del tipo de pavimento y/o superficie que tenga.
- Mejorar la conectividad de la red bajo jurisdicción del Departamento de Caldas con la red vial primaria y otros medios de transporte presentes en su territorio.

1.2 Descripción del proyecto

Es así como el pasado 20 de junio de 2023, en concordancia con el artículo 31 de la ley 2056, referente al ciclo de proyectos de inversión del SGR, fueron priorizados y aprobados mediante decreto 0332 suscrito por el Gobernador del Departamento, el proyecto 2023003170006 MEJORAMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DEL TRAMO VIAL LA PINTADA - ARMA - PUENTE BOCAS, EN EL MUNICIPIO DE AGUADAS.

La totalidad de la red vial a cargo del departamento de Caldas corresponde a 1,761 km, de los cuales apenas el 35% se encuentra pavimentado y el 65% está en afirmado. Por otra parte, el 15% corresponde a vías de primer orden, el 33% a vías de segundo orden y el 52% a vías terciarias, lo que implica la mayor proporción para vías de este tipo en el departamento, con un déficit de pavimentación del 97%.

La Secretaría de Infraestructura tiene como misión la construcción y mantenimiento de la infraestructura física municipal necesaria para posibilitar el desarrollo integral y de las actividades económicas productivas, mediante el estudio, diseño, construcción, conservación e interventoría de obras civiles.

La red vial del Departamento se encuentra primordialmente construida en afirmado y predominan los tramos en condición regular o mala. La totalidad de la red vial recibe mantenimiento periódico y/o rutinario, aunque no toda la infraestructura vial ha sido sometida a intervenciones de rehabilitación, mejoramiento o reconstrucción.

La red vial departamental es susceptible a los procesos de inestabilidad de taludes en todo el Departamento.

Este proyecto se estructura en cumplimiento de una de las funciones de la Secretaria de Infraestructura, para formular, dirigir y gestionar ante los organismos nacionales o internacionales de carácter público o privado las acciones necesarias encaminadas al desarrollo de programas de beneficio para el Departamento en materia de infraestructura vial.

La Gobernación de Caldas, en cabeza de la Secretaría de Infraestructura, busca mejorar la vía 3302 Salamina -(Cruce Ruta 25) La Pintada (Sectores: Salamina - Pacora, Pacora - Aguadas, Aguadas - Arma- Puente Bocas (Lim Antioquia)), vía secundaria a cargo del departamento según resolución del Ministerio de Transporte número 0005134 de 2016, por la cual se expide la categorización de las vías que conforman el Sistema Nacional de Carreteras o Red Vial Nacional correspondientes al Departamento de Caldas.

El proyecto pretende beneficiar al municipio de Aguadas y sus alrededores, con el mejoramiento de 3 km de vía entre las abscisas K26+970 al K29+970. Este tramo de vía avanza a media ladera desde el sector de Arma (en la vía Aguadas – La Pintada) en el departamento de Caldas, hasta La Pintada departamento de Antioquia, sobre un terreno ondulado y montañoso con trazado sinuoso

La vía presenta actualmente dificultad en la intercomunicación terrestre en la vía que conduce de Arma (Aguadas Caldas) a La Pintada (Antioquia), debido al deterioro en la superficie de rodadura y al deficiente mantenimiento, lo que implica restricción en la movilidad peatonal y vehicular.

Esto ha generado que en la zona aumenten los tiempos de viaje y exista baja comercialización de productos en los municipios, lo que a su vez propicia un inoportuno acceso a servicios médicos, aumento en los costos de transporte de carga y de pasajeros, pérdida de cosechas e incremento en los precios de los alimentos

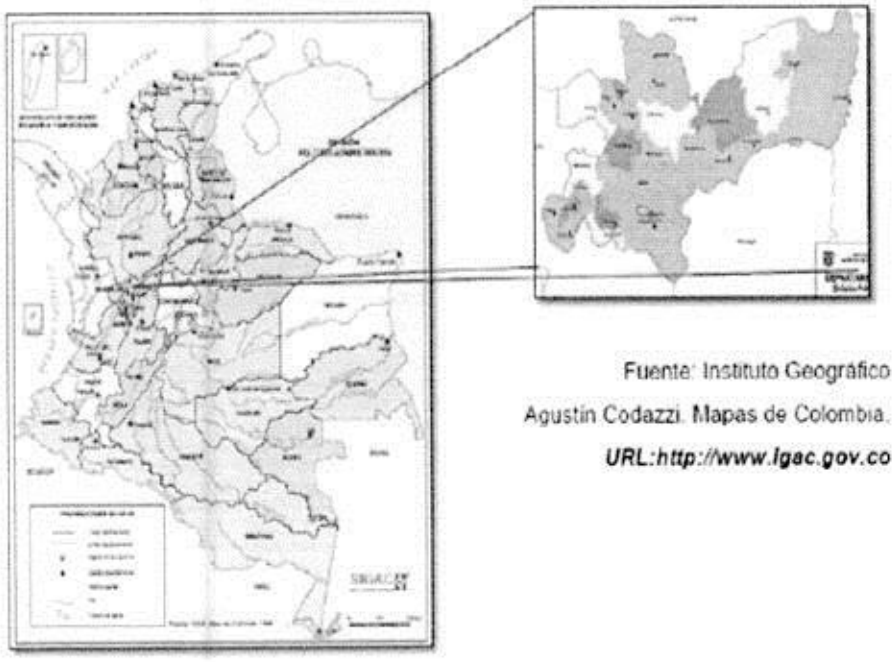
1.2.1 Localización del proyecto

El Departamento de Caldas está situado en el centro-occidente de la región Andina, localizado geográficamente entre los (05°46'51" y 04°48'20") latitud norte, (74°38'01" y 75°55'45") latitud oeste. Cuenta con una superficie de 7.956 km2.

Limita por el Norte con el departamento de Antioquia, por el Este con el departamento de Cundinamarca, por el Sur con los departamentos de Tolima y Risaralda, por el Oeste con el departamento de Risaralda.

La vía está ubicada en la zona norte del departamento de Caldas, en terrenos que pertenecen al municipio de Agudas, La vía que conduce de La Pintada – Arma –

Puente Bocas tiene una longitud de 41km, el proyecto busca intervenir 3 km entre las abscisas K26+970 a K29+970.



Fuente: Instituto Geográfico Agustín Codazzi. Mapas de Colombia. *URL:http://www.igac.gov.co*

Imagen 1. Localización del Departamento de Caldas

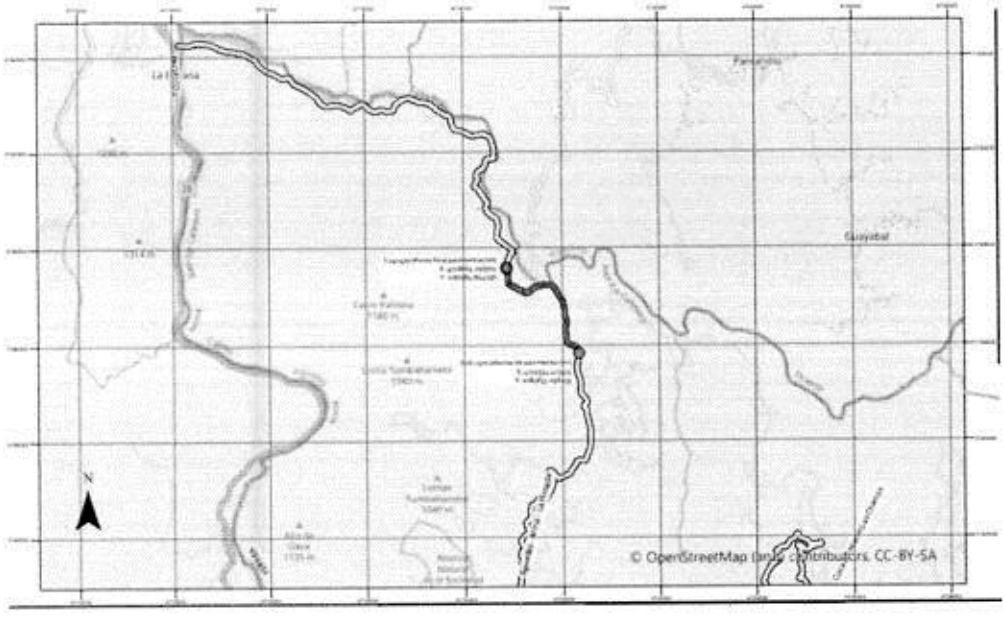


Imagen 2. Ubicación de la vía La pintada puente bocas – Arma municipio Aguadas

1.2.2 Estado inicial de la vía

Actualmente el tramo se encuentra con capa de rodadura constituida por materiales granulares en algunos tramos, en regular estado. La vía cuenta actualmente con una calzada de ancho variable y diversos tramos de cunetas erosionadas en toda su longitud.

Las problemáticas anteriores, generaban aumento de los tiempos de viaje y baja comercialización de productos en los municipios, lo que tiene como efecto el bajo desarrollo socioeconómico de la zona.

Así mismo, el aumento de tiempos de viaje afecta el acceso oportuno a servicios médicos, la asistencia de estudiantes a los centros de enseñanza y ocasiona el aumento de costos de transporte de carga y pasajeros.

1.2.3 Localización fuentes de materiales

La fuente de materiales utilizada para el desarrollo del contrato corresponde a la explotación de materiales pétreos del Rio Arma utilizables para, bases, concretos y filtros con título minero de explotación 5811 del 20 de mayo del 2008 y licencia ambiental para explotación de materiales Resolución N°160 CARES2004-1683 del 02 abril del 2020.

1.2.4 Características técnicas del proyecto

Perfil de la vía:

- ✓ Ancho plataforma 8 metros
- ✓ Ancho de calzada 6 metros
- ✓ Carriles de 3,00 metros
- ✓ Cuneta de 1 metro al costado derecho e izquierdo.

1.3 Información contrato de obra

Proceso

CONTRATO N.:	29092023-1457.
OBJETO:	"MEJORAMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DEL TRAMO VIAL LA PINTADA – ARMA- PUENTE BOCAS, EN EL MUNICIPIO DE AGUADAS".
CONTRATISTA:	Consorcio Aguadas Vial VC.
VALOR CONTRATO INICIAL:	$5.122.147.130,04

ADICIÓN N° 1:	$ 0,00
VALOR TOTAL CONTRATO:	$5.122.147.130,04
ANTICIPO:	1.024.429.426
PLAZO:	5 meses.
PRORROGA 1	2 meses
PRORROGA 2	2 meses
FECHA INICIO:	17 de octubre de 2023.
FECHA TERMINACIÓN:	15 de noviembre de 2024.

1.4 Descripción resumida de las actividades ejecutadas en el mes.

- Durante este periodo de tiempo se realizó las siguientes actividades:
- •Topografía: replanteo, demarcación del trazado de la vía y nivelación de esta, localización para las cuentas.
- •Estructuras en concreto:
- Corte y figuración de acero de refuerzo, enconfrada y fundición in situ de muro del muro # 3 para las secciones 3 al 6 ubicado en la abscisa k28+110.
- •Cunetas: Descapote, excavación, nivelación. Amarre acero de refuerzo y formaletiada y fundición in situ de cunetas con concreto de 3000 psi.
- Excavación mecánica para muro de contención 4 ubicado en la abscisa k28+530
- Estructura del pavimento:
- Instalación de base granular estabilizada con emulsión asfáltica entre las abscisas k27+430 al k28+430
- Construcción de filtros costado izquierdo la vía
- Implementación del componente PMT en obra.
- Divulgación radial del reinicio de la ejecución del proyecto.

1.4.1 Actividades de construcción semanales.

La interventoría evidenció las siguientes actividades realizadas en el período comprendido entre el 15 de septiembre del 2024 al 14 de octubre del 2024.

Actividades Semana 35 (15 de septiembre al 21 de septiembre de 2024)

- Excavación manual y amarre de acero refuerzos para cunetas
- Limpieza acero de refuerzo en obra
- Instalación de formaleta para muro contención 3 ubicado k28+110
- Continua la fundición de muro de contención 3 ubicado k28+110
- Recepción en obra de maquinaria amarilla.
- Continua excavación mecánica para muro de contención 3 ubicado k28+110

Actividades Semana 36 (22 de septiembre al 29 de septiembre 2024).

- Excavación manual y amarre de acero refuerzos para cunetas
- Instalación de formaleta metálica y fundición en concreto de poceta para recamara de caída ubicado k28+110
- Fundición in situ con concreto de 3000 psi para cunetas en ambos costados de la via
- Continua Excavación mecánica para muro de contención 3 ubicado k28+110.

Actividades Semana 37 (30 de septiembre al 06 de octubre de 2024).

- Excavación manual y amarre de acero refuerzos para cunetas
- Instalación de formaleta metálica y fundición en concreto de poceta para recamara de caída ubicado k28+110
- Fundición in situ con concreto de 3000 psi para cunetas en ambos costados de la via
- Continua Excavación mecánica para muro de contención 3 ubicado k28+110.

Actividades Semana 38 (07 de octubre al 14 de octubre de 2024).

- Escarificación de vía para aplicación de base estabilizada con emulsión asfáltica desde en las abscisas K27+340 - K27+500 y K28+440.
- Instalación de base estabilizada desde el K27+300 - K27+530
- Fundición in situ de tercera sección de muro de contención, instalación de acero de refuerzo para zapata, dentellón y muro de la cuarta sección.
- Excavación con maquinaria para zapatas para la quinta sección del muro de contención.

- Excavación manual para cunetas la vía en las abscisas K27+121.5 - K27+170.
- Instalación de formaletas para cunetas en ambos costados hasta el K27+150.
- Fundición de cunetas en concreto de 3000 PSI K27+092.5 - K27+135 en ambos costados de la vía.
- Construcción de bordillo margen derecho de la vía entre las abscisas K27+130 - K27+154.
- Construcción de filtro para el costado izquierdo de la vía K28+455.
- Acopio de base granular sobre la vía en las abscisas K27+780 - K27+850
- Construcción de filtro para muro de contención K28+122 - K28+134

1.4.2 Actividades de control de calidad

Acompañamiento topográfico y control de excavación mecánica para construcción de filtro en el costado izquierdo de la vía y ampliación de vía con excavación en roca como seguimiento topográfico en la conformación de la calzada existente mediante la excavación mecánica, nivelación y compactación de la subrasante existente como soporte de la estructura de pavimento, control de calidad en la fundida de secciones de 6 metros en el muro de contención ubicado en la abscisa k28+110. Seguimiento y cumplimiento del diseño de la capa de base estabilizada instalada en obra, verificación de actividades programadas por el contratista.

1.5 Información financiera del contratista

1.5.1 Avance financiero contrato de obra

El contratista de obra a fecha del presente informe ha cobrado las siguientes actas parciales de avance de obra:

Acta parcial No. 1 valor cobrado: $ 280.249.743,00

Acta parcial No. 2 valor cobrado: $ 600.087.439,00

Acta parcial No. 3 valor cobrado: $ 275.328.631,00

Acta parcial No. 4 valor cobrado: $ 799.093.417,00

1.5.2 Estado de avance de inversión

De acuerdo con el ajuste a la programación de inversión de acuerdo al acta de reinicio No. 1 y Prorroga No. 2, al finalizar la semana 40, Tabla 1 (programado), se observa un acumulado de $1.850.888.403,47correspondiente al 36,14%, y la Tabla (ejecutado) el acumulado es de $ 1.934.719.229,00 que corresponde al 37,77 % lo que indica una diferencia del + 1,63%.

PROGRAMA DE INVERSIÓN SEMANAL	SEMANA 37	SEMANA 38	SEMANA 39	SEMANA 40
COSTO DIRECTO E INDIRECTO SEMANAL	**$ 76.693.350,67**	**$ 138.715.381,91**	**$ 138.715.381,91**	**$ 319.709.021,54**
Porcentaje Semanal	1,50%	2,71%	2,71%	6,24%
COSTO DIRECTO E INDIRECTO SEMANAL ACUMULADO	**$1.253.748.618,11**	**$1.392.464.000,02**	**$1.531.179.381,93**	**$1.850.888.403,47**
Porcentaje Semanal Acumulado	24,48%	27,19%	29,89%	36,14%

Tabla 1. Inversión Semanal Reprogramada

ITEM	DESCRIPCIÓN	UN	CANTIDAD TOTAL DE OBRA PROYECTADA	CANTIDAD DE OBRA ACUMULADA HASTA LA SEMANA ANTERIOR	CANTIDAD DE OBRA EJECUTADA EN LA PRESENTE SEMANA	CANTIDAD TOTAL DE OBRA EJECUTADA A LA FECHA
	Capitulo 1. Actividades preliminares					
	EXCAVACIÓN SIN CLASIFICAR DE LA EXPLANACIÓN Y CANALES	m3	2.544,00	2.345,65	0,00	2345,65
	EXCAVACIÓN EN ROCA DE LA EXPLANACIÓN Y CANALES	m3	1.755,00	288,52	0,00	288,52
	Terraplenes	m3	2.882,00	-	0,00	0,00
	Capitulo 2. Estructura de pavimento					
	SUB-BASE GRANULAR CLASE B SBG-50	m3	3.205,00	-	0,00	0,00
	BASE GRANULAR CLASE B GRADACIÓN GRUESA	m3	2.990,00	-	0,00	0,00
	RIEGO DE IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRL-1	m2	18.150,00	-	0,00	0,00
	MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MDC-19 - COMPRA DE MEZCLA	m3	955,00	-	0,00	0,00
	Capitulo 3. Estructuras de drenaje					
	EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR	m3	5.722,00	2.233,23	0,00	2233,23
	RELLENO PARA ESTRUCTURAS CON SUELO	m3	404,00	603,01	0,00	603,01
	CONCRETO RESISTENCIA 28MPa (C) - COMPRA DE MEZCLA	m3	134,00	59,30	0,00	59,30
	CONCRETO RESISTENCIA 21MPa (D) - COMPRA DE MEZCLA	m3	188,00	31,08	0,00	31,08
	CONCRETO RESISTENCIA 14MPa (F)	m3	6,00	13,62	0,00	13,62
	CUNETA DE CONCRETO VACIADA IN SITU. NO INCLUYE LA CONFORMACION DE LA SUPERFICIE DE APOYO	m3	454,00	-		0,00
	ACERO DE REFUERZO Fy 4200 MPa	kg	31.535,00	5.789,00	0,00	5789,00
	MATERIAL DE COBERTURA TIPO SUB- BASE CLASE C SBG-50	m3	947,00	-	0,00	0,00
	TUBERÍA DE PLASTICO TIPO PVC NORMA NTC-5055 DE DIAMETRO 900 mm	ml	145,00	105,60	0,00	105,60
	TUBERÍA DE PVC 4"	ml	3.126,00	1.733,00	0,00	1733,00
	GEOTEXTIL TIPO NO TEJIDO CON RESISTENCIA A LA TENSIÓN GRAB MÍNIMA DE 700 N APROXIMADAMEI	m2	14.866,00	6.780,40	0,00	6780,40
	MATERIAL GRANULAR DRENANTE	m3	3.539,00	1.664,28	0,00	1664,28
	JUNTA DE CONSTRUCCIÓN	ml	117,00	-	0,00	0,00
	DISIPADORES DE ENERGIA Y SEDIMENTADORES DE CONCRETO CICLOPEO	m3	157,00	-	0,00	0,00
	Capitulo 4. Obras de Estabilización					
	EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR	m3	561,00	364,95	0,00	364,95
	RELLENO PARA ESTRUCTURAS CON SUELO	m3	402,00	12,76		12,76
	CONCRETO RESISTENCIA 28MPa (C) - COMPRA DE MEZCLA	m3	204,00	42,76	0,00	42,76
	ACERO DE REFUERZO Fy 4200 MPa	kg	15.901,00	3.060,60	0,00	3060,60
	MATERIAL GRANULAR DRENANTE	m3	68,00	1,65		1,65
	TUBERÍA DE PVC 4"	ml	125,00	11,20		11,20
	JUNTA DE CONSTRUCCIÓN	ml	54,00	-		0,00
	GEOTEXTIL TIPO NO TEJIDO CON RESISTENCIA A LA TENSIÓN GRAB MÍNIMA DE 700 N APROXIMADAMENTE	m2	562,00	14,30		14,30
	CONCRETO RESISTENCIA 14MPa (F)	m3	14,00	2,92	0,00	2,92
	TUBERÍA DE PVC 2"	m	51,00	-	0,00	-
	Capitulo 5. Señalización y Demarcación vial					-
	LÍNEA DE DEMARCACIÓN CON PINTURA EN FRÍO	ml	9.000,00	-	0,00	0,00
	TACHA REFLECTIVA - ADHESIVO EPÓXICO	un	1.125,00	-	0,00	0,00
	SEÑAL VERTICAL DE TRANSITO TIPO SR, SP Y/O SI, TABLERO EN LÁMINA CON LAMINA RETRORREFLECTIVA TIPO IV (75X75 cm)	un	65,00	-	0,00	0,00
	Capitulo 6. Transportes					
	TRANSPORTE DE MATERIALES PROVENIENTES DE LA EXCAVACIÓN DE LA EXPLANACIÓN, CANALES Y PRÉSTAMOS PARA DISTANCIAS MAYORES DE MIL METROS (1.000 m) MEDIDOS A PARTIR DE CIEN METROS (100 m)	m3/km	42.986,00	16.496,66	0,00	16.496,66
	ITEMS NUEVOS					
	DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS EN CONCRETO	M3				
	CONSTRUCCIÓN BORDILLOS EN CCTO	ML				
	REMOSIÓN DE CERCAS	ML				
	CERCA DE ALAMBRE CON POSTES DE MADERA	ML				
	CONFORMACIÓN DE LA CALZADA EXISTENTE	M2		4800	0	4800
	BASE ESTABILIZADA CON EMULSIÓN ASFÁLTICA TIPO BEE-38	M3		340	0	340

Tabla 2. Costo directo total ejecutado.

1.5.3 Estado actual del contrato de obra

Valor ejecutado a la fecha es de: **$ 1.934.719.229,00**

Plazo ejecutado es de 10 meses equivale al 37,77 % del total.

1.6 Inconvenientes

Durante este periodo de tiempo se presentaron fuertes lluvias las cuales afectaron el normal avance de las obras.

1.7 Estado general del tiempo

Para el período entre el 15 septiembre del 2024 al 14 de octubre del 2024.

FECHA	CLIMA	CONDICIÓN CLIMÁTICA	INICIO	FIN	PRECIPITACIÓN (mm).	OBSERVACIONES
15 de septiembre del 2024	lluvias	Templado	8:00:00 a. m.	1:00:00 p. m.		lluvias
16 de septiembre del 2024	lluvias	Templado	9:10:00 a. m.	11:10:00 a. m.		lluvias
17 de septiembre del 2024	soleado	Templado	7:00:00 a. m.	5:00:00 p. m.		soleado
18 de septiembre del 2024	lluvias	Templado	7:40:00 a. m.	9:00:00 a. m.		lluvias
19 de septiembre del 2024	lluvias	Templado	6:00:00 a. m.	11:00:00 a. m.		lluvias
20 de septiembre del 2024	soleado	Templado	7:00:00 a. m.	5:00:00 p. m.		soleado
21 de septiembre del 2024	soleado	Templado	7:00:00 a. m.	5:00:00 p. m.		soleado
22 de septiembre del 2024	lluvias	Templado	11:00:00 a. m.	2:30:00 p. m.		lluvias
23 de septiembre del 2024	lluvias	Templado	5:10:00 a. m.	9:40:00 a. m.		lluvias
24 de septiembre del 2024	soleado	Templado	7:00:00 a. m.	5:00:00 p. m.		soleado
25 de septiembre del 2024	lluvias	Templado	10:40:00 a. m.	11:50:00 a. m.		lluvias
26 de septiembre del 2024	soleado	Templado	7:00:00 a. m.	5:00:00 p. m.		soleado
27 de septiembre del 2024	soleado	Templado	7:00:00 a. m.	5:00:00 p. m.		soleado
28 de septiembre del 2024	lluvias	Templado	7:50:00 a. m.	1:00:00 p. m.		lluvias
29 de septiembre del 2024	lluvias	Templado	7:10:00 a. m.	10:40:00 a. m.		lluvias
30 de septiembre del 2024	soleado	Templado	7:00:00 a. m.	5:00:00 p. m.		soleado
1 de octubre del 2024	lluvias	Templado	11:20:00 a. m.	12:50:00 p. m.		lluvias
2 de octubre del 2024	soleado	Templado	7:00:00 a. m.	5:00:00 p. m.		soleado
3 de octubre del 2024	lluvias	Templado	5:00:00 a. m.	1:00:00 p. m.		lluvias
4 de octubre del 2024	lluvias	Templado	8:50:00 a. m.	11:00:00 a. m.		lluvias
5 de octubre del 2024	lluvias	Templado	7:00:00 a. m.	8:30:00 a.m		lluvias
6 de octubre del 2024	lluvias	Templado	7:10:00 a. m.	10:40:00 a. m.		lluvias
7 de octubre del 2024	soleado	Templado	7:00:00 a. m.	5:00:00 p. m.		soleado

8 de octubre del 2024	lluvias	Templado	11:20:00 a. m.	12:50:00 p. m.		lluvias
9 de octubre del 2024	soleado	Templado	7:00:00 a. m.	5:00:00 p. m.		soleado
10 de octubre del 2024	lluvias	Templado	5:00:00 a. m.	1:00:00 p. m.		lluvias
11 de octubre del 2024	lluvias	Templado	8:50:00 a. m.	11:00:00 a. m.		lluvias
12 de octubre del 2024	lluvias	Templado	8:00:00 a. m.	9:40:00 a. m.		lluvias

Tabla 3. Registro del clima del 15 septiembre del 2024 al 14 de octubre del 2024

1.8 Comités técnicos de obra

Durante el periodo se realizaron los comités de obra 32. Se anexan las respectivas actas.

Comité de obra N°29
Fecha: 19/09/2024
Lugar: Comité técnico de seguimiento – Centro poblado arma del municipio de agudas Caldas.
Asistentes: Supervisores Gobernación de Caldas, Representante Legal y Personal Técnico Contratista de Obra, Personal Técnico Interventoría.
Temas tratados: Aspectos Técnicos de la Obra, Aspectos Administrativos.

Comité de obra N°30
Fecha: 26/09/2024
Lugar: Comité técnico de seguimiento – Centro poblado arma del municipio de agudas Caldas.
Asistentes: Supervisores Gobernación de Caldas, Representante Legal y Personal Técnico Contratista de Obra, Representante Legal y Personal Técnico Interventoría.
Temas tratados: Aspectos Técnicos de la Obra, Aspectos Administrativos.

Comité de obra N°31
Fecha: 03/10/2024
Lugar: Comité técnico de seguimiento – Forma virtual.
Asistentes: Supervisores Gobernación de Caldas, Representante Legal y Personal Técnico Contratista de Obra, Representante Legal y Personal Técnico Interventoría.
Temas tratados: Aspectos Técnicos de la Obra, Aspectos Administrativos.

Comité de obra N°32
Fecha: 10/10/2024
Lugar: Comité técnico de seguimiento – Forma virtual.
Asistentes: Supervisores Gobernación de Caldas, Representante Legal y Personal Técnico Contratista de Obra, Representante Legal y Personal Técnico Interventoría.
Temas tratados: Aspectos Técnicos de la Obra, Aspectos Administrativos.

1.9 Informes semanales de Interventoría

Para este período la interventoría presentó semanalmente a la secretaria de infraestructura del departamento de caldas, vía correo electrónico los informes semanales N°, 29,30,31,32.

1.10 Información del contrato de interventoría

PROCESO

CONTRATO N.°:	03102023-1470.
OBJETO:	"interventoría técnica, administrativa, financiera y ambiental al contrato de obra resultante del proceso de licitación lp-si-013-2022. el cual tiene por objeto: mejoramiento y pavimentación del tramo vial la pintada – arma- puente bocas, en el municipio de aguadas".
CONTRATISTA:	Consorcio Vial 2023.
VALOR CONTRATO INICIAL:	$ 391.157.475,55
ADICIÓN N°1:	$146.595.104
ADICIÓN N°2:	$146.595.104
VALOR TOTAL CONTRATO:	$ 684.347.685
ANTICIPO:	$0.00
PLAZO:	6 meses.
PRORROGA 1	2 meses.
PRORROGA 2	2 meses.
FECHA INICIO:	17 de octubre de 2023.
FECHA TERMINACIÓN:	15 de Noviembre de 2024.

1.10 ORDENADOR DEL GASTO:

SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA: Jorge Ricardo Gutiérrez Cardona.

1.11 SUPERVISIÓN: Jorge Hernán Neira Díaz.

1.12 CONSTANCIA SECOP

NÚMERO DE CONSTANCIA SECOP: CO1.PCCNTR.5373140

1.13 Descripción de las actividades realizadas por la Interventoría.

La Interventoría con su equipo de trabajo, localizado en el centro poblado arma del municipio de aguadas caldas, realizó de manera permanente durante el mes de septiembre de 2024 y octubre de 2024 las actividades de inspección, control propio y revisión de los controles del contratista, verificación y evaluación para la buena realización de las distintas obras que adelanta el consorcio constructor y organizó el acompañamiento correspondiente, llevando los registros requeridos.

Igualmente, con práctica continúa y permanente se realiza la evaluación previa al reinicio de las obras, revisando los controles establecidos para el recibo de estas y solicitando cuando fuese necesario se subsane fallas presentadas durante la ejecución del contrato.

Para el período comprendido entre el día 15 de agosto del 2024 al 14 de mayo del 2024, se han realizado las siguientes actividades:

- Supervisión técnica en los diferentes frentes de trabajo.
- Recepción de documentación.
- Realización de informes semanales y mensual.
- Control de calidad en la construcción de alcantarillas en concreto reforzado.
- Registro y archivo fotográfico.
- Asistencia a los comités de obra realizados en el centro poblado arma del municipio de agudas caldas.
- Revisión en la implementación de los componentes PMT y PAGA entregados por el contratista de obra.
- Seguimiento y cumplimiento al ajuste a la programación de obra aprobada por la interventoría.

1.14 Actividades topográficas

El Consorcio Vial 2023 en cumplimiento de sus obligaciones presenta informe mensual de las actividades topográficas ejecutadas durante el periodo del 15 de septiembre del 2024 al 14 de octubre del 2024.

1.14.1 Objetivo.

Realizar los procedimientos topográficos correctos para la verificación de las actividades topográficas realizadas por parte del contratista para "MEJORAMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DEL TRAMO VIAL LA PINTADA - ARMA PUENTE BOCAS, EN EL MUNICIPIO DE AGUADAS, garantizando que se cumplan los parámetros socio ambientales establecidos y los diseños al igual que la precisión de estos.

El objetivo del Estudio Topográfico es proporcionar información básica y necesaria basada en informes recopilados y evaluados, en data topográfica tomada en campo y procesada en gabinete de la topografía, cartografía, elementos estructurales, y demás de la zona materia del estudio.

El objetivo de un levantamiento topográfico es la determinación, tanto en planimetría como en altimetría, de puntos del terreno necesarios para la representación fidedigna de un determinado sector del terreno a fin de:

- Elaborar planos topográficos a escalas adecuadas.
- Proporcionar información de base para los estudios y diseño de obras de ingeniería.
- Elaborar planos de los elementos estructurales replanteados en campo.

1.14.2 ARMA

El proyecto se encuentra localizado en la zona rural "AGUADAS CALDAS "en la vía terciaria que comunica al municipio de la pintada con el municipio de aguadas pasando por el corregimiento de Arma y su área de estudio tiene una topografía ondulada y llana suave.

- Ubicación Política:

Departamento:	CALDAS
Capital:	MANIZALES
Municipio:	AGUADAS

Centro poblado: ARMA

- Ubicación Geográfica: En coordenadas LONGITUT-LATITUD

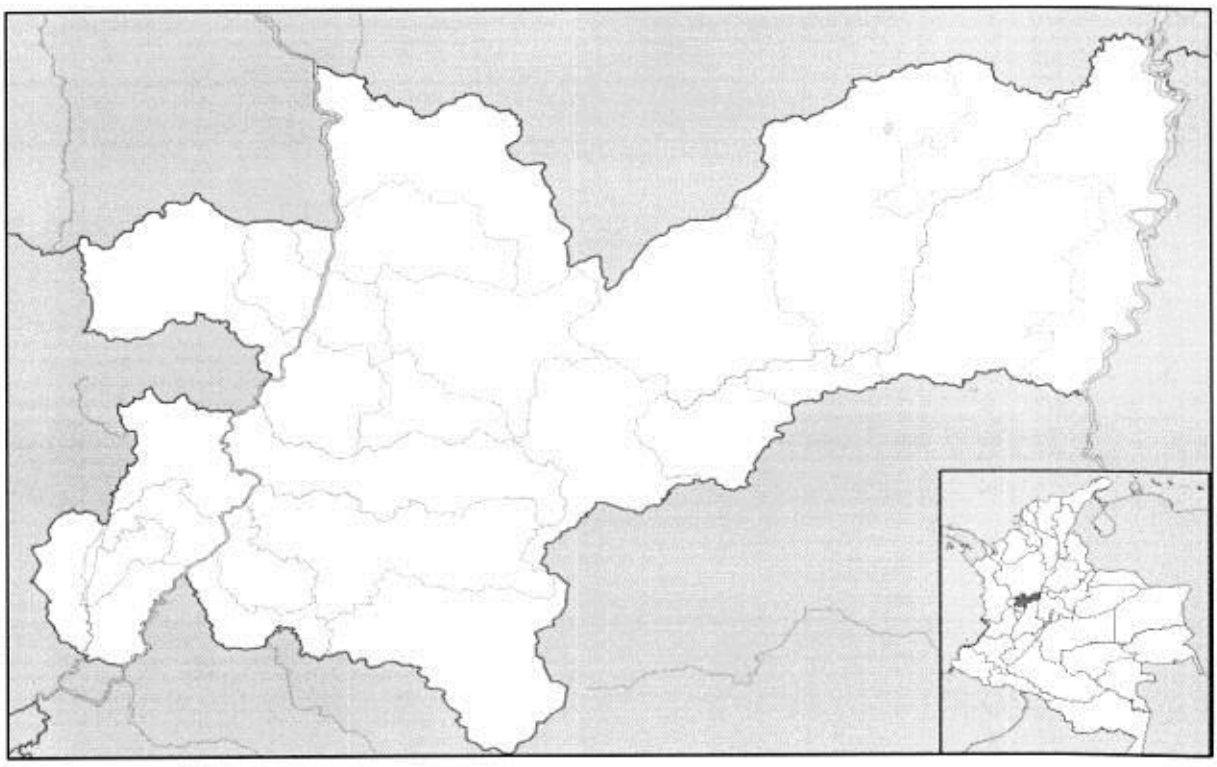
5.61436944 N -75.53955 O

Clima: 25ª C

Santiago de Arma, conocido también como Arma Viejo, es un corregimiento localizado en el municipio de Aguadas, localizado al norte del departamento de Caldas. Limita al norte y oriente con la vereda Tierra Fría, al sur con la vereda Salineros y al occidente con la cabecera municipal de Aguadas. Este corregimiento caldense fue fundado el 25 de julio de 1542 por el teniente Miguel Muñoz.Según Wikipedia El municipio de Albania se encuentra localizado geográficamente a 5° 46' 00" latitud norte y 73° 56' 00" longitud al oeste de Greenwich; entre las coordenadas planas: X= 1.141.000 m.N a la X = 1.124.000 m. N Y= 1.013.000 m.E a la Y = 1.038.000 m.E.

El corregimiento de Arma posee alrededor de 5.000 habitantes, de los cuales 800 habitan en la cabecera corregimental o centro poblado, distribuidos en unas 100 casas. Los residentes se dedican en su mayoría al cultivo de café, flores y cítricos. Arma recibió su nombre debido a los antiguos indios armados que habitaron la región y al Tesoro Pipintá.

Cuenta con una población de 5000 habitantes de acuerdo con proyección del DANE.



1.14.3 La Pintada

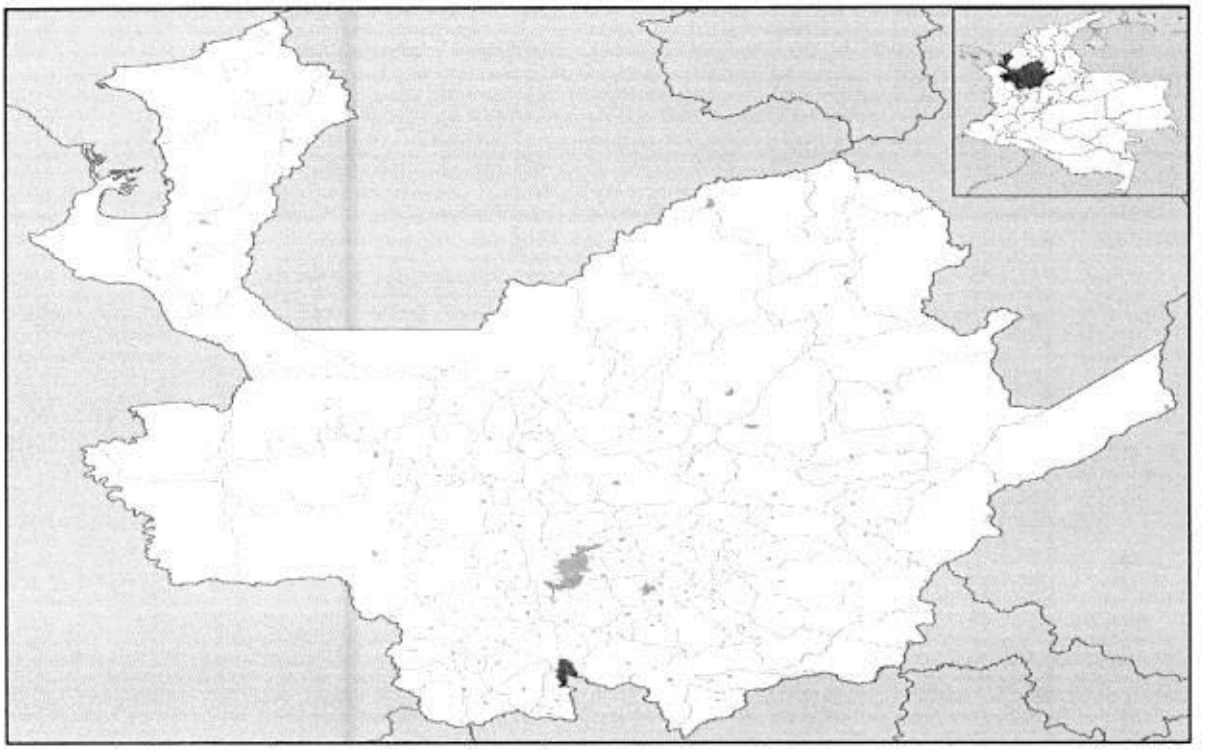
La Pintada es un municipio de la República de Colombia, situado en la subregión Suroeste del departamento de Antioquia. Limita al norte con los municipios de Fredonia y Santa Bárbara, por el oriente limita también con el municipio de Santa Bárbara; por el sur a su vez con el municipio de Valparaíso y con Aguadas (Caldas); y por el occidente con los municipios de Valparaíso, Fredonia y Támesis. El territorio del municipio es atravesado por el río Cauca.

Tiene una extensión de 55 kilómetros cuadrados, superficie que resultó de la fusión, según dictamen del gobierno en su tiempo, de dos áreas diferentes que pertenecían respectivamente a los municipios de Santa Bárbara y Valparaíso. Entre los apelativos que la población tiene están "*Emporio Turístico de Antioquia*", "*La Mejor Esquina de Antioquia*", "*La Puerta de Antioquia*"

Según la información del DANE

Población Total: 8 114 hab. (2018)

- Población Urbana: 7 060
- Población Rural: 1 054



1.14.4 METODOLOGÍA EMPLEADA EN EL TRABAJO

El trabajo topográfico está compuesto por dos etapas fundamentales, la primera de ellas es el trabajo de campo, donde la comisión topográfica se dirige a la obra para el "MEJORAMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DEL TRAMO VIAL LA PINTADA - ARMA PUENTE BOCAS, EN EL MUNICIPIO DE AGUADAS, en donde con ayuda del nivel automático marca GEOMAX modelo ZAL-132 y la estación total TOPCON marca topcon modelo TKS-302R, se recopila toda la información necesaria para posteriormente realizar el trabajo de oficina.

1.14.5 Acceso al Área de Estudio

El acceso a área de estudio se realiza vía terrestre, Utilizando LA VIA PRINCIPAL que de la pintada conduce al municipio de aguadas y corregimientos del norte de caldas con una duración de 30 a 45 minutos, parte del tramo de acceso es destapado y otra parte se encuentra asfaltado en buenas condiciones. El área de estudio se encuentra antes del corregimiento de Arma.

La visita topográfica corresponde a los días 24 de septiembre al 05 de octubre del 2024.

El trabajo de oficina se realiza en los días 07 de octubre de 2024

1.14.6 Comisiones de Campo

Los trabajos de campo fueron ejecutados por una comisión de topografía, integrada por un topógrafo y un cadenero o auxiliar de campo. En la Tabla No. 1, se relaciona el personal principal que conformó la comisión de topografía.

Tabla 1 Comisión de Topografía

NOMBRE	CARGO
Wilfredo Jiménez	topógrafo director
Aldrúbal Mejía Artunduaga	Topógrafo de campo
Brahyan Tangarife	Cadenero primero
Wilfredo Jiménez	dibujante.

El topógrafo director de la realización de los levantamientos topográficos, está debidamente matriculado y registrado en el Concejo Profesional Nacional de Topografía, mediante matrícula No. 01-15632. Copia de la Licencia se incluye como Anexo 3 de este Informe.

El topógrafo de campo y el cadenero primero de la realización de los levantamientos topográficos cuenta con la seguridad correspondiente como lo indica la ley 1562 de 2012 de seguridad y salud en el trabajo, Anexo 4 planilla de seguridad.

1.14.7 Equipos Utilizados

En la ejecución de las nivelaciones topográficas se utilizaron los equipos relacionados en la Tabla No. 2, estos equipos cuentan con sus debidos certificados de calibración. Los cuales son incluidos en el Anexo No 5.

Tabla 2 Equipos de Topografía

NOMBRE	MARCA	MODELO	No. SERIE
NIVEL AUTOMATICO	GEOMAX	ZAL-132	303532
ESTACION TOTAL	TOPCON	TKS-302R	8E2194

Además de los equipos antes mencionados se utilizó igualmente el equipo convencional complementario.

1.14.8 Actividades realizadas

- 24/09/2024 realización de empalme.
- 25/09 localización de alcantarilla en la accisa e instalación y nivelación de tubería.
- 27/09/2024 se hizo un recorrido vial revisando abscisado de las alcantarillas del K26+670 Al K29+90.Tambien se contrató nivelación del K27+500 Al K28+000.
- 28/09/2024 Tramo vial la pintada Arma se hizo nivelación y contra nivelación para cambios y BM también se pusieron niveles para conectas Margen derecha del K26+970 al K27+040.
- 30/09/2024 TRAMO VIAL LA PINTADA ARMA se hizo nivelación para cuneta margen derecha del K27+040 AL K27+100 se comenzó hacer estacas para nivelación de base granular.
- 01/09/2024 TRAMO VIAL LA PINTADA ARMA se realizó control de sobre ancho de la vía para cuneta del K27+370 al K27+450 se controló derrumbe del K27+665 al K27+680 también se hicieron estacas para la instalación de base granular.
- 02/10/2024 TRAMO VIAL LA PINTADA ARMA se hizo nivelación de sub base también se colocaron tacos para nivelación de base granular del

K27+370 al K27+ 470 también se realizó sobre ancho de vía y cuneta del K27+470 al K27+660 se colocaron nivelación para cuneta del K27+040 al K27+ 100 margen derecha.

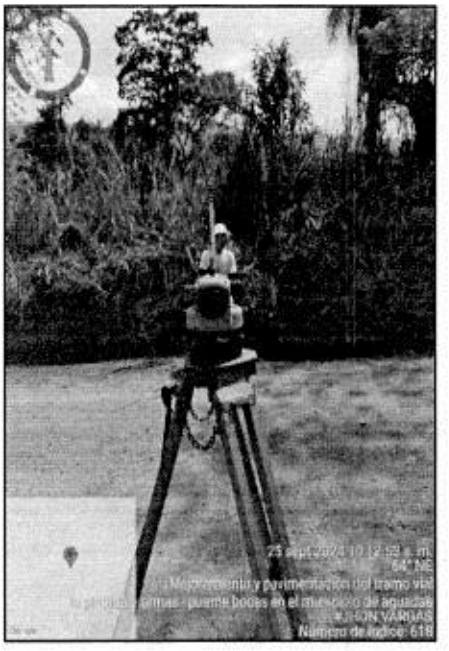
- 03/10/2024 TRAMO VIAL LA PINTADA ARMA sé hizo nivelación de la sub base verificación de ancho de vía se colocaron tacos para nivelación de base granular del K27+470 al K27+570 se colocaron niveles para cuneta del K27+100 al K27+130.
- 04/10/2024 TRAMO VIAL LA PINTADA ARMA se hizo nivelación de la sub base se instalaron tacos para nivelación de base granular del K27+570.
- Al K27+670 también se nivelo box culver para sacar cota de en Cole y descole en el K27+980.
- 05/10/2024 TRAMO VIAL LA PINTADA ARMA se hizo nivelación de sub-base también instalación de tacos para nivelación de base granular del K27+670 al K27+800.

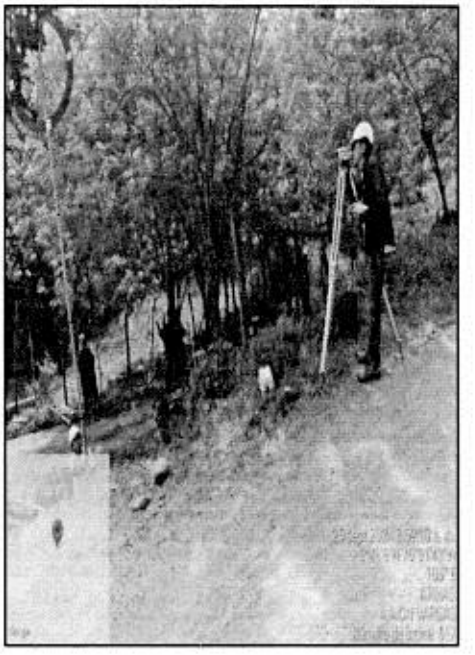
Se toma registro fotográfico de las partes donde se ha venido realizando la nivelación y las actividades ejecutadas.

Cabe resaltar que en las actividades antes mencionadas se contó con el acompañamiento de la Ingeniera Residente del Contratista.

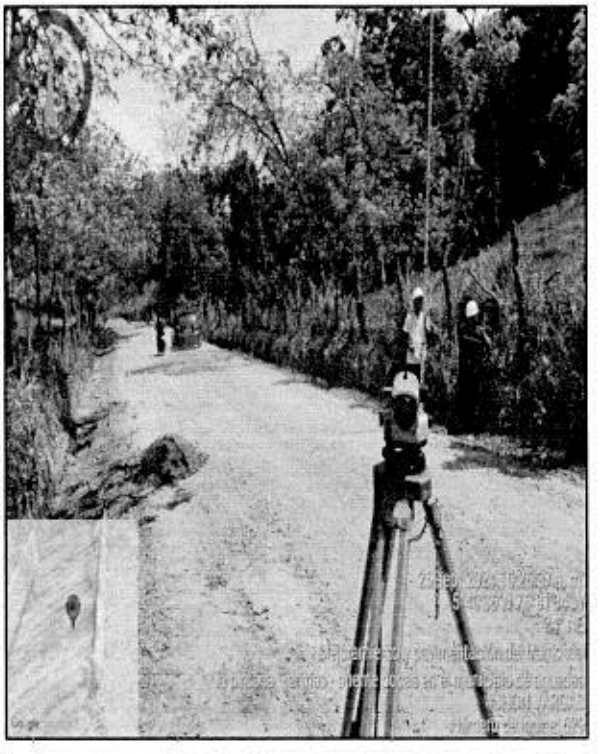
Se realizó acompañamiento para cumplir estas expectativas, carteras topográficas, informe y registro fotográfico.

1.14.9. Anexo fotográfico 1

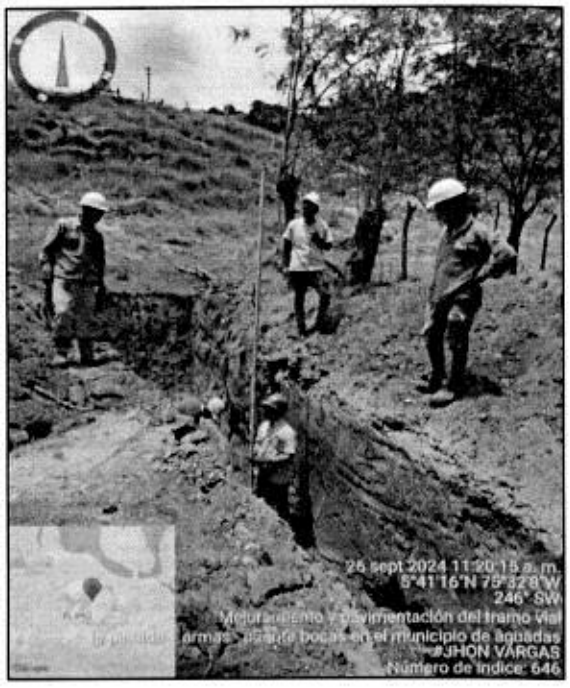

64° NE
Mejoramiento y pavimentación del tramo vial
Número de índice: 618

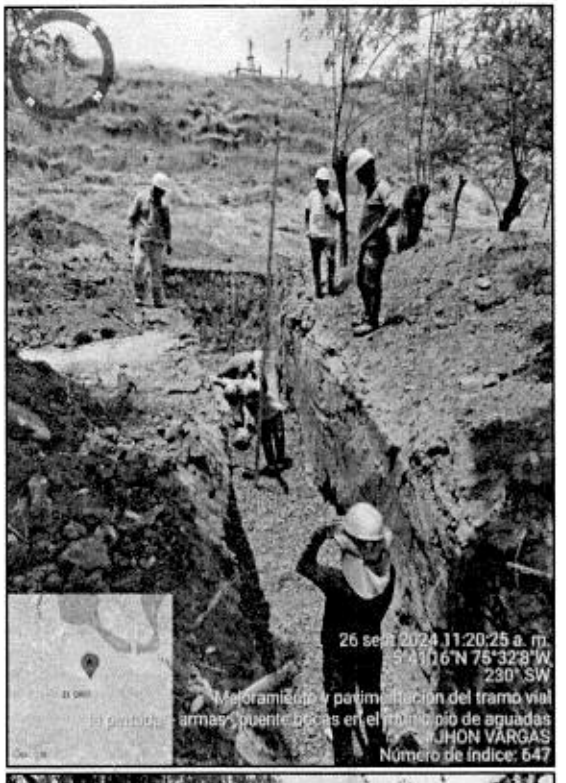


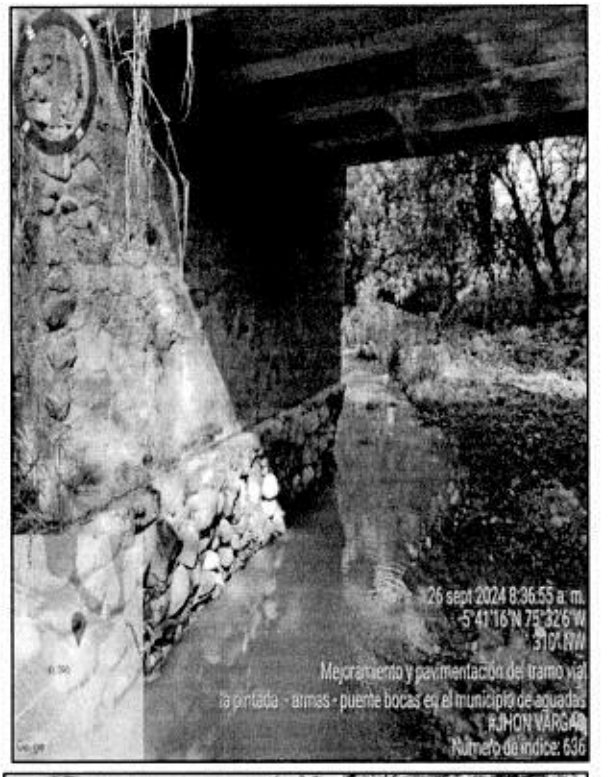

25 sept 2024 8:57:55 a. m.
5°41'6"N 75°31'43"W
24° NE
ARMAS
JHON VARGAS
Número de índice: 616



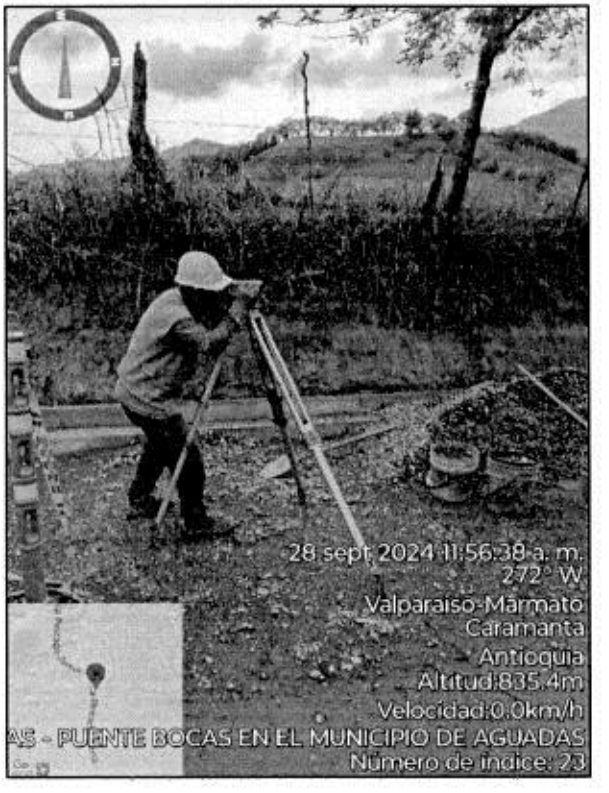

26 sept 2024 11:34:54 a.m.
218° SW
Aguadas
Caldas
Altitud:831.5m
Velocidad:0.0km/h
AS - PUENTE BOCAS EN EL MUNICIPIO DE AGUADAS
Número de índice: 6

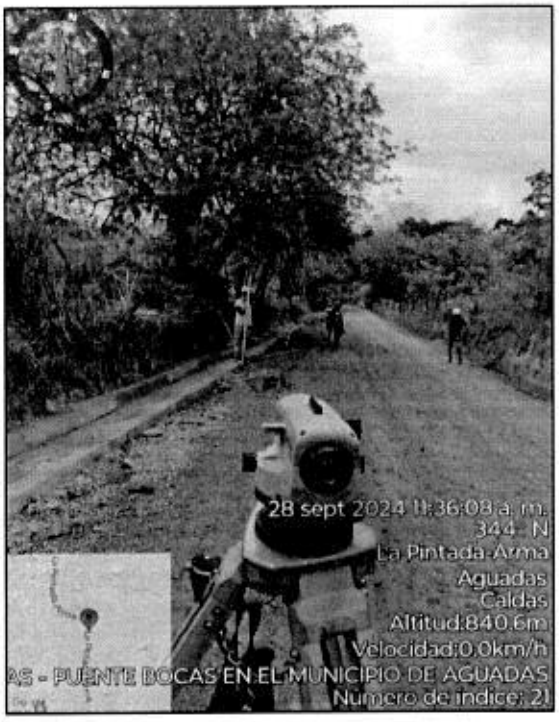

26 sept 2024 11:20:18 a.m.
5°41'16"N 75°32'8"W
246° SW
Mejoramiento y pavimentación del tramo vial
armas - puente bocas en el municipio de Aguadas
#JHON VARGAS
Número de índice: 646

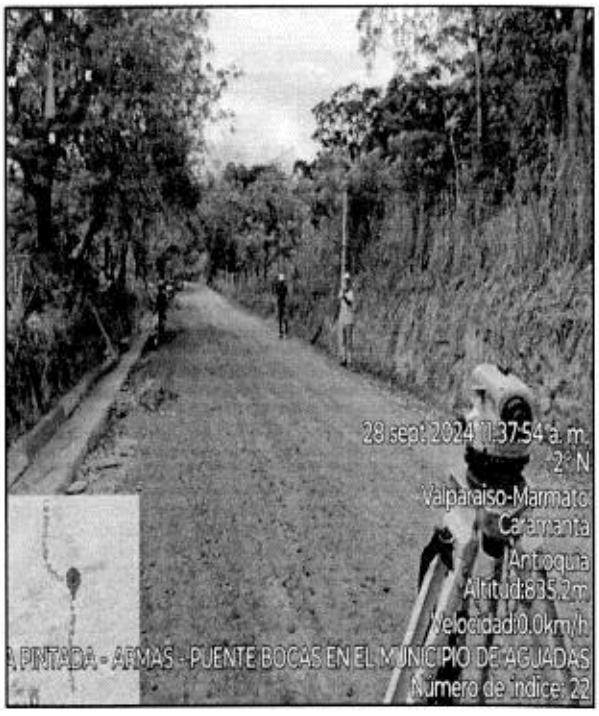

26 sept 2024 11:20:25 a. m.
5°41'06"N 75°32'8"W
230° SW
Mejoramiento y pavimentación del tramo vial
- armas - puente bocas en el municipio de aguadas
#JHON VARGAS
Número de índice: 647

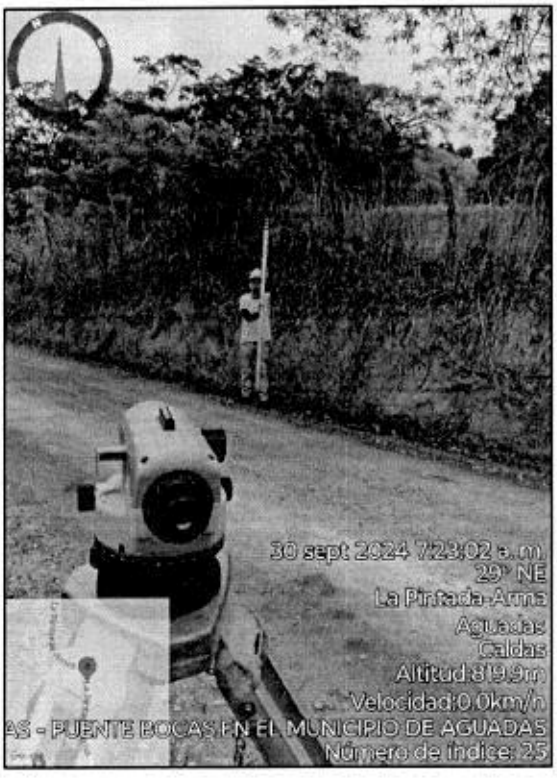

26 sept 2024 8:36:55 a. m.
5°41'16"N 75°32'6"W
310° NW
Mejoramiento y pavimentación del tramo vial
la pintada - armas - puente bocas en el municipio de aguadas
#JHON VARGAS
Número de índice: 636

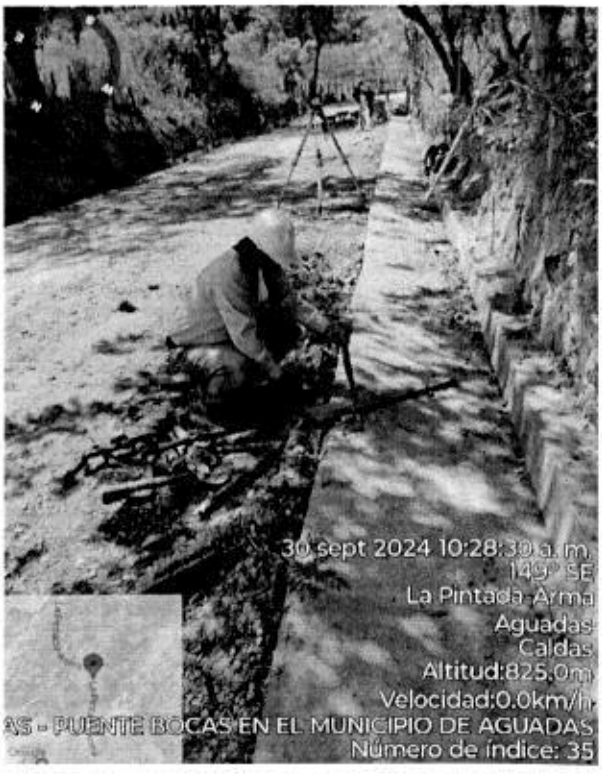

28 sept 2024 11:37:15 a. m.
5°40'36"N 75°31'33"W
171° S
#JHON VARGAS
Número de índice: 666

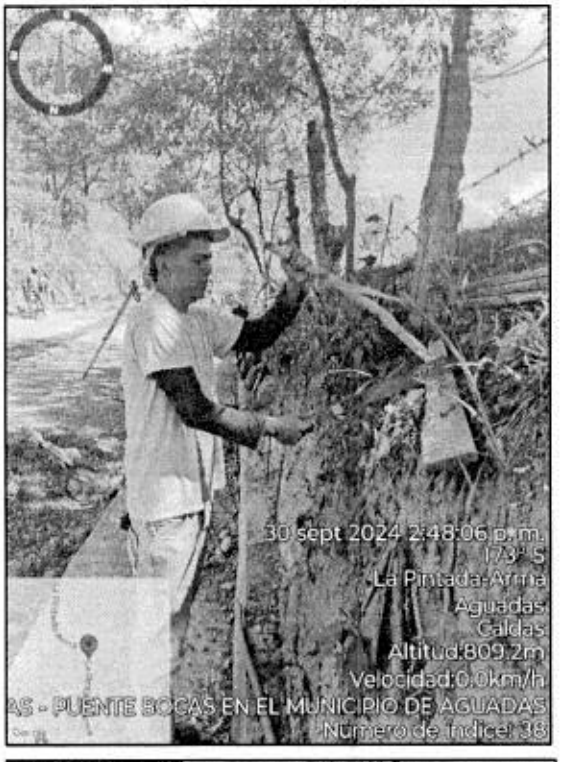

28 sept 2024 11:56:38 a. m.
272° W
Valparaíso-Marmato
Caramanta
Antioquia
Altitud:835.4m
Velocidad:0.0km/h
AS - PUENTE BOCAS EN EL MUNICIPIO DE AGUADAS
Número de índice: 23

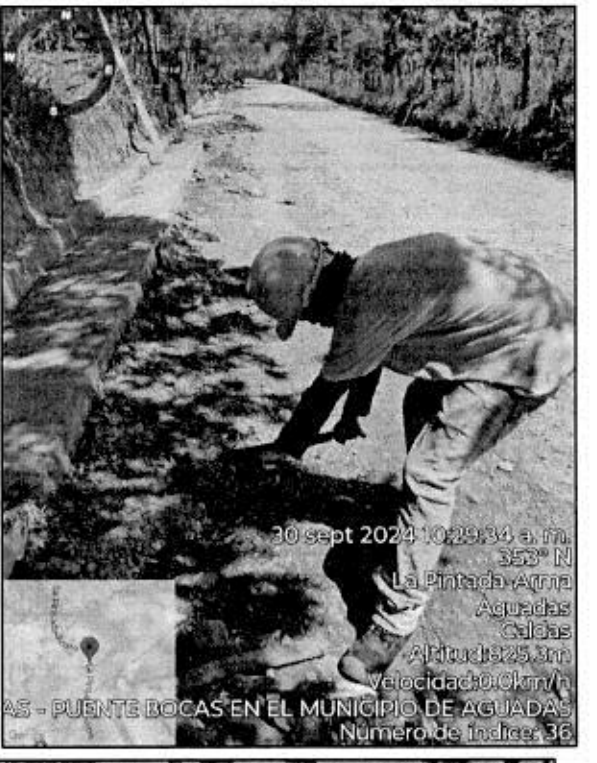

28 sept 2024 11:36:08 a. m.
344° N
La Pintada-Arma
Aguadas
Caldas
Altitud:840.6m
Velocidad:0.0km/h
AS - PUENTE BOCAS EN EL MUNICIPIO DE AGUADAS
Número de índice: 21

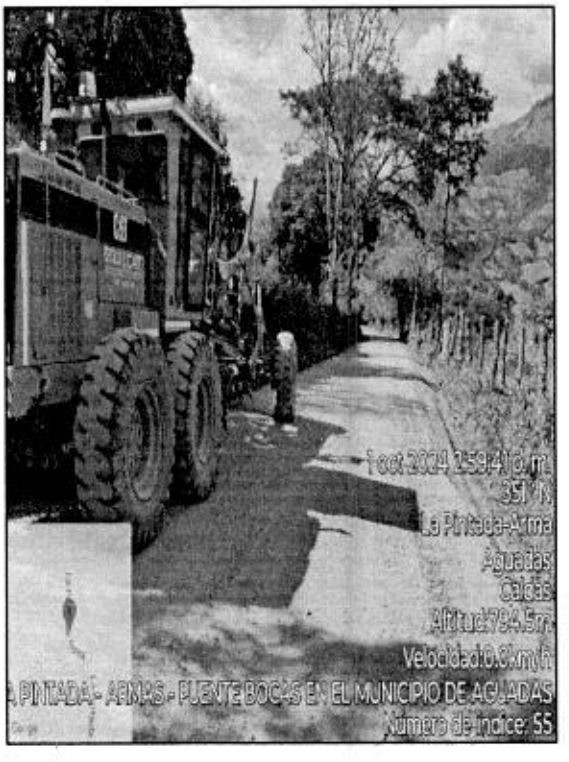

28 sept 2024 11:37:54 a. m.
2° N
Valparaíso-Marmato
Caramanta
Antioquia
Altitud:835.2m
Velocidad:0.0km/h
A PINTADA - ARMAS - PUENTE BOCAS EN EL MUNICIPIO DE AGUADAS
Número de índice: 22

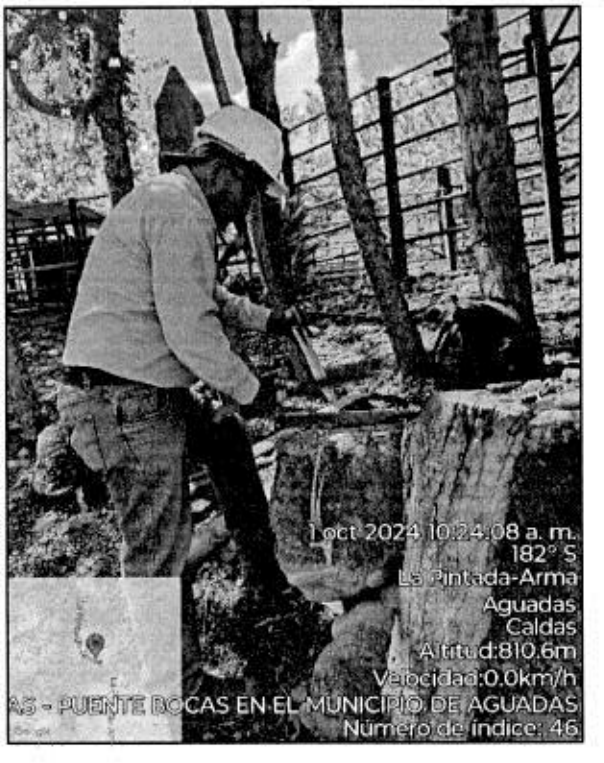

30 sept 2024 7:23:02 a. m.
29° NE
La Pintada-Arma
Aguadas
Caldas
Altitud:819.9m
Velocidad:0.0km/h
AS - PUENTE BOCAS EN EL MUNICIPIO DE AGUADAS
Número de índice: 25

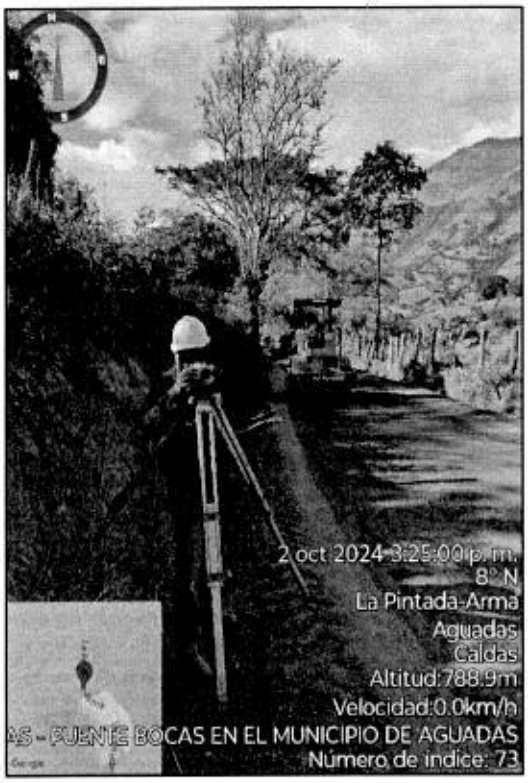

30 sept 2024 10:28:30 a. m.
149° SE
La Pintada-Arma
Aguadas
Caldas
Altitud:825.0m
Velocidad:0.0km/h
AS - PUENTE BOCAS EN EL MUNICIPIO DE AGUADAS
Número de índice: 35


30 sept 2024 2:48:06 p. m.
179° S
La Pintada-Arma
Aguadas
Caldas
Altitud:809.2m
Velocidad:0.0km/h
AS - PUENTE BOCAS EN EL MUNICIPIO DE AGUADAS
Número de índice: 38

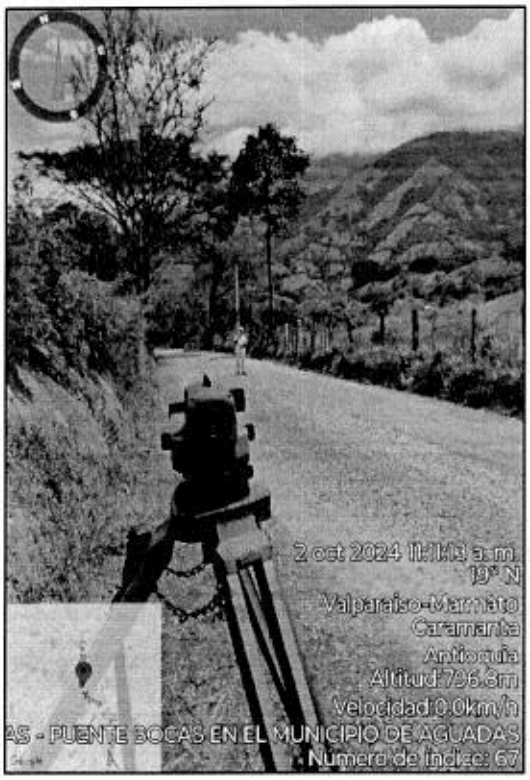

30 sept 2024 10:29:34 a. m.
353° N
La Pintada-Arma
Aguadas
Caldas
Altitud:825.3m
Velocidad:0.0km/h
AS - PUENTE BOCAS EN EL MUNICIPIO DE AGUADAS
Número de índice: 36

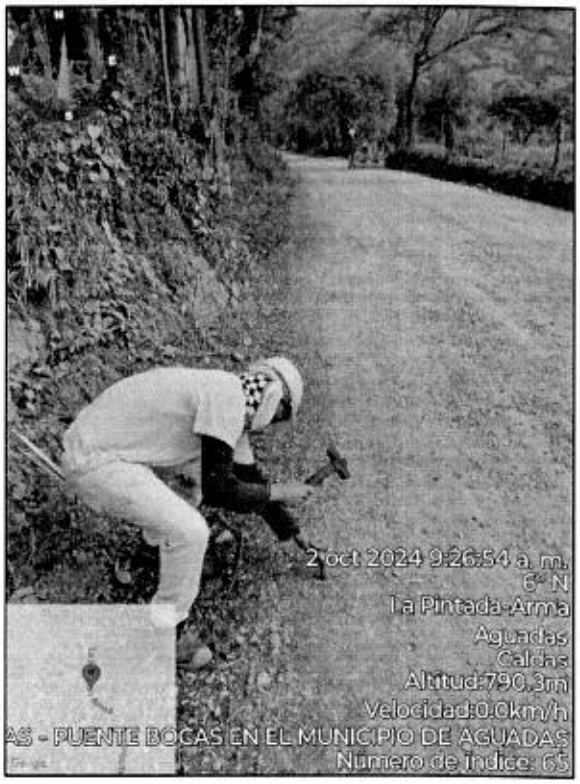

1 oct 2024 2:59:41 p. m.
351° N
La Pintada-Arma
Aguadas
Caldas
Altitud:784.5m
Velocidad:0.0km/h
A PINTADA - ARMAS - PUENTE BOCAS EN EL MUNICIPIO DE AGUADAS
Número de índice: 55

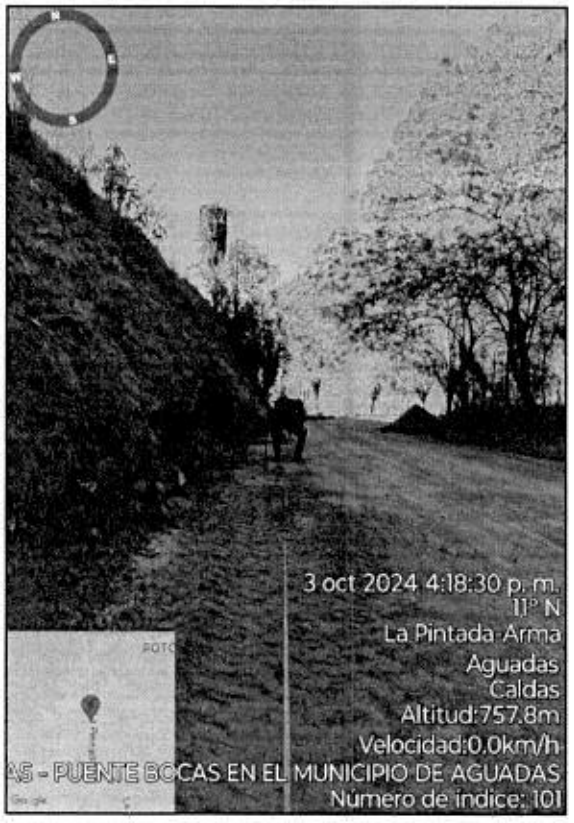

1 oct 2024 10:24:08 a. m.
182° S
La Pintada-Arma
Aguadas
Caldas
Altitud:810.6m
Velocidad:0.0km/h
AS - PUENTE BOCAS EN EL MUNICIPIO DE AGUADAS
Número de índice: 46

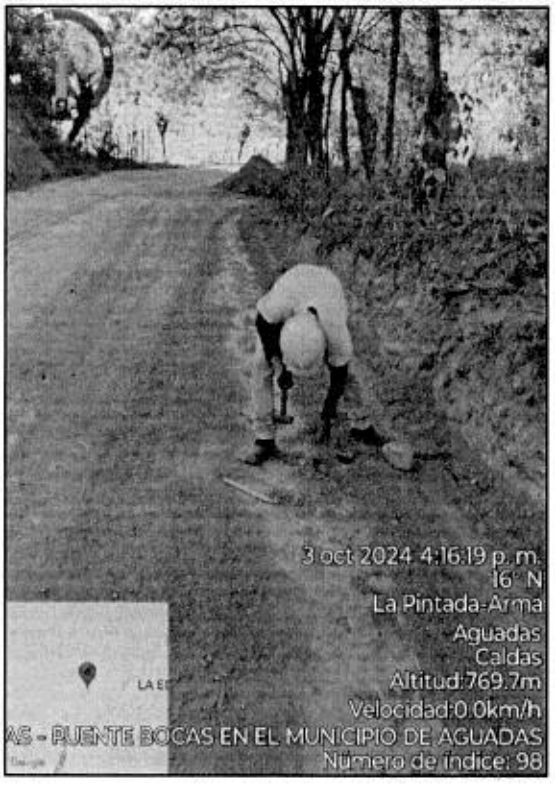

2 oct 2024 3:25:00 p. m.
8° N
La Pintada-Arma
Aguadas
Caldas
Altitud:788.9m
Velocidad:0.0km/h
AS - PUENTE BOCAS EN EL MUNICIPIO DE AGUADAS
Número de indice: 73


2 oct 2024 1:26:33 p. m.
95° E
Valparaíso-Marmato
Caramanta
Antioquia
Altitud:795.7m
Velocidad:0.0km/h
AS - PUENTE BOCAS EN EL MUNICIPIO DE AGUADAS
Número de indice: 68


2 oct 2024 11:11:13 a. m.
19° N
Valparaíso-Marmato
Caramanta
Antioquia
Altitud:796.8m
Velocidad:0.0km/h
AS - PUENTE BOCAS EN EL MUNICIPIO DE AGUADAS
Número de indice: 67

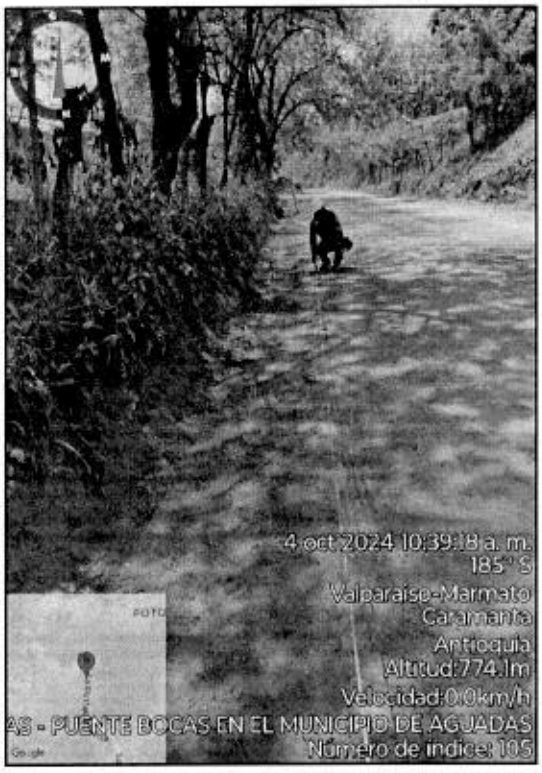

2 oct 2024 9:26:54 a. m.
6° N
La Pintada-Arma
Aguadas
Caldas
Altitud:790.3m
Velocidad:0.0km/h
AS - PUENTE BOCAS EN EL MUNICIPIO DE AGUADAS
Número de indice: 65

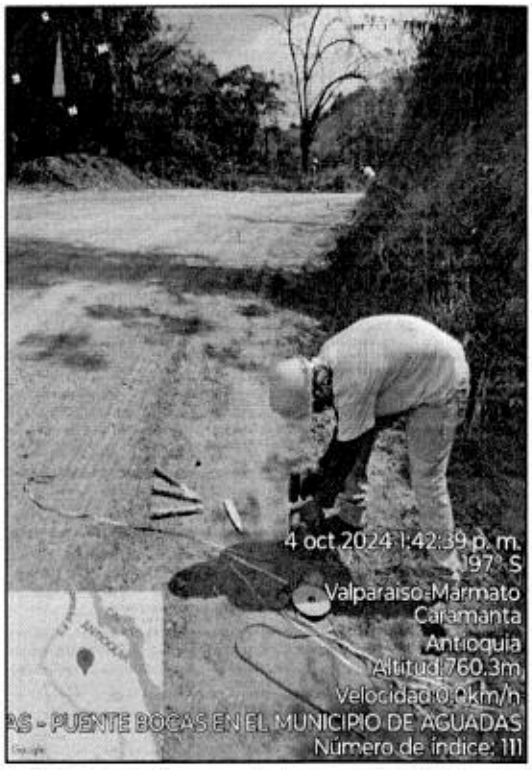

3 oct 2024 4:18:30 p. m.
11° N
La Pintada-Arma
Aguadas
Caldas
Altitud:757.8m
Velocidad:0.0km/h
AS - PUENTE BOCAS EN EL MUNICIPIO DE AGUADAS
Número de índice: 101

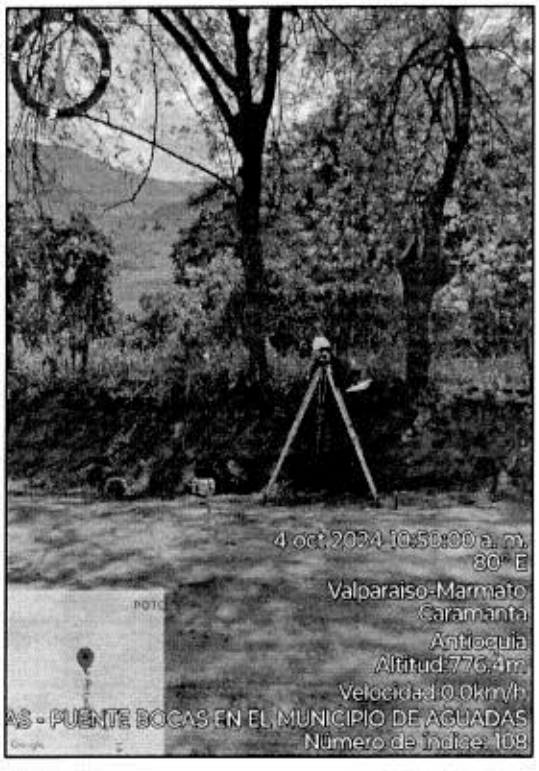

3 oct 2024 4:16:19 p. m.
16° N
La Pintada-Arma
Aguadas
Caldas
Altitud:769.7m
Velocidad:0.0km/h
AS - PUENTE BOCAS EN EL MUNICIPIO DE AGUADAS
Número de índice: 98

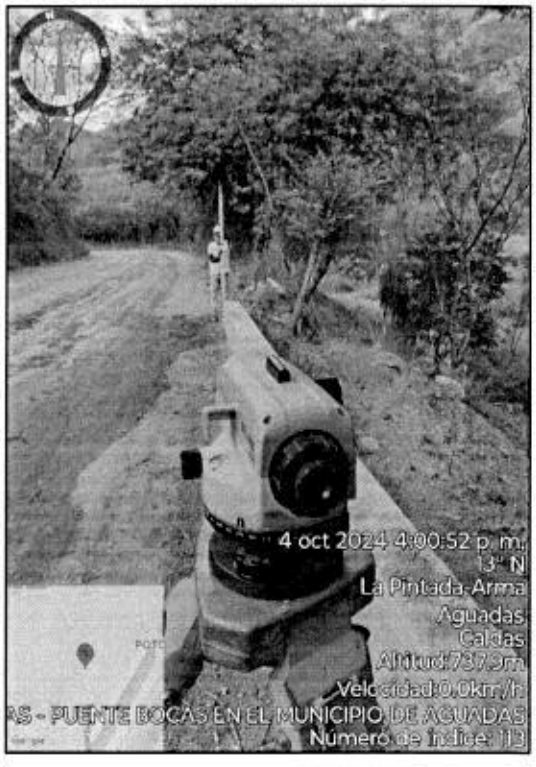

3 oct 2024 1:34:53 p. m.
11° N
Valparaíso-Marmato
Caramanta
Antioquia
Altitud:788.6m
Velocidad:0.0km/h
AS - PUENTE BOCAS EN EL MUNICIPIO DE AGUADAS
Número de índice: 94

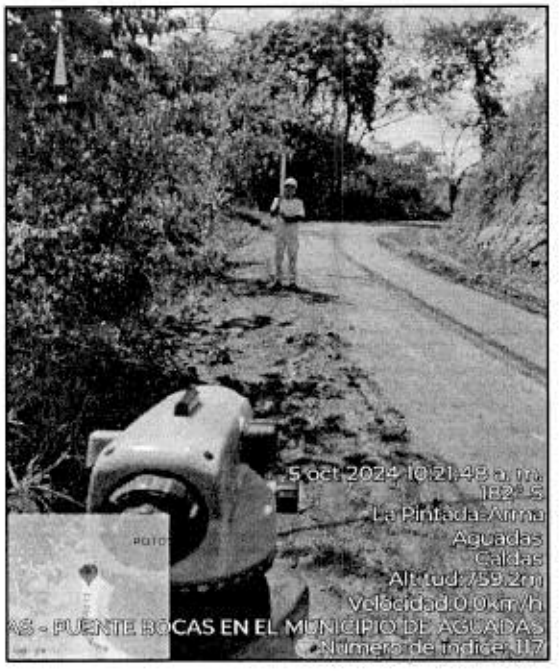

3 oct 2024 11:27:17 a. m.
335° NW
Aguadas
Caldas
Altitud:781.1m
Velocidad:0.0km/h
AS - PUENTE BOCAS EN EL MUNICIPIO DE AGUADAS
Número de índice: 82

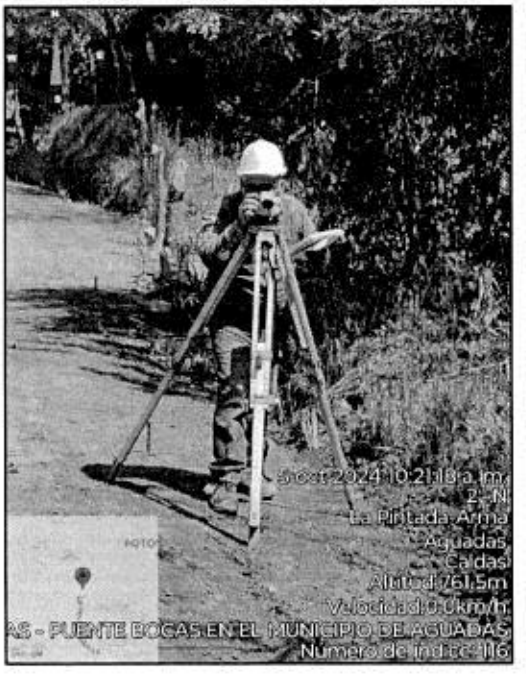

4 oct 2024 10:39:18 a. m.
185° S
Valparaiso-Marmato
Caramanta
Antioquia
Altitud:774.1m
Velocidad:0.0km/h
AS - PUENTE BOCAS EN EL MUNICIPIO DE AGUADAS
Número de índice: 105

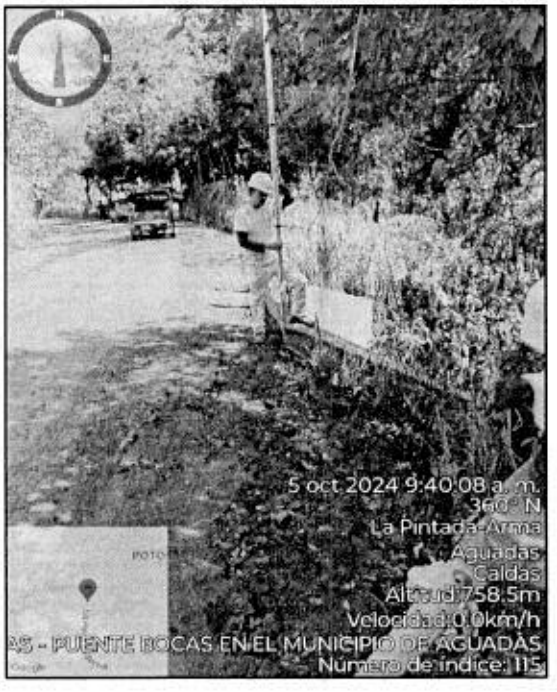

4 oct 2024 1:42:39 p. m.
197° S
Valparaiso-Marmato
Caramanta
Antioquia
Altitud:760.3m
Velocidad:0.0km/h
AS - PUENTE BOCAS EN EL MUNICIPIO DE AGUADAS
Número de índice: 111


4 oct 2024 10:50:00 a. m.
80° E
Valparaiso-Marmato
Caramanta
Antioquia
Altitud:776.4m
Velocidad:0.0km/h
AS - PUENTE BOCAS EN EL MUNICIPIO DE AGUADAS
Número de índice: 108


4 oct 2024 4:00:52 p. m.
13° N
La Pintada-Arma
Aguadas
Caldas
Altitud:737.9m
Velocidad:0.0km/h
AS - PUENTE BOCAS EN EL MUNICIPIO DE AGUADAS
Número de índice: 113


5 oct 2024 10:21:43 a. m.
182° S
La Pintada-Arma
Aguadas
Caldas
Altitud:759.2m
Velocidad:0.0km/h
AS - PUENTE BOCAS EN EL MUNICIPIO DE AGUADAS
Número de índice: 117


5 oct 2024 10:21:18 a. m.
2° N
La Pintada-Arma
Aguadas
Caldas
Altitud:761.5m
Velocidad:0.0km/h
AS - PUENTE BOCAS EN EL MUNICIPIO DE AGUADAS
Número de índice: 116


5 oct 2024 9:40:08 a. m.
360° N
La Pintada-Arma
Aguadas
Caldas
Altitud:758.5m
Velocidad:0.0km/h
AS - PUENTE BOCAS EN EL MUNICIPIO DE AGUADAS
Número de índice: 115


5 oct 2024 9:39:35 a. m.
357° N
La Pintada-Arma
Aguadas
Caldas
Altitud:763.6m
Velocidad:0.0km/h
AS - PUENTE BOCAS EN EL MUNICIPIO DE AGUADAS
Número de índice: 114

ABSCISA	TIPO DE AREA	COTASUB RASANTE IZQUIERDA	COTA SUB RAZANTE EJE	COTA RASANTE DERECHA
K27+370	SUB BASE	764,771	764,521	764,29
K27+380	SUB BASE	763,946	763,73	763,62
K27+390	SUB BASE	762,99	762,92	762,82
K27+400	SUB BASE	762,17	762,12	761,99
K27+410	SUB BASE	761,36	761,31	761,18
K27+420	SUB BASE	760,575	760,526	760,42
K27+430	SUB BASE	759,725	759,73	759,61
K27+440	SUB BASE	758,786	758,8	758,77
K27+450	SUB BASE	757,871	757,936	757,869
K27+460	SUB BASE	757,132	757,078	756,995
K27+470	SUB BASE	756,233	756,24	756,203
K27+480	SUB BASE	755,423	755,47	755,436
K27+490	SUB BASE	754,626	754,666	754,562
K27+500	SUB BASE	753,716	753,786	753,694
K27+510	SUB BASE	752,936	753,01	752,936
K27+520	SUB BASE	752,276	752,226	752,156
K27+530	SUB BASE	751,606	751,526	751,433
K27+540	SUB BASE	750,709	750,743	750,7
K27+550	SUB BASE	749,93	749,91	749,95
K27+560	SUB BASE	749,16	749,094	749,09
K27+570	SUB BASE	748,32	748,045	748,18
K27+580	SUB BASE	747,443	747,42	747,33
K27+590	SUB BASE	746,666	746,625	746,525
K27+600	SUB BASE	745,943	745,835	745,771
K27+610	SUB BASE	745,15	745,017	744,96
K27+620	SUB BASE	744,303	744,253	744,165
K27+630	SUB BASE	743,511	743,471	743,32
K27+640	SUB BASE	742,726	742,611	742,571
K27+650	SUB BASE	741,881	741,8	741,671
K27+660	SUB BASE	741,19	741,025	740,84
K27+670	SUB BASE	740,32	740,24	740
K27+680	SUB BASE	739,52	739,38	739,13
K27+690	SUB BASE	738,83	738,66	738,51
K27+700	SUB BASE	738,078	737,92	737,564
K27+710	SUB BASE	737,36	737,13	736,82
K27+720	SUB BASE	736,44	736,37	736,26
K27+730	SUB BASE	735,426	735,56	735,575
K27+740	SUB BASE	734,655	734,82	735,037
K27+750	SUB BASE	733,73	733,97	733,97
K27+760	SUB BASE	732,74	732,94	733,765
K27+770	SUB BASE	731,48	731,84	732,15

1.15 Información financiera de la interventoría

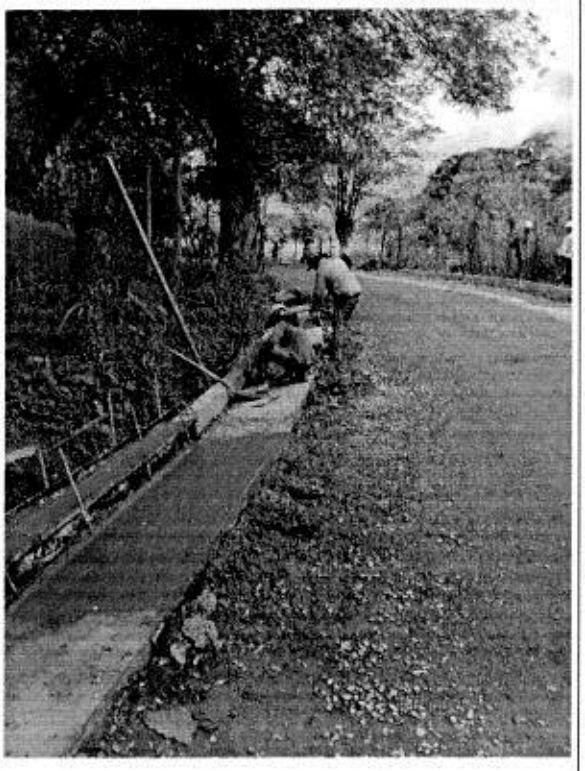
1.15.1 Avance financiero contrato de interventoría

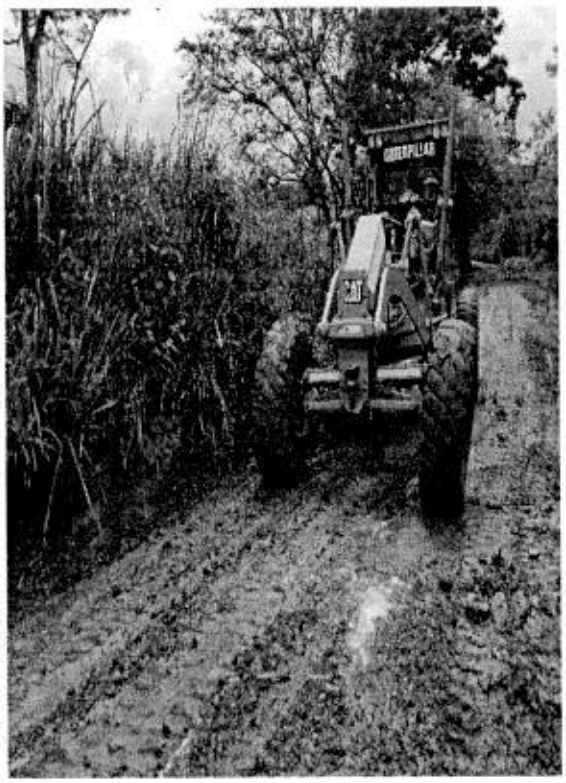
RESUMEN DEL CONTRATO		
VALOR DEL CONTRATO MAS ADICIÓN		$ 684.347.685
VALOR ACTA No. 1 PAGOS FIJOS	$ 20.145.729,00	
VALOR ACTA No. 2 PAGOS FIJOS	$ 20.145.729,00	
VALOR ACTA No. 3 PAGOS FIJOS	$ 20.145.729,00	
VALOR ACTA No. 4 PAGOS FIJOS	$ 20.145.729,00	
VALOR ACTA PARCIAL No. 1 POR AVANCE DE OBRA DEL 5,47%	$ 14.977.420,00	
VALOR ACTA No. 5 PAGOS FIJOS	$ 20.145.729,00	
VALOR ACTA No. 6 PAGOS FIJOS	$ 20.145.729,00	
VALOR ACTA PARCIAL No. 2 POR AVANCE DE OBRA DEL 11,72%	$ 32.090.559,00	
VALOR ACTA No. 7 PAGOS FIJOS	$ 20.145.729,00	
VALOR ACTA PARCIAL No. 3 POR AVANCE DE OBRA DEL 4,98%	18.761.112.00	
VALOR ACTA No. 8 PAGOS FIJOS	$ 6.352.858,00	
SUMAS IGUALES	**$ 213.202.052**	**$ 684.347.685**

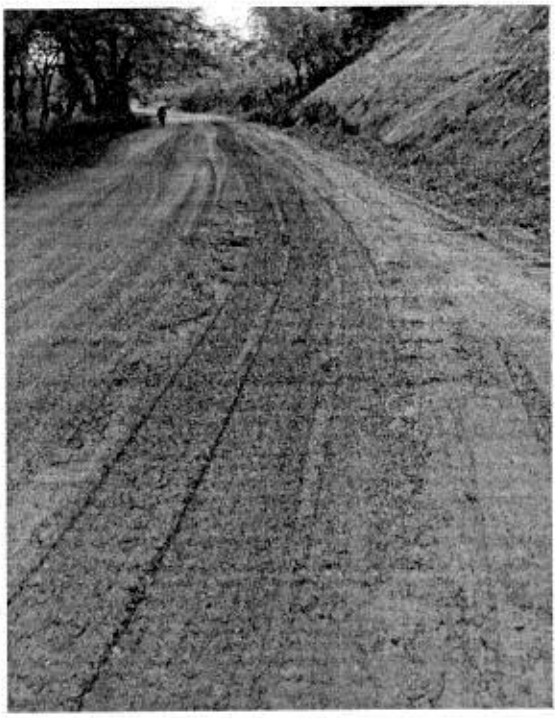
1.16 Libro de obra

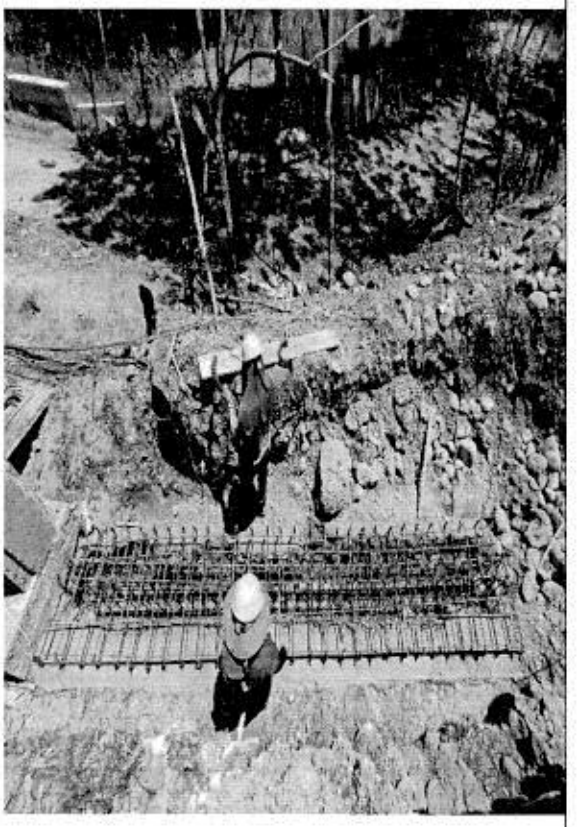
Para soportar los controles de Interventoría se registra las actividades en el LIBRO DE OBRA y en cumplimiento al manual de Interventoría se lleva el control diario del estado del tiempo, equipos, personal y observaciones a las que haya lugar. Se anexa copia.

1.17 Registro fotográfico Componente Técnico.

	
Imagen 1. Fundición de cunetas en concreto de 3000 PSI	Imagen 2. Construcción de filtro para muro de contención

	
Imagen 3. Excavación con maquinaria para filtro al costado izquierdo de la vía	Imagen 4. Ampliación de vía con motoniveladora

	
Imagen 5. Instalación base estabilizada con emulsión asfáltica	Imagen 6. Excavación con maquinaria amarilla para zapatas del muro de contención

	
Imagen 7. Excavación manual para cunetas	Imagen 8. Instalación de acero de refuerzo para cimientos del muro de contención

CAPÍTULO 2. COMPONENTE AMBIENTAL

El presente documento tiene como fin dar cumplimiento a los pliegos contractuales y servir como base para el seguimiento en la ejecución de las actividades de obra relacionadas con el tema de Plan de Manejo Ambiental y realizada en el periodo comprendido entre 15 de Septiembre de 2024 al 14 de Octubre de 2024 y determinar el cumplimiento con la normatividad ambiental vigente la cual soporta el documento PLAN DE ADAPTACIÓN DE LA GUÍA AMBIENTAL PAGA), para el contrato cuyo objeto es "INTERVENTORÍA TÉCNICA ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL A LOS CONTRATOS DE OBRA RESULTANTES DEL PROCESO DE LICITACIÓN LP-SI-013-2022, EL CUAL TIENE COMO OBJETO: MEJORAMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DEL TRAMO VIAL LA PINTADA – ARMA – PUENTE BOCAS, EN EL MUNICIPIO DE AGUADAS CALDAS".

Este informe tiene el propósito de evaluar y dar a conocer a la Gobernación de Caldas, (Entidad contratante) el estado o condición ambiental del proyecto liderado por el contratista Consorcio Aguadas Vial, bajo la coordinación del Consorcio Vial 2023; donde se requiere como base los lineamientos establecidos en la Guía de Manejo Ambiental de Proyectos de Infraestructura Modo Carretero y la Ley 99 de 1993, Sistema Nacional Ambiental, SINA; entendiendo como labor importante supervisar y controlar de manera eficaz y permanente las etapas de ejecución del proyecto, haciendo cumplir las especificaciones técnicas, administrativas, legales, sociales y ambientales y Desarrollo Sostenible establecidas en el respectivo contrato.
En el presente informe se evidencia el seguimiento desde el 15 de Septiembre al 14 de Octubre de 2024. De la aplicabilidad del Plan de Adaptación de la Guía Ambiental PAGA: buscando mitigar los impactos que puedan generarse en el desarrollo del proyecto, así como aplicando la protección, prevención y compensación de las zonas a intervenir.

Objetivo general
Informar a la Gobernación de Caldas, entidad contratante sobre los avances del Componente Ambiental presentado por el Contratista de Obra Consorcio Aguadas Vial VC, con el fin de garantizar el cumplimiento de las actividades programadas para este periodo en el documento Plan de Adaptación de la Guía Ambiental.

2.1. Objetivos específicos

Realizar seguimiento a las actividades del proyecto de la red vial del Departamento de Caldas, TRAMO VIAL LA PINTADA – ARMA – PUENTE BOCAS, EN EL MUNICIPIO DE AGUADAS.
Informar sobre las actividades ejecutadas por el contratista CONSORCIO AGUADAS VIAL, las cuales deben estar estipuladas dentro de los lineamientos del documento PAGA, durante el periodo del 15 de Septiembre de 2024 al 14 de Octubre de 2024.
Validar la implementación de las medidas requeridas para la construcción y operación de los campamentos temporales y centros de acopio, materiales de construcción, manejo integral de residuos sólidos, control de emisiones atmosféricas (material particulado) y manejo integral de cuerpos de agua establecidos en el componente de manejo de las actividades constructivas.
Identificar actividades que generen impacto ambiental negativo, resultado de procesos que no se establecieron en el PAGA, identificados como imprevistos.
Evaluar en forma cualitativa y cuantitativa la magnitud de los factores ambientales presentes en la obra, para disponer de parámetros concretos que permitan medir los impactos de estos sobre el medio ambiente y su evolución en el tiempo.

Evaluar el cumplimiento de la Guía de Manejo Ambiental de proyectos de Infraestructura-Subsector Vial.
Realizar un seguimiento al cumplimiento de los requisitos legales, como base fundamental para garantizar la aprobación de las materias primas y de sus proveedores.
Realizar un seguimiento a las labores constructivas desarrolladas por el contratista para la obtención del recurso hídrico.
Verificar el cumplimiento de las medidas de manejo ambiental establecidas dentro del PAGA y su aplicación a las fichas ambientales, identificando las falencias y medidas correctivas establecidas para subsanar los impactos ambientales generados.
Realizar el informe mensual ambiental GP.

2.2 Seguimiento y evaluación ambiental

En el periodo comprendido entre el 15 de Septiembre de 2024 al 14 de Octubre de 2024, el contratista reportó (semanal) el cumple en las actividades de gestión y control ambiental en el marco del proyecto, las charlas para el personal de la obra, el manejo de los materiales y la señalización adecuada dentro de la obra, así como el manejo de aguas superficiales y de residuos líquidos buscando la protección de la fauna, y la adecuación de las zonas de acopios y las zonas para la maquinaria.
Las actividades de reutilización se enfocaron para la conformación de obras estabilizadoras de la bancada de la vía objeto de intervención y sectores que requieran un refuerzo adicional, a la fecha está pendiente la remisión del contratista con el balance total de material generado y material reutilizado, tomando en consideración que este material está siendo acopiado temporalmente en uno de los puntos de acopio de material y maquinaria definidos por el contratista.
En este mismo sentido se efectuó seguimiento a las actividades ejecutadas en campo, y seguimiento a los compromisos adquiridos en los respectivos comités de obra.

2.2.1 Actividades ejecutadas interventoría periodo comprendido entre el 15 de Septiembre de 2024 al 14 de Octubre de 2024.

Se describen las actividades realizadas por la interventoría, ejecutadas en el mes en referencia.
Seguimiento a la implementación de medidas para el manejo durante el desarrollo de actividades operativas.
Seguimiento a la gestión ambiental en campo.

Se realizaron los informes semanales correspondientes al periodo objeto de reporte, enviado los lunes por correo electrónico, describiendo las actividades realizadas por la interventoría y seguimiento ambiental de obra.
Elaboración del informe Mensual N°9, el cual contiene las actividades ejecutadas durante el tiempo mencionado anteriormente.
Recorridos e inspecciones rutinarias.
Participación en comités de Obra.



Ilustración 1 Seguimiento Gestión de Obra

2.3 SEGUIMIENTO E IMPLEMENTACIÓN DEL PAGA

Las actividades operativas desarrolladas y objeto del control y seguimiento ambiental efectuado en el periodo objeto del reporte están asociadas a la adecuación de obras de arte (transversales) para el manejo de aguas lluvias en el tramo objeto de intervención, manejo de residuos que se generarán por el proyecto, manejo de material de construcción (Material pétreo).
Como parte del seguimiento por parte de la interventoría, se ha efectuado reuniones de control con el contratista, así como en los comités de obra, donde se han

brindado las recomendaciones para el aseguramiento de las actividades de campo, para lo cual no se evidencian hallazgos significativos en la gestión ambiental adelantada por el contratista, fuera en los retrasos en la entrega de informes y soportes de gestión ambiental.
Durante la fase de seguimiento de obra se efectuó control y seguimiento al cumplimiento legal e implementación de medidas de manejo de conformidad con lo establecido en el PAGA aprobado.

2.3.1 Personal que conforma la función encargada del cumplimiento paga.

Por parte del Consorcio Aguadas Vial el siguiente personal realiza las actividades para el cumplimiento de los programas ambientales establecidos en el PAGA, a la fecha no se cuenta con personal operativo vinculado, toda vez no se ha presentado avance físico de la obra.

N°	DEPARTAMENTO	NOMBRE Y APELLIDOS	CEDULA	FECHA DE INGRESO	CARGO
1	Administracion	Lina Patricia Mejia Ramos	43750420	12/09/2024	residente
2	Administracion	yudi viviana Henao Ossa	1035427442	11/09/2024	admistradora
3	Administracion	Daniela Rios	1055834261	11/09/2024	aux sst
4	Administracion	Helmer Andres Gomez Sierra	1065611820	14/09/2024	ing ambiental
5	Administracion	kety Quintero	1065897524	16/09/2024	social

Tabla 4 Personal de Obra activo que conforma el PAGA.

2.4 Programa adaptación guías ambientales

A continuación, se remiten los aspectos relevantes asociados a la fase de control y seguimiento desarrollado por la interventoría de conformidad con el PAGA aprobado:

2.4.1 Programa de desarrollo y aplicación gestión ambiental

2.4.2 Conformación del grupo de gestión Socio-Ambiental

Seguimiento y control al cumplimiento de las medidas de manejo establecidas en el PAGA.
Elaboración y presentación de informes ambientales de interventoría.
Verificación y aseguramiento de los informes ambientales remitidos por el contratista.

2.4.3 Capacitación al personal de Obra

El contratista ha desarrollado actividades de capacitación ambiental (adicionales a las charlas ambientales), realizando un refuerzo mediante un proceso de formación y capacitación especifico en temas ambientales. En el informe mensual del contratista se puede evidenciar la gestión adelantada.

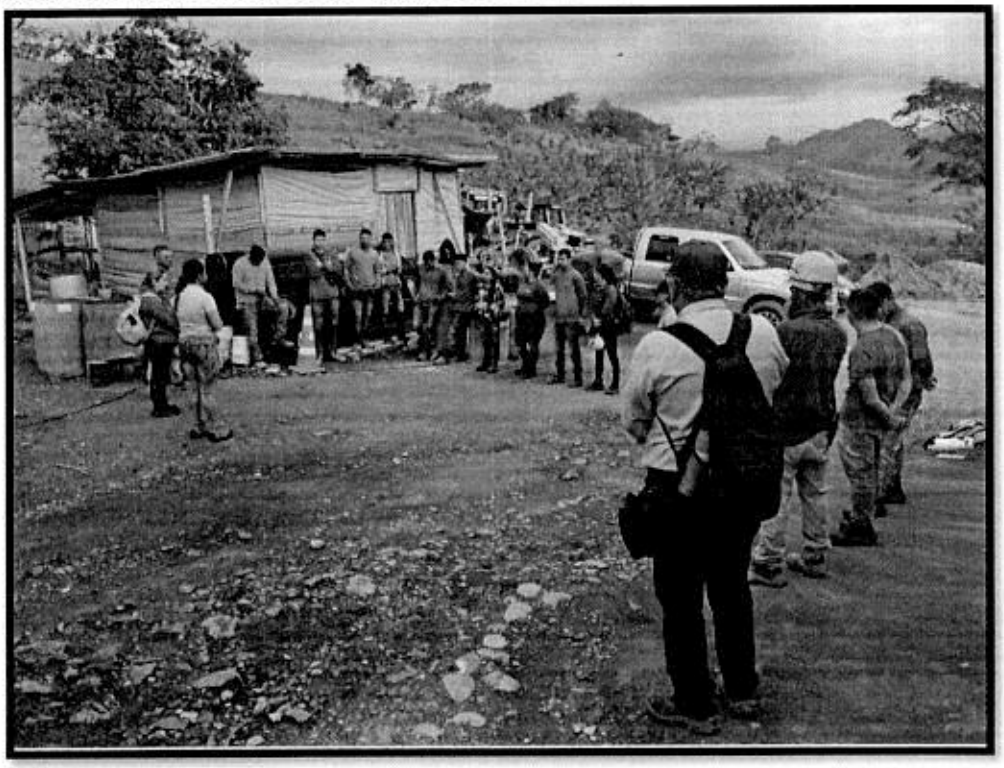


Ilustración 2. Capacitación al Personal de Obra

2.5 Cumplimiento de requerimientos legales

Durante el desarrollo de la fase física del proyecto se ha efectuado control y seguimiento ambiental en obra, así como el soporte desde interventoría para dar cumplimiento al marco legal ambiental, principalmente asociado a las actividades de control de material particulado (medidas del PAGA), Manejo de Residuos, reutilización de residuos de excavación, así como la conservación y protección de ecosistemas sensibles (Principalmente asociado a fuentes hídricas cercanas).
El recurso hídrico requerido para el proyecto está siendo adquirido mediante compra al acueducto de ARMA (EMPOCALDAS), los cual está siendo soportado mediante las facturas de compra remitidas en el informe mensual entregado por el contratista.



Ilustración 3 Manejo de Residuos

2.6 Programa de actividades constructivas

2.6.1 Manejo Integral de Materiales de Construcción

Durante el periodo objeto de reporte no se efectuó movimiento de material de manera significativa, aun así, se implementaron medidas de manejo especificas durante el desarrollo de actividades para los movimientos efectuados.



Ilustración 4 Material en Obra

2.6.2 Señalización de Frentes de Obra y sitios temporales

Se efectuó seguimiento a la delimitación de áreas intervenidas y punto de acopio temporal de material removido, sin identificar hallazgos que evidencien un incumplimiento a las medidas establecidas en el PAGA.



Ilustración 5 Señalización en Obra

2.6.3 Manejo y disposición final de escombros, sobrantes de excavación y retiro de material sobrante.

Tal como ha sido referido, mediante un análisis y valoración con el área técnica y de conformidad con el marco normativo frente al manejo de RCD (Res 472 de 2017 mod por la Res 1257 de 2021), el material sobrante de excavación ha sido utilizado para el refuerzo en los procesos de estabilización de bancadas en los tramos donde técnicamente ha sido viable su implementación y/o sectores de la vía objeto de intervención donde se ha requerido un refuerzo en su estabilización. A la fecha continua el contratista no ha enviado el balance general del material reutilizado, tomando en cuenta que este ha sido acopiado de manera temporal en los puntos y/o sitios de acopio de material y equipos definido por el contratista.

2.6.4 Manejo y Disposición Final de residuos sólidos convencionales y especiales.

La disposición final de residuos sólidos se está desarrollado por medio de gestores externos acreditados, mediante la verificación del reporte mensual se verifican los soportes de gestión y manejo adecuado de los residuos generados durante el

desarrollo del proyecto. Si bien el manejo de residuos sólidos está siendo efectuado de manera adecuada en campo. Actualmente el contratista cuenta con un convenio con la compañía ARGOS denominado "sacos Verdes", para hacer el manejo y gestión de los sacos de cemento que se generarán en obra.

2.7 PROGRAMA GESTIÓN HÍDRICA

2.7.1 Manejo de Aguas Superficiales

De conformidad con el informe remitido por el contratista se puede verificar que el agua requerida para el proyecto está siendo adquirida del acueducto, mediante compra, y no se está efectuando captación u aprovechamiento de fuentes superficiales y/o subterráneas.

2.7.2 Manejo de Residuos líquidos domésticos e industriales.

Desde la interventoría se ha efectuado el seguimiento y control del manejo de residuos líquidos en la fase de ejecución del proyecto, los cuales corresponden al uso de unidades sanitarias.
En este mismo sentido se ha efectuado el seguimiento y control al mantenimiento de estas, (a la fecha está pendiente que el contratista remita el consolidado de los soportes físico, remitidos por el gestor externo para su validación, junto con las actas de disposición final, correspondientes al periodo objeto de reporte, la validación se ha efectuado mediante seguimiento en campo y verificación de los informes mensuales, aun así queda pendiente envió de soportes asociados al último periodo de gestión).

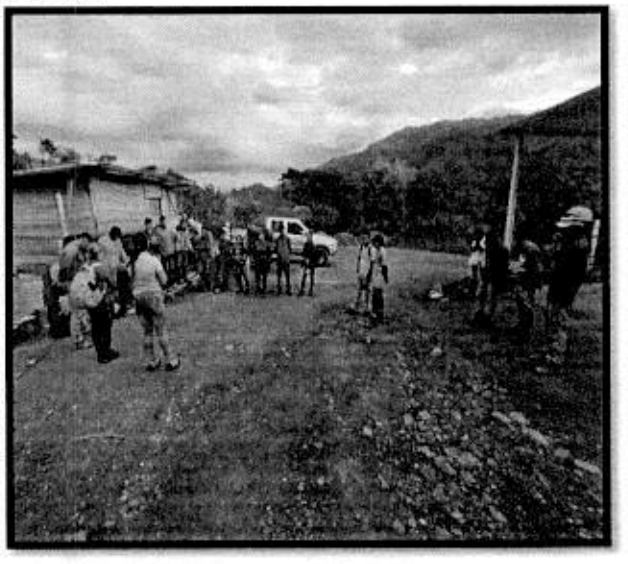


Ilustración 6 Charla de Seguimiento

2.8 Programa biodiversidad y servicios ecosistémicos

2.8.1 Manejo del descapote y cobertura vegetal

Las actividades de descapote realizadas solo se han asociado a los costados de la vía con intervención únicamente de pastos, El aprovechamiento forestal correspondió a la intervención de cercos vivos, conforme al inventario presentado a CORPOCALDAS.

2.8.2 Protección de Fauna

No aplica en el pedido objeto de reporte (No se ha identificado fauna que requiera de intervención y/o manejo especial por el desarrollo del proyecto).

2.9 Manejo de instalaciones

No se han establecido instalaciones temporales en el tramo de intervención. El contratista cuenta con una base localizada en el centro poblado de Arma, tomada como arriendo para centro de operaciones.

2.10 Instalación, funcionamiento y desmantelamiento de campamentos y sitios de acopio temporal.

Los sitios de acopio temporal de material removido se están manejando a los costados de la vía por corresponder a cantidades menores. (El contratista cuenta con una base localizada en el centro poblado de Arma, tomada como arriendo para centro de operaciones).

2.11 Manejo de Maquinaria, equipos y vehículos.

Mediante el informe mensual el contratista ha remitido la documentación de los vehículos y maquinaria utilizada en obra, el cual está siendo objeto de inspecciones preoperacionales. Esto puede ser verificado mediante el informe mensual de SST.

2.12 CONCLUSIONES

Para el periodo del mes de Septiembre la Interventoría concluye lo siguiente:

- Se evidencia un cumple en las actividades, charlas/capacitaciones al personal de la obra por parte del Contratista de acuerdo al Plan de Adaptación de la Guía ambiental. PAGA.

- Se registra el estado/condición ambiental del proyecto liderado por el contratista Consorcio Aguadas Vial, bajo la coordinación del Consorcio Vial 2023.

- Debido a que el Contrato se había suspendido se proyecta para el próximo Informe aumentar el avance de ejecución de las actividades propuestas en el documento Plan de Adaptación de la Guía Ambiental PAGA.

Cordialmente,

HÉCTOR MAURICIO CORTES
ING. AMBIENTAL
CONSORCIO VIAL 2023

CAPÍTULO 3. SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

3.1 Aspectos generales de seguridad y salud en el trabajo

La seguridad y salud en el trabajo debe ser concebida como una prestación social común de los trabajadores, como una obligación moral más que una obligación legal, porque además de ganar una alta reducción de costos, se mejoran las condiciones laborales de los empleados y se hacen más agradables los ambientes laborales, tanto en los aspectos físicos como humanos, logrando un mayor compromiso y entrega de las personas para con las empresas, de esa forma el **Consorcio Vial 2023** actuando como interventor los cuales garantizaran la ejecución de las actividades contenidas en el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo; en el proyecto de "MEJORAMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DEL TRAMO VIAL LA PINTADA – ARMA – PUENTE BOCAS, EN EL MUNICIPIO DE AGUADAS.".

3.2 Aspectos generales normatividad

La interventoría Consorcio Vial 2023 hace seguimiento al Contratista Consorcio Aguadas Vial, el cual se comprometió con el cumplimiento de leyes, resoluciones y decretos que constituyen el marco legal de la Seguridad y Salud en el Trabajo:

Aspectos básicos legales, Seguridad Industrial (Reporte e Investigación de Accidentes de Trabajo, Inspecciones de Seguridad, Normas de Seguridad, Análisis de Tareas Criticas Orden y Aseo, Señalización y Demarcación de Áreas, Elementos de Protección Personal, Equipo de Trabajo en Alturas, Brigada de Emergencia), Medicina del Trabajo (exámenes de ingreso y egreso, Diagnóstico de condiciones de Salud), Promoción y Prevención (Capitaciones estilos de vida y trabajo Saludables), Higiene Industrial (análisis de Riesgos, Mediciones Ambientales, Acciones de Seguimiento), Ambiental (saneamiento básico, control al medio ambiente).

3.3 Registro de control de afiliaciones

Para este periodo se presentaron ingresos del personal, se encuentra Activos con una totalidad de 36 en el proyecto.

Para el periodo analizado, se da cumplimiento con las afiliaciones hechas por el contratista directamente a ARL, AFP, EPS Y PARAFISCALES, así mismo se dio cumplimiento con el pago de seguridad social, el cual será verificado esté mes junto con las afiliaciones de todo el personal y luego se seguirá revisando mes a mes por parte de la interventoría.

Indicador de personal contratado

Ingresos directos del contratista:	21
Retiros del 15 Septiembre al 14 Octubre 2024:	0
Reingresos del 15 Septiembre al 14 Octubre 2024:	0
Ingresos de personal nuevo 15 Septiembre al 14 Octubre 2024:	15
Ingresos totales del periodo:	36

Tabla 5. Relación de personal que ingresa en el periodo analizado.

Anexo 2. Pago de aportes de Seguridad integral

3.4 Liquidaciones

Para el periodo analizado del 15 Septiembre al 14 Octubre 2024 no se presentaron liquidaciones.

3.5 Certificados de aptitud laboral (exámenes de ingreso)

Tienen como objetivo determinar las condiciones físicas y psicológicas de los aspirantes y trabajadores, a través de las evaluaciones médicas ocupacionales, ya que estos constituyen un instrumento importante en la elaboración de los

diagnósticos de las condiciones de salud de los trabajadores, con el fin de diseñar programas de prevención de enfermedades en pro de mejorar la calidad de vida de los trabajadores. Estos exámenes fueron realizados en la empresa Avanza.

Durante este periodo se realizaron exámenes de Ingresos.

INDICADOR DE CUMPLIMIENTO

$$IDC = \frac{No.ingresos\ nuevos\ en\ el\ periodo}{No.examenes\ de\ ingreso\ nuevos\ realizados} * 100$$

$$IDA = \frac{15}{15} * 100 = 100\%$$

3.6 Exámenes médicos de retiro (ordenes entregadas)

Durante el periodo del 15 Septiembre al 14 Octubre 2024 no se presentaron exámenes médicos de retiro.

Se da cumplimiento con la entrega de la orden para la práctica del examen de retiro al 100% de los retirados.

INDICADOR DE CUMPLIMIENTO

$$IDC = \frac{No.retiros\ durante\ el\ periodo}{No.notificación\ de\ examenes\ de\ egreso\ realizados} * 100$$

$$IDA = \frac{0}{0} * 100 = 100\%$$

Consolidado de exámenes de ingreso y egreso:

APTITUD LABORAL	CANTIDAD DE PERSONAL	%	ORDEN	%
Exámenes De Ingreso	15	100%	0	100%

Notificación de exámenes De Egreso	0	100%	0	100%

Tabla 6. Relación de prácticas de exámenes.

3.7 Registro de ausentismo

Para el periodo analizado se presenta el siguiente ausentismo en personas.

PERIODO	AT	EG	IJ	PP	C	OC	TOTALES
Octubre 17 al 16 Noviembre 2023	0	0	0	0	0	0	0
Noviembre 17 al 16 Diciembre 2023	0	0	0	15	1	15	31
Diciembre 17 2023 al 16 Enero 2024	1	2	0	4	1	0	6
Enero 17 al 16 Febrero 2024	2	1	0	4	1	0	8
Febrero 17 al 16 Marzo 2024	1	3	0	0	0	0	4
Marzo 17 al 16 Abril 2024	1	8	0	0	0	0	9
Abril 17 al 16 Mayo 2024	1	2	0	0	0	0	3
Agosto 15 al 14 Septiembre 2024	0	0	0	0	0	0	0
Septiembre 15 al 14 Octubre 2024	0	0	0	0	0	0	0

Tabla. Relación de ausentismo.

Convenciones
AT – Accidente de trabajo EG – Enfermedad general IJ – Injustificada
PP – Permiso personal C – Capacitación OC – Otras causas

3.8 Reporte de ausentismo, accidentes e incidentes laborales

En el periodo analizado no se presentó ausentismo.

TIPO DE AUSENTISMO EN OBRA		SEVERIDAD DE ACCIDENTALIDAD			TOTAL
		ACCIDENTE	INCIDENTE	CAUSA MÉDICA	
PRESENTADOS EN EL MES	Cantidad	0	0	0	0
DÍAS DE INCAPACIDAD	Cantidad	0	0	0	0
TOTAL	Cantidad	0	0	0	0

Tabla 7. Relación de accidentes.

3.9 Comité paritario de seguridad y salud en el trabajo (COPASST)

En el periodo analizado no se dio cumplimiento con la reunión conforme resolución 2013 de 1986.

ACTIVIDAD	REUNIÓN N.º	FECHA
Conformación del COPASST	0	15 Enero 2024
Reunión del Comité COPASST	1	16 Febrero 2024
Reunión del Comité COPASST	2	14 Marzo 2024
Reunión del Comité COPASST	3	12 Marzo 2024
Reunión del Comité COPASST	4	06 Mayo 2024

Tabla. Reuniones COPASST.

INDICADOR DE CUMPLIMIENTO

$$IDC = \frac{No.\,de\ actividades\ ejecutadas\ en\ el\ periodo}{No.\,de\ actividades\ Programa\ en\ el\ periodo} * 100$$

$$IDA = \frac{5}{5} * 100 = 100\%$$

Anexo. Acta COPASST contratista

3.10. Registro del plan de auditoría de seguridad y salud en el trabajo.

La interventoría realizó seguimiento al desarrollo de las actividades de Seguridad y Salud en el Trabajo, mediante comunicación constante con el contratista, comités de obra, inspecciones de seguridad, verificación del personal y envío de oficios, con el fin de tomar acciones correctivas frente a situaciones encontradas.

Así mismo se hace la claridad que a la fecha no se ha presentado ningún tipo de avance físico del proyecto y no se han realizado actividades operativas, fuera de inspecciones visuales y levantamientos topográfico del tramo a adecuar.

3.11. Permisos de trabajo

De acuerdo con el decreto 1409 de 2012, la empresa contratista da cumplimento mediante el programa de trabajo seguro en alturas con alcance a todos los trabajadores involucrados directa o indirectamente con este riesgo.

3.12. Elementos de protección personal

El contratista hace entrega de dotación al personal, ya que es una oportunidad para demostrarles a tus colaboradores el compromiso de la empresa.

Se entregó dotación a 36 trabajadores, se relacionan en la siguiente tabla:

DOTACIÓN
BOTAS DE SEGURIDAD
CAMISA
PANTALON
OVEROL
BUZO

Tabla 8. Relación de entrega EPP Y DOTACIÓN.

Anexo Entrega de Dotación al personal de la obra.

3.13. Condiciones de orden, aseo y limpieza.

Se hicieron inspecciones, con recomendaciones y acciones correctivas inmediatas.

Se realizaron campañas de aseo diarias por frente de trabajo, en medio de la jornada y al terminar la misma. Con el fin de mejorar en forma continua las Condiciones de trabajo, elevando la cantidad, la productividad, la salud y la satisfacción en el trabajo. se crea con el fin de crear y desarrollar hábitos y rutinas seguras. A su vez contribuye a disminuir la presencia de accidentes e incidentes de trabajo, facilita la detección de irregularidades en el mantenimiento de equipos y de espacios locativos, favorece la agilidad de los procedimientos y genera ambientes de trabajo confortables.



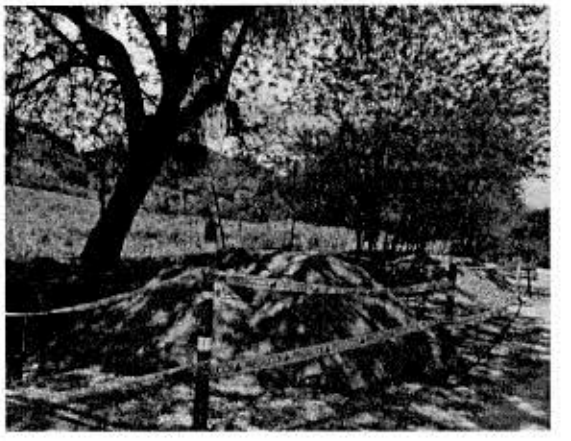
Anexos del contratista

3.14. Señalización y demarcación

Se han señalizado los frentes de trabajo, mediante la instalación de señales informativas y preventivas reglamentarias (oficina y frentes de trabajo), donde se

están haciendo las excavaciones profundas con cinta de peligro; la interventoría resalta que es un papel fundamental cuando se tiene la obligación de comunicar y dar a conocer de forma correcta, puede reducir al mínimo el riesgo de accidentes ocurridos en un ambiente de trabajo.





3.15. Inspecciones de seguridad

En este periodo se realizó inspecciones Preoperacionales de la pulidora.

3.16. Atención de emergencias

A la fecha objeto del reporte no se ha presentado ningún tipo de evento y/o emergencia.

3.16.1 Kit de Emergencias

Actualmente se cuenta con los "kit de primeros auxilios", en las oficinas, previo al inicio de actividades en campo.

3.17. Conformación de brigadas

A la fecha no se han conformado brigadas.

3.18. Reporte de capacitaciones y charlas

En el periodo analizado se presentaron las siguientes charlas y capacitaciones al personal de la obra.

3.19. Reporte de inducciones

Para el presente periodo del 15 Septiembre al 14 Octubre 2024, se presentaron inducciones.

INDICADOR DE CUMPLIMIENTO

$$IDA = \frac{No.\,de\ inducciones\ en\ el\ periodo}{No.\,de\ inducciones\ en\ el\ periodo} * 100$$

$$IDA = \frac{15}{15} * 100 = 100\%$$

INDICADOR DE CUMPLIMIENTO

$$IDA = \frac{No.\,de\ reinducciones\ en\ el\ periodo}{No.\,de\ reinducciones\ en\ el\ periodo} * 100$$

$$IDA = \frac{0}{0} * 100 = 100\%$$

3.20. Identificación de peligros y riesgos químicos.

En el periodo objeto de reporte no se han desarrollado actividades de riesgo y/o avance físico del proyecto.

3.21. Condiciones de salud y saneamiento.

Se continua con el control de condiciones de salud de los trabajadores en obra y administrativos.

En el periodo objeto de reporte no se han desarrollado actividades de riesgo y/o avance físico del proyecto

3.22. Sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo interventoría

Actividades de la interventoría:

- Verificación del control de personal en obra.
- Seguimiento al pago de liquidaciones.
- Participación de Comités de obra semanal.
- Revisión a documentación legal, como complemento al SG-SST.
- Verificar el cumplimiento con los certificados de aptitud laboral.
- Verificar las afiliaciones al personal que ingresa a obra.
- Verificar la entrega y uso de los elementos de protección personal.

- Revisión del informe mensual SST.
- Seguimiento a las actividades del SG-SST.
- Revisión al pago de seguridad social.
- Seguimiento al cumplimiento con la entrega de dotación.
- Seguimiento al cumplimiento de los protocolos de bioseguridad.

El CONSORCIO VIAL 2023 es consciente de su responsabilidad en poner en práctica las medidas necesarias que contribuyan a mantener y mejorar los niveles de eficiencia en las operaciones de la empresa y brindar a sus trabajadores un medio laboral seguro, preservar, mantener y mejorar la salud individual y colectiva de los trabajadores en sus correspondientes ocupaciones de manera multidisciplinaria.

Consideramos que la planeación es una de las herramientas más efectivas y eficientes que permiten organizar e integrar los recursos humanos, físicos y financieros encaminados en lograr objetivos y metas establecidas por la empresa para el proyecto; por lo tanto, el presente Sistema de Gestión HSE para el contrato cuyo objeto es "INTERVENTORÍA TÉCNICA ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL A LOS CONTRATOS DE OBRA RESULTANTES DEL PROCESO DE LICITACIÓN LP-SI-013-2022, EL CUAL TIENE COMO OBJETO: MEJORAMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DEL TRAMO VIAL LA PINTADA – ARMA – PUENTE BOCAS, EN EL MUNICIPIO DE AGUADAS".

3.23. Manual del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo.

El plan está encaminado principalmente a:

- Preservar y mantener las mejores condiciones de salud, bienestar y equilibrio al trabajador, protegiendo de los riesgos que se puedan generar por el ambiente donde se lleven a cabo actividades y las que se deriven de la organización del trabajo.

- Brindar a sus trabajadores un medio laboral seguro, preservar la propiedad y productos del cliente y proteger el medio ambiente.

- Prevenir accidentes de trabajo y enfermedad laboral de la población trabajadora que interviene en la prestación del servicio.

3.24. Política de seguridad y salud en el trabajo.

3.24.1. Política integral HSEQ

El CONSORCIO VIAL 2023 desarrolla sus actividades alineadas con estándares de calidad, Seguridad y Salud en el Trabajo y medio ambiente; enfocando todos

sus recursos humanos, físicos, técnicos y económicos en el cumplimiento de necesidades y expectativas de trabajadores y clientes.

Nuestra empresa enmarca sus acciones en el cumplimiento de las disposiciones legales, contractuales, técnicas y otras vigentes, aplicables a la actividad económica de la organización, incluyendo el fomento de la responsabilidad social en nuestro grupo de interés. El sistema de Gestión Integral de la compañía incluye a proveedores y subcontratistas que se involucran en nuestras operaciones.

En concordancia con el Compromiso Gerencial, CONSORCIO VIAL 2023 orienta sus esfuerzos en:

- Promover la calidad de vida laboral de sus trabajadores, prevenir accidentes de trabajo, lesiones personales, enfermedades ocupacionales, daños a la propiedad y minimizar el impacto socio-ambiental que se pueda causar durante el desarrollo de nuestras actividades; enfatizando la implementación de los siguientes programas prioritarios:

- Desarrollar programas de gestión sobre riesgos aceptables con control específico relacionados con factor de riesgo Biomecánico (Movimientos repetitivos miembros superiores y postura prolongada) y riesgo de seguridad vial.

- Desarrollar programa de Gestión Ambiental para prevenir la contaminación al medio ambiente asociados a aspectos significativos, como la generación de residuos y consumo de recursos naturales.

- Desarrollar programas de capacitación para impulsar la cultura en Seguridad y salud en el Trabajo y protección del medio ambiente, gestionar el auto cuidado, fomentar la preservación y uso eficiente de los recursos naturales en todos los colaboradores y personal involucrado en nuestras operaciones.

- Mejorar continuamente el desempeño de los procesos, productos y servicios establecidos en los sistemas de gestión de la organización.

3.24.2 Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial.

Para el periodo analizado, es publicado nuevamente el Reglamento de Higiene Y Seguridad, en un punto estratégico en la oficina y el cual es socializado con todas las personas que inicia su vínculo laboral con nuestro consorcio.

3.25 Afiliación y cobertura a la seguridad social y parafiscales.

El CONSORCIO VIAL cumple con los procesos de pago de seguridad integral del personal vinculado al proyecto, en el área de interventoría.

INDICADOR DE CUMPLIMIENTO

$$IDA = \frac{No.\,empleados\ con\ cobertura\ a\ la\ seguridad\ S}{No.\,empleados\ en\ el\ periodo} * 100$$

$$IDA = \frac{9}{9} * 100 = 100\%$$

3.26. Certificados de aptitud laboral

3.26.1 Exámenes médicos de ingreso (ordenes entregadas)

Tienen como objetivo determinar las condiciones físicas y psicológicas de los aspirantes y trabajadores, a través de las evaluaciones médicas ocupacionales, ya que constituyen un instrumento importante en la elaboración de los diagnósticos de las condiciones de salud de los trabajadores, con el fin de diseñar programas de prevención de enfermedades en pro a mejorar la calidad de vida de los trabajadores. En el periodo analizado se presentó el ingreso de la totalidad del equipo de interventoría.

3.26.2 Exámenes médicos de retiro (ordenes entregadas)

No se ha presentado retiro de personal vinculado a la interventoría.

3.27. Registro de ausentismo

Para el periodo analizado no se presenta ausentismo.

PERIODO	AT	EG	IJ	PP	C	OC	TOTALES
AÑO 2024							
Enero	0	0	0	0	0	0	0
Febrero	0	0	0	0	0	0	0
Marzo	0	0	0	0	0	0	0
Abril	0	0	0	0	0	0	0
Mayo	0	0	0	0	0	0	0
Agosto	0	0	0	0	0	0	0
Septiembre	0	0	0	0	0	0	0
Octubre	0	0	0	0	0	0	0

Tabla 9. Relación de ausentismo.

Convenciones

AT – Accidente de trabajo EG – Enfermedad general IJ – Injustificada
PP – Permiso personal C – Capacitación OC – Otras causas

3.28. Comité paritario de seguridad y salud en el trabajo (COPASST) o vigía de SST

La interventoría da cumplimiento con la resolución 2013 de 1986.

ACTIVIDAD	REUNIÓN N.°	FECHA
Acta Reunión COPASST	1	18 Diciembre 2023
Acta Reunión COPASST	2	18 Enero 2024
Acta Reunión COPASST	3	18 Abril 2024
Acta Reunión COPASST	4	12 Mayo 2024
Acta Reunión COPASST	5	18 Septiembre 2024

3.29. Reporte e investigaciones y acciones correctivas para accidentes e incidentes laborales.

En el periodo analizado, No se presenta ningún accidente laboral.

TIPO DE AUSENTISMO EN OBRA		SEVERIDAD DE ACCIDENTALIDAD		
		ACCIDENTE	INCIDENTE	OTRAS CAUSAS
FRECUENCIA DE ACCIDENTALIDAD	Cantidad	0	0	0
	%	0%	0%	0%
DÍAS DE INCAPACIDAD	Cantidad	0	0	0
	%	0%	0%	0%
TOTAL	Cantidad	0	0	**0**

Tabla Severidad de accidentes

3.30. Elementos de protección personal y dotación

3.30.1 Entrega de dotación:

Para el Periodo de Septiembre y octubre se hizo entrega de dotación al personal de interventoría.

3.31. Condiciones de orden, aseo y limpieza

La interventoría por sus actividades operativas no genera residuos especiales.

3.33. Inspecciones de seguridad

Para el periodo analizado se realizaron inspecciones donde no se ha presentado avance físico:

INDICADOR DE CUMPLIMIENTO

$$IDA = \frac{No.\,de\ inspecciones\ ejecutadas\ en\ el\ periodo}{No.\,de\ inspecciones\ planeadas} * 100$$

$$IDA = \frac{3}{3} * 100 = 100\%$$

3.34. Atención de emergencias

A la fecha objeto del reporte no se ha presentado ningún tipo de evento y/o emergencia.

3.35. Reporte de capacitaciones

Para el periodo analizado, Se realizó una capacitación en seguridad y salud en el trabajo.

INDICADOR DE CUMPLIMIENTO
$IDA = \frac{No.\,de\ capacitaciones\ ejecutadas\ en\ el\ periodo}{No.\,de\ capacitaciones\ programadas\ en\ el\ periodo} * 100$
$IDA = \frac{1}{1} * 100 = 100\%$

3.36. Realización de pausas activas

Las pausas activas se realizan de manera diaria con duración de 10 minutos en las áreas administrativas.

3.37. Reporte de inducciones

En el periodo objeto de reporte se realizó la inducción al equipo de interventoría para inicio de actividades.

Capítulo 4. PROGRAMA DE GESTIÓN SOCIAL

El documento es presentado por la firma interventora Consorcio Vial 2023 para dar cumplimiento a los compromisos en materia de Gestión Social con la ejecución del contrato de Interventoría CO1.PCCNTR.5373140 cuyo objeto es "INTERVENTORÍA TÉCNICA ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL A LOS CONTRATOS DE OBRA RESULTANTES DEL PROCESO DE LICITACIÓN LP-SI-013-2022, EL CUAL TIENE COMO OBJETO: MEJORAMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DEL TRAMO VIAL LA PINTADA – ARMA – PUENTE BOCAS, EN EL MUNICIPIO DE AGUADAS", supervisara las actividades del contratista.

En el presente informe encontrará el seguimiento y verificación realizado por la Interventoría en el área de Gestión Social a las actividades ejecutadas por el Contratista durante el periodo correspondiente desde el 15 de Septiembre al 14 de Octubre del 2024.

4.1 Programas

4.1.1. Capacitación y concientización para el personal de obra

El contratista no ha realizado capacitaciones al personal de la obra.

4.1.2. Atención a la comunidad

Durante este periodo el contratista brindo la atención correspondiente en los buzones satélites y en las oficinas de atención al ciudadano en los horarios establecidos. Los anteriores se encuentran ubicados en:

UBICACIÓN	DIRECCIÓN	MEDIO DE RECEPCIÓN	PQR RECIBIDAS	TIPO DE PQR
Subestación de la policía	Corregimiento Arma	Buzón satélite	0	

NOTA: Hasta momento no se ha presentado ninguna solicitud de PQR.

PQR:

INDICADOR DE CUMPLIMIENTO

$$IDA = \frac{No.de\ PQR\ respondidas\ \ en\ el\ mes}{No.de\ PQR\ recibidas\ en\ el\ mes} * 100$$

$$IDA = \frac{0}{0} * 100 = 100\%$$

4.1.3. Información y divulgación

Las actividades de socialización y divulgación están en proceso de concertación con la Gobernación de Caldas y una vez se cuente con fecha programada se efectuará el seguimiento y control respectivo:

- ***A nivel organizacional:***
- Se realiza capacitaciones con el personal de la obra.
- ***A nivel municipal y departamental:***
- Durante el periodo correspondiente se elaboraron cuatro circulares informativas, las cuales fue compartida a través de redes sociales (Facebook, WhatsApp) por la cuenta de medio de comunicación digital Brumas Casa Audiovisual, entrega de manera física algunos habitantes del sector y transeúntes, al transporte público y privado:

INDICADOR DE CUMPLIMIENTO

$$IDC = \frac{No.de\ acciones\ realizadas}{No.de\ acciones\ programadas} * 100$$

$$IDA = \frac{6}{6} * 100 = 100\%$$

4.1.4 Manejo de infraestructura de predios y de servicios públicos

- ***Actas de vecindad:***

En los periodos de seguimiento de los meses de Septiembre y Octubre, no se realizaron Actas de vecindad y Permisos de intervención, la interventoría le solicita al contratista realizar el seguimiento de las actas que se aplicaron en los meses anteriores.

RELACION ACTAS DE VECINDAD		
No	**ABSCISA**	**NOMBRE DEL PROPIETARIO**
1	K27+490	JORGE RIOS
2	K28+840	GREGORIO NACIANCENO SALDARRIAGA
3	K28+890	LONIDAS PASCUAL GAVIRIA
4	K28+920(Hacia al Rio)	PEDRO PASCUAL GAVIRIA
5	K28+930	ALDEMAR GAVIRIA GIL
6	K28+950	ALEYDA MARIA NARVAEZ
7	K29+150	FERNANDO PELAEZ

- ***Permisos de intervención:***

AUTORIZACIONES INTERVENCION DE PREDIOS		
No	**ABSCISA**	**PROPIETARIO**
1	K 26+960 AL 277 280	BENICIO PELAEZ BOMBAY
2	K 26+960 AL 28+820	BENICIO PELAEZ BOMBAY FINCA LA CEIBA
3	K28+840 AL 29+960	FERNANDO PELAEZ
4	K27+280 AL 28+840	JORGE JUAN RIOS

- ***Actas de Entorno:***

En los periodos de seguimiento de los meses de Agosto Y septiembre, no se realizaron Actas de vecindad y Permisos de intervención, la interventoría le solicita al contratista realizar el seguimiento de las actas que se aplicaron en los meses anteriores.

RELACION ACTAS DE ENTORNO		
No	**ABSCISA**	**NOMBRE DEL PROPIETARIO**
1	FINCA ORO HERMANOS	JORGE IVAN RIOS

Indicadores de cumplimiento:

INDICADOR DE CUMPLIMIENTO

$$IDC = \frac{No.\,de\ actas\ de\ vecindad\ elaboradas}{No.\,de\ predios\ existentes\ en\ el\ area\ de\ influencia} * 100$$

$$IDC = \frac{7}{7} * 100 = 100\%$$

INDICADOR DE CUMPLIMIENTO

$$IDC = \frac{No.\,de\ autorizacion\ de\ predios\ realizadas}{No.\,de\ predios\ identificados} * 100$$

$$IDA = \frac{4}{4} * 100 = 100\%$$

INDICADOR DE CUMPLIMIENTO

$$\frac{No.\,de\ actas\ de\ Entorno\ elaboradas}{No.\,de\ predios\ existentes\ en\ el\ area\ de\ influencia} * 100$$

$$IDA = \frac{1}{1} * 100 = 100\%$$

Consolidado de manejo de infraestructura de predios y de servicios:

TIPO DE MANIFESTACIÓN	CANTIDAD		ESTADO DE LA MANIFESTACIÓN			
	N°	%	ABIERTOS	%	CERRADAS	%
Actas de Vecindad	7	100%	7	100%	0	100%
Intervención de Predios	4	100%	4	100%	4	100%
Actas de Entorno	1	100%	1	100%	1	100%
TOTAL	12	100%	12	100%	5	100%

Tabla 10. Consolidado de manejo de infraestructura de predios y de servicios.

4.1.4. Manejo de cultura vial y participación comunitaria

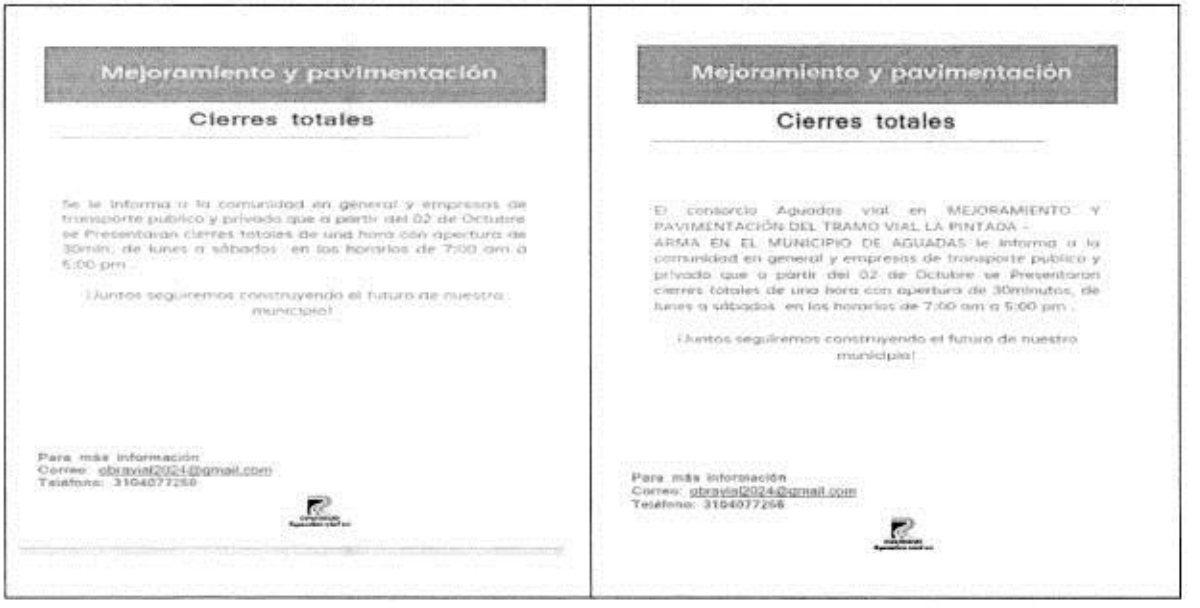
Durante el periodo correspondiente se elaboraron cuatro circulares informativas, las cuales fue compartida a través de redes sociales (Facebook, WhatsApp) por la cuenta de medio de comunicación digital Brumas Casa Audiovisual, entrega de manera física algunos habitantes del sector y transeúntes, al transporte público y privado:

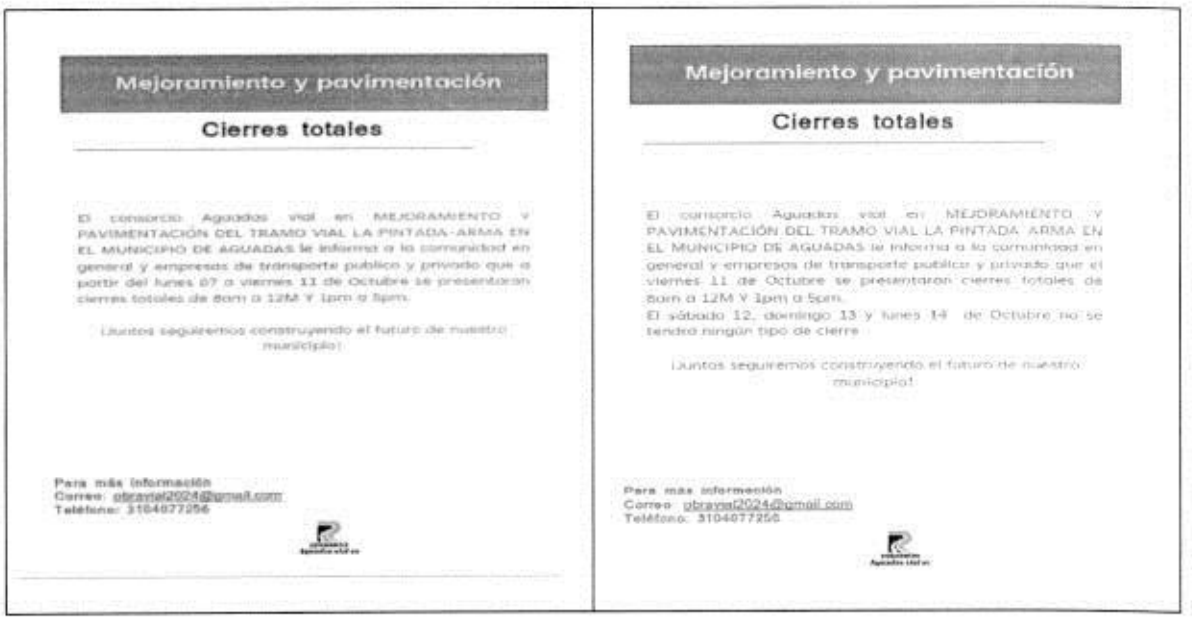
Se realizó comité de veeduría ciudadanía el día 27 de septiembre del 2024 con los representantes de veeduría, el alcalde de aguadas Fabio Gómez, el secretario de gobierno John Faber Ramírez, la profesional social de la secretaria de gobierno Laura González, la interventoría del consorcio vial 2023 y el contratista de obra consorcio aguadas vial VC, con el fin de informar a la comunidad sobre los diferentes avances en obra, se aclaran dudadas sobre las intervenciones, cierres viales, también se les menciona el tiempo de la obra, se les socializan los diferentes medios de atención a la comunidad y las estrategias que se utilizaran para la divulgación de la información.

Anexos N.1 del contratista.



Anexos N.2 del contratista.





Comité de veeduria ciudadana



Comite de Tecnico de obra,Gobernacion de caldas,Obra y Interventoria





INDICADOR DE CUMPLIMIENTO

$$IDC = \frac{No.\,de\ infografias\ enviadas}{No.\,de\ infografias\ programadas} * 100$$

$$IDA = \frac{6}{6} * 100 = 100\%$$

4.1.5. Contratación mano de obra

INDICADOR DE CUMPLIMIENTO

$$IDC = \frac{No.\,de\ infografias\ enviadas}{No.\,de\ infografias\ programadas} * 100$$

$$IDA = \frac{36}{36} * 100 = 100\%$$

4.1.5. Contratación mano de obra

En el periodo comprendido entre el 15 de Septiembre al 14 de Octubre de 2024 se presenta la vinculación del siguiente personal por parte del contratista:

Mano de obra	Total, activos	Total, activos de la zona	Mujeres	Hombres
Calificada	12	1	4	8
No calificada	24	19	4	15
Total	36	20	8	23

4.1.6. Contratación mano de obra de Interventoría

En el periodo comprendido entre el 15 de Septiembre al 14 de Octubre del 2024 se presenta la vinculación del siguiente personal:

CARGO	CONTRATADOS POR EL CONSORCIO	ACTIVOS
Ingeniero Residente	1	1
Director	1	1
Secretaria	1	1
Topógrafo	1	1
Cadenero	2	2
Ingeniero Auxiliar	1	1
Sst-Social	1	1
Ingeniero Ambiental	1	1

Tabla. Personal de Interventoría.

INDICADOR DE CUMPLIMIENTO

$$IDC = \frac{No.\,de\ trabjadores\ contratados}{No.\,de\ trabajadores\ del\ area\ de\ influencia\ cotratados} * 100$$

$$IDA = \frac{9}{9} * 100 = 100\%$$

GOBIERNO DE CALDAS	ACTA DE MECANISMOS DE INTEGRACION SIG Acta de comité con veeduría ciudadana- ARMA.	Código: FO-GD-02-033 Versión: 06 Fecha modificación: 29/01/2020

Mecanismo de Integración / Proceso: Contrato de Obra No. 1457 de 2023	**Acta N°:** 3
Objetivo: Reunión de seguimiento de avances de obra, entre profesionales de obra, interventoría y supervisión.	
Objeto Contractual (Si Aplica): MEJORAMIENTO Y PAVIMENTACION DEL TRAMO VIAL LA PINTADA – ARMA-PUENTE BOCAS, EN EL MUNICIPIO DE AGUADAS.	
Fecha: 28/9/23 **Lugar:** Comité técnico de seguimiento – Sala veeduría del Proyecto "ARMA"	**Hora de Inicio:** 2:30PM **Hora de Terminación:** 3:30PM

Tipo:	**Informativo:** X	**Consultivo:**	**Decisivo:**

Nombres y Apellidos	Rol				Cargo	Dependencia / Entidad
	Integrante	Invitado	Asist.	Ausent.		
Fabio Gómez Mejía		✓			Alcalde Aguadas	Alcaldía Aguadas
[illegible]	X				Interventoría	Consorcio Vial 2023
Luis Miguel Sierra B.	X				Interventoría	Consorcio Vial 2023
[illegible]	X				[illegible]	Consorcio Vial
[illegible]	X				Contratista	Consorcio V.C
[illegible]	X				Gerente	Consorcio V.C.
[illegible]	X	✓			Secretario Juridico	[illegible]
[illegible]	X				Contratista.	Consorcio
[illegible]	X				contratista	consorcio
[illegible]	X				Sup. Social - SST	Consorcio

Agenda:

1. Presentación del quorum
2. Temas por tratar
3. Desarrollo de la reunión
4. Compromisos
5. Disposición final

Desarrollo de la Agenda:

Presentación asistentes a la reunión con la veeduría.
- el secretario de interventoría de la Gobernación explica la parte de los efectos económicos del Proyecto, con los ajustes económicos que toca hacer, asimismo explica el estado del contratista, y los inconvenientes que se han presentado por los cuales se ha tenido que dar prorroga al Proyecto.
- la interventoría hace lectura y explicación de las obras ejecutadas a la fecha y la cantidad que falta por ejecutar.

1

Powered by CamScanner

GOBIERNO DE CALDAS	ACTA DE MECANISMOS DE INTEGRACION SIG	Código: FO-GD-02-033 Versión: 06 Fecha modificación: 29/01/2020

- se explica el sistema a utilizar en la Vía, base estabilizada y carpeta asfáltica.
* En la obra se había instalado 300m de base estabilizada la cual debido al abandono de la obra y al estar expuesta a la intemperie y al paso vehicular, por lo tanto se debe intervenir nuevamente
* En cuanto a la sección del contrato y todo el proceso adelantado para esto, se realizó una prorroga en el contrato hasta el 15 de noviembre, se debe tener en cuenta que hubo un mes muerto para el avance de las actividades, el cual fue utilizado para la inestabilidad del contrato lo cual puede generar algun atraso en la programación de la obra Por lo tanto se puede generar la necesidad de una nueva prorroga en el contrato.
* Se analiza la situación del estado actual del tanton abierto dentro de la Protección del Proyecto, la cual queda pendiente de una visita técnica para realizar estudios y dar solución a fallas presentadas a la fecha en la estructura del Puente
* Solicitan y agradecen la socialización que están haciendo el contratista sobre la intervención del Proyecto.
* Solicitan se realice información del avance de obra
* COMPROMISO Realizar reunión con veeduría cada mes.

Compromisos / Tareas	Fecha (dd/mm/aa)	Responsable

Powered by CamScanner

GOBIERNO DE CALDAS	ACTA DE MECANISMOS DE INTEGRACION SIG Acta de comité con veedurías ciudadanas - ARMA	Código: FO-GD-02-033 Versión: 06 Fecha modificación: 29/01/2020

Mecanismo de Integración / Proceso: Contrato de Obra No. 1457 de 2023	**Acta Nº: 5**
Objetivo: Reunión de seguimiento de avances de obra, entre profesionales de obra, interventoria y supervisión.	
Objeto Contractual (Si Aplica): MEJORAMIENTO Y PAVIMENTACION DEL TRAMO VIAL LA PINTADA – ARMA-PUENTE BOCAS, EN EL MUNICIPIO DE AGUADAS.	
Fecha: 28/9/2024	**Lugar:** Comité técnico de seguimiento – Instalación de Obra **Hora de Inicio:** 2:00PM **Hora de Terminación:** 3:30PM

Tipo:	**Informativo:** X	**Consultivo:**	**Decisivo:**

Nombres y Apellidos	Rol				Cargo	Dependencia / Entidad
	Integrante	Invitado	Asist.	Ausent.		
Edgar Mauricio Pulgarin	Interventor				Ap. Ingeniero	Interventoria
Hugo Restrepo Pinzón	Veeduría				Interventor	Veeduría
Nilda Tangarife	Veeduría					Veeduría
Javier Bolaños Lopez	Veeduría				Presidente	Veeduría
[illegible]	Ing.				Obra	Obra
Ignacio Montes D	Gobernación	X			Ingeniero	Gobernación
Fernando Mateo	Veeduría	X	X		Secretario	Veeduría
Juan Pablo PEÑA M	PODIAS	X			Comunidad	Aguadas
Adel Ortegón	Concejo	X			Concejal	Concejo Municipal
Jorge Hernán Ramírez	Interventoría	X			Interventor	Jorge Hernán R.

Agenda:

1. Presentación del quorum
2. Temas por tratar
3. Desarrollo de la reunión
4. Compromisos
5. Disposición final

Desarrollo de la Agenda:

1

Powered by CamScanner

GOBIERNO DE CALDAS	ACTA DE MECANISMOS DE INTEGRACION SIG Acta de comité con veeduría ciudadana - ANLA	Código: FO-GD-02-033 Versión: 06 Fecha modificación: 29/01/2020

	Lugar	Fecha	Hora
Próxima Reunión	Comité técnico de seguimiento –		
Tomó nota de ésta acta	Luis Miguel Suaza/R.L. Consorcio Vial 2023 (Interventoría) – José Erley Vitoviz Ortiz/ Ingeniero auxiliar de interventoría.		

Firmas:

LINA OLIVA	

Powered by CamScanner

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

El Contratista viene ejecutando las actividades propuestas en el Plan de Manejo de Transito PMT. La Interventoría realiza el acompañamiento a todas las actividades realizadas por el Contratista en el proceso de ejecución de la obra.

La Interventoría recomienda al Contratista:

5.3 Componente SST

La interventoría le da las siguientes sugerencias al contratista para tener en cuenta:

- Realizar inspecciones de seguridad.
- Inspecciones de los Elementos de Primeros Auxilios.
- Presentar la planilla de seguridad social.
- Capacitaciones al personal de obra.

5.4 Programa de gestión social

En los periodos de seguimiento de los meses de Septiembre y Octubre, no se realizaron Actas de vecindad y Permisos de intervención, la interventoría le solicita al contratista realizar el seguimiento de las actas que se aplicaron en los meses anteriores, realizar capacitaciones al personal de la obra.

5.5 Plan de Manejo de Transito

Las señalizaciones presentadas por el Contratista en el documento Plan de Manejo de Transito; no se evidencia dentro de la obra; poniendo en riesgo a los trabajadores y la comunidad que frecuenta y transita diariamente por la obra.

La interventoría le hace un llamado al contratista implementar los elementos del Plan de manejo transito propuesto por el contratista.
