EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO GIRACOM
Radicado Entrada No.20230099
SE: 0000 - SUB: 0000
YESENIA HENAO QUICENO
DESTINATARIO ----------
Franklin Duque Gómez
2023-03-17 10:16

EQUICONSTRUCCIÓN S.A.S

16 marzo de 2023

Oficio No 002-2023-Zarzagueta.Interv.

Franklin Duque Gómez
Supervisor
GIRACOM

Referencia: CONTRATO DE OBRA No 002 DEL 24 DE ENERO DE 2023 cuyo objeto es "CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE VEHICULAR EN LA VEREDA ZARZAGUETA EN EL MUNICIPIO DE HISPANIA".

Asunto: Documento Acta No 01 de Obra e Interventoría.

Con la presente estamos entregando los documentos de acta de cobro parcial de obra e interventoría en tres (3) copias así:

- Interventoría: (3 copias).

1. Factura Electrónica No FEEQ48
2. Resolución de Facturación
3. Certificación Bancaria
4. Copia del RUT
5. Parafiscales de Enero y febrero de 2023.
6. Copia de las planillas de seguridad social de enero y febrero 2023.
7. Matricula del contador
8. Vigencia de matrícula de Contador.
9. Informe de Interventoría No 01 del 26 de enero al 25 febrero de 2023.
10. Anexos del informe. (Se enviaron en medio magnético).

- Obra (3 Copias).

1. Factura Electrónica CSAS1571
2. Copia de Acta de Obra No 01.
3. Memorias de Cantidades del Acta No 01.
4. Resolución de Facturación
5. Certificación Bancaria
6. Copia del RUT
7. Parafiscales de marzo 2023.
8. Copia de Seguridad social de enero y febrero 2023.

EquiConstrucción S.A.S
NIT. 900.307.818- 1
Calle 87 sur # 55 – 552 casa 2
Tel: 314 219 55 57
La Estrella – Colombia

9. Copia de Cedula de contador
10. Matricula profesional del contador
11. Vigencia de Contador

Atentamente,

EQUICONSTRUCCIÓN S.A.S.
ALVARO MIGUEL SOLANO ARROYO
INTERVENTORÍA

EQUICONSTRUCCION SAS
NIT: 900307818-1
Régimen: Responsable del impuesto sobre las ventas –IVA
Persona Jurídica
CL 87 SUR 55 552 CA 2, La Estrella, Antioquia, Colombia
Tel. 5590565
Email. equiconstruccion.fe@gmail.com
Autorización factura electrónica de venta No. 18764037629098 válida desde 2022-10-10 hasta 2023-10-10 rango desde FEEQ35 hasta FEEQ200.

Cliente:	EMPRESA PARA LA COMPETITIVIDAD TERRITORIAL DEL MUNICIPIO DE GIRARDOTA
NIT:	901464458
Dirección:	CR 14 # 7 - 21 ED. BOLIVAR, Girardota, Antioquia, Colombia
Teléfono:	6044603870
Email:	contactenos@giracom.com.co
Tipo de negociación:	Contado
Medio de Pago:	Acuerdo mutuo
Fecha de Pago:	31/03/2023
Total de Lineas:	1

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA:	**FEEQ48**
MONEDA:	**COP Colombia, Pesos**
HORA EMISIÓN:	**15:08:41**
FECHA FIRMADO:	**16/03/2023 15:08:42**

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
16	03	2023	31	03	2023

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U. MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO U.	IVA	DCTO.	TOTAL
1	001	COSTO DIRECTO ACTA DE INTERVENTORIA No 001 y Parcial del CONTRATO DE CONSULTORÍA No. 002 DEL 24 DE ENERO DE 2023 cuyo Objeto es : ?INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA CONSTRUCCIÓN DE PUENTE EN LA VEREDA ZARZAGUETA EN EL MUNICIPIO DE HISPANIA?	WSD	1,00	$16.371.024,00	19,00	0,00	$16.371.024,00

Notas:
Favor Consignar en la cuenta de Ahorros Banco Caja Social # 24113014444 a Nombre de EQUICONSTRUCCION S.A.S. Nit. 900.307.818-1

SON: (diecinueve millones cuatrocientos ochenta y un mil quinientos diecinueve pesos)
CUFE: 834d78de5eac518c821c949f1cb6eee23f5c46781f200ce76ff5d7a1b6a470febbe5514795659bf2875a10f521a80039

Subtotal:	$16.371.024,00
Cargos:	$0.00
Descuento:	$0.00
IVA:	$3.110.495,00
Total:	$19.481.519,00

IMPUESTO	BASE	TARIFA	IMPORTE
IMPUESTOS			
01 IVA	$16.371.024,00	19,00%	$3.110.495,00

Firma Digital: qCkguUdQRekRKESsATzRJUMO42uDL86TwHOovJmjGL2V9veiEO6Bej1KRHRJ1g8p
ndSjskplaGmtvqzywa1M0P5FHmmHjpcOlYGb/bxQ1i4HdPlYKV
Z0aYTGBYS0yUv dxQBe+SIMIlj3zAxj/k0Auq35uNLCYTzii05Lnchwa/VU3J8PO8TYoZqhM/5Cnda h3MatlUG9zVM1VsBPjmU4oTJdehayzVCFo
qtvADxhlLcs2GvfAkB6VvVlkl0i1R ZJxtt2pHieQEiSwmjfS0nIWvtWX6Me133lefdqdnSprCzPvFPHEWZF+oPtP01aO3 XSc0vHXqkWq5WKEN30+/
MQ==

Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.

facturatech
Software: e-Factura Proveedor tecnológico: cadena. Nit. 890.930.534-0

Municipio de Hispania – Antioquia

INFORME DE INTERVENTORIA No 001
DEL 26 ENERO AL 25 FEBRERO DE 2023.

OBJETO DEL CONTRATO

"CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE VEHICULAR EN LA VEREDA ZARZAGUETA EN EL MUNICIPIO DE HISPANIA"

GIRACOM EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO

UNIDOS POR LO SOCIAL
LEIDY JOHANA CARDONA RUEDA
ALCALDESA 2020 - 2023

EMPRESA PARA LA COMPETITIVIDAD TERRITORIAL
DEL MUNICIPIO DE GIRARDOTA - GIRACOM

MUNICIPIO DE HISPANIA

FEBRERO DE 2023

Contenido

1. INTRODUCCIÓN 4
2. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS 5
2.1. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO 5
2.2. LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO. 6
2.3. RESUMEN CONTRATO DE OBRA COP No 009-2022. 8
2.4. RESUMEN DEL CONTRATO DE 060 CD 2022 ..... **¡Error! Marcador no definido.**
2.5. CONTROL DOCUMENTAL. 10
2.5.1. Correspondencia recibida. 10
2.5.2. Correspondencia enviada. 10
2.6. CONTROL LABORAL 11
2.6.1. Registro de personal 11
2.6.2. Pagos salariales 13
2.6.3. Seguridad social 13
2.6.4. Paz y salvo de trabajadores 13
3. ASPECTOS LEGALES 14
3.1. GARANTIA UNICA CONTRATO DE OBRA No 009 DE 2021 14
3.1.1. Pólizas iniciales (por legalización del contrato y acta de inicio) 14
3.1.2. Pólizas modificadas ..... **¡Error! Marcador no definido.**
4. ASPECTOS FINANCIEROS. 17
4.1.1. Actas de cobro 19
5. ASPECTOS TÉCNICOS. 20
5.1. ALCANCE DEL PROYECTO 20
5.2. PROGRAMACIÓN VS EJECUCIÓN 20
5.3. ACTIVIDADES REALIZADAS Y EN EJECUCIÓN 21
5.4. RELACIÓN DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA E ÍTEMS NO PREVISTOS 22
5.5. BALANCE PRESUPUESTAL 23

5.6. CONTROL DE CALIDAD 23
5.7. ACTAS DE COMITÉS DE OBRAS 23
5.8. REGISTRO FOTOGRAFICO 24
5.9. LIBRO DIARIO DE OBRA/BITACORA DE OBRA 24
5.10. CLIMATOLOGÍA 24
5.11. MANUAL DE MANTENIMIENTO 24
6. ASPECTOS AMBIENTALES 25
6.1. MATERIALES DE OBRA 25
6.2. CONTROL DE EQUIPO Y MAQUINARIA 25
6.3. CONTROL DE VEHICULOS 25
7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 26
ANEXOS 27

1. INTRODUCCIÓN

El presente documento que se presenta a continuación contiene el informe No 001 de interventoría, correspondiente al período comprendido entre los días 26 de enero de 2023 al 25 de febrero de 2023, en cumplimiento de los artículos 82, 83, 84 y 85 de la ley 1474 de 2011, por medio de la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública.

Es un informe cuyo propósito es dejar consignado en escrito y para que la EMPRESA PARA LA COMPETITIVIDAD TERRITORIAL DEL MUNICIPIO DE GIRARDOTA - GIRACOM y la secretaria de planeación de Municipio de Hispania, esté totalmente enterado de la ejecución mes a mes del desarrollo del Contrato de Obra No 002 de 2023, cuyo objeto es: "CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE VEHICULAR EN LA VEREDA ZARZAGUETA EN EL MUNICIPIO DE HISPANIA".

El informe contiene básicamente los siguientes aspectos conformados por capítulos:

- Introducción
- Administrativo
- Financiero
- Legal
- Técnico
- Ambiental
- Conclusiones, así:

2. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS


2.1. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO

El proyecto consiste en la construcción de un puente de 30 metros de luz y 7.20 metros de ancho, simplemente apoyado en la vía terciaria que comunica a la vereda Zaragüeta sector Hoyo Grande, esto con el fin de garantizar la continuidad e interconectividad para quienes hacen uso de la red vial terciaria potenciando positivamente la agricultura, el comercio, la economía y en general las óptimas condiciones para la realización de las actividades de la población rural a beneficiarse.

Así pues, en el marco del cumplimiento del proyecto a efectuar, y en consecuencia a la atención a la necesidad planteada previamente de conformidad igualmente a los estudios y diseños técnicos correspondientes con los cuales se pretende llevar a cabo una adecuada ejecución, y conforme a las especificaciones requeridas de las actividades a ejecutar, se deberá tener en cuenta dentro del alcance de las siguientes las actividades y especificaciones plasmadas dentro de los documentos del proyecto viabilizado.

Dimensiones de diseño del puente:

- **Luz:** 30,0 metros
- **Ancho:** 7,20 metros
- **Galibo:** 4.5 metros
- **Descripción diseño**: Puente en losa en concreto reforzado apoyado simplemente sobre viga a cabezal fundada sobre 3 pilas a cada lado y protecciones en estribos laterales en concreto para crecientes.
- **Sistema de fundación**: 3 Pilas x estribo de 12 metros de 1.20 m de diámetro

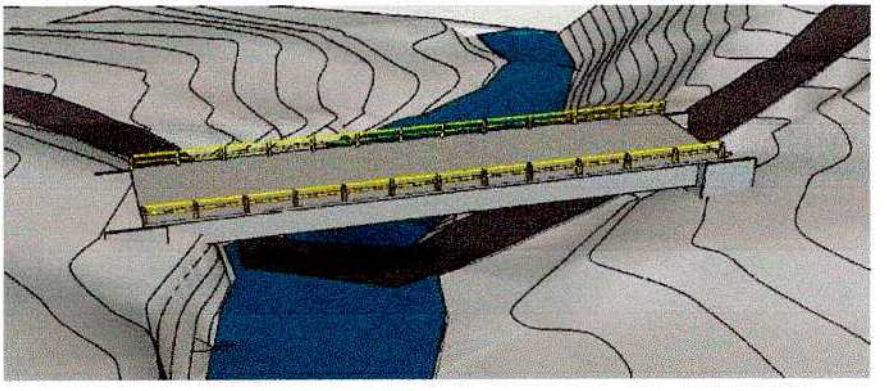


Línea dentro del plan de desarrollo del municipio:

PLAN DE DESARROLLO	LINEA ESTRATEGICA	SECTOR	PROGRAMA	INDICADOR DE PRODUCTO
Unidos por lo Social 2020 - 2023	Línea 2: Unidos construyendo un Hispania con desarrollo social.	2.1. Infraestructura	2.1.1. Vías y caminos que generan desarrollo.	2.1.1.1.5. Atención a la comunidad en infraestructura vial (los que demanden el servicio). 2.1.1.1.6. Mantenimientos oportunos en puentes veredales y caminos de herradura.

2.2. LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO.

Hispania es un municipio de Colombia, localizado en la subregión Suroeste del departamento de Antioquia. Limita por el norte con los municipios de Bolívar y Pueblorrico, por el este con el municipio de Pueblorrico, por el sur con los municipios de Andes y Betania y por el oeste con los municipios de Betania y Bolívar. Su cabecera dista 98 kilómetros de la ciudad de Medellín, capital del Departamento de Antioquia. El municipio posee una extensión de 58 kilómetros cuadrados.



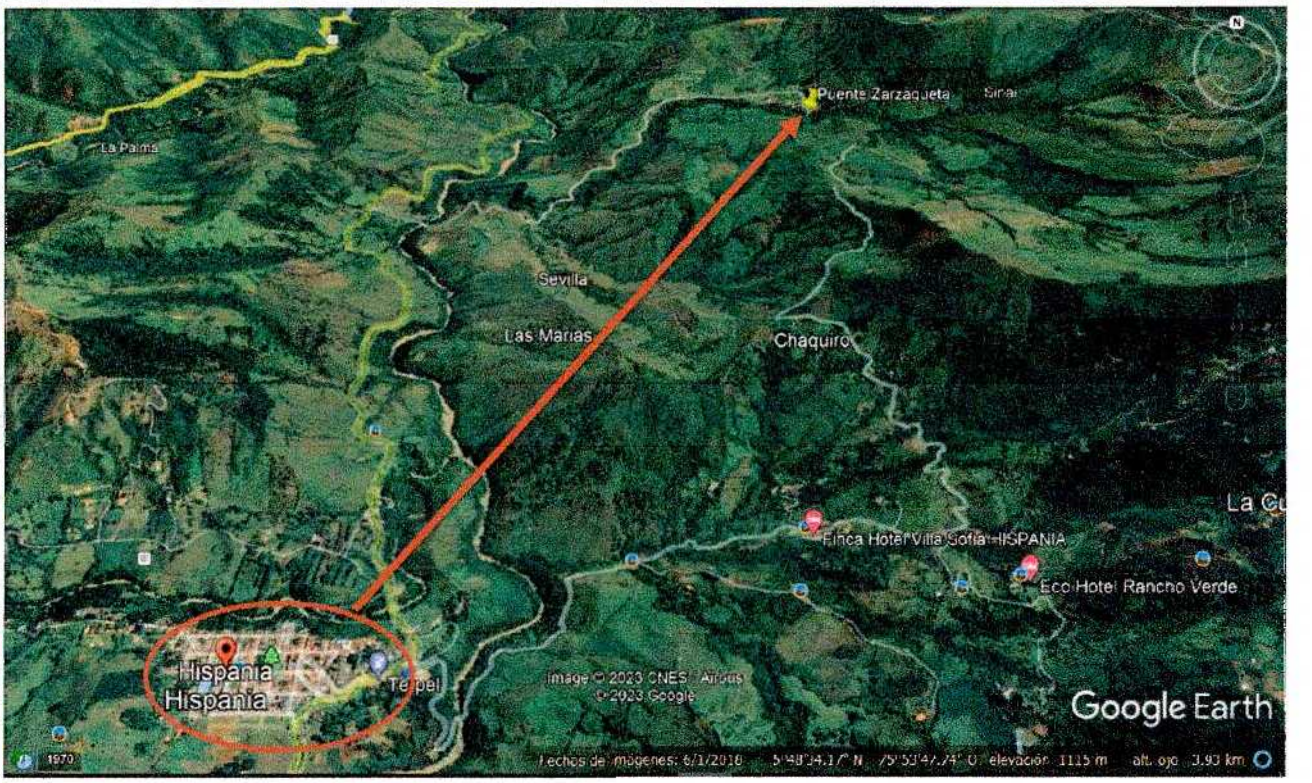



Coordenada según Google de la ubicación del puente a construir.

2.3. RESUMEN CONTRATO DE OBRA COP No 002-2023.

Contrato que nace de la invitación privada del contrato COP No 002-2023, y la suscripción de acta de inicio el día 26 de enero 2023. A continuación, se muestra cuadro administrativo:

Tabla 1 Resumen del contrato Nº 002 de 2023

CONTRATO COP No 002 - 2023	
OBJETO	CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE VEHICULAR EN LA VEREDA ZARZAGUETA EN EL MUNICIPIO DE HISPANIA.
CONTRATISTA	ING CONSTRUGENESIS S.A.S NIT. 901.281.615-2
DATOS CONTRATISTA	Rep. Legal: ALBERTO CARLOS GENES SOLANO CC. 1.067.863.440
VALOR DEL CONTRATO	MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS TREINTA PESOS M/L ($1.335.887.230).
ADICIÓN	No Aplica
PLAZO INICIAL	Siete (7) meses
FECHA DE INICIO	26 enero de 2023
FECHA DE TERMINACIÓN	26 agosto de 2023
DIAS TRANSCURRIDOS	30 días
DIAS FALTANTES	180 días
ANTICIPO (25%)	Trescientos treinta y tres millones novecientos setenta y un mil ochocientos siete pesos con cincuenta centavos ($333.971.807,50).

2.3.1 RESUEMN DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA.

Contrato que nace de la invitación privada del contrato de consultoría No 002-2023, y la suscripción de acta de inicio el día 26 de enero 2023. A continuación, se muestra cuadro administrativo:

Tabla 2 Resumen del contrato consultoría Nº 002 de 2023

CONTRATO CONSULTORIA No 002 - 2023	
OBJETO	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA CONSTRUCCION DE PUENTE EN LA VEREDA ZARZAGUETA EN EL MUNICIPIO DE HISPANIA
CONTRATISTA	EQUICONSTRUCCION S.A.S NIT. 900.307.818-1
DATOS CONTRATISTA	Rep. Legal: ALVARO MIGUEL SOLANO ARROYO Tel.: 314 219 55 57 Email: gerencia@equiconstruccion.com
VALOR DEL CONTRATO	CIENTO CINCUENTA Y UN MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL CIENTO NOVENTA Y TRES PESOS M/L ($ 151.498.193).
ADICIÓN	No Aplica
PLAZO INICIAL	Ocho (8) meses
FECHA DE INICIO	26 enero de 2023
FECHA DE TERMINACIÓN	26 septiembre 2023
DIAS TRANSCURRIDOS	30 días
DIAS FALTANTES	210 días
ANTICIPO (0%)	No Aplica

2.4. CONTROL DOCUMENTAL.

2.4.1. Correspondencia recibida.

En la siguiente tabla se relacionan las correspondencias recibidas hasta la fecha y se anexan a este informe.

Tabla 3. Correspondencia recibida medio físico

FECHA DE RADICACIÓN	REMITENTE	ASUNTO	ANEXO NO/SI, CUAL?
14-02-2023	Equiconstruccion S.A.S.	Documentos requeridos por la interventoría para informe mensual	No

ANEXO 1 CORRESPONDENCIA RECIBIDA.

2.4.2. Correspondencia enviada.

En la siguiente tabla se relacionan las correspondencias enviadas hasta la fecha y se anexan a este informe.

Tabla 4. *Correspondencia enviada en medio físico*

FECHA DE RADICACIÓN	DESTINATARIO	ASUNTO	ANEXO NO/SI, CUAL?
OF ICS 001-2023	Ing. Construgenesis SAS	Entrega de información solicitada oficio 001-2023 Zarzagüeta. Interv.	Si. ○ Presupuesto y APU del contrato ○ Hojas de vida del personal

			○ Afiliaciones del personal ○ Diseño de mezcla ○ Documentos de la cantera ○ Pólizas del contrato ○ Contrato de obra firmado y otro si
OF ICS 002-2023	Ing. Construgenesis SAS	Entrega de Programación de Obras	Si Programación en Excel y Project.

ANEXO 2 CORRESPONDENCIA ENVIADA

2.5. CONTROL LABORAL

2.5.1. Registro de personal

La interventoría realiza diario el registro de asistencia del personal de obra incluyendo el personal profesional, técnico, topógrafos, de maquinarias, obreros y personal derivados de subcontratos de algunas actividades.

ING CONSTRUGENESIS S.A.S								
AIU								
ITEM	**CÓDIGO**	**DESCRIPCIÓN**	**CANT**	**VALOR MENSUAL**	**PREST. SOC.**	**DEDIC. %**	**PLAZO**	**VALOR PARCIAL**
1	**EQUIPO PROFESIONAL**							**$ 61,873,000**
1.1	MO001	DIRECTOR DE OBRA	1.00	$ 5,000,000	$ 2,500,000	33%	7.00	$ 17,325,000
1.2	MO003	RESIDENTE DE OBRA	1.00	$ 3,200,000	$ 1,600,000	100%	7.00	$ 33,600,000
1.3	MO008	TECNÓLOGO SST	1.00	$ 2,000,000	$ 1,020,000	20%	7.00	$ 4,228,000
1.4	MO006	RESIDENTE SOCIO - AMBIENTAL	1.00	$ 3,200,000	$ 1,600,000	20%	7.00	$ 6,720,000
2	**PERSONAL TÉCNICO NO PROFESIONAL DE OBRA**							**$ 1,412,880**
2.1	MO013	SECRETARIA	1.00	$ 1,160,000	$ 858,400	10%	7.00	$ 1,412,880

***Tabla No 5**. Control de personal administrativo según la Discriminación de Administración*

CANTIDAD	CARGO	PERSONAL PROPUESTO	DEDICACION	PERFIL PROFESIONAL	CUMPLE/NO CUMPLE
1	Director de Obra	Ing. Civil DANIEL DAVID DIAZ REDONDO	33%	INGENIERO CIVIL CON 10 AÑOS DE EXPERIENCIA GENERAL, ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS QUE CERTIFIQUE MINIMO 2 CONTRATOS EN LOS QUE HAYA PARTICIPADO COMO ESPECIALISTA DE ESTRUCTURAS O DIRECTOR EN OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL	SI
2	Residente de Obra	Ing. Civil JUSTTIN ALBERTO GARCÍA.	100%	INGENIERO CIVIL CON 2 AÑOS DE EXPERIENCIA GENERAL CON UNA ESPECIALIZACION AFIN A LA INGENIERIA Y 2 CERTIFICADOS COMO RESIDENTE DE OBRA EN INFRAESTRUCTURA VIAL.	SI
3	Tecnólogo SST	JOHANIS VASQUEZ PADILLA	20%	PROFESIONAL O TECNICO EN SST O HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL, CON 10 AÑOS DE EXPERIENCIA GENERAL Y 2 CERTIFICADOS COMO INSPECTOR SISO O HSE EN CUALQUIER TIPO DE OBRA CIVIL	SI
4	Residente Socio-Ambiental	ING. JUAN DAVID DIAZ YANEZ	20%	INGENIERO AMBIENTAL O SANITARIO AMBIENTAL CON 5 AÑOS DE EXPERIENCIA GENERAL CON 2 CERTIFICADOS COMO INGENIERO AMBIENTAL O SANITARIO AMBIENTAL EN PROYECTOS DE OBRA CIVIL	SI
5	**Secretaria**	**NO ACREDITA**	**10%**		**NO**

ANEXO No 03 CONTROL DIARIO DE PERSONAL ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO

2.5.2. Pagos salariales

La interventoría mes a mes verifica con preguntas al personal operativo los pagos salariales de todo el personal operativo y administrativo. Al final de cada mes de deben presentar los paz y salvo y liquidaciones del personal que va siendo retirado del periodo.

En este mes no presentan retiros de personal, se presentan los ingresos del personal que habla el anexo No 03.

2.5.3. Seguridad social

La interventoría mes a mes recopila y verifica las afiliaciones y pagos de la seguridad social de todo el personal del proyecto de acuerdo a los pagos de nóminas y el control de personal.

ANEXO No 04. CONTROL DE SEGURIDAD SOCIAL

2.5.4. Paz y salvo de trabajadores

La interventoría mes a mes recopila y verifica de acuerdo a los requisitos de ley las liquidaciones que se presentan en la obra.

Se debe adjuntar copia de los soportes de las liquidaciones realizadas en el periodo que se presente con el lleno de los requisitos de ley, con firma y huella del trabajador.

En este mes **NO PRESENTAN RETIROS DE PERSONAL**, se presentan los ingresos del personal que habla el anexo No 03.

ANEXO 5. LIQUIDACIONES Y PAZ Y SALVO DE TRABAJADORES

2.5.5. Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST

Para los diferentes frentes de trabajo se realizó la entrega de los elementos de protección personal, los cuales quedan registrados en las planillas del informe PAPSO. También se puede evidenciar el informe de seguimiento al PMT la instalación de señalizaciones provisionales para el cierre de vía.

ANEXO 6. Seguimiento a Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST.

3. ASPECTOS LEGALES

3.1 GARANTIA UNICA CONTRATO DE OBRA No 002 DE 2022

3.1.1. Pólizas iniciales.

En cumplimiento de los términos de referencia y con el fin de poder legalizar el contrato de obra No 002 de 2023, el contratista presentó las respectivas pólizas iniciales.

Tabla 6 Pólizas iniciales para legalización.

COMPAÑÍA ASEGURADORA:	SEGUROS DEL ESTADO		
POLIZAS No.	75-44-101126608 CUMPLIMIENTO 75-40-101047427 RC	ANEXOS: 0 ANEXO: 0	
NOMBRE DEL AMPARO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	VALOR ASEGURADO
CUMPLIMIENTO	24-01-2023	24-04-2024	$400.766.169
PAGO SALARIO, PRESTACIONES SOCIALES	24-1-2023	24-08-2026	$276.177.446
DEVOLUCION DEL PAGO DE ANTICIPO	24-01-2023	24-04-2024	$33.971.807,5
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	24-02-2023	24-02-2028	$400.766.169
RCE	24-01-2023	24-08-2023	$232.000.000

Tabla 7. Pólizas actualizadas **con inclusión de Gobernación de Antioquia, GIRACOM y Municipio de Hispania.**

COMPAÑÍA ASEGURADORA:	**SEGUROS DEL ESTADO**		
POLIZAS No.	75-44-101126608 CUMPLIMIENTO 75-40-101047427 RC	ANEXOS: 2 ANEXO: 2	
NOMBRE DEL AMPARO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	VALOR ASEGURADO
CUMPLIMIENTO	30-01-2023	30-04-2024	$400.766.169
PAGO SALARIO, PRESTACIONES SOCIALES	30-1-2023	30-08-2026	$276.177.446
DEVOLUCION DEL PAGO DE ANTICIPO	30-01-2023	30-04-2024	$33.971.807,5
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	30-02-2023	30-02-2028	$400.766.169
RCE	30-01-2023	30-08-2023	$232.000.000

Nota: vemos que las vigencias de inicio de las pólizas se trasladaron de del 24 enero 2023 al 30 enero de 2023, lo cual según el acta de inicio debieron ser trasladadas desde el 26 de enero de 2023 y desde esa fecha se debió contar los demás tiempos de amparos. Se solicita al contratista actualizar las pólizas con la fecha del acta de inicio para las pólizas de cumplimiento y RC.

3.1.2. Tabla 8. Pólizas actualizadas con el Acta de inicio.

COMPAÑÍA ASEGURADORA:	SEGUROS DEL ESTADO		
POLIZAS No.	75-44-101126608 CUMPLIMIENTO 75-40-101047427 RC	ANEXOS: 4 ANEXO: 4	
NOMBRE DEL AMPARO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	VALOR ASEGURADO
CUMPLIMIENTO	26-01-2023	26-04-2024	$400.766.169
PAGO SALARIO, PRESTACIONES SOCIALES	26-1-2023	26-08-2026	$276.177.446
DEVOLUCION DEL PAGO DE ANTICIPO	26-01-2023	26-04-2024	$33.971.807,5
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	26-02-2023	26-02-2028	$400.766.169
RCE	26-01-2023	26-08-2023	$232.000.000

ANEXO 7. POLIZAS DEL CONTRATO CUMPLIMIENTO Y RC.

Notas: Las pólizas de cumplimiento y responsabilidad civil extracontractual se encuentran cumpliendo los montos y vigencias solicitadas en el contrato y en el anexo 4 se actualizaron a la fecha de inicio del contrato del 26 de enero de 2023.

4. ASPECTOS FINANCIEROS.

4.1 Buen manejo del anticipo.

PLAN DE MANEJO DE ANTICIPO

CONTRATO N°	004 DEL 24 ENERO DEL 2023
OBJETO:	CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE VEHICULAR EN LA VEREDA ZARZAGUETA EN EL MUNICIPIO DE HISPANIA"
CONTRATISTA:	ING CONSTRUGENESIS SAS
INTERVENTOR	EQUICONSTRUCCION SAS
VALOR:	$ 1.335.887.230,00
VALOR ANTICIPO :	$ 333.971.807,50
PLAZO EJECUCION DE LA OBRA:	7 MESES

N°	DESCRIPCION	UNID	CANT.	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL
1	Mano de Obra	GLB	1,00	$ 100.000.000,00	$ 100.000.000,00
2	suministro de Materiales de Construccion	GLB	1,00	$ 233.971.807,50	$ 233.971.807,50
	TOTAL A INVERTIR POR CONCEPTO DE ANTICIPO				$ 333.971.807,50

ALBERTO GENES SOLANO
Representante Legal de ING CONSTRUGENESIS SAS
CONTRATISTA

ALVARO SOLANO ARROYO
Representante Legal de EQUICONSTRUCCION SAS
INTERVENTORIA

Cuadro No 1. Plan de inversión de anticipo

El contratista de obra presento el plan de inversión de anticipo el cual fue aprobado y avalado por esta interventoría.

También se constituyo la fiducia para el manejo del anticipo con la entidad bancaria BANCO DE OCCIDENTE.

La empresa GIRACOM desembolso a la fiducia del BANCO DE OCCIDENTE el día 21-02-2023 un valor de anticipo de $ 333.971.807,5.

Para el periodo del informe el contratista ha invertido del anticipo entregado a la Fiduciaria BANCO DE OCCIDENTE un valor de $ 333.971.807,5 en un (1) desembolsos con un saldo a favor por invertir de $0. En este periodo la interventoría autorizo el desembolso de anticipos a terceros donde se garantizó una buena inversión del anticipo en materiales, equipos y herramientas.

ANEXO 8. SOPORTES DE GIROS No. 01 DEL ANTICIPO Y CONTRATO DE FIDUCIA.

4.2 Verificación del A.U contractual

La interventoría realiza la verificación de los salarios del personal que el contratista oferto en su propuesta económica de Administración y Utilidad (AU) para lo cual se adjunta el cuadro comparativo de salarios vs afiliación y numero de planilla.

Tabla No. 09 Control de IBC según la Discriminación Administración.

CARGO	NOMBRE	SALARIO AU	SALARIO PLANILLA PAGADA	APERADOR	# DE PLANILLA	CUMPLE IBC
Director de Obra	Ing. Civil DANIEL DAVID DIAZ REDONDO	$ 1.815.000 Salario de 5.500.000 al se aplicado % de dedicación 33%.	$ 1.815.000	SOI	Enero 1738412531 Febrero 1738412809	SI
Residente de obra	Ing. Civil JUSTTIN ALBERTO GARCÍA.	$ 3.500.000	$ 3.500.000	SOI	Enero 1738412531 Febrero 1738412809	SI
Residente Ambiental	JOHANIS VASQUEZ PADILLA	$1.160.000 Salario de 2.300.000 al aplicar 20% queda en 1 SMMLV	$ 1.160.000	SOI	Enero 1738412531 Febrero 1738412809	SI
Residente Salud Ocupacional	ING. JUAN DAVID DIAZ YANEZ	$1.160.000 Salario de 3.500.000 al aplicar 20% queda en 1 SMMLV	$ 1.160.000	SOI	Enero 1738412531 Febrero 1738412809	SI
Secretaria	No Aporto	$ 1 SMMLV	SMMLV			No


Nota: Se esta cumpliendo por los aportes al sistema de seguridad social según la discriminación del AU entregado en la oferta económica.

4.3. Actas de cobro

Al momento del informe No 01 por parte del contratista no se presenta acta de obra con el avance del primer mes de ejecución.

Tabla 10. Control financiero de actas de obra.

ACTA No	VALORES DE ACTAS	%Ejecutado	VALOR TOTAL EJECUTADO ACUMULADO	SALDOS REGISTRO PRESUPUESTAL
Valor Inicial	$ 1,335,887,230			
Acta No 01 y Parcial	$ 0	0.00%	$ 0	$ 1,335,887,230
Totales	$ 0	0.00%		

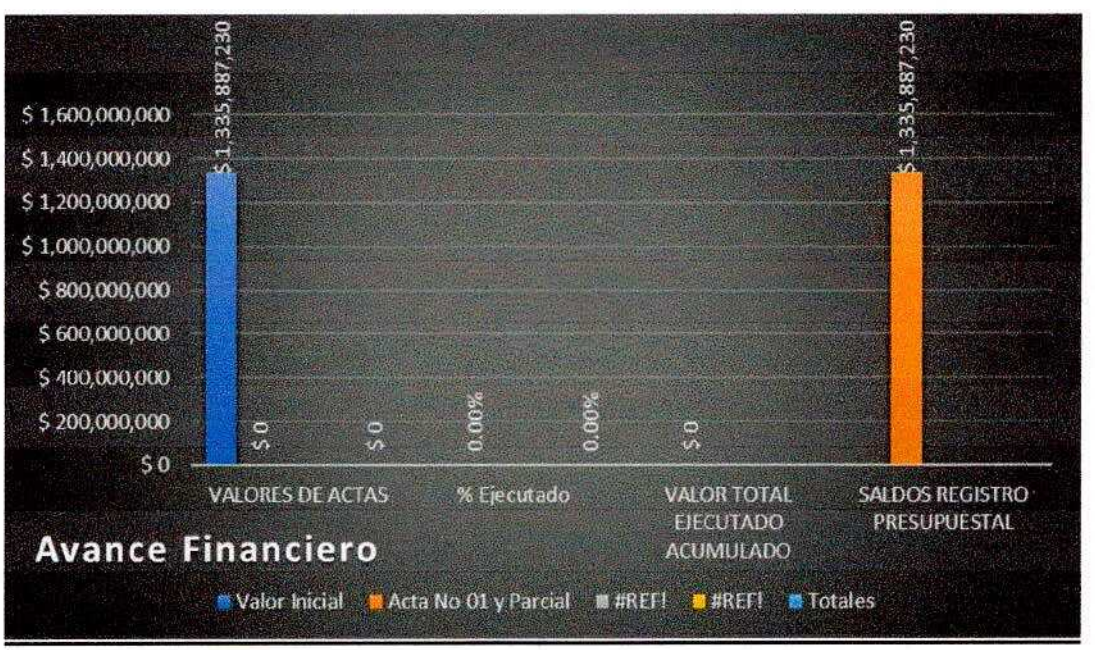

Grafica. No 1 % Actas de avance de obra.

<u>ANEXO 9. ACTA DE OBRA No 01 y sus memorias de cálculos. NO APLICA.</u>

5. ASPECTOS TÉCNICOS.

5.1 ALCANCE DEL PROYECTO

Construcción de Puente en concreto reforzado simplemente apoyado en dos estribos de luz de 30 metros y ancho de 7.20 con un galibo mínimo de 4.50 metros en la vereda Zaragüeta del Municipio de Hispania.

5.2 PROGRAMACIÓN VS EJECUCIÓN

Para el periodo comprendido entre el 26 de enero de 2023 al 25 de febrero de 2023 se contaba con un % programado del 9.00%, en programación de obra enviado en oficio de contratista No OF ICS 002-2023. Según el avance real ejecutado y certificado por la interventoría se tiene un % físico completado de 13.00%, lo que nos permite concluir que se presentó buen avance según la programación de obra y nos muestra un adelanto en % del 4.00% a corte del primer informe del proyecto.



Grafica. No 2 % de Avance del proyecto.

Durante el periodo del informe se argumenta que se está cumpliendo con los tiempos requeridos de la obra ya que no presenta atrasos y se viene presentando unas fuertes lluvias aisladas que hacen que la quebrada presente crecientes que hasta el momento solo nos afectado en materiales pétreos que se tienen en las orillas de la quebrada.

5.3 ACTIVIDADES REALIZADAS Y EN EJECUCIÓN

Las actividades realizadas en el periodo del 26 de enero al 25 febrero de 2023 fueron:

- Socialización con la comunidad sobre la construcción del puente de Zaragüeta el día 31 de enero del 2023.
- Construcción de cerramientos y obras provisionales. Campamento de obra y almacén.
- Replanteo y localización del puente donde en comité de obra No 02 del día 02 de febrero del 2023 y con la comisión de topografía se determina la nueva localización del puente como lo muestra la imagen a continuación.

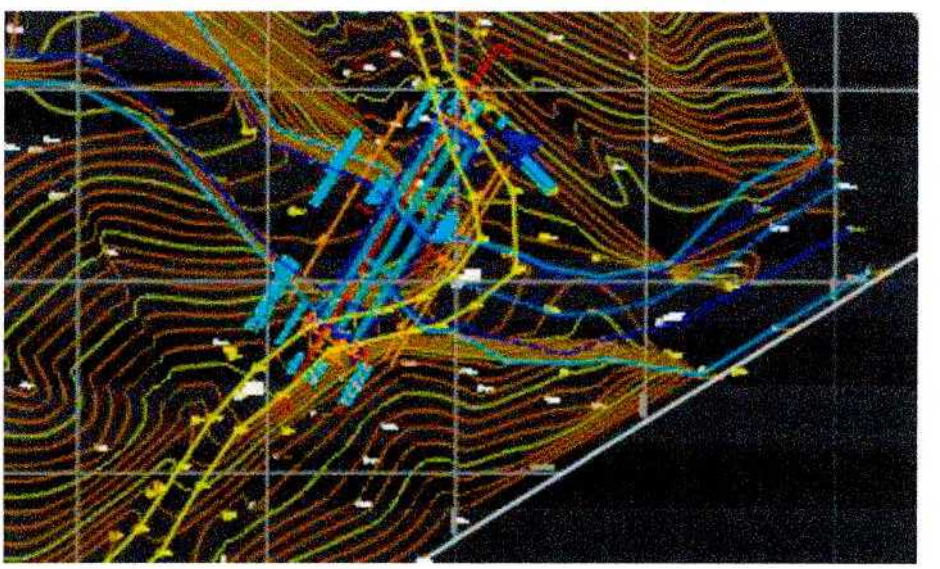


Imagen No 01. Localización del Puente según Visita de comité de Obra No 2.

- En el periodo del informe se tiene 21 metros de pilas excavados y anillados correspondientes al ítem contractual 1.6 Excavación de pilas de 0-5 metros en los estribos derecho e izquierdo.

Tabla No. 11 Excavaciones de pilas.

CUADRO CONTROL EXCAVACION DE PILAS		
ITEM	**ESTRIBO DERECHO (metros)**	**ESTRIBO IZQUIERDO (metros)**
PILA 1	5	3
PILA 2	4	2
PILA 3	4	3
SUBTOTAL	13	8
ACUMULADO EN (M)	21	



5.4 RELACIÓN DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA E ÍTEMS NO PREVISTOS

Se realizó una calibración de cantidades del contrato según el presupuesto aprobado y se concluyó que se mantiene el equilibrio económico del contrato, es importante destacar que esta calibración de cantidades se va ir revisando mes a mes para determinar el alcance físico de la obra

ANEXO 10. MAYORES Y MENORES CANTIDADES.

5.5 BALANCE PRESUPUESTAL

La supervisión realiza diario, semanal, mensualmente o cuando se requiera el balance presupuestal de acuerdo a las actividades realizadas, cantidades mayores, cantidades menores y obras extras. A la fecha no se detectan cambios de obra

5.6 CONTROL DE CALIDAD

Calidad de los Materiales: Se anexan los certificados de calidad de los siguientes insumos y materiales.

1. Ensayos de materiales pétreos (arena y triturados).
2. Certificado de Calidad del Cemento.

ANEXO 11. CERTIFICADOS DE CALIDAD MATERIALES.

5.7 ACTAS DE COMITÉS DE OBRAS

Durante el periodo del informe se realizaron 2 comités de obra que a continuación se relacionan:

COMITÉ DE OBRA No.	FECHA DEL COMITE
1	31 enero de 2023
2	02 de febrero de 2023

ANEXO 12. ACTAS DE COMITÉ DE OBRA

5.8 REGISTRO FOTOGRAFICO

La interventoría lleva registro fotográfico del antes, durante y después de las actividades del proyecto.

ANEXO 13. REGISTRO FOTOGRAFICO.

5.9 LIBRO DIARIO DE OBRA/BITACORA DE OBRA

La Interventoría consigna diariamente en el libro de bitácora de acuerdo al formato exigido por el Municipio de Ciudad Bolivar. Se presenta bitácora de obra debidamente firmada por la Interventoría y el Contratista del periodo 26 de enero al 25 de febrero 2023.

ANEXO 14. COPIA DE BITACORA DE OBRA.

5.10 CLIMATOLOGÍA

La Interventoría llena diariamente control de lluvias de acuerdo.

ANEXO 15. CONTROL DE LLUVIAS

5.11 MANUAL DE MANTENIMIENTO

Se adjunta una vez el proyecto llegue a buen final y es responsabilidad del contratista la elaboración de dicho manual.

ANEXO 16. MANUAL DE MANTENIMIENTO. NO APLICA PARA ESTE INFORME

ANEXOS

Anexo 1	*CORRESPONDENCIA RECIBIDA.*
ANEXO 2	*CORRESPONDENCIA ENVIADA*
ANEXO 3	CONTROL DIARIO DE PERSONAL ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO
ANEXO 4	CONTROL DE SEGURIDAD SOCIAL
ANEXO 5	LIQUIDACIONES Y PAZ Y SALVO DE TRABAJADORES
ANEXO 6.	Seguimiento a Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST
ANEXO 7	POLIZAS DEL CONTRATO CUMPLIMIENTO Y RC
ANEXO 8.	SOPORTES DE GIROS No. 01 DEL ANTICIPO Y CONTRATO DE FIDUCIA
ANEXO 9.	*ACTA DE OBRA No 01 y sus memorias de cálculos. NO APLICA.*
ANEXO 10	*MAYORES Y MENORES CANTIDADES.*
ANEXO 11	*CERTIFICADOS DE CALIDAD MATERIALES*
ANEXO 12	*ACTAS DE COMITÉ DE OBRA*
ANEXO 13	*REGISTRO FOTOGRAFICO*
ANEXO 14	*COPIA DE BITACORA DE OBRA.*
ANEXO 15	*CONTROL DE LLUVIAS*
ANEXO 16	*MANUAL DE MANTENIMIENTO. NO APLICA PARA ESTE INFORME*
ANEXO 17	*INFORME AMBIENTAL*
ANEXO 18	*CONTRATOS DE OBRA, ACTA INICIO, OTRO SI No 1 Y COPIA DE PROPUESTA CONTRATISTA*
ANEXO 19	*CONTRATOS DE INTERVENTORIA, ACTA DE INICIO Y COPIA DE PROPUESTA DE INTERVENTORIA*

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Autorización Numeración de Facturación

1876

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 18764037629098

(415)7707212489984(8020) 001876403762909 8

5. Número de Identificación Tributaria - NIT	6. DV	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
900307818	1				

11. Razón social
EQUICONSTRUCCION SAS

12. Dirección seccional
Impuestos de Medellin

Cód. 1 1

24. Dirección
CL 87 SUR 55 552 CA 2

25. País	26.Departamento	27. Municipio
Colombia	Antioquia	La Estrella

La U.A.E. Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, conforme a la facultad discrecional establecida en el artículo 684 - 2 del Estatuto Tributario y en virtud de lo estipulado en la Resolución 0042 del 05/05/2020, por la cual se dictan otras disposiciones en materia de sistemas de facturación; previo estudio y evaluación de la solicitud realizada por el contribuyente, representante legal o apoderado debidamente acreditado; determina autorizar los rangos de numeración de facturación y/o documento equivalente. En los casos, en que se agote dicha numeración antes de culminar su vigencia, el interesado tendrá derecho a solicitar una nueva autorización, de acuerdo con el tramite establecido.

Las vigencias de los rangos de numeración de facturación, se contarán a partir de la formalización de éste documento oficial.

Si el obligado a facturar; no hubiere agotado la numeración de facturación transcurrido el término de la vigencia autorizada, con 15 días de antelación podrá solicitar la habilitación de la numeración sobrante.

Cuando se trate de una solicitud de inhabilitación de la numeración de facturación y/o documento equivalente, la vigencia es permanente, por lo tanto, no procede la habilitación de dichos rangos.

AUTORIZADO

Nota: La no adopción o violación de los sistemas técnicos de control, dará lugar a la sanción establecida en el artículo 684-2 del E.T.

Firma del solicitante

DIAN
2022-10-10 / 08:39:50 AM
Fecha Acuse de Recibo
· Firmado ·

Firma del funcionario autorizado

984. Apellidos y nombres
985. Cargo
989. Dependencia SUBDIRECCION DE FACTURA ELECTRONICA Y SOLUCI
990. Lugar administrativo
991. Organización U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACION
992. Área
993. Establecimiento

1001. Apellidos y nombres SOLANO ARROYO ALVARO MIGUEL
1002. Tipo documento Cédula de Ciudadanía
1003. No. Identificación 78762840 1004. DV 3
1005. Cod. Representación Representante Legal Principal
1006. Organización EQUICONSTRUCCION SAS

997. Fecha formalización 2022-10-10/08:39:50

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Autorización Numeración de Facturación

1876

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 18764037629098

(415)7707212489984(8020) 001876403762909 8

5. Número de Identificación Tributaria - NIT	6. DV	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
900307818	1				

11. Razón social
EQUICONSTRUCCION SAS

Rangos de numeración para autorizar, habilitar o inhabilitar

	29. Establecimiento	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.
1	EQUICONSTRUCCION SAS CL 87 SUR 55 552 CA 2	FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA	4	FEEQ	35	200	12	HABILITACIÓN	2
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									

AUTORIZADO

Banco Caja Social

UNA EMPRESA DE FUNDACION GRUPO SOCIAL

HACE CONSTAR

Que el(los) cliente(s):

EQUICONSTRUCCION SAS *Identificado con* *NI9003078181*

Actualmente posee(n) el siguiente producto, radicado en la oficina 0218 UNICENTRO MEDELLIN, con las siguientes características:

CUENTA DE AHORROS PYME

Número	:	*24113014444*
Fecha de Apertura	:	*28 de marzo de 2022*
Saldo Disponible	:	*$ 200,000.00*
Saldo Total a la Fecha	:	*$ 200,000.00*
Condiciones de Manejo	:	*Individual,1 Firmas(s), 0 Sello(s) húmedo(s) o de caucho, Sin protector*
Estado	:	*CUENTA ACTIVA*

Esta constancia se expide con destino a: A QUIEN INTERESE
Realizada en la oficina 0218 UNICENTRO MEDELLIN de la ciudad de MEDELLIN, el día lunes, 28 de marzo de 2022.

Cordialmente,

Efectuado por:
D2G5G9O7 - DIEGO LEON GOMEZ GALEANO

FIRMA Y SELLOS AUTORIZADOS

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA | Banco Caja Social - Establecimiento Bancario

DIAN
POR UNA COLOMBIA MAS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 1 3 Actualización de oficio

4. Número de formulario 14853743942

(415)7707212489984(8020) 000001485374394 2

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 0 3 0 7 8 1 8	1	Impuestos de Medellín 1 1	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	27. Fecha expedición
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición 28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
EQUICONSTRUCCION SAS

36. Nombre comercial	37. Sigla
EQUICONSTRUCCION SAS	

UBICACION

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Antioquia 0 5	La Estrella 3 8 0

41. Dirección principal
CL 87 SUR 55 552 CA 2

42. Correo electrónico equiconstruccion.fe@gmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	4 9 8 7 0 3 2	3 2 1 7 4 6 8 3 3 4

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código 1	2	51. Código	52. Número establecimientos
7 1 1 2	2 0 1 3 0 4 1 5	4 2 9 0	2 0 1 3 0 4 1 5	4 2 1 0	4 1 1 2		1

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	2	5	7	9	1	4	1	6	4	2	4	8	5	2	5	5										

02- Gravamen a los movimientos financier
05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
07- Retención en la fuente a título de rent
09- Retención en la fuente en el impuesto
14- Informante de exogena
16- Obligación facturar por ingresos bienes
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico
55 - Informante de Beneficiarios Finales

Obligados aduaneros

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
54. Código																				

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2022 - 08 - 24 / 01 : 36: 14

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.
Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre ACTUACIÓN DE OFICIO AUTOMÁTICA
985. Cargo

DOCUMENTO CERTIFICADO SIN COSTO

EQUICONSTRUCCIÓN S.A.S

La Estrella, enero 2023.

CERTIFICADO DE PARAFISCALES

Asunto: Aportes Parafiscales

Con el fin de dar cumplimiento a los dispuesto en el artículo 50 de la ley 789 de 2002, certifico BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO que **EQUICONSTRUCCION S.A.S.** con NIT. **900.307.818-1se** encuentra al día con los pagos al Sistema de Seguridad Social Integral en Salud, con las Administradoras de Riesgos Profesionales y con los Fondos de Pensiones a los cuales se tienen afiliados los trabajadores. Así mismo, me encuentro a paz y salvo con la Caja de Compensación Familiar, Servicio Nacional de Aprendizaje –SENA - e Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y el FIC en los últimos 6 meses a la fecha de expedición de esta declaración.

Se adjuntan Planillas de soporte de pago de seguridad social.

Atentamente,

ALVARO MIGUEL SOLANO ARROYO
CC.78.762.840 de Sahagún
Representante legal
EquiConstrucción S.A.S.

Rosa Leni Calle Martinez
ROSA LENI CALLE MARTINEZ
CC.43.724.205
Contador
No Tarjeta: 70814-T

EQUICONSTRUCCIÓN S.A.S

La Estrella, febrero 2023.

CERTIFICADO DE PARAFISCALES

Asunto: Aportes Parafiscales

Con el fin de dar cumplimiento a los dispuesto en el artículo 50 de la ley 789 de 2002, certifico BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO que **EQUICONSTRUCCION S.A.S.** con NIT. **900.307.818-1se** encuentra al día con los pagos al Sistema de Seguridad Social Integral en Salud, con las Administradoras de Riesgos Profesionales y con los Fondos de Pensiones a los cuales se tienen afiliados los trabajadores. Así mismo, me encuentro a paz y salvo con la Caja de Compensación Familiar, Servicio Nacional de Aprendizaje –SENA - e Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y el FIC en los últimos 6 meses a la fecha de expedición de esta declaración.

Se adjuntan Planillas de soporte de pago de seguridad social.

Atentamente,

ALVARO MIGUEL SOLANO ARROYO
CC.78.762.840 de Sahagún
Representante legal
EquiConstrucción S.A.S.

Rosa Leni Calle Martinez
ROSA LENI CALLE MARTINEZ
CC.43.724.205
Contador
No Tarjeta: 70814-T

SuAporte | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2023-03-04, 04:44:09 PM **Tipo Planilla:** E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS. **Numéro Planilla:** 61747402

Periodo Cotización: enero de 2023 **Periodo Servicio:** febrero de 2023

PAGADO 04/03/2023 EN HORARIO EXTENDIDO

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	EQUICONSTRUCCION SAS		
Documento	NI900307818	**Dirección**	CALLE 10 N 38 49 C.C LOS COLORES OF 350
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	2608337
Tipo Persona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	MEDELLIN	**Departamento**	ANTIOQUIA
Representante Legal	SOLANO ARROYO ALVARO MIGUEL	**Identificación**	CC 78762840
Total Afiliados	3	**ARP**	ARL SURA

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																		Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días APP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 1036944269	PAOLA ANDREA LOPEZ MARTINEZ	01	00	X																0	5	5	5	5	(230301) PORVENIR	$ 193.334	$ 31.000	(EPS010) EPS SURA	$ 193.334	$ 7.800	6,960	$ 193.334	$ 13.500	(CCF04) COMFAMA	$ 193.334	$ 7.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 60.100
CC 43895997	SHIRLEY NARVAEZ OSORIO	01	00	X																0	5	5	5	5	(230301) PORVENIR	$ 193.334	$ 31.000	(EPS037) NUEVA EPS	$ 193.334	$ 7.800	6,960	$ 193.334	$ 13.500	(CCF04) COMFAMA	$ 193.334	$ 7.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 60.100
CC 92535981	CESAR AUGUSTO MERCADO SALAS	01	00	X																0	5	5	5	5	(230301) PORVENIR	$ 302.500	$ 48.400	(EPS010) EPS SURA	$ 302.500	$ 12.100	6,960	$ 302.500	$ 21.100	(CCF04) COMFAMA	$ 302.500	$ 12.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 93.700

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 689.168	$ 689.168	$ 689.168	$ 689.168	$ 110.400	$ 27.700	$ 48.100	$ 27.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 213.900	$ 7.400	$ 221.300

ARUS, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77. Línea Ética: 018000 517806.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

ARUS
Tecnología + Información = Conocimiento

SuAporte | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2023-03-04, 04:44:56 PM **Tipo Planilla:** E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS. **Numéro Planilla:** 61747505

Periodo Cotización: febrero de 2023 **Periodo Servicio:** marzo de 2023

PAGADO 04/03/2023 EN HORARIO EXTENDIDO

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	EQUICONSTRUCCION SAS		
Documento	NI900307818	**Dirección**	CALLE 10 N 38 49 C.C LOS COLORES OF 350
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	2608337
Tipo Persona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	MEDELLIN	**Departamento**	ANTIOQUIA
Representante Legal	SOLANO ARROYO ALVARO MIGUEL	**Identificación**	CC 78762840
Total Afiliados	3	**ARP**	ARL SURA

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																	Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 1036944269	PAOLA ANDREA LOPEZ MARTINEZ	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.160.000	$ 185.600	(EPS010) EPS SURA	$ 1.160.000	$ 46.400	6,960	$ 1.160.000	$ 80.800	(CCF04) COMFAMA	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 359.200
CC 43895997	SHIRLEY NARVAEZ OSORIO	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.160.000	$ 185.600	(EPS037) NUEVA EPS	$ 1.160.000	$ 46.400	6,960	$ 1.160.000	$ 80.800	(CCF04) COMFAMA	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 359.200
CC 92535661	CESAR AUGUSTO MERCADO SALAS	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.815.000	$ 290.400	(EPS010) EPS SURA	$ 1.815.000	$ 72.600	6,960	$ 1.815.000	$ 126.400	(CCF04) COMFAMA	$ 1.815.000	$ 72.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 562.000

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 4.135.000	$ 4.135.000	$ 4.135.000	$ 4.135.000	$ 661.600	$ 165.400	$ 288.000	$ 165.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.280.400	$ 0	$ 1.280.400

ARUS, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77. Línea Ética: 018000 517806.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Protager el medio ambiente está en nuestras manos.

EXPERTOS en PILA

SuAporte | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2023-03-16, 04:17:50 PM **Tipo Planilla:** E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS. **Numéro Planilla:** 62107376

Periodo Cotización: febrero de 2023 **Periodo Servicio:** marzo de 2023

PAGADO 16/03/2023

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	EQUICONSTRUCCION SAS		
Documento	NI900307818	**Dirección**	CALLE 10 N 38 49 C.C LOS COLORES OF 350
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	2608337
Tipo Persona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	MEDELLIN	**Departamento**	ANTIOQUIA
Representante Legal	SOLANO ARROYO ALVARO MIGUEL	**Identificación**	CC 78762840
Total Afiliados	1	**ARP**	ARL SURA

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																				Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	INP	Dias AFP	Dias EPS	Dias ARP	Dias CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 78762840	ALVARO MIGUEL SOLANO ARROYO	01	00																	0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 3.500.000	$ 560.000	(EPS010) EPS SURA	$ 3.500.000	$ 140.000	6,960	$ 3.500.000	$ 243.600	(CCF04) COMFAMA	$ 3.500.000	$ 140.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.083.600

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 3.500.000	$ 3.500.000	$ 3.500.000	$ 3.500.000	$ 560.000	$ 140.000	$ 243.600	$ 140.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.083.600	$ 13.200	$ 1.096.800

ARUS, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77. Línea Ética: 018000 517806.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

SuAporte | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2023-03-04, 04:48:04 PM **Tipo Planilla:** E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS. **Numéro Planilla:** 61428832

Periodo Cotización: enero de 2023 **Periodo Servicio:** febrero de 2023

PAGADO 04/03/2023 EN HORARIO EXTENDIDO

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	EQUICONSTRUCCION SAS		
Documento	NI900307818	**Dirección**	CALLE 10 N 38 49 C.C LOS COLORES OF 350
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	2608337
Tipo Persona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	MEDELLIN	**Departamento**	ANTIOQUIA
Representante Legal	SOLANO ARROYO ALVARO MIGUEL	**Identificación**	CC 78762840
Total Afiliados	20	**ARP**	ARL SURA

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																				Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días ATP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 1000404841	GUSTAVO ANTONIO BETANCUR MARULANDA	01	00																	0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 1.160.000	$ 185.600	(EPS040) SAVIA SALUD	$ 1.160.000	$ 46.400	6,960	$ 1.160.000	$ 80.800	(CCF04) COMFAMA	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 359.200
CC 1006441231	JESUS MIGUEL MARTINEZ PEREZ	01	00	X																0	21	21	21	21	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.120.000	$ 179.200	(EPS010) EPS SURA	$ 1.120.000	$ 44.800	6,960	$ 1.120.000	$ 78.000	(CCF04) COMFAMA	$ 1.120.000	$ 44.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 346.800
CC 1007107988	JHON EIBER UPEGUI TABORDA	01	00	X																0	7	7	7	7	(230301) PORVENIR	$ 270.667	$ 43.400	(ESSC24) EPS-S COOSALUD MOVILIDAD	$ 270.667	$ 10.900	6,960	$ 270.667	$ 18.900	(CCF04) COMFAMA	$ 270.667	$ 10.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 84.100
CC 1007108478	DUVAN FELIPE CASTRILLON MARIN	01	00	X																0	21	21	21	21	(230301) PORVENIR	$ 812.000	$ 130.000	(EPS040) SAVIA SALUD	$ 812.000	$ 32.500	6,960	$ 812.000	$ 56.600	(CCF04) COMFAMA	$ 812.000	$ 32.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 251.600
CC 1017139502	JORGE LUIS BLANDON CHAVERRA	01	00	X																0	28	28	28	28	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.493.334	$ 239.000	(EPS037) NUEVA EPS	$ 1.493.334	$ 59.800	6,960	$ 1.493.334	$ 104.000	(CCF04) COMFAMA	$ 1.493.334	$ 59.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 462.600
CC 1017179711	JOHN FREDY PEREZ SERNA	01	00		X															0	21	21	21	21	(231001) COLFONDOS	$ 812.000	$ 130.000	(EPS037) NUEVA EPS	$ 812.000	$ 32.500	6,960	$ 812.000	$ 56.600	(CCF04) COMFAMA	$ 812.000	$ 32.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 251.600
CC 1020452684	DIEGO ALONSO ARANGO BEDOYA	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.400.000	$ 224.000	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 1.400.000	$ 56.000	6,960	$ 1.400.000	$ 97.500	(CCF04) COMFAMA	$ 1.400.000	$ 56.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 433.500
CC 1033651643	DANIEL ZAPATA TORO	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.160.000	$ 185.600	(ESSC24) EPS-S COOSALUD MOVILIDAD	$ 1.160.000	$ 46.400	6,960	$ 1.160.000	$ 80.800	(CCF04) COMFAMA	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 359.200
CC 1038655072	ANTONIO SERNA MUÑOZ	01	00		X															0	18	18	18	18	(230301) PORVENIR	$ 696.000	$ 111.400	(EPS037) NUEVA EPS	$ 696.000	$ 27.900	6,960	$ 696.000	$ 48.500	(CCF04) COMFAMA	$ 696.000	$ 27.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 215.700
CC 70416560	JOSE DANIEL BEDOYA TAMAYO	01	00																	0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 1.160.000	$ 185.600	(EPS040) SAVIA SALUD	$ 1.160.000	$ 46.400	6,960	$ 1.160.000	$ 80.800	(CCF04) COMFAMA	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 359.200
CC 70417058	JHON JAIRO GUAPACHA	01	00	X	X															0	25	25	25	25	(230201) PROTECCION	$ 1.500.000	$ 240.000	(EPS041) NUEVA EPS S.A. MOVILIDAD	$ 1.500.000	$ 60.000	6,960	$ 1.500.000	$ 104.400	(CCF04) COMFAMA	$ 1.500.000	$ 60.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 464.400
CC 70420755	OSCAR DARIO MUÑOZ MONSALVE	01	00		X															0	21	21	21	21	(230301) PORVENIR	$ 812.000	$ 130.000	(EPS040) SAVIA SALUD	$ 812.000	$ 32.500	6,960	$ 812.000	$ 56.600	(CCF04) COMFAMA	$ 812.000	$ 32.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 251.600
CC 70421310	ALEXANDER DE JESUS VARGAS VALENCIA	01	00	X																0	8	8	8	8	(25-14) COLPENSIONES	$ 426.667	$ 68.300	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 426.667	$ 17.100	6,960	$ 426.667	$ 29.700	(CCF04) COMFAMA	$ 426.667	$ 17.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 132.200
CC 70421473	CARLOS ARTURO MUÑOZ MONSALVE	01	04	X																0	0	29	29	29	(NIN-AF) NINGUNA AFP	$ 0	$ 0	(EPS037) NUEVA EPS	$ 1.121.334	$ 44.900	6,960	$ 1.121.334	$ 78.100	(CCF04) COMFAMA	$ 1.121.334	$ 44.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 167.900
CC 70422338	VICTOR ALFONSO ESTRADA VARGAS	01	00	X																0	28	28	28	28	(230201) PROTECCION	$ 1.082.667	$ 173.300	(EPS017) FAMISANAR EPS	$ 1.082.667	$ 43.400	6,960	$ 1.082.667	$ 75.400	(CCF04) COMFAMA	$ 1.082.667	$ 43.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 335.500
CC 71190650	LEONARDO RINCON	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.600.000	$ 256.000	(ESSC24) EPS-S COOSALUD MOVILIDAD	$ 1.600.000	$ 64.000	6,960	$ 1.600.000	$ 111.400	(CCF04) COMFAMA	$ 1.600.000	$ 64.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 495.400
CC 71332864	EDIER BEDOYA CANO	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.800.000	$ 288.000	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 1.800.000	$ 72.000	6,960	$ 1.800.000	$ 125.300	(CCF04) COMFAMA	$ 1.800.000	$ 72.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 557.300
CC 71388801	DUBER DIDEY VELASQUEZ SERNA	01	00																	0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 1.160.000	$ 185.600	(EPS037) NUEVA EPS	$ 1.160.000	$ 46.400	6,960	$ 1.160.000	$ 80.800	(CCF04) COMFAMA	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 359.200
CC 78762840	ALVARO MIGUEL SOLANO ARROYO	01	00																	0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 3.500.000	$ 560.000	(EPS010) EPS SURA	$ 3.500.000	$ 140.000	6,960	$ 3.500.000	$ 243.600	(CCF04) COMFAMA	$ 3.500.000	$ 140.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.083.600

ARUS, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77. Línea Ética: 018000 517806.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

Pagado: 04/03/2023 | Empresa NI900307818 EQUICONSTRUCCION SAS | Planilla Nro: 61428832 | Periodo Cotización: enero de 2023 | Periodo Servicio: febrero de 2023

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																			Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 98764810	JOHN JAIRO RODRIGUEZ LONDOÑO	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.600.000	$ 256.000	(EPS037) NUEVA EPS	$ 1.600.000	$ 64.000	6,960	$ 1.600.000	$ 111.400	(CCF04) COMFAMA	$ 1.600.000	$ 64.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 496.400

III. TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 23.565.336	$ 24.686.669	$ 24.686.669	$ 24.686.669	$ 3.771.000	$ 987.900	$ 1.719.200	$ 987.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 7.466.000	$ 248.900	$ 7.714.900

ARUS, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77. Línea Ética: 018000 517806.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.


Rosa Leni Calle Martinez

FIRMA DEL TITULAR

Esta tarjeta es el unico documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la ley 43 de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla al Ministerio de Educación Nacional - Junta Central de Contadores.

043724205


República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

70814-T

ROSA LENI
CALLE MARTINEZ
C.C. 43724205
RESOLUCION INSCRIPCION 50 FECHA 09/03/2000
UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA

Presidente

00079169

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

EECAZA5BA8B9CEEF

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **ROSA LENI CALLE MARTINEZ** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 43724205 de ENVIGADO (ANTIOQUIA) Y Tarjeta Profesional No 70814-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *
