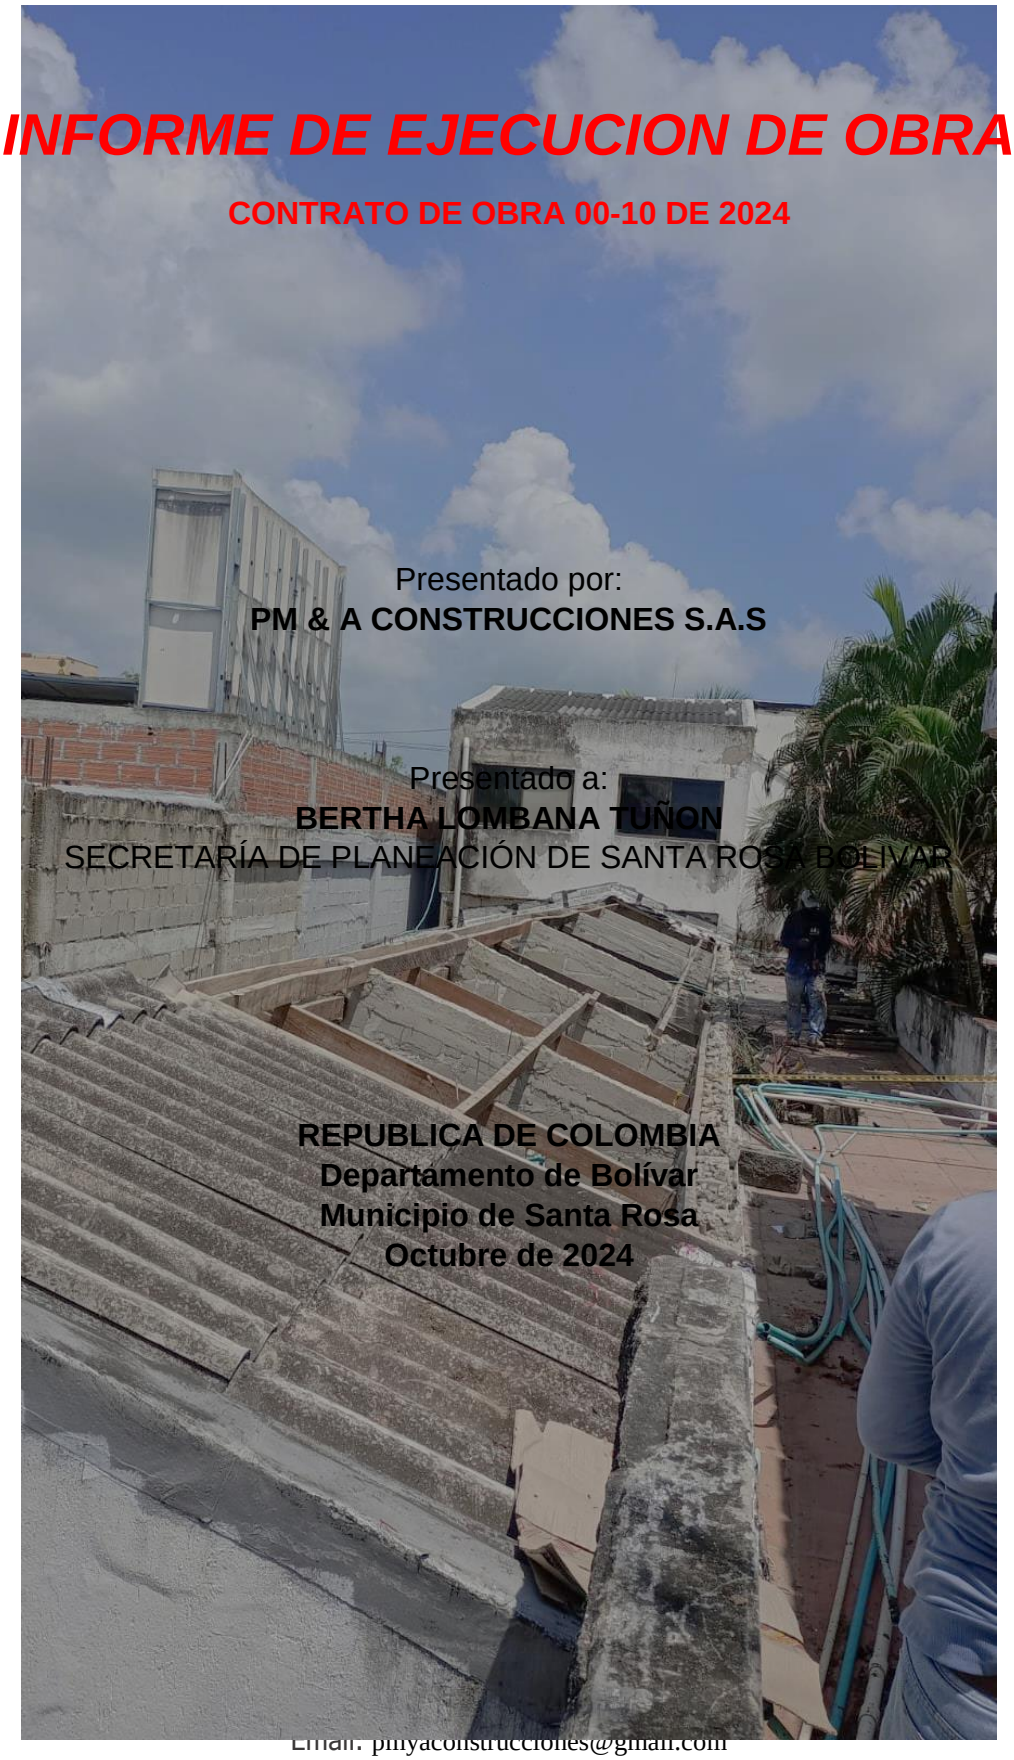


INFORME DE EJECUCION DE OBRA

CONTRATO DE OBRA 00-10 DE 2024

Presentado por:
PM & A CONSTRUCCIONES S.A.S

Presentado a:
BERTHA LOMBANA TUÑON
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN DE SANTA ROSA BOLIVAR

REPUBLICA DE COLOMBIA
Departamento de Bolívar
Municipio de Santa Rosa
Octubre de 2024

Email: pmyaconstrucciones@gmail.com
Cel: 300 6644230

Índice.

1. INTRODUCCIÓN. 3
2. OBJETIVO GENERAL DEL PRESENTE INFORME. 3
3. OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL PRESENTE INFORME. 3
4. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO DE OBRA. 4
6. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO. 5
7. AVANCE DEL CONTRATO. 6
7.1. Avance físico. 6
7.2. Avance cronológico. 6
7.3. Avance financiero. 6
8. ACTIVIDADES EJECUTADAS PARA EL PRESENTE INFORME. 7

1. INTRODUCCIÓN.

Para dar cumplimiento al Contrato de obra No 00-10 DE 2024 de fecha 25 del mes de julio del 2024, se hace entrega del informe de gestión correspondiente al periodo del 20 DE AGOSTO DE 2024 al 16 DE OCTUBRE DE 2024.

Para la buena presentación y entendimiento del presente informe se incluye un registro fotográfico dónde se muestran las actividades desarrolladas a la fecha.

1. OBJETIVO GENERAL DEL PRESENTE INFORME.

Ejecutar el Contrato de obra No 00-10 DE 2024, cuyo objeto es ***"CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA EL MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL PALACIO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SANTA ROSA BOLÍVAR".***

2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL PRESENTE INFORME.

1. informar e ilustrar acerca de todas las actividades desarrolladas en términos de apoyo al seguimiento y supervisión del contrato 00-10 DE 2024.

2. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO.

Tabla 1. Información general del contrato de Obra.

TIPO DE CONTRATO:	OBRA
NÚMERO DE CONTRATO:	N° 0-10 DE 2024 DERIVADO DE LA SAMC N° 00-05 DE 2024
CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE SANTA ROSA BOLIVAR
CONTRATISTA:	PM & A CONSTRUCCIONES S.A.S
NIT	900.659.125-6
OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA EL MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL PALACIO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SANTA ROSA BOLÍVAR
VALOR:	TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MILLONES QUINIENTOS DOS MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS ($359.502.874,00) M/CTE
DURACIÓN:	TRES (3) MESES
OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA:	1. Manejar con la debida confidencialidad la información a que tenga acceso, así como la producida a lo largo de la ejecución del contrato. 2. Permitir y facilitar a la supervisión designada por la ENTIDAD CONTRATANTE, el ejercicio del debido control y vigilancia sobre las actividades de ejecución del objeto contractual, a través de las funciones gerenciales de: planeación, organización, dirección, evaluación y retroalimentación. 3. Ejecutar las obras que constituyen el objeto del contrato de acuerdo con las especificaciones, cantidades de obra, precios establecidos en los estudios y documentos previos y en el presente contrato de obra. 4. Cumplir las normas de calidad, seguridad, economía y aspectos ambientales y dar estricto cumplimiento al programa de trabajo propuesto. 5. Someter a consideración de la ENTIDAD CONTRATANTE, las modificaciones que por razones de orden técnico o por naturaleza de la obra considere necesarias, antes de proceder a ejecutarlas. 6. Verificar la existencia de la totalidad de permisos o autorizaciones públicas o privadas requeridas por ley o reglamento para desarrollar sin oposición las obras cuya ejecución constituyen el objeto del contrato. 7. Entregar el cronograma estimado que constituirá anexo del contrato a celebrar. 8. Elaborar, suscribir y presentar al MUNICIPIO las respectivas Actas parciales de Obra. Estas Actas parciales de Obra deben estar aprobadas por el Supervisor del Contrato designado por el Municipio, según corresponda.
SUPERVISIÓN:	SECRETARIO DE PLANEACIÓN MUNICIPAL
FECHA DE INICIACIÓN	20 DE AGOSTO DE 2024

FECHA DE TERMINACION	20 DE NOVIEMBRE DE 2024

3. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO DEL CONTRATO DE OBRAS.

A la fecha no se ha realizado pagos parciales al contrato. Los recursos del mismo se encuentran amparados por el Certificado de Disponibilidad Presupuestal N° 494 de fecha 01 de abril de 2024 y Registro Presupuestal N° 1669 del 20 de agosto de 2024, expedidos por el jefe de Presupuesto Municipal, con cargo al Presupuesto de la Vigencia Fiscal 2024.

La forma de pago será la siguiente:

Para el presente contrato la ENTIDAD entregará al contratista a título de anticipo un valor equivalente al 50% del valor básico del contrato.

La forma de pago establecida es por precio unitario y por acta de avance, la cual se pagará por actas parciales de hasta el 90% del valor del contrato.

Tabla 3. Estado financiero del contrato.

VALOR DEL CONTRATO	$	359.502.874,00
VALOR ANTICIPO (50%)	$	179.751.437,00
VALOR EJECUTADO	$	156.321.465,00
SALDO POR EJECUTAR	$	203.181.409,00

4. AVANCE DEL CONTRATO.

4.1. Avance físico.

El avance físico del contrato de Obra, corresponde a un 43,48% del contrato original, calculado en base a las cantidades ejecutadas ponderadas con los valores

correspondientes del valor del presupuesto general del contrato de obra y de las obligaciones contempladas en el.

El contrato de Obra, lleva dos meses de ejecución, así:

DESCRICION	FECHA	DURACION (días)
FECHA INICIO	20/08/2024	
FECHA ACTUAL (INFORME 1)	16/10/2024	60,00
TOTAL		**60,00**

El avance físico del contrato de obras, se encuentra en un progreso del 43,48% de ejecución física, frente a un 44% respecto de las actividades programadas.

4.2. Avance cronológico.

A la fecha en el contrato 00-10 DE 2024 con objeto: *"CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA EL MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL PALACIO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SANTA ROSA BOLÍVAR",* se ha tenido un avance cronológico del 66,67%.

4.3. Avance financiero.

El avance financiero a la fecha corresponde a un 43,48% del valor total del contrato.

5. ACTIVIDADES EJECUTADAS PARA EL PRESENTE INFORME.

Las actividades ejecutadas para el presente informe corresponden a las descritas en las obligaciones contractuales, así:

El avance físico del primer informe fue el siguiente:

CONDICIONES CONTRATADAS INICIALES						CONDICIONES ACTUALIZADAS MODIFICATORIA No 1		AVANCE FISICO SEMANA 8		
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND.	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANT	VALOR TOTAL	CANT	VALOR TOTAL	% EJEC
	1.0 Preliminares									

1.1	Cerramiento en tela de polipropileno altura de 2,0m	m	120,00	$ 14.936,00	$ 1.792.320,00	50,00	$ 746.800,00	30,00	$ 448.080,00	60,00%
1.2	Desmonte de cielo raso en yeso cartón en oficinas de primer piso	m2	254,49	$ 8.724,00	$ 2.220.171,00	402,70	$ 3.513.155,00	402,70	$ 3.513.155,00	100,00%
1.4	Desmonte de muros en superboard	m2	333,77	$ 13.749,00	$ 4.589.004,00	48,68	$ 669.301,00	48,68	$ 669.301,00	100,00%
1.5	Demolición de muros en bloque concreto - vano para puerta de acceso de secretaria del alcalde	m2	2,00	$ 19.671,00	$ 39.342,00	2,00	$ 39.342,00	0,00	$ 0,00	0,00%
1.6	Desmonte de cubierta existente (Asbesto cemento)	m2	229,21	$ 19.483,00	$ 4.465.708,00	391,93	$ 7.635.972,00	391,93	$ 7.635.982,00	100,00%
1.7	Retiro y disposición final del material toxico (Asbesto cemento)	Kg	2750,53	$ 789,00	$ 2.170.165,00	4390,47	$ 3.464.083,00	4390,47	$ 3.464.081,00	100,00%
1.8	Impermeabilización de muros	m2	400,00	$ 17.497,00	$ 6.998.800,00	200,00	$ 3.499.400,00	0,00	$ 0,00	0,00%
					$ 22.275.510,00		**$ 19.568.053,00**		**$ 15.730.599,00**	
	2.0 CUBIERTA									
2.1	Suministro e instalación de cubierta termoacustica UPVC BLANCO - Blanco con fibra de carbono de 2,5 mm color a definir	m2	229,21	$ 124.064,00	$ 28.436.771,00	391,93	$ 48.624.404,00	391,93	$ 48.624.466,00	100,00%
2.2	Suministro e instalación de caballete UPVC	m	44,47	$ 88.977,00	$ 3.956.807,00	58,40	$ 5.196.257,00	58,40	$ 5.196.257,00	100,00%
2.3	Suministrar e instalar estructura metálica para cubiertas. Norma nsr10 titulo f. perfilería astm a572 gr50 y astm a37 (Perfil galvanizado en C de 160x60x2). Soldadura e70xx. Inc tensores, anclajes y accesorios, limpieza sspc-sp3, pintura anticorrosiva 3 mils y acabado esmalte alquídico 3 mils	kg	3135,00	$ 22.499,00	$ 70.534.365,00	2146,00	$ 48.282.854,00	2146,02	$ 48.283.371,00	100,00%
2.4	Redoblon en concreto	m	19,37	$ 38.466,00	$ 745.086,00	46,68	$ 1.795.658,00	62,72	$ 2.412.588,00	100,00%
2.5	Suministro e instalación tuberia IMC 2" adosada a fachada para bajante puesta a tierra, incluye accesorios y fijación	m	30,00	$ 115.431,00	$ 3.462.930,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
2.6	Suministro, transporte e instalación de canaleta metálica (12x5) cm con división. Incluye: Pintura electrostatica, puesta a tierra, tapa tornillo, elementos de fijación en pared y demás accesorios para su correcta instalación	m	44,47	$ 105.921,00	$ 4.710.307,00	44,47	$ 4.710.307,00	0,00	$ 0,00	0,00%
					$ 111.846.266,00		**$ 108.609.480,00**		**$ 104.516.682,00**	
	3.0 CIELO RASOS Y DIVISIONES									
3.1	Cielo raso en lamina plana superboard o equivalente E=6mm. Incluye encintado, masilla y pintura (Oficinas primer piso)	m2	254,49	$ 85.367,00	$ 21.725.048,00	402,70	$ 34.377.291,00	0,00	$ 0,00	0,00%
3.3	Muro en Drywall de 12 mm, incluye estructura metalica, masilla, cinta y primera mano de pintura, visto dos caras E=12 cm	m2	36,47	$ 105.784,00	$ 3.857.942,00	36,47	$ 3.857.942,00	0,00	$ 0,00	0,00%
3.4	Instalación de jardinera en bloque concreto en el balcón	m2	6,93	$ 98.105,00	$ 679.868,00	6,93	$ 679.868,00	0,00	$ 0,00	0,00%
					$ 26.262.858,00		**$ 38.915.101,00**		**$ 0,00**	
	4.0 PINTURA									

4.1	Suministro e instalación de pintura en vinilo tipo 1 muros interiores 3 manos	m2	2860,27	$ 14.811,00	$ 42.363.503,00	2860,27	$ 42.363.503,00	0,00	$ 0,00	0,00%
4.2	Suministro e instalación colorplast fachada	m2	320,12	$ 23.473,00	$ 7.514.177,00	320,12	$ 7.514.177,00	0,00	$ 0,00	0,00%
					$ 49.877.680,00		**$ 49.877.680,00**		**$ 0,00**	
	5.0 CARPINTERIA METALICA Y DE MADERA									
5.1	Instalación de puertas nuevas para armario secretaria- 0.70x2.00	und	2,00	$ 359.283,00	$ 718.566,00	2,00	$ 718.566,00	0,00	$ 0,00	0,00%
5.2	Instalación de puertas nuevas en MDF	und	14,00	$ 499.283,00	$ 6.989.962,00	14,00	$ 6.989.962,00	0,00	$ 0,00	0,00%
					$ 7.708.528,00		**$ 7.708.528,00**		**$ 0,00**	
	6.0 ELEMENTOS VARIOS EN CONCRETO VISTO Y MADERA									
6.1	Concreto para escaleras 3000 PSI (incluye acero)	m3	0,58	$ 1.392.518,00	$ 802.090,00	0,58	$ 802.090,00	0,00	$ 0,00	0,00%
6.2	Barandal escalera	m	5,01	$ 324.642,00	$ 1.626.456,00	5,01	$ 1.626.456,00	0,00	$ 0,00	0,00%
6.3	Suministro e instalación de baldosa ceramica antideslizante para huellas de la escalera	m2	2,62	$ 73.271,00	$ 191.970,00	2,62	$ 191.970,00	0,00	$ 0,00	0,00%
6.4	Estructura para balcon (Postes de madera para soporte de la pergola, Listones de madera para pergola, Vigas de apoyo de madera)	m2	17,43	$ 193.828,00	$ 3.379.236,00	17,43	$ 3.379.236,00	0,00	$ 0,00	0,00%
6.5	Postes de madera o MDF divisorios - h=3.00	un	9,00	$ 97.642,00	$ 878.778,00	9,00	$ 878.778,00	0,00	$ 0,00	0,00%
					$ 6.878.530,00		**$ 6.878.530,00**		**$ 0,00**	
	7.0 Actividades Varias									
7.1	Aseo en general	m2	800,00	$ 8.385,00	$ 6.708.000,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
7.2	Diagnostico y construccion de redes e instalaciones electricas	gb	1,00	$ 44.983.300,00	$ 44.983.300,00	1,00	$ 44.983.300,00	0,00	$ 0,00	0,00%
					$ 51.691.300,00		**$ 44.983.300,00**		**$ 0,00**	
					$ 276.540.672,00		**$ 276.540.672,00**		**$ 120.247.281,00**	
				AIU (30%)	$ 82.962.202,00		$ 82.962.202,00		$ 36.074.184,00	
				VALOR TOTAL	**$ 359.502.874,00**		**$ 359.502.874,00**		**$ 156.321.465,00**	**43,48%**

En el corte de la presentación del acta parcial No 1, se tuvo un avance del 43,48%, por lo que el contrato llevaba una ejecución acorde con los plazos establecidos en el contrato.

ANEXOS
REGISTRO FOTOGRAFICO DE ACTIVIDADES EJECUTADAS



Dir: : CALLE 32A # 36-104. EDIF ALTOS DE VENECIA APTO 10-04 B SINCELEJO
Email: pmyaconstrucciones@gmail.com
Cel: 300 6644230



Dir: : CALLE 32A # 36-104. EDIF ALTOS DE VENECIA APTO 10-04 B SINCELEJO
Email: pmyaconstrucciones@gmail.com
Cel: 300 6644230





Dir: : CALLE 32A # 36-104. EDIF ALTOS DE VENECIA APTO 10-04 B SINCELEJO
Email: pmyaconstrucciones@gmail.com
Cel: 300 6644230








Dir: : CALLE 32A # 36-104. EDIF ALTOS DE VENECIA APTO 10-04 B SINCELEJO
Email: pmyaconstrucciones@gmail.com
Cel: 300 6644230



Dir: : CALLE 32A # 36-104. EDIF ALTOS DE VENECIA APTO 10-04 B SINCELEJO
Email: pmyaconstrucciones@gmail.com
Cel: 300 6644230



Dir: : CALLE 32A # 36-104. EDIF ALTOS DE VENECIA APTO 10-04 B SINCELEJO
Email: pmyaconstrucciones@gmail.com
Cel: 300 6644230



Dir: : CALLE 32A # 36-104. EDIF ALTOS DE VENECIA APTO 10-04 B SINCELEJO
Email: pmyaconstrucciones@gmail.com
Cel: 300 6644230



Dir: : CALLE 32A # 36-104. EDIF ALTOS DE VENECIA APTO 10-04 B SINCELEJO
Email: pmyaconstrucciones@gmail.com
Cel: 300 6644230




Dir: : CALLE 32A # 36-104. EDIF ALTOS DE VENECIA APTO 10-04 B SINCELEJO
Email: pmyaconstrucciones@gmail.com
Cel: 300 6644230






Dir: : CALLE 32A # 36-104. EDIF ALTOS DE VENECIA APTO 10-04 B SINCELEJO
Email: pmyaconstrucciones@gmail.com
Cel: 300 6644230



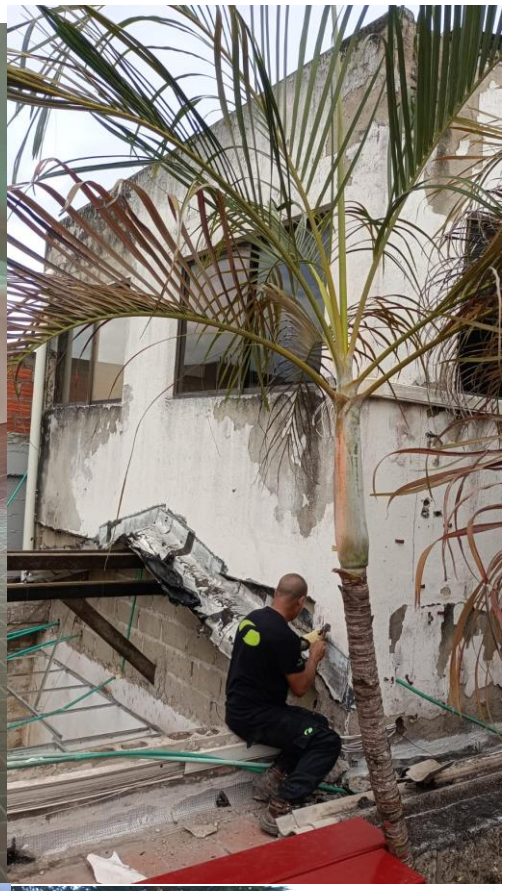





Dir: : CALLE 32A # 36-104. EDIF ALTOS DE VENECIA APTO 10-04 B SINCELEJO
Email: pmyaconstrucciones@gmail.com
Cel: 300 6644230

Espacio para
Logo Corporativo

PM & A CONSTRUCCIONES S.A.S
NIT 900.659.125-6
cr 28 a 23 61 brr la toscana
Tel: (035) 3006644230
Sincelejo - Colombia
pmyaconstrucciones@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. PMYA 36

Señores	MUNICIPIO DE SANTA ROSA		
NIT	890.481.343-3	**Teléfono**	(605) 3218958403 - Ext. 000
Dirección	cl 16 27 71 laza principal	**Ciudad**	Bolívar - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	24/10/2024, 11:51
Expedición	24/10/2024, 15:11
Vencimiento	24/10/2024

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Bruto
1	ACTA PARCIAL No 1 DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA No 00-10 DE 2024 DERIVADO DE LA SAMC N° 00-05 DE 2024	1.00	120,247,281.00
2	AIU 30%	1.00	36,074,184.00

Total items: 2

Total Bruto	156,321,465.00
Copago / Anticipo	78,160,732.50
Total a Pagar	78,160,732.50

Valor en Letras: Setenta y ocho millones ciento sesenta mil setecientos treinta y dos pesos m/cte con cincuenta cent.

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:
Consignación bancaria - Consignación $ 78,160,732.50

Observaciones: AMORTIZACION DEL ANTICIPO 50%: 78.160.732,50
VALOR NETO A PAGAR: 78.160.732,50

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764081209489 aprobado en 20241008 prefijo PMYA desde el número 33 al 100 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4290 Construcción de otras obras de ingeniería civil Tarifa
CUFE: 7072963159cd35be273452705eecf909de8592971cb83de1fc056eb9f7d01c2d2f7ba3dcb6d316a5ebccd005fa37d165

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900659125	6	PM & A CONSTRUCCIONES SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	SINCELEJO	CR 28 A 23 61 BARRIO LA TOSCANA	SINCELEJO-SUCRE	2721442	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-08	2024-09	904678147	9473102050	E	2024/09/06	2024/09/10	BANCOLOMBIA	4	$2,547,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: SINCELEJO (6 Afiliados)						$7,800,000	$1,378,000			$7,800,000	$312,000			$7,660,000	$306,400			$7,800,000	$543,000		$0	$0
Centro de Trabajo: SINCELEJO (6 Afiliados)						$7,800,000	$1,378,000			$7,800,000	$312,000			$7,660,000	$306,400			$7,800,000	$543,000		$0	$0
Ciudad: SINCELEJO Depto: SUCRE (6 Afiliados)						$7,800,000	$1,378,000			$7,800,000	$312,000			$7,660,000	$306,400			$7,800,000	$543,000		$0	$0
1	CC	18761071	AMELL ACUÑA ALEJANDRO MANUEL	230301	30	$1,300,000	$208,000	ESSC07	30	$1,300,000	$52,000	CCF41	30	$1,300,000	$52,000	14-23	30	$1,300,000	$90,500	30	$0	$0
2	CC	92542451	HERNANDEZ GARCIA ROBERTO CARLOS	230301	30	$1,300,000	$338,000	EPS002	30	$1,300,000	$52,000	CCF41	30	$1,300,000	$52,000	14-23	30	$1,300,000	$90,500	30	$0	$0
3	CC	9239807	MARRUGO VIVANCO CARLOS ALBERTO	25-14	30	$1,300,000	$208,000	ESSC07	30	$1,300,000	$52,000	CCF41	30	$1,300,000	$52,000	14-23	30	$1,300,000	$90,500	30	$0	$0
4	CC	92557456	MENDIVIL TOVAR CARMELO FABIAN	230301	30	$1,300,000	$208,000	ESSC07	30	$1,300,000	$52,000	CCF41	30	$1,160,000	$46,400	14-23	30	$1,300,000	$90,500	30	$0	$0
5	CC	18762257	NAGUIB GIL GUSTAVO LUIS	230201	30	$1,300,000	$208,000	EPS048	30	$1,300,000	$52,000	CCF41	30	$1,300,000	$52,000	14-23	30	$1,300,000	$90,500	30	$0	$0
6	CC	1100622811	TOVAR MEZA SERGIO ANTONIO	230301	30	$1,300,000	$208,000	ESSC07	30	$1,300,000	$52,000	CCF41	30	$1,300,000	$52,000	14-23	30	$1,300,000	$90,500	30	$0	$0
Total			**Afiliados(6)**			$7,800,000	$1,378,000			$7,800,000	$312,000			$7,660,000	$306,400			$7,800,000	$543,000		$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900659125	6	PM & A CONSTRUCCIONES SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	SINCELEJO	CR 28 A 23 61 BARRIO LA TOSCANA	SINCELEJO-SUCRE	2721442	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-08	2024-09	904678147	9473102050	E	2024/09/06	2024/09/10	BANCOLOMBIA	4	$2,547,300

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				6	$1,378,000	$4,300	$0	$1,382,300
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$208,000	$700	$0	$208,700
PORVENIR	230301	800,224,808	8	4	$962,000	$2,900	$0	$964,900
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$208,000	$700	$0	$208,700
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				6	$543,000	$1,600	$0	$544,600
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	6	$543,000	$1,600	$0	$544,600
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				6	$306,400	$900	$0	$307,300
COMFASUCRE	CCF41	892,200,015	5	6	$306,400	$900	$0	$307,300
EPS (ADMINISTRADORAS: 3)				6	$312,000	$1,100	$0	$313,100
EPS MUTUAL SER	EPS048	806,008,394	7	1	$52,000	$200	$0	$52,200
MUTUAL SER	ESSC07	806,008,394	7	4	$208,000	$700	$0	$208,700
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$52,000	$200	$0	$52,200
TOTAL				**6**	**$2,539,400**	**$7,900**	**$0**	**$2,547,300**

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900659125	6	PM & A CONSTRUCCIONES SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	SINCELEJO	CR 28 A 23 61 BARRIO LA TOSCANA	SINCELEJO-SUCRE	2721442	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-09	2024-10	967672649	9475035321	E	2024/10/07	2024/10/08	BANCOLOMBIA	1	$2,004,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION		SALUD		CCF		RIESGOS			PARAFISCALES	
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	Codigo	Días	Codigo	Días	Codigo	Días	Tarifa	Días	Exonerado SENA e ICBF
SUCURSAL: SANTA ROSA (7 Afiliados)																														
Centro de Trabajo: SANTA ROSA (7 Afiliados)																														
Ciudad: SANTA ROSA Depto: BOLIVAR (7 Afiliados)																														
1	CC	1005582386	CANCHILA MENDIVIL YOINER JAVIER	X																230301	21	MIN002	21	CCF09	21	14-23	21	6.960%	21	Si
2	CC	15614229	HERRERA MIRANDA RAFAEL NAUN	X																230301	24	ESSC07	24	CCF09	24	14-23	24	6.960%	24	Si
3	CC	9239135	IBAÑEZ DE HORTA FULGENCIO	X																25-14	24	ESSC24	24	CCF09	24	14-23	24	6.960%	24	Si
4	CC	92556826	MENDIVIL TOVAR SOMERZO RAUF	X																230301	17	EPS048	17	CCF09	17	14-23	17	6.960%	17	Si
5	CC	1048601196	SAYA GONZALEZ GABRIELA	X																230301	12	ESSC07	12	CCF09	12	14-23	12	6.960%	12	Si
6	CC	73539869	SIERRA OROZCO JONY	X																230301	24	EPS002	24	CCF09	24	14-23	24	6.960%	24	Si
7	CC	1007195517	VIVANCO YEPES JOEL DAVID	X																230301	24	ESSC07	24	CCF09	24	14-23	24	6.960%	24	Si
Total			**Afiliados(7)**																											

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900659125	6	PM & A CONSTRUCCIONES SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	SINCELEJO	CR 28 A 23 61 BARRIO LA TOSCANA	SINCELEJO-SUCRE	2721442	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-09	2024-10	967672649	9475035321	E	2024/10/07	2024/10/08	BANCOLOMBIA	1	$2,004,300

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)				7	$1,034,700	$900	$0	$1,035,600
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$166,400	$200	$0	$166,600
PORVENIR	230301	800,224,808	8	6	$868,300	$700	$0	$869,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				7	$450,200	$400	$0	$450,600
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	7	$450,200	$400	$0	$450,600
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				7	$258,700	$200	$0	$258,900
COMFAMILIAR CARTAGENA	CCF09	890,480,110	1	7	$258,700	$200	$0	$258,900
EPS (ADMINISTRADORAS: 5)				7	$258,700	$500	$0	$259,200
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	1	$41,600	$100	$0	$41,700
EPS MUTUAL SER	EPS048	806,008,394	7	1	$29,500	$100	$0	$29,600
FOSYGA RÉGIMEN DE EXCEPCIÓN	MIN002	901,037,916	1	1	$42,000	$100	$0	$42,100
MUTUAL SER	ESSC07	806,008,394	7	3	$104,000	$100	$0	$104,100
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$41,600	$100	$0	$41,700
TOTAL				7	$2,002,300	$2,000	$0	$2,004,300
