

PROGRAMACION DE INTERVENCION DE LA RED VIAL TERCIARIA PARA EL MUNICIPIO DE YOPAL CASANARE


ELABORACIÓN DEL PALN DE INTERVENCION.

Por medio de visitas técnicas realizadas por los ingenieros del área de vías, se han atendido solicitudes hechas por las diferentes comunidades rurales, la información recopilada en dichas visitas se usa para confirmar por medio de una comparación con la CONSULTORÍA No 1001.84.2038, cuyo objeto es "INVENTARIO Y ANÁLISIS DE SOSTENIBILIDAD PARA LA RED VIAL TERCIARIA DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE." Herramienta aprobada por el ministerio de transporte y que contiene el inventario de todas las vías rurales que pertenecen al municipio de Yopal, esto con el fin de confirmar la categorización de las vías a intervenir, y así evitar operaciones de la maquinaria del municipio en terrenos que sean de propiedad de algún particular o de alguna organización de carácter privado, generando así un diagnostico de cada vía visitada, el cual nos ha servido de insumo para proyectar nuestro plan de intervenciones de la red vial terciaria, el cual durante este segundo periodo tiene contempladas las vías que se relacionan a continuación.


VEREDA	VIA	LONGITUD (Km)
PICON - EL ARENAL	PICON ARENAL EL GARZON	14,1
PICON - EL ARENAL	PICON ARENAL EL GARZON RAMAL FINCA LAS MARIA	1,77
EL GARZON EL ARENAL	VARIANTE LA UNION- EL GARZON-EL ARENAL-VIA CENTRAL TILODIRAN (DESDE K19 HASTA EL K22)	19
EL ARENAL	VARIANTE LA UNION- EL GARZON-EL ARENAL-VIA CENTRAL TILODIRAN (DESDE K19 HASTA EL K22)	5




VEREDA	VIA	LONGITUD (Km)
EL GARZON EL ARENAL	VIA LA UNION-MANANTIALES (LA VIRGEN_VARIANTE LA UNION EL GARZON	3
EL ARENAL Y LA ALEMANIA	EL ARENAL-ALEMANIA	4
LA ALEMANIA	EL ARENAL-ALEMANIA	3,6
PLAYON SANTA BARBARA	CENTRO POBLADO LA CHAPARRERA_PLAYON SANTA BARBARA	4,6
PLAYON SANTA BARBARA	MARGINAL DE LA SELVA (PUENTE RÍO TOCARIA)_PLAYON RECUERDO	3,8
RINCON DE LA MANGA	RAMAL 2 RINCON DE LA MANGA	1,65
RINCON DE LA MANGA	RAMAL VÍA CENTRAL TACARIMENA RINCON DE LA MANGA(K7+390)	1,72

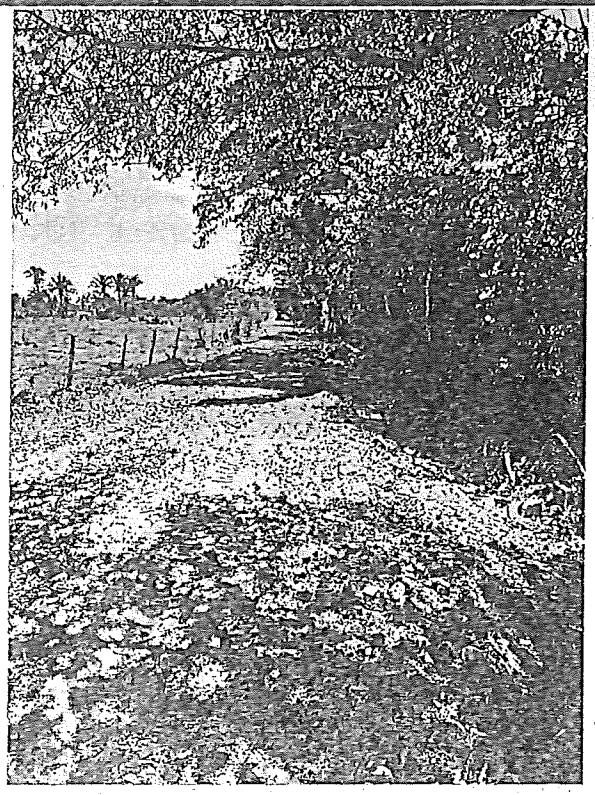


VEREDA	VIA	LONGITUD (Km)
LA CALCETA	VÍA CENTRAL TACARIMENA _LA CALCETA_LA MANGA	10
TACARIMENA	RAMAL VÍA CENTRAL TACARIMENA RINCON DE LA MANGA(K6+890)	2
PALOMAS	VÍA CENTRAL PALOMAS _RAMAL LOS REINAS	2,5
PALOMAS	VÍA CENTRAL MATEPANTANO_RAMAL PALOMAS	1,5
PUNTO NUEVO	RAMAL VIA EL TIESTAL-CAÑO SECO (K39+960) - FINCA EL RETORNO (K0+0 HASTA K0+35)	1,35

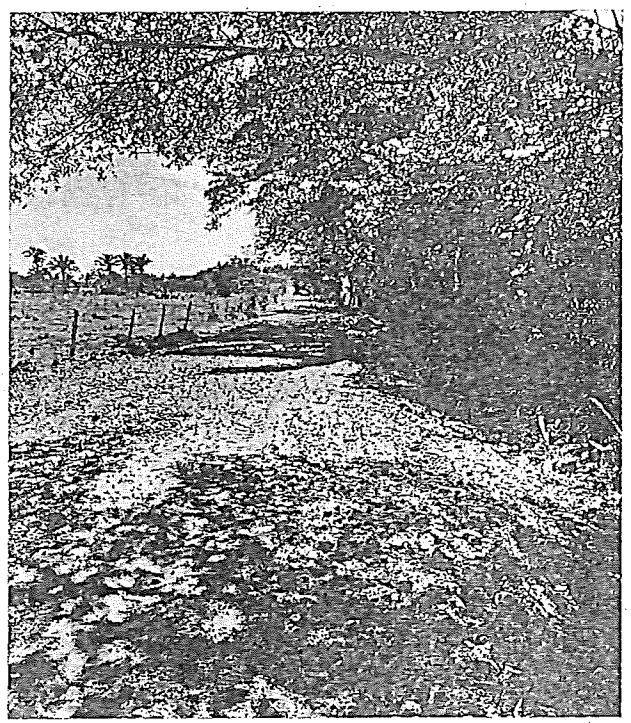


VEREDA	VIA	LONGITUD (Km)
PUNTO NUEVO	VIA FINCA EL RETORNO - RAMAL RIO CRAVO SUR	3
PUNTO NUEVO	RAMA PUNTO NUEVO (K19+290)	2
PALOMAS AGUA VERDE	RAMAL VIA EL TIESTAL - CAÑOSECO - PALOMAS AGUAVERDE - (K51+592)	0,74
PALOMAS	RAMAL PALOMAS AGUAVERDE	2,1
SAN JOSE DE CAÑO SECO	YOPAL (LIMITE URBANO CALLE 40)- MANANTIALES-EL TIESTAL (GLORIETA) - PUNTO NUEVO- QUEBRADASECA(DESDE K55+674 HASTA K58+874)	4,2

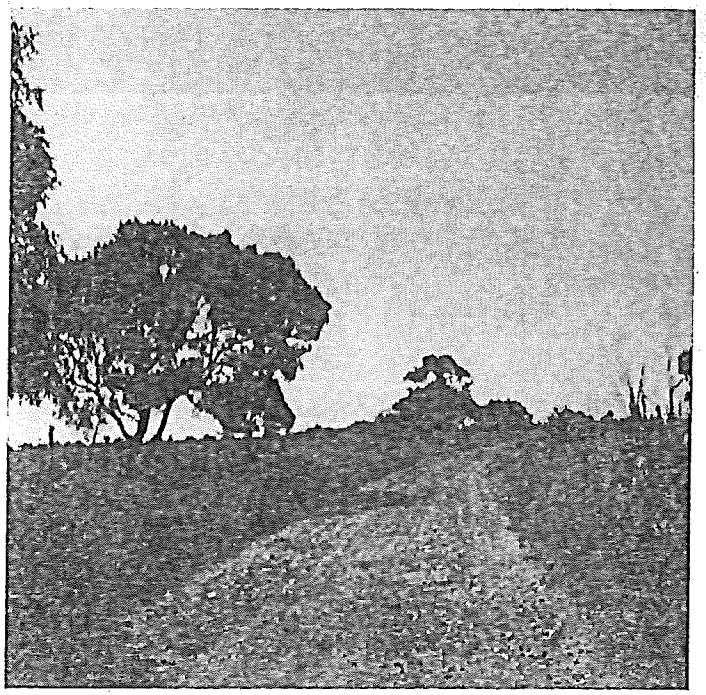

VEREDA	VIA	LONGITUD (Km)
LA ALEMANIA	VÍA CENTRAL YOPAL-TILO (K28+581)_ RAMAL ALEMANIA B	7
TILODIRAN	VILLAS DE TILODIRAN	1,3
GUAFILLA - CAGUI MILAGRO	MARGINAL DE LA SELVA (SECTOR CENTRO POBLADO GUAFILLA) _ CAGUI MILAGROS	7,3
LA VEGA-EL GAQUE- LA LIBERTAD	VIA CENTRAL A EL MORRO (GUAMALERA)_ESCUELA LIBERTAD	13
CAGUI MILAGRO - GUAFILLA - UPAMENA	RAMAL ACCESO VEREDAS CAGUI MILAGRO Y UPAMENA	2,35

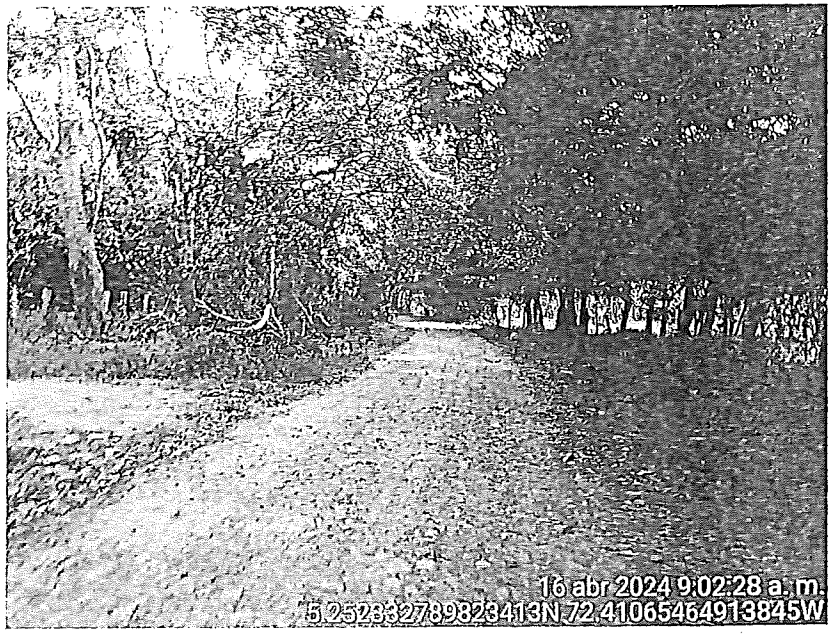

VEREDA	VIA	LONGITUD (Km)
BELLAVISTA (CHARTE)	MARGINA DE LA SELVA (SECTOR CENTRO POBLADO EL CHARTE)_BELLAVISTA	3,83
BELLAVISTA (CHARTE)	RAMAL INTERNO BELLAVISTA B. (ACCESO A URBANIZACIÓN)	0,821
MORICHAL	VÍA CENTRAL TILODIRAN (65CA04) K5+930_RAMAL A	1
MORICHAL	BARRIO LOS ANGELES	1
NARANJITOS	VÍA CENTRAL MATA DE LIMON(KIOSCO) _ENCERRAMIENTO ESCUELA NARANJITOS	4
BELLAVISTA (CHARTE)	RAMAL INTERNO BELLAVISTA D . (URBANIZACIÓN)	0,843

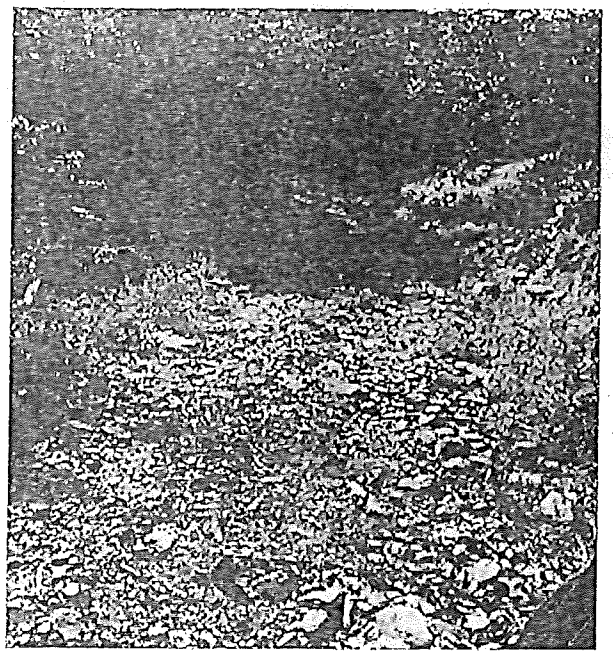

VEREDA	VIA	LONGITUD (Km)
MORICHAL	VÍA CENTRAL TILODIRAN (65CA04) K7+000_RAMAL C	1
GAVIOTAS AGUA VERDE	RAMAL VÍA GAVIOTAS AGUA VERDE-LIMITE MUNICIPAL YOPAL-MANI	15
BELLAVISTA (CHARTE)	RAMAL INTERNO BELLAVISTA C. (ACCESO AL RÍO CHARTE)	0,265
BRISAS DEL CRAVO	VÍA CENTRAL RINCON DEL SOLDADO_RAMAL INTERNO BRISAS DEL CRAVO (CERRO EL VENADO)	3,2



VEREDA	VIA	LONGITUD (Km)
CAGUI ESPERANZA	VÍA ACCESO VEREDA CAGUI ESPERANZA	5,62
LA VEGA-SAN CRISTOBAL	VÍA CENTRAL A EL MORRO (K1+761)_VEREDA LA VEGA_SAN CRISTOBAL_ELGAQUE	6,4
LA REFORMA	VÍA CENTRAL LABRANZAGRANDE_LA REFORMA	3,75



CONSOLIDADO

Durante este segundo semestre del año 2024, la Secretaria de Infraestructura tiene dentro de su programación, la intervención de 155 km de la red vial terciaria de Yopal, distribuidos en 26 veredas y 38 vías.

ITEM	VEREDA	LONGITUD (Km)
1	PICON - EL ARENAL	14.1
2	PICON - EL ARENAL	1.77
3	EL GARZON EL ARENAL	19
4	EL GARZON EL ARENAL	5
5	EL GARZON EL ARENAL	3
6	EL ARENAL Y LA ALEMANIA	4
7	LA ALEMANIA	3.6
8	PLAYON SANTA BARBARA	4.6
9	PLAYON SANTA BARBARA	3.8
10	RINCON DE LA MANGA	1.65
11	RINCON DE LA MANGA	1.72
12	LA CALCETA	10
13	TACARIMENA	2
14	PALOMAS	2.5
15	PALOMAS	1.5
16	PUNTO NUEVO	1.35
17	PUNTO NUEVO	3
18	PUNTO NUEVO	2
19	PALOMAS AGUA VERDE	1.74
20	PALOMAS AGUA VERDE	2.1
21	SAN JOSE DE CAÑO SECO	4.2
22	NARANJITOS	4
23	MORICHAL	1
24	MORICHAL	1
25	MORICHAL	1
26	LA ALEMANIA	7
27	TILODIRAN	1.3
28	LA VEGA -GAQUE-LA LIBERTAD	13
29	BELLAVISTA (CHARTE)	3.83
30	BELLAVISTA (CHARTE)	0.821
31	BELLAVISTA (CHARTE)	0.843
32	BELLAVISTA (CHARTE)	0.265
33	GUAFILLA - CAGUI MILAGRO	7.3
34	CAGUI MILAGRO - GUAFILLA - UPAMENA	2.35
35	BRISAS DEL CRAVO	3.2
36	CAGUI ESPERANZA	5.62
37	LA VEGA-SAN CRISTOBAL	6.4
38	LA REFORMA	3.75
	TOTAL	155.309

Elaboró: Juan Sebastián Patiño Mariño - Profesional contratado

Revisó: Gloria Esperanza Canaria Cardozo - Profesional contratado

REPUBLICA DE COLOMBIA
ALCALDIA DE YOPAL
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

INFORME DEL ESTADO ACTUAL DE LA MAQUINARIA ADSCRITA A LA SECRETARÍA DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE YOPAL. 23 DE AGOSTO DE 2024

ITEM	EQUIPO						ESTADO		
							EN SERVICIO	FUERA DE SERVICIO	OBSERVACIONES
	TIPO / MODELO	NUMERO INTERNO	MARCA	REFERENCIA	AÑO	PLACA			NECESIDAD
1	EXCAVADORA	01-01	SANY	SY 215C	2014		1		CAMBIO 2 VALVULAS SOLENIODE PROPORCIONAL # DE PAETE 60065222, UN SENSOR DE VELOCIDAD # DE PARTE B240600000235, CAMBIO MOTOR DE TRASLACION
2	EXCAVADORA	01-02	SANY	SY 215C	2014			1	REVISION ELECTROVALVULAS DE MARCHA
3	EXCAVADORA	01-03	J.Deere	200CLC	2006			1	CORREGIR FUGA MOTOR DE GIRO, FUGA RETENEDOR BOMBA HIDRAULICA, CAMBIO MANGUERAS DE ALTA, AJUSTE DE BUJES BALDE, CAMBIO DE ALGUNAS ZAPATAS, CAMBIO DE CADENAS Y CARRILERIA COMPLETA. CROMADA Y EMPAQUETADURA GATO CILINDRO BALDE, CAMBIO TABLERO DE INSTRUMENTOS, REPARACION AIRE ACONDICIONADO Y PLUMILLA, SISTEMA ELECTRICO (LUCES). LA EXCAVADORA SALE EL 20-11-2023 AL TALLER EXTERNO TEKMAN RETORNA DEL TALLER EXTERNO A LAS INSTALACIONES DE TALLER DELA ALCALDIA REPARADA EN ALGUNA DE SUSPARTE S EL DIA 12/12/2023 QUEDANDO PENDIENTE LO ANTERIOR MENTE MENCIONADO MAS UN NUEVO DIAGNOSTICO QUE PRESENTA RECALENTAMIENTO EN EL MOTOR REQUIERE PARA ESTO SENSORES DE TEMPERATURA

REPUBLICA DE COLOMBIA
ALCALDIA DE YOPAL
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

4	RETRO CARGADOR	02-01	KING	866H	2013				EQUIPO RELACIONADO PARA REMATE Y/O CHATARRIZACIÓN
5	RETRO CARGADOR	02-02	KING	866H	2013				EQUIPO RELACIONADO PARA REMATE Y/O CHATARRIZACIÓN
6	RETRO CARGADOR	02-03	KING	866H	2013				EQUIPO RELACIONADO PARA REMATE Y/O CHATARRIZACIÓN
7	RETRO CARGADOR	02-04	J.Deere	310SG	2006			1	REPARACION SERVO TRANSMISION Y REPARACION CONVEERTIDOR
8	MOTONIVELADORA	03-01	SANY	SHG 190C	2014				EQUIPO RELACIONADO PARA REMATE Y/O CHATARRIZACIÓN
9	MOTONIVELADORA	03-02	SANY	SHG 190C	2014		1		CAMBIO DE 6 LLANTAS E-3/L-3 17.5-25
10	MOTONIVELADORA	03-03	SANY	SHG 190C	2014		1		LAVADO DE RADIADOR, CAMBIO DE VIDRIO CABINA, REVISION RECALENTAMIENTO
11	MOTONIVELARORA	03-04	J.Deere	670D	2006			1	REHABILITACIÓN SISTEMA ELÉCTRICO CABINA, SISTEMA DE MARCHA Y CONTRA MARCHA BLOQUEADOS
12	MOTONIVELARORA	03-05	CASE	845B	2021		1		TORNA MESA EN OBSERVACION , MANTENIMIENTO PREVENTIVO

REPUBLICA DE COLOMBIA
ALCALDIA DE YOPAL
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

13	BULLDOZER	04-01	JOHN DEERE	850J	2013			1	REVISION DEL SENSOR DE GIRO IZQUIERDO Y CAMBIO DE BOMBA AUXILIAR DE CONBUSTIBLE, ENVENAR ZAPATAS, TORNILLERIA PARA ZAPATAS. REVISION CAMBIO DE SPROKET, (POR DEFINIR PRECIO) DE RECORTAR PASO CADENA, CAMBIO DE COJINETE Y RECONSTRUIR MUÑON BRAZO PALA
14	BULLDOZER	04-02	JOHN DEERE	750J	2014			1	FUGA CILINDRO HIDRAULICO DERECHO DE LA PALA, BLOQUEO SISTEMA DE LEVANTE DE LA PALA Y DEL REEPER, FULL DE HIDRAULICO,REVISION BOMBA HIDRAULICA, (POR DEFINIR PRECIO)
15	BULLDOZER	04-03	J.Deere	750J	2006			1	SITEME DE MARCHA BLOQUEADO, CAMBIO DE ELCTROVALVULAS FRENO DE PARQUEO Y CAMBIO MANGUERA RADIADOR FUGA DE AGUA (RECALENTAMIENTO)
16	VIBRO COMPACTADOR	05-01	KING	XS80	2013			1	FABRICACION DE EJE MOTOPR DE VIBRACION
17	VIBRO COMPACTADOR	05-02	KING	XS80	2013				EQUIPO RELACIONADO PARA REMATE Y/O CHATARRIZACIÓN
18	VIBRO COMPACTADOR	05-03	KING	XS80	2013				EQUIPO RELACIONADO PARA REMATE Y/O CHATARRIZACIÓN
19	VIBRO COMPACTADOR	05-04	DYNAPAC	CA-15	2006				EQUIPO RELACIONADO PARA REMATE Y/O CHATARRIZACIÓN
20	VIBRO COMPACTADOR	05-05	VIBROMAX	2000	1995				EQUIPO RELACIONADO PARA REMATE Y/O CHATARRIZACIÓN
21	VIBRO COMPACTADOR	05-06	CATERPÍLLAR	CAT-CB7	2021		1		BUEN ESTADO, PENDIENTE MANTENIMIENTO PREVENTIVO

REPUBLICA DE COLOMBIA
ALCALDIA DE YOPAL
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

22	MINI CARGADOR	06-01	JOHN DEERE	320D	2013		1		BUEN ESTADO
23	MINI CARGADOR	06-02	JOHN DEERE	320E	2014			1	CAMBIO BOTON DE PARQUEO, REVISION MANDOS DE MARCHA Y GIRO, CAMBIO DE EMPAQUETADURA CILINDRO DE LEVANTE PALA, CAMBIO DE EMPAQUETADDURA BOMBAS TRASLACION. (POR DEFINIR PRECIO)
24	VOLQUETA SENCILLA	07-01	FREIGHTLINER (M)	M2 106	2014	OSE-762		1	MANTENIMIENTO AIRE ACONDICIONADO, MANTENIMIENTVO PREVENTIVO, 4 LLANTAS TRACCION 12R X22.5 Y DOS LLANTAS DIRECCIONALES 12R X 22.5, 6 RINES , CARPERO Y CARPA , CAMBIO BLOWER DE A/C,NO TIENE REVISION TECNOMECANICA.
25	VOLQUETA SENCILLA	07-02	FREIGHTLINER (M)	M2 106	2014	OSE-763		1	REVISION Y PUESTA A PUNTO DE AIRE CAONDICIONADO, CARPERO, CARPA , 4 LLANTAS TRACCION 12 R X 22.5 Y DOS LLANTAS DIRECCIONALES 12 R X 22.5, 2 BATERIAS 30 H DE TORNILLO , 6 RINES, BLOWER DE A/C,CAMBIO KIT DE EMBRAGUE , AJUSTE CAJA DE VELOCIDADES, DOS RINES,MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y NO TIENE REVISION TECNOMECANICA
26	VOLQUETA SENCILLA	07-03	FREIGHTLINER (M)	M2 106	2014	OSE-764		1	REPARACION CARPERO , CAMBIO DE CARPA, NO TIENE REVISION TECNOMECANICA, CUATRO LLANTAS TRACCION 12 R X 22.5 , DOS LLANTAS DIRECCIONALES 12R X 22.5 Y REPARACION FIBRA DE VIDRIO CONJUNTO , DOS BATERIAS 30 H , DOS RINES Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO
27	VOLQUETA SENCILLA	07-04	FREIGHTLINER (M)	M2 106	2014	OSE-765		1	EMPAQUETADURA BOTELLA DEL VOLCO, CAMBIO CARPA PLATON , CARPERO MANTENIMIENTO AIRE ACONDICIONADO, NO TIENE REVISION TECNOMECANICA. REVISION CAJA DE VELOCIDADES, CUATRO LLANTAS TRACCION Y DOS DIRECCIONALES 12 R X 22.5 , DOS RINES MANTENIMIENTO PREVENTIVO

REPUBLICA DE COLOMBIA
ALCALDIA DE YOPAL
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

28	VOLQUETA SENCILLA	07-05	FREIGHTLINER (M)	M2 106	2014	OSE-766		1	4 LLANTAS TRACCION 12R X 22.5, Y DOS LLANTAS DIRECCIONALES 12R X 22.5, MANTENIMIENTO AIRE ACONDICIONADO, CAMBIO CARPA PLATON , CONJUNTO PARTE INFERIOR DELANTERA PARA REPARACION, NO TIENE REVISION TECNOMECANICA, NO ACELERA (SERVICIO DE SCANER). modulo de cabina, CUATRO RINES , DOS BATERIAS 30 H DE TORNILLO, MANTENIMIENTO PREVENTIVO,
29	VOLQUETA SENCILLA	07-06	FREIGHTLINER (M)	M2 106	2014	OSE-767		1	REVISION A/C, CARPA, CARPERO, DOS BATERIAS, NO TIENE REVISION TECNOMECANICA, NO TIENE PLACA TRASERA
30	VOLQUETA SENCILLA	07-07	INTERNATIONAL	S1954	1989	THK-079			EQUIPO RELACIONADO PARA REMATE Y/O CHATARRIZACIÓN
31	VOLQUETA SENCILLA	07-08	KODIAK	157MT 7200	2007	OSE-676			EQUIPO RELACIONADO PARA REMATE Y/O CHATARRIZACIÓN
32	VOLQUETA SENCILLA	07-09	KODIAK	157MT 7200	2007	OSE-677			EQUIPO RELACIONADO PARA REMATE Y/O CHATARRIZACIÓN
33	VOLQUETA SENCILLA	07-10	KODIAK	157MT 7200	2007	OSE-679			EQUIPO RELACIONADO PARA REMATE Y/O CHATARRIZACIÓN
34	VOLQUETA SENCILLA	07-11	KODIAK	157MT 7200	2007	OSE-680			EQUIPO RELACIONADO PARA REMATE Y/O CHATARRIZACIÓN
35	VOLQUETA SENCILLA	07-12	KODIAK	157MT 7200	2007	OSE-681			EQUIPO RELACIONADO PARA REMATE Y/O CHATARRIZACIÓN
36	VOLQUETA DOBLETROQUE	08-01	FREIGHTLINER (M)	M2 112	2014	OSE-768		1	REVISION DE AC, CAMBIO RETENEDOR DEL DIVISOR Y RETENEDOR TRANMISION TRASERA, FUGA DE AGUA RADIADOR, REVISION ELECTRICA , REVISION TECNOMECANICA VENCIDA.
37	VOLQUETA DOBLETROQUE	08-02	FREIGHTLINER (M)	M2 112	2014	OSE-769		1	REPARACION CARPERO , CARPA CAMBIO DE CUATRO LLANTAS TRACCION 12R X22.5, CAMBIO DE CORREA DE ACCESORIOS Y REPARACION COMPRESOR DE A/C

REPUBLICA DE COLOMBIA
ALCALDIA DE YOPAL
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

38	VOLQUETA DOBLETROQUE	08-03	FREIGHTLINER (M)	M2 112	2014	OSE-770		1	CARPA PLATON, 8 LLANTA TRACCION 12R X 22.5 Y DOS DIRECCIONALES 12 R X22.5, REVISION ELECTRICA EN GENERAL
39	VOLQUETA DOBLETROQUE	08-04	FREIGHTLINER (M)	M2 112	2014	OSE-772	1		CAMBIO FILTRO AIRE DE MOTOR
40	VOLQUETA DOBLETROQUE	08-05	FREIGHTLINER (M)	M2 112	2014	OSE-773		1	CAMBIO EMPAQUETADURA CILINDRO DE VOLCO, FUGA RETENEDOR DE LA TRANSMISION, CAMBIO DE TORNILLO DE CENTRO REVISION KIT DE EMBRAGUE
41	VOLQUETA DOBLETROQUE	08-06	FREIGHTLINER (M)	M2 112	2014	OSE-774	1		ARREGLO DE AIRE ACONDICIONADO, REVISION RECALENTAMIENTO, CAMBIO DE BUJES Y PASADORES MUELLES DELANTEROS , REVISION FUGA DE AIRE Y CAMBIO DE RETENEDOR PACHA TRASERA
42	VOLQUETA DOBLETROQUE	08-07	FREIGHTLINER (M)	M2 112	2014	OSE-775	1		CARPA PLATON , REVISION A/C, DOS LLANTAS DDIRECCIONALE Y OCHO LLANTAS TRACCION 12 R X 22.5, CAMBIO DE BUJES Y PASADORES VIGAS TANDEM
43	VOLQUETA DOBLETROQUE	08-08	FREIGHTLINER (M)	M2 112	2014	OSE-776		1	CARPA Y CARPERO, NO TIENE REVISION TECNOMECANICA
44	VOLQUETA DOBLETROQUE	08-09	FREIGHTLINER (M)	M2 112	2014	OSE-777	1		CAMBIO DE SWICHE DE ENCENDIDO
45	VOLQUETA DOBLETROQUE	08-10	FREIGHTLINER (M)	M2 112	2014	OSE-782	1		BUEN ESTADO
46	VOLQUETA DOBLETROQUE	08-11	KODIAK	TANDEM	2007	OSE-678			EQUIPO RELACIONADO PARA REMATE Y/O CHATARRIZACIÓN

REPUBLICA DE COLOMBIA
ALCALDIA DE YOPAL
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

47	CARROTANQUE DOBLETROQUE	09-01	FREIGHTLINER (M)	M2 112	2014	OSE-780	1		FUGA TANQUE DE AGUA, CAMBIO DE OCHO LLANTAS TRACCION Y DOS DIRCCIONALES 12 R X 22.5
48	CARROTANQUE SENCILLO	09-02	FREIGHTLINER (M)	M2 106	2014	OSE-781	1		REVISION FANCLOUCTH
49	CARROTANQUE SENCILLO	09-03	KODIAK DIESEL	157MT 7200	1995	OFJ-838			EQUIPO RELACIONADO PARA REMATE Y/O CHATARRIZACIÓN
50	CAMIONETA ESTACAS	CM-01	CHEVROLET	DIMAX	2014	OSE-783	1		FUGA DE ACEITE EN EL MOTOR, ODOMETRO DAÑADO, CAMBIO DE PATINTENSOR CORREA A/C Y REFUERZO SOPORTE FILTRO TRAMPA
51	CAMIONETA ESTACAS	CM-02	CHEVROLET	DIMAX	2014	OSE-784	1		CAMBIO DE CORREA DE A/C Y CAMBIO DE COMPRESOR A/C
52	CAMIONETA ESTACAS	CM-03	CHEVROLET	COLORADO	2022	OSE-925	1		CAMBIO SENSOR DEL TURBO, REVISION VIDRIODS ELELECTRICOS , CAMBIO DE UNA EXPLORADORA IZQUIERDA Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO.
53	CARRO TALLER	CT-01	CHEVROLET	NQR	2015	OSE-785	1		DOTACION DE HERRAMIENTA
54	TRAILER CAMA BAJA	TC-01	TRAILER CAMABAJA	SRBC	2014			1	CAMBIO DE LLANTAS, RINES Y REVISION DE FRENOS, REVISION ELECTRICA EN GENERAL
	TRACTOCAMION		KENWORTH	T800	1992	OSE-761			EQUIPO RELACIONADO PARA REMATE Y/O CHATARRIZACIÓN

REPUBLICA DE COLOMBIA
ALCALDIA DE YOPAL
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

55	TRAILER CAMA BAJA	CT-02	TRAILER CAMABAJA		2021	OSE-923	1		CAMBIO DE OCHO LLANTAS TRACCION, DOS DIRECCIONALES LLANTAS 295/80 R 22.5 Y OCHO LIANTAS 255/70/ R 22.5 TRAILER, SERVICIO DE SCANER
	TRACTOCAMIÓN		FREGHTLINER 114SD	TC-02	2022				REVISION MOTOBOMBA
							18	21	

PORCENTAJE DE MAQUINARIA EN SERVICIO **46%**

PORCENTAJE DE MAQUINARIA FUERA DE SERVICIO **54%**

MAQUINARIA REMATE Y/O CHATARRIZACION

ING. CESAR AUGUSTO RINCON COMBA
PROFESIONAL CONTRATADO CTO. 2194/2024

PROYECCION DE INVERSION VIGENCIAS 2024- 2025

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	VALOR TOTAL (IVA INCLUIDO)	Vigencia 2024	Vigencia 2025				
				DICIEMBRE	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO
1	MEZCLA DENSA EN CALIENTE (MDC -19)	m3	$ 1.738.550.008,27	$ 434.637.502,07	$ 260.782.501,24	$ 260.782.501,24	$ 260.782.501,24	$ 260.782.501,24	$ 260.782.501,24
2	EMULSIÓN ASFÁLTICA CRR-1 o CRL-1	Galón	$ 120.697.509,18	$ 30.214.376,57	$ 18.104.626,38	$ 18.104.626,38	$ 18.104.626,38	$ 18.104.626,38	$ 18.104.626,38
3	SUB BASE TRITURADA T. MAX 2"	m3	$ 520.000.012,00	$ -	$ 104.000.002,40	$ 104.000.002,40	$ 104.000.002,40	$ 104.000.002,40	$ 104.000.002,40
4	BASE TRITURADA T. MAX 1 1/2"	m3	$ 38.581.750,29	$ -	$ 7.716.350,06	$ 7.716.350,06	$ 7.716.350,06	$ 7.716.350,06	$ 7.716.350,06
5	CRUDO DE RIO CLASIFICADO T. MAX 4"	m3	$ 515.568.643,19	$ -	$ 103.113.728,64	$ 103.113.728,64	$ 103.113.728,64	$ 103.113.728,64	$ 103.113.728,64
6	DISCO DIAMANTADO D= 14" CORTE CONCRETO, LADRILLO O BALDOSA	und	$ 57.559.998,40	$ -	$ 11.511.999,68	$ 11.511.999,68	$ 11.511.999,68	$ 11.511.999,68	$ 11.511.999,68
TOTAL				$ 464.851.879	$ 505.229.208	$ 505.229.208	$ 505.229.208	$ 505.229.208	$ 505.229.208
								TOTAL	$ 2.990.997.921

INVERSION VIGENCIA 2024

Item	Cantidad (m3)	valor unitario	valor total	justificación de la inversion	
MEZCLA DENSA EN CALIENTE (MDC -19)	362,5	$ 1.199.000	$ 434.637.502	Deacuerdo al informe de programacion de reparcheo para el mantenimiento de las vias del casco rbano de la ciudad de yopal	MES DE DICIEMBRE
EMULSIÓN ASFÁLTICA CRR-1 o CRL-1	998	$ 30.250	$ 30.189.500	Deacuerdo al informe de programacion de reparcheo para el mantenimiento de las vias del casco rbano de la ciudad de Yopal.	MES DE DICIEMBRE
		TOTAL	$ 464.827.002		

INVERSION VIGENCIA 2025 PERIODO DESDE EL MES DE ENERO AL MES DE MAYO

DESCRIPCION	CANTIDAD (m3)	Valor	costo mensual	duracion (mes)	Costo total (5 meses)	justificacion
MEZCLA DENSA EN CALIENTE (MDC -19)	217,5	$ 1.199.000	$ 260.782.500	5	$ 1.303.912.500	Deacuerdo al informe de programacion de reparcheo para el mantenimiento de las vias del casco rbano de la ciudad de Yopal ; Informe de vias urbanas en afirmado; programacion de intervenciones rurales
EMULSIÓN ASFÁLTICA CRR-1 o CRL-1	598,4	$ 30.250	$ 18.101.600	5	$ 90.508.000	Deacuerdo al informe de programacion de reparcheo para el mantenimiento de las vias del casco rbano de la ciudad de Yopal ; Informe de vias urbanas en afirmado; programacion de intervenciones rurales
SUB BASE TRITURADA T. MAX 2"	1600	$ 65.000	$ 104.000.000	5	$ 520.000.000	Deacuerdo al informe de programacion de reparcheo para el mantenimiento de las vias del casco rbano de la ciudad de Yopal ; Informe de vias urbanas en afirmado; programacion de intervenciones rurales
BASE TRITURADA T. MAX 1 1/2"	97	$ 79.550	$ 7.716.350	5	$ 38.581.750	Deacuerdo al informe de programacion de reparcheo para el mantenimiento de las vias del casco rbano de la ciudad de Yopal ; Informe de vias urbanas en afirmado; programacion de intervenciones rurales
CRUDO DE RIO CLASIFICADO T. MAX 4"	2185,4	$ 47.183	$ 103.113.734	5	$ 515.568.668	Deacuerdo al informe de programacion de reparcheo para el mantenimiento de las vias del casco rbano de la ciudad de Yopal ; Informe de vias urbanas en afirmado; programacion de intervenciones rurales
DISCO DIAMANTADO D= 14" CORTE CONCRETO, LADRILLO O BALDOSA	16	$ 720.000	$ 11.520.000	5	$ 57.600.000	Deacuerdo al informe de programacion de reparcheo para el mantenimiento de las vias del casco rbano de la ciudad de Yopal ; Informe de vias urbanas en afirmado; programacion de intervenciones rurales
				TOTAL	$ 2.990.997.921	

Elaboró: _____
NOMBRE: JHORBAN EDGARDO MENDOZA CHAPARRO
CARGO: PROFESIONAL CONTRATADA

Revisó: _____
NOMBRE: GLORIA ESPERANZA CANARIA CARDOZO
CARGO: PROFESIONAL CONTRATADA
