Alcaldía Municipal de Envigado	FORMATO	Codigo:	PT-F-028
	INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN	Versión:	001
		Pagina:	1 de 3

INFORME DE SUPERVISOR No.:	1	**FECHA DEL INFORME:**	**jueves, 23 de abril de 2020**

CONTRATO DE OBRA

Contrato No:	ENV-09-32-0461-20		**Objeto:**	ESTUDIO Y DESEÑO ESTRUCTURAL PARA EL MANEJO DE INESTABILIDAD EN EL BARRIO EL SALADO, MUNICIPIO DE ENVIGADO.			
Contratista:	RAPITEST INGENIERIA LTDA.						
NIT:	830.052.363-2						
DATOS CONTRATO PRINCIPAL:	**Valor Inicial:**	$ 18.700.850	**Plazo Inicial:**	60	**Fecha suscripción:**	24-02-20	
DATOS ADICIÓN / MODIFICACIÓN No.1:	**Valor:**		**Plazo:**		**Fecha suscripción:**		
DATOS ADICIÓN / MODIFICACIÓN No.2:	**Valor:**		**Plazo:**		**Fecha suscripción:**		
DATOS ADICIÓN / MODIFICACIÓN No.3:	**Valor:**		**Plazo:**		**Fecha suscripción:**		
DATOS ADICIÓN / MODIFICACIÓN No.3:	**Valor:**		**Plazo:**		**Fecha suscripción:**		
ACTA DE SUSPENSIÓN No.1:		**ACTA DE REINICIO No.1:**		**ACTA DE SUSPENSIÓN No.2:**		**ACTA DE REINICIO No.2:**	
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	$ 18.700.850		**PLAZO TOTAL DEL CONTRATO:**	60			
Fecha de iniciación:	lunes, 2 de marzo de 2020		**Fecha de vencimiento:**	viernes, 1 de mayo de 2020			


POLIZAS DEL CONTRATO

COMPAÑÍA	CLASE GARANTIA	POLIZA No.	VALOR	VENCIMIENTO DIA	VENCIMIENTO MES	VENCIMIENTO AÑO
Este contrato no contempla polizas						

AVANCES DEL CONTRATO

GRAFICA DE AVANCE DEL CONVENIO

	%PROGRAMADO	%EJECUTADO	DIFERENCIA
Acumulado anterior	0,00%	0,00%	**0,00%**
Durante el periodo	100,00%	100,00%	**0,00%**
Acumulad Actual	100,00%	100,00%	**0,00%**

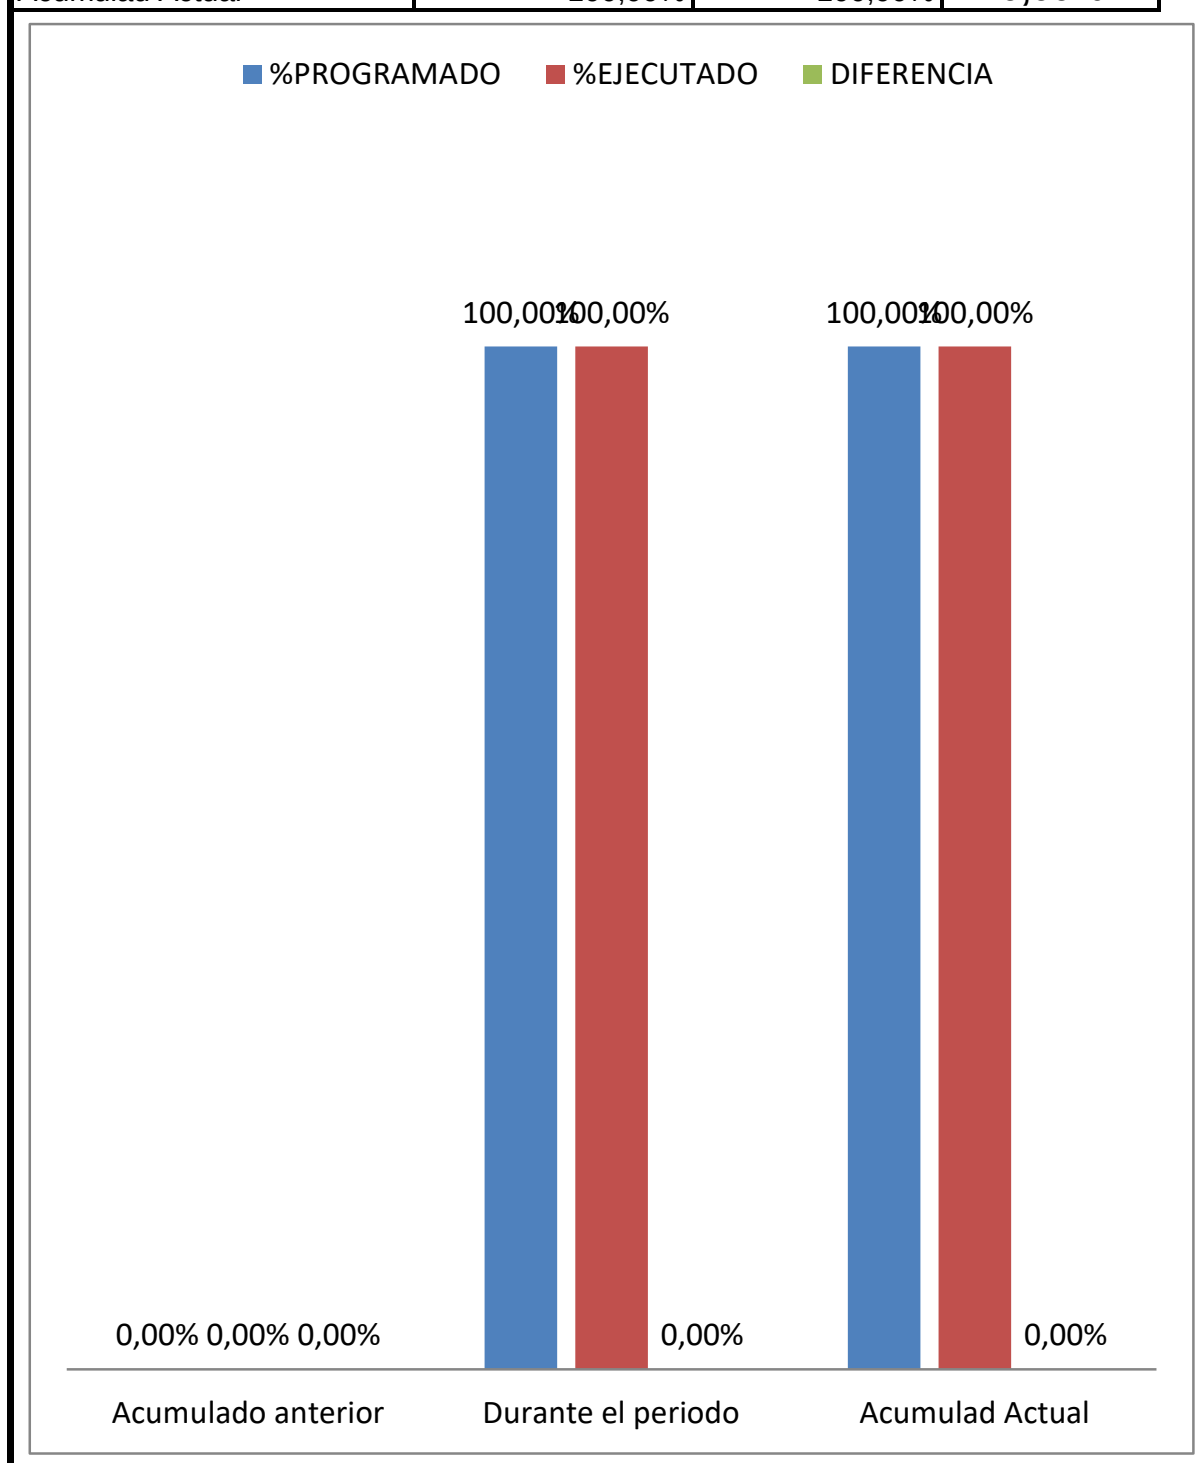

PROGRAMADO

	Mensual	Acumulado
Obra Programada (%)	100,00%	100,00%
Valor de la Obra	$ 18.700.850	$ 18.700.850

EJECUTADO

	Mensual	Acumulado
Obra fisica ejecutada (%)	100,00%	100,00%
Valor de la Obra	$ 18.700.850	$ 18.700.850

DATOS FINANCIEROS

V.r CONTRATO:	$ 18.700.850
Vr. TOTAL PAGADO EN ACTAS:	$ 18.700.850
SALDO POR PAGAR CONTRATO:	$ 0
Vr. ANTICIPO:	
TOTAL AMORTIZADO ANTICIPO:	$ 0
SALDO POR AMORTIZAR ANTICIPO:	$ 0

ACTA No.	TOTAL BRUTO	AMORTIZ. ANTICIPO	TOTAL NETO	% EJECUCIÓN	FECHA DEL ACTA
1	$ 18.700.850		$ 18.700.850	100,00%	23-04-20
TOTALES	**$ 18.700.850**	**$ -**	**$ 18.700.850**	**100,00%**	

SEGUIMIENTO CONTABLE DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO

MES DE PAGO	VALOR	CONCEPTO	MES DE PAGO	VALOR	CONCEPTO	MES DE PAGO	VALOR	CONCEPTO
abr-20	$ 18.700.850	Acta 1						

Alcaldia Municipal de Envigado	FORMATO	Codigo: PT-F-028
	INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN	Versión: 001
		Pagina: 2 de 3

SEGUIMIENTO DOCUMENTACIÓN Y REQUERIMIENTOS TECNICOS Y DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL

Responder si se cuenta con la documentación al día:							
				Se realizan reuniones de seguimiento al Contrato y se encuentran debidamente documentadas?			SI
Estudios y diseños:	SI			Se da cumplimiento a los requerimientos establecidos por la autoridad ambiental?			N.A.
Planos de obra:	SI			La autoridad ambiental competente emitió los permisos necesarios para el inicio de las obras?			N.A.
Especificaciones técnicas	SI			Se da cumplimiento a las Normas de salud Ocupacional y Seguridad Industrial?			SI
Permisos y Licencias:	SI			Se da cumplimiento a las Normas de Trabajo en altura?			SI
Bitacora:	SI			El personal se encuentra afiliado al Sistema de Seguridad Social?			SI
Empleos Directos:	4	Hombres:	4	Mujeres:	0	Tiempo transcurrido desde la iniciacion del contrato:	52

SEGUIMIENTO Y OBSERVACIONES AL DESARROLLO EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO

PENDIENTES POR PARTE DEL CONTRATISTA:

Ninguno

PENDIENTES POR PARTE DEL INTERVENTOR:

Ninguno

PENDIENTES POR PARTE DEL MUNICIPIO Y/O OTRAS ENTIDADES

ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL MES

Se realiza el estudio geotecnico y diseño estructural, cumpliendo con el objeto del contrato

ACTIVIDADES A REALIZAR EN EL SIGUIENTE MES

Ninguna

OBSERVACIONES GENERALES:

Avance, retrasos, decisiones, compromisos, logros, dificultades, aspectos administrativos, juridicos, técnicos o financieros

Se realiza el estudio geotecnico y diseño estructural, cumpliendo con el objeto del contrato

RESUMEN GENERAL DEL ESTADO DEL CONTRATO

Se realiza el estudio geotecnico y diseño estructural, cumpliendo con el objeto del contrato

DATOS DEL SUPERVISOR		FIRMA:
TIPO DE SUPERVISOR:	INTERNO	
NOMBRES Y APELLIDOS:	GUSTAVO ADOLFO RENDON RODAS	
CARGO:	PROFESIONAL UNIVERSITARIO	
DEPENDENCIA / EMPRESA:	OBRAS PUBLICAS	
