
INFORME No. 18

PERIODO: 06 DE AGOSTO DE 2024 HASTA EL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2024

CONTRATO N° 0757-23 “INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y LEGAL AL CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DEL COMEDOR Y COCINA DEL INSTITUTO TÉCNICO SUPERIOR INDUSTRIAL EN EL DISTRITO DE BARRANCABEREMEJA".

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	LEONARDO MANTILLA NOGUERA	

UT. INTERCOMEDOR ITSI
901.683.399-1

BARRANCABERMEJA, SANTANDER
SEPTIEMBRE 2024

INFORME No. 18 DE INTERVENTORÍA

CONTRATO N° 0757-23 “INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y LEGAL AL CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DEL COMEDOR Y COCINA DEL INSTITUTO TÉCNICO SUPERIOR INDUSTRIAL EN EL DISTRITO DE BARRANCABEREMEJA".



SEPTEIMBRE 2024

TABLA DE CONTENIDO

INTRODUCCIÓN **5**
OBJETIVOS **6**
1. CAPITULO I. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL CONTRATO **7**
1.1. LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO 7
1.2. ACTIVIDADES GENERALES DEL PROYECTO 8
1.3. CONDICIONES TÉCNICAS DEL PROYECTO 10
1.4. PLAZO DE EJECUCIÓN 10
1.5. INFORMACIÓN SOPORTE DEL PROYECTO 10
2. CAPÍTULO II. ACTIVIDADES DE LA INTERVENTORÍA **11**
2.1. ASPECTOS PRESUPUESTALES Y LEGALES DEL CONTRATO 11
2.2. ACTAS SUSCRITAS 13
2.3. ACTIVIDADES TÉCNICAS Y SEGUIMIENTO SEMANAL 14
2.4. ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS 16
2.5. ACTIVIDADES FINANCIERAS 17
2.6. CONTROL DE ACTIVIDADES DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 17
2.7. CUMPLIMIENTO DE ASPECTOS AMBIENTALES Y SOCIALES 18
2.8. ACTIVIDADES DE CONTROL DE LA CALIDAD 18
2.9. CONTROL DE GARANTÍAS 19
2.10. COMITÉ DE OBRA 19
2.11. CORRESPONDENCIA ENVIADA POR INTERVENTORIA 19
3. CAPITULO III. ACTIVIDADES DEL CONTRATISTA **20**
3.1. ASPECTO LEGAL Y PRESUPUESTAL DEL CONTRATO 20
3.2. ACTAS SUSCRITAS 23
3.3. ACTIVIDADES TÉCNICAS 24
3.4. ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS 25
3.5. ACTIVIDADES FINANCIERAS 26
3.6. ACTIVIDADES DE SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJO (SST) 27
3.7. ACTIVIDADES SOCIO AMBIENTALES 27
3.8. ACTIVIDADES DE CONTROL DE LA CALIDAD 28
3.9. CONTROL DE GARANTIAS 28

4. CAPITULO IV. CONCLUSIONES 29

5. CAPITULO V. ANEXOS 30

5.1. REGISTRO FOTOGRÁFICO 30

5.2. INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA 31

5.3. BITÁCORA DE OBRA 32

5.4. PAGO DE PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES DE INTERVENTORÍA 33

5.5. CORRESPONDENCIA ENVIADA POR INTERVENTORÍA Y CONTRATISTA 34

5.6. CERTIFICADO MANTENIMIENTO DE BATERIAS SANITARIAS 35

5.7. INFORME TÉCNICO DE OBRA 36

5.8. PAGO DE PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES DEL CONTRATISTA 37

5.9. INFORME HSE DE OBRA 38

5.10. INFORME SOCIO AMBIENTAL DE OBRA 39

INTRODUCCIÓN

La Institución educativa Instituto Técnico Superior Industrial - ITSI en el Distrito de Barrancabermeja, busca facilitar el desarrollo integral y el mejoramiento del impacto en el sistema educativo para los estudiantes de la sede principal de la institución, mediante la demolición de la actual cafetería y la construcción del área que cumpla las veces de cafetería y comedor escolar, cumpliendo con las condiciones básicas propuestas en la normativa sanitaria vigente: resolución 2674 de 2013, NTC 4595 y 4596, en las cuales se establece los requisitos y parámetros del diseño físico-espacial de nuevas instalaciones escolares, orientado a mejorar la calidad del servicio educativo, analizando los diagnósticos de infraestructura frente a la existencia, calidad y acceso a los servicios públicos y condiciones de dotación de equipos y menaje en el comedor. Todo esto con el fin de dar inclusión a la promoción y ampliación de cobertura de programas de alimentación que promueven el desarrollo cognitivo de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes en el sistema educativo oficial, para mantener sus niveles de atención, aumentar el porcentaje de permanencia escolar, promover el mejoramiento de hábitos saludables e impactar de forma positiva los procesos de aprendizaje.

Por lo anterior, se hace necesario iniciar proceso de selección de contratistas, para llevar a cabo CONSTRUCCIÓN Y DOTACION DE COMEDOR Y COCINA DEL INSTITUTO TÉCNICO SUPERIOR INDUSTRIAL EN EL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA.

OBJETIVOS

GENERAL

- ✓ Presentar el estado técnico, administrativo, financiero y legal del contrato de obra ejecutado por el contratista WRUSSY INGENIEROS SAS durante el periodo comprendido entre el **06 DE AGOSTO DE 2024 HASTA EL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2024**

ESPECÍFICOS

- ✓ Informar a la entidad contratante el avance físico y financiero de las actividades contractuales ejecutadas.


- ✓ Dar conocimiento de las diferentes actividades que desarrolló el contratista durante el presente periodo de ejecución del proyecto.

- ✓ Presentar informe de las obras ejecutadas durante el periodo.

1. CAPITULO I. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL CONTRATO

1.1. LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO

MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA – SANTANDER

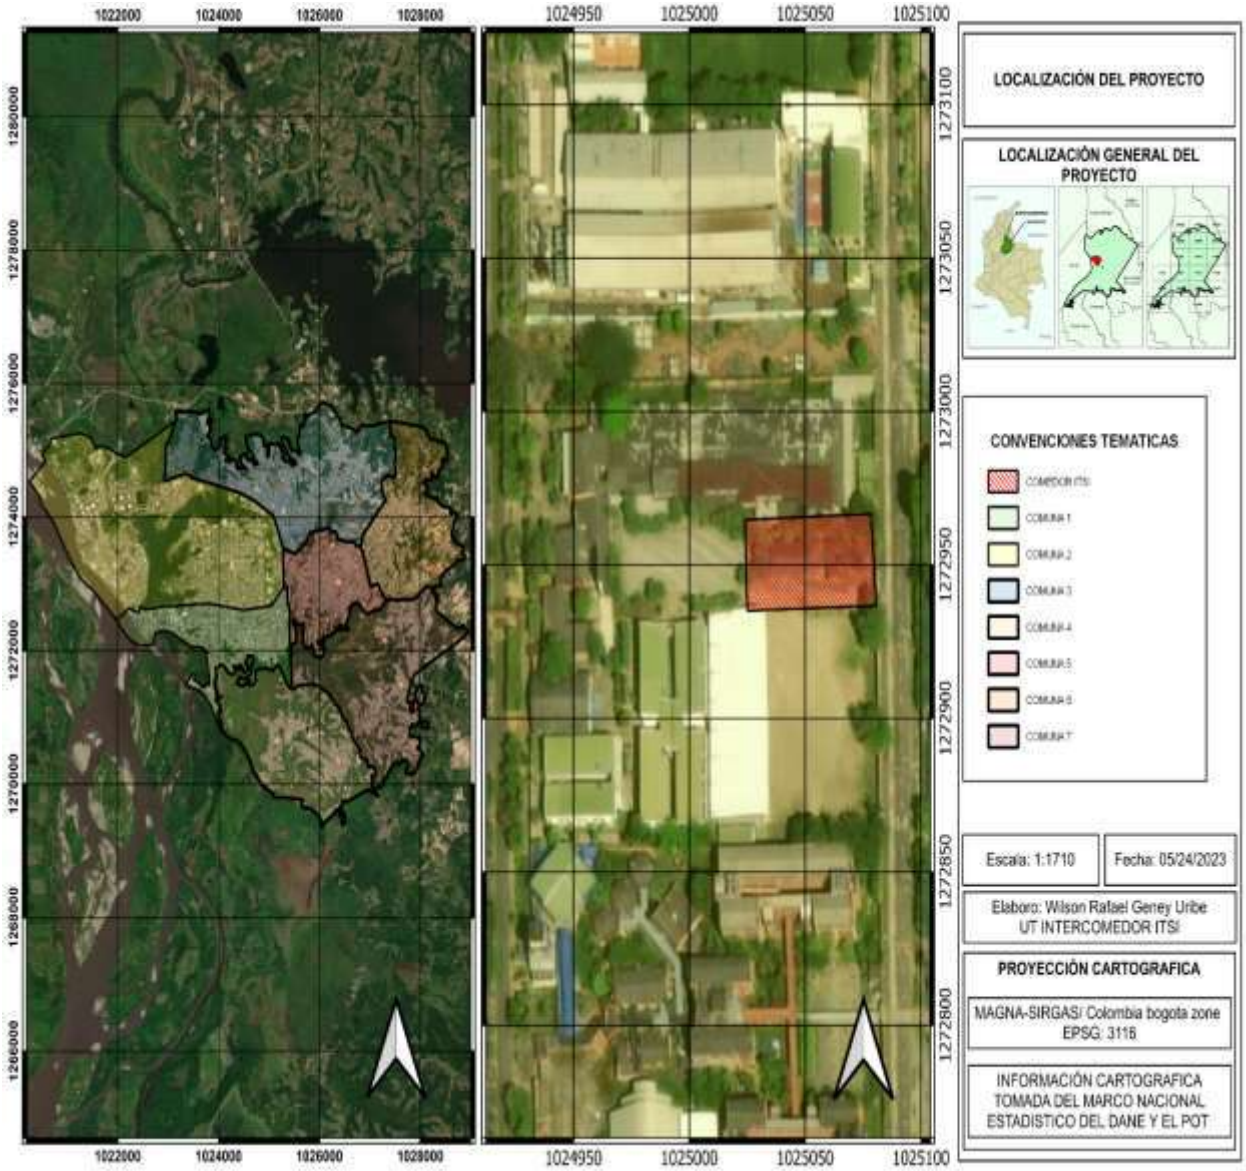


El proyecto de construcción del comedor escolar se encuentra ubicado en la carrera 28 No. 53-08 en el casco urbano del Distrito de Barrancabermeja, Santander, Dentro de las instalaciones del Instituto Técnico Superior Industrial – ITSI

Figura 1. Localización del proyecto.



Fuente: Interventoría.

Figura 2. Planta general comedor.

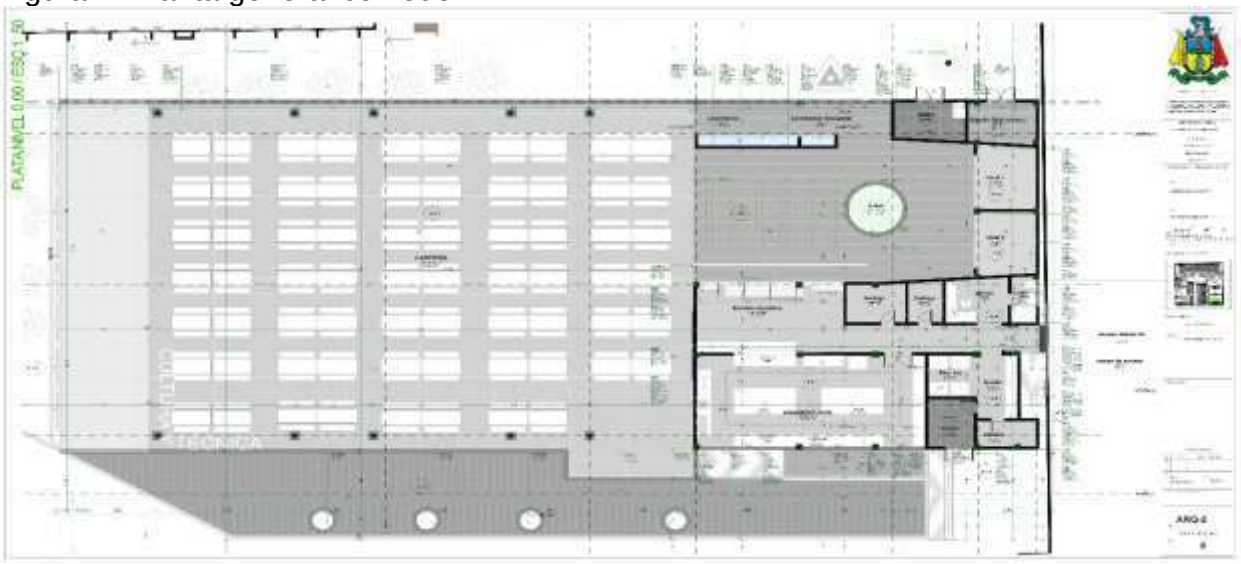

Fuente: secretaria distrital de infraestructura.

1.2. ACTIVIDADES GENERALES DEL PROYECTO

En este proyecto se indican de forma general las tareas encaminadas para la construcción del restaurante escolar del Instituto Técnico Superior Industrial, el cual será el comedor más grande de la ciudad, beneficiando cerca de 5000 estudiantes, que pasaran de tener comida industrializada a comida caliente preparada en sitio.
En general, las actividades a realizar serán:

- **ACTIVIDADES PRELIMINARES**, comprenden todas las actividades de localización, cerramiento, desmonte de estructuras, demoliciones y demás actividades necesarias para poder adecuar completamente el área disponible para el proyecto.

- **MOVIMIENTOS DE TIERRA**, comprenden las actividades de excavaciones, rellenos de acuerdo a la ubicación definida en planos y bajo estricto control topográfico y el cargue y retiro del material sobrante y de escombros generados durante el proyecto.

- **ESTRUCTURAS DE HORMIGON Y ACERO ESTRUCTURAL**, corresponde a las actividades de elaboración y vaciados de concretos de sus diferentes resistencias de acuerdo a las especificaciones del elemento, y al suministro de acero estructural para cubiertas, y el suministro y figurado de acero de refuerzo.

- **MAMPOSTERÍA Y FRISOS**, corresponde a la construcción de muros de mampostería y pañete de los mismos.

- **ARQUITECTURA Y ACABADOS**, comprenden actividades de instalación de puertas y ventanas, pasamanos, mesón en granito, acabados de pisos y muros para acabado final. También incluye la cubierta, así como el cielo raso, bajantes y canal metálico, los elementos sanitarios y de cocina y los acabados exteriores finales de la obra.

- **INSTALACIONES HIDRÁULICAS**, comprende actividades de instalación de tuberías de agua fría, cajas de registro, entre otros, para el abastecimiento de agua potable y la construcción del cuarto de bombas para el suministro de agua.

- **INSTALACIONES SANITARIAS**, comprende actividades de instalación de tuberías de desagües, ventilaciones, cajas de registro, entre otros para la eliminación de residuos a través de desagües.

- **ACTIVIDADES DE ALCANTARILLADO**, comprende actividades de instalación de tuberías para la entrega final de aguas lluvias y aguas negras, cajas de inspección y construcción de pozos.

- **INSTALACIONES DE GAS**, comprende actividades de instalación de tubería de gas y conexión para abastecimiento de la infraestructura.

- **INSTALACIONES ELÉCTRICAS**, comprenden todas las actividades de circuitos eléctricos y/o sistemas fotovoltaicos para dotar de energía eléctrica la infraestructura construida.

- **EQUIPOS DE COCINA**, hace referencia a las actividades de suministro e instalación de los equipos y elementos de primera necesidad para la cocina.

1.3. CONDICIONES TÉCNICAS DEL PROYECTO

Las condiciones técnicas del proyecto se encuentran establecidas en los estudios previos y los diseños propuestos (estudios de conveniencia y oportunidad, planos, especificaciones técnicas), por lo tanto, son inmodificables. El presente contrato de obra pública se realizará de acuerdo al siguiente alcance: **"CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. 0756-23 - CONSTRUCCION Y DOTACION DEL COMEDOR Y COCINA DEL INSTITUTO TECNICO SUPERIOR INDUSTRIAL EN EL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA".**

1.4. PLAZO DE EJECUCIÓN

El plazo de ejecución inicial del proyecto tiene una duración de doce (12) meses contados a partir de la suscripción del acta de inicio.

Durante la ejecución total del proyecto se suscribieron cuatro (04) adicionales en tiempo, como se muestra en el siguiente cuadro. Para un plazo de ejecución total de 18 meses.

ACTAS	TIEMPO	FECHA
Acta adicional N° 1 en tiempo	30 DIAS	28 de febrero de 2024
Acta adicional N° 2 en tiempo	30 DIAS	04 de abril de 2024
Acta adicional N° 3 en tiempo	90 DIAS	10 de mayo de 2024
Acta adicional N° 4 en tiempo	30 DIAS	31 de mayo de 2024

1.5. INFORMACIÓN SOPORTE DEL PROYECTO

El proyecto cuenta con el siguiente soporte técnico:

- Estudios Previos.
- Especificaciones Técnicas de construcción.
- Presupuesto Detallado.
- Análisis de Precios Unitarios.
- Planos y diseños.
- Pliegos de Condiciones.
- Propuesta económica de proponente.
- Acta de adjudicación del contrato.
- Minuta de contrato de Obra Pública.
- Aprobación de Póliza de Garantías.

2. CAPÍTULO II. ACTIVIDADES DE LA INTERVENTORÍA

2.1. ASPECTOS PRESUPUESTALES Y LEGALES DEL CONTRATO

2.1.1 Información General del Contrato

CONTRATO DE INTERVENTORÍA	:	N° 0757-23
CONTRATANTE	:	DISTRITO DE BARRANCABERMEJA
NIT	:	890.201.900-6
INTERVENTOR		
CONTRATISTA	:	UT INTERCOMEDOR ITSI
NIT	:	901.683.399-1
REPRESENTANTE LEGAL	:	LAURY XIMENA VILLARRUEL NAVARRO
CEDULA	:	28.060.888 DE BARRANCABERMEJA
DIRECCIÓN	:	CARRERA 22 N°52B - 60 EDIFICIO GLAYA APTO 101 BARRIO TORCOROMA
TELÉFONO	:	314 412 1030
CORREO	:	fmcconstructoresltda@gmail.com
DISTRITO DE BARRANCABERMEJA	:	
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	:	ING. JOHANA PAOLA SANTOS REY
SUPERVISOR	:	ARQ. ALEJANDRO ALFONSO ENRIQUEZ MORA
OBJETO:	:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y LEGAL AL CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE COMEDOR Y COCINA DEL INSTITUTO TÉCNICO SUPERIOR INDUSTRIAL EN EL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA.
VALOR INICIAL	:	DOSCIENTOS SETENTA Y DOS MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS M/CTE ($272.766.458) IVA INCLUIDO
ANTICIPO	:	NO APLICA
FECHA DE CELEBRACIÓN DEL CONTRATO	:	22 DE FEBRERO DE 2023
RÉGIMEN TRIBUTARIO	:	COMÚN
DURACIÓN	:	DOCE (12) MESES A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DE LA RESPECTIVA ACTA DE INICIO
RUBRO PRESUPUESTAL	:	El pago de la suma estipulada en este contrato se sujetará a la apropiación presupuestal correspondiente y específicamente al Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 23-00751 del 03 de febrero de 2023 con cargo al rubro 2.3-2201-0700-051-220057-2.3.2.02.02.008, por concepto de SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN, fuente de financiación CRÉDITO INTERNO por valor de DOSCIENTOS VEINTISIETE MILLONES TRESCIENTOS CINCO MIL CUATROCIENTOS PESOS MCTE

		($227.305.400,00); Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 23-01133 del 15 de febrero de 2023 con cargo al rubro 2.3-22-2201-0700-051-220057-02-2.3.2.02.02.008 por concepto de SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN, fuente de financiación CRÉDITO INTERNO por valor de CUARENTA Y CINCO MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y UN MIL OCHENTA PESOS MCTE ($45.461.080,00), Y ACUERDO FUTURAS ORDINARIAS No. 045 de 2022.
CDP	:	23-00751 DEL 03 DE FEBRERO DE 2023 23-01133 DEL 15 DE FEBRERO DE 2023
REGISTRO PRESUPUESTAL	:	No. 23-01337 DEL 27 DE FEBRERO DE 2023
BANCO DE PROYECTOS	:	BPPID 20220680810066. BPIN 2022680810057 CERTIFICADO POR LA SECRETARIA DE PLANEACIÓN DEL 25 DE ENERO DE 2023
CEPAA	:	787 DEL 03 DE FEBRERO DE 2023 1134 DEL 14 DE FEBRERO DE 2023
ACTA DE INICIO	:	06 DE MARZO DE 2023
APROBACIÓN DE GARANTÍAS POR ACTA DE INICIO	:	CO1.WRT.11240743 DEL 10 DE MARZO DE 2023
ADICIONAL EN PLAZO N°1	:	FEBRERO 28 DE 2024
PLAZO ADICIONAL N°1	:	30 DÍAS CALENDARIO
PLAZO TOTAL DEL CONTRATO SEGÚN ADICIONAL N°1	:	13 MESES
APROBACIÓN DE GARANTÍAS POR EL PLAZO ADICIONAL N°1	:	CO1.WRT.13871062 DEL 11 DE MARZO DE 2024
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN SEGÚN ADICIONAL N°1 EN PLAZO	:	ABRIL 05 DE 2024
ACTA DE RECIBO PARCIAL N°4	:	21 DE FEBRERO DE 2024
ADICIONAL EN PLAZO N°2	:	ABRIL 04 DE 2024
PLAZO SOLICITADO ADICIONAL N°2	:	TREINTA (30) DÍAS CALENDARIO
APROBACIÓN DE GARANTÍAS POR ADICIONAL EN PLAZO N°2	:	CO1.WRT.14100443 DEL 18 DE ABRIL DE 2024
PLAZO TOTAL DEL CONTRATO	:	CATORCE (14) MESES
FECHA DE FINALIZACIÓN SEGÚN ADICIONAL EN PLAZO N°2	:	MAYO 05 DE 2024
ACTA DE SUSPENSIÓN N°1	:	MAYO 03 DE 2024
FECHA DE FINALIZACIÓN SEGÚN SUSPENSIÓN N°1	:	MAYO 30 DE 2024
ACTA DE REINICIO N°1	:	MAYO 08 DE 2024
APROBACIÓN DE GARANTÍAS POR REINICIO N°1	:	CO1.WRT.14483767 DEL 09 DE JULIO DE 2024
FECHA DE FINALIZACION SEGÚN REINICIO N°1	:	MAYO 10 DE 2024

ADICIONAL EN PLAZO N°3	:	MAYO 10 DE 2024
PLAZO SOLICITADO ADICIONAL N°3	:	TRES (03) MESES
APROBACIÓN DE GARANTÍAS POR ADICIONAL EN PLAZO N°3	:	CO1.WRT.14485941 DEL 09 DE JULIO DE 2024
FECHA DE FINALIZACIÓN SEGÚN ADICIONAL EN PLAZO N°3	:	AGOSTO 10 DE 2024
ADICIONAL EN PLAZO N°4 Y VALOR N°1	:	MAYO 31 DE 2024
ADICIONAL EN PLAZO N°4	:	TREINTA (30) DIAS
ADICIONAL EN VALO N°1	:	$102.851.142,00
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	:	$375.617.600,00
BANCO DE PROYECTOS ADICIONAL 04 EN PLAZO Y VALOR Nº1	:	BPIN 2022680810057 DEL 02 DE MAYO DE 2024
CEPPA ADICIONAL EN VALOR Nº1	:	Nº 2198 DEL 03 DE MAYO DE 2024
CDP Nº	:	24-03842 DE 30 DE MAYO DE 2024 POR VALOR $102,851,142,00
RUBRO PRESUPEUSTAL	:	2.3-2201-0700-051-220057-2.3.2.01.01.001.02.8 CONCEPTO: SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÒN / FUENTE DE FINANCIACIÓN: RECURSOS PROPIOS: POR VALOR DE $102.851.142,00
RP ADICIONAL EN VALOR N°1	:	24-04670 DEL 04 DE JUNIO DE 2024
APROBACIÓN DE GARANTIAS POR ADICIONAL EN PLAZO N°4 Y EN VALOR N°1	:	CO1.WRT.14486111 DEL 09 DE JULIO DE 2024
FECHA DE FINALIZACIÓN SEGÚN ADICIONAL EN PLAZO N°4	:	SEPTIEMBRE 10 DE 2024

2.2. ACTAS SUSCRITAS

A la fecha se han suscrito las siguientes actas entre la supervisión e interventoría.

ACTAS	FECHA
Contrato de interventoría 0757-23	22 de febrero de 2023
Acta de Inicio de interventoría	6 de marzo de 2023
Acta de recibo parcial N° 1	8 de septiembre de 2023
Acta aclaratoria N°1 al Acta de recibo parcial N° 1	13 de septiembre de 2023
Acta aclaratoria N°2 al Acta de recibo parcial N° 1	21 de septiembre de 2023
Acta de recibo parcial N° 2	25 de octubre de 2023
Acta aclaratoria N°1 al Acta de recibo parcial N° 2	27 de octubre de 2023
Acta de recibo parcial N° 3	19 de diciembre de 2023
Acta aclaratoria N°1 al acta de recibo parcial N°3	20 de diciembre de 2023
Acta aclaratoria N°2 al acta de recibo parcial N°3	21 de diciembre de 2023
Acta adicional N° 1 en plazo	28 de febrero de 2024

Acta parcial N°4	15 de marzo de 2024
Acta adicional N° 2 en plazo	04 de abril de 2024
Acta de suspensión N°1	03 de mayo de 2024
Acta de reinicio N°1	08 de mayo de 2024
Acta adicional N°3 en plazo	10 de mayo de 2024
Acta adicional en plazo N°4 y en valor N°1	31 de mayo de 2024
Acta de pactación de precios N°3	23 de julio de 2024
Acta parcial N°5	21 de agosto de 2024
Acta parcial N°6	06 de septiembre de 2024

2.3. ACTIVIDADES TÉCNICAS Y SEGUIMIENTO SEMANAL

En el presente periodo se observa el siguiente avance de obra y presupuestal del proyecto. Y se hace un comparativo con el porcentaje proyectado según PDT. Esta gráfica se toma como referencia del último informe semanal del periodo.


Figura 3. Avance presupuestal.

33. CONSOLIDADO AVANCE DE OBRA			
EJECUCIÓN	EJECUTADO	PROGRAMADO	ATRASO(-) ADELANTO (+)
Acumulado anterior	98,50%	97,90%	0,60%
Durante el periodo	1,50%	2,10%	-0,60%
Acumulado Actual	100,00%	100,00%	0,00%

33.1. CONSOLIDADO AVANCE PRESUPUESTAL		
	SEMANA	ACUMULADO
Obra Programada	2,10%	100,00%
Valor de la Obra Programada	$ 76.809.316,78	$ 3.657.586.513,51

	SEMANA	ACUMULADO
Obra Ejecutada	1,50%	100,00%
Valor de la Obra Ejecutada	$ 54.863.797,70	$ 3.657.586.513,51

Figura 4. Programado vs Ejecutado.

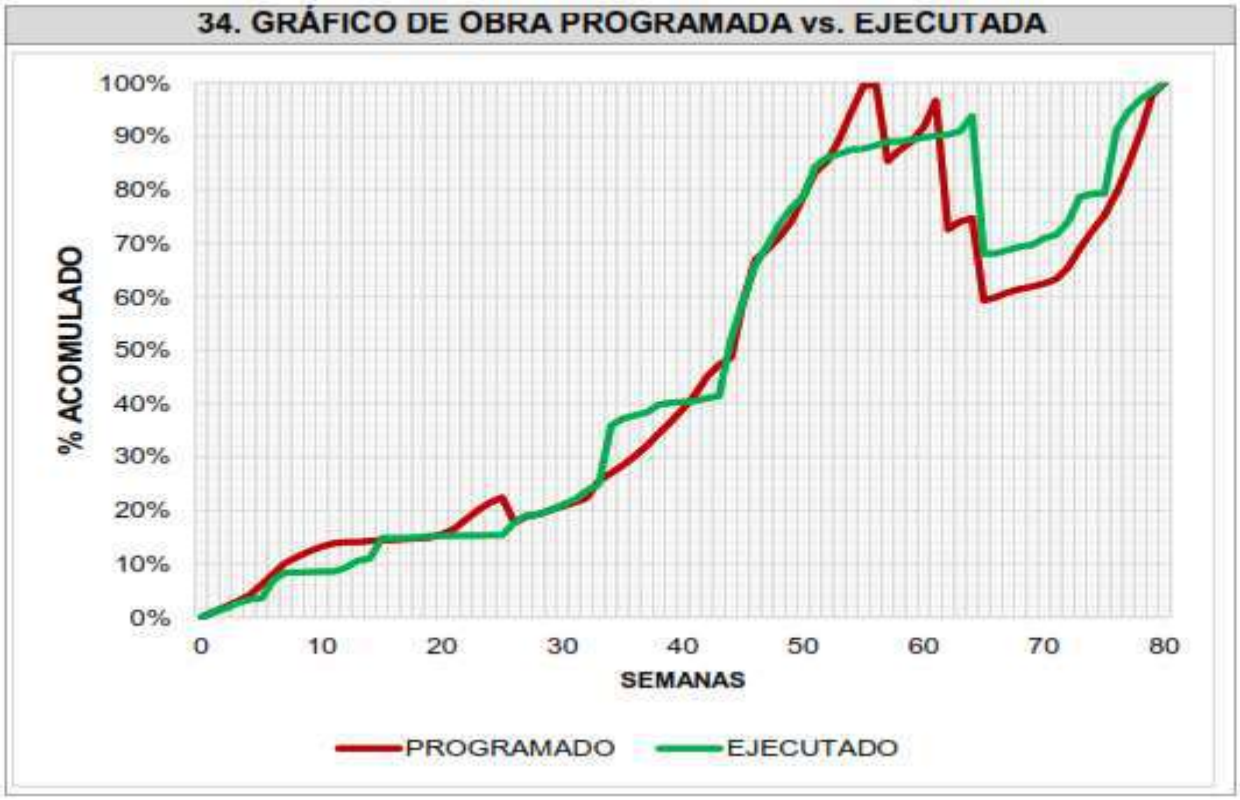

A continuación, se relacionan las actividades técnicas contractuales ejecutadas por el contratista durante en el periodo:

- PASAMANOS EN ACERO INOXIDABLE PARA ZONA DE SERVICIO AL PÚBLICO CON APOYO A PISO
- PE 01 3,0 X 3,94 PUERTA ESPECIAL CON MARCO METALICO, HOJAS CON LAMINA MICROPERFORADA EN COLLED ROLED O MALLA MICROPERFORADA SEGUN DISEÑO, INCLUIDO A ESTO SE REALIZO LA CONSTRUCCIÓN DE COLUMNAS Y VIGA DE CIMENTACIÓN.
- SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE JUEGO DE MESA EN POLIPROPILENO PARA EXTERIORES DE ALTO IMPACTO. (Incluye mesa con estructura metálica y tapas en tabla plástica de 385x80x75 cm (ancho, largo y alto) y dos bancas sin espaldar con estructura metálica y tapa en tabla plástica de 385x40x40 cm (ancho, largo y alto)).
- GROUTING PARA PEDESTALES (ESP: 8 CM MAX).
- IMPERMEABILIZACION TANQUE DE AGUA POTABLE.
- SUMINISTRO E INSTLACION DE VALVULA ANTIRRETORNO DE 2".

A su vez el contratista finalizo todas las subsanaciones informadas por interventoría.

2.4. ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS

- Por parte de interventoría se verifica constantemente que en obra se encuentre el personal mínimo para iniciar cualquier tipo de actividades.

- La interventoría cumple y exige al contratista el estricto cumplimiento al desarrollo del objeto contractual establecido en los pliegos de condiciones y las especificaciones técnicas.

- La interventoría realiza la presentación de informes mensuales donde se destaca el avance físico y presupuestal del proyecto, y posteriormente informa del cumplimiento o no de las obligaciones del contratista acorde con la realidad del proyecto.

- La interventoría verifica las afiliaciones al sistema de salud y parafiscales del personal que ingresó durante el periodo. Posteriormente se verifica que los pagos de las planillas se hagan oportunamente y se anexe su comprobante de pago en cada informe.

- La interventoría realiza y lleva el registro fotográfico diario de obra, donde se ilustra el avance de las actividades ejecutadas por el contratista.

2.4.1 Registro Diario de Obra

Durante el periodo de este informe se diligenció por parte de la interventoría, en equipo con el contratista, la bitácora de obra. En este libro se plasman todas las actividades realizadas día a día con sus respectivas cantidades, visitas técnicas, actividades no previstas, toma de decisiones y cualquier tema relevante para la obra. También se especifica si hay lluvias o climas desfavorables que ameriten suspender labores. **(Ver anexo 5.3)**

2.4.2 Personal de interventoría

A continuación, se relaciona el personal de la interventoría que laboró en este periodo Se anexa planilla de pago de seguridad social y aportes parafiscales. **(Ver anexo 5.4)**

PERSONAL	DEDICACIÓN
Director de Interventoría	20%
Residente de Interventoría	100%
Topógrafo	100%
Profesional SST	100%
Auxiliar de Interventoría	100%

2.4.3 Control de equipos de interventoría

A continuación, se presenta la relación de equipos usados por la interventoría durante el periodo de este informe.

EQUIPO	CANTIDAD
Equipo de cómputo portátil	5
Impresora multifuncional	1
Camioneta	1

2.4.4 Licencias

Durante el periodo de este informe, no se solicita al contratista ningún tipo de licencia para los trabajos a realizar, ya que en ninguna de las actividades realizadas se intervinieron especies de flora, ocupación de causes o se hizo uso del espacio púbico.

2.4.5 Correspondencia

A la fecha de este informe por parte de la interventoría no se enviaron comunicaciones. **(Ver anexo 5.5)**

2.5. ACTIVIDADES FINANCIERAS

Durante el periodo no se suscribieron actas parciales. A continuación, se presenta el resumen financiero del contrato.

ACTA	VALOR	PORCENTAJE
ACTA PARCIAL 1	$ 48.280.624,69	12,85%
ACTA PARCIAL 2	$ 46.832.034,00	12,47%
ACTA PARCIAL 3	$ 16.993.350,33	4,52%
ACTA PARCIAL 4	$112.106.006,34	32,95%
ACTA PARCIAL 5	$ 59.480.702,45	15,84%
ACTA PARCIAL 6	$ 42.228.551,23	11,24%
VALOR PARCIAL TOTAL	**$337.596.678,4**	**89,88%**
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	**$ 375.617.600,00**	**--**
SALDO POR EJECUTAR	**$ 38.020.921,66**	**10,12%**

Nota: A la fecha de elaboración del presente informe no se ha suscrito el acta de recibo final y de liquidación cuyo valor corresponde al saldo por ejecutar.

2.6. CONTROL DE ACTIVIDADES DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

- Por parte de interventoría se realiza el control estricto de los equipos usados en obra, verificando que su documentación este al día y que su funcionamiento y uso sea el

correcto.

- La interventoría verifica diariamente la realización de las charlas de SST antes de iniciar las actividades de obra.

- La interventoría lleva control y verificación de orden y aseo de todas las áreas de trabajo diariamente.

- Por parte de interventoría se verifica constantemente que el señalizador vial o paletero se encuentre en sitio cada vez que ingresan o salen vehículos de carga pesada de obra.

- La interventoría verifica que el contratista realiza recambio continuo de EPP´s que se encuentran en mal estado y no están actos para realizar trabajos. Esto con el fin de proteger la integridad de los trabajadores.

2.7. CUMPLIMIENTO DE ASPECTOS AMBIENTALES Y SOCIALES

2.7.1 Socializaciones y seguimiento al contrato

La interventoría en compañía con el contratista y el supervisor, realizan semanalmente el comité de obra. Donde se revisan temas de avances de obra, actividades realizadas y se despejan dudas surgidas en la semana de ejecución, al igual que surgen compromisos para mejorar el desarrollo de la obra.

2.7.2 Seguimiento al Plan de Manejo Ambiental

- La interventoría verifica el mantenimiento periódico de las baterías sanitarias suministradas por la empresa contratista y la disposición de los residuos surgidos en la obra. **Ver anexo 5.6.**

- La interventoría verifica el manejo y buen estado del punto ecológico para la disposición de basuras generadas por el proyecto.

2.8. ACTIVIDADES DE CONTROL DE LA CALIDAD

2.8.1 Cumplimiento de las Especificaciones Técnicas

La interventoría verificó que el contratista a la fecha ha cumplido con las especificaciones técnicas establecidas en el contrato. En lo concerniente al recurso humano se inspeccionó el buen estado de los elementos de protección personal al igual que la dotación suministrada por el contratista. En el periodo transcurrido toda actividad realizada por el contratista ha tenido el aval de la interventoría y se ha realizado de

manera segura y eficiente.

2.9. CONTROL DE GARANTÍAS

La interventoría cuenta actualmente con la póliza N° 400-47-994000090491 Anexo 6 de la ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA para amparar los riesgos de Cumplimiento del Contrato, Pago de Salarios y prestaciones Sociales Legales e Indemnizaciones Laborales.

POLIZA	ASEGURADORA	VIGENCIA		MONTO
		DESDE	HASTA	
CUMPLIMIENTO	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	06/03/2023	10/03/2025	$ 75.123.520,00
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	06/03/2023	10/09/2027	$ 37.561.760,00
CALIDAD DEL SERVICIO	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	06/03/2024	06/05/2025	$ 75.123.520,00

Estas garantías fueron aprobadas con el Certificado de aprobación de garantías No. CO1.WRT.11240743 del 10 de marzo de 2023.

2.10. COMITÉ DE OBRA

A la fecha de este informe por parte de la interventoría, contratista y supervisión no se realizaron comités de obra.

2.11. CORRESPONDENCIA ENVIADA POR INTERVENTORIA

FECHA	OFICIO N°	ASUNTO	ENVÍA	RECÍBE
15/08/2024	0038	APROBACIÓN DE FICHA TECNICA AIRE ACONDICIONADO Y FILTRO DE PURIFICACIÓN DE AGUA.	UT INTERCOMEDOR ITSI	WRUSSY INGENIEROS S.A.S

3. CAPITULO III. ACTIVIDADES DEL CONTRATISTA

3.1. ASPECTO LEGAL Y PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

3.1.1 Información General del Contrato

CONTRATO DE OBRA	:	N° 0756-23
CONTRATANTE	:	MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA
NIT.	:	890.201.900-6
CONTRATISTA DE OBRA		
CONTRATISTA	:	WRUSSY INGENIEROS S.A.S
NIT.	:	901109885-1
REP. LEGAL	:	WILVER FRANCINY RUSSY LADINO
CEDULA	:	80.212.380 DE BOGOTÁ
DIRECCIÓN	:	CALLE 8F # 79 – 94 BOGOTÁ
TELÉFONO	:	601 411 1513
CORREO ELECTRÓNICO	:	contacto@wrussyingenieros.com
INTERVENTOR		
CONTRATISTA	:	UT INTERCOMEDOR ITSI
NIT.	:	901.683.399-1
REP. LEGAL	:	LAURY XIMENA VILLARRUEL NAVARRO
C.C.	:	28.060.888 DE BARRANCABERMEJA
DISTRITO DE BARRANCABERMEJA		
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	:	ING. JOHANNA PAOLA SANTOS REY
SUPERVISOR	:	ARQ. ALEJANDRO ENRÍQUEZ MORA
OBJETO	:	CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE COMEDOR Y COCINA DEL INSTITUTO TÉCNICO SUPERIOR INDUSTRIAL EN EL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA SANTANDER
VALOR	:	El valor del contrato es TRES MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MILLONES SESENTA Y DOS MIL QUINIENTOS SESENTA PESOS CON OCHENTA Y OCHO CENTAVOS MCTE ($3.684.062.560,88)
ANTICIPO	:	NO APLICA
FECHA DE CELEBRACIÓN DEL CONTRATO	:	FEBRERO 23 DE 2023
RÉGIMEN TRIBUTARIO	:	COMÚN

DURACIÓN	:	El plazo de duración del presente contrato será de DOCE (12) MESES
RUBRO PRESUPUESTAL	:	El pago de la suma estipulada en este contrato se sujetará a la apropiación presupuestal correspondiente y específicamente al Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 23-00750 del 03 de Febrero de 2023 con cargo al rubro 2.3-2201-0700-051-220057-2.3.2.02.02.005, por concepto de CONSTRUCCIÓN Y SERVICIOS DE LA CONSTRUCCIÓN, fuente de financiación CRÉDITO INTERNO por valor de TRES MIL TRESCIENTOS SEIS MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS M/CTE ($3.306.985.499); Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 23-01132 del 15 de febrero de 2023 con cargo al rubro 2.3-22-2201-0700-051-220057-01-2.3.2.02.02.005 por concepto de CONSTRUCCIÓN Y SERVICIOS DE LA CONSTRUCCIÓN, fuente de financiación CRÉDITO INTERNO, por valor de QUINIENTOS OCHENTA Y NUEVE MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL CIENTO SESENTA Y OCHO PESOS M/CTE ($589.678.168), Y ACUERDO FUTURAS ORDINARIAS No. 045 de 2022.
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	:	23-01132 DE FEBRERO 15 DE 2023 23-00750 DE FEBRERO 03 DE 2023
REGISTRO PRESUPUESTAL	:	23-01338 DE FEBRERO 27 DE 2023 ($3,684,062,560.88)
APROBACIÓN DE GARANTÍAS	:	CO1.WRT.11189414 DEL 02 DE MARZO DE 2023
BANCO DE PROYECTOS	:	2022680810057 DEL 25 DE ENERO DE 2023
CEPAA	:	1133 DEL 14 DE FEBRERO DE 2023
ACTA DE INICIO	:	MARZO 06 DE 2023
APROBACIÓN DE GARANTÍAS POR ACTA INICIO	:	CO1.WRT.11377735 DEL 23 DE AGOSTO DE 2023
ADICIONAL EN PLAZO N°1	:	FEBRERO 28 DE 2024
PLAZO ADICIONAL N°1	:	30 DÍAS CALENDARIO

PLAZO TOTAL DEL CONTRATO SEGÚN ADICIONAL N°1	:	13 MESES
APROBACIÓN DE GARANTÍAS POR EL PLAZO ADICIONAL N°1	:	CO1.WRT.13933874 DEL 15 DE MARZO DE 2024
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN SEGÚN ADICIONAL N°1 EN PLAZO	:	ABRIL 05 DE 2024
ADICIONAL EN PLAZO N°2	:	ABRIL 04 DE 2024
PLAZO SOLICITADO ADICIONAL N°2	:	TREINTA (30) DÍAS CALENDARIO
APROBACIÓN DE GARANTÍAS POR ADICIONAL EN PLAZO N°2	:	CO1.WRT.14100443DEL 18 DE ABRIL DE 2024
PLAZO TOTAL DEL CONTRATO	:	CATORCE (14) MESES
FECHA DE FINALIZACIÓN SEGÚN ADICIONAL EN PLAZO N°2	:	MAYO 05 DE 2024
ACTA DE SUSPENSIÓN N°1	:	MAYO 03 DE 2024
FECHA DE FINALIZACIÓN SEGÚN SUSPENSIÓN N°1	:	MAYO 30 DE 2024
ACTA DE REINICIO N°1	:	MAYO 08 DE 2024
FECHA DE FINALIZACION SEGÚN REINICIO N°1	:	MAYO 10 DE 2024
APROBACIÓN DE GARANTIAS SEGÚN ACTA DE REINICIO N°1	:	CO1.WRT.14333664 DEL 31 DE JULIO DE 2024
ADICIONAL EN PLAZO N°3	:	MAYO10 DE 2024
APROBACIÓN DE GARANTIAS SEGÚN ADICIONAL EN PLAZO N°3	:	CO1.WRT.14336393 DEL 31 DE JULIO DE 2024
PLAZO SOLICITADO ADICIONAL N°3	:	TRES (03) MESES
PLAZO TOTAL DEL CONTRATO	:	DIESICIETE (17) MESES
FECHA DE FINALIZACIÓN SEGÚN ADICIONAL EN PLAZO N°3	:	AGOSTO 10 DE 2024
ADICIONAL EN PLAZO N°4 Y EN VALOR N°1	:	MAYO 31 DE 2024

PLAZO SOLICITADO ADICIONAL N°4	:	TREINTA (30) DIAS
APROBACIÓN DE GARANTIAS SEGÚN ADICIONAL EN PLAZO N°4 Y VALOR N°1	:	CO1.WRT.14483751 DEL 31 DE JULIO DE 2024
PLAZO TOTAL DEL CONTRATO	:	DIESIOCHO (18) MESES
FECHA DE FINALIZACIÓN SEGÚN ADICIONAL EN PLAZO N°4 Y EN VALOR N°1	:	SEPTIEMBRE 10 DE 2024
BANCO DE PROYECTOS ADICIONAL 04 EN PLAZO Y VALOR 01	:	20220680810066 DEL 02 DE MAYO DE 2024
CEPPA ADICIONAL EN VALOR Nº1	:	Nº 2197 DEL 03 DE MAYO DE 2024
RUBRO PRESUPUESTAL	:	2.3-2201-0700-051-220057-2.3.2.01.01.001.02.07 CONCEPTO: EDIFICIOS EDUCATIVOS – ICDE- ACUERDO 038/2022- INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA / FUENTE DE FINANCIACION: RECURSOS PROPIOS DESTINACION ESPECIFICA POR ACUERDO POR VALOR DE $1.389.880.309,00
REGISTRO PRESUPUESTAL	:	N° 24-04671 DEL 04 DE JUNIO DE 2024

3.2. ACTAS SUSCRITAS

A la fecha se han suscrito las siguientes actas por parte del contratista.

TIPO DE CONTRATO	FECHA
Contrato 0756-23	23 de febrero de 2023
Acta de inicio	06 de febrero de 2023
Acta de pactación de precios no previstos N°1	28 de agosto de 2023
Acta de modificación de ajuste en mayor y menor cantidad de obra y actividades no previstas N°1	29 de agosto de 2023
Acta parcial N°1	11 de septiembre de 2023
Acta aclaratoria N°1 al acta de recibo parcial N°1	13 de septiembre del 2023
Acta aclaratoria N°2 al acta de recibo parcial N°1	21 de septiembre del 2023
Acta parcial N°2	24 de octubre del 2023
Acta aclaratoria N°1 al acta de recibo parcial N°.2	27 de octubre del 2023
Acta parcial N°3	19 de diciembre del 2023

TIPO DE CONTRATO	FECHA
Acta aclaratoria N°1 al acta de recibo parcial N°.3	20 de diciembre del 2023
Acta de pactación de precios no previstos N°.02	26 de diciembre del 2022
Acta de modificación de ajuste en mayor y menor cantidad de obra y actividades N° previstas #2	27 de diciembre del 2023
Acta de modificación de ajuste en mayor y menor cantidad de obra y actividades N° previstas #3	15 de febrero de 2024
Adicional N°01 en plazo en plazo al contrato de obra pública N° 0756-23	28 de febrero de 2024
Acta parcial N°4	15 de marzo de 2024
Acta adicional N° 2 en plazo al contrato de obra pública no. 0756-23	04 de abril de 2024
Acta de suspensión N°1 al contrato 0756-23	03 de mayo de 2024
Acta de reinicio N°1 al contrato 0756-23	08 de mayo de 2024
Acta adicional N°3 en plazo al contrato 0756-23	10 de mayo de 2024
Acta adiciona N°4 en plazo y N°1 en valor al contrato 0756-23	31 de mayo de 2024
Acta de pactación de precios N°3	23 de julio de 2024
Acta de mayores y menores cantidades de obra y actividades no previstas N°4	24 de julio de 2024
Acta parcial N°5	21 de agosto de 2024
Acta de mayores y menores cantidades de obra y actividades no previstas N°5	03 de septiembre de 2024
Acta parcial N°6	06 de septiembre de 2024

3.3. ACTIVIDADES TÉCNICAS

A continuación, se relaciona un resumen de las actividades ejecutadas en el periodo, y se anexa el informe técnico mensual del contratista para ver a detalle las actividades ejecutadas. **(Ver anexo 5.7)**

- Se realiza pintura e instalación de rejillas metálicas del cárcamo de la placa estampada.
- Se realiza instalación de tubería de ventilación del tanque de agua potable.
- Llegada de DECK, mesas metálicas e instalación de las mismas en el área del comedor.
- Se realiza instalación de enchape del cuarto de aseo.
- Se realiza lavado y brillado final del piso de granito blanco huila.
- Se realiza fundida de canal de agua lluvia contigua al comedor.
- Se realiza pintura de portones enrollables, tapa metálica del tanque de agua.
- Se realiza fundida de GROUTING para pedestales.
- Llegada de gasodomésticos para la cocina.

- Instalación de campana de cocina y hongo extractor.
- Se realiza pintura de alto tráfico para el cuarto de bombas.
- Se realiza instalación de estufas, mesones de trabajo, congeladores, estanterías y demás dotación del área de la cocina.
- Se realiza fundida de viga para instalación del portón del acceso principal.
- Se realiza corrección cubierta de policarbonato, canales de agua lluvia, pintura e instalación de lámina de policarbonato.
- Se realiza demolición y construcción de columnas del acceso principal.
- Terminación de pintura de portones enrollables.
- Terminación e instalación de portón acceso principal.

3.4. ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS

Durante el periodo de ejecución del presente informe el contratista realizo las siguientes actividades administrativas:

- Pagos al sistema de seguridad social.
- Pagos de salarios y liquidaciones.

3.4.1 Personal de obra del contratista

A continuación, se relaciona el personal de obra del contratista que laboró en este periodo. Se anexa planilla de pago de seguridad social y parafiscales. **(Ver anexo 5.8).**

NOMBRE DEL TRABAJADOR	CARGO DEL TRABAJADOR	ESTADO
Wilver Franciny Russy Ladino	Director de Obra	**ACTIVO**
Cesar Orlando Narváez Quiñonez	Residente de Obra	**ACTIVO**
Carlos Alberto Oviedo Chavarro	Profesional eléctrico	**ACTIVO**
Yesenia Álvarez Acosta	Profesional Social	**ACTIVO**
Sandra Milena Santiago Camacho	Apoyo SST	**ACTIVO**
Elkin Reyes Serrano	Ayudante de obra	**ACTIVO**
Jorge Reyes Serrano	Guarda de seguridad	**ACTIVO**

A continuación, se presenta la relación de herramientas y equipos usados por el contratista durante el periodo de este informe.

EQUIPO/HERRAMIENTA	CANTIDAD
Herramienta menor	12
Pulidora 7"	1

EQUIPO/HERRAMIENTA	CANTIDAD
Martillo demoledor mediano	1
Vibrador de concreto	1

3.4.2 Correspondencia

En el periodo correspondiente de este informe el contratista envió los siguientes comunicados a la interventoría. **(Ver anexo 5.5).**

FECHA	OFICIO N°	ASUNTO	ENVÍA	RECÍBE
06/06/2024	0085-0756	RADICACIÓN POLIZAS PRORROGA Y ADICION AL CONTRATO DE OBRA	WRUSSY INGENIEROS S.A.S	SECRETARIA JURIDICA BARRANCABERMEJA
21/06/2024	0087-0756	RADICACIÓN FICHAS TECNICAS	WRUSSY INGENIEROS S.A.S	UT INTERCOMEDOR ITSI
26/06/2024	0088-0756	FICHA TECNICA MESAS COMEDOR	WRUSSY INGENIEROS S.A.S	UT INTERCOMEDOR ITSI
27/06/2024	0089-0756	RADICACION POLIZAS PRORROGA AL CONTRATO DE OBRA	WRUSSY INGENIEROS S.A.S	UT INTERCOMEDOR ITSI
03/07/2024	0091-0756	SOLICITUD DE INCLUSION ITEMS NO PREVISTOS	WRUSSY INGENIEROS S.A.S	UT INTERCOMEDOR ITSI
12/07/2024	0092-0756	HOMOLOGACIÓN MATERIAL MESAS COMEDOR	WRUSSY INGENIEROS S.A.S	UT INTERCOMEDOR ITSI
22/07/2024	0093-0756	RESPUESTA OFICIO No.0034	WRUSSY INGENIEROS S.A.S	UT INTERCOMEDOR ITSI
29/07/2024	0096-0756	PROPUESTA BARANDA DE ACERO INOXIDABLE	WRUSSY INGENIEROS S.A.S	UT INTERCOMEDOR ITSI
01/08/2024	0097-0756	DISTRIBUCIÓN MESAS COMEDOR	WRUSSY INGENIEROS S.A.S	UT INTERCOMEDOR ITSI

3.5. ACTIVIDADES FINANCIERAS

Durante el periodo no se suscribieron actas parciales. A continuación, se presenta el resumen financiero del contrato.

ACTA	VALOR	PORCENTAJE
ACTA PARCIAL 1	$ 652.092.013,92	12,85%

ACTA	VALOR	PORCENTAJE
ACTA PARCIAL 2	$ 468.320.345,00	9,32%
ACTA PARCIAL 3	$ 393.584.241,12	7,76%
ACTA PARCIAL 4	$ 1.671.827.231,59	32,95%
ACTA PARCIAL 5	$ 803.660.675,94	15,84%
ACTA PARCIAL 6	$ 570.434.549,43	11,24%
VALOR PARCIAL TOTAL	**$ 4.599.919.057,43**	**89,87%**
VALOR TOTAL	**$ 5.073.942.869,88**	**--**
SALDO POR EJECUTAR	**$ 514.023.812,88**	**10,12%**

Nota: A la fecha de elaboración del presente informe no se ha suscrito el acta de recibo final y de liquidación cuyo valor corresponde al saldo por ejecutar.

3.6. ACTIVIDADES DE SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJO (SST)

A continuación, se relacionan las actividades principales del área SST, ejecutadas por el contratista. Y se incluye el informe HSE para ver a detalle el trabajo realizado por el equipo de trabajo. **(Ver anexo 5.9).**

- Se realizaron las respectivas charlas diarias de seguridad y salud en el trabajo antes de iniciar la jornada laboral.

- Se realizó constantemente la reposición de EPP’s por daños a los trabajadores.

- Con ayuda del formato que se implementó de ENCUESTA DE AUTOCUIDADO se pudo determinar que ningún trabajador presentó sintomatología y/o posible contagio de COVID19 en el periodo de este informe.

- Se realizaron inspecciones de herramientas y equipos usados en el periodo.

- Se realizaron inspecciones diarias de áreas verificando el orden y aseo continuo.

- Se realizaron las charlas de seguridad, pausas activas, COPASST, CCL, capacitaciones e inducciones a todo el personal que laboró en el periodo de este informe.

- Se diligenciaron los permisos de trabajo necesarios para las actividades realizadas en el periodo.

3.7. ACTIVIDADES SOCIO AMBIENTALES

A continuación, se relacionan algunas de las actividades principales del área ambiental,

ejecutadas por el contratista. Y se incluye el informe Socio Ambiental para ver a detalle el trabajo realizado. **(Ver anexo 5.10).**

- Atención a PQRS por parte de representantes del colegio ITSI y comunidad en general y se realiza reunión con los padres de familia del colegio, para presentar el avance y seguimiento actual de obra.

- Se realiza limpieza continua de baños portátiles por parte de la empresa ASSEAR y se aporta el certificado emitido por disposición final de residuos.

- Se realizan las respectivas capacitaciones al personal de obra donde se tratan temas relacionados con la parte ambiental.

3.8. ACTIVIDADES DE CONTROL DE LA CALIDAD

- Las actividades de obra se han realizado siguiendo y respetando las especificaciones técnicas entregadas por la entidad contratante y con aval de la interventoría.

3.9. CONTROL DE GARANTIAS

A continuación, se relaciona la información de las pólizas que ampara el contrato de obra, actualizadas por adicional en plazo N°4 y en valor N°1.

INFORMACIÓN POLIZAS			
Póliza de cumplimiento:	11-44-101198726		
Póliza de Reps. Civil extracontractual:	11-40-101051776		
Expedida por:	SEGUROS DEL ESTADO		
Fecha de expedición	30 DE MARZO DE 2023		
AMPARO	**VIGENCIA**		**VALOR ASEGURADO**
	Fecha inicial	**Fecha final**	
Cumplimiento de contrato	06/03/2023	10/03/2025	$1.014.788.574,00
Salarios y prestaciones sociales	06/03/2023	10/09/2027	$507.394.287,00
Estabilidad de la obra	Se ampara 5 años, 0 meses y 1 días		$1.014.788.574,00
Responsabilidad civil extracontractual	06/03/2023	10/09/2024	$520.000.000,00

4. CAPITULO IV. CONCLUSIONES

- En el periodo correspondiente a este informe, el contratista cumplió con las actividades realizadas de manera correcta y segura, siguiendo las especificaciones técnicas y las recomendaciones de la interventoría.

- Con la implementación del protocolo y la limpieza y desinfección de manos, herramientas y áreas, se tuvo control con los empleados en cuanto a la prevención y mitigación del contagio de COVID19.

- Los trabajadores contaron con los elementos de protección personal y dotaciones de acuerdo a las exigencias de la obra en mención.

- Durante el periodo de ejecución de presente informe se evidencio un porcentaje de avance físico del 100%.

- Durante este periodo la ejecución del contrato no presenta atrasos en su ejecución.

5. CAPITULO V. ANEXOS

5.1. REGISTRO FOTOGRÁFICO

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 0756-23

OBJETO:	CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DEL COMEDOR Y COCINA DEL INSTITUTO TECNICO SUPERIOR INDUSTRIAL EN EL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA
CONTRATISTA:	WRUSSY INGENIEROS S.A.S
INTERVENTOR:	UT INTERCOMEDOR ITSI
SUPERVISOR:	ALEJANDRO ALFONSO ENRIQUEZ MORA
FECHA DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	EN EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 06-08-2024 AL 10-09-2024
DIRECCIÓN Y SECTOR:	INTITUTO TECNICO SUPERIOR INDUSTRIAL

FOTOGRAFIA NO.1 – INSTALACIÓN DE REJILLAS METÁLICAS DEL CÁRCAMO DE LA PLACA ESTAMPADA.










FOTOGRAFÍA NO.2 – INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE VENTILACIÓN DEL TANQUE DE AGUA POTABLE







FOTOGRAFÍA NO.3 – INSTALACIÓN DE MESAS EN EL AREA DEL COMEDOR.




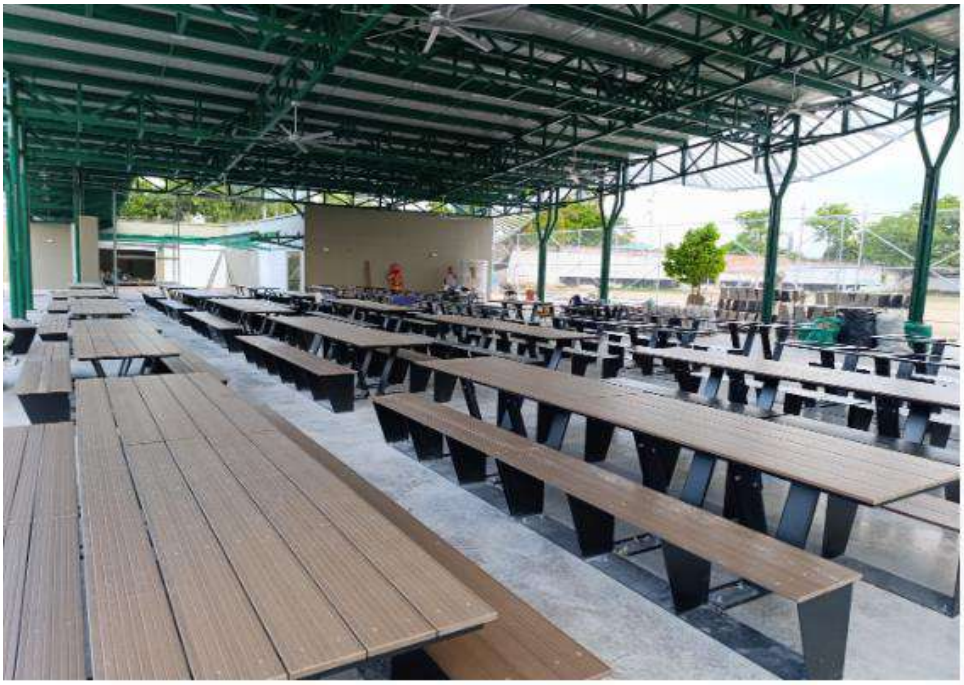



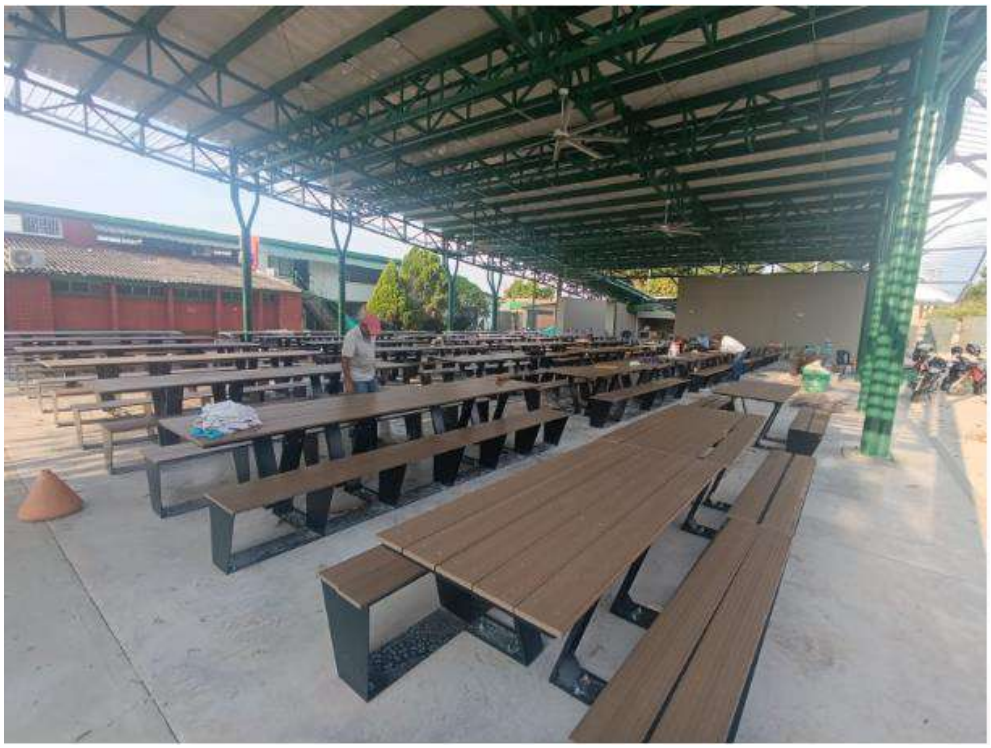

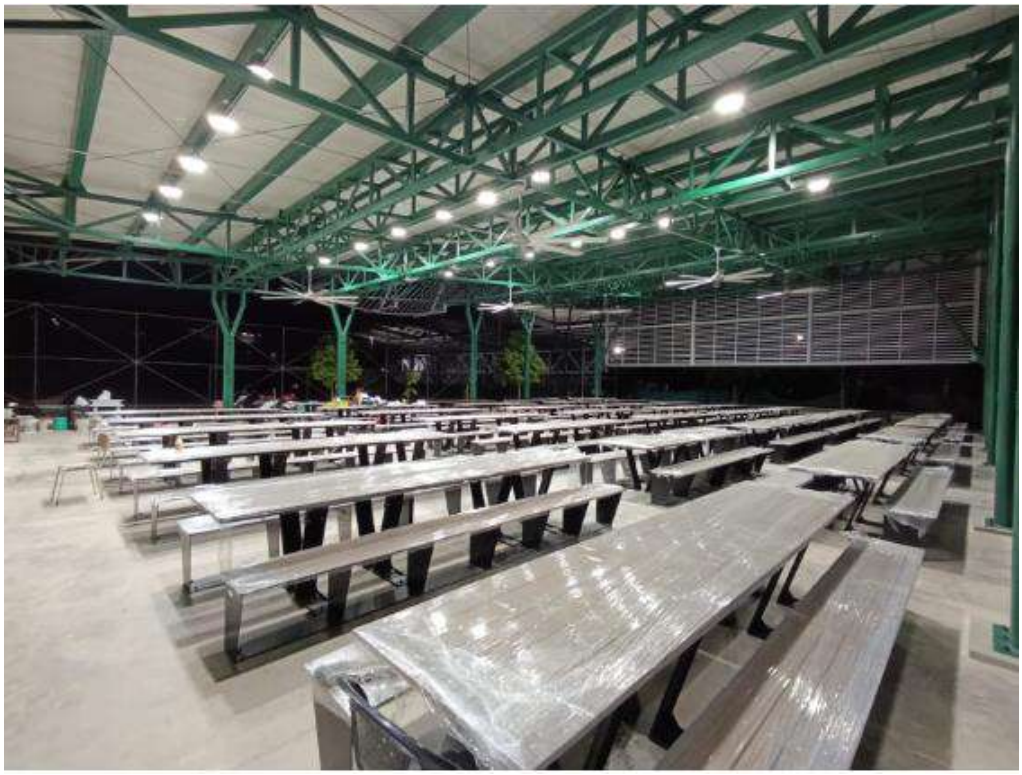

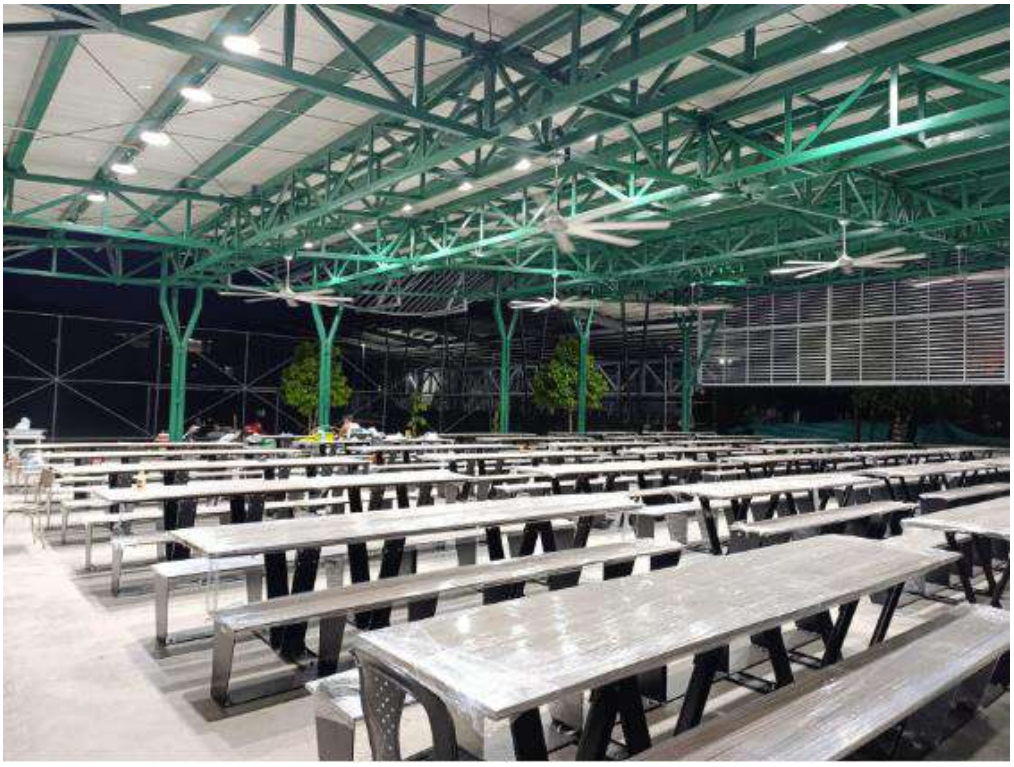

FOTOGRAFÍA NO.4 –INSTALACIÓN DE ENCHAPE DEL CUARTO DE ASEO.





FOTOGRAFÍA NO.5 – SE REALIZA LAVADO Y BRILLADO FINAL DEL PISO DE GRANITO BLANCO HUILA.













FOTOGRAFÍA NO.6 – SE REALIZA PINTURA DE PORTONES ENROLLABLES, TAPA METÁLICA DEL TANQUE DE AGUA









FOTOGRAFÍA NO.8 - SE REALIZA FUNDIDA DE GROUTING PARA PEDESTALES.





FOTOGRAFÍA NO.9 – INSTALACIÓN DE GASODOMESTICOS, CONGELADORES, DOTACION, MESONE Y DEMAS
















100
200
300
400
500
600
°C
°F




SILVER MAX
TOTAL PRICE
7 8 9 C TARE
4 5 6 ADD ZERO
1 2 3 M1 M2
0 • STORE M3
























GRIVAL
GRIVAL
GRIVAL
GRIVAL





FOTOGRAFIA NO.10 - SE REALIZA PINTURA ALTO TRAFICO PARA EL CUARTO DE BOMBAS.



FOTOGRAFIA NO.11 - SE REALIZA DEMOLICIÓN Y CONSTRUCCION DE COLUMNAS ACCESO PRINCIPAL Y VIGA DE SOPORTE.











FOTOGRAFIA No. 12 – SE REALIZA INSTALACIÓN DE PONTON ACCESO PRINCIPAL.





FOTOGRAFIA No.13 – INSTALACION DE POLICARBONATO, CANALES DE AGUA LLUVIA Y PINTURA DE LOS MISMOS.





5.2. INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

UT. INTERCOMEDOR ITSI

FORMATO INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

1. FECHA ELABORACIÓN:	16	8	2024	2. No. INFORME	75	3. SEMANA No.	75
4. INFORME CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE:	05/08/2024 AL 11/08/2024			5. ENTIDAD CONTRATANTE	ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANCABERMEJA - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA		

A. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

6. CONTRATO OBRA No:	0756-23	7. FECHA CONTRATO:	23	2	2023	8. VALOR CONTRATO:	$	3.684.062.560,88
9. FECHA ACTA INICIO:	6 / 3 / 2023	10. FECHA DE TERMINACIÓN:	10	9	2024	11. PLAZO:	18	Meses
12. PRORROGAS:	4	13. SUSPENSIONES:	1			14. ADICIONES:	$	1.389.880.309,00
15. OBJETO DEL CONTRATO OBRA:	CONSTRUCCION Y DOTACION DEL COMEDOR Y COCINA DEL INSTITUTO TECNICO SUPERIOR INDUSTRIAL EN EL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA							
16. CONTRATISTA:	WRUSSY INGENIEROS S.A.S							
17. CONTRATO INTEVENTORIA No:	0757-23	18. FECHA CONTRATO:	22	2	2023	19. VALOR CONTRATO:	$	272.766.458,00
20. FECHA ACTA INICIO:	6 / 3 / 2023	21. FECHA DE TERMINACIÓN:	10	9	2024	22. PLAZO:	18	Meses
23. PRORROGAS:	4	24. SUSPENSIONES:	1			25. ADICIONES:	$	102.851.142,00
26. INTEVENTORÍA:	UT INTERCOMEDOR ITSI							
27. SUPERVISOR :	ARQ. ALEJANDRO ALFONSO ENRIQUEZ MORA							

B. CONTROL DE PROGRAMACIÓN

28. CAPÍTULO SEGÚN CONTRATO	VALOR DEL CAPITULO	Peso en % del capitulo en relación al valor total del contrato (costos directos) (A)	% Acumulado programado por capitulo (B)	% Total Programado del capitulo (C)=AxB	% Acumulado de ejecución física por capitulo (D)	% Total ejecutado por capitulo (E)=AxD	(% Ejecución Física - % Acumulado programado) (F)= D-B	% Total de adelanto o atraso (G)=E-C
PRELIMINARES	$ 64.798.515,18	1,77%	100,00%	1,77%	100,00%	1,77%	0,00%	0,00%
MOVIMIENTO DE TIERRA	$ 271.734.261,07	7,43%	100,00%	7,43%	100,00%	7,43%	0,00%	0,00%
ESTRUCTURAS DE HORMIGON ARMADO Y ACERO	$ 1.015.665.409,57	27,77%	97,00%	26,94%	99,96%	27,76%	2,96%	0,82%
MAMPOSTERIA Y FRISOS	$ 42.642.546,98	1,17%	100,00%	1,17%	100,00%	1,17%	0,00%	0,00%
ARQUITECTURA Y ACABADO	$ 428.377.944,17	11,71%	47,00%	5,50%	97,62%	11,43%	50,62%	5,93%
INSTALACIONES HIDRAULICAS	$ 25.387.255,09	0,69%	99,00%	0,69%	100,00%	0,69%	1,00%	0,01%
INSTALACIONES SANITARIAS	$ 22.769.368,83	0,62%	100,00%	0,62%	100,00%	0,62%	0,00%	0,00%
ALCANTARILLADO	$ 36.154.407,39	0,99%	100,00%	0,99%	100,00%	0,99%	0,00%	0,00%
INSTALACIONES DE GAS	$ 12.888.477,03	0,35%	100,00%	0,35%	100,00%	0,35%	0,00%	0,00%
INSTALACIONES ELECTRICAS	$ 154.170.920,74	4,22%	91,00%	3,84%	100,00%	4,22%	9,00%	0,38%
EQUIPOS COCINA	$ 145.501.563,71	3,98%	44,00%	1,75%	0,00%	0,00%	-44,00%	-1,75%
OTROS	$ 536.526.900,75	14,67%	44,00%	6,45%	11,21%	1,64%	-32,79%	-4,81%
DOTACIÓN	$ 12.807.869,00	0,35%	1,00%	0,00%	0,00%	0,00%	-1,00%	0,00%
ITEM NO PREVISTOS	$ 888.161.074,00	24,28%	73,00%	17,73%	87,46%	21,24%	14,46%	3,51%
TOTAL	**$ 3.657.586.513,51**	**100,00%**		**75,23%**		**79,31%**		**4,08%**

33. CONSOLIDADO AVANCE DE OBRA


EJECUCIÓN	EJECUTADO	PROGRAMADO	ATRASO(-) ADELANTO (+)
Acumulado anterior	79,22%	72,28%	6,94%
Durante el periodo	0,09%	2,95%	-2,86%
Acumulado Actual	79,31%	75,23%	4,08%

33.1. CONSOLIDADO AVANCE PRESUPUESTAL

	SEMANA	ACUMULADO
Obra Programada	2,95%	75,23%
Valor de la Obra Programada	$ 107.898.802,15	$ 2.751.527.765,01

	SEMANA	ACUMULADO
Obra Ejecutada	0,09%	79,31%
Valor de la Obra Ejecutada	$ 3.291.827,86	$ 2.900.911.979,56

34. GRÁFICO DE OBRA PROGRAMADA vs. EJECUTADA

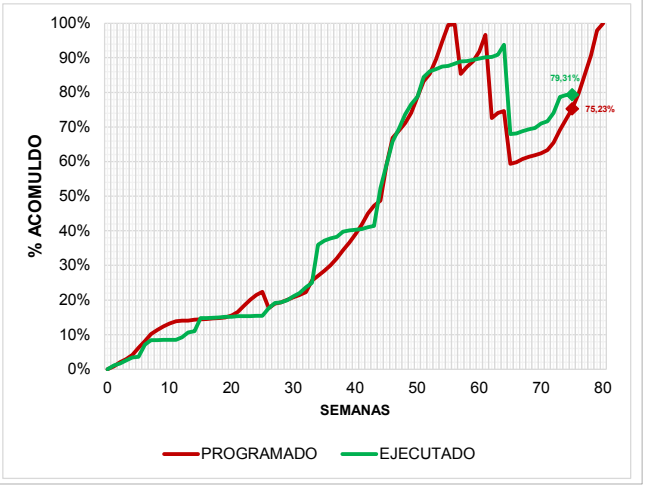

UT. INTERCOMEDOR ITSI	FORMATO INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

C. RECURSOS DEL CONTRATISTA

35. PERSONAL OPERATIVO OBRA		36. EQUIPOS EN OBRA		37. ESTADO DEL TIEMPO	
CARGO	CANTIDAD	EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	CANTIDAD	DIA	ESTADO
OBREROS	6	DEMOLEDOR	0	LUNES	F
PERSONAL INSTALACIÓN CUBIERTA METÁLICA	0	HERRAMIENTA MENOR	10	MARTES	F
PERSONAL SST Y AMBIENTAL	1	PULIDORA	1	MIERCOLES	F
MAESTRO	1	MINICARGADOR O BOBCAT	0	JUEVES	F
OFICIAL	0	MOTOBOMBA	1	VIERNES	F
TRABAJADORA SOCIAL	1	COMPACTADOR TIPO SALTARÍN	0	SÁBADO	F
RESIDENTE	1	VIBROCOMPACTADOR	0	**LLUVIOSO (L) FAVORABLE (F) SOLEADO (S)**	

D. TECNICO

1. El contratista realiza la limpieza y brillada final de la placa esmalta del area del comedor.
2. El contratista continua con la instalación y respectivo ajuste de carcamos en angulo y rejilla metalica.
3. El contratista continua con los resanes y correciones en el estuco sobre los muros exteriores.
4. La interventoría verifica que las actividades ejecutadas por el contratista se realicen de acuerdo a las especificaciones técnicas.

E. ADMINISTRATIVO

1. La interventoría en conjunto con el contratista, realizan el registro diario en Bitácora, de todas las actividades ejecutadas y decisiones tomadas en obra.
2. La interventoría exige al contratista el permanente cumplimientos de las especificaciones técnicas.
3. Interventoría verifica constantemente que en obra se encuentre el personal mínimo para iniciar cualquier tipo de actividades y aprobar el permiso de trabajo.

F. FINANCIERA

1. Durante el periodo del presente informe no se presentaron modificaciones al los valores de los contratos de obra e interventoría.

G. SOCIAL

1. En el periodo de este informe no se realizan actividades del componente social.

H. SST

1. Durante este periodo se realizan las respectivas charlas diarias de SST, impartidas por el profesional HSE.
2. Por parte del contratista, el profesional HSE, realiza recambio continuo y entrega de EPP que se encuentran en mal estado.
3. Se realiza jornada de orden y aseo general en la obra.

I. AMBIENTAL

1. Se realiza limpieza continua de los baños portátiles y se realiza la disposición final de los residuos obtenidos por parde de la empresa ASSEAR.
2. Las basuras generadas por la obra, son debidamente recogidas y llevadas al sitio adecuado para que sean recogidas continuamente por el camión recolector de residuos solidos.
3. Los RCD generados por las actividades constructivas son debidamente acopiados.

J. CONTABLE

1. A la fecha de corte del presente informe se ha realizado el pago N°1 por acta parcial al contratista y la interventoría.
2. A la fecha de corte del presente informe se ha realizado el pago N°2 por acta parcial al contratista y la interventoría.
3. A la fecha de corte del presente informe se ha realizado el pago N°3 por acta parcial al contratista y la interventoría.
4. A la fecha de corte del presente informe se ha realizado el pago N°4 por acta parcial al contratista y la interventoría.

K. JURIDICA

1. Durante el presente periodo se realizo la modificación en valor a los contratos de obra e interventoría, lo cual modifica los valores iniciales de los mismos.
2. Hasta la fecha de este informe se ha firmado el acta de pactación de precios e ítem no previstos N°1, acta de pactación de precios e ítem no previstos N°2, el acta de modificación de cantidades de mayores y menores e ítem no previstos N°1, acta de modificación de cantidades de mayores y menores e ítem no previstos N°2, acta de modificación de cantidades de mayores y menores N°3 del contrato de obra 0756-23, acta de adición en plazo N°4 y en valor N°1, acta de pactación de precios N°3 y acta de mayores y menores

Nombre: **LEONARDO MANTILLA NOGUERA**
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

Nombre: **ALEJANDRO ALFONSO ENRIQUEZ MORA**
SUPERVISOR DEL CONTRATO

UT. INTERCOMEDOR ITSI

REGISTRO FOTOGRAFICO INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

FECHA ELABORACIÓN:	16	8	2024	No. INFORME	75	SEMANA No.	75


OBJETO DEL CONTRATO OBRA:	CONSTRUCCION Y DOTACION DEL COMEDOR Y COCINA DEL INSTITUTO TECNICO SUPERIOR INDUSTRIAL EN EL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA

CONTRATO OBRA No:	0756-23	CONTRATISTA	WRUSSY INGENIEROS S.A.S
CONTRATO INTERVENTORÍA No:	0757-23	INTEVENTORÍA	UT INTERCOMEDOR ITSI

F. REGISTRO FOTOGRAFICO



DESCRIPCIÓN: El contratista realiza la limpieza y pulida final de la placa del area del comedor.

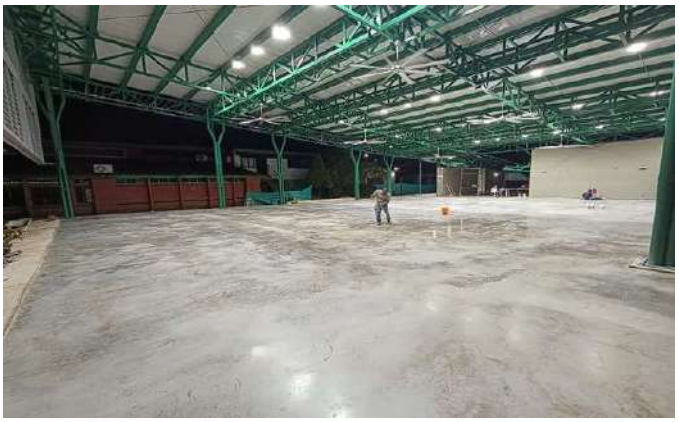

DESCRIPCIÓN: El contratista realiza la pulida de la placa de concreto del area del comedor.



DESCRIPCIÓN: El contratista realiza la instalación de ventilaciones para tanque de 2".



DESCRIPCIÓN: Instalación de enchape color gris mikonos cuarto de aseo.



DESCRIPCIÓN: El contratista realiza resanes sobre muros exteriores



DESCRIPCIÓN: aplicación de pintura sobre estructura metalica.

UT. INTERCOMEDOR ITSI

FORMATO INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

1. FECHA ELABORACIÓN:	19	8	2024	2. No. INFORME	76	3. SEMANA No.	76
4. INFORME CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE:	12/08/2024 AL 18/08/2024			5. ENTIDAD CONTRATANTE	ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANCABERMEJA - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA		

A. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

6. CONTRATO OBRA No:	0756-23			7. FECHA CONTRATO:	23	2	2023	8. VALOR CONTRATO:	$ 3.684.062.560,88
9. FECHA ACTA INICIO:	6	3	2023	10. FECHA DE TERMINACIÓN:	10	9	2024	11. PLAZO:	18 Meses
12. PRORROGAS:	4			13. SUSPENSIONES:	1			14. ADICIONES:	$ 1.389.880.309,00
15. OBJETO DEL CONTRATO OBRA:	CONSTRUCCION Y DOTACION DEL COMEDOR Y COCINA DEL INSTITUTO TECNICO SUPERIOR INDUSTRIAL EN EL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA								
16. CONTRATISTA:	WRUSSY INGENIEROS S.A.S								
17. CONTRATO INTEVENTORIA No:	0757-23			18. FECHA CONTRATO:	22	2	2023	19. VALOR CONTRATO:	$ 272.766.458,00
20. FECHA ACTA INICIO:	6	3	2023	21. FECHA DE TERMINACIÓN:	10	9	2024	22. PLAZO:	18 Meses
23. PRORROGAS:	4			24. SUSPENSIONES:	1			25. ADICIONES:	$ 102.851.142,00
26. INTEVENTORÍA:	UT INTERCOMEDOR ITSI								
27. SUPERVISOR :	ARQ. ALEJANDRO ALFONSO ENRIQUEZ MORA								

B. CONTROL DE PROGRAMACIÓN

28. CAPÍTULO SEGÚN CONTRATO	VALOR DEL CAPITULO	Peso en % del capitulo en relación al valor total del contrato (costos directos) (A)	% Acumulado programado por capitulo (B)	% Total Programado del capitulo (C)=AxB	% Acumulado de ejecución física por capitulo (D)	% Total ejecutado por capitulo (E)=AxD	(% Ejecución Física - % Acumulado programado) (F)= D-B	% Total de adelanto o atraso (G)=E-C
PRELIMINARES	$ 64.798.515,18	1,77%	100,00%	1,77%	100,00%	1,77%	0,00%	0,00%
MOVIMIENTO DE TIERRA	$ 271.734.261,07	7,43%	100,00%	7,43%	100,00%	7,43%	0,00%	0,00%
ESTRUCTURAS DE HORMIGON ARMADO Y ACERO	$ 1.015.665.409,57	27,77%	97,00%	26,94%	99,96%	27,76%	2,96%	0,82%
MAMPOSTERIA Y FRISOS	$ 42.642.546,98	1,17%	100,00%	1,17%	100,00%	1,17%	0,00%	0,00%
ARQUITECTURA Y ACABADO	$ 428.377.944,17	11,71%	57,00%	6,68%	97,62%	11,43%	40,62%	4,76%
INSTALACIONES HIDRAULICAS	$ 25.387.255,09	0,69%	99,00%	0,69%	100,00%	0,69%	1,00%	0,01%
INSTALACIONES SANITARIAS	$ 22.769.368,83	0,62%	100,00%	0,62%	100,00%	0,62%	0,00%	0,00%
ALCANTARILLADO	$ 36.154.407,39	0,99%	100,00%	0,99%	100,00%	0,99%	0,00%	0,00%
INSTALACIONES DE GAS	$ 12.888.477,03	0,35%	100,00%	0,35%	100,00%	0,35%	0,00%	0,00%
INSTALACIONES ELECTRICAS	$ 154.170.920,74	4,22%	92,00%	3,88%	100,00%	4,22%	8,00%	0,34%
EQUIPOS COCINA	$ 145.501.563,71	3,98%	57,00%	2,27%	0,00%	0,00%	-57,00%	-2,27%
OTROS	$ 536.526.900,75	14,67%	57,00%	8,36%	92,17%	13,52%	35,17%	5,16%
DOTACIÓN	$ 12.807.869,00	0,35%	18,00%	0,06%	0,00%	0,00%	-18,00%	-0,06%
ITEM NO PREVISTOS	$ 888.161.074,00	24,28%	75,00%	18,21%	88,08%	21,39%	13,08%	3,18%
TOTAL	**$ 3.657.586.513,51**	**100,00%**		**79,41%**		**91,34%**		**11,93%**

33. CONSOLIDADO AVANCE DE OBRA


EJECUCIÓN	EJECUTADO	PROGRAMADO	ATRASO(-) ADELANTO (+)
Acumulado anterior	79,31%	75,23%	4,08%
Durante el periodo	12,03%	4,18%	7,85%
Acumulado Actual	91,34%	79,41%	11,93%

33.1. CONSOLIDADO AVANCE PRESUPUESTAL

	SEMANA	ACUMULADO
Obra Programada	4,18%	79,41%
Valor de la Obra Programada	$ 152.887.116,26	$ 2.904.511.528,22

	SEMANA	ACUMULADO
Obra Ejecutada	12,03%	91,34%
Valor de la Obra Ejecutada	$ 440.007.657,58	$ 3.340.784.062,53

34. GRÁFICO DE OBRA PROGRAMADA vs. EJECUTADA

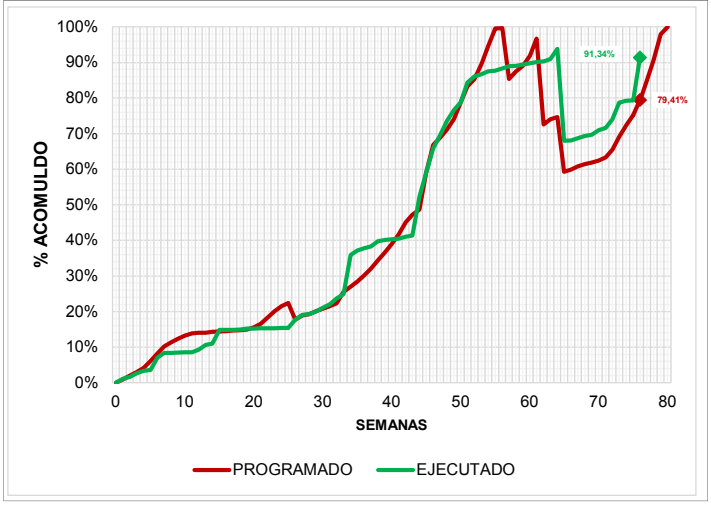

UT. INTERCOMEDOR ITSI

FORMATO INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

C. RECURSOS DEL CONTRATISTA

35. PERSONAL OPERATIVO OBRA		36. EQUIPOS EN OBRA		37. ESTADO DEL TIEMPO	
CARGO	CANTIDAD	EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	CANTIDAD	DIA	ESTADO
OBREROS	6	DEMOLEDOR	0	LUNES	F
PERSONAL INSTALACIÓN CUBIERTA METÁLICA	0	HERRAMIENTA MENOR	10	MARTES	F
PERSONAL SST Y AMBIENTAL	1	PULIDORA	1	MIERCOLES	F
MAESTRO	1	MINICARGADOR O BOBCAT	0	JUEVES	F
OFICIAL	0	MOTOBOMBA	1	VIERNES	F
TRABAJADORA SOCIAL	1	COMPACTADOR TIPO SALTARÍN	0	SÁBADO	F
RESIDENTE	1	VIBROCOMPACTADOR	0	**LLUVIOSO (L) FAVORABLE (F) SOLEADO (S)**	

D. TECNICO

1. El contratista inicia la actividad de brillo final en el piso de granito blanco huila.
2. El contratista continua con la adecuación y recuperación del área de la cancha mediante el esparcimiento de un capa de arenilla fina.
3. El contratista realiza la instalación de las mesas en estructura metálica en el área del comedor.
4. El contratista realiza el suministro e instalación del equipo de aire acondicionado de 9000 BTU 220V en la oficina de administración.
5. El contratista la instalación de grouting para pedestales.
6. La interventoría verifica que las actividades ejecutadas por el contratista se realicen de acuerdo a las especificaciones técnicas.

E. ADMINISTRATIVO

1. La interventoría en conjunto con el contratista, realizan el registro diario en Bitácora, de todas las actividades ejecutadas y decisiones tomadas en obra.
2. La interventoría exige al contratista el permanente cumplimientos de las especificaciones técnicas.
3. Interventoría verifica constantemente que en obra se encuentre el personal mínimo para iniciar cualquier tipo de actividades y aprobar el permiso de trabajo.

F. FINANCIERA

1. Durante el periodo del presente informe no se presentaron modificaciones al los valores de los contratos de obra e interventoría.

G. SOCIAL

1. En el periodo de este informe no se realizan actividades del componente social.

H. SST

1. Durante este periodo se realizan las respectivas charlas diarias de SST, impartidas por el profesional HSE.
2. Por parte del contratista, el profesional HSE, realiza recambio continuo y entrega de EPP que se encuentran en mal estado.
3. Se realiza jornada de orden y aseo general en la obra.

I. AMBIENTAL

1. Se realiza limpieza continua de los baños portátiles y se realiza la disposición final de los residuos obtenidos por parde de la empresa ASSEAR.
2. Las basuras generadas por la obra, son debidamente recogidas y llevadas al sitio adecuado para que sean recogidas continuamente por el camión recolector de residuos solidos.
3. Los RCD generados por las actividades constructivas son debidamente acopiados.

J. CONTABLE

1. A la fecha de corte del presente informe se ha realizado el pago N°1 por acta parcial al contratista y la interventoría.
2. A la fecha de corte del presente informe se ha realizado el pago N°2 por acta parcial al contratista y la interventoría.
3. A la fecha de corte del presente informe se ha realizado el pago N°3 por acta parcial al contratista y la interventoría.
4. A la fecha de corte del presente informe se ha realizado el pago N°4 por acta parcial al contratista y la interventoría.

K. JURIDICA

1. Durante el presente periodo se realizo la modificación en valor a los contratos de obra e interventoría, lo cual modifica los valores iniciales de los mismos.
2. Hasta la fecha de este informe se ha firmado el acta de pactación de precios e ítem no previstos N°1, acta de pactación de precios e ítem no previstos N°2, el acta de modificación de cantidades de mayores y menores e ítem no previstos N°1, acta de modificación de cantidades de mayores y menores e ítem no previstos N°2, acta de modificación de cantidades de mayores y menores N°3 del contrato de obra 0756-23, acta de adición en plazo N°4 y en valor N°1, acta de pactación de precios N°3 y acta de mayores y menores N°4

Nombre: **LEONARDO PANTILLA NOGUERA**
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

Nombre: **ALEJANDRO ALFONSO ENRIQUEZ MORA**
SUPERVISOR DEL CONTRATO

UT. INTERCOMEDOR ITSI

REGISTRO FOTOGRAFICO INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

FECHA ELABORACIÓN:	19	8	2024	No. INFORME	76	SEMANA No.	76

OBJETO DEL CONTRATO OBRA:	CONSTRUCCION Y DOTACION DEL COMEDOR Y COCINA DEL INSTITUTO TECNICO SUPERIOR INDUSTRIAL EN EL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA		
CONTRATO OBRA No:	0756-23	CONTRATISTA	WRUSSY INGENIEROS S.A.S
CONTRATO INTERVENTORÍA No:	0757-23	INTEVENTORÍA	UT INTERCOMEDOR ITSI

F. REGISTRO FOTOGRAFICO



DESCRIPCIÓN: Adecuación del area de la cancha.



DESCRIPCIÓN: Adecuación del area de la cancha.



DESCRIPCIÓN: Brillada y pulida del piso en granito blanco huila (preparación mixta, alancenas, oficina, cuarto de residuos solidos)



DESCRIPCIÓN: Brillada y pulida del piso en granito blanco huila (preparación mixta, alancenas, oficina, cuarto de residuos solidos)



DESCRIPCIÓN: Brillada y pulida del piso en granito blanco huila (preparación mixta, alancenas, oficina, cuarto de residuos solidos)



DESCRIPCIÓN: Brillada y pulida del piso en granito blanco huila (preparación mixta, alancenas, oficina, cuarto de residuos solidos)

UT. INTERCOMEDOR ITSI	**FORMATO INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA**

FECHA ELABORACIÓN:	**19**	**8**	**2024**	No. INFORME	76	SEMANA No. 76

OBJETO DEL CONTRATO OBRA:	CONSTRUCCION Y DOTACION DEL COMEDOR Y COCINA DEL INSTITUTO TECNICO SUPERIOR INDUSTRIAL EN EL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA

CONTRATO OBRA No:	0756-23	CONTRATISTA	WRUSSY INGENIEROS S.A.S
CONTRATO INTERVENTORÍA No:	0757-23	INTEVENTORÍA	UT INTERCOMEDOR ITSI

F. REGISTRO FOTOGRAFICO



DESCRIPCIÓN: Instalación de aire acondcionado de 9000BTU 22V.



DESCRIPCIÓN: Instalación de aire acondcionado de 9000BTU 22V.



DESCRIPCIÓN: Instalación de mesas en estructura metalica.



DESCRIPCIÓN: Instalación de mesas en estructura metalica.



DESCRIPCIÓN: Instalación de Grouting para pedestales.



DESCRIPCIÓN: Instalación de Grouting para pedestales.

UT. INTERCOMEDOR ITSI

FORMATO INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

1. FECHA ELABORACIÓN:	26	8	2024	2. No. INFORME	77	3. SEMANA No.	77
4. INFORME CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE:	19/08/2024 AL 25/08/2024			5. ENTIDAD CONTRATANTE	ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANCABERMEJA - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA		

A. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

6. CONTRATO OBRA No:	0756-23			7. FECHA CONTRATO:	23	2	2023	8. VALOR CONTRATO:	$ 3.684.062.560,88
9. FECHA ACTA INICIO:	6	3	2023	10. FECHA DE TERMINACIÓN:	10	9	2024	11. PLAZO:	18 Meses
12. PRORROGAS:	4			13. SUSPENSIONES:	1			14. ADICIONES:	$ 1.389.880.309,00
15. OBJETO DEL CONTRATO OBRA:	CONSTRUCCION Y DOTACION DEL COMEDOR Y COCINA DEL INSTITUTO TECNICO SUPERIOR INDUSTRIAL EN EL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA								
16. CONTRATISTA:	WRUSSY INGENIEROS S.A.S								
17. CONTRATO INTEVENTORIA No:	0757-23			18. FECHA CONTRATO:	22	2	2023	19. VALOR CONTRATO:	$ 272.766.458,00
20. FECHA ACTA INICIO:	6	3	2023	21. FECHA DE TERMINACIÓN:	10	9	2024	22. PLAZO:	18 Meses
23. PRORROGAS:	4			24. SUSPENSIONES:	1			25. ADICIONES:	$ 102.851.142,00
26. INTEVENTORÍA:	UT INTERCOMEDOR ITSI								
27. SUPERVISOR :	ARQ. ALEJANDRO ALFONSO ENRIQUEZ MORA								

B. CONTROL DE PROGRAMACIÓN

28. CAPÍTULO SEGÚN CONTRATO	VALOR DEL CAPITULO	Peso en % del capitulo en relación al valor total del contrato (costos directos) (A)	% Acumulado programado por capitulo (B)	% Total Programado del capitulo (C)=AxB	% Acumulado de ejecución física por capitulo (D)	% Total ejecutado por capitulo (E)=AxD	(% Ejecución Física - % Acumulado programado) (F)= D-B	% Total de adelanto o atraso (G)=E-C
PRELIMINARES	$ 64.798.515,18	1,77%	100,00%	1,77%	100,00%	1,77%	0,00%	0,00%
MOVIMIENTO DE TIERRA	$ 271.734.261,07	7,43%	100,00%	7,43%	100,00%	7,43%	0,00%	0,00%
ESTRUCTURAS DE HORMIGON ARMADO Y ACERO	$ 1.015.665.409,57	27,77%	98,00%	27,21%	99,96%	27,76%	1,96%	0,55%
MAMPOSTERIA Y FRISOS	$ 42.642.546,98	1,17%	100,00%	1,17%	100,00%	1,17%	0,00%	0,00%
ARQUITECTURA Y ACABADO	$ 428.377.944,17	11,71%	69,00%	8,08%	97,62%	11,43%	28,62%	3,35%
INSTALACIONES HIDRAULICAS	$ 25.387.255,09	0,69%	100,00%	0,69%	100,00%	0,69%	0,00%	0,00%
INSTALACIONES SANITARIAS	$ 22.769.368,83	0,62%	100,00%	0,62%	100,00%	0,62%	0,00%	0,00%
ALCANTARILLADO	$ 36.154.407,39	0,99%	100,00%	0,99%	100,00%	0,99%	0,00%	0,00%
INSTALACIONES DE GAS	$ 12.888.477,03	0,35%	100,00%	0,35%	100,00%	0,35%	0,00%	0,00%
INSTALACIONES ELECTRICAS	$ 154.170.920,74	4,22%	94,00%	3,96%	100,00%	4,22%	6,00%	0,25%
EQUIPOS COCINA	$ 145.501.563,71	3,98%	71,00%	2,82%	100,00%	3,98%	29,00%	1,15%
OTROS	$ 536.526.900,75	14,67%	71,00%	10,41%	68,66%	10,07%	-2,34%	-0,34%
DOTACIÓN	$ 12.807.869,00	0,35%	44,00%	0,15%	0,00%	0,00%	-44,00%	-0,15%
ITEM NO PREVISTOS	$ 888.161.074,00	24,28%	79,00%	19,18%	99,89%	24,26%	20,89%	5,07%
TOTAL	**$ 3.657.586.513,51**	**100,00%**		**84,86%**		**94,74%**		**9,88%**

33. CONSOLIDADO AVANCE DE OBRA


EJECUCIÓN	EJECUTADO	PROGRAMADO	ATRASO(-) ADELANTO (+)
Acumulado anterior	91,34%	79,41%	11,93%
Durante el periodo	3,40%	5,45%	-2,05%
Acumulado Actual	94,74%	84,86%	9,88%

33.1. CONSOLIDADO AVANCE PRESUPUESTAL

	SEMANA	ACUMULADO
Obra Programada	5,45%	84,86%
Valor de la Obra Programada	$ 199.338.464,99	$ 3.103.751.300,51

	SEMANA	ACUMULADO
Obra Ejecutada	3,40%	94,74%
Valor de la Obra Ejecutada	$ 124.357.941,46	$ 3.465.112.673,57

34. GRÁFICO DE OBRA PROGRAMADA vs. EJECUTADA

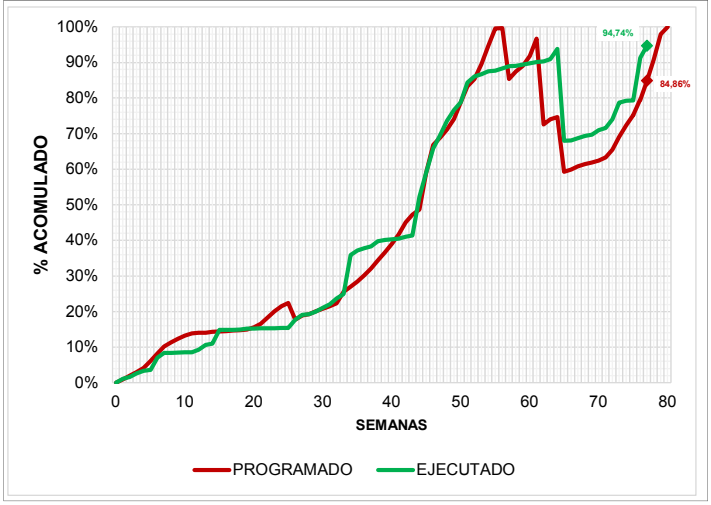

C. RECURSOS DEL CONTRATISTA

35. PERSONAL OPERATIVO OBRA		36. EQUIPOS EN OBRA		37. ESTADO DEL TIEMPO	
CARGO	CANTIDAD	EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	CANTIDAD	DIA	ESTADO
OBREROS	6	DEMOLEDOR	0	LUNES	F
PERSONAL INSTALACIÓN CUBIERTA METÁLICA	0	HERRAMIENTA MENOR	10	MARTES	F
PERSONAL SST Y AMBIENTAL	1	PULIDORA	1	MIERCOLES	F
MAESTRO	1	MINICARGADOR O BOBCAT	0	JUEVES	F
OFICIAL	0	MOTOBOMBA	1	VIERNES	F
TRABAJADORA SOCIAL	1	COMPACTADOR TIPO SALTARÍN	0	SÁBADO	F
RESIDENTE	1	VIBROCOMPACTADOR	0	**LLUVIOSO (L) FAVORABLE (F) SOLEADO (S)**	

D. TECNICO

1. El contratista realiza el suministró de los equipos de refrigeración (congeladores horizontales de 2pta, congelador horizontal de 1 pta., refrigeradores verticales de 1pta).
2. El contratista realiza el suministro e instalación de los equipos gasodomésticos.
3. El contratista realiza el suministro e instalación de la campana extractora.
4. El contratista realiza el suministro e instalación de la ducterìa y el equipo de extracción tipo hongo.
5. El contratista realiza el suministró de las mesas en acero inoxidable.
6. La interventoría verifica que las actividades ejecutadas por el contratista se realicen de acuerdo a las especificaciones técnicas.

E. ADMINISTRATIVO

1. La interventoría en conjunto con el contratista, realizan el registro diario en Bitácora, de todas las actividades ejecutadas y decisiones tomadas en obra.
2. La interventoría exige al contratista el permanente cumplimientos de las especificaciones técnicas.
3. Interventoría verifica constantemente que en obra se encuentre el personal mínimo para iniciar cualquier tipo de actividades y aprobar el permiso de trabajo.

F. FINANCIERA

1. Durante el periodo del presente informe no se presentaron modificaciones al los valores de los contratos de obra e interventoría.

G. SOCIAL

1. En el periodo de este informe no se realizan actividades del componente social.

H. SST

1. Durante este periodo se realizan las respectivas charlas diarias de SST, impartidas por el profesional HSE.
2. Por parte del contratista, el profesional HSE, realiza recambio continuo y entrega de EPP que se encuentran en mal estado.
3. Se realiza jornada de orden y aseo general en la obra.

I. AMBIENTAL

1. Se realiza limpieza continua de los baños portátiles y se realiza la disposición final de los residuos obtenidos por parde de la empresa ASSEAR.
2. Las basuras generadas por la obra, son debidamente recogidas y llevadas al sitio adecuado para que sean recogidas continuamente por el camión recolector de residuos solidos.
3. Los RCD generados por las actividades constructivas son debidamente acopiados.

J. CONTABLE

1. A la fecha de corte del presente informe se ha realizado el pago N°1 por acta parcial al contratista y la interventoría.
2. A la fecha de corte del presente informe se ha realizado el pago N°2 por acta parcial al contratista y la interventoría.
3. A la fecha de corte del presente informe se ha realizado el pago N°3 por acta parcial al contratista y la interventoría.
4. A la fecha de corte del presente informe se ha realizado el pago N°4 por acta parcial al contratista y la interventoría.

K. JURIDICA

1. Durante el presente periodo se realizo la modificación en valor a los contratos de obra e interventoría, lo cual modifica los valores iniciales de los mismos.
2. Hasta la fecha de este informe se ha firmado el acta de pactación de precios e ítem no previstos N°1, acta de pactación de precios e ítem no previstos N°2, el acta de modificación de cantidades de mayores y menores e ítem no previstos N°1, acta de modificación de cantidades de mayores y menores e ítem no previstos N°2, acta de modificación de cantidades de mayores y menores N°3 del contrato de obra 0756-23, acta de adición en plazo N°4 y en valor N°1, acta de pactación de precios N°3 y acta de mayores y menores N°4

Nombre: **LEONARDO MANTILLA NOGUERA**
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

Nombre: **ALEJANDRO ALFONSO ENRIQUEZ MORA**
SUPERVISOR DEL CONTRATO

UT. INTERCOMEDOR ITSI

REGISTRO FOTOGRAFICO INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

FECHA ELABORACIÓN:	26	8	2024	No. INFORME	76	SEMANA No.	76

OBJETO DEL CONTRATO OBRA:	CONSTRUCCION Y DOTACION DEL COMEDOR Y COCINA DEL INSTITUTO TECNICO SUPERIOR INDUSTRIAL EN EL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA		
CONTRATO OBRA No:	0756-23	CONTRATISTA	WRUSSY INGENIEROS S.A.S
CONTRATO INTERVENTORÍA No:	0757-23	INTEVENTORÍA	UT INTERCOMEDOR ITSI

F. REGISTRO FOTOGRAFICO



DESCRIPCIÓN: Suministro e instalación de equipos gasodomesticos



DESCRIPCIÓN: Suministro e instalación de equipos gasodomesticos



DESCRIPCIÓN: Suministro e instalación de mesas en acero inoxidable



DESCRIPCIÓN: Suministro e instalación de mesas en acero inoxidable



DESCRIPCIÓN: Suministro es instalación de equipos de refrigeración.



DESCRIPCIÓN: Suministro es instalación de equipos de refrigeración.

UT. INTERCOMEDOR ITSI	**FORMATO INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA**

FECHA ELABORACIÓN:	**26**	**8**	**2024**	No. INFORME	77	SEMANA No. 77

OBJETO DEL CONTRATO OBRA:	CONSTRUCCION Y DOTACION DEL COMEDOR Y COCINA DEL INSTITUTO TECNICO SUPERIOR INDUSTRIAL EN EL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA

CONTRATO OBRA No:	0756-23	CONTRATISTA	WRUSSY INGENIEROS S.A.S
CONTRATO INTERVENTORÍA No:	0757-23	INTEVENTORÍA	UT INTERCOMEDOR ITSI

F. REGISTRO FOTOGRAFICO



DESCRIPCIÓN: Suministro es instalación de equipos de refrigeración.



DESCRIPCIÓN: Suministro es instalación de equipos de refrigeración.



DESCRIPCIÓN: Instalación de ducteria para extración de aire.



DESCRIPCIÓN: Instalación de hongo extractor.



DESCRIPCIÓN: Instalación de ducteria para extración de aire.



DESCRIPCIÓN: Instalación de estantería.

UT. INTERCOMEDOR ITSI

FORMATO INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

1. FECHA ELABORACIÓN:	1	9	2024	2. No. INFORME	78	3. SEMANA No.	78
4. INFORME CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE:	26/08/2024 AL 01/08/2024			5. ENTIDAD CONTRATANTE	ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANCABERMEJA - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA		

A. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

6. CONTRATO OBRA No:	0756-23			7. FECHA CONTRATO:	23	2	2023	8. VALOR CONTRATO:	$ 3.684.062.560,88		
9. FECHA ACTA INICIO:	6	3	2023	10. FECHA DE TERMINACIÓN:	10	9	2024	11. PLAZO:	18	Meses	
12. PRORROGAS:	4			13. SUSPENSIONES:	1			14. ADICIONES:	$ 1.389.880.309,00		
15. OBJETO DEL CONTRATO OBRA:	CONSTRUCCION Y DOTACION DEL COMEDOR Y COCINA DEL INSTITUTO TECNICO SUPERIOR INDUSTRIAL EN EL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA										
16. CONTRATISTA:	WRUSSY INGENIEROS S.A.S										
17. CONTRATO INTEVENTORIA No:	0757-23			18. FECHA CONTRATO:	22	2	2023	19. VALOR CONTRATO:	$ 272.766.458,00		
20. FECHA ACTA INICIO:	6	3	2023	21. FECHA DE TERMINACIÓN:	10	9	2024	22. PLAZO:	18	Meses	
23. PRORROGAS:	4			24. SUSPENSIONES:	1			25. ADICIONES:	$ 102.851.142,00		
26. INTEVENTORÍA:	UT INTERCOMEDOR ITSI										
27. SUPERVISOR :	ARQ. ALEJANDRO ALFONSO ENRIQUEZ MORA										

B. CONTROL DE PROGRAMACIÓN

28. CAPÍTULO SEGÚN CONTRATO	VALOR DEL CAPITULO	Peso en % del capitulo en relación al valor total del contrato (costos directos) (A)	% Acumulado programado por capitulo (B)	% Total Programado del capitulo (C)=AxB	% Acumulado de ejecución física por capitulo (D)	% Total ejecutado por capitulo (E)=AxD	(% Ejecución Física - % Acumulado programado) (F)= D-B	% Total de adelanto o atraso (G)=E-C
PRELIMINARES	$ 64.798.515,18	1,77%	100,00%	1,77%	100,00%	1,77%	0,00%	0,00%
MOVIMIENTO DE TIERRA	$ 271.734.261,07	7,43%	100,00%	7,43%	100,00%	7,43%	0,00%	0,00%
ESTRUCTURAS DE HORMIGON ARMADO Y ACERO	$ 1.015.665.409,57	27,77%	99,00%	27,49%	99,96%	27,76%	0,96%	0,27%
MAMPOSTERIA Y FRISOS	$ 42.642.546,98	1,17%	100,00%	1,17%	100,00%	1,17%	0,00%	0,00%
ARQUITECTURA Y ACABADO	$ 428.377.944,17	11,71%	83,00%	9,72%	97,62%	11,43%	14,62%	1,71%
INSTALACIONES HIDRAULICAS	$ 25.387.255,09	0,69%	100,00%	0,69%	100,00%	0,69%	0,00%	0,00%
INSTALACIONES SANITARIAS	$ 22.769.368,83	0,62%	100,00%	0,62%	100,00%	0,62%	0,00%	0,00%
ALCANTARILLADO	$ 36.154.407,39	0,99%	100,00%	0,99%	100,00%	0,99%	0,00%	0,00%
INSTALACIONES DE GAS	$ 12.888.477,03	0,35%	100,00%	0,35%	100,00%	0,35%	0,00%	0,00%
INSTALACIONES ELECTRICAS	$ 154.170.920,74	4,22%	96,00%	4,05%	100,00%	4,22%	4,00%	0,17%
EQUIPOS COCINA	$ 145.501.563,71	3,98%	84,00%	3,34%	100,00%	3,98%	16,00%	0,64%
OTROS	$ 536.526.900,75	14,67%	84,00%	12,32%	81,72%	11,99%	-2,28%	-0,33%
DOTACIÓN	$ 12.807.869,00	0,35%	69,00%	0,24%	48,61%	0,17%	-20,39%	-0,07%
ITEM NO PREVISTOS	$ 888.161.074,00	24,28%	84,00%	20,40%	100,01%	24,28%	16,01%	3,89%
TOTAL	**$ 3.657.586.513,51**	**100,00%**		**90,59%**		**96,85%**		**6,27%**

33. CONSOLIDADO AVANCE DE OBRA


EJECUCIÓN	EJECUTADO	PROGRAMADO	ATRASO(-) ADELANTO (+)
Acumulado anterior	94,74%	84,86%	9,88%
Durante el periodo	2,11%	5,73%	-3,62%
Acumulado Actual	96,85%	90,59%	6,26%

33.1. CONSOLIDADO AVANCE PRESUPUESTAL

	SEMANA	ACUMULADO
Obra Programada	5,73%	90,59%
Valor de la Obra Programada	$ 209.579.707,22	$ 3.313.238.006,53

	SEMANA	ACUMULADO
Obra Ejecutada	2,11%	96,85%
Valor de la Obra Ejecutada	$ 77.175.075,44	$ 3.542.411.848,77

34. GRÁFICO DE OBRA PROGRAMADA vs. EJECUTADA

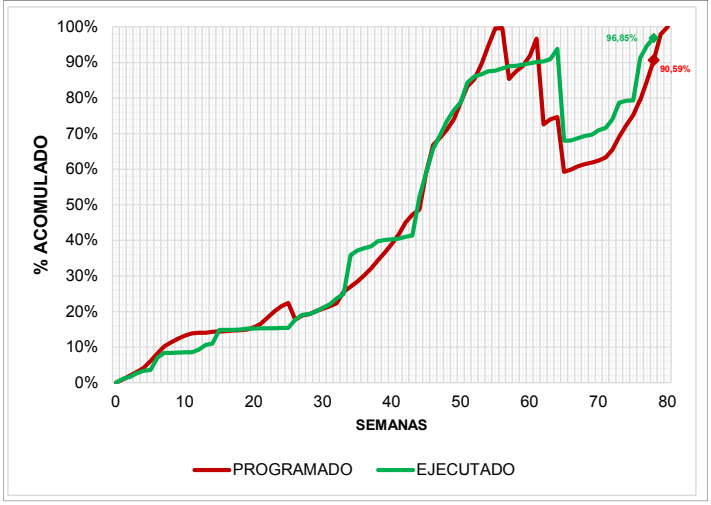

UT. INTERCOMEDOR ITSI	FORMATO INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

C. RECURSOS DEL CONTRATISTA

35. PERSONAL OPERATIVO OBRA		36. EQUIPOS EN OBRA		37. ESTADO DEL TIEMPO	
CARGO	**CANTIDAD**	**EQUIPOS Y HERRAMIENTAS**	**CANTIDAD**	**DIA**	**ESTADO**
OBREROS	6	DEMOLEDOR	0	LUNES	F
PERSONAL INSTALACIÓN CUBIERTA METÁLICA	0	HERRAMIENTA MENOR	10	MARTES	F
PERSONAL SST Y AMBIENTAL	1	PULIDORA	1	MIERCOLES	F
MAESTRO	1	MINICARGADOR O BOBCAT	0	JUEVES	F
OFICIAL	0	MOTOBOMBA	1	VIERNES	F
TRABAJADORA SOCIAL	1	COMPACTADOR TIPO SALTARÍN	0	SÁBADO	F
RESIDENTE	1	VIBROCOMPACTADOR	0	**LLUVIOSO (L) FAVORABLE (F) SOLEADO (S)**	

D. TECNICO

1. El contratista realiza la impermeabilización del tanque de almacenamiento de agua potable.
2. El contratista realiza el suministro e instalación de la valvula antiretorno del tanque de almacenamiento de agua potable.
3. El contratista cuntinua con el suminsitro e instalación de mesas en estructura de metalica y recubrimiento en deck.
4. El contratista realiza el suministro e instalación de los equipos gasodomesticos y refrigeradores.
5. El contratista realiza el suministró de la dotación del comedor.
6. La interventoría verifica que las actividades ejecutadas por el contratista se realicen de acuerdo a las especificaciones técnicas.

E. ADMINISTRATIVO

1. La interventoría en conjunto con el contratista, realizan el registro diario en Bitácora, de todas las actividades ejecutadas y decisiones tomadas en obra.
2. La interventoría exige al contratista el permanente cumplimientos de las especificaciones técnicas.
3. Interventoría verifica constantemente que en obra se encuentre el personal mínimo para iniciar cualquier tipo de actividades y aprobar el permiso de trabajo.

F. FINANCIERA

1. Durante el periodo del presente informe no se presentaron modificaciones al los valores de los contratos de obra e interventoría.

G. SOCIAL

1. En el periodo de este informe no se realizan actividades del componente social.

H. SST

1. Durante este periodo se realizan las respectivas charlas diarias de SST, impartidas por el profesional HSE.
2. Por parte del contratista, el profesional HSE, realiza recambio continuo y entrega de EPP que se encuentran en mal estado.
3. Se realiza jornada de orden y aseo general en la obra.

I. AMBIENTAL

1. Se realiza limpieza continua de los baños portátiles y se realiza la disposición final de los residuos obtenidos por parde de la empresa ASSEAR.
2. Las basuras generadas por la obra, son debidamente recogidas y llevadas al sitio adecuado para que sean recogidas continuamente por el camión recolector de residuos solidos.
3. Los RCD generados por las actividades constructivas son debidamente acopiados.

J. CONTABLE

1. A la fecha de corte del presente informe se ha realizado el pago N°1 por acta parcial al contratista y la interventoría.
2. A la fecha de corte del presente informe se ha realizado el pago N°2 por acta parcial al contratista y la interventoría.
3. A la fecha de corte del presente informe se ha realizado el pago N°3 por acta parcial al contratista y la interventoría.
4. A la fecha de corte del presente informe se ha realizado el pago N°4 por acta parcial al contratista y la interventoría.
5. A la fecha de corte del presente informe se ha realizado el pago N°5 por acta parcial al contratista y la interventoría.

K. JURIDICA

1. Durante el presente periodo se realizo la modificación en valor a los contratos de obra e interventoría, lo cual modifica los valores iniciales de los mismos.
2. Hasta la fecha de este informe se ha firmado el acta de pactación de precios e ítem no previstos N°1, acta de pactación de precios e ítem no previstos N°2, el acta de modificación de cantidades de mayores y menores e ítem no previstos N°1, acta de modificación de cantidades de mayores y menores e ítem no previstos N°2, acta de modificación de cantidades de mayores y menores N°3 del contrato de obra 0756-23, acta de adición en plazo N°4 y en valor N°1, acta de pactación de precios N°3 y acta de mayores y menores N°4

Nombre: **LEONARDO TANTILLA NOGUERA**
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

Nombre: **ALEJANDRO ALFONSO ENRIQUEZ MORA**
SUPERVISOR DEL CONTRATO

UT. INTERCOMEDOR ITSI

REGISTRO FOTOGRAFICO INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

FECHA ELABORACIÓN:	1	9	2024	No. INFORME	78	SEMANA No.	78

OBJETO DEL CONTRATO OBRA:	CONSTRUCCION Y DOTACION DEL COMEDOR Y COCINA DEL INSTITUTO TECNICO SUPERIOR INDUSTRIAL EN EL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA		
CONTRATO OBRA No:	0756-23	CONTRATISTA	WRUSSY INGENIEROS S.A.S
CONTRATO INTERVENTORÍA No:	0757-23	INTEVENTORÍA	UT INTERCOMEDOR ITSI

F. REGISTRO FOTOGRAFICO



DESCRIPCIÓN: Impermeabilización de tanque de agua potable



DESCRIPCIÓN: Suministro e instalación de valvula antiretornor



DESCRIPCIÓN: Suministro e instalación de mesas.



DESCRIPCIÓN: Suministro e instalación de mesas.



DESCRIPCIÓN: Suministro de dotación (molino de carne).



DESCRIPCIÓN: Suministro de dotación (licuadora).

UT. INTERCOMEDOR ITSI

FORMATO INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

1. FECHA ELABORACIÓN:	9	9	2024	2. No. INFORME	79	3. SEMANA No.	79
4. INFORME CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE:	02/09/2024 AL 08/09/2024			5. ENTIDAD CONTRATANTE	ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANCABERMEJA - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA		

A. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

6. CONTRATO OBRA No:	0756-23			7. FECHA CONTRATO:	23	2	2023	8. VALOR CONTRATO:	$ 3.684.062.560,88
9. FECHA ACTA INICIO:	6	3	2023	10. FECHA DE TERMINACIÓN:	10	9	2024	11. PLAZO:	18 Meses
12. PRORROGAS:	4			13. SUSPENSIONES:	1			14. ADICIONES:	$ 1.389.880.309,00
15. OBJETO DEL CONTRATO OBRA:	CONSTRUCCION Y DOTACION DEL COMEDOR Y COCINA DEL INSTITUTO TECNICO SUPERIOR INDUSTRIAL EN EL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA								
16. CONTRATISTA:	WRUSSY INGENIEROS S.A.S								
17. CONTRATO INTEVENTORIA No:	0757-23			18. FECHA CONTRATO:	22	2	2023	19. VALOR CONTRATO:	$ 272.766.458,00
20. FECHA ACTA INICIO:	6	3	2023	21. FECHA DE TERMINACIÓN:	10	9	2024	22. PLAZO:	18 Meses
23. PRORROGAS:	4			24. SUSPENSIONES:	1			25. ADICIONES:	$ 102.851.142,00
26. INTEVENTORÍA:	UT INTERCOMEDOR ITSI								
27. SUPERVISOR :	ARQ. ALEJANDRO ALFONSO ENRIQUEZ MORA								

B. CONTROL DE PROGRAMACIÓN

28. CAPÍTULO SEGÚN CONTRATO	VALOR DEL CAPITULO	Peso en % del capitulo en relación al valor total del contrato (costos directos) (A)	% Acumulado programado por capitulo (B)	% Total Programado del capitulo (C)=AxB	% Acumulado de ejecución física por capitulo (D)	% Total ejecutado por capitulo (E)=AxD	(% Ejecución Física - % Acumulado programado) (F)= D-B	% Total de adelanto o atraso (G)=E-C
PRELIMINARES	$ 64.798.515,18	1,77%	100,00%	1,77%	100,00%	1,77%	0,00%	0,00%
MOVIMIENTO DE TIERRA	$ 271.734.261,07	7,43%	100,00%	7,43%	100,00%	7,43%	0,00%	0,00%
ESTRUCTURAS DE HORMIGON ARMADO Y ACERO	$ 1.015.665.409,57	27,77%	99,00%	27,49%	100,00%	27,77%	1,00%	0,28%
MAMPOSTERIA Y FRISOS	$ 42.642.546,98	1,17%	100,00%	1,17%	100,00%	1,17%	0,00%	0,00%
ARQUITECTURA Y ACABADO	$ 428.377.944,17	11,71%	96,00%	11,24%	97,00%	11,36%	1,00%	0,12%
INSTALACIONES HIDRAULICAS	$ 25.387.255,09	0,69%	100,00%	0,69%	100,00%	0,69%	0,00%	0,00%
INSTALACIONES SANITARIAS	$ 22.769.368,83	0,62%	100,00%	0,62%	100,00%	0,62%	0,00%	0,00%
ALCANTARILLADO	$ 36.154.407,39	0,99%	100,00%	0,99%	100,00%	0,99%	0,00%	0,00%
INSTALACIONES DE GAS	$ 12.888.477,03	0,35%	100,00%	0,35%	100,00%	0,35%	0,00%	0,00%
INSTALACIONES ELECTRICAS	$ 154.170.920,74	4,22%	99,00%	4,17%	100,00%	4,22%	1,00%	0,04%
EQUIPOS COCINA	$ 145.501.563,71	3,98%	97,00%	3,86%	100,00%	3,98%	3,00%	0,12%
OTROS	$ 536.526.900,75	14,67%	97,00%	14,23%	92,17%	13,52%	-4,83%	-0,71%
DOTACIÓN	$ 12.807.869,00	0,35%	94,00%	0,33%	100,00%	0,35%	6,00%	0,02%
ITEM NO PREVISTOS	$ 888.161.074,00	24,28%	97,00%	23,55%	100,00%	24,28%	3,00%	0,73%
TOTAL	**$ 3.657.586.513,51**	**100,00%**		**97,90%**		**98,50%**		**0,60%**

33. CONSOLIDADO AVANCE DE OBRA


EJECUCIÓN	EJECUTADO	PROGRAMADO	ATRASO(-) ADELANTO (+)
Acumulado anterior	96,85%	90,59%	6,26%
Durante el periodo	1,65%	7,31%	-5,66%
Acumulado Actual	98,50%	97,90%	0,60%

33.1. CONSOLIDADO AVANCE PRESUPUESTAL

	SEMANA	ACUMULADO
Obra Programada	7,31%	97,90%
Valor de la Obra Programada	$ 267.369.574,14	$ 3.580.878.874,15

	SEMANA	ACUMULADO
Obra Ejecutada	1,65%	98,50%
Valor de la Obra Ejecutada	$ 60.350.177,47	$ 3.602.701.812,96

34. GRÁFICO DE OBRA PROGRAMADA vs. EJECUTADA

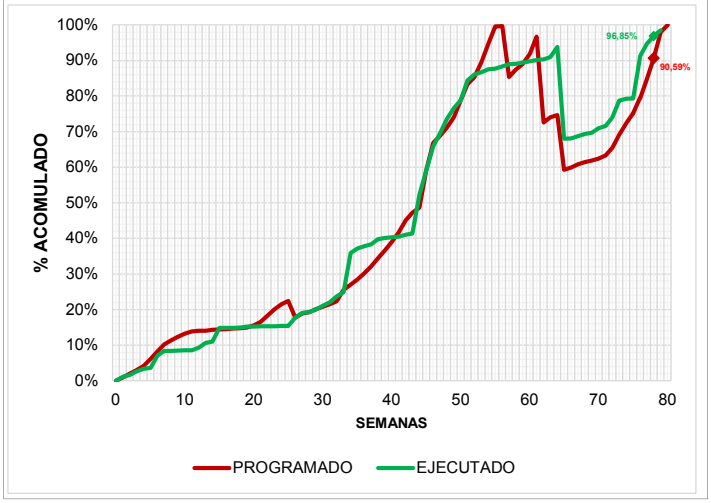

UT. INTERCOMEDOR ITSI

FORMATO INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

C. RECURSOS DEL CONTRATISTA

35. PERSONAL OPERATIVO OBRA		36. EQUIPOS EN OBRA		37. ESTADO DEL TIEMPO	
CARGO	CANTIDAD	EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	CANTIDAD	DIA	ESTADO
OBREROS	6	DEMOLEDOR	0	LUNES	F
PERSONAL INSTALACIÓN CUBIERTA METÁLICA	0	HERRAMIENTA MENOR	10	MARTES	F
PERSONAL SST Y AMBIENTAL	1	PULIDORA	1	MIERCOLES	F
MAESTRO	1	MINICARGADOR O BOBCAT	0	JUEVES	F
OFICIAL	0	MOTOBOMBA	1	VIERNES	F
TRABAJADORA SOCIAL	1	COMPACTADOR TIPO SALTARÍN	0	SÁBADO	F
RESIDENTE	1	VIBROCOMPACTADOR	0	**LLUVIOSO (L) FAVORABLE (F) SOLEADO (S)**	

D. TECNICO

1. El contratista realiza el retiro del portón existente.
2. El contratista realiza la construcción de columnas y viga para la instalación de porto corredizo.
3. El contratista continua con el suministro e instalación de mesas en estructura de metálica y recubrimiento en deck.
4. El contratista realiza la instalación de portón corredizo de acceso principal.
5. El contratista realiza el suministro e instalación de policarbonato alveolar.
6. La interventoría verifica que las actividades ejecutadas por el contratista se realicen de acuerdo a las especificaciones técnicas.

E. ADMINISTRATIVO

1. La interventoría en conjunto con el contratista, realizan el registro diario en Bitácora, de todas las actividades ejecutadas y decisiones tomadas en obra.
2. La interventoría exige al contratista el permanente cumplimientos de las especificaciones técnicas.
3. Interventoría verifica constantemente que en obra se encuentre el personal mínimo para iniciar cualquier tipo de actividades y aprobar el permiso de trabajo.

F. FINANCIERA

1. Durante el periodo del presente informe no se presentaron modificaciones al los valores de los contratos de obra e interventoría.

G. SOCIAL

1. En el periodo de este informe no se realizan actividades del componente social.

H. SST

1. Durante este periodo se realizan las respectivas charlas diarias de SST, impartidas por el profesional HSE.
2. Por parte del contratista, el profesional HSE, realiza recambio continuo y entrega de EPP que se encuentran en mal estado.
3. Se realiza jornada de orden y aseo general en la obra.

I. AMBIENTAL

1. Se realiza limpieza continua de los baños portátiles y se realiza la disposición final de los residuos obtenidos por parde de la empresa ASSEAR.
2. Las basuras generadas por la obra, son debidamente recogidas y llevadas al sitio adecuado para que sean recogidas continuamente por el camión recolector de residuos solidos.
3. Los RCD generados por las actividades constructivas son debidamente acopiados.

J. CONTABLE

1. A la fecha de corte del presente informe se ha realizado el pago N°1 por acta parcial al contratista y la interventoría.
2. A la fecha de corte del presente informe se ha realizado el pago N°2 por acta parcial al contratista y la interventoría.
3. A la fecha de corte del presente informe se ha realizado el pago N°3 por acta parcial al contratista y la interventoría.
4. A la fecha de corte del presente informe se ha realizado el pago N°4 por acta parcial al contratista y la interventoría.
5. A la fecha de corte del presente informe se ha realizado el pago N°5 por acta parcial al contratista y la interventoría.

K. JURIDICA

1. Durante el presente periodo se realizo la modificación en valor a los contratos de obra e interventoría, lo cual modifica los valores iniciales de los mismos.
2. Hasta la fecha de este informe se ha firmado el acta de pactación de precios e ítem no previstos N°1, acta de pactación de precios e ítem no previstos N°2, el acta de modificación de cantidades de mayores y menores e ítem no previstos N°1, acta de modificación de cantidades de mayores y menores e ítem no previstos N°2, acta de modificación de cantidades de mayores y menores N°3 del contrato de obra 0756-23, acta de adición en plazo N°4 y en valor N°1, acta de pactación de precios N°3 y acta de mayores y menores N°4 y acta de mayores y menores cantidades N°5.

Nombre: **LEONARDO PANTILLA NOGUERA**
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

Nombre: **ALEJANDRO ALFONSO ENRIQUEZ MORA**
SUPERVISOR DEL CONTRATO

UT. INTERCOMEDOR ITSI

REGISTRO FOTOGRAFICO INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

FECHA ELABORACIÓN:	9	9	2024	No. INFORME	79	SEMANA No.	79

OBJETO DEL CONTRATO OBRA:	CONSTRUCCION Y DOTACION DEL COMEDOR Y COCINA DEL INSTITUTO TECNICO SUPERIOR INDUSTRIAL EN EL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA		
CONTRATO OBRA No:	0756-23	CONTRATISTA	WRUSSY INGENIEROS S.A.S
CONTRATO INTERVENTORÍA No:	0757-23	INTEVENTORÍA	UT INTERCOMEDOR ITSI

F. REGISTRO FOTOGRAFICO



DESCRIPCIÓN: Retiro de portón existente.



DESCRIPCIÓN: Suministro e instalación de cubierta en policarbonato alveolar,



DESCRIPCIÓN: Suministro e instalación de mesas.



DESCRIPCIÓN: Construcción de columnas y viga para portón de acceso.



DESCRIPCIÓN: Construcción de columnas y viga para portón de acceso.



DESCRIPCIÓN: Suministro e instalación de portón corredizo..

UT. INTERCOMEDOR ITSI

FORMATO INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

1. FECHA ELABORACIÓN:	16	9	2024	2. No. INFORME	80	3. SEMANA No.	80
4. INFORME CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE:	09/09/2024 AL 10/09/2024			5. ENTIDAD CONTRATANTE	ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANCABERMEJA - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA		

A. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

6. CONTRATO OBRA No:	0756-23	7. FECHA CONTRATO:	23	2	2023	8. VALOR CONTRATO:	$ 3.684.062.560,88
9. FECHA ACTA INICIO:	6	3	2023	10. FECHA DE TERMINACIÓN:	10	9	2024	11. PLAZO:	18	Meses
12. PRORROGAS:	4	13. SUSPENSIONES:	1			14. ADICIONES:	$ 1.389.880.309,00
15. OBJETO DEL CONTRATO OBRA:	CONSTRUCCION Y DOTACION DEL COMEDOR Y COCINA DEL INSTITUTO TECNICO SUPERIOR INDUSTRIAL EN EL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA						
16. CONTRATISTA:	WRUSSY INGENIEROS S.A.S						
17. CONTRATO INTEVENTORIA No:	0757-23	18. FECHA CONTRATO:	22	2	2023	19. VALOR CONTRATO:	$ 272.766.458,00
20. FECHA ACTA INICIO:	6	3	2023	21. FECHA DE TERMINACIÓN:	10	9	2024	22. PLAZO:	18	Meses
23. PRORROGAS:	4	24. SUSPENSIONES:	1			25. ADICIONES:	$ 102.851.142,00
26. INTEVENTORÍA:	UT INTERCOMEDOR ITSI						
27. SUPERVISOR :	ARQ. ALEJANDRO ALFONSO ENRIQUEZ MORA						

B. CONTROL DE PROGRAMACIÓN

28. CAPÍTULO SEGÚN CONTRATO	VALOR DEL CAPITULO	Peso en % del capitulo en relación al valor total del contrato (costos directos) (A)	% Acumulado programado por capitulo (B)	% Total Programado del capitulo (C)=AxB	% Acumulado de ejecución física por capitulo (D)	% Total ejecutado por capitulo (E)=AxD	(% Ejecución Física - % Acumulado programado) (F)= D-B	% Total de adelanto o atraso (G)=E-C
PRELIMINARES	$ 64.798.515,18	1,77%	100,00%	1,77%	100,00%	1,77%	0,00%	0,00%
MOVIMIENTO DE TIERRA	$ 271.734.261,07	7,43%	100,00%	7,43%	100,00%	7,43%	0,00%	0,00%
ESTRUCTURAS DE HORMIGON ARMADO Y ACERO	$ 1.015.665.409,57	27,77%	100,00%	27,77%	100,00%	27,77%	0,00%	0,00%
MAMPOSTERIA Y FRISOS	$ 42.642.546,98	1,17%	100,00%	1,17%	100,00%	1,17%	0,00%	0,00%
ARQUITECTURA Y ACABADO	$ 428.377.944,17	11,71%	100,00%	11,71%	100,00%	11,71%	0,00%	0,00%
INSTALACIONES HIDRAULICAS	$ 25.387.255,09	0,69%	100,00%	0,69%	100,00%	0,69%	0,00%	0,00%
INSTALACIONES SANITARIAS	$ 22.769.368,83	0,62%	100,00%	0,62%	100,00%	0,62%	0,00%	0,00%
ALCANTARILLADO	$ 36.154.407,39	0,99%	100,00%	0,99%	100,00%	0,99%	0,00%	0,00%
INSTALACIONES DE GAS	$ 12.888.477,03	0,35%	100,00%	0,35%	100,00%	0,35%	0,00%	0,00%
INSTALACIONES ELECTRICAS	$ 154.170.920,74	4,22%	100,00%	4,22%	100,00%	4,22%	0,00%	0,00%
EQUIPOS COCINA	$ 145.501.563,71	3,98%	100,00%	3,98%	100,00%	3,98%	0,00%	0,00%
OTROS	$ 536.526.900,75	14,67%	100,00%	14,67%	100,00%	14,67%	0,00%	0,00%
DOTACIÓN	$ 12.807.869,00	0,35%	100,00%	0,35%	100,00%	0,35%	0,00%	0,00%
ITEM NO PREVISTOS	$ 888.161.074,00	24,28%	100,00%	24,28%	100,00%	24,28%	0,00%	0,00%
TOTAL	**$ 3.657.586.513,51**	**100,00%**		**100,00%**		**100,00%**		**0,00%**

33. CONSOLIDADO AVANCE DE OBRA


EJECUCIÓN	EJECUTADO	PROGRAMADO	ATRASO(-) ADELANTO (+)
Acumulado anterior	98,50%	97,90%	0,60%
Durante el periodo	1,50%	2,10%	-0,60%
Acumulado Actual	100,00%	100,00%	0,00%

33.1. CONSOLIDADO AVANCE PRESUPUESTAL

	SEMANA	ACUMULADO
Obra Programada	2,10%	100,00%
Valor de la Obra Programada	$ 76.809.316,78	$ 3.657.586.513,51

	SEMANA	ACUMULADO
Obra Ejecutada	1,50%	100,00%
Valor de la Obra Ejecutada	$ 54.863.797,70	$ 3.657.586.513,51

34. GRÁFICO DE OBRA PROGRAMADA vs. EJECUTADA

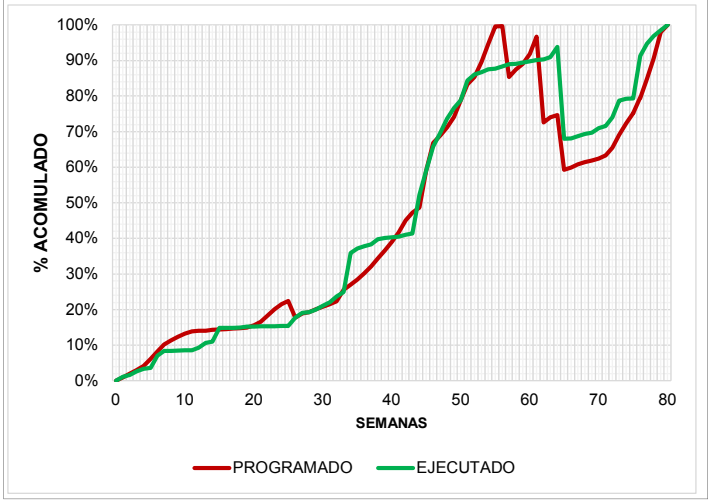

UT. INTERCOMEDOR ITSI	FORMATO INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

C. RECURSOS DEL CONTRATISTA

35. PERSONAL OPERATIVO OBRA		36. EQUIPOS EN OBRA		37. ESTADO DEL TIEMPO	
CARGO	CANTIDAD	EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	CANTIDAD	DIA	ESTADO
OBREROS	6	DEMOLEDOR	0	LUNES	F
PERSONAL INSTALACIÓN CUBIERTA METÁLICA	0	HERRAMIENTA MENOR	10	MARTES	F
PERSONAL SST Y AMBIENTAL	1	PULIDORA	1	MIERCOLES	F
MAESTRO	1	MINICARGADOR O BOBCAT	0	JUEVES	F
OFICIAL	0	MOTOBOMBA	1	VIERNES	F
TRABAJADORA SOCIAL	1	COMPACTADOR TIPO SALTARÍN	0	SÁBADO	F
RESIDENTE	1	VIBROCOMPACTADOR	0	**LLUVIOSO (L) FAVORABLE (F) SOLEADO (S)**	

D. TECNICO

1. El contratista finalizo la instalación del porton de ingreso.
2. El contratista finalizo la instalación de las mesas en estructura metalica y con recubrimeinto en deck.
3. El contratista finalizo la aplicación de pintura y estuco en zonas exteriores.
4. El contratista realiza la instalación de malla protectora exterior para los extratores de la zona de preparación mixta.
5. El contratista realiza orden y aseo final en la obra.
6. La interventoría verifica que las actividades ejecutadas por el contratista se realicen de acuerdo a las especificaciones técnicas.

E. ADMINISTRATIVO

1. La interventoría en conjunto con el contratista, realizan el registro diario en Bitácora, de todas las actividades ejecutadas y decisiones tomadas en obra.
2. La interventoría exige al contratista el permanente cumplimientos de las especificaciones técnicas.
3. Interventoría verifica constantemente que en obra se encuentre el personal mínimo para iniciar cualquier tipo de actividades y aprobar el permiso de trabajo.

F. FINANCIERA

1. Durante el periodo del presente informe no se presentaron modificaciones al los valores de los contratos de obra e interventoría.

G. SOCIAL

1. En el periodo de este informe no se realizan actividades del componente social.

H. SST

1. Durante este periodo se realizan las respectivas charlas diarias de SST, impartidas por el profesional HSE.
2. Por parte del contratista, el profesional HSE, realiza recambio continuo y entrega de EPP que se encuentran en mal estado.
3. Se realiza jornada de orden y aseo general en la obra.

I. AMBIENTAL

1. Se realiza limpieza continua de los baños portátiles y se realiza la disposición final de los residuos obtenidos por parde de la empresa ASSEAR.
2. Las basuras generadas por la obra, son debidamente recogidas y llevadas al sitio adecuado para que sean recogidas continuamente por el camión recolector de residuos solidos.
3. Los RCD generados por las actividades constructivas son debidamente acopiados.

J. CONTABLE

1. A la fecha de corte del presente informe se ha realizado el pago N°1 por acta parcial al contratista y la interventoría.
2. A la fecha de corte del presente informe se ha realizado el pago N°2 por acta parcial al contratista y la interventoría.
3. A la fecha de corte del presente informe se ha realizado el pago N°3 por acta parcial al contratista y la interventoría.
4. A la fecha de corte del presente informe se ha realizado el pago N°4 por acta parcial al contratista y la interventoría.
5. A la fecha de corte del presente informe se ha realizado el pago N°5 por acta parcial al contratista y la interventoría.

K. JURIDICA

1. Durante el presente periodo se realizo la modificación en valor a los contratos de obra e interventoría, lo cual modifica los valores iniciales de los mismos.
2. Hasta la fecha de este informe se ha firmado el acta de pactación de precios e ítem no previstos N°1, acta de pactación de precios e ítem no previstos N°2, el acta de modificación de cantidades de mayores y menores e ítem no previstos N°1, acta de modificación de cantidades de mayores y menores e ítem no previstos N°2, acta de modificación de cantidades de mayores y menores N°3 del contrato de obra 0756-23, acta de adición en plazo N°4 y en valor N°1, acta de pactación de precios N°3 y acta de mayores y menores N°4 y acta de mayores y menores cantidades N°5.

Nombre: **LEONARDO MANTILLA NOGUERA**
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

Nombre: **ALEJANDRO ALFONSO ENRIQUEZ MORA**
SUPERVISOR DEL CONTRATO

UT. INTERCOMEDOR ITSI

REGISTRO FOTOGRAFICO INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

FECHA ELABORACIÓN:	16	9	2024	No. INFORME	79	SEMANA No.	79

OBJETO DEL CONTRATO OBRA:	CONSTRUCCION Y DOTACION DEL COMEDOR Y COCINA DEL INSTITUTO TECNICO SUPERIOR INDUSTRIAL EN EL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA		
CONTRATO OBRA No:	0756-23	CONTRATISTA	WRUSSY INGENIEROS S.A.S
CONTRATO INTERVENTORÍA No:	0757-23	INTEVENTORÍA	UT INTERCOMEDOR ITSI


F. REGISTRO FOTOGRAFICO



DESCRIPCIÓN: Porton acceso principal.



DESCRIPCIÓN: Malla protectora para extractores,

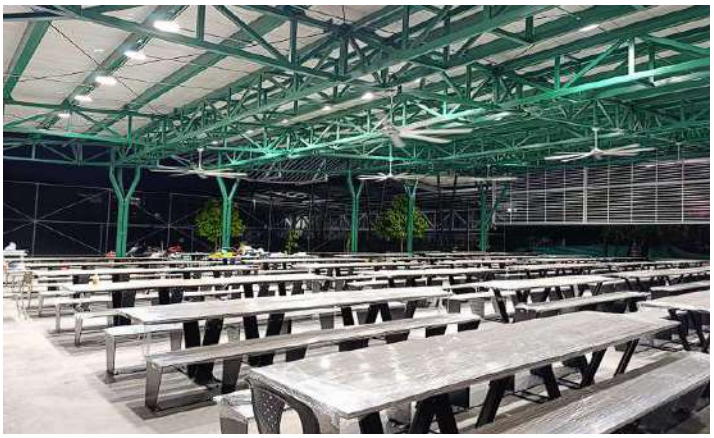

DESCRIPCIÓN: Suministro e instalación de mesas.



DESCRIPCIÓN: Orden y aseo (lavamanos)



DESCRIPCIÓN: Orden y aseo (zona lateral izquierda)



DESCRIPCIÓN: Orden y aseo (placa estampada)

UT. INTERCOMEDOR ITSI

FORMATO INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

FECHA ELABORACIÓN:	16	9	2024	No. INFORME	80	SEMANA No. 80

OBJETO DEL CONTRATO OBRA:	CONSTRUCCION Y DOTACION DEL COMEDOR Y COCINA DEL INSTITUTO TECNICO SUPERIOR INDUSTRIAL EN EL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA

CONTRATO OBRA No:	0756-23	CONTRATISTA	WRUSSY INGENIEROS S.A.S
CONTRATO INTERVENTORÍA No:	0757-23	INTEVENTORÍA	UT INTERCOMEDOR ITSI

F. REGISTRO FOTOGRAFICO



DESCRIPCIÓN: Orden y aseo (lateral derecho).



DESCRIPCIÓN: Orden y aseo (zona interior).



DESCRIPCIÓN: Orden y aseo (Preparación mixta).



DESCRIPCIÓN: Orden y aseo (Oficina).



DESCRIPCIÓN: Orden ya seo (pasillo).



DESCRIPCIÓN: Orden ya seo (baño).

5.3. BITÁCORA DE OBRA

Fecha 04 de julio 2024 / jueves.

. El contratista inicia labores a las 7am con la charla SST.
. Terreno colmatado por fuertes lluvias de la noche anterior, se prolongan lluvias leves hasta las 10:00 am
. Se realiza cargue de material sobrante y escombros se continua con el replanteo y reconformación del area de influencia de la obra.
. La interventoria verifica toda la ejecion de las actividades.

CESARONP

Residente interventoria Residente obra

Fecha 05 de julio 2024 / viernes.

. El contratista inicia labores a las 7am con la charla SST.
. Se presentan fuertes lluvias desde las noche anterior y se extiende hasta las 10:00 am.
Se presentan lluvias leves de 7:a 5pm.
. por las presentes lluvias, nose evidencia avance por terreno colmatado de agua.
. La interventoria verifica las actividades.

CESARONP

Residente interventoria Residente obra

Fecha 06 de julio 2024 / sabado.

- El contratista inicia labores a las 7am con charla SST.
- Se continua con la excavación para instalación de bordillos y carcamos prefabricados en concreto.
- Terreno colmatado de agua por las partes bajas del dia anterior.
- la interventoria verifica toda la ejecucion de las actividades.

Residente interventoria

CÉSARONP
Residente obra

Fecha 08 de julio 2024 / lunes.

- el contratista inicio labores a las 7am con charla SST.
- Se continua excavación para la instalación de bordillos y carcamos prefabricados en concreto.
- Se realiza instalacion de cinta de peligro, delimitando el area del interventoria de la obra.
- la interventoria verifica toda la ejecucion de la actividades.

Residente interventoria

CÉSARONP
Residente obra

Fecha 09 de julio 2024 / Martes.

- El contratista inicia labores a las 7am con la charla SST.
- Se continua con la excavación para instalación de bordillos y carcamos.
- la interventoria verifica toda la ejecucion de las actividades.

Residente interventoría

CESAR ONA
Residente obra

Fecha 10 de julio 2024 / Miercoles.

- El contratista inicia labores a las 7am con la charla SST.
- Se continua instalación de bordillos y carcamos prefabricados.
- aplicacion de solado para instalación de carcamos prefabricado
- se instala rejilla de sifones evidenciando observación en oficio echa por interventoria.
- Se continua limpieza de pedistales y estructura metalica.
- la interventoria verifica toda la ejecucion de las actividades.

Residente interventoría

CESAR ONA
Residente obra

Fecha 11 de julio 2024 / jueves.

- El contratista inicia labores a las 7am con charla SST.
- Se continua la instalación de cárcamos prefabricados en concreto
- Se continua con el replanteo y movimiento de tierras para posterior fundido de malla electrosoldada.
- Se recibe visita de la supervisión, interventoría y secretaría de infraestructura.
- La interventoría verifica toda la ejecución de las actividades.

Residente interventoría

CESAR ONO
Residente obra

Fecha 12 de julio 2024 / viernes.

- El contratista inicia labores a las 7am con la charla SST.
- Se realiza replanteo de andenes para posterior fundido de malla electrosoldada y fundido
- Se continua con la excavación para instalacion de bordillo prefabricados.
- La interventoría verifica toda la ejecucion de las actividades.

Residente interventoría

CESAR ONO
Residente obra

Fecha 13 de julio 2024 / sabado

- El contratista inicio labores a las 7am con la charla SST.
- Se continua replanteo y tendido de malla electrosoldada para Fundido de andenes
- Se realiza realce de caja de inspección e instalación de su respectivo marco.
- La interventoria verifica toda la ejecucion de las actividades.

Residente interventoria

CÉSARONP
Residente obra

Fecha 15 de julio 2024 / Lunes.

- El contratista inicia labores alas 7am con la charla SST.
- Se continua excavacion para instalación de cercamos pretensados en concreto.
- Se continua replanteo para fundido de andenes
- Se inicia aplicacion de emulsion asfaltica para impermeabilizacion de placa de cubierta.
- La interventoria verifica toda la ejecucion de las actividades.

Residente interventoria

CÉSARONP
Residente obra

Fecha 16 de julio 2024 / Martes.

El contratista inicia labores a las 7am con la charla SST.

- Se continua con la instalación de manto asfaltico en placa de cubierta.
- Se realiza fundida de andenes y acabados rayado de la misma.
- La interventoria verifica toda la ejecución de las actividades.

CÉSARONO
Residente obra

Residente interventoria

Fecha 17 de agosto 2024 / Miercoles.

- El contratista inicia labores altas Jans con la charla SST.
- Se realiza instalación de bordillos prefabricados en concreto
- se realiza replanteo y fundido de malla electrosoldada para fundido de andenes
- se continua con la instalación del manto asfaltico en la placa cubierta.
- Se realiza conección de la red del cuarto de bombas para poderner puesta en marcha del sistema de bombeo.
- Reunion con supervision, interventoria y estudiantes del colegio para verificar avance de obra.
- La interventoria verifica toda la ejecucion de todas las actividades.

Residente interventoria

CÉSARONO
Residente obra

Fecha 18 de julio 2024 / jueves.

- El contratista inicia labores a las 7am con la charla SST.
- Se termina la instalación de muerto estaltivo en placa de cubierta.
- Se realiza fundida de andenes y rampa en la entrada
- Se inicia reconformación del area para placa estampada
- Se termina instalación y puesta en marcha del sistema de bombeo.
- La interventoria verifica toda la ejecución de todas las actividades.

CESPARONY

Residente interventoria

Residente obra

Fecha 19 de julio 2024 / viernes.

- El contratista inicia labores a las 7am con la charla SST.
- Se continua replanteo para tendido de malla electrosoldada en el area de la placa estampada
- Se inicia excavación para la cimentacion de la malla eslabonada.
- Se continua limpieza y pintura de estructura metalica
- Se inicia reparación de humedades de muros exteriores
- La interventoria verifica toda la ejecucion de todas las actividades.

CESPARONY

Residente interventoria

Residente obra

Fecha 22 de julio 2024 / Lunes.

- El contratista inicia labores a las 7am con la charla SST.
- Se continua la excavación para la cimentación de la malla cerramiento
- Se figura y armado acero de refuerzo para cimentación.
- Se continua excavacion para instalación de carcamos en concreto
- Se continua con los resanes de estuco y se inicia pintura de muro de cerramiento de la institución
- La interventoria verifica toda la ejecucion de todas las actividades.

Residente interventoria — Residente obra

Fecha 23 de julio 2024 / Martes.

- El contratista inicia labores a las 7am con la charla SST.
- Se inician nivelado de tubos galvanizados para la malla de cerramiento.
- Se realiza tendido
- Se realiza tendido de plastico negro y maya electrosoldada para fundida de placa estampada
- Se realiza encofrado de carcamo de la placa esmaltada estampada.
- Se realiza trabajo de soldadura para la instalación de vigillos del carcamo de la placa estampada.

- Se instalan bajante de aguas lluvias
- La interventoria verifica la ejecución de todas las actividades.

Residente interventoría

CESARON
Residente obra

Fecha 24 de julio 2024 / Miercoles.

- El contratista inicia labores a las 7 am con la charla SST.
- se realiza fundida de placa estampado (50%) con su respectivo acabado.
- Se termina construcción e hincado de tuberia para muro de contención.
- Se continua aplicacion de mortero para instalación de carcamo prefabricados en concreto.
- La interventoria verifica toda la ejecucion de las actividades.

Residente interventoría

CESARON
Residente obra

Fecha 25 de julio 2024 / jueves.

- El contratista inicia labores a las 7 am con charla SST.
- Se presentan lluvias leves de 7 am a 9 am
- Se realiza fundida total y acabado de placa estampada
- Se continua con la instalación de marcos de aluminios y lamparas de 60x60.
- La interventoria verifica toda la ejecucion de todas las actividades.

Residente interventoría

CESARON
Residente obra

Fecha 26 de julio 2024 / viernes.

- El contratista inicia labores a las 7am con la charla SST.
- se realiza lavado de placa estampada, corte y relleno de juntas de dilatación con wilkem, sellado de la placa.
- Se realiza instalación de carcamo prefabricados en concreto.
- Se realiza instalacion y soldadura de tuberia galvanizada para la malla de cerramiento.
- Se realiza instalacion de Reflectores high bay para el area.
- La interventoria verifica toda la ejecucion de las actividades.
.

Residente interventoria

CESARONP
Residente obra

Fecha 27 de julio 2024 / sabado.

- El contratista inicia labores high bay en el area del comedor.
- El contratista inicia labores a las 7am con charla SST.
- se continua instalación de reflectores high bay en el area del comedor.
- se continua instalación de tuberia galvanizada para malla de cerramiento.
- se continua replanteo de cancha futbol.
- se inicia instalación de estructura metalica para muro en granito.
- La interventoria verifica toda la ejecucion de las actividades.

Residente interventoria

CESARONP
Residente obra

Fecha 29 de julio 2024 / Lunes.

- El contratista inicia labores a las 7am con la charla SST.
- Se continua instalacion de malla eslabonada para cerramiento de la cancha.
- se continua instalación de meson en granito nuevo lavamanos.
- Desencofre columnas de la placa estampada
- se continua instalacion de reflectores en el area del comedor.
- se continua con los resanes de estuco en muros exteriores.
- la interventoria verifica toda la ejecucion de las actividades.

Residente interventoria

CESAR ROJO
Residente obra

Fecha 30 de julio 2024 / Martes.

- El contratista inicia labores a las 7am con charla SST.
- Se continua instalacion de malla eslabonada para cerramiento de la cancha.
- se termina instalacion de meson en granito nuevo lavamanos
- se continua instalacion de reflectores en el area del comedor.
- se inicia fundida de alcorques.
- se continua con los resanes de estuco en muros exteriores.
- se inicia instalación de porticos enrollables.
- se continua replanteo de cancha polideportiva.

- La interventoria verifica toda la ejecucion de las actividades

CESARONP

Residente interventoria Residente obra

Fecha 31 de julio 2024 / Miercoles.

- La contratista inicia labores a las 7 am con charla SST.
- Se continua instalación de portones enrollables.
- Se continua replanteo de la concha.
- Se inicia Rondas de alcorques en los arboles
- Se inicia excavacion y reparación de cometa existente del colegio
- Se terminan la instalaciones electricas
- Se instalan los extractores de area en la cocina.
- La interventoria verifica toda las ejecuciones de las actividades.

CESARONP

Residente interventoria Residente obra

Fecha 01 - de agosto 2024 / jueves.

- El contratista inicia labores a las 7am con charla SST.
- Se continua instalacion de portones enrollables locales, 1 semana al cliente.
- Se termina replanteo de la concha.

- se termina fundida de alcorques.
- se realizo fundida de tapa pozo de inspeccion #2
- se continua la reparaciones de estuco y pintura.
- se realiza movimiento e instalacion final arco de futbol
- se realizan corte juntas de dilataciones pedestales.
- la interventoria verifica toda la ejecucion de las actividades.

Residente interventoria

ESTRONG
Residente obra.

Fecha 02 de agosto 2024 / viernes.

- el contratista inicia labores a las 7am con charla SST.
- Se realiza aplicación de anticorrosivo en las portones enrollables
- Se realiza armadas y fundida de tapa pozo de inspección #1
- se continua las reparaciones de estuco y pintura
- se continua pintura de columna metalicas areas comedor.
- Se continua reparación de canal de aguas lluvias contiguas al comedor.
- se inicia enchapes de baitones.
- la interventoria verifica toda la ejecucion de las actividades.

Residente interventoria

ESTRONG
Residente obra

024

Fecha 05 de agosto 2024 / Lunes

- El contratista inicio labores a las 7am con charla SST.
- Se realiza lavado y brillado de las placas pulida de concreto.
- La interventoría verifica todas las ejecuciones de las actividades

Residente interventoría

CESAR ONP
Residente obra

Fecha 06 de agosto 2024 / Martes.

- el contratista inicia labores a las 7 am con charla SST.
- se continua con los resanes de estuco y pintura
- se continua reparación de repellos con cemento.
- la interventoría verifica toda la ejecución de las actividades

Residente interventoría

CESAR ONP
Residente obra

5.4. PAGO DE PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES DE INTERVENTORÍA

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901683399	1	UT. INTERCOMEDOR ITSI	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	UNICA	CR 22 52 B 60 AP 101	BARRANCABERMEJA-SANTANDER	6555500	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-09	2024-10	988032070	9475490306	N	2024/10/23	2024/10/17	BANCO DE BOGOTA	0	$23,400

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	13749852	MACIAS RODRIGUEZ FABIO ANDRES								A				▫						230201	30	($2,000,000)	($320,000)	EPS005	30	($2,000,000)	($80,000)	CCF40	30	($2,000,000)	($80,000)	14-4	30	($2,000,000)	($139,200)	30	$0	$0	Si	($619,200)
2	CC	13749852	MACIAS RODRIGUEZ FABIO ANDRES		X						C									X	230201	30	$2,000,000	$320,000	EPS005	30	$2,000,000	$80,000	CCF40	30	$2,583,327	$103,400	14-4	30	$2,000,000	$139,200	30	$0	$0	Si	$642,600
Total	**Afiliados(1)**																						$0	$0			$0	$0			$583,327	$23,400			$0	$0		$0	$0		$23,400

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901683399	1	UT. INTERCOMEDOR ITSI	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	UNICA	CR 22 52 B 60 AP 101	BARRANCABERMEJA-SANTANDER	6555500	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-09	2024-10	988032070	9475490306	N	2024/10/23	2024/10/17	BANCO DE BOGOTA	0	$23,400

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$23,400	$0	$0	$23,400
COMFENALCO SANTANDER	CCF40	890,201,578	7	1	$23,400	$0	$0	$23,400
TOTAL				1	$23,400	$0	$0	$23,400

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901683399	1	UT. INTERCOMEDOR ITSI	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	UNICA	CR 22 52 B 60 AP 101	BARRANCABERMEJA-SANTANDER	6555500	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-09	2024-10	972452820	9474617237	E	2024/10/23	2024/10/10	BANCO DE BOGOTA	0	$852,000

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	1096241286	GENEY URIBE WILSON RAFAEL		X															X	230301	15	$650,000	$104,000	EPS037	15	$650,000	$26,000	CCF40	15	$1,435,398	$57,500	14-4	15	$650,000	$45,300	15	$0	$0	Si	$232,800
2	CC	13749852	MACIAS RODRIGUEZ FABIO ANDRES																		230201	30	$2,000,000	$320,000	EPS005	30	$2,000,000	$80,000	CCF40	30	$2,000,000	$80,000	14-4	30	$2,000,000	$139,200	30	$0	$0	Si	$619,200
Total	**Afiliados(2)**																						$2,650,000	$424,000			$2,650,000	$106,000			$3,435,398	$137,500			$2,650,000	$184,500		$0	$0		$852,000

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901683399	1	UT. INTERCOMEDOR ITSI	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	UNICA	CR 22 52 B 60 AP 101	BARRANCABERMEJA-SANTANDER	6555500	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-09	2024-10	972452820	9474617237	E	2024/10/23	2024/10/10	BANCO DE BOGOTA	0	$852,000

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)				2	$424,000	$0	$0	$424,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$104,000	$0	$0	$104,000
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$320,000	$0	$0	$320,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$184,500	$0	$0	$184,500
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	2	$184,500	$0	$0	$184,500
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$137,500	$0	$0	$137,500
COMFENALCO SANTANDER	CCF40	890,201,578	7	2	$137,500	$0	$0	$137,500
EPS (ADMINISTRADORAS: 2)				2	$106,000	$0	$0	$106,000
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$26,000	$0	$0	$26,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$80,000	$0	$0	$80,000
TOTAL				**2**	**$852,000**	**$0**	**$0**	**$852,000**

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900568048	6	FMC CONSTRUCTORES LTDA	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	FMC CONSTRUCTORES	CALLE 47 23 36 BARRANCABERMEJA	BARRANCABERMEJA-SANTANDER	6566600	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-09	2024-10	972436853	9475279829	E	2024/10/10	2024/10/10	BANCO DE BOGOTA	0	$585,000

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																		PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: FMC CONSTRUCTORES (2 Afiliados)																							$1,300,000	$208,000			$2,600,000	$104,000			$2,300,000	$92,000			$2,600,000		$181,000		$0	$0		$585,000
Centro de Trabajo: FMC CONSTRUCTORES (2 Afiliados)																							$1,300,000	$208,000			$2,600,000	$104,000			$2,300,000	$92,000			$2,600,000		$181,000		$0	$0		$585,000
Ciudad: BARRANCABERMEJA Depto: SANTANDER (2 Afiliados)																							$1,300,000	$208,000			$2,600,000	$104,000			$2,300,000	$92,000			$2,600,000		$181,000		$0	$0		$585,000
1	CC	33210596	NAVARRO VILLARRUEL MYRIAM DEL CARMEN																				0	$0	$0	MIN002	30	$1,300,000	$52,000	CCF40	30	$1,300,000	$52,000	14-4	30	$1,300,000	6.960%	$90,500	30	$0	$0	Si	$194,500
2	CC	28060888	VILLARRUEL NAVARRO LAURY XIMENA																			230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS005	30	$1,300,000	$52,000	CCF40	30	$1,000,000	$40,000	14-4	30	$1,300,000	6.960%	$90,500	30	$0	$0	Si	$390,500
Total	**Afiliados(2)**																						$1,300,000	$208,000			$2,600,000	$104,000			$2,300,000	$92,000			$2,600,000		$181,000		$0	$0		$585,000

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900568048	6	FMC CONSTRUCTORES LTDA	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	FMC CONSTRUCTORES	CALLE 47 23 36 BARRANCABERMEJA	BARRANCABERMEJA-SANTANDER	6566600	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-09	2024-10	972436853	9475279829	E	2024/10/10	2024/10/10	BANCO DE BOGOTA	0	$585,000

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$208,000	$0	$0	$208,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$208,000	$0	$0	$208,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$181,000	$0	$0	$181,000
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	2	$181,000	$0	$0	$181,000
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$92,000	$0	$0	$92,000
COMFENALCO SANTANDER	CCF40	890,201,578	7	2	$92,000	$0	$0	$92,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 2)				2	$104,000	$0	$0	$104,000
FOSYGA RÉGIMEN DE EXCEPCIÓN	MIN002	901,037,916	1	1	$52,000	$0	$0	$52,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$52,000	$0	$0	$52,000
TOTAL				2	$585,000	$0	$0	$585,000

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900568048	6	FMC CONSTRUCTORES LTDA	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	FMC CONSTRUCTORES	CALLE 47 23 36 BARRANCABERMEJA	BARRANCABERMEJA-SANTANDER	6566600	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-09	2024-10	972420727	9475279592	E	2024/10/10	2024/10/10	BANCO DE BOGOTA	0	$4,802,900

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES																	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: CONSULTORIA 023 AGUAS BCA (3 Afiliados)																						$15,105,217	$2,490,000			$15,105,217	$604,400			$16,419,951	$657,000			$15,105,217		$1,051,500		$0	$0		$4,802,900
Centro de Trabajo: CONSULTORIA 023 AGUAS BCA (3 Afiliados)																						$15,105,217	$2,490,000			$15,105,217	$604,400			$16,419,951	$657,000			$15,105,217		$1,051,500		$0	$0		$4,802,900
Ciudad: BARRANCABERMEJA Depto: SANTANDER (3 Afiliados)																						$15,105,217	$2,490,000			$15,105,217	$604,400			$16,419,951	$657,000			$15,105,217		$1,051,500		$0	$0		$4,802,900
1	CC	1102370870	GARZON MARTINEZ ANDRES CAMILO		X														X	23030 1	30	$7,281,710	$1,238,100	EPS005	30	$7,281,710	$291,300	CCF40	30	$8,596,444	$343,900	14-4	30	$7,281,710	6.960%	$506,900	30	$0	$0	Si	$2,380,200
2	CC	13570287	LUENGAS SUAREZ JHON EDINSON																	23030 1	30	$4,427,653	$708,500	EPS037	30	$4,427,653	$177,200	CCF40	30	$4,427,653	$177,200	14-4	30	$4,427,653	6.960%	$308,200	30	$0	$0	Si	$1,371,100
3	CC	37581158	TEJEDOR LAZCARRO ERLYS TATIANA									X								23020 1	30	$3,395,854	$543,400	EPS037	30	$3,395,854	$135,900	CCF40	30	$3,395,854	$135,900	14-4	30	$3,395,854	6.960%	$236,400	30	$0	$0	Si	$1,051,600
Total		**Afiliados(3)**																				$15,105,217	$2,490,000			$15,105,217	$604,400			$16,419,951	$657,000			$15,105,217		$1,051,500		$0	$0		$4,802,900

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900568048	6	FMC CONSTRUCTORES LTDA	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	FMC CONSTRUCTORES	CALLE 47 23 36 BARRANCABERMEJA	BARRANCABERMEJA-SANTANDER	6566600	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-09	2024-10	972420727	9475279592	E	2024/10/10	2024/10/10	BANCO DE BOGOTA	0	$4,802,900

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)				3	$2,490,000	$0	$0	$2,490,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	2	$1,946,600	$0	$0	$1,946,600
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$543,400	$0	$0	$543,400
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				3	$1,051,500	$0	$0	$1,051,500
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	3	$1,051,500	$0	$0	$1,051,500
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				3	$657,000	$0	$0	$657,000
COMFENALCO SANTANDER	CCF40	890,201,578	7	3	$657,000	$0	$0	$657,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 2)				3	$604,400	$0	$0	$604,400
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	2	$313,100	$0	$0	$313,100
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$291,300	$0	$0	$291,300
TOTAL				3	$4,802,900	$0	$0	$4,802,900

5.5. CORRESPONDENCIA ENVIADA POR INTERVENTORÍA Y CONTRATISTA

5.6. CERTIFICADO MANTENIMIENTO DE BATERIAS SANITARIAS

Aseos y Servicios de Colombia S.A.S.

ASEOS Y SERVICIOS DE COLOMBIA ASSEAR S.A.S
NIT. 900.346.265-5

CERTIFICA

Que prestamos el servicio de aseo y mantenimiento de baños portátiles a la empresa **WRUSSY INGENIEROS SAS** identificada con el NIT **901109885-1**, según el siguiente detalle:

Periodo de Servicio	Detalle	Cantidad de USP's	Litros vertidos
SEPTIEMBRE 2024	**BARRANCABERMEJA (SANTANDER) Y ZONAS ALEDAÑAS**	**2**	**360**

Las aguas residuales fueron el resultado del mantenimiento a **2** unidad(es) sanitaria(s) portátil(es) (USP) ubicada(s) en **INSTITUCIÓN EDUCATIVA INSTITUTO TÉCNICO SUPERIOR INDUSTRIAL** , a la(s) que se le realizaron **18** aseos durante el periodo informado, los residuos obtenidos fueron vertidos y tratados en la planta de tratamiento de la empresa **PURIFICACIÓN DE RESIDUOS ESPECIALES SAS PURIFIC**, quienes cuentan con autorización de la CAS según Resolución DGL No. 000588 de julio de 2023. Adjunto encontraran el certificado de tratamiento de residuos, la certificación emitida por **PURIFIC SAS**

Dada en Barrancabermeja a los 05 días del mes de Octubre de 2024.

DIANA CAROLINA CAMACHO GUZMÁN
Coordinador de Operaciones
ASSEAR S.A.S

La información consignada en el presente documento puede ser confirmada al teléfono 3138849291 – 3017870248 o al correo electrónico: operaciones@assear.com

OFICINA BARRANCABERMEJA
Km 1.8 Vía Retén - Aereopuerto Yariguies
Tel: 607 6 02 04 20 - 313 884 92 91

5.7. INFORME TÉCNICO DE OBRA

INFORME FINAL DE OBRA

"CONSTRUCCION Y DOTACION DEL COMEDOR Y COCINA DEL INSTITUTO TECNICO SUPERIOR INDUSTRIAL EN EL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA."



CONTRATO DE OBRA No. 0756-23

INFORME FINAL DE OBRA

PERIODO DE EJECUCIÓN

06 DE AGOSTO DE 2024 – 10 DE SEPTIEMBRE DE 2024

VERSIÓN 1

VOLUMEN 1-1

ORIGINAL

CONTENIDO

1. INTRODUCCIÓN 3
2. INFORMACION DEL PROYECTO 4
2.1. Localización del proyecto 4
2.2. Características técnicas del proyecto y alcance 5
2.3. CONTRATO SUSCRITO 6
2.3.1. Contrato de Obra No. 0756-23 6
2.3.2. Objeto del Contrato 6
2.3.3. Contratista 6
2.4. Plazo del Contrato 6
2.5. Valor de la inversión 6
3. CONTROL DE POLIZAS 7
3.1. Pólizas WRUSSY INGENIEROS SAS 7
4. CONTROL DE RECUSOS 7
4.1. Personal involucrado en el proyecto 7
4.2. RECURSO INVOLUCRADO EN EL PROYECTO 8
5. ACTIVIDADES DE ORDEN TECNICO CONTRATISTA 8
5.1. Actividades realizadas en el periodo mantenimiento 8
6. ACTIVIDADES DE ORDEN ADMINSTRATIVO 9
6.1. Contrato o modificaciones Suscritas 9
6.2. ACTIVIDADES DE ORDEN FINANCIERO 11
6.2.1. ACTAS DE RECIBO PARCIAL DE OBRA 11
6.3. ACTIVIDADES DE ORDEN JURIDICO. 11
6.3.1. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA 11
6.3.2. OTRAS ACTIVIDADES DE ORDEN JURIDICO 11
7. OBSERVACIONES Y CONCLUSIONES 11

1. INTRODUCCIÓN

La Institución educativa Instituto Técnico Superior Industrial - ITSI en el Distrito de Barrancabermeja, busca facilitar el desarrollo integral y el mejoramiento del impacto en el sistema educativo para los estudiantes de la sede principal de la institución, mediante la demolición de la actual cafetería y la construcción del área que cumpla las veces de cafetería y comedor escolar, cumpliendo con las condiciones básicas propuestas en la normativa sanitaria vigente: resolución 2674 de 2013, NTC 4595 y 4596, en las cuales se establece los requisitos y parámetros del diseño físico-espacial de nuevas instalaciones escolares, orientado a mejorar la calidad del servicio educativo, analizando los diagnósticos de infraestructura frente a la existencia, calidad y acceso a los servicios públicos y condiciones de dotación de equipos y menaje en el comedor. Todo esto con el fin de dar inclusión a la promoción y ampliación de cobertura de programas de alimentación que promueven el desarrollo cognitivo de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes en el sistema educativo oficial, para mantener sus niveles de atención, aumentar el porcentaje de permanencia escolar, promover el mejoramiento de hábitos saludables e impactar de forma positiva los procesos de aprendizaje.

Por lo anterior, se hace necesario iniciar proceso de selección de contratistas, para llevar a cabo la CONTRUCCION Y DOTACION DE COMEDOR Y COCINA DEL INSTITUTO TECNICO SUPERIOR INDUSTRIAL EN EL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA.

Es por eso por lo que se decide abrir el proceso de contratación Licitación pública LPO-015-2022, para la construcción anteriormente mencionada.

De esta rigurosa selección de proponentes, se adjudicó el contrato; a la empresa **WRUSSY INGENIEROS SAS** identificado con **NIT:901.109.885-1,** para celebrar el contrato el día 23 de febrero de 2023.

Así las cosas; y siguiendo con las exigencias de la interventoría del contrato, presentamos el informe final de obra correspondiente con fecha desde el 06 DE AGOSTO DE 2024 – 10 DE SEPTIEMBRE DE 2024, el presente informe contiene el resumen de las actividades realizadas para el desarrollo de la obra de “CONSTRUCCION Y DOTACION DEL COMEDOR Y COCINA DEL INSTITUTO TECNICO SUPERIOR INDUSTRIAL EN EL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA.", cuya oferta comercial es por valor de $3.684.062.560,88 y su culminación está prevista para el 5 de marzo de 2024.

2. INFORMACION DEL PROYECTO


2.1. Localización del proyecto

El proyecto se encuentra ubicado en Cra. 28 # 55-10, Barrancabermeja, Santander, en el INSTITUTO TECNICO SUPERIOR INDUSTRIAL (ITSI)

MICROLOCALIZACIÓN



MACROLOCALIZACIÓN

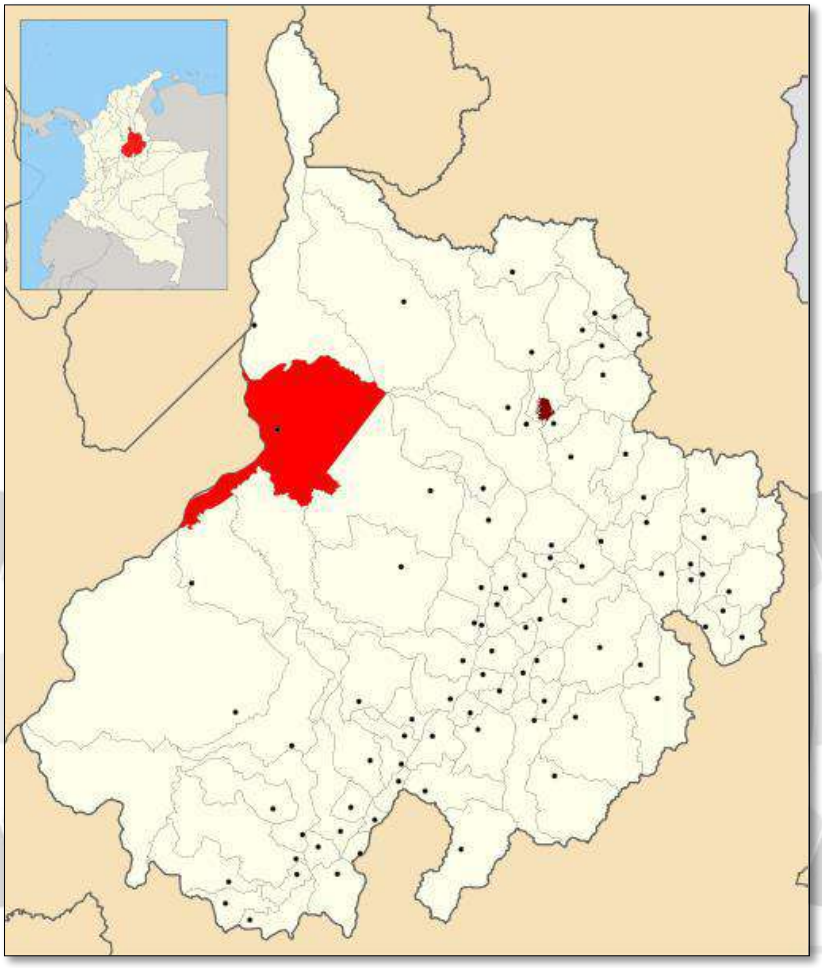

2.2. Características técnicas del proyecto y alcance

Para la ejecución del contrato 0756-23, cuyo objeto es "CONSTRUCCION Y DOTACION DEL COMEDOR Y COCINA DEL INSTITUTO TECNICO SUPERIOR INDUSTRIAL EN EL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA" se contempló construir un comedor escolar que garantice la promoción y ampliación de la cobertura de programas de alimentación escolar que promueven el desarrollo cognitivo de los niños, niñas, adolescentes pertenecientes a la sede principal del Instituto Técnico Superior Industrial – ITSI, para que, por medio del suministro de un complemento alimentario diario puedan mantener sus niveles de atención, promover el mejoramiento de hábitos saludables e impactar de forma positiva los procesos de aprendizaje. Fomentando así el derecho a la educación y asegurando las condiciones necesarias para su acceso,

permanencia y culminación del proceso educativo construir un comedor escolar que garantice la promoción y ampliación de la cobertura de programas de alimentación escolar que promueven el desarrollo cognitivo de los niños, niñas, adolescentes pertenecientes a la sede principal del Instituto Técnico Superior Industrial – ITSI para que, por medio del suministro de un complemento alimentario diario puedan mantener sus niveles de atención, promover el mejoramiento de hábitos saludables e impactar de forma positiva los procesos de aprendizaje. Fomentando así el derecho a la educación y asegurando las condiciones necesarias para su acceso, permanencia y culminación del proceso educativo.

2.3. CONTRATO SUSCRITO

2.3.1. Contrato de Obra No. 0756-23

2.3.2. Objeto del Contrato

El objeto del Contrato de Obra es: "CONSTRUCCION Y DOTACION DEL COMEDOR Y COCINA DEL INSTITUTO TECNICO SUPERIOR INDUSTRIAL EN EL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA.**"**

2.3.3. Contratista

El contratista es WRUSSY INGENIEROS S.A.S. NIT: 901.109.885-1

2.4. Plazo del Contrato

El plazo inicial para la realización del objeto del Contrato de Obra es de doce (12) meses, teniendo una fecha de inicio de 6 de marzo de 2023 y una fecha de finalización de 5 de marzo de 2024.

- Se tramito ante la secretaria de infraestructura una solicitud de adición en plazo por 30 días, la cual fue aprobada el día 28 de febrero del 2024 y empezó a regir a partir del día 5 de marzo del 2024.
- El día 4 de abril del 2024 se solicitó una adición en plazo #2 por un periodo de 30 días.
- El día 3 de mayo del 2024 se realiza suspensión del contrato de obra.
- El día 10 de mayo del 2024 se realiza una adición en plazo #3.
- El día 31 de mayo del 2024 se realiza una adición en plazo #4.

2.5. Valor de la inversión

El valor para invertir es de: TRES MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MILLONES SESENTA Y DOS MIL QUINIENTOS SESENTA PESOS CON OCHENTA Y OCHO CENTAVOS M/CTE **($ 3.684.062.560,88).**

El dia 31 de mayo del 2024 se realizó una adición en valor al contrato de obra

por un valor de MIL TRECIENTOS OCHENTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA MIL TRECIENTOS NUEVE PESOS M/CTE **($1.389.880.309,00)**

El total de la inversión es de CINCO MIL SETENTA Y TRES MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS CON OCHENTA Y OCHO CENTAVOS M/CTE **($5.073.942.869,88)**.

3. CONTROL DE POLIZAS

3.1. Pólizas WRUSSY INGENIEROS SAS

A continuación, se relaciona la información de las pólizas que amparan el Contrato

CONTRATO 0756-23

TABLA 6. POLIZAS SEGÚN FIRMA DEL CONTRATO DE OBRA

Póliza de cumplimiento	11-44-101198726		
Póliza de Resp. civil Extracontractual	11-40-101051776		
Expedida por:	SEGUROS DEL ESTADO		
Fecha de expedición:	05 de Junio de 2024		
AMPARO	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	Fecha inicial	fecha final	
Cumplimiento de Contrato	*06/03/2023*	*10/03/2025*	$1.014.788.574,00
Salarios y prestaciones sociales	*06/03/2023*	*10/09/2027*	$507.394.287,00
Estabilidad de la obra	*Si ampara 5 años, o meses y 1 días*		$1.014.788.574,00
Responsabilidad civil extracontractual	*06/03/2023*	*10/09/2024*	$520.000.000,00

4. CONTROL DE RECUSOS

4.1. Personal involucrado en el proyecto

Para el desarrollo del compromiso contractual, la empresa WRUSSY INGENIEROS SAS cuenta con el siguiente personal de apoyo profesional y operativo de obra:

TABLA No.2. PERSONAL DE APOYO PROFESIONAL Y OPERATIVO

NOMBRE DEL TRABAJADOR	CARGO DEL TRABAJADOR
Wilver Franciny Russy Ladino	Director de Obra
Cesar Orlando Narvaez Quiñonez	Residente de Obra
Carlos Alberto Oviedo Chavarro	Profesional eléctrico
Yesenia Alvarez Acosta	Profesional Social
Sandra Milena Santiago Camacho	Apoyo SST
Elkin Reyes Serrano	Ayudante de obra
Jorge Reyes Serrano	Guarda de seguridad

4.2. RECURSO INVOLUCRADO EN EL PROYECTO

Para el desarrollo del compromiso contractual, se cuenta con la siguiente maquinaria y/o equipos:

TABLA No.3. MAQUINARIA Y/O EQUIPOS

EQUIPO/HERRAMIENTA	CANTIDAD
Herramienta menor	12
Pulidora 7"	2
Vibrador de concreto	2
Motobomba	1
Camión tipo mixer	2
Bomba estacionaria	1
Rana compactadora	1
Martillo demoledor	1

5. ACTIVIDADES DE ORDEN TECNICO CONTRATISTA

5.1. Actividades realizadas en el periodo mantenimiento

A continuación, se relacionan las actividades ejecutadas en el periodo:

- Se realiza pintura e instalación de rejillas metálicas del cárcamo de la placa estampada.
- Se realiza instalación de tubería de ventilación del tanque de agua potable.
- Llegada de DECK, mesas metálicas e instalación de las mismas en el área del comedor.
- Se realiza instalación de enchape del cuarto de aseo.
- Se realiza lavado y brillado final del piso de granito blanco huila.

- Se realiza fundida de canal de agua lluvia contigua al comedor.
- Se realiza pintura de portones enrollables, tapa metálica del tanque de agua.
- Se realiza fundida de GROUTING para pedestales.
- Llegada de gasodomésticos para la cocina.
- Instalación de campana de cocina y hongo extractor.
- Se realiza pintura de alto tráfico para el cuarto de bombas.
- Se realiza instalación de estufas, mesones de trabajo, congeladores, estanterías y demás dotación del área de la cocina.
- Se realiza fundida de viga para instalación del portón del acceso principal.
- Se realiza corrección cubierta de policarbonato, canales de agua lluvia, pintura e instalación de lámina de policarbonato.
- Se realiza demolición y construcción de columnas del acceso principal.
- Terminación de pintura de portones enrollables.
- Terminación e instalación de portón acceso principal.

6. ACTIVIDADES DE ORDEN ADMINSTRATIVO

6.1. Contrato o modificaciones Suscritas

CONTRATOS Y/O MODIFICACIONES

FECHA	TIPO DE CONTRATO	CONTRATISTA
23 de febrero de 2023	CONTRATO 0756-23	WRUSSY INGENIEROS S.A.S
06 de febrero de 2023	ACTA DE INICIO	WRUSSY INGENIEROS S.A.S
28 de Agosto de 2023	ACTA DE PACTACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS #1	WRUSSY INGENIEROS S.A.S
29 de Agosto de 2023	ACTA DE MODIFICACIÓN DE AJUSTE EN MAYOR Y MENOR CANTIDAD DE OBRA Y ACTIVIDADES NO PREVISTAS #1	WRUSSY INGENIEROS S.A.S
11 de Septiembre de 2023	ACTA PARCIAL No.1	WRUSSY INGENIEROS S.A.S
13 de Septiembre del 2023	ACTA ACLARATORIA N°1 AL ACTA DE RECIBO PARCIAL No.1	WRUSSY INGENIEROS S.A.S
21 de Septiembre del 2023	ACTA ACLARATORIA N°2 AL ACTA DE RECIBO PARCIAL No.1	WRUSSY INGENIEROS S.A.S
24 de Octubre del 2023	ACTA PARCIAL No.2	WRUSSY INGENIEROS S.A.S
27 de Octubre del 2023	ACTA ACLARATORIA N°1 AL ACTA DE RECIBO PARCIAL No.2	WRUSSY INGENIEROS S.A.S
19 de Diciembre del 2023	ACTA PARCIAL No.3	WRUSSY INGENIEROS S.A.S
20 de Diciembre del 2023	ACTA ACLARATORIA N°1 AL ACTA DE RECIBO PARCIAL No.3	WRUSSY INGENIEROS S.A.S
26 de Diciembre del 2022	ACTA DE PACTACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS No.02	WRUSSY INGENIEROS S.A.S

27 de Diciembre del 2023	ACTA DE MODIFICACIÓN DE AJUSTE EN MAYOR Y MENOR CANTIDAD DE OBRA Y ACTIVIDADES NO PREVISTAS #2	WRUSSY INGENIEROS S.A.S
15 de Febrero del 2024	ACTA DE MODIFICACIÓN DE AJUSTE EN MAYOR Y MENOR CANTIDAD DE OBRA Y ACTIVIDADES NO PREVISTAS #3	WRUSSY INGENIEROS S.A.S
28 de Febrero del 2024	ADICIONAL No.01 EN PLAZO EN PLAZO AL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No.0756-23	WRUSSY INGENIEROS S.A.S
15 de Marzo del 2024	ACTA PARCIAL Nº4	WRUSSY INGENIEROS S.A.S
04 de Abril del 2024	ADICIONAL No.02 EN PLAZO EN PLAZO AL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No.0756-23	WRUSSY INGENIEROS S.A.S
03 de Mayo del 2024	ACTA DE SUSPENSIÓN No.1 AL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA 0756-23	WRUSSY INGENIEROS S.A.S
08 de Mayo del 2024	ACTA DE REINICIO AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA 0756-23	WRUSSY INGENIEROS S.A.S
10 de Mayo del 2024	ADICIONAL No.03 EN PLAZO EN PLAZO AL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No.0756-23	WRUSSY INGENIEROS S.A.S
31 de Mayo del 2024	ADICIONAL No.04 EN PLAZO Y EN VALOR Nº1 AL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No.0756-23	WRUSSY INGENIEROS S.A.S
23 de Julio del 2024	ACTA DE PACTACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTO No.3	WRUSSY INGENIEROS S.A.S
24 de Julio del 2024	ACTA DE MODIFICACIÓN DE AJUSTE EN MAYOR Y MENOR CANTIDAD DE OBRA Y ACTIVIDADES NO PREVISTAS No.4	WRUSSY INGENIEROS S.A.S
21 de Agosto del 2024	ACTA PARCIAL No.5	WRUSSY INGENIEROS S.A.S
27 de Agosto del 2024	ACTA ACLARATORIA No.1 AL ACTA DE RECIBO PARCIAL No.5 AL CONTRATO DE OBRA 0756-23	WRUSSY INGENIEROS S.A.S
27 de Agosto del 2024	ACTA ACLARATORIA No.1 AL ACTA DE REINICIO No.1 AL CONTRATO DE OBRA 0756-23	WRUSSY INGENIEROS S.A.S
27 de Agosto del 2024	OTROSÍ ACLARATORIO No.1 AL ADICIONAL No.4 EN PLAZO Y No.1 EN VALOR AL CONTRATO DE OBRA 0756-23	WRUSSY INGENIEROS S.A.S
03 de Septiembre del 2024	ACTA DE MODIFICACIÓN DE AJUSTE EN MAYOR Y MENOR CANTIDAD DE OBRA Y ACTIVIDADES NO PREVISTAS No.5	WRUSSY INGENIEROS S.A.S
06 de Septiembre del 2024	ACTA PARCIAL No.6	WRUSSY INGENIEROS S.A.S
10 de Septiembre del 2024	ACTA ACLARATORIA No.1 AL ACTA DE RECIBO PARCIAL No.6 AL CONTRATO DE OBRA 0756-23	WRUSSY INGENIEROS S.A.S

6.2. ACTIVIDADES DE ORDEN FINANCIERO

6.2.1. ACTAS DE RECIBO PARCIAL DE OBRA

En el periodo que comprende este informe se tramitó el acta de recibo parcial No.5 el día 21 de agosto del 2024 y acta de recibo parcial No.6 el día 06 de Septiembre del 2024.

6.3. ACTIVIDADES DE ORDEN JURIDICO.

6.3.1. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA.

En el periodo de tiempo que comprende este informe, se tramitó el acta de modificación de ajuste en mayor y menor cantidad de obra No.5 el 03 de septiembre del 2024.

6.3.2. OTRAS ACTIVIDADES DE ORDEN JURIDICO

En el periodo de tiempo que comprende este informe, no se realizaron actividades de orden jurídico.

7. OBSERVACIONES Y CONCLUSIONES

- Durante el periodo de tiempo comprendido en este informe se hace la debida instalación de gasodomésticos, congeladores, campana extractora, hongo extractor y la dotación comprendida en el contrato.
- De igual manera se realiza la instalación de mesones de trabajo, mesones tipo islas, mesas optimas con poceta y estantes en acero inoxidable.
- Se realiza la instalación de los 34 pares de mesas en el área del comedor, de igual manera se realiza la instalación del pasamanos en acero inoxidable, instalación de lámina de policarbonato en el área de locales y acceso a la cocina.
- Se da por concluido la fabricación e instalación del portón especial en lamina microperforada, con sus respectivas columnas y viga de soporte. Por solicitud de la institución y los padres de familia, se instala lamina galvanizada por motivos de seguridad e impedir la visibilidad hacia el interior de la institución.

ING.WILVER FRANCINY RUSSY LADINO
Representante Legal
WRUSSY INGENIEROS SAS NIT:901.109.885-1

5.8. PAGO DE PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES DEL CONTRATISTA

061

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	901109885-1	WRUSSY INGENIEROS SAS		CALE 8 F N 79 94	4111513	INGWILVER@HOTMAIL.COM
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
SUCURSAL	C – MIPYME	USPEC IND	USPEC IND	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	

EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					2	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-07	2024-07	Y	21/08/2024	79560413	$181.000	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																		PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	79650148	OVIEDO CHAVARRO CARLOS ALBERTO	59	0			N																		0	0	0	0	0	0		0	0	14-11	1.300.000	5	90.500		0	0	0	0	0	0	0	0
2	CC	79654153	RIVERA REVOLLO JUAN CARLOS	59	0			N																		0	0	0	0	0	0		0	0	14-11	1.300.000	5	90.500		0	0	0	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901109885-1	WRUSSY INGENIEROS SAS		CALE 8 F N 79 94	4111513	INGWILVER@HOTMAIL.COM	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
SUCURSAL	C – MIPYME	INDEPENDIENTE	15	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-07	2024-07	Y	21/08/2024	79560407	$194.900	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-11	ARL SURA	890903790-5	194.900				194.900	0	0	194.900			1.949	194.900	1

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	0	0	0
Pensión	0	0	0
Riesgos Laborales	1	194.900	194.900
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	1	194.900	194.900

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

062

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	901109885-1	WRUSSY INGENIEROS SAS		CALE 8 F N 79 94	4111513	INGWILVER@HOTMAIL.COM
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
SUCURSAL	C – MIPYME	INDEPENDIENTE	15	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	

EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-07	2024-07	Y	21/08/2024	79560407	$194.900	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																				PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES					
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	80212380	RUSSY LADINO WILVER FRANCINY	59	0			N																		0	0	0	0	0			0	0	14-11	2.800.000	5	194.900		0	0	0	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901109885-1	WRUSSY INGENIEROS SAS	CALE 8 F N 79 94	4111513	INGWILVER@HOTMAIL.COM	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
SUCURSAL	C – MIPYME	Barranca / Barranca	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					3	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-08	2024-07	E	21/08/2024	79560663	$2.123.100	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS002	Salud Total EPS	800130907-4	52.000	0		0		0	0	0	0	52.000	1
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	87.200	0		0		0	0	0	0	87.200	1
EPS010	EPS Sura	800088702-2	135.100	0		0		0	0	0	0	135.100	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	540.300	0	0	0	0	0	0		540.300	1
230301	Porvenir	800224808-8	556.800	0	0	0	0	0	0		556.800	2

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-11	ARL SURA	890903790-5	477.400				477.400	0	0	477.400			4.774	477.400	3

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF38	Cafaba	890270275-5	274.300	0	0	274.300	3

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	3	274.300	274.300
Pensión	2	1.097.100	1.097.100
Riesgos Laborales	1	477.400	477.400
CCF	1	274.300	274.300
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	7	2.123.100	2.123.100

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

063

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	901109885-1	WRUSSY INGENIEROS SAS		CALE 8 F N 79 94	4111513	INGWILVER@HOTMAIL.COM
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
SUCURSAL	C – MIPYME	Barranca	Barranca	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	

EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					3	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-08	2024-07	E	21/08/2024	79560663	$2.123.100	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1096226349	ALVAREZ MORALES YESENIA	1	0			S																	230301	1.300.000	208.000	0	0	0	0	EPS002	1.300.000	52.000	14-11	1.300.000	5	90.500	CCF38	1.300.000	52.000	0	0	0	0	0
2	CC	1098754093	NARVAEZ QUIÑONEZ CESAR ORLANDO	1	0			S								X								230201	3.376.714	540.300	0	0	0	0	EPS010	3.376.714	135.100	14-11	3.376.714	5	235.100	CCF38	3.376.714	135.100	0	0	0	0	0
3	CC	37712004	SANTIAGO CAMACHO SANDRA MILENA	1	0			S																	230301	2.180.000	348.800	0	0	0	0	EPS005	2.180.000	87.200	14-11	2.180.000	5	151.800	CCF38	2.180.000	87.200	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	80212380-5	WILVER FRANCINY RUSSY LADINO	Clle 11 B Bis A Num 78 23	4115589	ingwilver@hotmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
SUCURSAL	A – Más de 200 cot	Barranca / Barranca	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					3	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-08	2024-07	E	22/08/2024	79632406	$1.667.900	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS002	Salud Total EPS	800130907-4	118.600	0		0		0	1	100	0	118.700	1
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	84.500	0		0		0	1	100	0	84.600	1
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	12.200	0		0		0	1	100	0	12.300	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	337.700	0	0	0	0	1	300	0	338.000	1
231001	Colfondos	800227940-6	48.600	0	0	0	0	1	100	0	48.700	1
25-14	Colpensiones	900336004-7	474.400	0	0	0	0	1	400	0	474.800	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-11	ARL SURA	890903790-5	374.500				374.500	1	300	374.800			3.745	374.800	3

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF38	Cafaba	890270275-5	215.800	1	200	216.000	3

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	1	0	0	0
ICBF				
0	1	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	3	215.300	215.600
Pensión	3	860.700	861.500
Riesgos Laborales	1	374.500	374.800
CCF	1	215.800	216.000
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	8	1.666.300	1.667.900

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

064

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	80212380-5	WILVER FRANCINY RUSSY LADINO		Clle 11 B Bis A Num 78 23	4115589	ingwilver@hotmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
SUCURSAL	A – Más de 200 cot	Barranca	Barranca	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	

EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					3	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-08	2024-07	E	22/08/2024	79632406	$1.667.900	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES														PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1096218748	REYES SERRANO ELKIN FERNANDO	1	0			S								X								230201	2.110.356	337.700	0	0	0	0	EPS005	2.110.356	84.500	14-11	2.110.356	5	146.900	CCF38	2.110.356	84.500	0	0	0	0	0
2	CC	74755325	TORRES BERDUGO JOSE RAFAEL	1	0			S	X	X														231001	303.334	48.600	0	0	0	0	EPS037	303.334	12.200	14-11	303.334	5	21.200	CCF38	315.901	12.700	0	0	0	0	0
3	CC	91443395	REYES SERRANO JORGE	1	0			S								X								25-14	2.964.432	474.400	0	0	0	0	EPS002	2.964.432	118.600	14-11	2.964.432	5	206.400	CCF38	2.964.432	118.600	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	79650148
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			CARLOS ALBERTO OVIEDO CHAVARRO
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	DEPARTAMENTO:	BOGOTA - DISTRITO CAPITAL
DIRECCIÓN:	CL 8F #79-94	TELÉFONO:	4111513
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Comercio al por mayor de computadores, equipo per
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	**7933280203**	TIPO DE PLANILLA:	I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES julio AÑO 2024	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES julio AÑO 2024
DÍAS DE MORA:	1		
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2024/08/14	NÚMERO AUTORIZACIÓN:	843240385

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
25-14	25-14 COLPENSIONES	1	$ 208.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 200	$ 0	$ 208.000	$ 200	$ 208.200
SUBTOTALES:										**$ 208.000**	**$ 200**	**$ 208.200**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS001	EPS001-ALIANSALUD S.A.	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 162.500	$ 0	$ 200	$ 0	$ 162.500	$ 200	$ 0	$ 162.700
SUBTOTALES:													**$ 162.500**	**$ 200**	**$ 0**	**$ 162.700**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES																SEGURIDAD SOCIAL																												PARAFISCALES						
																										PENSIÓN										SALUD							ARP																		

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	901109885-1	WRUSSY INGENIEROS SAS		CALE 8 F N 79 94	4111513	INGWILVER@HOTMAIL.COM
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
SUCURSAL	C – MIPYME	RIESGO 5	12	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	

EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					2	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-08	2024-07	E	21/08/2024	79528465	$2.303.000	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	177.600	0		0		0	0	0	0	177.600	1
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	120.000	0		0		0	0	0	0	120.000	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	480.000	0	0	0	0	0	0		480.000	1
230301	Porvenir	800224808-8	710.100	0	0	0	0	0	0		710.100	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-11	ARL SURA	890903790-5	517.700				517.700	0	0	517.700			5.177	517.700	2

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF24	Compensar Caja	860066942-7	297.600	0	0	297.600	2

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	2	297.600	297.600
Pensión	2	1.190.100	1.190.100
Riesgos Laborales	1	517.700	517.700
CCF	1	297.600	297.600
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	6	2.303.000	2.303.000

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	901109885-1	WRUSSY INGENIEROS SAS		CALE 8 F N 79 94	4111513	INGWILVER@HOTMAIL.COM
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
SUCURSAL	C – MIPYME	RIESGO 5	12	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	

EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					2	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-08	2024-07	E	21/08/2024	79528465	$2.303.000	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																		PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1057588784	SALAMANCA ROJAS KAREN LISSETH	1	0			S																	230301	4.437.580	710.100	0	0	0	0	EPS005	4.437.580	177.600	14-11	4.437.580	5	308.900	CCF24	4.437.580	177.600	0	0	0	0	0
2	CC	1049650740	ROMERO SUESCA DANIEL SANTIAGO	1	0			S																	230201	3.000.000	480.000	0	0	0	0	EPS037	3.000.000	120.000	14-11	3.000.000	5	208.800	CCF24	3.000.000	120.000	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

ASOPAGOS s.a.

RAZÓN SOCIAL :	YURY YOHANA SUAREZ GUERRERO
IDENTIFICACIÓN:	CC-1015409649
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2024-08-27
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2024-08-13
FECHA DE PAGO:	2024-08-12
ENTIDAD DE PAGO:	BANCOLOMBIA
PERÍODO PENSIÓN:	2024-07
PERÍODO SALUD:	2024-07
NÚMERO PLANILLA:	30422915
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	30422915
TIPO DE PLANILLA:	I

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS010	800088702	EPS SURA	1	$ 2.000.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 250.000	$ 250.000
230301	800224808	PORVENIR	1	$ 2.000.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 320.000	$ 320.000
14-11	890903790	ARL SURA	1	$ 2.000.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 10.500	$ 10.500
CCF22	860007336	COLSUBSIDIO	1	$ 2.000.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 40.000	$ 40.000
				Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 0	$ 620.500	$ 620.500

PAGADO

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	11/09/2024

5.9. INFORME HSE DE OBRA

RUSSY INGENIEROS S.A.S. Nit. 901.109.885-1	**INFORME MENSUAL**


INFORME SST 18

PERIODO: 06 AGOSTO 2024 - 10 SEPTIEMBRE 2024

DISTRITO DE BARRANCABERMEJA

RUSSY INGENIEROS S.A.S. Nit. 901.109.885-1	**INFORME MENSUAL**

Elaboró:



KAREN SALAMANCA ROJAS
WRUSSY INGENIEROS SAS

Revisó y Aprobó:



WILVER FRANCINY RUSSY LADINO
WRUSSY INGENIEROS SAS

RUSSY INGENIEROS S.A.S. Nit. 901.109.885-1	INFORME MENSUAL

CONTENIDO

1. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO. 4
   1.1. INFORMACIÓN DEL CONTRATISTA 4
2. COMPONENTE DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO Y PLAN DE CONTINGENCIAS. 4
   2.1. PROGRAMA D1: SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO. 4
      2.1.1. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 5
      2.1.2. SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 7
   2.2. PROGRAMA DE HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL 11
      2.2.1. PROCEDIMIENTOS DE ALTO RIESGO 11
      2.2.2. INSPECCIONES 12
      2.2.3. ACCIDENTALIDAD 12
      2.2.4. BRIGADAS DE EMERGENCIAS 12
      2.2.5. INDICADORES 12
3. REPORTE DE CUMPLIMIENTO PROTOCOLO COVID-19 17
4. CONCLUSIONES 18

LISTA DE ILUSTRACIONES

lustración 1. Ubicación del proyecto. Google maps. 4


LISTADO DE TABLAS

Tabla 1. Personal 5
Tabla 2. Programación Charlas 9
Tabla 3. Programación Pausas activas 10
Tabla 4. COPASST 10
Tabla 5. CCL 11
Tabla 6. Permisos de trabajo 11
Tabla 7. Programación inspecciones 12
Tabla 8. Brigada de emergencias 12

1. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO.

El proyecto se ejecutará en la ciudad de Barrancabermeja en la dirección Cra. 28 # 55-10, como se evidencia en la ilustración N 1.

lustración 1. Ubicación del proyecto. Google maps.

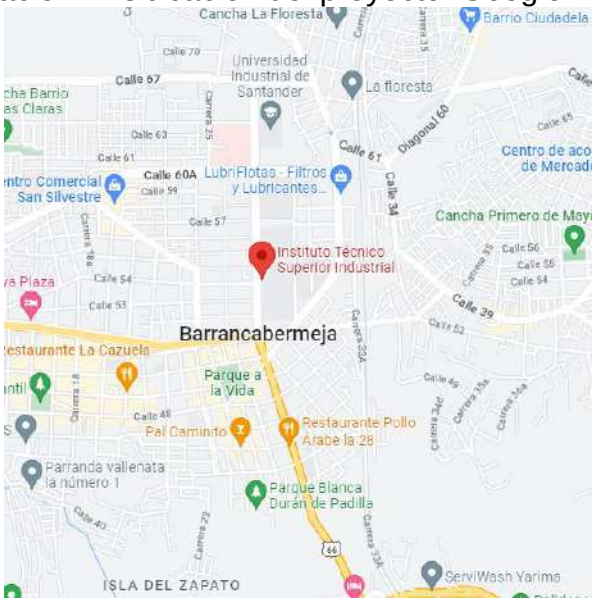

Fuente: https://www.google.com/maps/

1.1. INFORMACIÓN DEL CONTRATISTA

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: WILVER FRANCINY RUSSY LADINO
CORREO ELECTRÓNICO: proyectos@wrussyingenieros.com
OFICINA: DIRECCIÓN: Calle 8f # 79- 94 Bogotá D.C.
Contrato de Obra No. 0756-23
Objeto: CONSTRUCCION Y DOTACION DEL COMEDOR Y COCINA DEL INSTITUTO TECNICO SUPERIOR INDUSTRIAL EN EL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA

2. COMPONENTE DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO Y PLAN DE CONTINGENCIAS.

2.1. PROGRAMA DE: SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.

Este capítulo, está enmarcado al contexto del contrato **No. 0756-23** evidenciando las actividades ejecutadas de Seguridad y Salud en el Trabajo, derivados del desarrollo de los trabajos en obra, de igual forma, dando cumplimiento a los parámetros de seguridad y salud en el trabajo establecidos en el contrato.

RUSSY INGENIEROS S.A.S. Nit. 901.109.885-1	**INFORME MENSUAL**

La empresa **WRUSSY INGENIEROS SAS** realizó todas las actividades que se establecieron en el cronograma en el periodo comprendido del **06 de agosto 2024 al 11 septiembre de 2024**, entre las actividades realizadas se encuentran las siguientes: (identificación de riesgos en el centro de trabajo mediante la matriz de identificación de peligros, inspecciones de seguridad, inspección de orden y aseo, entrega de elementos de protección personal, charlas, pausas activas, capacitaciones, entre otras).

Dando cumplimiento al contrato en mención a continuación se relacionan todas las actividades que se han realizado en materia de seguridad y salud en el trabajo.

2.1.1. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

2.1.1.1. INFORMACIÓN CONTRACTUAL PERSONAL MÍNIMO

Personal para la ejecución del contrato No. 0756-23

En la tabla 1, se relaciona el personal que ejecutó actividades durante el periodo **06 de agosto 2024 al 11 septiembre de 2024** del cual hicieron parte: técnicos, profesionales, tecnólogos, ayudantes que realizaron labores dentro del contrato No. 0756-23.

Tabla 1. Personal

DATOS PERSONALES					
NOMBRE Y APELLIDOS	**CEDULA**	**CARGO**	**FECHA DE INGRESO**	**FECHA DE EGRESO**	**ESTADO**
WILVER RUSSY LADINO	80.212.380	DIRECTOR DE OBRA	6/03/2023	15/09/2024	**INACTIVO**
KAREN SALAMANCA ROJAS	1.057.588.784	RESIDENTE HSEQ	06/03/2023	15/09/2024	**INACTIVO**
CESAR ORLANDO NARVAEZ QUIÑONEZ	1,098,754,093	RESIDENTE DE OBRA	09/03/2023	15/09/2024	**INACTIVO**
SANDRA MILENA SANTIAGO CAMACHO	37,712,004	INSPECTOR HSE	15/03/2023	15/09/2024	**INACTIVO**
YESENIA ALVAREZ MORALES	1,096,226,349	PROFESIONAL SOCIAL	09/03/2023	06/09/2024	**INACTIVO**
ANTONIO JOSE CARVALLIDO CARPIO	1,096,242,479	AYUDANTE DE OBRA	6/03/2023	23/03/2024	**INACTIVO**

HECTOR JULIO ESCOBAR SAAVEDRA	91,425,553	AYUDANTE DE OBRA	6/03/2023	31/01/2024	**INACTIVO**
ALVEIRO CARPIO PEÑALOZA	1,042,211,689	AYUDANTE DE OBRA	6/03/2023	31/01/2024	**INACTIVO**
ELVIS CARPIO PEÑALOZA	1,096,212,001	AYUDANTE DE OBRA	7/03/2023	27/032024	**INACTIVO**
ALEXANDER JIMENEZ SANTAMARIA	13,565,252	AYUDANTE DE OBRA	7/03/2023	29/02/2024	**INACTIVO**
ALFONSO VERGARA	78.323.568	MAESTRO DE OBRA	23/05/2023	30/11/2023	**INACTIVO**
BRAYAN COSSIO	1.042.214.936	AYUDANTE DE OBRA	05/06/2023	30/12/2023	**INACTIVO**
CARLOS RODRIGUEZ	1.096.204.338	AYUDANTE DE OBRA	26/05/2023	26/11/2023	**INACTIVO**
DOMINGO MORA	13.568.501	AYUDANTE DE OBRA	05/06/2023	31/01/2024	**INACTIVO**
ELKIN REYES	1.096.218.748	AYUDANTE DE OBRA	26/05/2023	15/09/2024	**INACTIVO**
GUSTAVO BUITRAGO	1.005.179.912	AYUDANTE DE OBRA	26/05/2023	01/07/2023	**INACTIVO**
ISNARDO DE JESUS MORENO	1.096.248.874	AYUDANTE DE OBRA	05/06/2023	15/09/2023	**INACTIVO**
JAIR CARPIO	1.096.253.724	AYUDANTE DE OBRA	05/06/2023	30/12/2023	**INACTIVO**
KEVIN ORTEGA	1.007.775.962	AYUDANTE DE OBRA	05/06/2023	30/12/2023	**INACTIVO**
SIGILFREDO MENDEZ	13.569.557	OFICIAL DE OBRA	26/05/2023	09/12/2023	**INACTIVO**
ABELINO HOMERO MUÑOZ LOPEZ	94.265.684	OFICIAL DE OBRA	27/06/2023	29/02/2024	**INACTIVO**
MARIO FONTALVO PEREZ	8.572.679	AYUDANTE DE OBRA	05/07/2023	30/11/2023	**INACTIVO**
DEIBY CARPIO AGUDELO	1.001.814.868	AYUDANTE DE OBRA	16/08/2023	29/02/2024	**INACTIVO**
JOSE ANGEL PEÑALOZA LARIOS	1.050.918.199	AYUDANTE DE OBRA	16/08/2023	30/12/2023	**INACTIVO**
WILMAR ORTIZ MENDOZA	79.392.925	OFICIAL DE OBRA	16/08/2023	30/09/2023	**INACTIVO**
MANUEL ARTURO BANDERA	12.400.740	AYUDANTE DE OBRA	19/09/2023	30/11/2023	**INACTIVO**
JUAN MIGUEL PEREZ FERRER	8.572.227	AYUDANTE DE OBRA	19/09/2023	30/11/2023	**INACTIVO**
ANDRES APONTE BERGAÑO	1.016.093.871	INSTALADOR	26/09/2023	25/11/2023	**INACTIVO**

EDILBERTO LERMA SOTO	1.014.265.807	INSTALADOR	26/09/2023	25/11/2023	**INACTIVO**
RONNY REYES CISNEROS	1.235.891	INSTALADOR	26/09/2023	25/11/2023	**INACTIVO**
ALEXANDE ESCOBAR GUEVARA	77.159.168	INSTALADOR	21/10/2023	25/11/2023	**INACTIVO**
JUAN MANUEL HERAS DE LA HOZ	1.083.435.187	INSTALADOR	20/10/2023	25/11/2023	**INACTIVO**
YERSON MARTINEZ	88.217.901	VIGILANTE	20/11/2023	30/05/2024	**INACTIVO**
ANGEL GOMEZ	1.002.322.043	INSTALADOR	02/01/2024	15/09/2024	**INACTIVO**
CESAR CASTILLO	1.096.250.390	MAMPOSTERO	18/12/2023	31/12/2023	**INACTIVO**
EDGAR POLO	1.126.255.189	INSTALADOR	02/01/2024	15/09/2024	**INACTIVO**
JAVIER ESPITIA	80.282.429	ARQUITECTO	02/01/2024	15/09/2024	**INACTIVO**
JHON ZAMORA	1.096.228.666	MAMPOSTERO	18/12/2023	31/12/2023	**INACTIVO**
LUIS LIZCANO	3.132.569	INSTALADOR	02/01/2024	15/09/2024	**INACTIVO**
WILLINTON ORTIZ	91.443.547	MAMPOSTERO	18/12/2023	31/12/2023	**INACTIVO**
YEISON NAVARRO	1.128.047.356	MAMPOSTERO	18/12/2023	31/12/2023	**INACTIVO**
ANTONIO GUIO	80.770.814	DISPROARQ	24/01/2024	06/02/2024	**INACTIVO**
DANILO NOVA FORERO	1.005.179.957	GAS LOGISTICA DE LA NACIÓN	19/01/2024	15/09/2024	**INACTIVO**
DAVID ZAMBRANO	9.142.543	ENCHAPES	31/01/2024	15/09/2024	**INACTIVO**
DIOMEDES GARCIA	7.997.109	ENCHAPES	01/02/2024	15/09/2024	**INACTIVO**
EDWARD SARMIENTO	1.018.498.751	DISPROARQ	24/01/2024	06/02/2024	**INACTIVO**
EDWIN TILANO	91.443.072	ENCHAPES	31/01/2024	15/09/2024	**INACTIVO**
HECTOR ACOSTA	8.695.125	SOLDADOR	11/01/2024	20/01/2024	**INACTIVO**
JORGE REYES SERRANO	91.443.395	VIGILANTE	31/05/2024	15/09/2024	**INACTIVO**

2.1.2. SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

A continuación, presentamos la gestión de seguridad y salud en el trabajo que se llevó a cabo en la ejecución del contrato entre el periodo **06 de agosto 2024 al 11 septiembre de 2024.**

2.1.2.1. INDUCCIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Se realizó inducción de seguridad y salud en el trabajo donde se explicó al personal los siguientes temas:

- ✓ Entrega de la funciones y responsabilidades del cargo a desempeñar
- ✓ Bases del SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL.
- ✓ AFP-EPS-ARL-CCF

- ✓ Conceptos básicos de SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO, (SG SST)
- ✓ Se da a conocer a los trabajadores, los riesgos a los cuales están expuestos en sus labores diarias.
- ✓ Riesgo Biomecánico: manipulación de cargas, esfuerzo, movimiento repetitivo.
- ✓ Riesgo físico: ruido, vibración, iluminación.
- ✓ Riesgo químico: líquidos (nieblas y humos) polvos orgánicos e inorgánicos.
- ✓ Riesgo mecánico: peligro de Izaje y cargas suspendidas, peligro de proyección de partículas.
- ✓ Formato de reporte de actos y condiciones inseguras.
- ✓ Procedimiento reporte de accidente de trabajo.
- ✓ RIT (Reglamento Interno de Trabajo)
  - Son obligaciones especiales del trabajador
  - Son obligaciones de los trabajadores con el uso de EPP del SG SST
  - Prohibiciones de los trabajadores
- ✓ Política de Seguridad y salud en el trabajo y reglamento de higiene y seguridad industrial.
- ✓ PTS (procedimientos seguros) para tareas de alto riesgo.
- ✓ Que es el comité de convivencia laboral
- ✓ Que el COPASST

Para constancia de la inducción se anexan los siguientes registros:

ANEXO 1: Entrega individual EPP

2.1.2.2. DOCUMENTACION Y PLANILLAS DE SEGURIDAD SOCIAL

La documentación del personal que ejecuto actividades dentro del **06 de agosto 2024 al 11 septiembre de 2024** y las planillas de seguridad social se encuentran en el **ANEXO 2.**

2.1.2.3. CHARLAS DE SEGURIDAD

Las charlas de 5 minutos se realizaron antes de iniciar la jornada laboral, estas se realizan el objetivo de informar y sensibilizar a los trabajadores sobre su seguridad y salud en las actividades que ejecutan diariamente. En el periodo del **06 de agosto 2024 al 11 septiembre de 2024**, se programaron 25 charlas y se ejecutaron 25, cumpliendo con un porcentaje del **100 %.**

Tabla 2. Programación Charlas

PROGRAMACIÓN CHARLAS DE SEGURIDAD					
Fecha Programada	**Fecha Ejecutada**	**Cumple/No cumple**	**TEMA**	**Ejecutadas**	**% Cumplimiento**
06/08/2024	06/08/2024	CUMPLE	Estrés	1	100%
08/08/2024	08/08/2024	CUMPLE	Cuidado del equipo de protección personal	1	100%
09/08/2024	09/08/2024	CUMPLE	Uso adecuado de maquinaria	1	100%
10/08/2024	10/08/2024	CUMPLE	Objetos que caen	1	100%
13/08/2024	13/08/2024	CUMPLE	Caídas, resbalones en terrenos irregulares	1	100%
14/08/2024	14/08/2024	CUMPLE	Orden y aseo	1	100%
16/08/2024	16/08/2024	CUMPLE	Calentamiento global	1	100%
17/08/2024	17/08/2024	CUMPLE	Manejo de herramientas	1	100%
20/08/2024	20/08/2024	CUMPLE	Comunicación Asertiva	1	100%
21/08/2024	21/08/2024	CUMPLE	Identificador de peligros	1	100%
22/08/2024	22/08/2024	CUMPLE	Días de Lluvia	1	100%
23/08/2024	23/08/2024	CUMPLE	Recomendaciones para evitar accidentes	1	100%
26/08/2024	26/08/2024	CUMPLE	Estrés Laboral	1	100%
29/08/2024	29/08/2024	CUMPLE	La unión hace la fuerza	1	100%
30/08/2024	30/08/2024	CUMPLE	Uso de protección respiratoria	1	100%
31/08/2024	31/08/2024	CUMPLE	Peligros en la conducción	1	100%
02/09/2024	02/09/2024	CUMPLE	Cargas suspendidas e Izaje	1	100%
03/09/2024	03/09/2024	CUMPLE	Barandas y protecciones	1	100%
04/09/2024	04/09/2024	CUMPLE	Identificación de peligros	1	100%
05/09/2024	05/09/2024	CUMPLE	Que es un sistema para detección de caídas	1	100%
06/09/2024	06/09/2024	CUMPLE	Línea de Fuego	1	100%
07/09/2024	07/09/2024	CUMPLE	Protección ocular cuidado de la vista	1	100%
09/09/2024	09/09/2024	CUMPLE	Tableros eléctricos	1	100%
10/09/2024	10/09/2024	CUMPLE	Autocuidado, buena actitud	1	100%
11/09/2024	11/09/2024	CUMPLE	Ergonomia	1	100%
				25	**100 %**

ANEXO 3: Asistencia charlas de seguridad

2.1.2.4. PAUSAS ACTIVAS

Se realizaron las pausas activas durante la jornada laboral con el fin de revitalizar la energía corporal y refrescar la mente de los trabajadores. De acuerdo con el plan de trabajo se tiene programado que las pausas activas se deben realizar todos los

días laborales, donde en periodo se ejecutaron 25 pausas activas teniendo un porcentaje de cumplimiento del **100%.**

Tabla 3. Programación Pausas activas

Fecha Programada	Fecha Ejecutada	Cumple/No cumple	Ejecutadas	% Cumplimiento
06/08/2024	06/08/2024	CUMPLE	1	100%
08/08/2024	08/08/2024	CUMPLE	1	100%
09/08/2024	09/08/2024	CUMPLE	1	100%
10/08/2024	10/08/2024	CUMPLE	1	100%
13/08/2024	13/08/2024	CUMPLE	1	100%
14/08/2024	14/08/2024	CUMPLE	1	100%
16/08/2024	16/08/2024	CUMPLE	1	100%
17/08/2024	17/08/2024	CUMPLE	1	100%
20/08/2024	20/08/2024	CUMPLE	1	100%
21/08/2024	21/08/2024	CUMPLE	1	100%
22/08/2024	22/08/2024	CUMPLE	1	100%
23/08/2024	23/08/2024	CUMPLE	1	100%
26/08/2024	26/08/2024	CUMPLE	1	100%
29/08/2024	29/08/2024	CUMPLE	1	100%
30/08/2024	30/08/2024	CUMPLE	1	100%
31/08/2024	31/08/2024	CUMPLE	1	100%
02/09/2024	02/09/2024	CUMPLE	1	100%
03/09/2024	03/09/2024	CUMPLE	1	100%
04/09/2024	04/09/2024	CUMPLE	1	100%
05/09/2024	05/09/2024	CUMPLE	1	100%
06/09/2024	06/09/2024	CUMPLE	1	100%
07/09/2024	07/09/2024	CUMPLE	1	100%
09/09/2024	09/09/2024	CUMPLE	1	100%
10/09/2024	10/09/2024	CUMPLE	1	100%
11/09/2024	11/09/2024	CUMPLE	1	100%
			25	**100 %**

ANEXO 4: Asistencia Pausas Activas

2.1.2.5. COMITÉ PARITARIO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Se realizó reunión del comité paritario de seguridad y salud en el trabajo, cumpliendo con lo establecido en la normatividad legal vigente, se adjunta acta de reunión del vigía de seguridad y salud en el trabajo.

Tabla 4. COPASST

FECHA	TEMAS TRATADOS
21/08/2024	1. Comunicación de peligros 2. ¿Qué es la norma de comunicación de peligros? 3. Principales componentes de la norma 4. Responsabilidades a saber por el trabajador

ANEXO 5: Acta de reunión Vigía seguridad y salud en el trabajo

2.1.2.6. COMITÉ DE CONVIVENCIA LABORAL

Se realizó la reunión del comité de convivencia laboral, cumpliendo con lo establecido en la normatividad legal vigente, se adjunta acta de reunión del comité de convivencia laboral.

Tabla 5. CCL

FECHA	TEMAS TRATADOS
07/10/2024	1. Violencia en el lugar de trabajo 2. Trabajadores en riesgo de violencia 3. Protección contra la violencia

ANEXO 6: Acta de reunión Comité de convivencia Laboral.

2.2. PROGRAMA DE HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL

2.2.1. PROCEDIMIENTOS DE ALTO RIESGO

El análisis seguro de trabajo (AST), es un proceso por el cual se identifican incidentes potenciales y condiciones de peligro para cada uno de los pasos básicos de la tarea y se elaboran procedimientos de seguridad y controles para reducir la probabilidad de la materialización de este. El Análisis de Seguridad en la Tarea (AST) tiene como finalidad realizar una identificación de los agentes de riesgo a los cuales están expuestos los trabajadores en la ejecución de sus tareas dentro de la empresa.

Tabla 6. Permisos de trabajo

DOCUMENTO	CANTIDAD
ATS	2

ANEXO 7: ATS-Permisos de trabajo.

2.2.2. INSPECCIONES

Las inspecciones de seguridad son una técnica analítica de seguridad que consiste en el análisis realizado mediante la observación directa de las instalaciones, equipos y procesos productivos para identificar los peligros existentes y evaluar los riesgos en las áreas de trabajo. Para el periodo de **06 de agosto 2024 al 11 septiembre de 2024,** teniendo en cuenta las actividades ejecutadas en el mes.

Tabla 7. Programación inspecciones

INSPECCIÓN REALIZADA	CANTIDAD
Inspección botiquín	1
Inspección herramientas manuales	1
Inspección pulidora	2

ANEXO 8: Inspecciones

2.2.3. ACCIDENTALIDAD

Durante el periodo **06 de agosto 2024 al 11 septiembre de 2024**, no se presentaron accidentes laborales.

ANEXO 9: HSE-FOR-65 Accidentalidad.

2.2.4. BRIGADAS DE EMERGENCIAS

Se realiza reunión de la brigada de emergencias del proyecto.

Tabla 8. Brigada de emergencias

FECHA	TEMAS TRATADOS
10/10/2024	• Señales de Prevención de accidentes

ANEXO 10: Reunión Brigada de Emergencias

2.2.5. INDICADORES

Se establecen los indicadores para dar cumplimiento a lo establecido en el plan de seguridad y salud en el trabajo.

- **FRECUENCIA DE ACCIDENTALIDAD**

$$\mathrm{R} = \frac{\mathrm{No}\ Accidentes\ de\ trabajo\ en\ el\ mes}{\mathrm{No}\ \ de\ trabajadores\ en\ el\ mes} * 100$$

$$\mathrm{R} = \frac{0}{7} = 0\ \%$$

- **ÍNDICE DE SEVERIDAD DE ACCIDENTALIDAD**

$$\mathbf{R} = \frac{\mathbf{\#\ dias\ incapacidad\ AT\ mes + \#\ días\ cargados\ en\ el\ mes}}{\mathbf{\#\ trabajadores\ en\ el\ mes}} * \mathbf{100}$$

$$\mathbf{R} = \frac{\mathbf{0}}{\mathbf{7}} = \mathbf{0}\ \%$$

En el periodo de **06 de agosto 2024 al 11 septiembre de 2024,** no se tuvo accidentes laborales.

- **ÍNDICE DE PROPORCIÓN DE ACCIDENTES DE TRABAJO MORTALES**

$$\mathbf{R} = \frac{\mathbf{\#\ ATmortalesen\ el\ año}}{\mathbf{\#\ AT\ en\ el\ año}} * \mathbf{100}$$

$$\mathbf{R} = \frac{\mathbf{0}}{\mathbf{0}} = \mathbf{0}\ \%$$

Durante la ejecución del contrato no se ha presentado ningún accidente mortal.

- **INCIDENCIA DE ENFERMEDAD LABORAL**

$$\mathbf{R} = \frac{\mathbf{\#\ de\ casos\ nuevos\ de\ EL}}{\mathbf{Promedio\ de\ trabajadores}} * \mathbf{100}$$

$$\mathbf{R} = \frac{\mathbf{0}}{\mathbf{0}} = \mathbf{0}\ \%$$

Durante la ejecución del proyecto no se ha presentado enfermedades laborales en los trabajadores.

- **ÍNDICE FRECUENCIA AUSENTISMO**

$$\mathbf{R} = \frac{\textbf{No } \boldsymbol{días\ ausencia\ por\ incapacidad\ laboral}}{\textbf{No días programados de trabajo en el mes}} * \mathbf{100}$$


$$\mathbf{R} = \frac{\mathbf{0}}{\mathbf{30}} = \mathbf{0}\ \%$$

En el periodo de **06 de julio 2024 al 05 agosto de 2024**, no se presentó ausentismo laboral.

- **PAUSAS ACTIVAS**

$$\mathbf{R} = \frac{\textbf{No } \boldsymbol{pausas\ activas\ Ejecutadas}}{\textbf{No } \boldsymbol{pausas\ activas\ \ programadas}}$$

$$\mathbf{R} = \frac{\mathbf{25}}{\mathbf{25}} * \mathbf{100\%} = \mathbf{100\%}$$

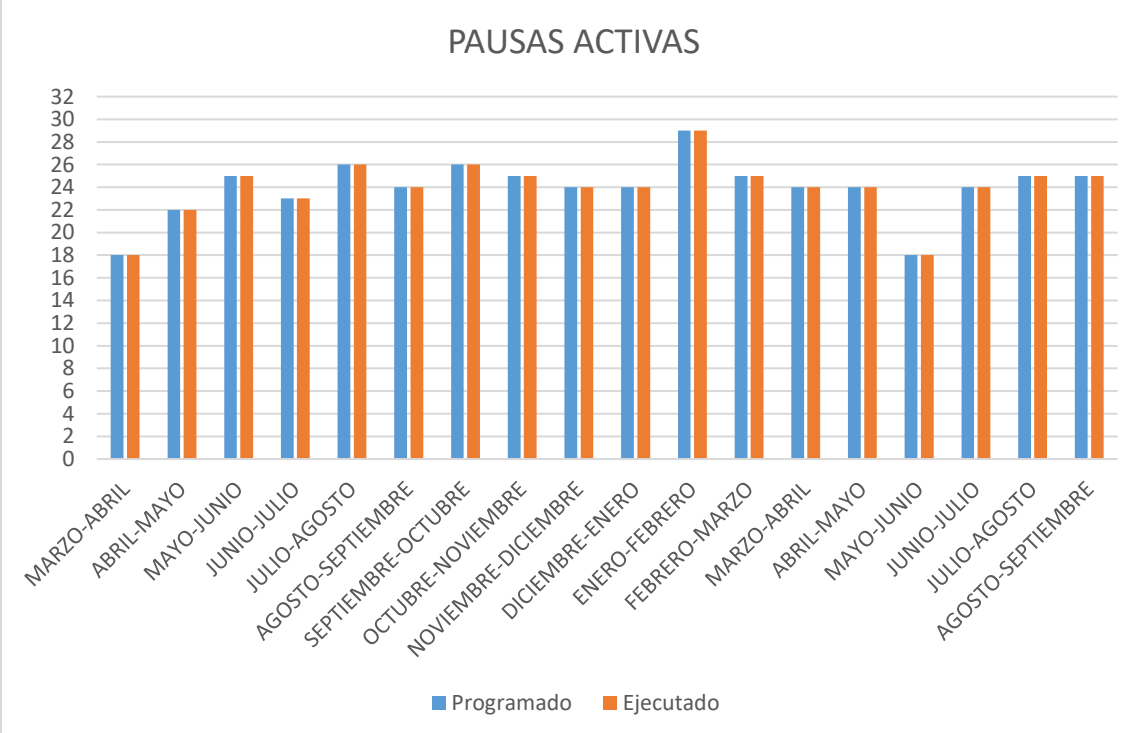


Se cumplió con el 100 % de las Pausas Activas Programadas para el periodo del **06 de agosto 2024 al 11 septiembre de 2024.**

- **CHARLAS DE SEGURIDAD.**

$$\mathbf{R} = \frac{\mathbf{No}\ \boldsymbol{Charlas\ de\ seguridad\ \ programadas}}{\mathbf{No}\ \boldsymbol{Charlas\ de\ seguridad\ \ Ejecutadas}}$$

$$\mathbf{R} = \frac{\mathbf{25}}{\mathbf{25}} * \mathbf{100\%} = \mathbf{100\%}$$

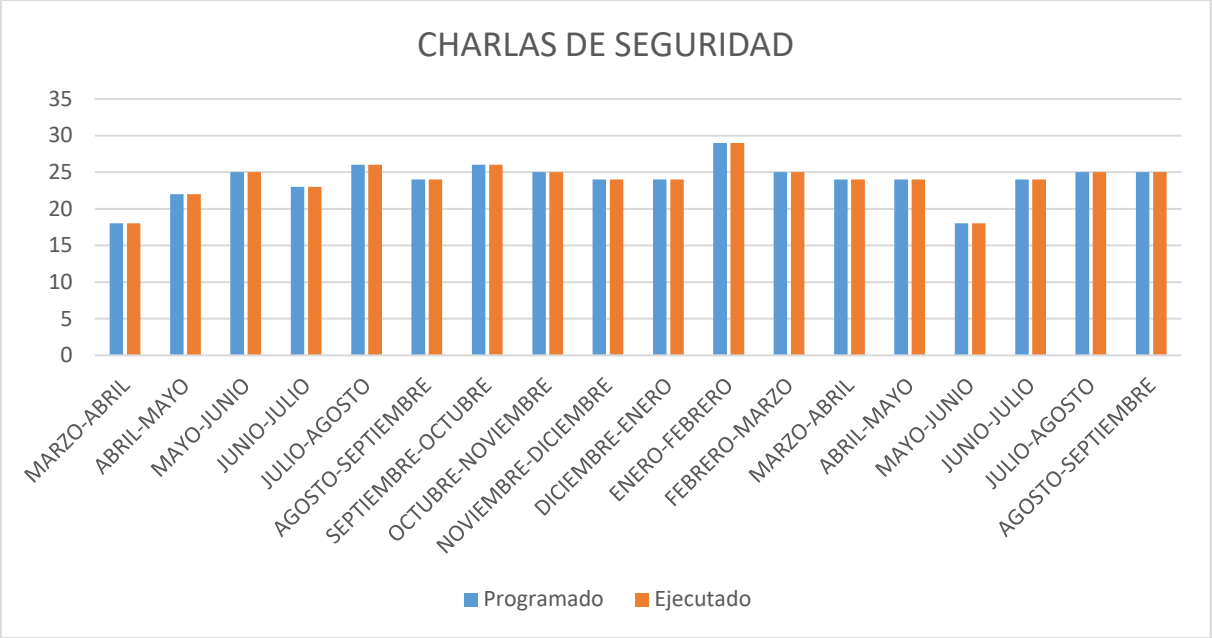


Se cumplió con el 100% de las Charlas de seguridad programadas para el periodo del **06 de agosto 2024 al 11 septiembre de 2024**

- **CCL.**

$$\mathbf{CCL}\ = \frac{\mathbf{No}\ \boldsymbol{Reuniones\ \ programadas}}{\mathbf{No}\ \boldsymbol{Reuniones\ \ ejeutadas}}$$


$$\mathbf{R} = \frac{\mathbf{1}}{\mathbf{1}} * \mathbf{100\%} = \mathbf{100\%}$$

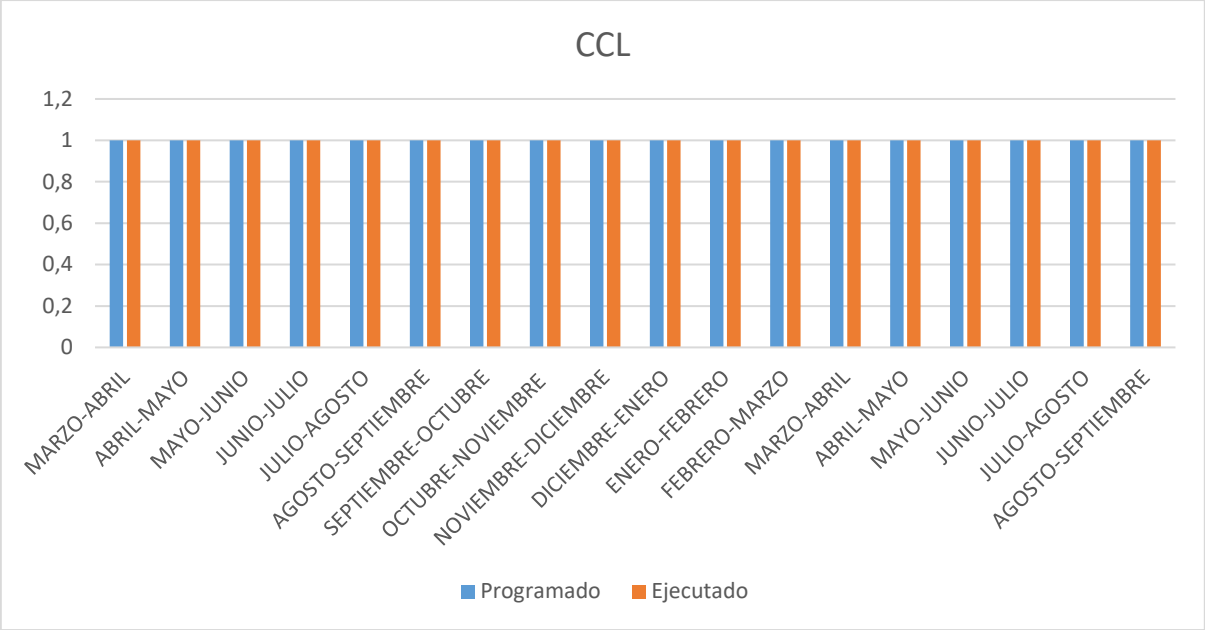

- **REUNIONES COPASST**

$$\textbf{COPASST} = \frac{\textbf{No } \boldsymbol{Reuniones\ programadas}}{\textbf{No } \boldsymbol{Reuniones\ ejeutadas}}$$


$$\mathbf{R} = \frac{\mathbf{1}}{\mathbf{1}} * \mathbf{100\%} = \mathbf{100\%}$$

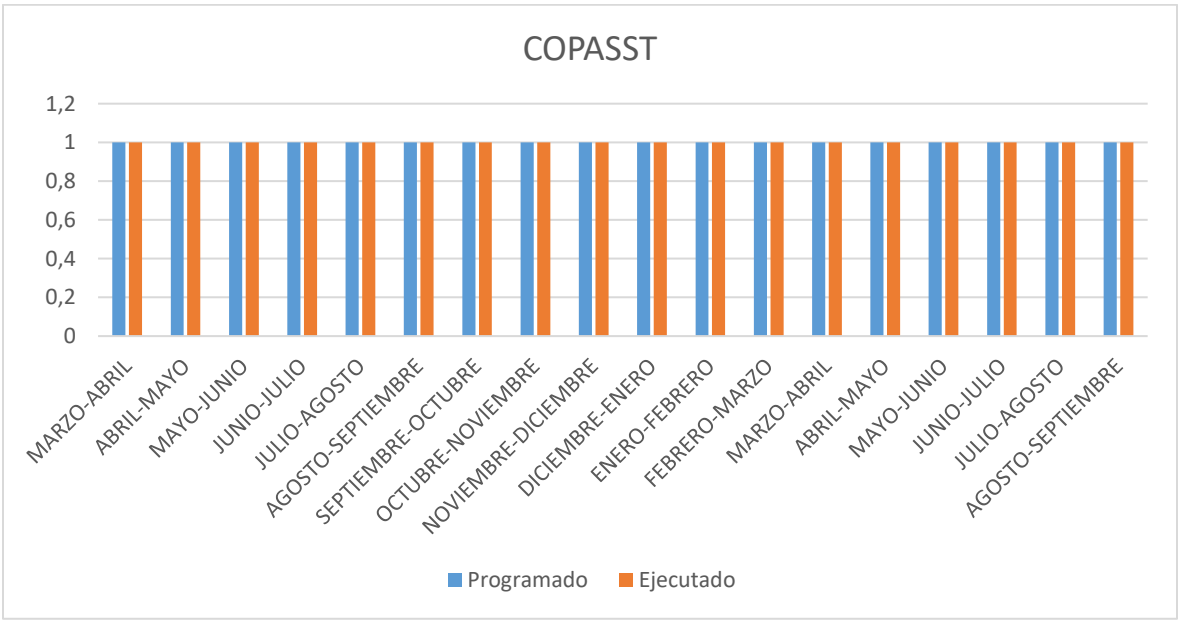

- **REUNIONES COE**

$$\mathbf{COE} = \frac{\mathbf{No}\ \boldsymbol{Reuniones\ programadas}}{\mathbf{No}\ \boldsymbol{Reuniones\ ejeutadas}}$$

$$\mathbf{R} = \frac{\mathbf{1}}{\mathbf{1}} * \mathbf{100\%} = \mathbf{100\%}$$

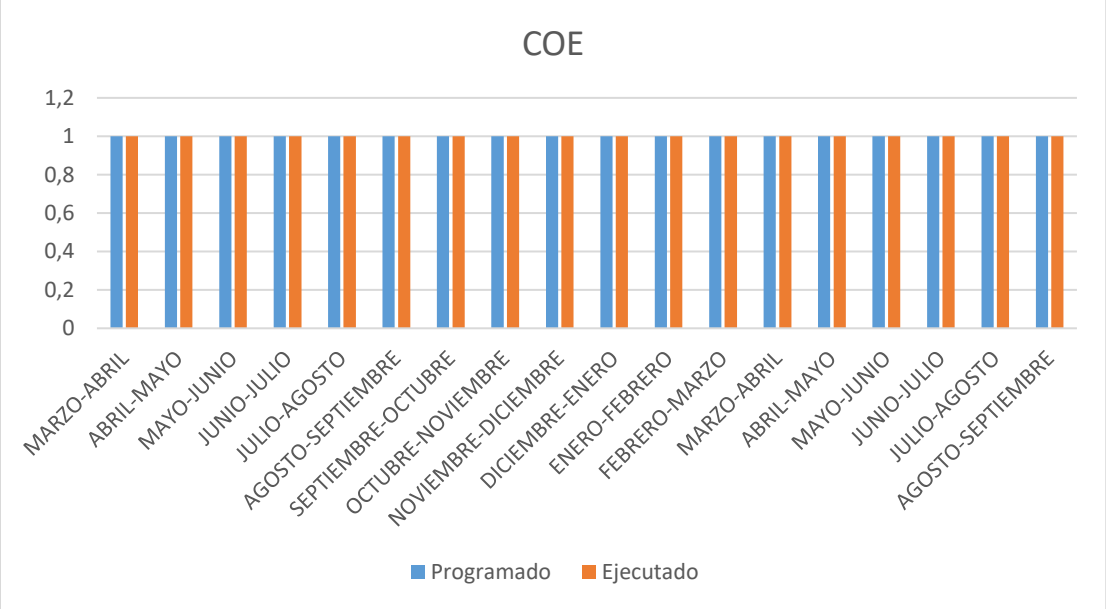

3. REPORTE DE CUMPLIMIENTO PROTOCOLO COVID-19

Debido a la pandemia que se presenta actualmente por el coronavirus COVID-19 y en cumplimiento a la circular conjunta 001 del 11 de mayo de 2020 expedida por Ministerio De Vivienda, Ciudad y Territorio, Ministerio De Salud y Protección Social Y Ministerio Del Trabajo; a la circular conjunta 0000003 del 8 de mayo de 2020 expedida por el Ministerio De Salud y Protección Social, Ministerio De Trabajo y Ministerio De Transporte, al decreto 593 de 24 mayo de 2020, a la resolución 666 de 24 de mayo de 2020, al decreto 121 de 2020, a la Resolución 223 de 2021 y a la resolución 777 de 2021, entre otros, diariamente se realiza control a los trabajadores de su estado de salud mediante una encuesta para autorizar su ingreso a las instalaciones y se implementa el protocolo de bioseguridad a los trabajadores. En el **ANEXO 11** se encuentra los registros de la implementación del protocolo de bioseguridad PAPSO.

4. CONCLUSIONES

- Durante el periodo de **06 de agosto 2024 al 11 septiembre de 2024** se realizó la reunión de comité de Convivencia laboral.

- Durante el periodo de **06 de agosto 2024 al 11 septiembre de 2024** se presentaron accidentes laborales.

- Se cumplió con los compromisos contractuales del contrato en el periodo del **06 de agosto 2024 al 11 septiembre de 2024.**

- Los trabajadores contaron con los elementos de protección personal y dotaciones de acuerdo con las exigencias de la obra en mención.

- Con la implementación del protocolo y la limpieza y desinfección de manos, herramientas y áreas, se tuvo control con los empleados en cuanto a la prevención y mitigación del contagio de COVID19.

ANEXO 1. ENTREGA DE EPP

WRUSSY INGENIEROS S.A.S.	ENTREGA ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL	CODIGO: HSE-FOR-02
		VERSION 1
		FECHA APROBACION: 08/01/2019

FORMATO PARA ENTREGA INDIVIDUAL DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL (EPP) Y DOTACIÓN

Para dar cumplimiento a los art.230 CST modificado art.7 de la ley 11/84 "suministro de calzado y vestido de labor" y en seguridad y salud en el trabajo art 85 ley 9 de 1.979 y art. 91 decreto 1072 de 2015.

DATOS DEL TRABAJADOR

NOMBRE:	Elkin Reyes.	CARGO: Ayudante.

ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL (EPP)

ITEM	EPP	FIRMA	CANTIDAD	FECHA DE ENTREGA	OBSERVACIONES
1	Guantes Vaqueta.		1	14-08-24	
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					

COMPROMISO

Me comprometo a utilizar adecuadamente durante la jornada laboral los elementos de proteccion personal recibidos y mantenerlos en buen estado, dando cumplimiento a las normas de seguridad y salud en el trabajo que contribuyen a mi bienestar fisico, psicológico y social. Declaro que he recibido información sobre el uso adecuado de los mismos.

Usando los equipos y elementos de protección personal (Incluyendo ropa de trabajo) estoy cumpliendo con mis deberes como trabajador definidos en la ley a través de la siguiente normatividad: CODIGO SUSTANTIVO DEL TRABAJO; Art. 56 y Art. 58 numeral 7; LEY 9 DE 1979; Art. 88; DECRETO 1295 DE 1994: Art. 22. Soy responsable del uso y cuidado de los EPP. El presente compromiso quedará archivado en el Sistema de Gestion y Seguridad del trabajo como evidencia y seguimiento del cumplimiento de mis deberes y derechos como empleado en la WRUSSY INGENIEROS SAS

El presente compromiso aplica para los elementos de protección personal entregados.

FIRMA DEL TRABAJADOR:	CEDULA:
x Elkin R. Reyes	1096218748.

RESPONSABLE

NOMBRE	Sandra Santiago	CEDULA No.	37712004
CARGO	SST.	FIRMA	

ANEXO 2. DOCUMENTACIÓN Y PLANILLAS DE SEGURIDAD SOCIAL

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901109885-1	WRUSSY INGENIEROS SAS		CALE 8 F N 79 94	4111513	INGWILVER@HOTMAIL.COM	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
SUCURSAL	C – MIPYME	USPEC IND	USPEC IND	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					2	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-07	2024-07	Y	21/08/2024	79560413	$181.000	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-11	ARL SURA	890903790-5	181.000				181.000	0	0	181.000			1.810	181.000	2

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	0	0	0
Pensión	0	0	0
Riesgos Laborales	1	181.000	181.000
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	1	181.000	181.000

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	901109885-1	WRUSSY INGENIEROS SAS		CALE 8 F N 79 94	4111513	INGWILVER@HOTMAIL.COM
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
SUCURSAL	C – MIPYME	USPEC IND	USPEC IND	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	

EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					2	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-07	2024-07	Y	21/08/2024	79560413	$181.000	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																		PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	79650148	OVIEDO CHAVARRO CARLOS ALBERTO	59	0			N																		0	0	0	0	0	0		0	0	14-11	1.300.000	5	90.500		0	0	0	0	0	0	0	0
2	CC	79654153	RIVERA REVOLLO JUAN CARLOS	59	0			N																		0	0	0	0	0	0		0	0	14-11	1.300.000	5	90.500		0	0	0	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901109885-1	WRUSSY INGENIEROS SAS		CALE 8 F N 79 94	4111513	INGWILVER@HOTMAIL.COM	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
SUCURSAL	C – MIPYME	INDEPENDIENTE	15	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-07	2024-07	Y	21/08/2024	79560407	$194.900	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-11	ARL SURA	890903790-5	194.900				194.900	0	0	194.900			1.949	194.900	1

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	0	0	0
Pensión	0	0	0
Riesgos Laborales	1	194.900	194.900
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	1	194.900	194.900

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	901109885-1	WRUSSY INGENIEROS SAS		CALE 8 F N 79 94	4111513	INGWILVER@HOTMAIL.COM
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
SUCURSAL	C – MIPYME	INDEPENDIENTE	15	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	

EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-07	2024-07	Y	21/08/2024	79560407	$194.900	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																			PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES					
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	80212380	RUSSY LADINO WILVER FRANCINY	59	0			N																		0	0	0	0	0			14-11	2.800.000	5	194.900		0	0	0	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901109885-1	WRUSSY INGENIEROS SAS	CALE 8 F N 79 94	4111513	INGWILVER@HOTMAIL.COM	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
SUCURSAL	C – MIPYME	Barranca / Barranca	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					3	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-08	2024-07	E	21/08/2024	79560663	$2.123.100	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS002	Salud Total EPS	800130907-4	52.000	0		0		0	0	0	0	52.000	1
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	87.200	0		0		0	0	0	0	87.200	1
EPS010	EPS Sura	800088702-2	135.100	0		0		0	0	0	0	135.100	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	540.300	0	0	0	0	0	0		540.300	1
230301	Porvenir	800224808-8	556.800	0	0	0	0	0	0		556.800	2

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-11	ARL SURA	890903790-5	477.400				477.400	0	0	477.400			4.774	477.400	3

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF38	Cafaba	890270275-5	274.300	0	0	274.300	3

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	3	274.300	274.300
Pensión	2	1.097.100	1.097.100
Riesgos Laborales	1	477.400	477.400
CCF	1	274.300	274.300
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	7	2.123.100	2.123.100

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

080

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	901109885-1	WRUSSY INGENIEROS SAS		CALE 8 F N 79 94	4111513	INGWILVER@HOTMAIL.COM
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
SUCURSAL	C – MIPYME	Barranca	Barranca	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	

EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					3	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-08	2024-07	E	21/08/2024	79560663	$2.123.100	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1096226349	ALVAREZ MORALES YESENIA	1	0			S																	230301	1.300.000	208.000	0	0	0	0	EPS002	1.300.000	52.000	14-11	1.300.000	5	90.500	CCF38	1.300.000	52.000	0	0	0	0	0
2	CC	1098754093	NARVAEZ QUIÑONEZ CESAR ORLANDO	1	0			S								X								230201	3.376.714	540.300	0	0	0	0	EPS010	3.376.714	135.100	14-11	3.376.714	5	235.100	CCF38	3.376.714	135.100	0	0	0	0	0
3	CC	37712004	SANTIAGO CAMACHO SANDRA MILENA	1	0			S																	230301	2.180.000	348.800	0	0	0	0	EPS005	2.180.000	87.200	14-11	2.180.000	5	151.800	CCF38	2.180.000	87.200	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	80212380-5	WILVER FRANCINY RUSSY LADINO	Clle 11 B Bis A Num 78 23	4115589	ingwilver@hotmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
SUCURSAL	A – Más de 200 cot	Barranca / Barranca	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					3	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-08	2024-07	E	22/08/2024	79632406	$1.667.900	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS002	Salud Total EPS	800130907-4	118.600	0		0		0	1	100	0	118.700	1
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	84.500	0		0		0	1	100	0	84.600	1
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	12.200	0		0		0	1	100	0	12.300	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	337.700	0	0	0	0	1	300	0	338.000	1
231001	Colfondos	800227940-6	48.600	0	0	0	0	1	100	0	48.700	1
25-14	Colpensiones	900336004-7	474.400	0	0	0	0	1	400	0	474.800	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-11	ARL SURA	890903790-5	374.500				374.500	1	300	374.800			3.745	374.800	3

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF38	Cafaba	890270275-5	215.800	1	200	216.000	3

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	1	0	0	0
ICBF				
0	1	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	3	215.300	215.600
Pensión	3	860.700	861.500
Riesgos Laborales	1	374.500	374.800
CCF	1	215.800	216.000
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	8	1.666.300	1.667.900

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	80212380-5	WILVER FRANCINY RUSSY LADINO		Clle 11 B Bis A Num 78 23	4115589	ingwilver@hotmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
SUCURSAL	A – Más de 200 cot	Barranca	Barranca	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					3	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-08	2024-07	E	22/08/2024	79632406	$1.667.900	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1096218748	REYES SERRANO ELKIN FERNANDO	1	0			S								X								230201	2.110.356	337.700	0	0	0	0	EPS005	2.110.356	84.500	14-11	2.110.356	5	146.900	CCF38	2.110.356	84.500	0	0	0	0	0
2	CC	74755325	TORRES BERDUGO JOSE RAFAEL	1	0			S	X	X														231001	303.334	48.600	0	0	0	0	EPS037	303.334	12.200	14-11	303.334	5	21.200	CCF38	315.901	12.700	0	0	0	0	0
3	CC	91443395	REYES SERRANO JORGE	1	0			S								X								25-14	2.964.432	474.400	0	0	0	0	EPS002	2.964.432	118.600	14-11	2.964.432	5	206.400	CCF38	2.964.432	118.600	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	79650148
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			CARLOS ALBERTO OVIEDO CHAVARRO
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	DEPARTAMENTO:	BOGOTA - DISTRITO CAPITAL
DIRECCIÓN:	CL 8F #79-94	TELÉFONO:	4111513
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Comercio al por mayor de computadores, equipo per
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	**7933280203**	TIPO DE PLANILLA:	I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES julio AÑO 2024	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES julio AÑO 2024
DÍAS DE MORA:	1		
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2024/08/14	NÚMERO AUTORIZACIÓN:	843240385

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
25-14	25-14 COLPENSIONES	1	$ 208.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 200	$ 0	$ 208.000	$ 200	$ 208.200
SUBTOTALES:										**$ 208.000**	**$ 200**	**$ 208.200**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS001	EPS001-ALIANSALUD S.A.	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 162.500	$ 0	$ 200	$ 0	$ 162.500	$ 200	$ 0	$ 162.700
SUBTOTALES:													**$ 162.500**	**$ 200**	**$ 0**	**$ 162.700**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES																SEGURIDAD SOCIAL																												PARAFISCALES						
																										PENSIÓN										SALUD							ARP																		

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901109885-1	WRUSSY INGENIEROS SAS		CALE 8 F N 79 94	4111513	INGWILVER@HOTMAIL.COM	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
SUCURSAL	C – MIPYME	RIESGO 5	12	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					2	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-08	2024-07	E	21/08/2024	79528465	$2.303.000	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	177.600	0		0		0	0	0	0	177.600	1
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	120.000	0		0		0	0	0	0	120.000	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	480.000	0	0	0	0	0	0		480.000	1
230301	Porvenir	800224808-8	710.100	0	0	0	0	0	0		710.100	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-11	ARL SURA	890903790-5	517.700				517.700	0	0	517.700			5.177	517.700	2

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF24	Compensar Caja	860066942-7	297.600	0	0	297.600	2

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	2	297.600	297.600
Pensión	2	1.190.100	1.190.100
Riesgos Laborales	1	517.700	517.700
CCF	1	297.600	297.600
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	6	2.303.000	2.303.000

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	901109885-1	WRUSSY INGENIEROS SAS		CALE 8 F N 79 94	4111513	INGWILVER@HOTMAIL.COM
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
SUCURSAL	C – MIPYME	RIESGO 5	12	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	

EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					2	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-08	2024-07	E	21/08/2024	79528465	$2.303.000	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																		PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1057588784	SALAMANCA ROJAS KAREN LISSETH	1	0			S																	230301	4.437.580	710.100	0	0	0	0	EPS005	4.437.580	177.600	14-11	4.437.580	5	308.900	CCF24	4.437.580	177.600	0	0	0	0	0
2	CC	1049650740	ROMERO SUESCA DANIEL SANTIAGO	1	0			S																	230201	3.000.000	480.000	0	0	0	0	EPS037	3.000.000	120.000	14-11	3.000.000	5	208.800	CCF24	3.000.000	120.000	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

ASOPAGOS s.a.

RAZÓN SOCIAL :	YURY YOHANA SUAREZ GUERRERO
IDENTIFICACIÓN:	CC-1015409649
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2024-08-27
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2024-08-13
FECHA DE PAGO:	2024-08-12
ENTIDAD DE PAGO:	BANCOLOMBIA
PERÍODO PENSIÓN:	2024-07
PERÍODO SALUD:	2024-07
NÚMERO PLANILLA:	30422915
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	30422915
TIPO DE PLANILLA:	I

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS010	800088702	EPS SURA	1	$ 2.000.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 250.000	$ 250.000
230301	800224808	PORVENIR	1	$ 2.000.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 320.000	$ 320.000
14-11	890903790	ARL SURA	1	$ 2.000.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 10.500	$ 10.500
CCF22	860007336	COLSUBSIDIO	1	$ 2.000.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 40.000	$ 40.000
				Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 0	$ 620.500	$ 620.500

PAGADO

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	11/09/2024

ANEXO 3. CHARLAS DE SEGURIDAD

RUSSY INGENIEROS S.A.S.	REGISTRO DE ASISTENCIA	CÓDIGO: FOR-HSE-76
		VERSION 1
		FECHA APROBACION 01/08/2019

Fecha:	06-08-2024.	Lugar:	ITSI
Hora:	7:00 a. m.	Tema:	Estres
Responsable:	SANDRA SANTIAGO	Cargo:	INPS SST (pausas activas)

Charla Diaria	X	Entrenamiento		Inducción		Capacitación		Otro	

No.	NOMBRE	CARGO	FIRMA	EMPRESA
1	ELKIN REYES	AYUDANTE		WRUSSY
2	YESENIA ALVAREZ	TRABAJO SOCIAL	Yesenia Alv	WRUSSY
3	CESAR NARVAEZ	ING. RESIDENTE		WRUSSY
4	JORGE REYES	GUARDA DE SEGURIDAD	Jorge Reyes	WRUSSY
5				
6				
7				
8				

RUSSY INGENIEROS S.A.S.	REGISTRO DE ASISTENCIA	CÓDIGO: FOR-HSE-76
		VERSION 1
		FECHA APROBACION 01/08/2019

Fecha:	08-08-2024.	Lugar:	ITSI
Hora:	7:00 a. m.	Tema:	Cuidado del equipo de protección personal
Responsable:	SANDRA SANTIAGO	Cargo:	INPS SST (paras actuar).

Charla Diaria		Entrenamiento		Inducción		Capacitación	X	Otro	

No.	NOMBRE	CARGO	FIRMA	EMPRESA
1	ELKIN REYES	AYUDANTE		WRUSSY
2	YESENIA ALVAREZ	TRABAJO SOCIAL		WRUSSY
3	CESAR NARVAEZ	ING. RESIDENTE		WRUSSY
4	JORGE REYES	GUARDA DE SEGURIDAD		WRUSSY
5				
6				
7				
8				

WRUSSY INGENIEROS S.A.S.	REGISTRO DE ASISTENCIA	CÓDIGO: FOR-HSE-76 VERSION 1 FECHA APROBACION 01/08/2019

Fecha:	09-08-2024.	Lugar:	ITSI
Hora:	7:00 a. m.	Tema:	Uso adecuado de Maquinarias
Responsable:	SANDRA SANTIAGO	Cargo:	INPS SST (para actividades)

Charla Diaria	Entrenamiento	Inducción	Capacitación	Otro
X				

No.	NOMBRE	CARGO	FIRMA	EMPRESA
1	ELKIN REYES	AYUDANTE		WRUSSY
2	YESENIA ALVAREZ	TRABAJO SOCIAL		WRUSSY
3	CESAR NARVAEZ	ING. RESIDENTE		WRUSSY
4	JORGE REYES	GUARDA DE SEGURIDAD		WRUSSY
5				
6				
7				
8				

RUSSY INGENIEROS S.A.S.	REGISTRO DE ASISTENCIA SABADO.	CÓDIGO: FOR-HSE-76
		VERSION 1
		FECHA APROBACION 01/08/2019

Fecha:	10-08-2024.	Lugar:	ITSI
Hora:	7:00 a. m.	Tema:	Objetos que caen
Responsable:	SANDRA SANTIAGO	Cargo:	INPS SST (pausas activas)

Charla Diaria	Entrenamiento	Inducción	Capacitación	Otro
X				

No.	NOMBRE	CARGO	FIRMA	EMPRESA
1	ELKIN REYES	AYUDANTE		WRUSSY
2	YESENIA ALVAREZ	TRABAJO SOCIAL		WRUSSY
3	CESAR NARVAEZ	ING. RESIDENTE		WRUSSY
4	JORGE REYES	GUARDA DE SEGURIDAD	Jorge Reys	WRUSSY
5				
6				
7				
8				

WRUSSY INGENIEROS S.A.S.	REGISTRO DE ASISTENCIA	CÓDIGO: FOR-HSE-76 VERSION 1 FECHA APROBACION 01/09/2019

Fecha:	13-08-2024.	Lugar:	ITSI
Hora:	7:00 a. m.	Tema:	Caidas Resbalones en terrenos irregulares.
Responsable:	SANDRA SANTIAGO	Cargo:	INPS SST (Pausas Activas)

Charla Diaria	X	Entrenamiento	Inducción	Capacitación	Otro

No.	NOMBRE	CARGO	FIRMA	EMPRESA
1	ELKIN REYES	AYUDANTE		WRUSSY
2	YESENIA ALVAREZ	TRABAJO SOCIAL		WRUSSY
3	CESAR NARVAEZ	ING. RESIDENTE		WRUSSY
4	JORGE REYES	GUARDA DE SEGURIDAD		WRUSSY
5				
6				
7				
8				

RUSSY INGENIEROS S.A.S.	REGISTRO DE ASISTENCIA	CÓDIGO: FOR-HSE-76 VERSION 1 FECHA APROBACION 01/08/2019

Fecha:	14-08-2024.	Lugar:	ITSI
Hora:	7:00 a. m.	Tema:	Orden y aseo. (Pausas Activas)
Responsable:	SANDRA SANTIAGO	Cargo:	INPS SST

Charla Diaria:	Y	Inducción	Capacitación	Otro

No.	NOMBRE	CARGO	FIRMA	EMPRESA
1	ELKIN REYES	AYUDANTE		WRUSSY
2	YESENIA ALVAREZ	TRABAJO SOCIAL		WRUSSY
3	CESAR NARVAEZ	ING. RESIDENTE		WRUSSY
4	JORGE REYES	GUARDA DE SEGURIDAD		WRUSSY
5				
6				
7				
8				

WRUSSY INGENIEROS S.A.S.

REGISTRO DE ASISTENCIA

CÓDIGO: FOR-HSE-76
VERSION 1
FECHA APROBACION 01/08/2019

Fecha:	16-08-2024.	Lugar:	ITSI
Hora:	7:00 a. m.	Tema:	Calentamiento global
Responsable:	SANDRA SANTIAGO	Cargo:	INPS SST (pausas activas).

Charla Diaria	Entrenamiento	Inducción	Capacitación	Otro
	X			

No.	NOMBRE	CARGO	FIRMA	EMPRESA
1	ELKIN REYES	AYUDANTE		WRUSSY
2	YESENIA ALVAREZ	TRABAJO SOCIAL		WRUSSY
3	CESAR NARVAEZ	ING. RESIDENTE		WRUSSY
4	JORGE REYES	GUARDA DE SEGURIDAD		WRUSSY
5				
6				
7				
8				

WRUSSY INGENIEROS S.A.S.	REGISTRO DE ASISTENCIA SABADO	CÓDIGO: FOR-HSE-76
		VERSION 1
		FECHA APROBACION 01/08/2019

Fecha:	17-08-2024.	Lugar:	ITSI
Hora:	7:00 a. m.	Tema:	Manejo de herramienta
Responsable:	SANDRA SANTIAGO	Cargo:	INPS SST (pausas activas).

Charla Diaria: X | Entrenamiento | Inducción | Capacitación | Otro

No.	NOMBRE	CARGO	FIRMA	EMPRESA
1	ELKIN REYES	AYUDANTE		WRUSSY
2	YESENIA ALVAREZ	TRABAJO SOCIAL		WRUSSY
3	CESAR NARVAEZ	ING. RESIDENTE		WRUSSY
4	JORGE REYES	GUARDA DE SEGURIDAD	Jorge Reyes	WRUSSY
5				
6				
7				
8				

WRUSSY INGENIEROS S.A.S.	REGISTRO DE ASISTENCIA	CÓDIGO: FOR-HSE-76 VERSION 1 FECHA APROBACION 01/08/2019

Fecha:	20-08-2024.	Lugar:	ITSI
Hora:	7:00 a. m.	Tema:	Comunicación Abierta.
Responsable:	SANDRA SANTIAGO	Cargo:	INPS SST (Pausas Activas).

Charla Diaria	X.	Entrenamiento	Inducción	Capacitación	Otro

No.	NOMBRE	CARGO	FIRMA	EMPRESA
1	ELKIN REYES	AYUDANTE		WRUSSY
2	YESENIA ALVAREZ	TRABAJO SOCIAL		WRUSSY
3	CESAR NARVAEZ	ING. RESIDENTE		WRUSSY
4	JORGE REYES	GUARDA DE SEGURIDAD		WRUSSY
5				
6				
7				
8				

RUSSY INGENIEROS S.A.S.	REGISTRO DE ASISTENCIA	CÓDIGO: FOR-HSE-78 VERSION 1 FECHA APROBACION 01/08/2019

Fecha:	21-08-2024.	Lugar:	ITSI
Hora:	7:00 a. m.	Tema:	Identificador de peligros
Responsable:	SANDRA SANTIAGO	Cargo:	INPS SST (causas actuos).

Charla Diaria	Entrenamiento	Inducción	Capacitación	Otro
X				

No.	NOMBRE	CARGO	FIRMA	EMPRESA
1	ELKIN REYES	AYUDANTE		WRUSSY
2	YESENIA ALVAREZ	TRABAJO SOCIAL		WRUSSY
3	CESAR NARVAEZ	ING. RESIDENTE		WRUSSY
4	JORGE REYES	GUARDA DE SEGURIDAD		WRUSSY
5				
6				
7				
8				

RUSSY INGENIEROS S.A.S.

REGISTRO DE ASISTENCIA

CÓDIGO: FOR-HSE-76
VERSION 1
FECHA APROBACION 01/06/2019

Fecha:	22-08-2024.	Lugar:	ITSI
Hora:	7:00 a. m.	Tema:	Dias de lluvias
Responsable:	SANDRA SANTIAGO	Cargo:	INPS SST (pausas activas)

Charla Diaria: X | Entrenamiento | Inducción | Capacitación | Otro

No.	NOMBRE	CARGO	FIRMA	EMPRESA
1	ELKIN REYES	AYUDANTE		WRUSSY
2	YESENIA ALVAREZ	TRABAJO SOCIAL		WRUSSY
3	CESAR NARVAEZ	ING. RESIDENTE		WRUSSY
4	JORGE REYES	GUARDA DE SEGURIDAD		WRUSSY
5				
6				
7				
8				

WRUSSY INGENIEROS S.A.S.	REGISTRO DE ASISTENCIA	CÓDIGO: FOR-HSE-76 VERSION 1 FECHA APROBACION 01/08/2019

Fecha:	23-08-2024.	Lugar:	ITSI
Hora:	7:00 a. m.	Tema:	Recomendaciones para evitar accidentes.
Responsable:	SANDRA SANTIAGO	Cargo:	INPS SST (pausas activas).

Charla Diaria	Entrenamiento	Inducción	Capacitación	Otro
X				

No.	NOMBRE	CARGO	FIRMA	EMPRESA
1	ELKIN REYES	AYUDANTE		WRUSSY
2	YESENIA ALVAREZ	TRABAJO SOCIAL		WRUSSY
3	CESAR NARVAEZ	ING. RESIDENTE		WRUSSY
4	JORGE REYES	GUARDA DE SEGURIDAD		WRUSSY
5				
6				
7				
8				

RUSSY INGENIEROS S.A.S.	REGISTRO DE ASISTENCIA	CÓDIGO: FOR-HSE-76 VERSION 1 FECHA APROBACION 01/08/2019

Fecha:	26-08-2024.	Lugar:	ITSI
Hora:	7:00 a. m.	Tema:	Estres laboral
Responsable:	SANDRA SANTIAGO	Cargo:	INPS SST (pausas activas).

Charla Diaria	Entrenamiento	Inducción	Capacitación	Otro
	X			

No.	NOMBRE	CARGO	FIRMA	EMPRESA
1	ELKIN REYES	AYUDANTE		WRUSSY
2	YESENIA ALVAREZ	TRABAJO SOCIAL		WRUSSY
3	CESAR NARVAEZ	ING. RESIDENTE		WRUSSY
4	JORGE REYES	GUARDA DE SEGURIDAD		WRUSSY
5				
6				
7				
8				

RUSSY INGENIEROS S.A.S.

REGISTRO DE ASISTENCIA SABADO

CÓDIGO: FOR-HSE-76
VERSIÓN 1
FECHA APROBACION 01/08/2019

Fecha:	29-08-2024.	Lugar:	ITSI
Hora:	7:00 a. m.	Tema:	la unión hace la fuerza.
Responsable:	SANDRA SANTIAGO	Cargo:	INPS SST (pausas activas)

Charla Diaria	Entrenamiento	Inducción	Capacitación	Otro
X				

No.	NOMBRE	CARGO	FIRMA	EMPRESA
1	ELKIN REYES	AYUDANTE		WRUSSY
2	YESENIA ALVAREZ	TRABAJO SOCIAL	—	WRUSSY
3	CESAR NARVAEZ	ING. RESIDENTE		WRUSSY
4	JORGE REYES	GUARDA DE SEGURIDAD		WRUSSY
5				
6				
7				
8				

WRUSSY INGENIEROS S.A.S.	REGISTRO DE ASISTENCIA	CÓDIGO: FOR-HSE-76 VERSION 1 FECHA APROBACION 01/06/2019

Fecha:	30-08-2024.	Lugar:	ITSI
Hora:	7:00 a. m.	Tema:	Uso de Protección respiratoria
Responsable:	SANDRA SANTIAGO	Cargo:	INPS SST (pausas activas).

Charla Diaria	Entrenamiento	Inducción	Capacitación	Otro
	X			

No.	NOMBRE	CARGO	FIRMA	EMPRESA
1	ELKIN REYES	AYUDANTE		WRUSSY
2	YESENIA ALVAREZ	TRABAJO SOCIAL		WRUSSY
3	CESAR NARVAEZ	ING. RESIDENTE		WRUSSY
4	JORGE REYES	GUARDA DE SEGURIDAD		WRUSSY
5				
6				
7				
8				

RUSSY INGENIEROS S.A.S.	REGISTRO DE ASISTENCIA SABADO.	CÓDIGO: FOR-HSE-76
		VERSION 1
		FECHA APROBACION 01/06/2019

Fecha:	31-08-2024,	Lugar:	ITSI
Hora:	7:00 a. m.	Tema:	Peligros en la Conducción
Responsable:	SANDRA SANTIAGO	Cargo:	INPS SST (pausas activas).

Charla Diaria	Entrenamiento	Inducción	Capacitación	Otro
X				

No.	NOMBRE	CARGO	FIRMA	EMPRESA
1	ELKIN REYES	AYUDANTE		WRUSSY
2	YESENIA ALVAREZ	TRABAJO SOCIAL		WRUSSY
3	CESAR NARVAEZ	ING. RESIDENTE		WRUSSY
4	JORGE REYES	GUARDA DE SEGURIDAD		WRUSSY
5				
6				
7				
8				

WRUSSY INGENIEROS S.A.S.	REGISTRO DE ASISTENCIA	CÓDIGO: FOR-HSE-76 VERSION 1 FECHA APROBACION 01/08/2019

Fecha:	02-09-2024.	Lugar:	ITSI
Hora:	7:00 a. m.	Tema:	(argos suspendidas en izaje.
Responsable:	SANDRA SANTIAGO	Cargo:	INPS SST (pausas activas).

Charla Diaria	Entrenamiento	Inducción	Capacitación	Otro
X				

No.	NOMBRE	CARGO	FIRMA	EMPRESA
1	ELKIN REYES	AYUDANTE		WRUSSY
2	YESENIA ALVAREZ	TRABAJO SOCIAL		WRUSSY
3	CESAR NARVAEZ	ING. RESIDENTE		WRUSSY
4	JORGE REYES	GUARDA DE SEGURIDAD		WRUSSY
5				
6				
7				
8				

RUSSY INGENIEROS S.A.S.	REGISTRO DE ASISTENCIA	CÓDIGO: FOR-HSE-76 VERSIÓN 1 FECHA APROBACION 01/08/2019

Fecha:	03-09-2024.	Lugar:	ITSI
Hora:	7:00 a. m.	Tema:	Barandas y protecciones.
Responsable:	SANDRA SANTIAGO	Cargo:	INPS SST (pausas activas).

Charla Diaria	X	Entrenamiento		Inducción		Capacitación		Otro	

No.	NOMBRE	CARGO	FIRMA	EMPRESA
1	ELKIN REYES	AYUDANTE		WRUSSY
2	YESENIA ALVAREZ	TRABAJO SOCIAL		WRUSSY
3	CESAR NARVAEZ	ING. RESIDENTE		WRUSSY
4	JORGE REYES	GUARDA DE SEGURIDAD		WRUSSY
5				
6				
7				
8				

RUSSY INGENIEROS S.A.S.	REGISTRO DE ASISTENCIA	CÓDIGO: FOR-HSE-76 VERSION 1 FECHA APROBACION 01/06/2019

Fecha:	04- 09 - 2024.	Lugar:	ITSI
Hora:	7:00 a. m.	Tema:	Identificación de peligros
Responsable:	SANDRA SANTIAGO	Cargo:	INPS SST (pasa) actual).

Charla Diaria	Entrenamiento	Inducción	Capacitación	Otro
X				

No.	NOMBRE	CARGO	FIRMA	EMPRESA
1	ELKIN REYES	AYUDANTE		WRUSSY
2	YESENIA ALVAREZ	TRABAJO SOCIAL		WRUSSY
3	CESAR NARVAEZ	ING. RESIDENTE		WRUSSY
4	JORGE REYES	GUARDA DE SEGURIDAD		WRUSSY
5				
6				
7				
8				

RUSSY INGENIEROS S.A.S.	REGISTRO DE ASISTENCIA	CÓDIGO: FOR-HSE-74
		VERSION 1
		FECHA APROBACION 01/08/2019

Fecha:	05-09-2024.	Lugar:	ITSI
Hora:	7:00 a. m.	Tema:	Que es un SPRC? (Sistema para detención de caidas
Responsable:	SANDRA SANTIAGO	Cargo:	INPS SST (pausas activas)

Charla Diaria	Entrenamiento	Inducción	Capacitación	Otro

No.	NOMBRE	CARGO	FIRMA	EMPRESA
1	ELKIN REYES	AYUDANTE		WRUSSY
2	YESENIA ALVAREZ	TRABAJO SOCIAL		WRUSSY
3	CESAR NARVAEZ	ING. RESIDENTE		WRUSSY
4	JORGE REYES	GUARDA DE SEGURIDAD		WRUSSY
5				
6				
7				
8				

RUSSY INGENIEROS S.A.S.	REGISTRO DE ASISTENCIA	CÓDIGO: FOR-HSE-76 VERSION 1 FECHA APROBACION 01/08/2019

Fecha:	06-09-2024.	Lugar:	ITSI
Hora:	7:00 a. m.	Tema:	linea de fuego
Responsable:	SANDRA SANTIAGO	Cargo:	INPS SST (pausas activas).

Charla Diaria	Entrenamiento	Inducción	Capacitación	Otro
	✓			

No.	NOMBRE	CARGO	FIRMA	EMPRESA
1	ELKIN REYES	AYUDANTE		WRUSSY
2	YESENIA ALVAREZ	TRABAJO SOCIAL		WRUSSY
3	CESAR NARVAEZ	ING. RESIDENTE	CESAR C.	WRUSSY
4	JORGE REYES	GUARDA DE SEGURIDAD	Jorge Reyes	WRUSSY
5				
6				
7				
8				

WRUSSY INGENIEROS S.A.S.

REGISTRO DE ASISTENCIA SABADO.

CÓDIGO: FOR-HSE-76
VERSION 1
FECHA APROBACION 01/06/2019

Fecha:	07-09-2024	Lugar:	ITSI
Hora:	7:00 a. m.	Tema:	Protección ocular cuidado de la vista
Responsable:	SANDRA SANTIAGO	Cargo:	INPS SST (pausas activas).

Charla Diaria	Entrenamiento	Inducción	Capacitación	Otro
X				

No.	NOMBRE	CARGO	FIRMA	EMPRESA
1	ELKIN REYES	AYUDANTE		WRUSSY
2	YESENIA ALVAREZ	TRABAJO SOCIAL		WRUSSY
3	CESAR NARVAEZ	ING. RESIDENTE		WRUSSY
4	JORGE REYES	GUARDA DE SEGURIDAD		WRUSSY
5				
6				
7				
8				

RUSSY INGENIEROS S.A.S.	REGISTRO DE ASISTENCIA	CÓDIGO: FOR-HSE-76 VERSION 1 FECHA APROBACION 01/06/2019

Fecha:	09-09-2024,	Lugar:	ITSI
Hora:	7:00 a. m.	Tema:	Tableros electricos
Responsable:	SANDRA SANTIAGO	Cargo:	INPS SST (pausas activas)

Charla Diaria	Entrenamiento	Inducción	Capacitación	Otro
	X			

No.	NOMBRE	CARGO	FIRMA	EMPRESA
1	ELKIN REYES	AYUDANTE		WRUSSY
2	YESENIA ALVAREZ	TRABAJO SOCIAL		WRUSSY
3	CESAR NARVAEZ	ING. RESIDENTE		WRUSSY
4	JORGE REYES	GUARDA DE SEGURIDAD		WRUSSY
5				
6				
7				
8				

RUSSY INGENIEROS S.A.S.	REGISTRO DE ASISTENCIA	CÓDIGO: FOR-HSE-76 VERSION 1 FECHA APROBACION 01/08/2019

Fecha:	10-09-2024	Lugar:	ITSI
Hora:	7:00 a. m.	Tema:	Autocuidado, una actitud
Responsable:	SANDRA SANTIAGO	Cargo:	INPS SST (pausas activas)

Charla Diaria	Entrenamiento	Inducción	Capacitación	Otro
	X			

No.	NOMBRE	CARGO	FIRMA	EMPRESA
1	ELKIN REYES	AYUDANTE		WRUSSY
2	YESENIA ALVAREZ	TRABAJO SOCIAL		WRUSSY
3	CESAR NARVAEZ	ING. RESIDENTE		WRUSSY
4	JORGE REYES	GUARDA DE SEGURIDAD		WRUSSY
5				
6				
7				
8				

RUSSY INGENIEROS S.A.S.	REGISTRO DE ASISTENCIA	CÓDIGO: FOR-HSE-76 VERSION 1 FECHA APROBACION 01/06/2019

Fecha:	11-09-2024.	Lugar:	ITSI
Hora:	7:00 a. m.	Tema:	Ergonomia
Responsable:	SANDRA SANTIAGO	Cargo:	INPS SST (pausa activa)

Charla Diaria | Entrenamiento | Inducción | Capacitación | Otro

No.	NOMBRE	CARGO	FIRMA	EMPRESA
1	ELKIN REYES	AYUDANTE		WRUSSY
2	YESENIA ALVAREZ	TRABAJO SOCIAL		WRUSSY
3	CESAR NARVAEZ	ING. RESIDENTE		WRUSSY
4	JORGE REYES	GUARDA DE SEGURIDAD		WRUSSY
5				
6				
7				
8				

ANEXO 4. PAUSAS ACTIVAS

WRUSSY INGENIEROS S.A.S.	REGISTRO DE ASISTENCIA	CÓDIGO: FOR-HSE-76
		VERSION 1
		FECHA APROBACION 01/08/2019

Fecha:	06-08-2024.	Lugar:	ITSI
Hora:	7:00 a. m.	Tema:	Estrés
Responsable:	SANDRA SANTIAGO	Cargo:	INPS SST (pausas activas)

Charla Diaria	X	Entrenamiento		Inducción		Capacitación		Otro	

No.	NOMBRE	CARGO	FIRMA	EMPRESA
1	ELKIN REYES	AYUDANTE		WRUSSY
2	YESENIA ALVAREZ	TRABAJO SOCIAL	Yesenia Alv	WRUSSY
3	CESAR NARVAEZ	ING. RESIDENTE		WRUSSY
4	JORGE REYES	GUARDA DE SEGURIDAD	Jorge Reyes	WRUSSY
5				
6				
7				
8				

RUSSY INGENIEROS S.A.S.	REGISTRO DE ASISTENCIA	CÓDIGO: FOR-HSE-76
		VERSION 1
		FECHA APROBACION 01/08/2019

Fecha:	08-08-2024.	Lugar:	ITSI
Hora:	7:00 a. m.	Tema:	Cuidado del equipo de protección personal
Responsable:	SANDRA SANTIAGO	Cargo:	INPS SST (paras actuar).

Charla Diaria		Entrenamiento		Inducción		Capacitación	X	Otro	

No.	NOMBRE	CARGO	FIRMA	EMPRESA
1	ELKIN REYES	AYUDANTE		WRUSSY
2	YESENIA ALVAREZ	TRABAJO SOCIAL		WRUSSY
3	CESAR NARVAEZ	ING. RESIDENTE		WRUSSY
4	JORGE REYES	GUARDA DE SEGURIDAD		WRUSSY
5				
6				
7				
8				

WRUSSY INGENIEROS S.A.S.	REGISTRO DE ASISTENCIA	CÓDIGO: FOR-HSE-76 VERSION 1 FECHA APROBACION 01/08/2019

Fecha:	09-08-2024.	Lugar:	ITSI
Hora:	7:00 a. m.	Tema:	Uso adecuado de Maquinarias
Responsable:	SANDRA SANTIAGO	Cargo:	INPS SST (para actividades)

Charla Diaria	Entrenamiento	Inducción	Capacitación	Otro
			X	

No.	NOMBRE	CARGO	FIRMA	EMPRESA
1	ELKIN REYES	AYUDANTE		WRUSSY
2	YESENIA ALVAREZ	TRABAJO SOCIAL		WRUSSY
3	CESAR NARVAEZ	ING. RESIDENTE		WRUSSY
4	JORGE REYES	GUARDA DE SEGURIDAD		WRUSSY
5				
6				
7				
8				

RUSSY INGENIEROS S.A.S.	REGISTRO DE ASISTENCIA SABADO.	CÓDIGO: FOR-HSE-76
		VERSION 1
		FECHA APROBACION 01/08/2019

Fecha:	10-08-2024.	Lugar:	ITSI
Hora:	7:00 a. m.	Tema:	Objetos que caen
Responsable:	SANDRA SANTIAGO	Cargo:	INPS SST (pausas activas)

Charla Diaria	Entrenamiento	Inducción	Capacitación	Otro
X				

No.	NOMBRE	CARGO	FIRMA	EMPRESA
1	ELKIN REYES	AYUDANTE		WRUSSY
2	YESENIA ALVAREZ	TRABAJO SOCIAL		WRUSSY
3	CESAR NARVAEZ	ING. RESIDENTE		WRUSSY
4	JORGE REYES	GUARDA DE SEGURIDAD	Jorge Reys	WRUSSY
5				
6				
7				
8				

WRUSSY INGENIEROS S.A.S.	REGISTRO DE ASISTENCIA	CÓDIGO: FOR-HSE-76 VERSION 1 FECHA APROBACION 01/09/2019

Fecha:	13-08-2024.	Lugar:	ITSI
Hora:	7:00 a. m.	Tema:	Caidas Resbalones en terrenos irregulares.
Responsable:	SANDRA SANTIAGO	Cargo:	INPS SST (Pausas Activas)

Charla Obra	X	Entrenamiento	Inducción	Capacitación	Otro

No.	NOMBRE	CARGO	FIRMA	EMPRESA
1	ELKIN REYES	AYUDANTE		WRUSSY
2	YESENIA ALVAREZ	TRABAJO SOCIAL		WRUSSY
3	CESAR NARVAEZ	ING. RESIDENTE		WRUSSY
4	JORGE REYES	GUARDA DE SEGURIDAD		WRUSSY
5				
6				
7				
8				

RUSSY INGENIEROS S.A.S.	REGISTRO DE ASISTENCIA	CÓDIGO: FOR-HSE-76 VERSION 1 FECHA APROBACION 01/08/2019

Fecha:	14-08-2024.	Lugar:	ITSI
Hora:	7:00 a. m.	Tema:	Orden y aseo. (Pausas Activas)
Responsable:	SANDRA SANTIAGO	Cargo:	INPS SST

Charla Diaria:	Y	Inducción	Capacitación	Otro

No.	NOMBRE	CARGO	FIRMA	EMPRESA
1	ELKIN REYES	AYUDANTE		WRUSSY
2	YESENIA ALVAREZ	TRABAJO SOCIAL		WRUSSY
3	CESAR NARVAEZ	ING. RESIDENTE		WRUSSY
4	JORGE REYES	GUARDA DE SEGURIDAD		WRUSSY
5				
6				
7				
8				

WRUSSY INGENIEROS S.A.S.

REGISTRO DE ASISTENCIA

CÓDIGO: FOR-HSE-76
VERSION 1
FECHA APROBACION 01/08/2019

Fecha:	16-08-2024.	Lugar:	ITSI
Hora:	7:00 a. m.	Tema:	Calentamiento global
Responsable:	SANDRA SANTIAGO	Cargo:	INPS SST (pausas activas).

Charla Diaria	Entrenamiento	Inducción	Capacitación	Otro
	X			

No.	NOMBRE	CARGO	FIRMA	EMPRESA
1	ELKIN REYES	AYUDANTE		WRUSSY
2	YESENIA ALVAREZ	TRABAJO SOCIAL		WRUSSY
3	CESAR NARVAEZ	ING. RESIDENTE		WRUSSY
4	JORGE REYES	GUARDA DE SEGURIDAD		WRUSSY
5				
6				
7				
8				

WRUSSY INGENIEROS S.A.S.	REGISTRO DE ASISTENCIA SABADO	CÓDIGO: FOR-HSE-76
		VERSION 1
		FECHA APROBACION 01/08/2019

Fecha:	17-08-2024.	Lugar:	ITSI
Hora:	7:00 a. m.	Tema:	Manejo de herramienta
Responsable:	SANDRA SANTIAGO	Cargo:	INPS SST (pausas activas).

Charla Diaria: X | Entrenamiento | Inducción | Capacitación | Otro

No.	NOMBRE	CARGO	FIRMA	EMPRESA
1	ELKIN REYES	AYUDANTE		WRUSSY
2	YESENIA ALVAREZ	TRABAJO SOCIAL		WRUSSY
3	CESAR NARVAEZ	ING. RESIDENTE		WRUSSY
4	JORGE REYES	GUARDA DE SEGURIDAD	Jorge Reyes	WRUSSY
5				
6				
7				
8				

WRUSSY INGENIEROS S.A.S.	REGISTRO DE ASISTENCIA	CÓDIGO: FOR-HSE-76 VERSION 1 FECHA APROBACION 01/08/2019

Fecha:	20-08-2024.	Lugar:	ITSI
Hora:	7:00 a. m.	Tema:	Comunicación Abierta.
Responsable:	SANDRA SANTIAGO	Cargo:	INPS SST (Pausas Activas).

Charla Diaria: X. Entrenamiento: | Inducción: | Capacitación: | Otro:

No.	NOMBRE	CARGO	FIRMA	EMPRESA
1	ELKIN REYES	AYUDANTE		WRUSSY
2	YESENIA ALVAREZ	TRABAJO SOCIAL		WRUSSY
3	CESAR NARVAEZ	ING. RESIDENTE		WRUSSY
4	JORGE REYES	GUARDA DE SEGURIDAD		WRUSSY
5				
6				
7				
8				

RUSSY INGENIEROS S.A.S.	REGISTRO DE ASISTENCIA	CÓDIGO: FOR-HSE-78 VERSION 1 FECHA APROBACION 01/08/2019

Fecha:	21-08-2024.	Lugar:	ITSI
Hora:	7:00 a. m.	Tema:	Identificador de peligros
Responsable:	SANDRA SANTIAGO	Cargo:	INPS SST (causas actuos).

Charla Diaria	Entrenamiento	Inducción	Capacitación	Otro
X				

No.	NOMBRE	CARGO	FIRMA	EMPRESA
1	ELKIN REYES	AYUDANTE		WRUSSY
2	YESENIA ALVAREZ	TRABAJO SOCIAL		WRUSSY
3	CESAR NARVAEZ	ING. RESIDENTE		WRUSSY
4	JORGE REYES	GUARDA DE SEGURIDAD		WRUSSY
5				
6				
7				
8				

RUSSY INGENIEROS S.A.S.

REGISTRO DE ASISTENCIA

CÓDIGO: FOR-HSE-76
VERSION 1
FECHA APROBACION 01/06/2019

Fecha:	22-08-2024.	Lugar:	ITSI
Hora:	7:00 a. m.	Tema:	Dias de lluvias
Responsable:	SANDRA SANTIAGO	Cargo:	INPS SST (pausas activas)

Charla Diaria: X | Entrenamiento | Inducción | Capacitación | Otro

No.	NOMBRE	CARGO	FIRMA	EMPRESA
1	ELKIN REYES	AYUDANTE		WRUSSY
2	YESENIA ALVAREZ	TRABAJO SOCIAL		WRUSSY
3	CESAR NARVAEZ	ING. RESIDENTE		WRUSSY
4	JORGE REYES	GUARDA DE SEGURIDAD		WRUSSY
5				
6				
7				
8				

WRUSSY INGENIEROS S.A.S.	REGISTRO DE ASISTENCIA	CÓDIGO: FOR-HSE-76 VERSION 1 FECHA APROBACION 01/08/2019

Fecha:	23-08-2024.	Lugar:	ITSI
Hora:	7:00 a. m.	Tema:	Recomendaciones para evitar accidentes.
Responsable:	SANDRA SANTIAGO	Cargo:	INPS SST (pausas activas).

Charla Diaria	Entrenamiento	Inducción	Capacitación	Otro
X				

No.	NOMBRE	CARGO	FIRMA	EMPRESA
1	ELKIN REYES	AYUDANTE		WRUSSY
2	YESENIA ALVAREZ	TRABAJO SOCIAL		WRUSSY
3	CESAR NARVAEZ	ING. RESIDENTE		WRUSSY
4	JORGE REYES	GUARDA DE SEGURIDAD		WRUSSY
5				
6				
7				
8				

WRUSSY INGENIEROS S.A.S.	REGISTRO DE ASISTENCIA	CÓDIGO: FOR-HSE-76 VERSION 1 FECHA APROBACION 01/08/2019

Fecha:	26-08-2024.	Lugar:	ITSI
Hora:	7:00 a. m.	Tema:	Estres laboral
Responsable:	SANDRA SANTIAGO	Cargo:	INPS SST (pausas activas).

Charla Diaria	Entrenamiento	Inducción	Capacitación	Otro
X				

No.	NOMBRE	CARGO	FIRMA	EMPRESA
1	ELKIN REYES	AYUDANTE		WRUSSY
2	YESENIA ALVAREZ	TRABAJO SOCIAL		WRUSSY
3	CESAR NARVAEZ	ING. RESIDENTE		WRUSSY
4	JORGE REYES	GUARDA DE SEGURIDAD		WRUSSY
5				
6				
7				
8				

RUSSY INGENIEROS S.A.S.

REGISTRO DE ASISTENCIA SABADO

CÓDIGO: FOR-HSE-76
VERSIÓN 1
FECHA APROBACION 01/08/2019

Fecha:	29-08-2024.	Lugar:	ITSI
Hora:	7:00 a. m.	Tema:	la unión hace la fuerza.
Responsable:	SANDRA SANTIAGO	Cargo:	INPS SST (pausas activas)

Charla Diaria	Entrenamiento	Inducción	Capacitación	Otro
X				

No.	NOMBRE	CARGO	FIRMA	EMPRESA
1	ELKIN REYES	AYUDANTE		WRUSSY
2	YESENIA ALVAREZ	TRABAJO SOCIAL	—	WRUSSY
3	CESAR NARVAEZ	ING. RESIDENTE		WRUSSY
4	JORGE REYES	GUARDA DE SEGURIDAD		WRUSSY
5				
6				
7				
8				

WRUSSY INGENIEROS S.A.S.	REGISTRO DE ASISTENCIA	CÓDIGO: FOR-HSE-76 VERSION 1 FECHA APROBACION 01/06/2019

Fecha:	30-08-2024.	Lugar:	ITSI
Hora:	7:00 a. m.	Tema:	Uso de Protección respiratoria
Responsable:	SANDRA SANTIAGO	Cargo:	INPS SST (pausas activas).

Charla Diaria	Entrenamiento	Inducción	Capacitación	Otro
X				

No.	NOMBRE	CARGO	FIRMA	EMPRESA
1	ELKIN REYES	AYUDANTE		WRUSSY
2	YESENIA ALVAREZ	TRABAJO SOCIAL		WRUSSY
3	CESAR NARVAEZ	ING. RESIDENTE		WRUSSY
4	JORGE REYES	GUARDA DE SEGURIDAD		WRUSSY
5				
6				
7				
8				

RUSSY INGENIEROS S.A.S.	REGISTRO DE ASISTENCIA SABADO.	CÓDIGO: FOR-HSE-76
		VERSION 1
		FECHA APROBACION 01/06/2019

Fecha:	31-08-2024,	Lugar:	ITSI
Hora:	7:00 a. m.	Tema:	Peligros en la Conducción
Responsable:	SANDRA SANTIAGO	Cargo:	INPS SST (pausas activas).

Charla Diaria	Entrenamiento	Inducción	Capacitación	Otro
X				

No.	NOMBRE	CARGO	FIRMA	EMPRESA
1	ELKIN REYES	AYUDANTE		WRUSSY
2	YESENIA ALVAREZ	TRABAJO SOCIAL		WRUSSY
3	CESAR NARVAEZ	ING. RESIDENTE		WRUSSY
4	JORGE REYES	GUARDA DE SEGURIDAD		WRUSSY
5				
6				
7				
8				

WRUSSY INGENIEROS S.A.S.	REGISTRO DE ASISTENCIA	CÓDIGO: FOR-HSE-76 VERSION 1 FECHA APROBACION 01/08/2019

Fecha:	02-09-2024.	Lugar:	ITSI
Hora:	7:00 a. m.	Tema:	(argos suspendidas en izaje.
Responsable:	SANDRA SANTIAGO	Cargo:	INPS SST (pausas activas).

Charla Diaria	Entrenamiento	Inducción	Capacitación	Otro
X				

No.	NOMBRE	CARGO	FIRMA	EMPRESA
1	ELKIN REYES	AYUDANTE		WRUSSY
2	YESENIA ALVAREZ	TRABAJO SOCIAL		WRUSSY
3	CESAR NARVAEZ	ING. RESIDENTE		WRUSSY
4	JORGE REYES	GUARDA DE SEGURIDAD		WRUSSY
5				
6				
7				
8				

RUSSY INGENIEROS S.A.S.	REGISTRO DE ASISTENCIA	CÓDIGO: FOR-HSE-76 VERSIÓN 1 FECHA APROBACION 01/08/2019

Fecha:	03-09-2024.	Lugar:	ITSI
Hora:	7:00 a. m.	Tema:	Barandas y protecciones.
Responsable:	SANDRA SANTIAGO	Cargo:	INPS SST (pausas activas).

Charla Diaria	X	Entrenamiento		Inducción		Capacitación		Otro	

No.	NOMBRE	CARGO	FIRMA	EMPRESA
1	ELKIN REYES	AYUDANTE		WRUSSY
2	YESENIA ALVAREZ	TRABAJO SOCIAL		WRUSSY
3	CESAR NARVAEZ	ING. RESIDENTE		WRUSSY
4	JORGE REYES	GUARDA DE SEGURIDAD		WRUSSY
5				
6				
7				
8				

RUSSY INGENIEROS S.A.S.	REGISTRO DE ASISTENCIA	CÓDIGO: FOR-HSE-76 VERSION 1 FECHA APROBACION 01/06/2019

Fecha:	04- 09 - 2024.	Lugar:	ITSI
Hora:	7:00 a. m.	Tema:	Identificación de peligros
Responsable:	SANDRA SANTIAGO	Cargo:	INPS SST (pasa) actual).

Charla Diaria	Entrenamiento	Inducción	Capacitación	Otro
X				

No.	NOMBRE	CARGO	FIRMA	EMPRESA
1	ELKIN REYES	AYUDANTE		WRUSSY
2	YESENIA ALVAREZ	TRABAJO SOCIAL		WRUSSY
3	CESAR NARVAEZ	ING. RESIDENTE		WRUSSY
4	JORGE REYES	GUARDA DE SEGURIDAD		WRUSSY
5				
6				
7				
8				

RUSSY INGENIEROS S.A.S.	REGISTRO DE ASISTENCIA	CÓDIGO: FOR-HSE-74
		VERSION 1
		FECHA APROBACION 01/08/2019

Fecha:	05-09-2024.	Lugar:	ITSI
Hora:	7:00 a. m.	Tema:	Que es un SPRC? (Sistema para detención de caidas
Responsable:	SANDRA SANTIAGO	Cargo:	INPS SST (pausas activas)

Charla Diaria	Entrenamiento	Inducción	Capacitación	Otro

No.	NOMBRE	CARGO	FIRMA	EMPRESA
1	ELKIN REYES	AYUDANTE		WRUSSY
2	YESENIA ALVAREZ	TRABAJO SOCIAL		WRUSSY
3	CESAR NARVAEZ	ING. RESIDENTE		WRUSSY
4	JORGE REYES	GUARDA DE SEGURIDAD		WRUSSY
5				
6				
7				
8				

RUSSY INGENIEROS S.A.S.	REGISTRO DE ASISTENCIA	CÓDIGO: FOR-HSE-76 VERSION 1 FECHA APROBACION 01/08/2019

Fecha:	06-09-2024.	Lugar:	ITSI
Hora:	7:00 a. m.	Tema:	linea de fuego
Responsable:	SANDRA SANTIAGO	Cargo:	INPS SST (posibles actividades).

Charla Diaria	Entrenamiento	Inducción	Capacitación	Otro
	✓			

No.	NOMBRE	CARGO	FIRMA	EMPRESA
1	ELKIN REYES	AYUDANTE		WRUSSY
2	YESENIA ALVAREZ	TRABAJO SOCIAL		WRUSSY
3	CESAR NARVAEZ	ING. RESIDENTE	CESAR C.	WRUSSY
4	JORGE REYES	GUARDA DE SEGURIDAD	Jorge Reyes	WRUSSY
5				
6				
7				
8				

WRUSSY INGENIEROS S.A.S.

REGISTRO DE ASISTENCIA SABADO.

CÓDIGO: FOR-HSE-76
VERSION 1
FECHA APROBACION 01/06/2019

Fecha:	07-09-2024	Lugar:	ITSI
Hora:	7:00 a. m.	Tema:	Protección ocular cuidado de la vista
Responsable:	SANDRA SANTIAGO	Cargo:	INPS SST (pausas activas).

Charla Diaria	Entrenamiento	Inducción	Capacitación	Otro
X				

No.	NOMBRE	CARGO	FIRMA	EMPRESA
1	ELKIN REYES	AYUDANTE		WRUSSY
2	YESENIA ALVAREZ	TRABAJO SOCIAL		WRUSSY
3	CESAR NARVAEZ	ING. RESIDENTE		WRUSSY
4	JORGE REYES	GUARDA DE SEGURIDAD		WRUSSY
5				
6				
7				
8				

RUSSY INGENIEROS S.A.S.	REGISTRO DE ASISTENCIA	CÓDIGO: FOR-HSE-76 VERSION 1 FECHA APROBACION 01/06/2019

Fecha:	09-09-2024,	Lugar:	ITSI
Hora:	7:00 a. m.	Tema:	Tableros electricos
Responsable:	SANDRA SANTIAGO	Cargo:	INPS SST (pausas activas)

Charla Diaria	X	Entrenamiento		Inducción		Capacitación		Otro	

No.	NOMBRE	CARGO	FIRMA	EMPRESA
1	ELKIN REYES	AYUDANTE		WRUSSY
2	YESENIA ALVAREZ	TRABAJO SOCIAL		WRUSSY
3	CESAR NARVAEZ	ING. RESIDENTE		WRUSSY
4	JORGE REYES	GUARDA DE SEGURIDAD		WRUSSY
5				
6				
7				
8				

RUSSY INGENIEROS S.A.S.	REGISTRO DE ASISTENCIA	CÓDIGO: FOR-HSE-76 VERSION 1 FECHA APROBACION 01/08/2019

Fecha:	10-09-2024	Lugar:	ITSI
Hora:	7:00 a. m.	Tema:	Autocuidado, una actitud
Responsable:	SANDRA SANTIAGO	Cargo:	INPS SST (pausas activas)

Charla Diaria	Entrenamiento	Inducción	Capacitación	Otro
	X			

No.	NOMBRE	CARGO	FIRMA	EMPRESA
1	ELKIN REYES	AYUDANTE		WRUSSY
2	YESENIA ALVAREZ	TRABAJO SOCIAL		WRUSSY
3	CESAR NARVAEZ	ING. RESIDENTE		WRUSSY
4	JORGE REYES	GUARDA DE SEGURIDAD		WRUSSY
5				
6				
7				
8				

RUSSY INGENIEROS S.A.S.	REGISTRO DE ASISTENCIA	CÓDIGO: FOR-HSE-76 VERSION 1 FECHA APROBACION 01/06/2019

Fecha:	11-09-2024.	Lugar:	ITSI
Hora:	7:00 a. m.	Tema:	Ergonomia
Responsable:	SANDRA SANTIAGO	Cargo:	INPS SST (pausa activa)

Charla Diaria | Entrenamiento | Inducción | Capacitación | Otro

No.	NOMBRE	CARGO	FIRMA	EMPRESA
1	ELKIN REYES	AYUDANTE		WRUSSY
2	YESENIA ALVAREZ	TRABAJO SOCIAL		WRUSSY
3	CESAR NARVAEZ	ING. RESIDENTE		WRUSSY
4	JORGE REYES	GUARDA DE SEGURIDAD		WRUSSY
5				
6				
7				
8				

ANEXO 5. COPASST

RUSSY INGENIEROS S.A.S.	ACTA DE REUNIÓN	CÓDIGO DE-FOR-01
		VERSIÓN 2
		FECHA DE APROBACIÓN: 08/01/2019

FECHA REUNION: 21/08/2024 **HORA: 11:00 AM** **LUGAR: I.T.S.I BARRANCABERMEJA** **ACTA NO. 18**

REUNIÓN CONVOCADA POR	Sandra Milena Santiago Camacho
TIPO DE REUNIÓN	REUNIÓN N° 18 - GESTION HSE
CONTRATO N°	**No. 0756-23**
OBJETO DE LA REUNION	"CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DEL COMEDOR Y COCINA DEL INSTITUTO TÉCNICO SUPERIOR INDUSTRIAL EN EL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA"
ORGANIZADOR	Sandra Milena Santiago Camacho
APUNTADOR	Sandra Milena Santiago Camacho
ASISTENTES	Sandra Milena Santiago Camacho

TEMAS DE DISCUSIÓN
1. Comunicación de Peligros
2. ¿Qué es la Norma de Comunicación de Peligros?
3. Principales componentes de la Norma
4. Responsabilidades a saber por el trabajador

DESARROLLO TEMAS DE DISCUSIÓN

1. COMUNICACIÓN DE PELIGROS

El propósito del Programa de Comunicación de Peligros es informar a todos los empleados sobre los componentes principales de dicho programa en la compañía. Las normas de la OSHA referentes al Programa de Comunicación de Peligros pueden encontrarse en la Sección 29 CFR1910.1200.

2. ¿QUÉ ES LA NORMA DE COMUNICACIÓN DE PELIGROS?

La norma de comunicación de peligros fue desarrollada para proteger a los trabajadores contra productos químicos peligrosos. Casi todos los lugares de trabajo tienen por lo menos un producto químico peligroso. La norma estipula que tanto los trabajadores como los empleadores trabajen en unión, para proteger el lugar de trabajo.

3. PRINCIPALES COMPONENTES DE LA NORMA

- Determinación de productos químicos peligrosos (inventario de productos químicos)
- Hojas de datos de seguridad del material (MSDS)
- Etiquetas y otras formas de advertencia

- Información y entrenamiento de empleados
- Programa escrito

4. RESPONSABILIDADES A SABER POR EL TRABAJADOR

- Qué productos químicos peligrosos hay en su lugar de trabajo.
- Cómo leer rótulos de recipientes.
- Cómo utilizar el equipo de protección personal apropiado.
- Dónde están localizadas las hojas de datos de seguridad del material y cómo leerlas.
- Cómo responder ante una fuga importante de un producto químico.
- Dónde reportar riesgos descubiertos en su lugar de trabajo.
- Quién en su lugar de trabajo puede responder preguntas acerca del programa de comunicación de peligros.


CONCLUSIONES

- Los productos químicos son una parte importante del trabajo que hacemos, pero pueden ser peligrosos y aún mortales. Asegúrese de saber cómo obtener información sobre los productos químicos en su área y protéjase. ¡Usted puede no tener una segunda oportunidad!

COMPROMISOS

- Se solicita verificar si dentro del cronograma de capacitaciones se incluyen temas sobre la comunicación sobre los peligros.

FIRMA ASISTENTES

NOMBRE	CARGO	FIRMA
Sandra Santiago	Inspectora SST	
Elkin Reyes	Ayudante	

ANEXO 6. CCL

RUSSY INGENIEROS S.A.S.	ACTA DE REUNIÓN	CÓDIGO DE-FOR-01
		VERSIÓN 2
		FECHA DE APROBACIÓN: 08/01/2019

FECHA REUNION: 07/10/2024 **HORA: 11:00 AM** **LUGAR: I.T.S.I BARRANCABERMEJA** **ACTA NO. 18**

REUNIÓN CONVOCADA POR	Sandra Milena Santiago Camacho
TIPO DE REUNIÓN	REUNIÓN N° 18 - GESTION HSE
CONTRATO N°	**No. 0756-23**
OBJETO DE LA REUNION	"CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DEL COMEDOR Y COCINA DEL INSTITUTO TÉCNICO SUPERIOR INDUSTRIAL EN EL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA"
ORGANIZADOR	Sandra Milena Santiago Camacho
APUNTADOR	Sandra Milena Santiago Camacho
ASISTENTES	Sandra Milena Santiago Camacho

TEMAS DE DISCUSIÓN
1. Violencia en el Lugar de Trabajo
2. Trabajadores en Riesgo de Violencia
3. Protección contra la Violencia

ESARROLLO TEMAS DE DISCUSIÓN

1. VIOLENCIA EN EL LUGAR DE TRABAJO

Los objetivos de esta charla son suministrar información relacionada con los diversos riesgos de la violencia en el lugar de trabajo y ofrecer algunos consejos útiles para evitar confrontaciones peligrosas y violentas con los compañeros de trabajo y otras personas en el lugar de trabajo. La violencia en el lugar de trabajo se está convirtiendo en una causa principal de muerte en la industria.

2. TRABAJADORES EN RIESGO DE VIOLENCIA

- Trabajadores que cargan grandes sumas de dinero.
- Trabajadores que laboran en grupos pequeños, en áreas aisladas.
- Trabajadores que utilizan joyas costosas.
- Trabajadores que se estacionan en lugares con poca iluminación.
- Trabajadores que caminan solos en áreas desprotegidas.

3. PROTECCIÓN CONTRA LA VIOLENCIA

- Utilice ropa discreta y evite usar joyas.
- Estaciónese en áreas bien iluminadas.

RUSSY INGENIEROS S.A.S.	ACTA DE REUNIÓN	CÓDIGO DE-FOR-01
		VERSIÓN 2
		FECHA DE APROBACIÓN: 08/01/2019

- No cargue grandes cantidades de dinero en efectivo mientras esté en su oficio, a menos que sea absolutamente necesario.
- Camine hasta el carro acompañado por alguien.
- Cargue aerosoles lacrimógenos o de pimienta. Revise las leyes locales o estatales para verificar que estas sustancias sean legales en su área. Aplique el aerosol en el rostro del atacante. Si los aerosoles son ilegales en su área, utilice un silbato.
- Esté alerta a su alrededor y a la gente que lo rodea. Mantenga la cabeza en alto cuando camine.
- Todos los accidentes violentos deben reportarse a los oficiales de policía local y a los funcionarios de seguridad de la compañía.

CONCLUSIONES

- ¡El saber que usted está en peligro y evitar la violencia pueden salvar su vida! Con la tendencia hoy día a la rebaja de personal, la violencia en el lugar de trabajo se está volviendo muy común. ¡Conozca las reglas, utilice el sentido común y mantenga sus defensas activas!

COMPROMISOS

- Se solicita verificar si dentro del cronograma de capacitaciones se incluyen temas sobre las violencias que se pueden presentar en el lugar de trabajo.

FIRMA ASISTENTES

NOMBRE	CARGO	FIRMA
Elkin Reyes	Ayudante	Elkin Reyes
Sandra Santiago	Inspectora SST	

ANEXO 7. ATS-PERMISOS

RUSSY INGENIEROS S.A.S.	ANALISIS SEGURO DE TRABAJO	CÓDIGO HSE-FOR-18
		VERSIÓN 2
		FECHA DE APROBACION: 05/08/2019

Empresa: RUSSY INGENIEROS S.A.S

Lugar de Trabajo: ITST BARRANCABERMEJA

Fecha de Inicio 06-08-2024

Fecha de finalización 14-08-2024

Replanteo de terreno para placa, fundida en concreto para placa de anden, impermeabilización con manto asfaltico en placa de cubierta

Descripción de la tarea a realizar:

PARA ESTE TRABAJO SE REQUIERE PERMISO DE:

TRABAJO EN ALTURA		ESPACIO CONFINADO		CALIENTE	X
ENERGIA PELIGROSAS		ELECTRICO		OTRO, CUAL?	

Cedula, Nombre y Apellidos de los Trabajadores Ejecutores	
Elkin Reyes CC. 1.096.218.798	
Rodolfo Lopalino CC. 1057272358	
Fabian perez CC. 1072750684	

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS A UTILIZAR

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		Indique cada una de las herramientas a utilizar.
Manuales	X	picas, barras, palas, Carretillas.
Eléctricas	X	Soldadora
Neumáticas		
Hidráulicas		
Mecánicas		
Otras		

ANALISIS DE LA TAREA

¿Qué tan alto se encuentra el lugar de trabajo?	Nivel de piso
¿Cuál es el sistema de acceso al lugar de trabajo?	Puerta frontal Colegio ITSI
¿Cuáles son los sistemas de prevención y protección requeridos?	Casco, guantes, gafas, botas
¿Cuáles son los elementos de protección requeridos?	EPP, EPI
¿Cuántos trabajadores se requieren?	3
¿Qué materiales y recursos van a utilizarse?	Arena, Cemento, asfalto mucho, pintura
¿Existen hoyos o grietas debajo del área de trabajo?	SI
¿Hay peligro de resbalar o tropezar alrededor del área de trabajo?	NO
¿Qué otros peligros hay en el lugar de trabajo? (chispas, electricidad, químicos, superficie resbaladiza, superficies calientes, objetos filosos, cargas pesadas, etc.)	NO

Pasos básicos de la tarea	Peligros/Consecuencias	CONTROLES	RESPONSABLE
* Peligros Comunes a las actividades del trabajo.	* Partículas en suspensión, punchazos, laceraciones	* Inspecciones previamente a la zona de trabajo	Ing Residente
	* Posturas incomodas del trabajo		Insp SST
	* Despejar el area de trabajo	* Inspección del area	Ing Residente
	caídas al mismo nivel, golpe por manipulacion de	* uso de EPP, capacitación del personal	Insp SST
* Instalación de Cercados prefabricados en concreto	cortes y materiales.	sobre el uso de ellos	Ing Residente
	* Atrapamiento, riesgo ergonomico	* inspeccion del area	Insp SST
	* Sobre esfuerzo y caidas del mismo nivel de objetos	* uso EPP.	Ing Residente
	* inhalación y particulas de polvo	* Divulgación de procedimientos ATS a	Insp SST
	* Atrapamiento, Fracturas golpes.	diario y sus respectivas acciones y controles	Ing Residente
* Instalación de Bordillos en Concreto prefabricado	* Contusiones, esguince y fracturas.	* Golpes, lesiones menores, lesiones ovulares	Insp SST
		* intoxicación en la piel	Ing Residente
		* Atrapamiento	Insp SST
* Aplicación de pintura en Aceite en Base metalica de la estructura.	* Malas posturas	* Uso de tapabocas.	Ing Residente
	* trabajos en Alturas	* Señalización del area de trabajo	Insp SST
	* caídas a diferentes niveles.	* uso EPP.	Ing Residente
		* personal capacitado en la labor.	Insp SST
* impermeabilización con mato asfaltico en placa de concreto	* Posturas prolongadas, arrodillado, movimientos repetitivos	* higiene postural previos laborales, rotación del	Ing Residente
	* Estado general del equipo	personal, inspección	Insp SST
	Sin protección defectuosos, Quemaduras	preoperacional de equipo	Ing Residente
		* Uso de guantes de seguridad.	Insp SST
	* inhalación absorción, ingestion de productos químicos	* Seguir el procedimiento de las hojas de seguridad para los productos	Ing Residente
	* Exposición a microorganismos patógenos como virus, bacterias, parasitos, hongos	químicos	Insp SST
		* Uso de guantes de seguridad	Ing Residente
			Insp SST

FIRMA INSPECTOR HSEQ	
FIRMA ASESORA HSEQ	
RESIDENTE DE OBRA	

RUSSY INGENIEROS S.A.S.	ANALISIS SEGURO DE TRABAJO	CÓDIGO HSE-FOR-59
		VERSIÓN 2
		FECHA DE APROBACIÓN: 08/08/2019

Empresa: RUSSY INGENIEROS S.A.S

Lugar de Trabajo: ITST BARRANCABERMEJA

Fecha de Inicio: 06- 08- 2024

Fecha de finalización: 11 - 09 - 2024.

Descripción de la tarea a realizar: * Instalación y reconformación de la cancha polideportiva * pintura de malla de cerramiento * estuco y pintura de exteriores * pulida de piso en granito y area de cancha * instalaciones electricas.

PARA ESTE TRABAJO SE REQUIERE PERMISO DE:

TRABAJO EN ALTURA	ESPACIO CONFINADO	CALIENTE	X
ENERGIA PELIGROSAS	ELECTRICO	OTRO, CUAL?	

Nombre, Cédula y Apellidos de los Trabajadores Expuestos

ELKIN REYES CC. 1.096.218.748.	
RODOLFO RAPALINO CC. 1052722358	
FABIAN PEREZ CC. 1092750684	
JOSE TORRES CC. 7475525	
JAVIER CANO CC. 1096192685	

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS A UTILIZAR

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		Indique cada una de las herramientas a utilizar.
Manuales	X	Pala, picas, carretillas, barra, pana, Espatula, Multimetro, anzas, Regla, Flexometro.
Eléctricos	X	Alicate, taladro,
Neumáticos		
Hidráulicos		
Electrónicos	X	Rana Compactadora.
Otras		

ANALISIS DE LA TAREA	
¿Qué tan alto se encuentra el lugar de trabajo?	Nivel de piso y a 6mts de altura.
¿Cuál es el sistema de acceso al lugar de trabajo?	Puerta trasera del codigo ITSI.
¿Cuáles son los sistemas de prevención y protección requeridos?	Casco, guantes, careta, gafas, botas, peto
¿Cuáles son los elementos de protección requeridos?	EPP. EPI
¿Cuántos trabajadores se requieren?	4.
¿Qué materiales y recursos van a utilizarse?	Pintura, Cemento, Estuco, pintura,
¿Existen huecos o grietas debajo del área de trabajo?	SI
¿Hay peligro de resbalar o tropezar alrededor del área de trabajo?	SI
¿Qué otros peligros hay en el lugar de trabajo? (chispas, electricidad, químicos, superficie resbaladiza, superficies calientes, objetos filosos, cargas pesadas, etc.)	SI

Pasos esenciales de la tarea	Riesgos/Consecuencias	CONTROLES	RESPONSABLE
* Peligros comunes a las actividades del trabajo.	* Partículas en suspensión, golpeadas, lesiones, caídas a nivel.	* Inspecciones frecuentes a la zona de trabajo.	Ing Residente Insp SST
* Replanteo y Reconformación del terreno de Cancha polideportiva.	* Posturas incomodas del trabajo * Desplazar el área de trabajo Caídas al mismo nivel, golpe x manipulación de ítems y materiales * Atrapamientos, riesgo órgano móvil	* Inspección del uso de epp, capacitación del personal sobre el uso de ítems. * Inspección del área.	Ing Residente Insp SST Ing Residente Insp SST
* Instalaciones eléctricas. Operaciones donde involucren riesgo eléctrico, cambio de luminarias, Canaleta, cableados eléctricos	* Caídas esfuerzo y caídas del mismo nivel de objetos * Sobre esfuerzos y caídas del mismo nivel de objetos * inhalación y partículas de polvo * Contacto directo-indirecto durante la conexión de nuevos puntos eléctricos. * Quemaduras de primer y segundo grado. * Choques eléctricos, cortes, laceraciones, golpes, fracturas, esguinces, amputaciones retraso de obra. * Golpes caídas, tropiezos o torceduras generados por desorden general de la obra.	* Uso de EPP * Divulgación de procedimientos ATS a diario y uso respectivos controles y acciones. * Desenergizar el área de trabajo, estar atento a la actividad a desarrollar inspeccionar el área de trabajo. Verificar el sistema eléctrico, ausencia de tensión, aplicar las 5 reglas de oro, de acuerdo al reglamento Técnico de instalaciones eléctricas RETIE.	Ing Residente Insp SST Ing Residente Insp SST Ing Residente Insp SST Ing Residente Insp SST
* Pintura de malla de cerramiento		* Hacer pausas activas para descansar.	Ing Residente Insp SST
* Estuco y pintura de exteriores.	* Posturas prolongadas arrodillado Movimientos repetitivos * Estado general del equipo Sin protección defectuoso Quemaduras.	* Propagación del ítem. * Uso de guantes * Seguir procedimiento de la hoja de seguridad para productos.	Ing Residente Insp SST Ing Residente Insp SST Ing Residente Insp SST

FIRMA INSPECTOR HSEQ	
FIRMA ASESORA HSEQ	
RESIDENTE DE OBRA	

ANEXO 8. INSPECCIONES

RUSSY INGENIEROS S.A.S.	FORMATO DE INSPECCIÓN DE BOTIQUINES	CODIGO: HSE-FOR-05
		VERSION: 1
		FECHA APROBACION: 08/01/2019

Objeto:	Construcción y dotación de cocina y comedor del colegio ITST. de Sacaba.		
N° contrato	0956-22		
Entidad Contratante:	alcaldia	**NIT:**	
Empresa Contratista:	Wessy Ingenieros SAS	**NIT:**	901109885-1
Ubicación del botiquin:			
Tipo de botiquin:	Móvil X	Fijo	**Señalización:** Tiene No tiene

	ELEMENTO	Cantidad mínima	Cumple SI = √ No=X	Fecha de Vencimiento	OBSERVACIONES
	Antisepticos				
1	Solución salina o suero fisiológico en bolsa	500ml	✓	JUN 2025	
2	Alcohol antiséptico 70% (botella plástica) Limpieza instrumental	120ml	✓	NOV 2025	
3	Yodopovidona- Isodine Espuma	60ml	✓	JUN 2025	
4	Jabón Liquido Antibacterial	60ml	✓		
	Elementos de Protección Personal				
5	Guantes látex desechables (empaque individual)	6 pares	✓	04-11-25	
6	Tapabocas desechables (empaque individual)	4	✓		
7	Monogafas (empaque individual)	1	✓		
8	Mascarilla Facial de Bolsillo para RCCP (reanimación cerebrocardiopulmonar)	1	X		
	Instrumental				
9	Tijera universal	1	✓		
10	Linterna Pequeña	1	X		
11	Termómetro digital o de mercurio	1	X		
12	Gotero y/o Jeringa	1	✓		
13	Inmovilizador cervical multitalla (adulto)	1	✓		
14	Inmovilizadores Maleables (para brazos y piernas)	4	✓		

	Curación				
15	Algodón	Bolsa 50g	✓		
16	Gasa en paquetes individual	4 paquetes	X		No hay
17	Vendas elástica con gancho	1	✓		
18	Vendas elásticas de 5 Yardas x 4Pulg	3	✓		
19	Curitas	40	X		No hay
20	Toalla higiénica (Apósitos)	4	✓		
21	Venda triangular	6	✓		
22	Esparadrapo de Micropore	1 rollo	X		No hay
23	Esparadrapo de Tela tamaño Grande	1 rollo	X		No hay
24	Aplicadores (Copitos)	50	✓		
25	Bajalenguas	20	✓		
26	Compresas	4	✓		
	Hidratación				
27	Suero oral de rehidratación (Hidraplus)	6 sachets	X		no hay
	Varios				
28	Bolsas de plástico (Roja)	2	X		No hay
29	Camilla	1	✓		

INSPECCIONO:	**FECHA DE INSPECCION:** 06-08-2024 / 11-09-2024	
NOMBRE: Sandra Santana	**CARGO:** Insp SST	**FIRMA**
COPASST		
INSPECCIONO:	**FECHA DE INSPECCION:**	
NOMBRE:	**CARGO:**	**FIRMA**

RUSSY INGENIEROS S.A.S.	INSPECCION PREOPERACIONAL HERRAMIENTAS MANUALES	CODIGO: HSE-FOR-24
		VERSION: 1
		FECHA APROBACION: 08/01/2019

OBJETO	Construcción y dotación de cocina y comedor del colegio IIII		
Nº CONTRATO	0756-23		
ENTIDAD CONTRATANTE	Alcaldía	NIT	
EMPRESA CONTRATISTA	Wussy Ingenieros sas	NIT	901098921-1
HERRAMIENTA Nº	OPERADOR	Jhon Pulgo J	
MES	06-08- / 11-09 2024	TAMAÑO: G	P

ITEM	CONCEPTO	1		2		3		4	
		SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO
ESTADO GENERAL	Se utilizan las herramientas diseñadas especialmente para la tarea?	✓		✓		✓		✓	
	Las herramientas utilizadas están en perfectas condiciones (aptas para utilización y funcionamiento)?	✓		✓		✓		✓	
	Se utiliza la herramienta de forma adecuada?	✓		✓		✓		✓	
	Las herramientas son ten livianas como para no forzar el brazo y el hombro	✓		✓		✓		✓	
	Herramientas dañadas, con defectos o gastadas son removidas del servicio hasta que sean reparadas	✓		✓		✓		✓	
	Los trabajadores solo usan herramientas con las cuales tienen experiencia o han sido entrenados	✓		✓		✓		✓	
	Las tareas son variadas para evitar que la misma herramienta no sea usada todo el día cansando la mano	✓		✓		✓		✓	
	Los trabajadores que usan herramientas siempre usan lentes de seguridad para los ojos o cara	✓		✓		✓		✓	
	Las herramientas son guardadas en cajas de herramientas u otros recipientes apropiados cuando no están en uso. Herramientas con filo o puntiagudas son	✓		✓		✓		✓	
	Las herramientas no se dejan en las escaleras, andamios o áreas de trabajo arriba de la cabeza.	✓		✓		✓		✓	
	Los mangos de las herramientas se encuentran en buen estado	✓		✓		✓		✓	
	Cuando el trabajo con herramientas cortantes pueden riesgos de cortaduras, quemaduras, peligros filosos o quebrosos, los trabajadores usan protección para las manos	✓		✓		✓		✓	
FIRMA	FIRMA OPERADOR (AYUDANTE TECNICO)								
	FIRMA INSPECTOR HSEQ								
	COPASST								
	FIRMA ASESORA HSEQ								

HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO

FECHA	HALLAZGO	ACCION CORRECTIVA / PREVENT.

RUSSY INGENIEROS S.A.S.	INSPECCION PREOPERACIONAL PULIDORA	CODIGO: HSE-FOR-20
		VERSION: 1
		FECHA DE APROBACION: 08/01/2019

OBJETO	Construcción y dotación de cocina y comedor del colegio ITSI de bua-b/g.		
N° CONTRATO	0756-23		
ENTIDAD CONTRATANTE	Alcaldía	NIT	
EMPRESA CONTRATISTA	Wecasy Ingenieros	NIT	901109885-1

PULIDORA No. OPERADOR Elmer Key.

MES 06-08-2024 / 11-09-2024. TAMAÑO: G [X] P [ ]

ITEM	CONCEPTO	1		2		3.		4	
		B	M	B	M	B	M	B	M
ESTADO GENERAL E INSPECCIÓN OPERACIONAL	Estado del cable y las conexiones eléctricas	✓		✓		✓			
	Estado del interruptor de encendido y su seguro	✓		✓		✓			
	Estado del accesorio portadiscos	✓		✓		✓			
	Estado del mango	✓		✓		✓			
	Estado del cuerpo (CARCAZA)	✓		✓		✓			
	Estado del disco de corte (Verificar capacidad en RPM)	✓		✓		✓			
	Carcaza de protección del disco instalada	✓		✓		✓			
	Carcaza de protección del disco ajustada	✓		✓		✓			
	Extensión eléctrica suficientemente larga de acuerdo con ubicación del equipo y del tablero eléctrico	✓		✓		✓			
	Voltaje del tablero eléctrico coincide con el especificado para la pulidora	✓		✓		✓			
	Cuadro eléctrico protegido	✓		✓		✓			
	Se verifica guarda de seguridad	✓		✓		✓			
	Estado general de la gula y la guarda	✓		✓		✓			
	El disco gira en sentido de las manecillas del reloj (Izquierda - derecha)	✓		✓		✓			
	Contratuerca asegurada al eje	✓		✓		✓			
	Escobillas funcionando	✓		✓		✓			
	No se evidencia cortos(chispas, humo, fuego) durante manipulación de la pulidora	✓		✓		✓			
	No se evidencia recalentamiento del equipo durante su operación	✓		✓		✓			
	No se evidencian ruidos extraños durante el funcionamiento de la pulidora	✓		✓		✓			
	Estado de la plaqueta de identificación	✓		✓		✓			
FIRMA	FIRMA OPERADOR (TECNICO)								
	FIRMA INSPECTOR HSEQ								
	FIRMA ASESORA HSEQ								
	FIRMA DEL COPASST								

HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO

FECHA	HALLAZGO	ACCION CORRECTIVA / PREVENT.

RUSSY INGENIEROS S.A.S.	INSPECCION PREOPERACIONAL PULIDORA	CODIGO: HSE-FOR-20
		VERSION: 1
		FECHA DE APROBACION: 08/01/2019

OBJETO	Construcción y dotación de cocina y comedor del colegio ITTI		
N° CONTRATO	0756-23		
ENTIDAD CONTRATANTE	Alcaldía	NIT	
EMPRESA CONTRATISTA	Wessy Ingenieros	NIT	901098851

PULIDORA No. OPERADOR Jo Edwin Dueñas

MES 06-08-2024 / 11-09-2024. TAMAÑO: G P

	ITEM	CONCEPTO	1		2		3.		4	
			B	M	B	M	B	M	B	M
ESTADO GENERAL E INSPECCIÓN OPERACIONAL		Estado del cable y las conexiones eléctricas	✓		✓		✓		✓	
		Estado del interruptor de encendido y su seguro	✓		✓		✓		✓	
		Estado del accesorio portadiscos	✓		✓		✓		✓	
		Estado del mango	✓		✓		✓		✓	
		Estado del cuerpo (CARCAZA)	✓		✓		✓		✓	
		Estado del disco de corte (Verificar capacidad en RPM)	✓		✓		✓		✓	
		Carcaza de protección del disco instalada	✓		✓		✓		✓	
		Carcaza de protección del disco ajustada	✓		✓		✓		✓	
		Extensión eléctrica suficientemente larga de acuerdo con ubicación del equipo y del tablero eléctrico	✓		✓		✓		✓	
		Voltaje del tablero eléctrico coincide con el especificado para la pulidora	✓		✓		✓		✓	
		Cuadro eléctrico protegido	✓		✓		✓		✓	
		Se verifica guarda de seguridad	✓		✓		✓		✓	
		Estado general de la guía y la guarda	✓		✓		✓		✓	
		El disco gira en sentido de las manecillas del reloj (Izquierda - derecha)	✓		✓		✓		✓	
		Contratuerca asegurada al eje	✓		✓		✓		✓	
		Escobillas funcionando	✓		✓		✓		✓	
		No se evidencia cortos(chispas, humo, fuego) durante manipulación de la pulidora	✓		✓		✓		✓	
		No se evidencia recalentamiento del equipo durante su operación	✓		✓		✓		✓	
		No se evidencian ruidos extraños durante el funcionamiento de la pulidora	✓		✓		✓		✓	
		Estado de la plaqueta de identificación	✓		✓		✓		✓	
FIRMA		FIRMA OPERADOR (TECNICO)								
		FIRMA INSPECTOR HSEQ								
		FIRMA ASESORA HSEQ								
		FIRMA DEL COPASST								

HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO

FECHA	HALLAZGO	ACCION CORRECTIVA / PREVENT.

ANEXO 9. ACCIDENTALIDAD

RUSSY INGENIEROS S.A.S. Nit. 901.109.895-1	ACCIDENTALIDAD	CÓDIGO: HSE-FOR-55
		VERSIÓN: 1
		FECHA DE APROBACIÓN: 08/01/2019

FECHA: 05 de agosto al 11 de septiembre del 2024

UBICACIÓN: BARRANCABERMEJA

OBSERVACIÓN: En el mes del 05 de agosto al 11 de septiembre del 2024 no se presentaron accidentes laborales

EMPRESA	SERVICIO PRESTADO	Tipos de accidentes				N° de accidentes presentados	Lista de accidentes con daños personales o enfermedades directas	N° de accidentes sin daño evidente	Lista de accidentes con daño material	Lista de accidentes con daño ambiental	Tipos de accidentes				N° de accidentes reportados	Lista de accidentes con daños personales a terceros	Días perdidos leídos en el mes	Horas hombre trabajadas	Monto gastado o perdido por accidentes	Normas colombianas			Normas internacionales	
		Leve	Grave (G)	Fatal (F)	Total (G+F)						Leve (L)	Grave (G)	Fatal (F)	Total (G+F)						Indice de Frecuencia	Indice de Severidad	Indice de Accidentabilidad	Indice de Accidentabilidad	Indice de Severidad
CONSTRUCCIONES EN	MC PRUEBA	0	0	0	0	0					0	0	0	0	0	Ninguno	0		$ 0,00	0,0	0	0	0,0	0,0
		0	0	0	0	0		0			0	0	0	0	0	Ninguno	0		$ 0,00	0,0	0	0	0,0	0,0
		0	0	0	0	0									0									

Comodidad Material	EMPRESA	N° de colaboradores	Tipos de accidentes				Total de accidentes personales
			Leve (L)	Grave (G)	Fatal (F)	Total (G+F)	
EMPRESA		0	0	0	0	0	0
Total		0	0	0	0	0	0

Total de accidentes sin daño material
0
0


N° de accidentes con daño ambiental	Total de accidentes con daño ambiental	Tipos de accidentes				Total de accidentes a terceros
		Leve (L)	Grave (G)	Fatal (F)	Total (G+F)	
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0

Total de días perdidos	Total de horas hombre trabajadas	Montos gastado o perdido por accidentes	Normas colombianas			Normas internacionales	
			Indice de Frecuencia	Indice de Severidad	Indice de Accidentabilidad	Indice de Accidentabilidad	Indice de Severidad
0	0	$ 0,00	0,0	0	0	0,0	0,0
0	0	0	0	0	0	0,0	0,0

























Fecha Elaboro	Revisó y Aprobó	Vobo:
Karen Lisseth Salamanca Rojas 1.053.819.764 Residente HSEQ	Karen Lisseth Salamanca Rojas 1.053.819.764 Directora HSEQ	Oliver Ramón Ruiz Lacho 80.11[illegible]349 Gerente General

ANEXO 10. COE

RUSSY INGENIEROS S.A.S.	ACTA DE REUNIÓN	CÓDIGO DE-FOR-01
		VERSIÓN 2
		FECHA DE APROBACIÓN: 08/01/2019

FECHA REUNION: 10/10/2024 **HORA: 11:00 AM** **LUGAR: I.T.S.I BARRANCABERMEJA** **ACTA NO. 18**

REUNIÓN CONVOCADA POR	Sandra Milena Santiago Camacho
TIPO DE REUNIÓN	REUNIÓN N° 18 - GESTION HSE
CONTRATO N°	**No. 0756-23**
OBJETO DE LA REUNION	"CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DEL COMEDOR Y COCINA DEL INSTITUTO TÉCNICO SUPERIOR INDUSTRIAL EN EL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA"
ORGANIZADOR	Sandra Milena Santiago Camacho
APUNTADOR	Sandra Milena Santiago Camacho
ASISTENTES	Sandra Milena Santiago Camacho

TEMAS DE DISCUSIÓN

1. Señales de Prevención de Accidentes

DESARROLLO TEMAS DE DISCUSIÓN

1. SEÑALES DE PREVENCIÓN DE ACCIDENTES

El objetivo de esta charla es explicar las diferencias entre señales de peligro, cuidado e instrucciones de seguridad y conocer los colores asociados con cada tipo de señal.

- **Exigencias de señales:**

OSHA 29 CFR 1910.145: requerimientos de especificaciones en señales y marcas para la prevención de accidentes.

- **Señales de peligro:**

Indicar peligro inmediato.
Tomar precauciones especiales
Usar los colores rojo, negro y blanco.

- **Señales de cuidado:**

Advertir contra peligros potenciales ó atención contra prácticas inseguras.
Tomar las precauciones adecuadas.
Letras amarillas sobre fondo negro.

RUSSY INGENIEROS S.A.S.	ACTA DE REUNIÓN	CÓDIGO DE-FOR-01
		VERSIÓN 2
		FECHA DE APROBACIÓN: 08/01/2019

- **Señales de instrucciones de seguridad:**

Ofrezca instrucciones generales y sugerencias relativas a las medidas de seguridad.
Señal blanca con panel verde.

- **Emblema de vehículo que se desplaza lentamente:**

Usados sólo en vehículos que están diseñados para desplazarse lentamente (25 mph – 40 km./h - ó menos) y que operan en vias públicas.
Triángulos fluorescentes de color amarillo-naranja con borde reflectivo rojo oscuro.

CONCLUSIONES

- Se han establecido exigencias específicas para las señales de peligro, cuidado, instrucciones de seguridad y el emblema de vehículo lento, para ayudar a los empleados y empleadores con los programas de prevención de accidentes. Todo el mundo debería reconocer las importantes diferencias en cada caso, incluyendo el tipo de mensaje que envían. Siempre lea las señales cuidadosamente en cada estación de trabajo.

COMPROMISOS

- Se solicita verificar si dentro del cronograma de capacitaciones se incluyen temas sobre las señales de prevención de accidentes.

FIRMA ASISTENTES

NOMBRE	CARGO	FIRMA
Sandra Santiago	Inspectora SST	
Elkin Reyes	Ayudante	Elkin Reyes

ANEXO 11. COVID19

ENCUESTA AUTOCUIDADO COVID-19

RUSSY INGENIEROS S.A.S.

FECHA: 06-08-2024.

RESPONSABLE: Sandra Santiago

NOMBRE Y APELLIDO	DOCUMENTO	EDAD	SEXO	EPS	ARL	Presenta los siguientes síntomas ? 1. Fiebre mayor o igual 38° C	2. Tos	3. Dificultad respiratoria	4. Dolor de garganta	5. Fatiga	6. Malestar General	7. Perdida del olfato o gusto	Tiene alguno de estos antecedentes : enfermedades cardiovasculares, tiene medicación de cardiacidas, diabetes, en el sistema inmunológico, trastornos de la tiroides, cáncer de cualquier tipo, sobrepeso u obesidad, diarrea/colon, fumador, enfermedades pulmonares, enfermedades renales, falla renal, hipertensión, hipertensión arterial, enfermedad renal, diabetes, o enfermedades inmunocupresoras (incluyendo trasplante previo, lupus, entre otros)?	Convive con una persona diagnosticada con COVID-19?	¿En los últimos 14 días ha tenido contacto estrecho (por más de 15 minutos, a menos de 2 metros) y sin uso adecuado de protección personal) con alguna persona a o confirmada de tener COVID-19?."	MEDIO DE TRANSPORTE: PARTICULAR	BUS	A PIE	BICICLETA	TRANSPORTE PUBLICO	FIRMA
YESENIA ALVAREZ	1.096.226.349	28	F	SALUD TOTAL	SURA	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO		X				
CESAR NARVAEZ	1.098.540.099	29	M	SURA	SURA	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO				X		
SANDRA SANTIAGO	37.712.004	40	F	FAMISANAR	SURA	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	X					
ELKIN REYES	1.096.218.748	30	M	SANITAS	SURA	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO			X			
JORGE REYES	9.144.339		M		SURA	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO			X			

Observaciones: (Informacion adicional que el personal considere importante manifestar)

RUSSY INGENIEROS S.A.S.

ENCUESTA AUTOCUIDADO COVID-19

FECHA: 08-08-2024.

RESPONSABLE: Sandy Santana

NOMBRE Y APELLIDO	DOCUMENTO	EDAD	SEXO	EPS	ARL	Presenta los siguientes síntomas ?							Tiene alguna de estas enfermedades: enfermedades autoinmunes, tienen medicamos de corticoides, deficiencias en el sistema inmunológico(inmunodeficiencia), cancer de cualquier tipo, estreptococo y abscesos, desnutrición, tumores, enfermedades pulmonares, enfermedades cardiacas, falla renal, hipertiroidismo, hipotiroidismo arterial, enfermedad renal, diabetes, o enfermedades inmunosupresoras((incluyendo trasplante previo, lupus, entre otros)?	FIRMA		AUTORIZA	MOTO	A PIE	MISCELANEA	TRABAJADOR DE PLANTA	FIRMA
						1. Fiebre mayor o igual 38° C	2. Tos	3. Dificultad respiratoria	4. Dolor de garganta	5. Fatiga	6. Malestar General	7. Perdida del olfato o gusto		Convive con una persona diagnosticada con COVID-19?	¿En los últimos 14 días ha estado cercano estrecho (por más de 10 minutos, a menos de 2 metros) y sin usar elementos de protección personal) con alguien sospechoso o confirmado de tener COVID-19?,						
YESENIA ALVAREZ	1.096.226.349	28	F	SALUD TOTAL	SURA	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO		X				
CESAR NARVAEZ	1.098.540.093	29	M	SURA	SURA	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO				X		
SANDRA SANTIAGO	37.712.004	40	F	FAMISANAR	SURA	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	X					
ELKIN REYES	1.096.238.748	30	M	SANITAS	SURA	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO			X			
JORGE REYES	9.144.359		M		SURA	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO			X			

Observaciones: (Informacion adicional que el personal considere importante manifestar)

ENCUESTA AUTOCUIDADO COVID-19

RUSSY INGENIEROS S.A.S.

FECHA: 09-08-2024.

RESPONSABLE: Sandra Santiago

NOMBRE Y APELLIDO	DOCUMENTO	EDAD	SEXO	EPS	ARL	Presenta los siguientes síntomas? 1. Fiebre mayor o igual 38° C	2. Tos	3. Dificultad respiratoria	4. Dolor de garganta	5. Fatiga	6. Malestar General	7. Pérdida del olfato o gusto	Tiene alguno de estos antecedentes: enfermedades alérgicas/otras, tiene medicación de cortisonas, diabetes/no en el plasma inmunológico/inmunodeficiencia, cáncer de cualquier tipo, sobrepeso o obesidad, desnutrición, tabaquismo, enfermedades pulmonares, enfermedades cardiacas, falla renal, hipertiroidismo, hipotensión arterial, enfermedad renal, diabetes, o enfermedades inmunosupresoras (incluyendo trasplante previo, lupus, colon ulcer)?	FIEBRA: Convive con una persona diagnosticada con COVID-19?	FIEBRA: ¿En los últimos 14 días has tenido contacto cercano (por más de 10 minutos, a menos de 2 metros y sin usar elementos de protección personal) con algunas empleadores o conocidos de tener COVID-19?*	MEDIO DE TRANSPORTE: AUTOMOVIL	MOTO	A PIE	BICICLETA	TRANSPORTE PUBLICO	FIRMA
YESENIA ALVAREZ	1.096.226.349	28	F	SALUD TOTAL	SURA	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO		X				
CESAR NARVAEZ	1.098.540.093	29	M	SURA	SURA	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO				X		
SANDRA SANTIAGO	37.712.004	40	F	FAMISANAR	SURA	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	X					
ELKIN REYES	1.096.218.748	30	M	SANITAS	SURA	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO			X			
JORGE REYES	9.144.939		M		SURA	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO			X			

Observaciones: (Información adicional que el personal considere importante manifestar)

ENCUESTA AUTOCUIDADO COVID-19

RUSSY MAQUINARIA S.A.S

FECHA: 10-08-2024.

RESPONSABLE: Sandra Santiago

NOMBRE Y APELLIDO	DOCUMENTO	EDAD	SEXO	EPS	ARL	Presentas los siguientes síntomas ?							Tiene alguno de estos antecedentes: enfermedades autoinmunes, toma medicación de cortisol-dex, diabéticos en el último trimestre inmunológicos/inmunodeficiencia, cáncer de cualquier tipo, cardiopatía o cirugía cardíaca, depresión, tumores, enfermedades pulmonares, enfermedades cardíacas, falla renal, hipotiroidismo, hipertensión arterial, enfermedad renal, diabetes, o enfermedades inmunocomprometidas (indiquenlo) trasplante previo, lupus, entre otros?	FIEBRE		TRANSPORTE				FIRMA
						1. Fiebre mayor o igual 38° C	2. Tos	3. Dificultad respiratoria	4. Dolor de garganta	5. Peligt	6. Malestar General	7. Perdida del olfato o gusto		Convive con una persona diagnosticado con COVID-19?	¿En los últimos 14 días has estado en contacto cercano (por más de 10 minutos, a menos de 2 metros y sin usar elementos de protección personal) con alguien diagnosticado o sospechoso de tener COVID-19?.	ASISTENCIA	MOTO	A PIE	BICICLETA	TRANSPORTE PUBLICO	
YESENIA ALVAREZ	1.096.226.349	28	F	SALUD TOTAL	SURA	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO		X				
CESAR NARVAEZ	1.098.540.099	29	M	SURA	SURA	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO				X		
SANDRA SANTIAGO	37.712.004	40	F	FAMISANAR	SURA	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	X					
ELKIN REYES	1.096.218.748	30	M	SANITAS	SURA	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO			X			
JORGE REYES	9.144.339		M		SURA	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO			X			

Observaciones: (Informacion adicional que el personal considere importante manifestar)

ENCUESTA AUTOCUIDADO COVID-19

RUSSY INGENIEROS S.A.S

FECHA: 12-08-2024.

RESPONSABLE: Sandra Santiago

NOMBRE Y APELLIDO	DOCUMENTO	EDAD	SEXO	EPS	ARL	Presenta los siguientes síntomas ? 1. Fiebre mayor o igual 38° C	2. Tos	3. Dificultad respiratoria	4. Dolor de garganta	5. Fatiga	6. Malestar General	7. Pérdida del olfato o gusto	Tiene alguna de estas enfermedades: enfermedades autoinmunes, tiene medicación de antibióticos, diabéticos en el último trimestre/lupus/inmunodeficiencia, cáncer de cualquier tipo, estrógeno o obesidad, desnutrición, tumores, enfermedades pulmonares, enfermedades cardiacas, falla renal, hipertensión. Hipertensión arterial, enfermedad renal, diabetes, o enfermedades transmucosa/semen (incluyendo transfusión previa, lupus, entre otros)?	Convive con una persona diagnosticada con COVID-19?	¿En los últimos 14 días han estado cercanos convivido durante más de 10 minutos, a menos de 2 metros y sin usar elementos de protección personal) con alguna sospechosa o confirmado de tener COVID-19?*	MEDIO DE TRANSPORTE: AUTOMOVIL	BUS	A PIE	BICICLETA	TRANSPORTE PUBLICO	FIRMA
YESENIA ALVAREZ	1.096.226.349	28	F	SALUD TOTAL	SURA	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO		X				
CESAR NARVAEZ	1.098.540.099	29	M	SURA	SURA	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO				X		
SANDRA SANTIAGO	37.712.004	40	F	FAMISANAR	SURA	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	X					
ELKIN REYES	1.086.218.748	30	M	SANITAS	SURA	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO			X			
JORGE REYES	9.144.939		M		SURA	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO			X			

Observaciones: (Informacion adicional que el personal considere importante manifestar)

RUSSY

ENCUESTA AUTOCUIDADO COVID-19

FECHA: 13-08-2024.

RESPONSABLE: Sandra Santiago

NOMBRE Y APELLIDO	DOCUMENTO	EDAD	SEXO	EPS	ARL	Presenta los siguientes síntomas? 1. Fiebre mayor o igual 38° C	2. Tos	3. Dificultad respiratoria	4. Dolor de garganta	5. Fatiga	6. Dolor de Cabeza	7. Perdida del olfato o gusto	Tiene alguno de estos antecedentes: enfermedades autoinmunes, tomas medicamentos de esteroides, padecemos en el pasado inmunodeficiencia/inmunosupresión, cáncer de cualquier tipo, sobrepeso o obesidad, desnutrición, tensión, enfermedades pulmonares, enfermedades cardiacas, falla renal, hipertensión, hipotensión arterial, enfermedad renal, diabetes, o enfermedades inmunosupresoras (trasplante, transfusión previa, lupus, entre otros)?	FIEBRE: Convive con una persona diagnosticada con COVID-19?	FIEBRE: ¿En los últimos 14 días ha tenido contacto estrecho (por más de 15 minutos, a menos de 2 metros y sin usar elementos de protección personal) con alguna sospechoso o confirmado de tener COVID-19?*	MEDIO DE TRANSPORTE: AUTOMOVIL	BUS	A PIE	BICICLETA	TRANSPORTE PUBLICO	FIRMA
YESENIA ALVAREZ	1.096.226.349	28	F	SALUD TOTAL	SURA	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO		X				
CESAR NARVAEZ	1.098.540.093	29	M	SURA	SURA	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO				X		
SANDRA SANTIAGO	37.712.004	40	F	FAMISANAR	SURA	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	X					
ELKIN REYES	1.086.218.748	30	M	SANITAS	SURA	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO			X			
JORGE REYES	9.144.339		M		SURA	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO			X			

Observaciones: (Informacion adicional que el personal considere importante manifestar)

ENCUESTA AUTOCUIDADO COVID-19

RUSSY

FECHA: SABADO 14-08-2024.

RESPONSABLE: Sandra Santiago

NOMBRES Y APELLIDO	DOCUMENTO	EDAD	SEXO	EPS	ARL	Presenta los siguientes síntomas? 1. Fiebre mayor o igual 38° C	2. Tos	3. Dificultad respiratoria	4. Dolor de garganta	5. Fatiga	6. Malestar General	7. Pérdida del olfato o gusto	Tiene alguna de estas enfermedades: enfermedades autoinmunes, tienen medicación de corticoides, defensivos en el sistema inmunológico? neurodistrofia, cáncer de cualquier tipo, cardiopatía o obesidad, diarrea/colon, tensión, enfermedades pulmonares, enfermedades cardíacas, falla renal, hepatopatías, hipertensión arterial, enfermedad renal, diabetes, o enfermedades inmunocomprometas (incluyendo trasplante previo, lupus, entre otros)?	FIRMA: Cursa con una persona diagnosticada con COVID-19?	¿En los últimos 14 días has estado cuidando estrechamente (por más de 10 días), a alguien de 2 metros y sin usar elementos de protección personal) con alguna sospechoso o confirmado de tener COVID-19?*	MEDIO DE TRANSPORTE: AUTOMOVIL	MOTO	A PIE	BICICLETA	TRANSPORTE PUBLICO	FIRMA
YESENIA ALVAREZ	1.096.226.349	28	F	SALUD TOTAL	SURA	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO		X				
CESAR NARVAEZ	1.098.540.093	29	M	SURA	SURA	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO				X		
SANDRA SANTIAGO	37.712.004	40	F	FAMISANAR	SURA	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	X					
ELKIN REYES	1.096.218.748	30	M	SANITAS	SURA	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO			X			
JORGE REYES	9.144.339		M		SURA	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO			X			

Observaciones: (Informacion adicional que el personal considere importante manifestar)

RUSSY

ENCUESTA AUTOCUIDADO COVID-19

FECHA: 15-08-2019.

RESPONSABLE: Sandra Santiago

NOMBRES Y APELLIDO	DOCUMENTO	EDAD	SEXO	EPS	ARL	Presenta los siguientes síntomas ? 1. Fiebre mayor o igual 38° C	2. Tos	3. Dificultad respiratoria	4. Dolor de garganta	5. Fatiga	6. Malestar General	7. Perdida del olfato o gusto	Tiene alguna de estas patologías (enfermedades cardiovasculares, diabetes, enfermedades pulmonares, enfermedades renales, hipertensión arterial, enfermedad renal, diabetes, o enfermedades inmunosuprimidas (incluyendo trasplante previo, lupus, entre otros ?	RIESGO Cuenta con una persona diagnosticada con CO-ID-19?	¿En los últimos 14 días han tenido contacto estrecho (por más de 15 minutos, a menos de 2 metros) de una persona diagnosticada con COVID-19?	MEDIO DE TRANSPORTE: AUTOMOVIL	BUSES	A PIE	BICICLETA	TRANSPORTE PUBLICO	FIRMA
YESENIA ALVAREZ	1.096.226.849	25	F	SALUD TOTAL	SURA	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO		X				
CESAR NARVAEZ	1.098.540.093	29	M	SURA	SURA	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO					X	
SANDRA SANTIAGO	37.712.004	40	F	FAMISANAR	SURA	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	X					
ELKIN REYES	1.096.218.748	30	M	SANITAS	SURA	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO			X			
JORGE REYES	9.144.319		M		SURA	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO			X			

Observaciones (Informacion adicional que el personal considere importante manifestar)

RUSSY INGENIERIA S.A.S

ENCUESTA AUTOCUIDADO COVID-19

FECHA: 16-08-2024.

RESPONSABLE: Sandra Santiago

NOMBRE Y APELLIDO	DOCUMENTO	EDAD	GENERO	EPS	ARL	Presenta los siguientes síntomas ? 1. Fiebre mayor o igual 38° C	2. Tos	3. Dificultad respiratoria	4. Dolor de garganta	5. Fatiga	6. Dolor de cabeza	7. Perdida del olfato y gusto	Tiene alguna de estas patologías: enfermedades cardiovasculares, tienen cardiopatía de coronarias, dislipidemias en el sistema inmunológico(inmunodeficiencia), cancer de cualquier tipo, cobrepeso o obesidad, desnutrición, tuberculosis, enfermedad pulmonar, enfermedades cardiacas, vías renal, hipotiroidismo, hipertensión arterial, enfermedad renal, diabetes, y enfermedades inmunosupresoras (trasplantado, transplante previo, lupus, entre otros)?	FIEBRE: Cuenta con una temperatura digital o cada con CID-19?	FIEBRE: ¿En los últimos 14 días ha tenido contacto estrecho (por más de 15 minutos, a menos de 2 metros y sin usar elementos de protección personal) con alguien sospechoso o confirmado de tener COVID-19?"	MEDIO DE TRANSPORTE: AUTOMOVIL	MOTO	A PIE	BICICLETA	TRANSPORTE PUBLICO	FIRMA
YERENIA ALVAREZ	1.096.226.349	28	F	SALUD TOTAL	SURA	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO		X				
CESAR NARVAEZ	1.098.540.093	25	M	SURA	SURA	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO				X		
SANDRA SANTIAGO	37.712.004	40	F	FAMISANAR	SURA	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	X					
ELKIN REYES	1.096.218.748	30	M	SANITAS	SURA	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO			X			
JORGE REYES	9.144.339		M		SURA	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO			X			

Observaciones (Información adicional que el personal considere importante manifestar)

RUSSY INGENIEROS S.A.S.

ENCUESTA AUTOCUIDADO COVID-19

FECHA: 20-08-2024

RESPONSABLE: Sandra Santiago

NOMBRE Y APELLIDO	DOCUMENTO	EDAD	SEXO	EPS	ARL	Presenta los siguientes síntomas ? 1. Fiebre mayor a o igual 38° C	2. Tos	3. Dificultad respiratoria	4. Dolor de garganta	5. Fatiga	6. Malestar General	7. Perdida del olfato o gusto	Ti ene alguna de estas antecedes ion enfermedades inflamatorias, Bron condicio n de cotiledón, Enfermedas art ol ar cluso Inmunodeficiencias adquiridas, cancer de cualquier tipo, enfermedad cardiovascular, diabetes, hipertensión arterial, enfermedad renal, alcoholismo, hipotiroidismo, enfermedad pulmonar ob, enfermedades cerebrales renal, hipotiroidismo, hipertensión arterial, enfermedad renal, diabetes, c enfermedades inmunosupresoras (incluyendo trasplante previo, lupus, entre otra.)?	Cierra ve con una pr esente diagnó ficado con COVID-19?	¿En los últimos 14 días has tenido contacto estrecho (por más de 15 minutos, a menos de 2 metros y sin usar r ecuerdo de protección personal) con alguien simpat ico o confirmado de tener COVID-19?"	TIPO DE TRANSPORTE: AUTOMOVIL	BUSETA	A PIE	BICICLETA	TRANSPORTE PUBLICO	FIRMA
YESENIA ALVAREZ	1.096.226.349	23	F	SALUD TOTAL	SURA	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO		X				
CESAR NARVAEZ	1.098.540.093	26	M	SURA	SURA	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO				X		
SANDRA SANTIAGO	37.732.004	40	F	FAMISANAR	SURA	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	X					
ELKIN REYES	1.096.238.748	30	M	SANITAS	SURA	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO			X			
JORGE REYES	9.144.339		M		SURA	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO			X			

Observaciones (Informacion adicional que el personal considere importante manifestar)

RUSSY INGENIEROS S.A.S.

ENCUESTA AUTOCUIDADO COVID-19

FECHA: 21-08-2024.

RESPONSABLE: Sandra Santiago

NOMBRE Y APELLIDO	DOCUMENTO	EDAD	SEXO	EPS	ARL	Presenta los siguientes síntomas ? 1. Fiebre mayor o igual 38° C	2. Tos	3. Dificultad respiratoria	4. Dolor de garganta	5. Fatiga	6. Dolor de cabeza	7. Pérdida del olfato o gusto	Tiene alguna de estas enfermedades (ej: enfermedades cardiovasculares, diabetes mellitus, cáncer de cualquier tipo, enfermedades pulmonares, enfermedades cerebrales, obesidad, hipertensión arterial, enfermedad renal, diabetes, inmunosupresoras (trasplante previo, lupus, entre otras)?	Convivió con una persona diagnosticada con COVID-19?	¿En los últimos 14 días has tenido contacto estrecho (por más de 15 minutos a menos de 2 metros y sin usar mascarilla de protección personal) con alguien sospechoso o confirmado de tener COVID-19?.	MEDIO DE TRANSPORTE AUTOMOVIL	BUS	A PIE	BICICLETA	TRANSPORTE PÚBLICO	FIRMA
YESENIA ALVAREZ	1.096.228.349	28	F	SALUD TOTAL	SURA	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO		X				
CESAR NARVAEZ	1.098.540.093	29	M	SURA	SURA	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO					X	
SANDRA SANTIAGO	37.712.004	40	F	FAMISANAR	SURA	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	X					
EJKIN REYES	1.096.218.748	30	M	SANITAS	SURA	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO			X			
JORGE REYES	9.144.339		M		SURA	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO			X			

Observaciones (información adicional que el personal considere importante manifestar)

RUSSY INGENIEROS S.A.S.

ENCUESTA AUTOCUIDADO COVID-19

FECHA: 12-08-2024.

RESPONSABLE: Sandra Santiago

NOMBRE Y APELLIDO	DOCUMENTO	EDAD	SEXO	EPS	ARL	Presenta los siguientes síntomas ?							Tiene alguna de estas enfermedades (autoinmunes, tiene radioterapia o de coagulación, deficiencias en el sistema inmunológico diagnosticadas por un médico, cáncer de cualquier tipo, enfermedades obesidad, enfermedades hepáticas, enfermedades renales, hipertensión arterial, enfermedad renal, diabetes, o enfermedades inmunosuprimidas (trasplantado, receptor de médula, entre otras)?	PRUEBA		TRANSPORTE				FIRMA
						1. Fiebre mayor o igual 38° C	2. Tos	3. Dificultad respiratoria	4. Dolor de garganta	5. Fatiga	6. Malestar General	7. Pérdida del olfato o gusto		Cuenta con una prueba diagnostica con COVID-19?	¿En los últimos 14 días han estado cercanas estrechas (por más de 10 minutos, a menos de 2 metros y sin usar elementos de protección personal) con algún empleado con o sospechoso de tener COVID-19?"	AUTOMOVIL	MOTO	A PIE	BICICLETA	TRANSPORTE PUBLICO	
YESENIA ALVAREZ	1.096.226.349	28	F	SALUD TOTAL	SURA	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO		X				
CESAR NARVAEZ	1.098.540.098	29	M	SURA	SURA	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO				X		
SANDRA SANTIAGO	37.712.004	40	F	FAMISANAR	SURA	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	X					
ELKIN REYES	1.096.216.748	30	M	SANITAS	SURA	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO			X			
JORGE REYES	9.144.359		M		SURA	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO			X			

Observaciones (informacion adicional que el personal considere importante man/estar)

RUSSY SOLUCIONES S.A.S.

ENCUESTA AUTOCUIDADO COVID-19

FECHA: 23-08-2024.

RESPONSABLE: Sandra Santiago

NOMBRE Y APELLIDO	DOCUMENTO	EDAD	SEXO	EPS	ARL	Presenta los siguientes síntomas ? 1. Fiebre mayor o igual 38° C	2. Tos	3. Dificultad respiratoria	4. Dolor de garganta	5. Fatiga	6. Dolor de cabeza	7. Pérdida del olfato o gusto	Si usted alguna de estas enfermedades crónicas, toma medicación de cortisonicos, deficiencias en el sistema inmunológico (enfermedades reumatológicas, cáncer de cualquier tipo, osteoporosis, obesidad, diabetes, tuberculosis, enfermedades pulmonares, enfermedades cardiacas, insuficiencia renal, hipertiroidismo, hipertensión arterial, enfermedad renal, diabetes, o enfermedades neuromuscular (incluyendo trasplante previo, lupus, entre otros)?	Convive con una persona diagnosticada con COVID-19?	¿En los últimos 14 días has tenido contacto estrecho (por más de 15 minutos, a menos de 2 metros y sin usar elementos de protección personal) con alguien enquien sea o confirmado de tener COVID-19?"	AUTOMOVIL	MOTO	A PIE	BICICLETA	TRANSPORTE PUBLICO	FIRMA
YESENIA ALVAREZ	1.096.226.349	28	F	SALUD TOTAL	SURA	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO		X				
CESAR NARVAEZ	1.098.540.093	26	M	SURA	SURA	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO				X		
SANDRA SANTIAGO	37.712.004	40	F	FAMISANAR	SURA	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	X					
ELKIN REYES	1.096.218.748	30	M	SANITAS	SURA	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO			X			
JORGE REYES	9.144.339		M		SURA	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO			X			

Observaciones (Información adicional que el personal considere importante manifestar)

SABADO

RUSSY INGENIEROS S.A.S.

ENCUESTA AUTOCUIDADO COVID-19

FECHA: 24-08-2024.

RESPONSABLE: Sandra Santiago

NOMBRE Y APELLIDO	DOCUMENTO	EDAD	SEXO	EPS	ARL	Presenta los siguientes síntomas ?							Tiene alguna de estas patologías: (es enfermedades catastróficas, están relacionadas a: de cardiovasculares, diabetes(as) en el sistema inmunológico(enfermedades autoinmunes, cáncer de cualquier tipo), embarazo o lactancia, desnutrición, tuberculosis pulmonar activa, cirrosis, cardiopatías, falla renal, hipertensión, hipertensión arterial, enfermedad renal, diabetes, o enfermedades inmunosupresoras) (medicamento, trasplante previo, lupus, entre otros)?	Convive con una persona alguna vivienda con COVID-19?	¿En los últimos 14 días has tenido contacto estrecho (por más de 15 minutos, a menos de 2 metros) y sin usar elementos de protección personal con alguien mayor con o sospechoso de tener COVID-19?"	MEDIO DE TRANSPORTE				FIRMA
						1. Fiebre mayor o igual 38° C	2. Tos	3. Dificultad respiratoria	4. Dolor de garganta	5. Fatiga	6. Dolor de cabeza	7. Pérdida del olfato o gusto				ASISTENCIAL	MOTO	A PIE	BICICLETA	TRANSPORTE PUBLICO	
YESENIA ALVAREZ	1.096.226.349	28	F	SALUD TOTAL	SURA	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO		X				
CESAR NARVAEZ	1.098.540.093	29	M	SURA	SURA	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO					X	
SANDRA SANTIAGO	37.712.004	40	F	FAMISANAR	SURA	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	X					
ELKIN REYES	1.086.218.748	30	M	SANITAS	SURA	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO				X		
JORGE REYES	9.144.319		M		SURA	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO				X		

Observaciones (Información adicional que el personal considere importante manifestar)

RUSSY INGENIEROS S.A.S

ENCUESTA AUTOCUIDADO COVID-19

FECHA: 26-08-2024.

RESPONSABLE: Sandra Santiago

NOMBRE Y APELLIDO	DOCUMENTO	EDAD	SEXO	EPS	ARL	Presenta los siguientes síntomas ?							Tiene alguna de estas patologías: enfermedades cardiovasculares, tiroideas, uso de esteroides o corticoides, diabéticos en el sistema inmunológico(inmunosupresión), cancer de cualquier tipo, cáncer de pulmón, enfermedades pulmonares, enfermedades cardiacas, falla renal, hipotiroidismo, hipertensión arterial, enfermedad renal, diabetes, o enfermedades inmunosupresoras (incluyendo trasplante previo, lupus, entre otros) ?	FIEBRE		ASISTENCIA	EPS	ARL	BICICLETA	TRANSPORTE PUBLICO	FIRMA
						1. Fiebre mayor o igual 38° C	2. Tos	3. Dificultad respiratoria	4. Dolor de garganta	5. Fatiga	6. Malestar General	7. Perdida del olfato o gusto		Convivo con una persona diagnosticada con COVID-19?	¿En los últimos 14 días has tenido contacto estrecho (por más de 15 minutos, a menos de 2 metros) con alguna persona (personal) con diagnóstico confirmado de tener COVID-19?.						
YESENIA ALVAREZ	1.096.226.849	28	F	SALUD TOTAL	SURA	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO		X			Yesenia
CESAR NARVAEZ	1.098.540.093	29	M	SURA	SURA	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO				X	
SANDRA SANTIAGO	37.712.004	40	F	FAMISANAR	SURA	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	X				
ELKIN REYES	1.096.218.748	30	M	SANITAS	SURA	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO			X		
JORGE REYES	9.144.319		M		SURA	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO			X		

Observaciones (Informacion adicional que el personal considere importante manifestar)

ENCUESTA AUTOCUIDADO COVID-19

WRUSSY INGENIEROS S.A.S

FECHA: 30-08-2024.

RESPONSABLE: Sandra Santiago.

NOMBRE Y APELLIDO	DOCUMENTO	EDAD	SEXO	EPS	ARL	Presenta los siguientes síntomas ? 1. Fiebre mayor o igual 38° C	2. Tos	3. Dificultad respiratoria	4. Dolor de garganta	5. Fatiga	6. Malestar General	7. Perdida del olfato o gusto	Tiene alguno de estos antecedentes: enfermedades autoinmunes, Hemo reactividad de cardiacidas, diabetes(no en el alcance) broncoalergopatíapulmonardefinitiva, cáncer de cualquier tipo, sobrepeso o obesidad, desnutrición, tuberculosis, enfermedades pulmonares, enfermedades cardiacas, falla renal, hipertensión, hipertensión arterial, enfermedad renal, diabetes, o enfermedades inmunosupresoras (incluyendo trasplante previo, lupus, entre otros)?	Convives con una persona diagnosticada con COVID-19?	¿En los últimos 14 días has tenido contacto estrecho (por más de 15 minutos, a menos de 2 metros y sin usar elementos de protección personal) con alguien sospechoso o confirmado de tener COVID-19?"	MEDIO DE TRANSPORTE: AUTOMOVIL	BICI	A PIE	MOTO	TRANSPORTE PUBLICO	FIRMA
YESENIA ALVAREZ	1.096.226.349	28	F	SALUD TOTAL	SURA	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO		X				
CESAR NARVAEZ	1.098.540.093	29	M	SURA	SURA	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO				X		
SANDRA SANTIAGO	37.712.004	40	F	FAMISANAR	SURA	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	X					
ELKIN REYES	1.096.218.748	30	M	SANITAS	SURA	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO			X			
JORGE REYES	9.144.339		M		SURA	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO			X			

Observaciones: (Informacion adicional que el personal considere importante manifestar)

129

ENCUESTA AUTOCUIDADO COVID-19

RUSSY INGENIEROS S.A.S

FECHA: SABADO 31-08-2024.

RESPONSABLE: Sandra Santiago

NOMBRE Y APELLIDO	DOCUMENTO	EDAD	SEXO	EPS	ARL	Presenta los siguientes síntomas ? 1. Fiebre mayor o igual 38° C	2. Tos	3. Dificultad respiratoria	4. Dolor de garganta	5. Fatiga	6. Malestar General	7. Perdida del olfato o gusto	Tiene alguno de estos antecedentes: enfermedades autoinmunes, tienen medicación de corticoides, disfunciones en el sistema inmunológico/inmunodeficiencia, cáncer de cualquier tipo, sobrepeso o obesidad, desnutrición, fumador, enfermedades pulmonares, enfermedades cardiacas, falla renal, hipertensión, hipotiroidismo adrenal, enfermedad renal, diabetes, o enfermedades inmunocomprometa (incluyendo trasplante previo, lupus, entre otros)?	Convive con otra persona diagnosticada con COVID-19?	¿En los últimos 14 días has tenido contacto estrecho (por más de 15 minutos, a menos de 2 metros y sin usar elementos de protección personal) con alguna persona o confirmado de tener COVID-19?*	MEDIO DE TRANSPORTE: AUTOMOVIL	MOTO	A PIE	BICICLETA	TRANSPORTE PUBLICO	FIRMA
YESENIA ALVAREZ	1.096.226.349	28	F	SALUD TOTAL	SURA	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO		X				
CESAR NARVAEZ	1.098.540.093	29	M	SURA	SURA	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO				X		
SANDRA SANTIAGO	37.712.004	40	F	FAMISANAR	SURA	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	X					
ELKIN REYES	1.096.218.748	30	M	SANITAS	SURA	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO			X			
JORGE REYES	9.144.339		M		SURA	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO			X			

Observaciones: (Informacion adicional que el personal considere importante manifestar)

ANEXO 12. REGISTRO FOTOGRAFICO

REGISTRO FOTOGRAFICO



Descripcion	Actividades de Pintura
Fecha	08 de Agosto de 2024



Descripcion	Actividades de soldadura
Fecha	08 de Agosto de 2024



Descripcion	Actividades de soldadura
Fecha	08 de Agosto de 2024



Descripcion	Actividades de Pintura
Fecha	08 de Agosto de 2024



Descripcion	Charla de seguridad y pausas activas
Fecha	08 de Agosto de 2024



Descripcion	Charla de seguridad y pausas activas
Fecha	08 de Agosto de 2024

REGISTRO FOTOGRAFICO



Descripcion	Actividades de soldadura
Fecha	09 de Agosto de 2024



Descripcion	Actividades de traslado de materiales
Fecha	09 de Agosto de 2024



Descripcion	Charla de seguridad y pausas activas
Fecha	09 de Agosto de 2024

REGISTRO FOTOGRAFICO



Descripcion	Actividades de Orden y aseo
Fecha	12 de Agosto de 2024



Descripcion	Actividades de Orden y aseo
Fecha	12 de Agosto de 2024



Descripcion	Charla de seguridad y pausas activas
Fecha	12 de Agosto de 2024



Descripcion	Charla de seguridad y pausas activas
Fecha	12 de Agosto de 2024

REGISTRO FOTOGRAFICO



Descripcion	Actividades de Pintura
Fecha	13 de Agosto de 2024



Descripcion	Actividades de Pintura
Fecha	13 de Agosto de 2024



Descripcion	Actividades de pulida de pisos
Fecha	13 de Agosto de 2024



Descripcion	Actividades de pulida de pisos
Fecha	13 de Agosto de 2024



Descripcion	Charla de seguridad y pausas activas
Fecha	13 de Agosto de 2024



Descripcion	Charla de seguridad y pausas activas
Fecha	13 de Agosto de 2024



Descripcion	Entrega de Cancha
Fecha	13 de Agosto de 2024



Descripcion	Entrega de Cancha
Fecha	13 de Agosto de 2024



Descripcion	Entrega de Cancha
Fecha	13 de Agosto de 2024



Descripcion	Entrega de Cancha
Fecha	13 de Agosto de 2024

REGISTRO FOTOGRAFICO



Descripcion	Charla de seguridad y pausas activas
Fecha	14 de Agosto de 2024



Descripcion	Entrega de elementos de Proteccion
Fecha	14 de Agosto de 2024



Descripcion	Charla de seguridad y pausas activas
Fecha	14 de Agosto de 2024

REGISTRO FOTOGRAFICO



Descripcion	Ingreso de Materiales
Fecha	16 de Agosto de 2024



Descripcion	Actividades de Afinado de pisos
Fecha	16 de Agosto de 2024



Descripcion	Instalacion de Trapa de grasas
Fecha	16 de Agosto de 2024



Descripcion	Instalacion de Trapa de grasas
Fecha	16 de Agosto de 2024

REGISTRO FOTOGRAFICO



Descripcion	Instalacion de Comedor
Fecha	17 de Agosto de 2024



Descripcion	Charla de seguridad y pausas activas
Fecha	17 de Agosto de 2024



Descripcion	Charla de seguridad y pausas activas
Fecha	17 de Agosto de 2024

REGISTRO FOTOGRAFICO



Descripcion	Instalacion de Cocina
Fecha	20 de Agosto de 2024



Descripcion	Charla de seguridad y pausas activas
Fecha	20 de Agosto de 2024



Descripcion	Charla de seguridad y pausas activas
Fecha	20 de Agosto de 2024

REGISTRO FOTOGRAFICO



Descripcion	Instlacion de elementos de cocina
Fecha	23 de Agosto de 2024



Descripcion	Instlacion de elementos de cocina
Fecha	23 de Agosto de 2024



Descripcion	Instalacion de Comedor
Fecha	23 de Agosto de 2024



Descripcion	Charla de seguridad y pausas activas
Fecha	23 de Agosto de 2024



Descripcion	Charla de seguridad y pausas activas
Fecha	23 de Agosto de 2024

REGISTRO FOTOGRAFICO	
	
Descripcion	Actividades de soldadura
Fecha	26 de Agosto de 2024

	
Descripcion	Charla de seguridad y pausas activas
Fecha	26 de Agosto de 2024

	
Descripcion	Charla de seguridad y pausas activas
Fecha	26 de Agosto de 2024

REGISTRO FOTOGRAFICO



Descripcion	Instalacion de comedor
Fecha	29 de Agosto de 2024



Descripcion	Instalacion de comedor
Fecha	29 de Agosto de 2024



Descripcion	Instalacion de comedor
Fecha	29 de Agosto de 2024

REGISTRO FOTOGRAFICO



Descripcion	Actividades de pintura
Fecha	05 de Septiembre de 2024



Descripcion	Actividades de pintura
Fecha	05 de Septiembre de 2024



Descripcion	Actividades de Soldadura
Fecha	05 de Septiembre de 2024



Descripcion	Actividades de pintura
Fecha	05 de Septiembre de 2024



Descripcion	Actividades de pintura
Fecha	05 de Septiembre de 2024

ANEXO 13. PAZ Y SALVO

RUSSY
INGENIEROS S.A.S.
Nit. 901.109.885-1

Bogotá D.C., 15 de septiembre de 2024

PAZ Y SALVO

Yo **WILVER FRANCINY RUSSY LADINO**, identificado con cedula de ciudadanía como aparece al pie de mi firma, actuando como representante legal de la empresa **WRUSSY INGENIEROS SAS** identificado con **NIT 901.109.885-1**, certifico que me encuentro a Paz y Salvo con el Sr. **CESAR ORLANDO NARVAEZ QUIÑONEZ** identificado con cédula de ciudadanía **No. 1.098.754.093 de Bucaramanga.** Por concepto del pago de las obligaciones relacionadas con el sistema de riesgos laborales, pagos relacionados con sus servicios prestados, entrega de dotación y elementos de protección personal EPP, liquidación de prestaciones sociales y ha cumplido en forma oportuna todas sus obligaciones legales como empleador en CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DEL COMEDOR Y COCINA DEL INSTITUTO TÉCNICO SUPERIOR INDUSTRIAL EN EL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA, con el contrato de obra No. 0756-23.

Se expide a los días 15 del mes de septiembre del 2024.

Cordialmente,

WRUSSY INGENIEROS SAS
WILVER FRANCINY RUSSY LADINO
80.212.380

CESAR ORLANDO NARVAEZ QUIÑONEZ
1.098.754.093 de Bucaramanga

C.C. - ARCHIVO

Wilver Franciny Russy Ladino
INGENIERO CIVIL
NIT. 80-212.380-5

Bogotá D.C., 15 de septiembre de 2024

PAZ Y SALVO

Yo **WILVER FRANCINY RUSSY LADINO**, identificada con cedula de ciudadanía como aparece al pie de mi firma, actuando como representante legal de la empresa **WILVER FRANCINY RUSSY LADINO.** identificado con **NIT 80.212.380-5** certifico que me encuentro a Paz y Salvo con el Sr. **ELKIN FERNANDO REYES SERRANO** identificado con cédula de ciudadanía **No. 1.096.218.748 de Barrancabermeja.** Por concepto del pago de las obligaciones relacionadas con el sistema de riesgos laborales, pagos relacionados con sus servicios prestados, entrega de dotación y elementos de protección personal EPP, liquidación de prestaciones sociales y ha cumplido en forma oportuna todas sus obligaciones legales como empleador en el proyecto de CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DEL COMEDOR Y COCINA DEL INSTITUTO TÉCNICO SUPERIOR INDUSTRIAL EN EL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA, con el contrato de obra No. 0756-23.

Cordialmente,

1096218748 B.

WILVER FRANCINY RUSSY LADINO
80.212.380 de Bogotá D.C.

ELKIN FERNANDO REYES SERRANO
1.096.218.748 de Barrancabermeja

C.C. – ARCHIVO

Wilver Franciny Russy Ladino

Bogotá D.C., 15 de septiembre de 2024

PAZ Y SALVO

Yo **WILVER FRANCINY RUSSY LADINO**, identificada con cedula de ciudadania como aparece al pie de mi firma, actuando como representante legal de la empresa **WILVER FRANCINY RUSSY LADINO.** identificado con **NIT 80.212.380-5** certifico que me encuentro a Paz y Salvo con el Sr. **JORGE REYES SERRANO** identificado con cédula de ciudadanía **No. 91.443.395 de Barrancabermeja.** Por concepto del pago de las obligaciones relacionadas con el sistema de riesgos laborales, pagos relacionados con sus servicios prestados, entrega de dotación y elementos de protección personal EPP, liquidación de prestaciones sociales y ha cumplido en forma oportuna todas sus obligaciones legales como empleador en el proyecto de CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DEL COMEDOR Y COCINA DEL INSTITUTO TÉCNICO SUPERIOR INDUSTRIAL EN EL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA, con el contrato de obra No. 0756-23.

Cordialmente,

INGENIERIA

WILVER FRANCINY RUSSY LADINO
80.212.380 de Bogotá D.C.

JORGE REYES SERRANO
91.443.395 de Barrancabermeja

C.C. – ARCHIVO

RUSSY
INGENIEROS S.A.S.
Nit. 901.109.885-1

Bogotá D.C., 15 de septiembre de 2024

PAZ Y SALVO

Yo **WILVER FRANCINY RUSSY LADINO**, identificado con cedula de ciudadanía como aparece al pie de mi firma, actuando como representante legal de la empresa **WRUSSY INGENIEROS SAS** identificado con **NIT 901.109.885-1,** certifico que me encuentro a Paz y Salvo con la Sra. **SANDRA MILENA SANTIAGO CAMACHO** identificada con cédula de ciudadanía **No. 37.712.004 de Bucaramanga.** Por concepto del pago de las obligaciones relacionadas con el sistema de riesgos laborales, pagos relacionados con sus servicios prestados, entrega de dotación y elementos de protección personal EPP, liquidación de prestaciones sociales y ha cumplido en forma oportuna todas sus obligaciones legales como empleador en CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DEL COMEDOR Y COCINA DEL INSTITUTO TÉCNICO SUPERIOR INDUSTRIAL EN EL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA, con el contrato de obra No. 0756-23.

Se expide a los días 15 del mes de septiembre del 2024.

Cordialmente,

WRUSSY INGENIEROS SAS
WILVER FRANCINY RUSSY LADINO
80.212.380

SANDRA MILENA SANTIAGO CAMACHO
37.712.004 de Bucaramanga

C.C. – ARCHIVO

RUSSY
INGENIEROS S.A.S.
Nit. 901.109.885-1

Bogotá D.C., 06 de septiembre de 2024

PAZ Y SALVO

Yo **WILVER FRANCINY RUSSY LADINO**, identificado con cedula de ciudadanía como aparece al pie de mi firma, actuando como representante legal de la empresa **WRUSSY INGENIEROS SAS** identificado con **NIT 901.109.885-1,** certifico que me encuentro a Paz y Salvo con la Sra. **YESENIA ALVAREZ MORALES** identificada con cédula de ciudadanía **No. 1.096.226.349 de Barrancabermeja.** Por concepto del pago de las obligaciones relacionadas con el sistema de riesgos laborales, pagos relacionados con sus servicios prestados, entrega de dotación y elementos de protección personal EPP, liquidación de prestaciones sociales y ha cumplido en forma oportuna todas sus obligaciones legales como empleador en CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DEL COMEDOR Y COCINA DEL INSTITUTO TÉCNICO SUPERIOR INDUSTRIAL EN EL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA, con el contrato de obra No. 0756-23.

Se expide a los días 06 del mes de septiembre del 2024.

Cordialmente,

WRUSSY INGENIEROS SAS
WILVER FRANCINY RUSSY LADINO
80.212.380

YESENIA ALVAREZ MORALES
1.096.226.349 de Barrancabermeja

C.C. – ARCHIVO

Powered by CamScanner

ANEXO 14. EXAMENES DE EGRESO

RUSSY
INGENIEROS S.A.S.
Nit. 901.109.885-1

Bogotá D.C., 15 de septiembre de 2024

Señor:
CESAR ORLANDO NARVAEZ QUIÑONEZ
1.098.754.093 de Bucaramanga

ASUNTO: EXÁMENES DE RETIRO

Respetado Señor (a):

Por medio de la presente y de la manera más atenta se le notifica que a partir de la fecha tiene 5 días calendario para realizarse los exámenes médicos de retiro en la sede **MILENH IPS S.A.S**, CALLE 49 # 21-58- BARRIO COLOMBIA, de acuerdo con la exposición de riesgos que obtuvo durante el periodo de tiempo laborado en la empresa **WRUSSY INGENIEROS SAS.**

Esto con el fin de dar cumplimiento a lo establecido en la resolución 2346 en el **ARTÍCULO 6°. EVALUACIONES MÉDICAS OCUPACIONALES DE EGRESO**. Aquellas que se deben realizar al trabajador cuando se termina la relación laboral. Su objetivo es valorar y registrar las condiciones de salud en las que el trabajador se retira de las tareas o funciones asignadas.

Examen programado: De acuerdo con el profesiograma de la empresa se programan los siguientes exámenes, examen médico, audiometría, visiometría.

Si pasados los cinco (5) días calendario el trabajador no se realiza los exámenes la empresa **NO** responde si hay alguna alteración en la salud de los trabajadores dado que lo que se busca con los exámenes de retiro es garantizar el bienestar físico, psicosocial de todo el personal.

Cordialmente,

WRUSSY INGENIEROS SAS
WILVER FRANCINY RUSSY LADINO
80.212.380

CESAR ORLANDO NARVAEZ QUIÑONEZ
1.098.754.093 de Bucaramanga

Wilver Franciny Russy Ladino
INGENIERO CIVIL
NIT. 80-212.380-5

Bogotá D.C., 15 de septiembre de 2024

Señor:
ELKIN FERNANDO REYES SERRANO
1.096.218.748 de Barrancabermeja

ASUNTO: EXÁMENES DE RETIRO

Respetado Señor (a):

Por medio de la presente y de la manera más atenta se le notifica que a partir de la fecha tiene 5 días calendario para realizarse los exámenes médicos de retiro en la sede **MILENH IPS S.A.S,** CALLE 49 # 21-58- BARRIO COLOMBIA, de acuerdo con la exposición de riesgos que obtuvo durante el periodo de tiempo laborado en la empresa **WILVER FRANCINY RUSSY LADINO**.

Esto con el fin de dar cumplimiento a lo establecido en la **resolución 2346** en el **ARTÍCULO 6°. EVALUACIONES MÉDICAS OCUPACIONALES DE EGRESO**. Aquellas que se deben realizar al trabajador cuando se termina la relación laboral. Su objetivo es valorar y registrar las condiciones de salud en las que el trabajador se retira de las tareas o funciones asignadas.

Examen programado: De acuerdo con el profesiograma de la empresa se programan los siguientes exámenes, examen médico, audiometría, visiometría.

Si pasados los cinco (5) días calendario el trabajador no se realiza los exámenes la empresa **NO** responde si hay alguna alteración en la salud de los trabajadores dado que lo que se busca con los exámenes de retiro es garantizar el bienestar físico, psicosocial de todo el personal.

Cordialmente,

WILVER FRANCINY RUSSY LADINO
80.212.380 de Bogotá D.C.

ELKIN FERNANDO REYES SERRANO
1.096.218.748 de Barrancabermeja

C.C. – ARCHIVO

Wilver Franciny Russy Ladino
INGENIERO CIVIL

Bogotá D.C., 15 de septiembre de 2024

Señor
JORGE REYES SERRANO
91.443.395 de Barrancabermeja

ASUNTO: EXÁMENES DE RETIRO

Respetado Señor (a)

Por medio de la presente y de la manera más atenta se le notifica que a partir de la fecha tiene 5 días calendario para realizarse los exámenes médicos de retiro en la sede **MILENH IPS S.A.S**, CALLE 49 # 21-58- BARRIO COLOMBIA, de acuerdo con la exposición de riesgos que obtuvo durante el periodo de tiempo laborado en la empresa **WILVER FRANCINY RUSSY LADINO**

Esto con el fin de dar cumplimiento a lo establecido en la **resolución 2346** en el **ARTÍCULO 6°. EVALUACIONES MÉDICAS OCUPACIONALES DE EGRESO** Aquellas que se deben realizar al trabajador cuando se termina la relación laboral. Su objetivo es valorar y registrar las condiciones de salud en las que el trabajador se retira de las tareas o funciones asignadas.

Examen programado: De acuerdo con el profesiograma de la empresa se programan los siguientes exámenes, examen médico, audiometría, visiometría.

Si pasados los cinco (5) días calendario el trabajador no se realiza los exámenes la empresa **NO** responde si hay alguna alteración en la salud de los trabajadores dado que lo que se busca con los exámenes de retiro es garantizar el bienestar físico, psicosocial de todo el personal.

Cordialmente,

WILVER FRANCINY RUSSY LADINO
80.212.380 de Bogotá D.C.

Jorge Reyes S

JORGE REYES SERRANO
91.443.395 de Barrancabermeja

C.C. – ARCHIVO

RUSSY
INGENIEROS S.A.S.
Nit. 901.109.885-1

Bogotá D.C., 15 de septiembre de 2024

Señor:
SANDRA MILENA SANTIAGO CAMACHO
37.712.004 de Bucaramanga

ASUNTO: EXÁMENES DE RETIRO

Respetado Señor (a):

Por medio de la presente y de la manera más atenta se le notifica que a partir de la fecha tiene 5 días calendario para realizarse los exámenes médicos de retiro en la sede **MILENH IPS S.A.S,** CALLE 49 # 21-58- BARRIO COLOMBIA, de acuerdo con la exposición de riesgos que obtuvo durante el periodo de tiempo laborado en la empresa **WRUSSY INGENIEROS SAS.**

Esto con el fin de dar cumplimiento a lo establecido en la resolución 2346 en el **ARTÍCULO 6°. EVALUACIONES MÉDICAS OCUPACIONALES DE EGRESO**. Aquellas que se deben realizar al trabajador cuando se termina la relación laboral. Su objetivo es valorar y registrar las condiciones de salud en las que el trabajador se retira de las tareas o funciones asignadas.

Examen programado: De acuerdo con el profesiograma de la empresa se programan los siguientes exámenes, examen médico, audiometría, visiometria.

Si pasados los cinco (5) días calendario el trabajador no se realiza los exámenes la empresa **NO** responde si hay alguna alteración en la salud de los trabajadores dado que lo que se busca con los exámenes de retiro es garantizar el bienestar físico, psicosocial de todo el personal.

Cordialmente,

WRUSSY INGENIEROS SAS
WILVER FRANCINY RUSSY LADINO
80.212.380

SANDRA MILENA SANTIAGO CAMACHO
37.712.004 de Bucaramanga

RUSSY
INGENIEROS S.A.S.
Nit. 901.109.885-1

Bogotá D.C., 06 de septiembre de 2024

Señor:
YESENIA ALVAREZ MORALES
1.096.226.349 de Barrancabermeja

ASUNTO: EXÁMENES DE RETIRO

Respetado Señor (a):

Por medio de la presente y de la manera más atenta se le notifica que a partir de la fecha tiene 5 días calendario para realizarse los exámenes médicos de retiro en la sede **MILENH IPS S.A.S,** CALLE 49 # 21-58- BARRIO COLOMBIA, de acuerdo con la exposición de riesgos que obtuvo durante el periodo de tiempo laborado en la empresa **WRUSSY INGENIEROS SAS.**

Esto con el fin de dar cumplimiento a lo establecido en la resolución 2346 en el **ARTÍCULO 6°. EVALUACIONES MÉDICAS OCUPACIONALES DE EGRESO**. Aquellas que se deben realizar al trabajador cuando se termina la relación laboral. Su objetivo es valorar y registrar las condiciones de salud en las que el trabajador se retira de las tareas o funciones asignadas.

Examen programado: De acuerdo con el profesiograma de la empresa se programan los siguientes exámenes, examen médico, audiometría, visiometría.

Si pasados los cinco (5) días calendario el trabajador no se realiza los exámenes la empresa **NO** responde si hay alguna alteración en la salud de los trabajadores dado que lo que se busca con los exámenes de retiro es garantizar el bienestar físico, psicosocial de todo el personal.

Cordialmente,

WRUSSY INGENIEROS SAS
WILVER FRANCINY RUSSY LADINO
80.212.380

YESENIA ALVAREZ MORALES
1.096.226.349 de Barrancabermeja

Powered by CamScanner

5.10. INFORME SOCIO AMBIENTAL DE OBRA

RUSSY INGENIEROS S.A.S. Nit. 901.109.885-1	**INFORME MENSUAL**

INFORME AMBIENTAL 18

PERIODO: 06 AGOSTO 2024 - 10 SEPTIEMBRE 2024

DISTRITO DE BARRANCABERMEJA

RUSSY INGENIEROS S.A.S. Nit. 901.109.885-1	**INFORME MENSUAL**

Elaboró:

KAREN SALAMANCA ROJAS
WRUSSY INGENIEROS SAS

Revisó y Aprobó:

WILVER FRANCINY RUSSY LADINO
WRUSSY INGENIEROS SAS

RUSSY INGENIEROS S.A.S. Nit. 901.109.885-1	INFORME MENSUAL

CONTENIDO

INTRODUCCION 4
2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO. 5
2.1. INFORMACIÓN DEL CONTRATISTA 5
3. ESTADO DE CUMPLIMIENTO DE LOS PERMISOS Y/O LICENCIAS APLICABLES 5
4. COMPONENTE AMBIENTAL 6
4.1. SEÑALIZACIÓN DE OBRAS 6
4.2. TRATAMIENTO Y MANEJO DE COBERTURA VEGETAL 7
4.3. DESCAPOTE Y REMOCIÓN DE LA CAPA ORGÁNICA 7
4.4. MANEJO DE AGUAS SUPERFICIALES 7
4.5. MANEJO Y DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS 7
4.6. CONTROL DE EMISIONES ATMOSFERICAS 9
4.7. MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS Y CONVENCIONALES 9
4.8. MANEJO DE RESIDUOS PELIGROSOS 9
4.9. REGISTRO DE MATERIALES 10
5. COMPONENTE SOCIAL 10
5.1. ACTAS DE REUNIÓN 10
5.2. INFORME SOCIAL 10
6. CONCLUSIONES 10

LISTA DE ILUSTRACIONES

lustración 1. Ubicación del proyecto. Google maps. 5

LISTADO DE TABLAS

Tabla 1. Registro fotográfico Señalización y cerramiento 6
Tabla 2. Acumulado de volúmenes de RCD 8

RUSSY INGENIEROS S.A.S. Nit. 901.109.885-1	**INFORME MENSUAL**


INTRODUCCION

El diseño de las estrategias y medidas de prevención, mitigación y control de los impactos ambientales identificados en los proyectos de tipo constructivo están enmarcadas en la legislación ambiental colombiana de orden local, regional y nacional; donde se orienta la prospectiva ambiental nacional para la conservación del ambiente y los recursos naturales. De igual manera la protección del trabajador, la prevención de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales son reglamentadas a través de los requisitos dispuestos en la normatividad del país.

2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO.

El proyecto se ejecutará en la ciudad de Barrancabermeja en la dirección Cra. 28 # 55-10, como se evidencia en la ilustración N 1.

lustración 1. Ubicación del proyecto. Google maps.

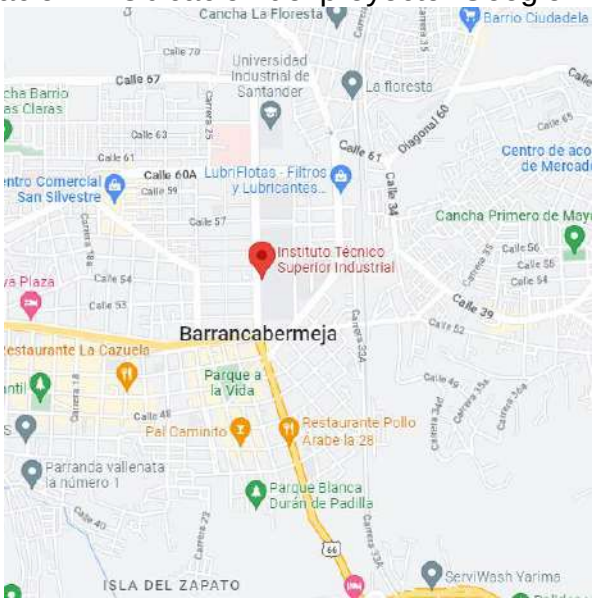

Fuente: https://www.google.com/maps/

2.1. INFORMACIÓN DEL CONTRATISTA

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: WILVER FRANCINY RUSSY LADINO
CORREO ELECTRÓNICO: proyectos@wrussyingenieros.com
OFICINA: DIRECCIÓN: Calle 8f # 79- 94 Bogotá D.C.
Contrato de Obra No. 0756-23
Objeto: CONSTRUCCION Y DOTACION DEL COMEDOR Y COCINA DEL INSTITUTO TECNICO SUPERIOR INDUSTRIAL EN EL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA

3. ESTADO DE CUMPLIMIENTO DE LOS PERMISOS Y/O LICENCIAS APLICABLES

Durante el periodo del **06 de agosto 2024 al 11 septiembre de 2024** se ejecutaron actividades que requerían permisos y/o licencias ambientales.

4. COMPONENTE AMBIENTAL

A continuación, se describen las actividades de implementación del PMA en el periodo del **06 de agosto 2024 al 11 septiembre de 2024**; para la interpretación de los programas que demuestran la ejecución de las medidas de manejo y sus anexos.

4.1. SEÑALIZACIÓN DE OBRAS

Se realizó señalización preventiva e informativa, además se realiza cerramiento de las áreas de intervención.

Tabla 1. Registro fotográfico Señalización y cerramiento

Desinfección Unidades Sanitarias	Desinfección Unidades Sanitarias
	
Orden y aseo	Desinfección Unidades Sanitarias
	
Desinfección Unidades Sanitarias	Desinfección Unidades Sanitarias





4.2. TRATAMIENTO Y MANEJO DE COBERTURA VEGETAL

Durante el periodo del **06 de agosto 2024 al 11 septiembre de 2024**, no se realizaron actividades con referencia a este programa.

4.3. DESCAPOTE Y REMOCIÓN DE LA CAPA ORGÁNICA

Durante el periodo del **06 de agosto 2024 al 11 septiembre de 2024**, no se realizaron actividades con referencia a este programa como se evidencia en el registro fotográfico.

4.4. MANEJO DE AGUAS SUPERFICIALES

Durante periodo del **06 de agosto 2024 al 11 septiembre de 2024**, no se realizaron actividades con referencia a este programa.


4.5. MANEJO Y DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS

Durante periodo del **06 de agosto 2024 al 11 septiembre de 2024**, no se realizaron retiros de escombro.

SEGUIMIENTO Y MONITOREO
$\%\ Disposición\ escombros = \frac{Vol.escombros\ dispuestos\ en\ escombrera\ m3}{Vol.\ escombros\ generados\ m3}(mes) * 100$
$\%\ Disposición\ escombros = \frac{0}{0} * 100 = 0\%$

Tabla 2. Acumulado de volúmenes de RCD

Mes	Material de excavación (m^3)	Demolición (m^3)	Cantidad Total (m^3)
MARZO-ABRIL	0	68	68
ABRIL-MAYO	0	224	224
MAYO-JUNIO	0	248	248
JUNIO-JULIO	0	64	64
JULIO-AGOSTO	0	56	56
AGOSTO-SEPTIEMBRE	0	16	16
SEPTIEMBRE-OCTUBRE	0	416	416
OCTUBRE-NOVIEMBRE	0	0	0
NOVIEMBRE-DICIEMBRE	0	105	105
DICIEMBRE-ENERO	0	0	0
ENERO-FEBRERO	0	0	0
FEBRERO-MARZO	0	0	0
MARZO-ABRIL	0	0	0
ABRIL-MAYO	0	0	0
MAYO-JUNIO	0	0	0
JUNIO-JULIO	0	232	232
JULIO-AGOSTO	0	0	0
AGOSTO-SEPTIEMBRE	0	0	0
TOTAL	**0**	**1429**	**1429**

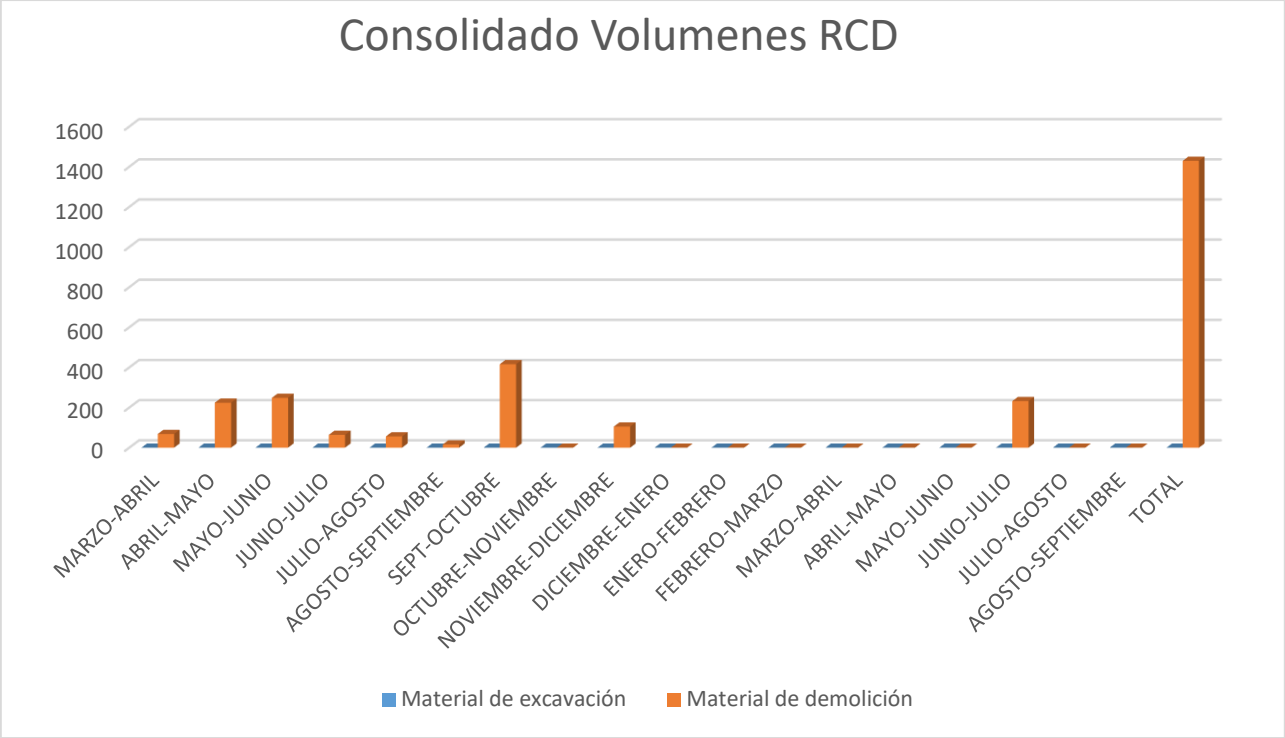

4.6. CONTROL DE EMISIONES ATMOSFERICAS

Durante el periodo comprendido del **06 de agosto 2024 al 11 septiembre de 2024** no se presentaron quejas por ruido de las actividades que se ejecutaron.

SEGUIMIENTO Y MONITOREO
$Quejas\ de\ ruido = No.quejas\ por\ ruido\ en\ el\ mes$
$Quejas\ de\ ruido = 0$

4.7. MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS Y CONVENCIONALES

Para el periodo del **06 de agosto 2024 al 11 septiembre de 2024**, se generaron residuos sólidos, los cuales fueron dispuestos en los puntos ecológicos presentes en el frente de obra, y posterior a ello la recolección la realizó la empresa de servicios públicos de aseo de Barrancabermeja, VEOLIA S.A ESP.

4.8. MANEJO DE RESIDUOS PELIGROSOS

Durante el periodo del **06 de agosto 2024 al 11 septiembre de 2024** no se realizaron actividades con referencia a este programa. Se adjunta el certificado del manejo de los residuos líquidos de los baños **ANEXO 1**.

4.9. REGISTRO DE MATERIALES

Durante el periodo del **06 de agosto 2024 al 11 septiembre de 2024**, no se realizaron actividades con referencia a este programa.

5. COMPONENTE SOCIAL

A continuación, se describen las actividades de la gestión social que se realizó en el periodo del **06 de agosto 2024 al 11 septiembre de 2024**.

5.1. ACTAS DE REUNIÓN

Durante el periodo comprendido del **06 de agosto 2024 al 11 septiembre de 2024**, se realizaron reuniones de socialización con la comunidad sobre el inicio del proyecto la cual se encuentra la evidencia en el **ANEXO 2**.

5.2. INFORME SOCIAL

Se realiza informe mensual social, el cual se encuentra en el **ANEXO 3**.

6. CONCLUSIONES

- Se cumplió con los compromisos contractuales del contrato en el periodo del **06 de agosto 2024 al 11 septiembre de 2024.**

- Se realizaron actividades de supervisión de los trabajos desarrollados con apoyo del residente e inspector HSE, de esta manera se garantizó el cumplimiento de los requisitos exigidos legalmente en el contrato y en la normatividad legal vigente colombiana.

- Todas las áreas intervenida se dejaron con su respectivo orden y aseo.

ANEXO 1. CERTIFICADO MANEJO DE VERTIMIENTOS

Aseos y Servicios de Colombia S.A.S.

assear
www.assear.com

Retiro
(2024/09/02) - Fecha Servidor: (2024/09/02)

Contrato de Origen

Contrato: 3086_1 **Cliente:** WRUSSY INGENIEROS SAS
Dirección: INSTITUCIÓN EDUCATIVA INSTITUTO TÉCNICO SUPERIOR INDUSTRIAL **Barrio:** GALAN

Contrato

Contrato: Principal_0 **Cliente:** Assear
Dirección: Kilometro 1,8 Via El Reten - Aeropuerto Yariguies - Barrancabermeja **Barrio:** Laureles

Activo

Sticker: 085.255 **Nombre Activo:** USP ARMAL AZUL
Extras: USP : USP - **Marca :** ARMAL - **Color :** AZUL - **Tipo :** 2021

Vehículo

CAMION NPR TAR685	TAR685

Operadores

Conductor		Auxiliar 1	
Jhon Jairo Moya Suarez		Melvin Mantilla Roa	
91446417		1096196276	

Resumen

Hora: 13:53:45

Encuesta

Foto



Nombre de el responsable

jf operador

UBICACIÓN



7.06425115, -73.8504165

Retiro

Ok

clickidea

Aseos y Servicios de Colombia S.A.

assear
www.assear.com

Retiro
(2024/09/02) - Fecha Servidor: (2024/09/02)

Contrato de Origen

Contrato: 3086_1 **Cliente:** WRUSSY INGENIEROS SAS
Dirección: INSTITUCIÓN EDUCATIVA INSTITUTO TÉCNICO SUPERIOR INDUSTRIAL **Barrio:** GALAN

Contrato

Contrato: Principal_0 **Cliente:** Assear
Dirección: Kilometro 1,8 Via El Reten - Aeropuerto Yariguies - Barrancabermeja **Barrio:** Laureles

Activo

Sticker: 070.940 **Nombre Activo:** USP MANITU VERDE

Vehículo

CAMION NPR TAR685	TAR685

Operadores

Conductor		Auxiliar 1	
Jhon Jairo Moya Suarez		Melvin Mantilla Roa	
91446417		1096196276	

Resumen

Hora: 13:54:07

Encuesta

Foto



Nombre de el responsable

jf operador

UBICACIÓN



7.06424916, -73.85041982

Retiro

Ok

clickidea

Aseos y Servicios de Colombia S.A.S.

assear
www.assear.com

Servicio realizado
(2024/08/08) - Fecha Servidor: (2024/08/08)

Contrato

Contrato: 3086_1
Cliente: WRUSSY INGENIEROS SAS
Dirección: INSTITUCIÓN EDUCATIVA INSTITUTO TÉCNICO SUPERIOR INDUSTRIAL
Barrio: GALAN

Activo

Sticker: 070.940
Nombre Activo: USP MANITU VERDE

Vehículo

CAMIONETA NISSAN LHP665	LHP665

Operadores

Conductor		Auxiliar 1	
Jhonatan Ricardo Fontecha Villarreal		Melvin Mantilla Roa	
1096212725		1096196276	

Resumen

Hora: 13:01:29

Encuesta

Foto



UBICACIÓN



7.06427295, -73.85059328

Servicio realizado

Ok

clickidea

Aseos y Servicios de Colombia S.A.

assear
www.assear.com

Servicio realizado
(2024/08/12) - Fecha Servidor: (2024/08/12)

Contrato

Contrato: 3086_1 **Cliente:** WRUSSY INGENIEROS SAS
Dirección: INSTITUCIÓN EDUCATIVA INSTITUTO TÉCNICO SUPERIOR INDUSTRIAL **Barrio:** GALAN

Activo

Sticker: 085.255 **Nombre Activo:** USP ARMAL AZUL
Extras: USP : USP - **Marca :** ARMAL - **Color :** AZUL - **Tipo :** 2021

Vehiculo

CAMIONETA NISSAN LHP665	LHP665

Operadores

Conductor		Auxiliar 1	
Jhonatan Ricardo Fontecha Villarreal		Melvin Mantilla Roa	
1096212725		1096196276	

Resumen

Hora: 08:43:33

Encuesta

Foto



UBICACIÓN



7.06421512, -73.85052585

Servicio realizado

Ok

clickidea

Aseos y Servicios de Colombia S.A.S.

assear
www.assear.com

Servicio realizado
(2024/08/15) - Fecha Servidor: (2024/08/15)

Contrato

Contrato: 3086_1 **Cliente:** WRUSSY INGENIEROS SAS

Dirección: INSTITUCIÓN EDUCATIVA INSTITUTO TÉCNICO SUPERIOR INDUSTRIAL **Barrio:** GALAN

Activo

Sticker: 070.940 **Nombre Activo:** USP MANITU VERDE

Vehículo

CAMION NPR TAR684	TAR684

Operadores

Conductor	
Jhonatan Ricardo Fontecha Villarreal	
1096212725	

Resumen

Hora: 07:24:32

Encuesta

Foto



UBICACIÓN



7.06418656, -73.8505696

Servicio realizado

Ok

clickidea

Aseos y Servicios de Colombia S.A.S.

assear
www.assear.com

No realizado en Ruta
(2024/08/19) - Fecha Servidor: (2024/08/19)

Contrato

Contrato: 3086_1 **Cliente:** WRUSSY INGENIEROS SAS

Dirección: INSTITUCIÓN EDUCATIVA INSTITUTO TÉCNICO SUPERIOR INDUSTRIAL **Barrio:** GALAN

Vehículo

CAMIONETA NISSAN LHP665	LHP665

Operadores

Conductor	
Jhon Jairo Arango Matta	
91445133	

Resumen

Hora: 09:15:21

Encuesta

Foto



UBICACIÓN



7.06552545, -73.85045356

No realizado en Ruta

Sin autorización de ingreso

no hay personal laborando portón serrado

Aseos y Servicios de Colombia S.A.S.

assear
www.assear.com

CERTIFICACION DE VISITA
(2024/08/20) - Fecha Servidor: (2024/08/20)

Contrato

Contrato: 3086_1 **Cliente:** WRUSSY INGENIEROS SAS
Dirección: INSTITUCIÓN EDUCATIVA INSTITUTO TÉCNICO SUPERIOR INDUSTRIAL **Barrio:** GALAN

Activo

Sticker: 070.940 **Nombre Activo:** USP MANITU VERDE

Vehículo

CAMIONETA NISSAN LHP665	LHP665

Operadores

Conductor	
Jhon Jairo Arango Matta	
91445133	

Resumen

Hora: 15:09:22

Encuesta

CERTIFICACION

FOTO CERTIFICACION VISITA



NOMBRE QUIEN RECIBE
no hay personal para la firma

CARGO QUIEN RECIBE
conductor

FIRMA CLIENTE

UBICACIÓN



7.06424132, -73.85050739

CERTIFICACION DE VISITA

Ok Equipo funcionando

clickidea

Aseos y Servicios de Colombia S.A.S.

assear
www.assear.com

Servicio realizado
(2024/08/22) - Fecha Servidor: (2024/08/22)

Contrato

Contrato: 3086_1 **Cliente:** WRUSSY INGENIEROS SAS

Dirección: INSTITUCIÓN EDUCATIVA INSTITUTO TÉCNICO SUPERIOR INDUSTRIAL **Barrio:** GALAN

Activo

Sticker: 070.940 **Nombre Activo:** USP MANITU VERDE

Vehículo

CAMIONETA NISSAN LHP665	LHP665

Operadores

Conductor		Auxiliar 1	
Juan Francisco Perez Leiva		Melvin Mantilla Roa	
92189988		1096196276	

Resumen

Hora: 07:43:15

Encuesta

Foto



UBICACIÓN



7.06421081, -73.85060022

Servicio realizado

Ok

clickidea

Aseos y Servicios de Colombia S.A.S.

assear
www.assear.com

Servicio realizado
(2024/08/26) - Fecha Servidor: (2024/08/26)

Contrato

Contrato: 3086_1 **Cliente:** WRUSSY INGENIEROS SAS
Dirección: INSTITUCIÓN EDUCATIVA INSTITUTO TÉCNICO SUPERIOR INDUSTRIAL **Barrio:** GALAN

Activo

Sticker: 070.940 **Nombre Activo:** USP MANITU VERDE

Vehículo

CAMIONETA NISSAN LHP665	LHP665

Operadores

Conductor	
Jhon Jairo Arango Matta	
91445133	

Resumen

Hora: 10:00:46

Encuesta

Foto



UBICACIÓN



7.06422982, -73.8505614

Servicio realizado

Ok

clickidea

Aseos y Servicios de Colombia S.A.S.

assear
www.assear.com

Servicio realizado
(2024/08/29) - Fecha Servidor: (2024/08/29)

Contrato

Contrato: 3086_1 **Cliente:** WRUSSY INGENIEROS SAS

Dirección: INSTITUCIÓN EDUCATIVA INSTITUTO TÉCNICO SUPERIOR INDUSTRIAL **Barrio:** GALAN

Activo

Sticker: 070.940 **Nombre Activo:** USP MANITU VERDE

Vehículo

CAMIONETA NISSAN LHP665	LHP665

Operadores

Conductor		Auxiliar 1	
Jhon Jairo Arango Matta		Melvin Mantilla Roa	
91445133		1096196276	

Resumen

Hora: 14:32:53

Encuesta

Foto



UBICACIÓN

Ver Ubicación

7.06426678, -73.85052359

Servicio realizado

Ok

clickidea

ANEXO 2. ACTAS DE SOCIALIZACIÓN

RUSSY INGENIEROS S.A.S.	ACTA DE REUNIÓN	CÓDIGO DE-FOR-01
		VERSIÓN 1
		FECHA DE APROBACIÓN: 08/01/2019

FECHA REUNIÓN: 14-09-24	HORA: 8:00 am	LUGAR: I.T.S. I	ACTA NO. 1.

REUNIÓN CONVOCADA POR	Cesar Narvaez.
TIPO DE REUNIÓN	Capacitación
CONTRATO N°	0756-23
OBJETO DEL CONTRATO	Construcción y Dotación del comedor del Instituto Tecnico Superior Industrial del Distrito Especial Barrancabermeja
ORGANIZADOR	Supervisor del Contrato
APUNTADOR	Cesar Narvaez
ASISTENTES	

TEMAS DE DISCUSIÓN

* Entrega portón antiguo propiedad de la Institución.
* Entrega contador antiguo del gas.
* Capacitación manejo sistema de bombeo.

DESARROLLO TEMAS DE DISCUSIÓN

Se hace entrega a la Institución del portón antiguo que servia de acceso a la obra, ya que en dicho acceso quedo instalado un portón nuevo.

De igual manera de hace entrega del medidor antiguo de gas de la anterior cafeteria, este medidor se debe conservar, ya que la empresa VANTI realiza la lectura del mismo todos los meses.

Se hace capacitación del manejo del sistema de bombeo al personal de mantenimiento de la

RUSSY INGENIEROS S.A.S.	ACTA DE REUNIÓN	CÓDIGO DE-FOR-01
		VERSIÓN 1
		FECHA DE APROBACIÓN: 08/01/2019

Institución, se indican las 2 bombas y su respectivo fondonamiento, sus valvulas de paso del acueducto y del tanque de almacenamiento.

RUSSY INGENIEROS S.A.S.	ACTA DE REUNIÓN	CÓDIGO DE-FOR-01
		VERSIÓN 1
		FECHA DE APROBACIÓN: 08/01/2019

NOMBRE	CARGO	FIRMA
Cesar Narvaez	Ing. Residente RUSSY	CESAR CN
Fabian Ospina J	Operario ITSI	Fabian Ospina J

ANEXO 3. INFORME SOCIAL

RUSSY INGENIEROS S.A.S.	INFORME SOCIAL

Objeto: Construcción y Dotación del comedor y cocina del Instituto Tecnico Superior Industrial del Distrito de Barrancabermeja.	
Actividades ejecutadas en el periodo: 06 de agosto de 2024 a 05 de septiembre de 2024	No. Contrato: 0756-23

Actividades Ejecutadas
Actas de entorno y de vecindad.
Se realizo acta de vecindad final, donde se deja evidencia que el proyecto no afecto las instalaciones del colegio ni áreas cercanas al proyecto ejecutado, con las siguientes evidencias encontradas: Zona con presencia de humedad, moho, piso con fisuras pequeñas En el muro se evidencia falta de mantenimiento, se deja caja de alcantarillado de aguas servidas y alcantarillado pluvial. Se realizo vía de recolección de aguas lluvias, mejoramiento de recolección de aguas lluvias existentes. Mejoramiento de la cancha de tierra utilizada para cerramiento. Conexión a transformador principal para la respectiva conexión a las redes eléctricas. Reforzamiento del muro por construcción del nuevo acceso para estudiantes. Mejoramiento del muro existente que se encontraba a punto de caer (demolición y construcción de muro nuevo de cerramiento), se mejoró por la parte interior.
PQRS (Peticiones, Quejas, Reclamos, Solicitudes)
Comunidad I.T.S.I En el periodo entre el 6 de mayo al 5 de junio por parte de la comunidad del I.T.S.I no se presentan PQRS.
Acta de entrega.
Entrega de cancha de futbol de tierra que fue utilizada para cerramiento durante la ejecución del proyecto, la entrega se realizó en compañía de las personas encargadas de la Institución, con los ajustes respectivos realizados.
Anexos Fotográficos.

ANEXO 4. REGISTRO FOTOGRÁFICO

REGISTRO FOTOGRAFICO



Descripcion	Limpieza de Unidades Sanitarias
Fecha	22 de Agosto de 2024



Descripcion	Limpieza de Unidades Sanitarias
Fecha	22 de Agosto de 2024
