| | | |
|---|---|---|
| Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático | **INFORME PERIÓDICO DEL SUPERVISOR**<br>(Para Contratos diferentes la prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión) | **Código:** GC-FT-65<br>**Versión:** 3<br>**Página:** 1 de 1<br>**Vigente Desde:** 23/11/2021 |

## 1. Datos generales

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número del Contrato o Convenio | FONDIGER-013-2023 | | | | | | | **Fecha suscripción contrato o convenio::** | 3-feb-23 |
| Tipo de contrato | INTERVENTORÍA | | | | | | | **Nombre o Razón Social del Contratista:** | JAM INGENIERIA Y MEDIO AMBIENTE SAS |
| Plazo de Ejecución (meses) | 14 | | | | | | | **Número de Cédula o NIT:** | 830.084.684.9 |
| Periodo del Informe: | 20 | 7 | 2024 | al | 19 | 8 | 2024 | **Nombre del Representante Legal:**<br>**(Quien en tenga la facultad en el periodo)** | Javier Antonio Millán López<br>CC .79.345.746 |
| Interventor (si Aplica) | NO APLICA | | | | | | | **Número de Cédula o NIT:**<br>**Nombre del Representante Legal:**<br>**(Quien en tenga la facultad en el periodo)** | NO APLICA |
| Cargo del Supervisor (1) del IDIGER<br>(según cláusula de supervisión del contrato/convenio) | Subdirector de Análisis de Riesgos y Efectos del Cambio Climático | | | | | | | **Nombre Supervisores de otras entidades (cooperantes) - (Si aplica)** | NO APLICA |
| Cargo del Supervisor (2) del IDIGER<br>(según cláusula del supervisor del contrato/convenio) Si Aplica | NO APLICA | | | | | | | **Cargos supervisores de otras entidades (Si Aplica)** | NO APLICA |
| Cargo Apoyo a la Supervisión del IDIGER | NINGUNO | | | | | | | | |

**Objeto Contractual:**

REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA EVALUACIÓN Y ZONIFICACIÓN DETALLADA DE AMENAZA, VULNERABILIDAD Y RIESGO POR INUNDACIÓN PARA EL RÍO TUNJUELO EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C; ASÍ COMO ESTABLECER LAS MEDIDAS DE REDUCCIÓN A ESTE FENÓMENO AMENAZANTE.

## 2. Información presupuestal y plazo de ejecución

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Valor Inicial del contrato/convenio | $ 692.999.995 | Aporte IDIGER | Valor CDP | | Número CDP | | Fecha CDP | | Fuente de Recursos | |
| | | | Valor RP | | Número RP | | Fecha RP | | | |
| | | Aporte FONDIGER | Valor CDP | $ 693.211.736 | Número CDP | 3092 -2023 | Fecha CDP | | Fuente de Recursos | FONDIGER |
| Plazo Inicial de Ejecución (meses) | 14 | | Valor RP | $ 692.999.995 | Número RP | 9140 -2023 | Fecha RP | 13/02/2023 | | |
| | | **Valor Total** | | $ 692.999.995 | | | | | | |
| | | Aporte Cooperante/Parte Conviniente (Dinero/Especie) Según Aplique | | | **Descripción** | | | | | |
| | | **Valor Total** | | $ 692.999.995 | | | | | | |

### 2.1 Adiciones y Prórrogas

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Valor Adición No. 1 del contrato/convenio | | Aporte IDIGER | Valor CDP | | Número CDP | | Fecha CDP | | Fuente de Recursos | |
| | | | Valor RP | | Número RP | | Fecha RP | | | |
| | | Aporte FONDIGER | Valor CDP | $ 109.147.497 | Número CDP | 3808-2024 | Fecha CDP | | Fuente de Recursos | FONDIGER |
| Cantidad de meses de prórroga 1 | 4,5 | | Valor RP | $ 109.147.497 | Número RP | 10728-2024 | Fecha RP | 22/04/2024 | | |
| | | **Subtotal** | | $ 109.147.497 | | | | | | |
| | | **Valor Total (Inicial +** | | $ 802.147.492 | | | | | | |
| | | Aporte Cooperante/Parte Conviniente (Dinero/Especie) Según Aplique | | | **Descripción** | | | | | |
| Cantidad Total de meses (Total plazo de ejecución) | 18,5 | | | | | | | | | |



42

| Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático | **INFORME PERIÓDICO DEL SUPERVISOR**<br>(Para Contratos diferentes la prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión) | **Código:** GC-FT-65<br>**Versión:** 3<br>**Página:** 1 de 1<br>**Vigente Desde:** 23/11/2021 |
|---|---|---|

## 1. Datos generales

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Número del Contrato o Convenio** | FONDIGER-013-2023 | | | | | | | **Fecha suscripción contrato o convenio::** | 3-feb-23 |
| **Tipo de contrato** | INTERVENTORÍA | | | | | | | **Nombre o Razón Social del Contratista:** | JAM INGENIERIA Y MEDIO AMBIENTE SAS |
| **Plazo de Ejecución (meses)** | 14 | | | | | | | **Número de Cédula o NIT:** | 830.084.684.9 |
| **Periodo del Informe:** | 20 | 7 | 2024 | al | 19 | 8 | 2024 | **Nombre del Representante Legal:**<br>**(Quien en tenga la facultad en el periodo)** | Javier Antonio Millán López<br>CC .79.345.746 |
| **Interventor (si Aplica)** | NO APLICA | | | | | | | **Número de Cédula o NIT:**<br>**Nombre del Representante Legal:**<br>**(Quien en tenga la facultad en el periodo)** | NO APLICA |
| **Cargo del Supervisor (1) del IDIGER**<br>**(según cláusula de supervisión del contrato/convenio)** | Subdirector de Análisis de Riesgos y Efectos del Cambio Climático | | | | | | | **Nombre Supervisores de otras entidades (cooperantes) - (Si aplica)** | NO APLICA |
| **Cargo del Supervisor (2) del IDIGER**<br>**(según cláusula del supervisor del contrato/convenio) Si Aplica** | NO APLICA | | | | | | | **Cargos supervisores de otras entidades (Si Aplica)** | NO APLICA |
| **Cargo Apoyo a la Supervisión del IDIGER** | NINGUNO | | | | | | | | |

**Objeto Contractual:**

REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA EVALUACIÓN Y ZONIFICACIÓN DETALLADA DE AMENAZA, VULNERABILIDAD Y RIESGO POR INUNDACIÓN PARA EL RÍO TUNJUELO EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C; ASÍ COMO ESTABLECER LAS MEDIDAS DE REDUCCIÓN A ESTE FENÓMENO AMENAZANTE.

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Valor Total** | $ 802.147.492 | | | | | | | |
| **Valor Adición No. 2 del contrato/convenio** | | **Aporte IDIGER** | Valor CDP | | Número CDP | | Fecha CDP | | Fuente de Recursos | |
| | | | Valor RP | | Número RP | | Fecha RP | | | |
| | | **Aporte FONDIGER** | Valor CDP | | Número CDP | | Fecha CDP | | Fuente de Recursos | |
| **Cantidad de meses de prórroga 2** | 3,5 | | Valor RP | | Número RP | | Fecha RP | | | |
| | | **Subtotal** | | | | | | | | |
| | | **Valor Total (Inicial + Adición 1)** | | | | | | | | |
| **Cantidad Total de meses (Total plazo de ejecución)** | 22,0 | **Aporte Cooperante/Parte Conviniente (Dinero/Especie) Según Aplique** | | | **Descripción** | | | | | |
| | | **Valor Total** | $ 802.147.492 | | | | | | | |

*Si tiene mas de dos adiciones y prórrogas inserte las casillas necesarias*

2.2 Disminuciones (Cuando Aplique)

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Fecha Documento Disminución:** | | **Valor disminución :** | |

***Descripción del motivo de la disminución***

**Nota:** Si este documento se encuentra impreso se considera Copia no Controlada. La versión vigente está publicada en el sitio web del Instituto Distrital de la Gestión del Riesgo y Cambio Climático.

| | | |
|---|---|---|
| Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático | **INFORME PERIÓDICO DEL SUPERVISOR**<br>(Para Contratos diferentes la prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión) | **Código:** GC-FT-65<br>**Versión:** 3<br>**Página:** 1 de 1<br>**Vigente Desde:** 23/11/2021 |

## 1. Datos generales

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Número del Contrato o Convenio** | FONDIGER-013-2023 | | | | | | | **Fecha suscripción contrato o convenio::** | 3-feb-23 |
| **Tipo de contrato** | INTERVENTORÍA | | | | | | | **Nombre o Razón Social del Contratista:** | JAM INGENIERIA Y MEDIO AMBIENTE SAS |
| **Plazo de Ejecución (meses)** | 14 | | | | | | | **Número de Cédula o NIT:** | 830.084.684.9 |
| **Periodo del Informe:** | 20 | 7 | 2024 | al | 19 | 8 | 2024 | **Nombre del Representante Legal:**<br>**(Quien en tenga la facultad en el periodo)** | Javier Antonio Millán López<br>CC .79.345.746 |
| **Interventor (si Aplica)** | NO APLICA | | | | | | | **Número de Cédula o NIT:**<br>**Nombre del Representante Legal:**<br>**(Quien en tenga la facultad en el periodo)** | NO APLICA |
| **Cargo del Supervisor (1) del IDIGER**<br>**(según cláusula de supervisión del contrato/convenio)** | Subdirector de Análisis de Riesgos y Efectos del Cambio Climático | | | | | | | **Nombre Supervisores de otras entidades (cooperantes) - (Si aplica)** | NO APLICA |
| **Cargo del Supervisor (2) del IDIGER**<br>**(según cláusula del supervisor del contrato/convenio) Si Aplica** | NO APLICA | | | | | | | **Cargos supervisores de otras entidades (Si Aplica)** | NO APLICA |
| **Cargo Apoyo a la Supervisión del IDIGER** | NINGUNO | | | | | | | | |

**Objeto Contractual:**

REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA EVALUACIÓN Y ZONIFICACIÓN DETALLADA DE AMENAZA, VULNERABILIDAD Y RIESGO POR INUNDACIÓN PARA EL RÍO TUNJUELO EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C; ASÍ COMO ESTABLECER LAS MEDIDAS DE REDUCCIÓN A ESTE FENÓMENO AMENAZANTE.

*NOVEDADES DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL*

### 2.3 VALOR TOTAL Y PLAZO TOTAL MAS MODIFICACIONES

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Cantidad de Adiciones**<br>**(Sume la cantidad de adiciones realizadas)** | 1 | **Valor Total de Contrato/Convenio**<br>**(Valor Inicial + Valor total de las Adiciones)** | $ 802.147.492 | **Plazo Total de Ejecución**<br>**(Cantidad de meses inicial + Cantidad de mese prórrogas)** | 22 |

### 2.4. Anticipo ( Si Aplica)

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Valor Anticipo**<br>**(Si Aplica)** | NO APLICA | **Porcentaje de Amortización**<br>**(Si Aplica)** | NO APLICA | **Fecha Pago del Anticipo** | dd | mm | aaa |

### 3. Información relacionada con la contratación derivada

*(Este aparte sólo debe diligenciarse en el evento de existir contratación derivada. Se debe allegar la relación de la misma y el estado que reporte la entidad que adelante la contratación derivada en caso que no sea directamente el IDIGER O IDIGER - FONDIGER)*

***NO APLICA CONTRATACIÓN DERIVADA***

El supervisor certifica la existencia de contratación derivada del Contrato (Convenio) No. _____ de ____, consistente en _____ (cantidad) contratos, suscritos por _____ (contratante), con el fin de _____ (objeto). De igual manera allega relación de dicha contratación, en _____ folios, en la cual se identifica el número de contrato, la fecha de suscripción, el contratista, el objeto, la duración, el valor, observaciones generales y la certificación expresa del Contratante de que dicha contratación derivada se encuentra finalizada y/o liquidada, y de que todos sus contratistas se encuentran a paz y salvo por todo concepto.

### 4. Certificaciones para pagos suscritas por el supervisor

| Periodo certificado | Fecha de certificación | Valor pagado | Observaciones |
|---|---|---|---|
| 1. 20 de feb al 19 de marzo 2023 | 4 de agosto 2023 | 24.254.999 | Corresponde al mensual 1 - 2023ER17545_Pago 1 |
| 2. 20 de marzo al 19 de abril 2023 | 4 de agosto 2023 | 24.254.999 | Corresponde al mensual 2 - 2023ER17544_Pago 2 |
| 3. 20 de abril al 19 de mayo 2023 | 20 de septiembre 2023 | 24.254.999 | Corresponde al mensual 3 - 2023ER21358_ Pago 3 |
| 4. 20 de mayo al 19 de junio 2023 | 20 de septiembre 2023 | 24.254.999 | Corresponde al mensual 4 - 2023ER21357_Pago 4 |
| 5. 20 de junio al 19 de julio 2023 | 20 de octubre 2023 | 24.254.999 | Corresponde al mensual 5 - 2023ER24133_ Pago 5 |
| 6. 20 de julio al 19 de agosto 2023 | 20 de octubre 2023 | 24.254.999 | Corresponde al mensual 6 - 2023ER24132_ Pago 6 |

**Nota:** Si este documento se encuentra impreso se considera Copia no Controlada. La versión vigente está publicada en el sitio web del Instituto Distrital de la Gestión del Riesgo y Cambio Climático.

| Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático | **INFORME PERIÓDICO DEL SUPERVISOR**<br>(Para Contratos diferentes la prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión) | **Código:** GC-FT-65<br>**Versión:** 3<br>**Página:** 1 de 1<br>**Vigente Desde:** 23/11/2021 |
|---|---|---|

**1. Datos generales**

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Número del Contrato o Convenio** | FONDIGER-013-2023 | | | | | | | **Fecha suscripción contrato o convenio::** | 3-feb-23 |
| **Tipo de contrato** | INTERVENTORÍA | | | | | | | **Nombre o Razón Social del Contratista:** | JAM INGENIERIA Y MEDIO AMBIENTE SAS |
| **Plazo de Ejecución (meses)** | 14 | | | | | | | **Número de Cédula o NIT:** | 830.084.684.9 |
| **Periodo del Informe:** | 20 | 7 | 2024 | al | 19 | 8 | 2024 | **Nombre del Representante Legal:**<br>**(Quien en tenga la facultad en el periodo)** | Javier Antonio Millán López<br>CC .79.345.746 |
| **Interventor (si Aplica)** | NO APLICA | | | | | | | **Número de Cédula o NIT:**<br>**Nombre del Representante Legal:**<br>**(Quien en tenga la facultad en el periodo)** | NO APLICA |
| **Cargo del Supervisor (1) del IDIGER**<br>**(según cláusula de supervisión del contrato/convenio)** | Subdirector de Análisis de Riesgos y Efectos del Cambio Climático | | | | | | | **Nombre Supervisores de otras entidades (cooperantes) - (Si aplica)** | NO APLICA |
| **Cargo del Supervisor (2) del IDIGER**<br>**(según cláusula del supervisor del contrato/convenio) Si Aplica** | NO APLICA | | | | | | | **Cargos supervisores de otras entidades (Si Aplica)** | NO APLICA |
| **Cargo Apoyo a la Supervisión del IDIGER** | NINGUNO | | | | | | | | |

**Objeto Contractual:**

REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA EVALUACIÓN Y ZONIFICACIÓN DETALLADA DE AMENAZA, VULNERABILIDAD Y RIESGO POR INUNDACIÓN PARA EL RÍO TUNJUELO EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C; ASÍ COMO ESTABLECER LAS MEDIDAS DE REDUCCIÓN A ESTE FENÓMENO AMENAZANTE.

| | | | |
|---|---|---|---|
| 7. 20 de agosto al 19 de septiembre | 13 de diciembre 2023 | 24.254.998 | Corresponde al mensual 7 - 2023ER28146 _ Pago 7 |
| 8. 20 de septiembre al 19 del octubre | 13 de diciembre 2023 | 24.254.999 | Corresponde al mensual 8 - 2023ER28148 _ Pago 8 |
| 9. 20 de octubre al 19 de noviembre | 13 de diciembre 2023 | 24.254.999 | Corresponde al mensual 9 - 2023ER28149 _ Pago 9 |
| 10. 20 de Noviembre al 19 de Diciembre | 20 de febero 2024 | 24.254.999 | Corresponde al mensual 10 - 2024ER3749 _ Pago 10 |
| 11. 20 de Diciembre 2023 al 19 de Enero 2024 | 04 de Marzo 2024 | 24.254.999 | Corresponde al mensual 11 - 2024ER4612 _ Pago 11 |
| 12. 20 de Enero 2024 al 19 de Febrero 2024 | 11 de abril 2024 | 24.254.999 | Corresponde al mensual 12 - 2024ER7249 _ Pago 12 |
| 13. 20 de Febrero 2024 al 19 de Marzo 2024 | 11 de abril 2024 | 24.254.999 | Corresponde al mensual 13- 2024ER7248 _ Pago 13 |
| 14. 20 de Marzo 2024 al 19 de Abril 2024 | 20 de mayo 2024 | 24.254.999 | Corresponde al mensual 14- 2024ER9698 _ Pago 14 |
| 15. 20 de abril 2024 al 19 de mayo 2024 | 19 de junio 2024 | 24.254.999 | Corresponde al mensual 15- 2024ER11798 _ Pago 15 |
| 16. 20 de mayo 2024 al 19 de junio 2024 | 1 de agosto 2024 | 24.254.999 | Corresponde al mensual 16- 2024ER15211 _ Pago 16 |
| | | | |

| | | |
|---|---|---|
| Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático | **INFORME PERIÓDICO DEL SUPERVISOR**<br>(Para Contratos diferentes la prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión) | **Código:** GC-FT-65<br>**Versión:** 3<br>**Página:** 1 de 1<br>**Vigente Desde:** 23/11/2021 |

## 1. Datos generales

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Número del Contrato o Convenio** | FONDIGER-013-2023 | | | | | | | **Fecha suscripción contrato o convenio::** | 3-feb-23 |
| **Tipo de contrato** | INTERVENTORÍA | | | | | | | **Nombre o Razón Social del Contratista:** | JAM INGENIERIA Y MEDIO AMBIENTE SAS |
| **Plazo de Ejecución (meses)** | 14 | | | | | | | **Número de Cédula o NIT:** | 830.084.684.9 |
| **Periodo del Informe:** | 20 | 7 | 2024 | al | 19 | 8 | 2024 | **Nombre del Representante Legal:**<br>**(Quien en tenga la facultad en el periodo)** | Javier Antonio Millán López<br>CC .79.345.746 |
| **Interventor (si Aplica)** | NO APLICA | | | | | | | **Número de Cédula o NIT:**<br>**Nombre del Representante Legal:**<br>**(Quien en tenga la facultad en el periodo)** | NO APLICA |
| **Cargo del Supervisor (1) del IDIGER**<br>**(según cláusula de supervisión del contrato/convenio)** | Subdirector de Análisis de Riesgos y Efectos del Cambio Climático | | | | | | | **Nombre Supervisores de otras entidades (cooperantes) - (Si aplica)** | NO APLICA |
| **Cargo del Supervisor (2) del IDIGER**<br>**(según cláusula del supervisor del contrato/convenio) Si Aplica** | NO APLICA | | | | | | | **Cargos supervisores de otras entidades (Si Aplica)** | NO APLICA |
| **Cargo Apoyo a la Supervisión del IDIGER** | NINGUNO | | | | | | | | |

**Objeto Contractual:**

REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA EVALUACIÓN Y ZONIFICACIÓN DETALLADA DE AMENAZA, VULNERABILIDAD Y RIESGO POR INUNDACIÓN PARA EL RÍO TUNJUELO EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C; ASÍ COMO ESTABLECER LAS MEDIDAS DE REDUCCIÓN A ESTE FENÓMENO AMENAZANTE.

## 5. Pagos Efectuados

| Número de pago/desembolso | Valor de desembolso (SEGÚN FORMA PACTADA) | Fecha y número de la orden de pago correspondiente | Observaciones<br>(si el valor pagado fue diferente al pactado en la minuta, describir breve justificación, descuentos y concepto de los |
|---|---|---|---|
| Mensual 1 | 24.254.999 | OP 23296 (11-08-2023) | Corresponde al mensual 1 - 2023ER17545_Pago 1 |
| Mensual 2 | 24.254.999 | OP 23298 (11-08-2023) | Corresponde al mensual 2 - 2023ER17544_Pago 2 |
| Mensual 3 | 24.254.999 | OP 23672 (22-09-2023) | Corresponde al mensual 3 - 2023ER21358_ Pago 3 |
| Mensual 4 | 24.254.999 | OP 23671 (22-09-2023) | Corresponde al mensual 4 - 2023ER21357_Pago 4 |
| Mensual 5 | 24.254.999 | OP-23971 (27-10-2023) | Corresponde al mensual 5 - 2023ER24133_ Pago 5 |
| Mensual 6 | 24.254.999 | OP-23968 (25-10-2023) | Corresponde al mensual 6 - 2023ER24132_ Pago 6 |
| Mensual 7 | 24.254.998 | OP-24558 (18-12-2023) | Corresponde al mensual 7 - 2023ER28146 _ Pago 7 |
| Mensual 8 | 24.254.999 | OP-24560 (18-12-2023) | Corresponde al mensual 8 - 2023ER28148 _ Pago 8 |
| Mensual 9 | 24.254.999 | OP-24561 (18-12-2023) | Corresponde al mensual 9 - 2023ER28149 _ Pago 9 |
| Mensual 10 | 24.254.999 | OP-25131 (26-02-2024) | Corresponde al mensual 10 - 2024ER3749 _ Pago 10 |
| Mensual 11 | 24.254.999 | OP-25205 (08-03-2024) | Corresponde al mensual 11 - 2024ER4612 _ Pago 11 |
| Mensual 12 | 24.254.999 | OP-25493 (15-04-2024) | Corresponde al mensual 12 - 2024ER7249 _ Pago 12 |
| Mensual 13 | 24.254.999 | OP-25494 (15-04-2024) | Corresponde al mensual 13- 2024ER7248 _ Pago 13 |
| Mensual 14 | 24.254.999 | OP 25676 (22-05-2024) | Corresponde al mensual 14- 2024ER9698 _ Pago 14 |
| Mensual 15 | 24.254.999 | OP 25840 (21-06-2024) | Corresponde al mensual 15- 2024ER11798 _ Pago 15 |
| Mensual 16 | 24.254.999 | OP 26157 (14-08-2024) | Corresponde al mensual 16- 2024ER15211 _ Pago 16 |
| TOTALES | 388.079.983 | | |
| | | | |

## 6. Descuentos/Liberaciones/Reducciones al valor (si aplica)

| Fecha Descuento/Liberación/Reducción | Valor Descuento/Liberación/Reducción | Concepto Descuento/Liberación/Reducción |
|---|---|---|
| | | |
| | | |

| Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático | **INFORME PERIÓDICO DEL SUPERVISOR**<br>(Para Contratos diferentes la prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión) | **Código:** GC-FT-65<br>**Versión:** 3<br>**Página:** 1 de 1<br>**Vigente Desde:** 23/11/2021 |
|---|---|---|

## 1. Datos generales

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Número del Contrato o Convenio** | FONDIGER-013-2023 | | | | | | | **Fecha suscripción contrato o convenio::** | 3-feb-23 |
| **Tipo de contrato** | INTERVENTORÍA | | | | | | | **Nombre o Razón Social del Contratista:** | JAM INGENIERIA Y MEDIO AMBIENTE SAS |
| **Plazo de Ejecución (meses)** | 14 | | | | | | | **Número de Cédula o NIT:** | 830.084.684.9 |
| **Periodo del Informe:** | 20 | 7 | 2024 | al | 19 | 8 | 2024 | **Nombre del Representante Legal:**<br>**(Quien en tenga la facultad en el periodo)** | Javier Antonio Millán López<br>CC .79.345.746 |
| **Interventor (si Aplica)** | NO APLICA | | | | | | | **Número de Cédula o NIT:**<br>**Nombre del Representante Legal:**<br>**(Quien en tenga la facultad en el periodo)** | NO APLICA |
| **Cargo del Supervisor (1) del IDIGER**<br>**(según cláusula de supervisión del contrato/convenio)** | Subdirector de Análisis de Riesgos y Efectos del Cambio Climático | | | | | | | **Nombre Supervisores de otras entidades (cooperantes) - (Si aplica)** | NO APLICA |
| **Cargo del Supervisor (2) del IDIGER**<br>**(según cláusula del supervisor del contrato/convenio) Si Aplica** | NO APLICA | | | | | | | **Cargos supervisores de otras entidades (Si Aplica)** | NO APLICA |
| **Cargo Apoyo a la Supervisión del IDIGER** | NINGUNO | | | | | | | | |

**Objeto Contractual:**

REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA EVALUACIÓN Y ZONIFICACIÓN DETALLADA DE AMENAZA, VULNERABILIDAD Y RIESGO POR INUNDACIÓN PARA EL RIO TUNJUELO EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C; ASÍ COMO ESTABLECER LAS MEDIDAS DE REDUCCIÓN A ESTE FENÓMENO AMENAZANTE.

| **TOTAL** | | |
|---|---|---|

## 7. Reintegros efectuados (si aplica)

| Fecha reintegro | Valor reintegro | Comprobante reintegro | Concepto reintegro |
|---|---|---|---|
| | | | |
| | | | |

## 8. Garantías

| Amparos | Compañía aseguradora | No. de póliza | Vigencia | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Desde (Día/ mes/ año) | hasta (Día/ mes/ año) | Fecha aprobación (Día/ mes/ año | Valor del amparo |
| **Cumplimiento del contrato** | SEGUROS MUNDIAL | 21-44-101406042 | 20/02/2023 | 20/04/2025 | 9/03/2023 | 138.599.999 |
| **Pago de salarios** | | | 20/02/2023 | 20/04/2027 | 9/03/2023 | 34.650.000 |
| **Calidad del servicio** | | | 20/02/2023 | 20/042027 | 9/03/2023 | 138.599.999 |
| **Responsabilidad civil extra contractual** | SEGUROS MUNDIAL | 21-40-101205844 | 20/02/2023 | 20/04/2024 | 9/03/2023 | 232.000.000 |

**MODIFICACIÓN 1**

| Amparos | Compañía aseguradora | No. de póliza | Vigencia | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Desde (Día/ mes/ año) | hasta (Día/ mes/ año) | Fecha aprobación (Día/ mes/ año | Valor del amparo |
| **Cumplimiento del contrato** | SEGUROS MUNDIAL | 21-44-101406042 | 20/02/2023 | 3/09/2025 | Pendinte OJ | 160.429.498 |
| **Pago de salarios** | | | 20/02/2023 | 3/09/2027 | Pendinte OJ | 40.107.375 |
| **Calidad del servicio** | | | 20/02/2023 | 3/09/2027 | Pendinte OJ | 160.429.498 |
| **Responsabilidad civil extra contractual** | SEGUROS MUNDIAL | 21-40-101205844 | 20/02/2023 | 3/09/2024 | Pendinte OJ | 232.000.000 |

**Nota:** Si este documento se encuentra impreso se considera Copia no Controlada. La versión vigente está publicada en el sitio web del Instituto Distrital de la Gestión del Riesgo y Cambio Climático.

| | | |
|---|---|---|
| Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático | **INFORME PERIÓDICO DEL SUPERVISOR**<br>(Para Contratos diferentes la prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión) | **Código:** GC-FT-65<br>**Versión:** 3<br>**Página:** 1 de 1<br>**Vigente Desde:** 23/11/2021 |

## 1. Datos generales

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Número del Contrato o Convenio** | FONDIGER-013-2023 | | | | | | | **Fecha suscripción contrato o convenio::** | 3-feb-23 |
| **Tipo de contrato** | INTERVENTORÍA | | | | | | | **Nombre o Razón Social del Contratista:** | JAM INGENIERIA Y MEDIO AMBIENTE SAS |
| **Plazo de Ejecución (meses)** | 14 | | | | | | | **Número de Cédula o NIT:** | 830.084.684.9 |
| **Periodo del Informe:** | 20 | 7 | 2024 | al | 19 | 8 | 2024 | **Nombre del Representante Legal:**<br>**(Quien en tenga la facultad en el periodo)** | Javier Antonio Millán López<br>CC .79.345.746 |
| **Interventor (si Aplica)** | NO APLICA | | | | | | | **Número de Cédula o NIT:**<br>**Nombre del Representante Legal:**<br>**(Quien en tenga la facultad en el periodo)** | NO APLICA |
| **Cargo del Supervisor (1) del IDIGER**<br>**(según cláusula de supervisión del contrato/convenio)** | Subdirector de Análisis de Riesgos y Efectos del Cambio Climático | | | | | | | **Nombre Supervisores de otras entidades (cooperantes) - (Si aplica)** | NO APLICA |
| **Cargo del Supervisor (2) del IDIGER**<br>**(según cláusula del supervisor del contrato/convenio) Si Aplica** | NO APLICA | | | | | | | **Cargos supervisores de otras entidades (Si Aplica)** | NO APLICA |
| **Cargo Apoyo a la Supervisión del IDIGER** | NINGUNO | | | | | | | | |
| **Objeto Contractual:** | | | | | | | | | |
| REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA EVALUACIÓN Y ZONIFICACIÓN DETALLADA DE AMENAZA, VULNERABILIDAD Y RIESGO POR INUNDACIÓN PARA EL RÍO TUNJUELO EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C; ASÍ COMO ESTABLECER LAS MEDIDAS DE REDUCCIÓN A ESTE FENÓMENO AMENAZANTE. | | | | | | | | | |

**MODIFICACIÓN 2**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Cumplimiento del contrato** | **SEGUROS MUNDIAL** | **21-44-101406042** | **20/02/2023** | **28/12/2025** | **Pendinte OJ** | **160.429.498** |
| **Pago de salarios** | | | **20/02/2023** | **28/12/2027** | **Pendinte OJ** | **40.107.375** |
| **Calidad del servicio** | | | **20/02/2023** | **28/12/2027** | **Pendinte OJ** | **160.429.498** |
| **Responsabilidad civil extra contractual** | **SEGUROS MUNDIAL** | **21-40-101205844** | **20/02/2023** | **28/12/2024** | **Pendinte OJ** | **160.429.498** |

*Si se presentan más prórrogas, incluir más filas para éstas.*

## 9. Seguimiento a matriz de riesgos

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Luego del seguimiento detectó alguno con alta probabilidad de ocurrencia? | Si | | No | X |

Registre cual(es) riesgo(s) detectó con alta probabilidad de ocurrencia:

Observaciones adicionales:

*Si hay algún riesgo que se materializó o que tiene alta probabilidad de ocurrencia debe informarse a la Oficina Asesora Jurídica.*

| | | |
|---|---|---|
| Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático | **INFORME PERIÓDICO DEL SUPERVISOR**<br>(Para Contratos diferentes la prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión) | **Código:** GC-FT-65<br>**Versión:** 3<br>**Página:** 1 de 1<br>**Vigente Desde:** 23/11/2021 |

**1. Datos generales**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Número del Contrato o Convenio** | FONDIGER-013-2023 | | | | | | | **Fecha suscripción contrato o convenio::** | 3-feb-23 |
| **Tipo de contrato** | INTERVENTORÍA | | | | | | | **Nombre o Razón Social del Contratista:** | JAM INGENIERIA Y MEDIO AMBIENTE SAS |
| **Plazo de Ejecución (meses)** | 14 | | | | | | | **Número de Cédula o NIT:** | 830.084.684.9 |
| **Periodo del Informe:** | 20 | 7 | 2024 | al | 19 | 8 | 2024 | **Nombre del Representante Legal:**<br>**(Quien en tenga la facultad en el periodo)** | Javier Antonio Millán López<br>CC .79.345.746 |
| **Interventor (si Aplica)** | NO APLICA | | | | | | | **Número de Cédula o NIT:**<br>**Nombre del Representante Legal:**<br>**(Quien en tenga la facultad en el periodo)** | NO APLICA |
| **Cargo del Supervisor (1) del IDIGER**<br>**(según cláusula de supervisión del contrato/convenio)** | Subdirector de Análisis de Riesgos y Efectos del Cambio Climático | | | | | | | **Nombre Supervisores de otras entidades (cooperantes) - (Si aplica)** | NO APLICA |
| **Cargo del Supervisor (2) del IDIGER**<br>**(según cláusula del supervisor del contrato/convenio) Si Aplica** | NO APLICA | | | | | | | **Cargos supervisores de otras entidades (Si Aplica)** | NO APLICA |
| **Cargo Apoyo a la Supervisión del IDIGER** | NINGUNO | | | | | | | | |

**Objeto Contractual:**

REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA EVALUACIÓN Y ZONIFICACIÓN DETALLADA DE AMENAZA, VULNERABILIDAD Y RIESGO POR INUNDACIÓN PARA EL RÍO TUNJUELO EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C; ASÍ COMO ESTABLECER LAS MEDIDAS DE REDUCCIÓN A ESTE FENÓMENO AMENAZANTE.

**10 REFERENTE AL SEGUIMIENTO TÉCNICO: Información de seguimiento técnico del contrato, así como análisis respecto del cronograma o avance inicialmente pactado (evidencia de posibles retrasos, vicisitudes, dificultades), (estado % de terminados, en ejecución, pendientes por ejecutar, pagos pendientes y/o en curso etc.).**

**Resumen del desarrollo del contrato**

Durante el transcurso del periodo comprendido entre el 20 de Enero de 2024 al 19 de febrero de 2024, los contratos de consultoría FONDIGER 010 DE 2023 e interventoría FONDIGER 013 de 2023 se encuentran en el décimo cuarto mes de desarrollo del proyecto, que corresponde al 100% del tiempo de ejecución del contrato de conformidad con los tiempos contractuales establecidos en el contrato, sin embargo, posterior a la aprobación de la prórroga el tiempo contractual se encuentra en un 100%, con fecha de terminación el 19 de agosto de 2024 (Consultoría) y 3 de septiembre (Interventoría). No obstante, de conformidad con las solicitudes de prórroga con radicados IDIGER 2024ER14985, 2024ER15073 y 2024ER15242, se adicionan 3,5 meses para el desarrollo de los contratos, el alcance de los objetivos y el cumplimiento de los requisitos establecidos en el anexo técnico.

Dentro de los alcances y el cronograma vigente del proyecto aprobado en referencia a la segunda prorroga que fue aprobada el 16 de agosto de 2024, y entra en vigencia el nuevo cronograma y por medio de la estructura de valor ganado. Los avances durante el mes del presente informe para consultoría se relacionan a continuación: Avance programado consultoría : 57,61% Avance Real Consultoría 56.12%.
La interventoría informa "Dada la aprobación de la segunda prórroga, el cronograma del proyecto se ajusta y entra en rigor una nueva etapa para el desarrollo del contrato. Una vez realizado el cambio del cronograma, se identifica el ajuste entre la programación y las actividades ejecutadas. En la gráfica anterior se evidencia el efecto que tiene el cronograma del plan de contingencia, el cronograma de la primer prórroga y el cronograma de la segunda prorroga, ajustando en cierta medida los avances reales y programados. Es importante mencionar que, la gráfica presenta el corte de actualización del informe de interventoría al día viernes 16 de agosto de 2024...Durante el periodo del informe se han entregado documentos, además con el desarrollo de mesas de trabajo se evidencian avances en la ejecución de los componentes, sin embargo, se ha incurrido en retrasos en la entrega de las modelaciones hidráulicas para los tres escenarios de modelación objeto de estudio, lo que epercute en el desarrollo de los componentes de AVR y Medidas de Intervención, por otra parte, se ha incurrido en retrasos en el componente de jarillones."sos en la entrega de las modelaciones hidráulicas para los tres escenarios de modelación objeto de estudio, lo que repercute en el desarrollo de los componentes de AVR y Medidas de Intervención, por otra parte, se ha incurrido en retrasos en el componente de jarillones."

**Resumen administrativo:** Se realizaron todas las gestiones de seguimiento que han permitido el desarrollo del contrato.
**Resumen jurídico**: Se cumplieron los requisitos precontractuales y de inicio.
**Resumen financiero:**

Se anexa el informe de supervisión correspondiente

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Técnicos** | 56,1% | **Técnico** | 56,1% |
| **Financieros consultoría** | 25% | **Financieros Interventoría** | 48,4% |

**11. Verificación Pago al Sistema de Seguridad Social Integral y Parafiscales.**

La supervisión verifico el cumplimiento del contratista de sus obligaciones con el Sistema de Seguridad Social Integral y parafiscales conforme a los documentos (planillas, pagos, certificaciones) allegados por el contratista para el pao del producto 1, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 50 de la ley 789 de 2002: "(....) verificar y dejar constancia del cumplimiento de las obligaciones del contratista frente a los aportes mencionados durante toda su vigencia, estableciendo una correcta relación entre el monto cancelado y las sumas que debieron haber sido cotizadas. (...) Cuando la contratación se realice con personas jurídicas, se deberá acreditar el pago de los aportes de sus empleados, a los sistemas mencionados mediante certificación expedida por el revisor fiscal(...)"

| **Fecha emisión de Informe** | 20 | 9 | 2024 |
|---|---|---|---|

**Nota:** Si este documento se encuentra impreso se considera Copia no Controlada. La versión vigente está publicada en el sitio web del Instituto Distrital de la Gestión del Riesgo y Cambio Climático.

| | | |
|---|---|---|
| Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático | **INFORME PERIÓDICO DEL SUPERVISOR**<br>(Para Contratos diferentes la prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión) | **Código:** GC-FT-65<br>**Versión:** 3<br>**Página:** 1 de 1<br>**Vigente Desde:** 23/11/2021 |

**1. Datos generales**

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Número del Contrato o Convenio** | FONDIGER-013-2023 | | | | | | | **Fecha suscripción contrato o convenio::** | 3-feb-23 |
| **Tipo de contrato** | INTERVENTORÍA | | | | | | | **Nombre o Razón Social del Contratista:** | JAM INGENIERIA Y MEDIO AMBIENTE SAS |
| **Plazo de Ejecución (meses)** | 14 | | | | | | | **Número de Cédula o NIT:** | 830.084.684.9 |
| **Periodo del Informe:** | 20 | 7 | 2024 | al | 19 | 8 | 2024 | **Nombre del Representante Legal:**<br>**(Quien en tenga la facultad en el periodo)** | Javier Antonio Millán López<br>CC .79.345.746 |
| **Interventor (si Aplica)** | NO APLICA | | | | | | | **Número de Cédula o NIT:**<br>**Nombre del Representante Legal:**<br>**(Quien en tenga la facultad en el periodo)** | NO APLICA |
| **Cargo del Supervisor (1) del IDIGER**<br>**(según cláusula de supervisión del contrato/convenio)** | Subdirector de Análisis de Riesgos y Efectos del Cambio Climático | | | | | | | **Nombre Supervisores de otras entidades (cooperantes) - (Si aplica)** | NO APLICA |
| **Cargo del Supervisor (2) del IDIGER**<br>**(según cláusula del supervisor del contrato/convenio) Si Aplica** | NO APLICA | | | | | | | **Cargos supervisores de otras entidades (Si Aplica)** | NO APLICA |
| **Cargo Apoyo a la Supervisión del IDIGER** | NINGUNO | | | | | | | | |
| **Objeto Contractual:** | | | | | | | | | |
| REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA EVALUACIÓN Y ZONIFICACIÓN DETALLADA DE AMENAZA, VULNERABILIDAD Y RIESGO POR INUNDACIÓN PARA EL RÍO TUNJUELO EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C; ASÍ COMO ESTABLECER LAS MEDIDAS DE REDUCCIÓN A ESTE FENÓMENO AMENAZANTE. | | | | | | | | | |

Firma

**Darwin Javier Ortiz González**
**Subdirector de Análisis de Riesgos y Efectos del Cambio Climático**

**Carolina Castañeda Jiménez**
**Profesional Especializado 222-23**

**Nota:** Si este documento se encuentra impreso se considera Copia no Controlada. La versión vigente está publicada en el sitio web del Instituto Distrital de la Gestión del Riesgo y Cambio Climático.

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

**IDIGER**

# SEGUIMIENTO A CONTRATOS Y CONVENIOS

## Informe de Supervisión Contrato de interventoría FONDIGER 13-2023

| | |
|---|---|
| **Fecha de elaboración del informe** | 20 de septiembre de 2024 |
| **Periodo de seguimiento** | 20 de julio de 2024 al 19 de agosto de 2024 |
| **Fecha de inicio** | 20 de febrero de 2023 |
| **Fecha de terminación** | 03 de septiembre de 2024 |
| **Valor del Contrato** | $ 802.147.492 Incluido IVA |
| **Objeto** | REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA EVALUACIÓN Y ZONIFICACIÓN DETALLADA DE AMENAZA, VULNERABILIDAD Y RIESGO POR INUNDACIÓN PARA EL RÍO TUNJUELO EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C; ASÍ COMO ESTABLECER LAS MEDIDAS DE REDUCCIÓN A ESTE FENÓMENO AMENAZANTE |
| **Nombre de contratista** | JAM INGENIERIA Y MEDIO AMBIENTE SAS |
| **Nombre del Supervisor** | DARWIN JAVIER ORTIZ GONZALEZ |
| **PLAZO DE EJECUCIÓN** | 18.5 meses |

**Avance**

*(INCLUIR EL PORCENTAJE DE AVANCE TÉNCICO Y FINANCIERO)*


Durante el transcurso del periodo comprendido entre el 20 de Enero de 2024 al 19 de febrero de 2024, los contratos de consultoría FONDIGER 010 DE 2023 e interventoría FONDIGER 013 de 2023 se encuentran en el décimo cuarto mes de desarrollo del proyecto, que corresponde al 100% del tiempo de ejecución del contrato de conformidad con los tiempos contractuales establecidos en el contrato, sin embargo, posterior a la aprobación de la prórroga el tiempo contractual se encuentra en un 100%, con fecha de terminación el 19 de agosto de 2024 (Consultoría) y 3 de septiembre (Interventoría). No obstante, de conformidad con las solicitudes de prórroga con radicados IDIGER 2024ER14985, 2024ER15073 y 2024ER15242, se adicionan 3,5 meses para el desarrollo de los contratos, el alcance de los objetivos y el cumplimiento de los requisitos establecidos en el anexo técnico. En el periodo se desarrollaron mesas de trabajo, reuniones de seguimiento, y se emitieron y recibieron conceptos mediante oficios como soportes de las actividades del contrato de consultoría e interventoría.

Dentro de los alcances y el cronograma vigente del proyecto aprobado en referencia a la segunda prorroga que fue aprobada el 16 de agosto de 2024, y entra en vigencia el nuevo cronograma y por medio de la estructura de valor ganado. Los avances durante el mes del presente informe para consultoría se relacionan a continuación: Avance programado consultoría : 57,61% Avance Real Consultoría 56.12%.

La interventoría informa "*Dada la aprobación de la segunda prórroga, el cronograma del proyecto se ajusta y entra en rigor una nueva etapa para el desarrollo del contrato. Una vez realizado el cambio del cronograma, se identifica el ajuste entre la programación y las actividades ejecutadas (ver gráfica adjunta).*

*En la gráfica anterior se evidencia el efecto que tiene el cronograma del plan de contingencia, el cronograma de la primer prórroga y el cronograma de la segunda prorroga, ajustando en cierta medida los avances reales y programados. Es importante mencionar que, la gráfica presenta el corte de actualización del informe de interventoría al día viernes 16 de agosto de 2024 ... Durante el periodo del informe se han entregado documentos, además con el desarrollo de mesas de trabajo se evidencian avances en la ejecución de los componentes, sin embargo, se ha incurrido en retrasos en la entrega de las modelaciones hidráulicas para los tres escenarios de modelación objeto de estudio, lo que epercute en el desarrollo de los componentes de AVR y Medidas de Intervención, por otra parte, se ha incurrido en retrasos en el componente de jarillones."*

*Ilustración 5-1.Avance real vs programado.*

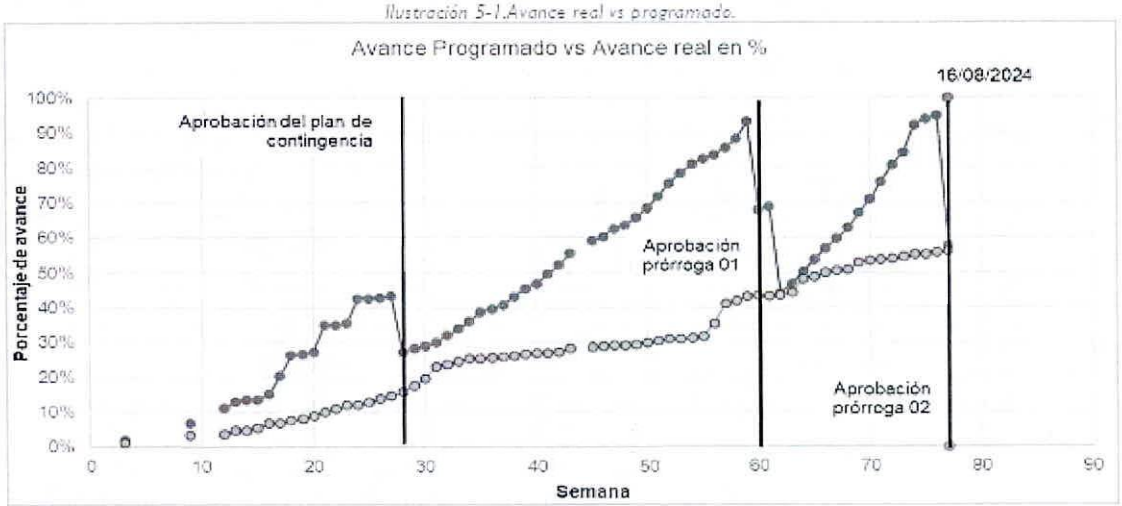


*Fuente: JAM Ingeniería y Medio Ambiente SAS*

Por otra parte, el contrato FONDIGER 010-2024 presenta un proceso de presunto incumplimiento solicitud enviada por interventoría radicado 2023ER28619 del 19 de diciembre de 2023, cuya solicitud de incumplimiento se remite desde la supervisión al Oficina Jurídica (2023IE6248) el 22 de diciembre de 2023, y por lo cual se han surtido los siguientes procesos hasta la fecha de corte del presente informe:

| Tema | Fecha |
|---|---|
| Actualización estado de avance del contrato de consultoría FONDIGER 010-2023 por solicitud de Supervisión con fecha de corte a 19 de julio de 2024. Jurídica solicitud nuevamente actualización del informe (2024ER13925) | 22 de julio de 2024 |
| Nuevamente se solicita actualización del informe por la oficina Jurídica interventoría remite - Alcance al oficio con asunto "Actualización estado de avance del contrato de consultoría FONDIGER 010-2023 por solicitud de Supervisión con fecha de corte a 19 de julio de 2024". CO-0955-JAM-IDIGER_372 | 30 de julio de 2024 |
| SOLICITUD APLAZAMIETO AUDIENCIA | 8 de agosto 2024 |
| Se realiza el aplazamiento de la audiencia por solicitud de consultoría | 9 de agosto de 2024 |
| Solicitud de prorroga con aval jurídico | 13 de agosto 2024 |
| Audiencia - Se lee resolución de multa | 13 de agosto 2024 |
| Prorroga del contrato | 16 de agosto de 2024 |
| Audiencia | 23 de agosto de 2024 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Técnicos** | 56,1% | **Técnico** | 56,1% |
| **Financieros consultoría** | 25% | **Financieros Interventoría** | 48,4% |

**SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO:**

*(RELACIONAR CORREOS, RESPUESTAS OFICIALES, REUNIONES Y TRÁMITES REALIZADOS EN EL PERÍODO DE SEGUIMIENTO )*

| Fecha | Actividad | Soporte |
|---|---|---|
| 22/07/2024 | Actualización estado de avance del contrato de consultoría FONDIGER 010-2023 por solicitud de Supervisión con fecha de corte a 19 de julio de 2024. | Correo<br>Radicado a jurídica |
| 22/07/2024 | Respuesta correo electrónico con asunto "Avance zonificación y modelación geotécnica" | Correo |
| 23/07/2024 | Reunión (presencial) de Seguimiento Tunjuelo - Veedores Bosa San Jose | Acta |
| 23/07/2024 | Respuesta al oficio GE-24-0032/498-0554 – Solicitud de prórroga al contrato de consultoría FONDIGER 010-2023 a partir del 19/08/2024 por un término de 3.5 meses. | Correo |
| 26/07/2024 | Remisión del informe semanal del 15 de julio al 21 de julio de 2024 | 2024ER14328 |
| 30/07/2024 | Reunión de seguimiento - Río Tunjuelo (Virtual) | Acta |

| | | |
|---|---|---|
| 30/07/2024 | Alcance al oficio con asunto "Actualización estado de avance del contrato de consultoría FONDIGER 010-2023 por solicitud de Supervisión con fecha de corte a 19 de julio de 2024" | Correo<br>Radicado a jurídica |
| 30/07/2024 | Observaciones al informe mensual 12 de consultoría del contrato FONDIGER 010-2023 | Correo |
| 30/07/2024 | Observaciones al informe mensual 13 de consultoría del contrato FONDIGER 010-2023 | Correo |
| 31/07/2024 | Observaciones al informe mensual 14 de consultoría del contrato FONDIGER 010-2023 | Correo |
| 1/08/2024 | Reunión Río Tunjuelo - componente variabilidad Climatica | Acta |
| 1/08/2024 | Respuesta al oficio GE-24-0481/498-0589. Parametrización geotécnica | Correo |
| 2/08/2024 | Reunión de Seguimiento Tunjuelo | Acta |
| 2/08/2024 | Remisión del informe mensual 17 | 2024ER14763 |
| 2/08/2024 | Respuesta al oficio GE-24-0491/498-0591.Solicitud de prorroga al contrato de consultoría FONDIGER010-2023 por untérmino de 3.5 meses a partir del 19 de agosto de 2024 | Correo |
| 5/08/2024 | Respuesta al oficio GE-24-0491/498-0591 remitido el 02/08/2024. Solicitud de prórroga al contrato de consultoría FONDIGER010-2023 por un término de 3.5 meses a partir del 19/08/2024 | Correo |
| 5/08/2024 | Respuesta al oficio GE-24-0491/498-0591 remitido el 02/08/2024. Cronograma de la solicitud de prórroga al contrato de consultoría FONDIGER010-2023 por un término de 3.5 meses a partir del 19/08/2024 | Correo |
| 5/08/2024 | Respuesta al oficio GE-24-00506/498-0594. Solicitud de prórroga al contrato de consultoría FONDIGER 010-2023 por un término de tres meses y medio (3.5 meses). | Correo |
| 8/08/2024 | Solicitud de prórroga al contrato de Interventoría FONDIGER 013-2023 a partir del 3 de septiembre de 2024 | 2024ER14992 |
| 8/08/2024 | Respuesta al oficio GE-24-00508/498-0595. Solicitud de prórroga al contrato de consultoría FONDIGER 010-2023 por un término de tres meses y medio (3.5 meses) | 2024ER14985 |
| 8/08/2024 | Remisión del informe semanal del 22 de julio al 28 de julio de 2024 | 2024ER15097 |
| 8/08/2024 | Alcance al radicado 2024ER14992 - Solicitud de prórroga al contrato de Interventoría FONDIGER 013-2023 por un término de cuatro meses (3.5 meses), a partir del 3 de septiembre de 2024. | 2024ER15073 |
| 9/08/2024 | Reunión de seguimiento - Río Tunjuelo | Acta |

| | | |
|---|---|---|
| 9/08/2024 | Remisión del informe semanal del 29 de julio al 04 de agosto de 2024 | 2024ER15122 |
| 9/08/2024 | Observaciones a la modelación hidráulica | Correo |
| 12/08/2024 | Alcance al radicado IDIGER 2024ER15073 - Solicitud de prórroga al contrato de Interventoría FONDIGER 013-2023 por un término de cuatro meses (3.5 meses), a partir del 3 de septiembre de 2024. | Correo |
| 13/08/2024 | Respuesta Radicados IDIGER 2024ER14992 y 2024ER15073 – Solicitud de prórroga al contrato de Interventoría FONDIGER 013-2023 por un término de cuatro meses (3.5 meses), a partir del 3 de septiembre de 2024 | 2024EE13352<br>RO-148076 |
| 13/08/2024 | Reunión de seguimiento Río Tunjuelo - Presencial | Acta |
| 13/08/2024 | Respuesta al oficio GE-24-0522/498-0598 - Modelaciones Hidráulicas escenario de inundación por Desbordamiento. | Correo |
| 14/08/2024 | Respuesta al oficio GE-24-0513/498-0597 – Entregable 7 Componente de Jarillones. | Correo |
| 15/08/2024 | Revisión soportes SST y parafiscales de consultoría - Contrato FONDIGER 010-2023 | Correo |
| 16/08/2024 | Mesa Tecnica Hidráulica - Tunjuelo (Virtual) | Acta |
| | | |

**SEGUIMIENTO TECNICO:**

*(RELACIONAR INFORMES Y/O APORTES TÉCNICOS REALIZADOS N EL PERÍODO DE SEGUIMIENTO )*

| Producto | Fecha | Actividad | Soporte |
|---|---|---|---|
| Informes Mensual | 2/08/2024 | Informe Mensual 17 de interventoría en V1 | Comunicación 2024ER14763 |

**PROFESIONAL RESPONSABLE**

DARWIN JAVIER ORTIZ GONZALEZ - SUPERVISOR DEL CONTRATO
