Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático	**INFORME PERIÓDICO DEL SUPERVISOR** (Para Contratos diferentes la prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión)	**Código:** GC-FT-65 **Versión:** 3 **Página:** 1 de 1 **Vigente Desde:** 23/11/2021

1. Datos generales

Número del Contrato o Convenio	FONDIGER-013-2023							**Fecha suscripción contrato o convenio::**	3-feb-23
Tipo de contrato	INTERVENTORIA							**Nombre o Razón Social del Contratista:**	JAM INGENIERIA Y MEDIO AMBIENTE SAS
Plazo de Ejecución (meses)	14							**Número de Cédula o NIT:**	830.084.684.9
Periodo del Informe:	20	8	2024	al	19	9	2024	**Nombre del Representante Legal:** **(Quien en tenga la facultad en el periodo)**	Javier Antonio Millán López CC .79.345.746
Interventor (si Aplica)	NO APLICA							**Número de Cédula o NIT:** **Nombre del Representante Legal:** **(Quien en tenga la facultad en el periodo)**	NO APLICA
Cargo del Supervisor (1) del IDIGER (según cláusula de supervisión del contrato/convenio)	Subdirector de Análisis de Riesgos y Efectos del Cambio Climático							**Nombre Supervisores de otras entidades (cooperantes) - (Si aplica)**	NO APLICA
Cargo del Supervisor (2) del IDIGER (según cláusula del supervisor del contrato/convenio) Si Aplica	NO APLICA							**Cargos supervisores de otras entidades (Si Aplica)**	NO APLICA
Cargo Apoyo a la Supervisión del IDIGER	NINGUNO								

Objeto Contractual:

REALIZAR LA INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA EVALUACIÓN Y ZONIFICACIÓN DETALLADA DE AMENAZA, VULNERABILIDAD Y RIESGO POR INUNDACIÓN PARA EL RÍO TUNJUELO EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C; ASÍ COMO ESTABLECER LAS MEDIDAS DE REDUCCIÓN A ESTE FENÓMENO AMENAZANTE.

2. Información presupuestal y plazo de ejecución

Valor Inicial del contrato/convenio	$ 692.999.995	**Aporte IDIGER**	Valor CDP		Número CDP		Fecha CDP		Fuente de Recursos	
			Valor RP		Número RP		Fecha RP			
		Aporte FONDIGER	Valor CDP	$ 693.211.736	Número CDP	3092 -2023	Fecha CDP		Fuente de Recursos	FONDIGER
			Valor RP	$ 692.999.995	Número RP	9140 -2023	Fecha RP	13/02/2023		
		Valor Total	$ 692.999.995							
Plazo Inicial de Ejecución (meses)	14	**Aporte Cooperante/Parte Conviniente (Dinero/Especie) Según Aplique**			**Descripción**					
		Valor Total	$ 692.999.995							

2.1 Adiciones y Prórrogas

Valor Adición No. 1 del contrato/convenio		**Aporte IDIGER**	Valor CDP		Número CDP		Fecha CDP		Fuente de Recursos	
			Valor RP		Número RP		Fecha RP			
		Aporte FONDIGER	Valor CDP	$ 109.147.497	Número CDP	3808-2024	Fecha CDP		Fuente de Recursos	FONDIGER
Cantidad de meses de prórroga 1	4,5		Valor RP	$ 109.147.497	Número RP	10728-2024	Fecha RP	22/04/2024		
		Subtotal	$ 109.147.497							
		Valor Total (Inicial + Aporte	$ 802.147.492							
Cantidad Total de meses (Total plazo de ejecución)	18,5	**Cooperante/Parte Conviniente (Dinero/Especie) Según Aplique**			**Descripción**					
		Valor Total	$ 802.147.492							
Valor Adición No. 2 del contrato/convenio		**Aporte IDIGER**	Valor CDP		Número CDP		Fecha CDP		Fuente de Recursos	
			Valor RP		Número RP		Fecha RP			
		Aporte FONDIGER	Valor CDP		Número CDP		Fecha CDP		Fuente de Recursos	
Cantidad de meses de prórroga 2	3,5		Valor RP		Número RP		Fecha RP			
		Subtotal								
		Valor Total (Inicial + Adición 1)								
Cantidad Total de meses (Total plazo de ejecución)	22,0	**Aporte Cooperante/Parte Conviniente (Dinero/Especie) Según Aplique**			**Descripción**					
		Valor Total	$ 802.147.492							

Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático	**INFORME PERIÓDICO DEL SUPERVISOR** (Para Contratos diferentes la prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión)	**Código:** GC-FT-65 **Versión: 3** **Página:** 1 de 1 **Vigente Desde:** 23/11/2021

1. Datos generales

Número del Contrato o Convenio	FONDIGER-013-2023							**Fecha suscripción contrato o convenio::**	3-feb-23
Tipo de contrato	INTERVENTORÍA							**Nombre o Razón Social del Contratista:**	JAM INGENIERIA Y MEDIO AMBIENTE SAS
Plazo de Ejecución (meses)	14							**Número de Cédula o NIT:**	830.084.684.9
Periodo del Informe:	20	8	2024	al	19	9	2024	**Nombre del Representante Legal:** **(Quien en tenga la facultad en el periodo)**	Javier Antonio Millán López CC .79.345.746
Interventor (si Aplica)	NO APLICA							**Número de Cédula o NIT:** **Nombre del Representante Legal:** **(Quien en tenga la facultad en el periodo)**	NO APLICA
Cargo del Supervisor (1) del IDIGER **(según cláusula de supervisión del contrato/convenio)**	Subdirector de Análisis de Riesgos y Efectos del Cambio Climático							**Nombre Supervisores de otras entidades (cooperantes) - (Si aplica)**	NO APLICA
Cargo del Supervisor (2) del IDIGER **(según cláusula del supervisor del contrato/convenio) Si Aplica**	NO APLICA							**Cargos supervisores de otras entidades (Si Aplica)**	NO APLICA
Cargo Apoyo a la Supervisión del IDIGER	NINGUNO								

Objeto Contractual:

REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA EVALUACIÓN Y ZONIFICACIÓN DETALLADA DE AMENAZA, VULNERABILIDAD Y RIESGO POR INUNDACIÓN PARA EL RÍO TUNJUELO EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C; ASÍ COMO ESTABLECER LAS MEDIDAS DE REDUCCIÓN A ESTE FENÓMENO AMENAZANTE.

Si tiene mas de dos adiciones y prórrogas inserte las casillas necesarias

2.2 Disminuciones (Cuando Aplique)

Fecha Documento Disminución:		**Valor disminución :**	

Descripción del motivo de la disminución

NOVEDADES DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

2.3 VALOR TOTAL Y PLAZO TOTAL MAS MODIFICACIONES

Cantidad de Adiciones **(Sume la cantidad de adiciones realizadas)**	1	**Valor Total de Contrato/Convenio** **(Valor Inicial + Valor total de las Adiciones)**	$ 802.147.492	**Plazo Total de Ejecución** **(Cantidad de meses inicial + Cantidad de mese prórrogas)**	22

2.4. Anticipo (Si Aplica)

Valor Anticipo (Si Aplica)	NO APLICA	**Porcentaje de Amortización** **(Si Aplica)**	NO APLICA	**Fecha Pago del Anticipo**	dd	mm	aaa

3. Información relacionada con la contratación derivada

(Este aparte sólo debe diligenciarse en el evento de existir contratación derivada. Se debe allegar la relación de la misma y el estado que reporte la entidad que adelante la contratación derivada en caso que no sea directamente el IDIGER O IDIGER - FONDIGER)

NO APLICA CONTRATACIÓN DERIVADA

4. Certificaciones para pagos suscritas por el supervisor

Periodo certificado	Fecha de certificación	Valor pagado	Observaciones
1. 20 de feb al 19 de marzo 2023	4 de agosto 2023	24.254.999	Corresponde al mensual 1 - 2023ER17545_Pago 1
2. 20 de marzo al 19 de abril 2023	4 de agosto 2023	24.254.999	Corresponde al mensual 2 - 2023ER17544_Pago 2
3. 20 de abril al 19 de mayo 2023	20 de septiembre 2023	24.254.999	Corresponde al mensual 3 - 2023ER21358_ Pago 3
4. 20 de mayo al 19 de junio 2023	20 de septiembre 2023	24.254.999	Corresponde al mensual 4 - 2023ER21357_Pago 4
5. 20 de junio al 19 de julio 2023	20 de octubre 2023	24.254.999	Corresponde al mensual 5 - 2023ER24133_ Pago 5
6. 20 de julio al 19 de agosto 2023	20 de octubre 2023	24.254.999	Corresponde al mensual 6 - 2023ER24132_ Pago 6
7. 20 de agosto al 19 de septiembre	13 de diciembre 2023	24.254.998	Corresponde al mensual 7 - 2023ER28146 _ Pago 7
8. 20 de septiembre al 19 del octubre	13 de diciembre 2023	24.254.999	Corresponde al mensual 8 - 2023ER28148 _ Pago 8
9. 20 de octubre al 19 de noviembre	13 de diciembre 2023	24.254.999	Corresponde al mensual 9 - 2023ER28149 _ Pago 9
10. 20 de Noviembre al 19 de Diciembre	20 de febero 2024	24.254.999	Corresponde al mensual 10 - 2024ER3749 _ Pago 10
11. 20 de Diciembre 2023 al 19 de Enero 2024	04 de Marzo 2024	24.254.999	Corresponde al mensual 11 - 2024ER4612 _ Pago 11
12. 20 de Enero 2024 al 19 de Febrero 2024	11 de abril 2024	24.254.999	Corresponde al mensual 12 - 2024ER7249 _ Pago 12
13. 20 de Febrero 2024 al 19 de Marzo 2024	11 de abril 2024	24.254.999	Corresponde al mensual 13- 2024ER7249 _ Pago 13

Nota: Si este documento se encuentra impreso se considera Copia no Controlada. La versión vigente está publicada en el sitio web del Instituto Distrital de la Gestión del Riesgo y Cambio Climático.

Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático	**INFORME PERIÓDICO DEL SUPERVISOR** (Para Contratos diferentes la prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión)	**Código:** GC-FT-65 **Versión:** 3 **Página:** 1 de 1 **Vigente Desde:** 23/11/2021

1. Datos generales

Número del Contrato o Convenio	FONDIGER-013-2023							**Fecha suscripción contrato o convenio::**	3-feb-23
Tipo de contrato	INTERVENTORÍA							**Nombre o Razón Social del Contratista:**	JAM INGENIERIA Y MEDIO AMBIENTE SAS
Plazo de Ejecución (meses)	14							**Número de Cédula o NIT:**	830.084.684.9
Periodo del Informe:	20	8	2024	al	19	9	2024	**Nombre del Representante Legal:** **(Quien en tenga la facultad en el período)**	Javier Antonio Millán López CC .79.345.746
Interventor (si Aplica)	NO APLICA							**Número de Cédula o NIT:** **Nombre del Representante Legal:** **(Quien en tenga la facultad en el período)**	NO APLICA
Cargo del Supervisor (1) del IDIGER (según cláusula de supervisión del contrato/convenio)	Subdirector de Análisis de Riesgos y Efectos del Cambio Climático							**Nombre Supervisores de otras entidades (cooperantes) - (Si aplica)**	NO APLICA
Cargo del Supervisor (2) del IDIGER (según cláusula del supervisor del contrato/convenio) Si Aplica	NO APLICA							**Cargos supervisores de otras entidades (Si Aplica)**	NO APLICA
Cargo Apoyo a la Supervisión del IDIGER	NINGUNO								

Objeto Contractual:

REALIZAR LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA EVALUACIÓN Y ZONIFICACIÓN DETALLADA DE AMENAZA, VULNERABILIDAD Y RIESGO POR INUNDACIÓN PARA EL RÍO TUNJUELO EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C; ASÍ COMO ESTABLECER LAS MEDIDAS DE REDUCCIÓN A ESTE FENÓMENO AMENAZANTE.

14. 20 de Marzo 2024 al 19 de Abril 2024	20 de mayo 2024	24.254.999	Corresponde al mensual 14- 2024ER9698 _ Pago 14
15. 20 de abril 2024 al 19 de mayo 2024	19 de junio 2024	24.254.999	Corresponde al mensual 15- 2024ER11798 _ Pago 15
16. 20 de mayo 2024 al 19 de junio 2024	1 de agosto 2024	24.254.999	Corresponde al mensual 16- 2024ER15211 _ Pago 16
17. 20 de junio 2024 al 19 de julio 2024	10 de septiembre 2024	24.254.999	Corresponde al mensual 17- 2024ER18009 _ Pago 17

5. Pagos Efectuados

Número de pago/desembolso	Valor de desembolso (SEGÚN FORMA PACTADA)	Fecha y número de la orden de pago correspondiente	Observaciones (si el valor pagado fue diferente al pactado en la minuta, describir breve justificación, descuentos y concepto de los mismos)
Mensual 1	24.254.999	OP 23296 (11-08-2023)	Corresponde al mensual 1 - 2023ER17545_Pago 1
Mensual 2	24.254.999	OP 23298 (11-08-2023)	Corresponde al mensual 2 - 2023ER17544_Pago 2
Mensual 3	24.254.999	OP 23672 (22-09-2023)	Corresponde al mensual 3 - 2023ER21358_ Pago 3
Mensual 4	24.254.999	OP 23671 (22-09-2023)	Corresponde al mensual 4 - 2023ER21357_Pago 4
Mensual 5	24.254.999	OP-23971 (27-10-2023)	Corresponde al mensual 5 - 2023ER24133_ Pago 5
Mensual 6	24.254.999	OP-23968 (25-10-2023)	Corresponde al mensual 6 - 2023ER24132_ Pago 6
Mensual 7	24.254.998	OP-24558 (18-12-2023)	Corresponde al mensual 7 - 2023ER28146 _ Pago 7
Mensual 8	24.254.999	OP-24560 (18-12-2023)	Corresponde al mensual 8 - 2023ER28148 _ Pago 8
Mensual 9	24.254.999	OP-24561 (18-12-2023)	Corresponde al mensual 9 - 2023ER28149 _ Pago 9
Mensual 10	24.254.999	OP-25131 (26-02-2024)	Corresponde al mensual 10 - 2024ER3749 _ Pago 10
Mensual 11	24.254.999	OP-25205 (08-03-2024)	Corresponde al mensual 11 - 2024ER4612 _ Pago 11
Mensual 12	24.254.999	OP-25493 (15-04-2024)	Corresponde al mensual 12 - 2024ER7249 _ Pago 12
Mensual 13	24.254.999	OP-25494 (15-04-2024)	Corresponde al mensual 13- 2024ER7248 _ Pago 13
Mensual 14	24.254.999	OP 25676 (22-05-2024)	Corresponde al mensual 14- 2024ER9698 _ Pago 14
Mensual 15	24.254.999	OP 25840 (21-06-2024)	Corresponde al mensual 15- 2024ER11798 _ Pago 15
Mensual 16	24.254.999	OP 26157 (14-08-2024)	Corresponde al mensual 16- 2024ER15211 _ Pago 16
Mensual 17	24.254.999	OP 26357 (19-09-2024)	Corresponde al mensual 17- 2024ER18009 _ Pago 17
TOTALES	412.334.982		

6. Descuentos/Liberaciones/Reducciones al valor (si aplica)

Fecha Descuento/Liberación/Reducción	Valor Descuento/Liberación/Reducción	Concepto Descuento/Liberación/Reducción
TOTAL		

Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático	**INFORME PERIÓDICO DEL SUPERVISOR** (Para Contratos diferentes la prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión)	**Código:** GC-FT-65 **Versión:** 3 **Página:** 1 de 1 **Vigente Desde:** 23/11/2021

1. Datos generales

Número del Contrato o Convenio	FONDIGER-013-2023							Fecha suscripción contrato o convenio::	3-feb-23
Tipo de contrato	INTERVENTORÍA							Nombre o Razón Social del Contratista:	JAM INGENIERIA Y MEDIO AMBIENTE SAS
Plazo de Ejecución (meses)	14							Número de Cédula o NIT:	830.084.684.9
Periodo del Informe:	20	8	2024	al	19	9	2024	Nombre del Representante Legal: (Quien en tenga la facultad en el periodo)	Javier Antonio Millán López CC .79.345.746
Interventor (si Aplica)	NO APLICA							Número de Cédula o NIT: Nombre del Representante Legal: (Quien en tenga la facultad en el periodo)	NO APLICA
Cargo del Supervisor (1) del IDIGER (según cláusula de supervisión del contrato/convenio)	Subdirector de Análisis de Riesgos y Efectos del Cambio Climático							Nombre Supervisores de otras entidades (cooperantes) - (Si aplica)	NO APLICA
Cargo del Supervisor (2) del IDIGER (según cláusula del supervisor del contrato/convenio) Si Aplica	NO APLICA							Cargos supervisores de otras entidades (Si Aplica)	NO APLICA
Cargo Apoyo a la Supervisión del IDIGER	NINGUNO								

Objeto Contractual:

REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA EVALUACIÓN Y ZONIFICACIÓN DETALLADA DE AMENAZA, VULNERABILIDAD Y RIESGO POR INUNDACIÓN PARA EL RÍO TUNJUELO EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C; ASÍ COMO ESTABLECER LAS MEDIDAS DE REDUCCIÓN A ESTE FENÓMENO AMENAZANTE.

7. Reintegros efectuados (si aplica)

Fecha reintegro	Valor reintegro	Comprobante reintegro	Concepto reintegro

8. Garantías

Amparos	Compañía aseguradora	No. de póliza	Vigencia			
			Desde (Día/ mes/ año)	hasta (Día/ mes/ año)	Fecha aprobación (Día/ mes/ año	Valor del amparo
Cumplimiento del contrato	SEGUROS MUNDIAL	21-44-101406042	20/02/2023	20/04/2025	9/03/2023	138.599.999
Pago de salarios			20/02/2023	20/04/2027	9/03/2023	34.650.000
Calidad del servicio			20/02/2023	20/042027	9/03/2023	138.599.999
Responsabilidad civil extra contractual	SEGUROS MUNDIAL	21-40-101205844	20/02/2023	20/04/2024	9/03/2023	232.000.000

MODIFICACIÓN 1

Amparos	Compañía aseguradora	No. de póliza	Vigencia			
			Desde (Día/ mes/ año)	hasta (Día/ mes/ año)	Fecha aprobación (Día/ mes/ año	Valor del amparo
Cumplimiento del contrato	SEGUROS MUNDIAL	21-44-101406042	20/02/2023	3/09/2025	3/09/2024	160.429.498
Pago de salarios			20/02/2023	3/09/2027	3/09/2024	40.107.375
Calidad del servicio			20/02/2023	3/09/2027	3/09/2024	160.429.498
Responsabilidad civil extra contractual	SEGUROS MUNDIAL	21-40-101205844	20/02/2023	3/09/2024	3/09/2024	232.000.000

MODIFICACIÓN 2

Cumplimiento del contrato	SEGUROS MUNDIAL	21-44-101406042	20/02/2023	28/12/2025	Pendinte OJ	160.429.498
Pago de salarios			20/02/2023	28/12/2027	Pendinte OJ	40.107.375
Calidad del servicio			20/02/2023	28/12/2027	Pendinte OJ	160.429.498
Responsabilidad civil extra contractual	SEGUROS MUNDIAL	21-40-101205844	20/02/2023	28/12/2024	Pendinte OJ	160.429.498

Si se presentan más prórrogas, incluir más filas para éstas.

9. Seguimiento a matriz de riesgos

Luego del seguimiento detectó alguno con alta probabilidad de ocurrencia?	Si		No	X

Registre cual(es) riesgo(s) detectó con alta probabilidad de ocurrencia:

Observaciones adicionales:

Nota: Si este documento se encuentra impreso se considera Copia no Controlada. La versión vigente está publicada en el sitio web del Instituto Distrital de la Gestión del Riesgo y Cambio Climático.

Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático	**INFORME PERIÓDICO DEL SUPERVISOR** (Para Contratos diferentes la prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión)	**Código:** GC-FT-65 **Versión:** 3 **Página:** 1 de 1 **Vigente Desde:** 23/11/2021

1. Datos generales

Número del Contrato o Convenio	FONDIGER-013-2023							Fecha suscripción contrato o convenio::	3-feb-23
Tipo de contrato	INTERVENTORÍA							Nombre o Razón Social del Contratista:	JAM INGENIERIA Y MEDIO AMBIENTE SAS
Plazo de Ejecución (meses)	14							Número de Cédula o NIT:	830.084.684.9
Periodo del Informe:	20	8	2024	al	19	9	2024	Nombre del Representante Legal: (Quien en tenga la facultad en el periodo)	Javier Antonio Millán López CC .79.345.746
Interventor (si Aplica)	NO APLICA							Número de Cédula o NIT: Nombre del Representante Legal: (Quien en tenga la facultad en el periodo)	NO APLICA
Cargo del Supervisor (1) del IDIGER (según cláusula de supervisión del contrato/convenio)	Subdirector de Análisis de Riesgos y Efectos del Cambio Climático							Nombre Supervisores de otras entidades (cooperantes) - (Si aplica)	NO APLICA
Cargo del Supervisor (2) del IDIGER (según cláusula del supervisor del contrato/convenio) Si Aplica	NO APLICA							Cargos supervisores de otras entidades (Si Aplica)	NO APLICA
Cargo Apoyo a la Supervisión del IDIGER	NINGUNO								
Objeto Contractual: REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA EVALUACIÓN Y ZONIFICACIÓN DETALLADA DE AMENAZA, VULNERABILIDAD Y RIESGO POR INUNDACIÓN PARA EL RÍO TUNJUELO EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C; ASÍ COMO ESTABLECER LAS MEDIDAS DE REDUCCIÓN A ESTE FENÓMENO AMENAZANTE.									

Si hay algún riesgo que se materializó o que tiene alta probabilidad de ocurrencia debe informarse a la Oficina Asesora Jurídica.

10 REFERENTE AL SEGUIMIENTO TÉCNICO: Información de seguimiento técnico del contrato, así como análisis respecto del cronograma o avance inicialmente pactado (evidencia de posibles retrasos, vicisitudes, dificultades), (estado % de terminados, en ejecución, pendientes por ejecutar, pagos pendientes y/o en curso etc.).

Resumen del desarrollo del contrato
Durante el transcurso del periodo comprendido entre el 20 de Enero de 2024 al 19 de febrero de 2024, los contratos de consultoría FONDIGER 010 DE 2023 e interventoría FONDIGER 013 de 2023 se encuentran en el décimo cuarto mes de desarrollo del proyecto, que corresponde al 100% del tiempo de ejecución del contrato de conformidad con los tiempos contractuales establecidos en el contrato, sin embargo, posterior a la aprobación de la prórroga el tiempo contractual se encuentra en un 100%, con fecha de terminación el 19 de agosto de 2024 (Consultoría) y 3 de septiembre (Interventoría). No obstante, se aprueba una segunda prorroga (solicitudes con radicados IDIGER 2024ER14985, 2024ER15073 y 2024ER15242) por un termino de 3,5 meses para el desarrollo de los contratos, el alcance de los objetivos y donde se incluirá los análisis por variabilidad climática dentro de los escenarios del componente hidráulico y posteriormente en Amenaza, Vulnerabilidad y Riesgo.

Dentro de los alcances y el cronograma vigente del proyecto aprobado en referencia a la segunda prorroga que fue aprobada el 16 de agosto de 2024, y entra en vigencia el nuevo cronograma y por medio de la estructura de valor ganado, los avances durante el mes del presente informe para consultoría se relacionan a continuación: Avance programado consultoría : 63,42% Avance Real Consultoría 58,11%.
La interventoría informa "Dada la aprobación de la segunda prórroga, el cronograma del proyecto se ajusta y entra en rigor una nueva etapa para el desarrollo del contrato. Una vez realizado el cambio del cronograma, se identifica el ajuste entre la programación y las actividades ejecutadas ... se evidencia el efecto que tiene el cronograma del plan de contingencia, el cronograma de la primer prórroga y el cronograma de la segunda prorroga, ajustando en cierta medida los avances reales y programados. Es importante mencionar que, la gráfica presenta el corte de actualización del informe de interventoría al día viernes 20 de septiembre de 2024...Durante el periodo del informe se han entregado documentos, además con el desarrollo de mesas de trabajo se evidencian avances en la ejecución de los componentes, sin embargo, se ha incurrido en retrasos en la entrega de las modelaciones hidráulicas, en específico el montaje o idealización del modelo, además, se presentan retrasos en la entrega del componente 7, correspondiente a Jarillones, el cual debía estar debidamente entregado a satisfacción a inicios del periodo del informe, sin embargo, a la fecha de corte del presente informe no se han logrado subsanar las no conformidades encontradas en la caracterización, parametrización y zonificación geotécnica"

Resumen administrativo: Se realizaron todas las gestiones de seguimiento que han permitido el desarrollo del contrato.
Resumen jurídico: Se cumplieron los requisitos precontractuales y de inicio.
Resumen financiero:

Se anexa el informe de supervisión correspondiente

Técnicos	58,1%	**Técnico**	58,1%
Financieros consultoría	25%	**Financieros Interventoría**	51,4%

11. Verificación Pago al Sistema de Seguridad Social Integral y Parafiscales.

La supervisión verifico el cumplimiento del contratista de sus obligaciones con el Sistema de Seguridad Social Integral y parafiscales conforme a los documentos (planillas, pagos, certificaciones) allegados por el contratista para el pao del producto 1, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 50 de la ley 789 de 2002: "(....) verificar y dejar constancia del cumplimiento de las obligaciones del contratista frente a los aportes mencionados durante toda su vigencia, estableciendo una correcta relación entre el monto cancelado y las sumas que debieron haber sido cotizadas. (...) Cuando la contratación se realice con personas jurídicas, se deberá acreditar el pago de los aportes de sus empleados, a los sistemas mencionados mediante certificación expedida por el revisor fiscal(...)"

Fecha emisión de Informe	11	10	2024

Firma

Darwin Javier Ortiz González
Subdirector de Análisis de Riesgos y Efectos del Cambio Climático

Carolina Castañeda Jiménez
Profesional Especializado 222-23

Nota: Si este documento se encuentra impreso se considera Copia no Controlada. La versión vigente está publicada en el sitio web del Instituto Distrital de la Gestión del Riesgo y Cambio Climático.

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

IDIGER

SEGUIMIENTO A CONTRATOS Y CONVENIOS

Informe de Supervisión Contrato de interventoría FONDIGER 13-2023

Fecha de elaboración del informe	11 de octubre de 2024
Periodo de seguimiento	20 de agosto de 2024 al 19 de septiembre de 2024
Fecha de inicio	20 de febrero de 2023
Fecha de terminación	18 de diciembre de 2024
Valor del Contrato	$ 802.147.492 Incluido IVA
Objeto	REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA EVALUACIÓN Y ZONIFICACIÓN DETALLADA DE AMENAZA, VULNERABILIDAD Y RIESGO POR INUNDACIÓN PARA EL RÍO TUNJUELO EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C; ASÍ COMO ESTABLECER LAS MEDIDAS DE REDUCCIÓN A ESTE FENÓMENO AMENAZANTE
Nombre de contratista	JAM INGENIERIA Y MEDIO AMBIENTE SAS
Nombre del Supervisor	DARWIN JAVIER ORTIZ GONZALEZ
PLAZO DE EJECUCIÓN	22 meses

Avance

(INCLUIR EL PORCENTAJE DE AVANCE TÉNCICO Y FINANCIERO)


Durante el transcurso del periodo comprendido entre el 20 de Enero de 2024 al 19 de febrero de 2024, los contratos de consultoría FONDIGER 010 DE 2023 e interventoría FONDIGER 013 de 2023 se encuentran en el décimo cuarto mes de desarrollo del proyecto, que corresponde al 100% del tiempo de ejecución del contrato de conformidad con los tiempos contractuales establecidos en el contrato, sin embargo, posterior a la aprobación de la prórroga el tiempo contractual se encuentra en un 100%, con fecha de terminación el 19 de agosto de 2024 (Consultoría) y 3 de septiembre (Interventoría). No obstante, se aprueba una segunda prórroga (solicitudes con radicados IDIGER 2024ER14985, 2024ER15073 y 2024ER15242) por un termino de 3,5 meses para el desarrollo de los contratos, el alcance de los objetivos y donde se incluirá los análisis por variabilidad climática dentro de los escenarios del componente hidráulico y posteriormente en Amenaza, Vulnerabilidad y Riesgo. De acuerdo a esta segunda prórroga, la fecha de terminación para Consultoría es el 04 de diciembre de 2024 y para Ineterventoría es el 18 de diciembre Interventoría. En el periodo se desarrollaron mesas de trabajo, reuniones de seguimiento, y se emitieron y recibieron conceptos mediante oficios como soportes de las actividades del contrato de consultoría e interventoría.

Dentro de los alcances y el cronograma vigente del proyecto aprobado en referencia a la segunda prórroga que fue aprobada el 16 de agosto de 2024, y entra en vigencia el nuevo cronograma y por medio de la estructura de valor ganado, los avances durante el mes del presente informe para consultoría se relacionan a continuación: Avance programado consultoría : 63,42% Avance Real Consultoría 58,11%.

La interventoría informa "Dada la aprobación de la segunda prórroga, el cronograma del proyecto se ajusta y entra en rigor una nueva etapa para el desarrollo del contrato. Una vez realizado el cambio del cronograma, se identifica el ajuste entre la programación y las actividades ejecutadas (ver gráfica adjunta).

En la gráfica anterior se evidencia el efecto que tiene el cronograma del plan de contingencia, el cronograma de la primer prórroga y el cronograma de la segunda prórroga, ajustando en cierta medida los avances reales y programados. Es importante mencionar que, la gráfica presenta el corte de actualización del informe de interventoría al día viernes 20 de septiembre de 2024...Durante el periodo del informe se han entregado documentos, además con el desarrollo de mesas de trabajo se evidencian avances en la ejecución de los componentes, sin embargo, se ha incurrido en retrasos en la entrega de las modelaciones hidráulicas, en específico el montaje o idealización del modelo, además, se presentan retrasos en la entrega del componente 7, correspondiente a Jarillones, el cual debía estar debidamente entregado a satisfacción a inicios del periodo del informe, sin embargo, a la fecha de corte del presente informe no se han logrado subsanar las no conformidades encontradas en la caracterización, parametrización y zonificación geotécnica."

Ilustración 5-1 Avance real vs programado.

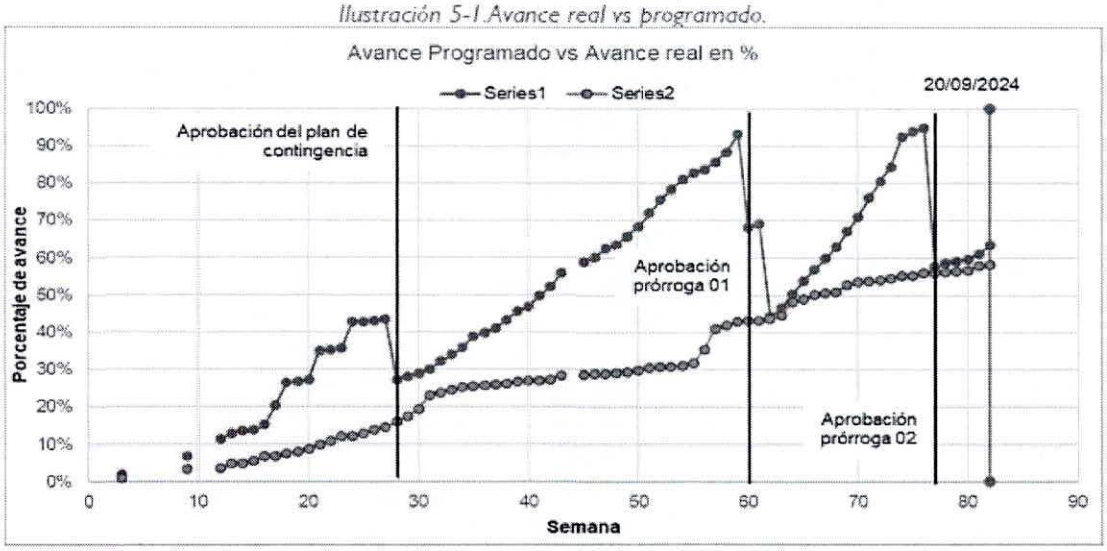

Fuente: JAM Ingeniería y Medio Ambiente SAS

Por otra parte, el contrato FONDIGER 010-2024 presenta un proceso de presunto incumplimiento solicitud enviada por interventoría radicado 2023ER28619 del 19 de diciembre de 2023, cuya solicitud de incumplimiento se remite desde la supervisión al Oficina Jurídica (2023IE6248) el 22 de diciembre de 2023, y por lo cual se han surtido los siguientes procesos hasta la fecha de corte del presente informe:

Tema	Fecha
Audiencia	23 de agosto de 2024
Audiencia - Se cierra el proceso	30 de agosto de 2024

Técnicos	58.1%	**Técnico**	58.1%
Financieros consultoría	25%	**Financieros Interventoría**	51.4%

SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO:

(RELACIONAR CORREOS, RESPUESTAS OFICIALES, REUNIONES Y TRÁMITES REALIZADOS EN EL PERÍODO DE SEGUIMIENTO)

Fecha	Actividad	Soporte
20/08/2024	Remisión del informe semanal del 05 de agosto al 11 de agosto de 2024	2024ER15762
20/08/2024	Respuesta Radicado IDIGER 2024ER14763 – Observaciones al informe mensual de interventoría No. 17. Contrato FONDIGER 13-2023	2024EE13715 RO- 148212
22/08/2024	Respuesta al oficio GE-24-0512/498-0596 – Levantamientos topográficos	Correo
22/08/2024	Respuesta al oficio GE-24-0524/498-0599 – Informe Mensual 5 de consultoría ajustado.	Correo
22/08/2024	Respuesta al oficio GE-24-0525/498-0600 – Informe Mensual 6 de consultoría ajustado	Correo
22/08/2024	Respuesta al oficio GE-24-0526/498-0601 – Informe Mensual 8 de consultoría ajustado	Correo
22/08/2024	Respuesta al oficio GE-24-0527/498-0602 – Informe Mensual 9 de consultoría ajustado	Correo
22/08/2024	Reuniónінterventoría y consultoria revisión producto 7 - Jarillones	Acta
23/08/2024	Remisión del informe semanal del 12 de agosto al 18 de agosto de 2024	2024ER16065
23/08/2024	Reunión Presencial - Presentación Componente Hidrologia río Tunjuelo - CT	Correo convocatoria
26/08/2024	Solicitud de acta u oficio de aprobación cronograma aprobado segunda prórroga	Correo
27/08/2024	Reunión de seguimiento Estudio río Tunjuelo presencial	Acta
28/08/2024	Comunicación aprobación del cronograma propuesto – Segunda prórroga al contrato FONDIGER 010-2023	2024ER16312
28/08/2024	Reunión EAAB - IDIGER - Revisión información Topografica y de modelación - Presencial Oficinas EAAB	Acta
29/08/2024	Respuesta al oficio GE-24-0541/498-0605 – MDT actualizado según observaciones realizadas mediante comunicado CO-1027-IDIGER-390	Correo

29/08/2024	Remisión del informe mensual 18 - Contrato FONDIGER 013-2023	2024ER16429 2024ER16484
29/08/2024	Programación visita en el sector San Bernardino río Tunjuelo	Correo
30/08/2024	Respuesta al radicado IDIGER 2024EE13715 – Informe mensual de interventoría 17 V2	2024ER16575
2/09/2024	Respuesta al oficio GE-24-0553/498-0606 – Inventario de estructuras	Correo
2/09/2024	Respuesta al oficio GE-24-0556/498-0607– Modelo Digital del Terreno (MDT)	Correo
2/09/2024	Llamado de atención – Entrega de Informes mensuales y soportes SST de consultoría	Correo
3/09/2024	Reunión de seguimiento - Río Tunjuelo Virtual	Acta
4/09/2024	Respuesta al oficio GE-24-0236/498-0530 – Solicitud de cambio del Profesional Ambiental de Consultoría	Correo
4/09/2024	Respuesta al oficio GE-24-0560/498-0608 – Solicitud de cambio del Especialista en Riesgos de Consultoría.	Correo
5/09/2024	Remisión del informe semanal del 19 de agosto al 25 de agosto de 2024	2024ER16971
5/09/2024	Respuesta al oficio GE-24-0568/498-0611 – Programación mesa de trabajo componente AVR.	Correo
5/09/2024	Respuesta al oficio GE-24-0569/498-0612– Solicitud de cambio del Especialista en Riesgos de Consultoría	Correo
6/09/2024	Se remite comunicación a interventoría con asunto: "Acciones para el cumplimiento del cronograma vigente del proyecto - Contrato de Consultoría FONDIGER 010- 2023".	2024EE14927 CR-53132
6/09/2024	Remisión del informe semanal del 26 de agosto al 01 de septiembre de 2024	2024ER17169
6/09/2024	Reunión IDIGER - HABITAT - Estudio río Tunjuelo (Virtual)	Acta
9/09/2024	Solicitud a interventoría para gestionar mesas de trabajo hidráulica y entrega producto 7 componente de jarillones según compromisos	Correo
9/09/2024	Respuesta al oficio GE-24-0574/498-0613 – Solicitud de cambio del Especialista en Riesgos de Consultoría	Correo
9/09/2024	Solicitud entrega de la calibración del modelo hidráulico	Correo
9/09/2024	Plan de acción para el debido cumplimiento al cronograma vigente del contrato FONDIGER 010-2023 y cumplimiento de los compromisos acordados	Correo
10/09/2024	Reunión presencial de seguimiento - Estudio río Tunjuelo	Acta
11/09/2024	Cumplimiento a compromisos y entrega de productos intermedios y/o finales	Correo
12/09/2024	Presentación de la calibración del modelo hidráulico	Correo

13/09/2024	Remisión del informe semanal del 02 de septiembre al 08 de septiembre de 2024	2024ER17732
16/09/2024	Respuesta al oficio GE-24-0565/498-0610 y GE-24-0599/498-0621 - Metodología Variabilidad Climática	Correo
16/09/2024	Llamado de atención - Reiteración cumplimiento de compromisos y entrega de productos	Correo
16/09/2024	Respuesta al oficio GE-24-0584/498-0615 – Informe mensual 6 de Consultoría ajustado	Correo
16/09/2024	Respuesta al oficio GE-24-0585/498-0616 – Informe mensual 7 de Consultoría ajustado	Correo
16/09/2024	Respuesta al oficio GE-24-0587/498-0618 – Informe mensual 8 de Consultoría ajustado	Correo
16/09/2024	Respuesta al oficio GE-24-0586/498-0617 – Informe mensual 9 de Consultoría ajustado	Correo
16/09/2024	Respuesta al oficio GE-24-0588/498-0619 – Informe mensual 10 de Consultoría ajustado	Correo
17/09/2024	Mesa de Trabajo - Modelo Hidráulico Tunjuelo	Acta
17/09/2024	Reunión presencial de seguimiento - Estudio río Tunjuelo	Acta

SEGUIMIENTO TECNICO:

(RELACIONAR INFORMES Y/O APORTES TÉCNICOS REALIZADOS N EL PERÍODO DE SEGUIMIENTO)

Producto	Fecha	Actividad	Soporte
Informes Mensuales	29/08/2024	Informe Mensual 18 de interventoría en V1	Comunicación 2024ER16484
	30/08/2024	Informe Mensual 17 de interventoría en V2	Comunicación 2024ER16575

PROFESIONAL RESPONSABLE

DARWIN JAVIER ORTIZ GONZALEZ - SUPERVISOR DEL CONTRATO
