jasb
Jorge Álvaro Sánchez
Desarrollo Integral de Proyectos
Transversal 55A No. 115A-06
Barrio Ilarco
Tel: +57(1) 300 3053
Cel: +57(1) 301 3369740
Bogotá D.C., Colombia
Código postal: 111111
info@jasb.com.co

[illegible], [illegible] 202[illegible]

[illegible]
[illegible] 702[illegible]56[illegible]

[illegible]

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVIAS
ATN. ING. JOSÉ RICARDO BURBANO BÁRCENAS
[illegible]

REFERENCIA: CONTRATO 988 DE 2022 "[illegible] 2.0".

ASUNTO: [illegible] 25 [illegible] 202[illegible].

[illegible],

[illegible] 2022, [illegible] 25 [illegible] 0 [illegible] 3 [illegible] 202[illegible] [illegible] 2022 [illegible].

[illegible].

ING. RAÚL ANTONIO PÉREZ G.
[illegible]
[illegible] 2022
[illegible] 055 [illegible]

296-24-CLI-CVC055-DIR

Villagarzón – Putumayo, 01 de agosto de 2024

SEÑORES:
CONSORCIO VIAL JAC 2022
ATN. ING. RAÚL ANTONIO PÉREZ GUAGLIANONI
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
CIUDAD

Referencia: **Contrato de Obra Pública N° 985 de 2022**. "Mejoramiento, mantenimiento, gestión predial, social y ambiental sostenible de la carretera Villagarzón - San José de Fragua y puente sobre el río Caquetá en los departamentos de Putumayo, Cauca y Caquetá en marco de la reactivación económica, mediante el programa de las vías para la conexión de territorios, el crecimiento sostenible y la reactivación 2,0"

Asunto: Entrega de acta parcial de obra No. 25 de 01 a 31 de julio de 2024

Respetados señores:

De conformidad con el Instructivo Único de Facturación del INVIAS y el Manual de Interventoría, nos permitimos entregar el Acta parcial de Obra No. 25 correspondiente al período comprendido desde el 01 al 31 de julio de 2024, junto con los documentos que se relacionan a continuación, los que se podrán descargar del enlace adjunto al final de este comunicado:

0. Hoja de Ruta y Orden de Pago MEPI-MN1-IN-4-FR-2.
1. Factura Proforma.
2. Acta de Recibo Parcial MEPI-MN1-IN-4-FR-1.
3. Afectación Presupuestal AFINCO-FR-12.
4. Identificación de la Distribución AFINCO-FR-13.
6. Certificado pago Parafiscales y Seguridad RPLG.
7. Copia RUT Contratistas e Integrantes.
8. Informe Financiero y Presupuestal MEPI-MN1-IN-15-FR-8.
9. Acta de modificación de cantidades 03 MEPI-MN1-IN-7-FR-1.
10. Acta de fijación de ítem NP MEPI-MN1-IN-10-FR-4.
11. Seguimiento Programa Inversión MEPI-MN1-IN-6-FR-2.
12. Pre-acta de obra.
12.1 Memoria de Calculo.
15. Pre-acta Ambiental MASPS-MN1-IN-1-FR-3.
16. Pre-acta Social MSOAMB-MN-IN-1-FR-7.
17. Pre-acta Predial MASPS-MN1-IN-5-FR-11, MASPS-MN1-IN-5-FR-10, MASPS-MN1-IN-5-FR-09, MASPS-MN1-IN-5-FR-08

18. Pre-acta Sostenibilidad MASPS-MN-IN1-6-FR-4.
19. Anexo-1 (Certificación bancaria).
20. Check list.

Cordialmente,

RUBÉN DARÍO FUENTES PEÑA
Director de Obra
Consorcio Vías Colombia 055

Anexos: Anexos 296-24-CLI-CVC055-DIR
C.C Jorge Eduardo Duarte Rodríguez – Representante Legal- (jduarte@hehcolombia.com.co)
José Ricardo Burbano Bárcenas – Supervisor Técnico - INVÍAS (jburbano@invias.gov.co)
Hector Fabian Chaparro Rivera – Apoyo Técnico a Supervición INVIAS (hchaparro@invias.gov.co)
Jimmy Bonini – Director Técnico e Innovación - (jbonini@hehcol.com)
Rubén Guisa Velandia – Líder de integración – (rvelandia@hehcol.com)
Jaime Sánchez: (jsanchez@casacontratistas.com.co)
Leonardo Molina: lmolina@casacontratistas.com.co
Diego Sebastián Molina: smolina@casacontratistas.com.co
Cesar Malaver: cmalaver@casacontratistas.com.co
Luis Fernando Castrillón Marín lcastrillon@casacontratistas.com.co
Archivo

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA** **HOJA DE RUTA Y ORDEN DE PAGO CONTRATO DE OBRA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-4-FR-2
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1

FECHA: 31-jul-24 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SMCN-GRUPO SUR OCCIDENTE **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** PUTUMAYO PERIODO MES: 1 al 31 de julio

ACTA PARCIAL DE OBRA No. **25** (Indique el número del acta) ACTA AJUSTE PROVISIONAL No. ____ (Indique el número del acta) ACTA AJUSTE DEFINITIVO No. ____ (Indique el número del acta) VALOR BÁSICO ACTA: $ 2.643.475.447,00

	Día/Mes/Año			FIRMA
FECHA DE PRESENTACIÓN POR PARTE DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR	01-jul-24	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	RAÚL ANTONIO PÉREZ G.	
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR (EN CASO DE REQUERIRSE)		NOMBRE DE QUIEN RECIBE		
FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR		NOMBRE DE QUIEN RECIBE		
FECHA DE APROBACIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR	10-ago-24	NOMBRE DE QUIEN APRUEBA	RAÚL ANTONIO PÉREZ G.	
FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INTERVENTOR A LA DIRECCIÓN TERRITORIAL	10-ago-24	NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE	JOSÉ RICARDO BURBANO BARCENAS	JOSE RICARDO BURBANO BARCENAS Firmado digitalmente por JOSE RICARDO BURBANO BARCENAS Fecha: 2024.08.13 06:54:58 -05'00'
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL (EN CASO DE REQUERIRSE)		NOMBRE DE QUIEN RECIBE		
FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INTERVENTOR A LA DIRECCIÓN TERRITORIAL		NOMBRE DE QUIEN RECIBE		
FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR EL DIRECTOR TERRITORIAL	13-ago-24	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	JOSÉ RICARDO BURBANO BARCENAS	JOSE RICARDO BURBANO BARCENAS Firmado digitalmente por JOSE RICARDO BURBANO BARCENAS Fecha: 2024.08.13 06:54:58 -05'00'
FECHA DE ENTREGA DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL AL CONTRATISTA		NOMBRE DE QUIEN RECIBE		
FECHA DE ENTREGA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO	15-ago-24	NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE	HECTOR FABIAN CHAPARRO RIVERA	
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO (EN CASO DE REQUERIRSE)		NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE		
FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO		NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE		
FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR PARTE DEL ORDENADOR DEL PAGO	20/08/2024	NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE	Gustavo A. Bastidas G.	Firmado digitalmente por GUSTAVO ADOLFO BASTIDAS GODOY

Para la orden de pago debe estar diligenciada la hoja de ruta en su totalidad.

ORDEN DE PAGO

CONTRATO DE OBRA No.: 985 DE 2022

OBJETO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA VILLAGARZON - SAN JOSE DEL FRAGUA Y PUENTE SOBRE EL RIO CAQUETA EN LOS DEPARTAMENTOS DE PUTUMAYO, CAUCA Y CAQUETA EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA VIAS PARA LA CONEXION DE TERRITORIOS, EL CRECIMIENTO SOSTENIBLE Y LA REACTIVACIÓN 2.0

CONTRATISTA: CONSORCIO VÍAS COLOMBIA 055 **NIT.** 901.584.893-4

DE ACUERDO CON LA FACULTAD OTORGADA POR EL, SMCN-GRUPO SUR OCCIDENTE (Indicar el ordenador del pago) AUTORIZA EL PAGO A: CONSORCIO VÍAS COLOMBIA 055

VALOR TOTAL A PAGAR: $ 2.528.660.467,00 (Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo) VALOR EN LETRAS: DOS MIL QUINIENTOS VEINTIOCHO MILLONES SEISCIENTOS SESENTA MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS M/CTE

CORRESPONDIENTE AL ACTA: No. 25 (Indicar si es Acta de Recibo Parcial de Obra o de Ajuste y el No. del Acta **DEL PERIODO** 1 al 31 de julio (Indicar el periodo del Acta) y con cargo al registro presupuestal indicado en el formato de afectación presupuestal.

JOSE RICARDO BURBANO BARCENAS Firmado digitalmente por JOSE RICARDO BURBANO BARCENAS Fecha: 2024.08.13 06:55:07 -05'00'

Firma
Nombre: JOSÉ RICARDO BURBANO BARCENAS
Matricula profesional No.: 52202-46096 NRÑ
SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORÍA
Fecha firma:
(Suscribe según su competencia)

JOSE RICARDO BURBANO BARCENAS Firmado digitalmente por JOSE RICARDO BURBANO BARCENAS Fecha: 2024.08.13 06:55:20 -05'00'

Firma
Nombre: JOSÉ RICARDO BURBANO BARCENAS
Matricula profesional No. : 52202-46096 NRÑ
DIRECTOR TERRITORIAL
Fecha firma:
(Suscribe según su competencia)

Firma
Nombre: HECTOR FABIAN CHAPARRO RIVERA
Matricula profesional No.: 25202-158055 CND
GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO
Fecha firma: 15-ago-24
(Suscribe según su competencia)
Apoyo a la supervisión en aspectos técnicos y administrativos
2024S-VBOG-029826 de 2024-05-15

Firmado digitalmente por GUSTAVO ADOLFO BASTIDAS GODOY

Firma
Nombre: GUSTAVO ADOLFO BASTIDAS GODOY
Matrícula Profesional No.: 25202-103081 CND
ORDENADOR DEL PAGO
Fecha de Firma: 20/08/2024

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

					PROFORMA No. CVC055 -043
PERIODO:1 al 31 de julio					
CVC 055 Acta de Obra 25, Correspondiente a Obra Basica Ejecutada					
Contrato: 985 DE 2022					
TOTAL ACTA DE OBRA No. 25	**$**	**2,662,793,152.00**			
Valor Basico de Obra			$	2,033,442,652.00	2,033,442,652.00
Administracion		20.00%	$	406,688,531.00	406,688,531.00
Imprevistos		5.00%	$	101,672,132.00	101,672,132.00
Utilidad		5.00%	$	101,672,132.00	101,672,132.00
IVA de Obra (Sobre Utilidad)		19.00%	$	19,317,705.00	
SUBTOTAL BASICO			$	2,643,475,447.00	
SUBTOTAL IVA			$	19,317,705.00	
AMORTIZACION ANTICIPO			$	134,132,685.00	134,132,685.00
NETO A PAGAR			$	2,528,660,467.00	
ACTA DE OBRA #25			$	2,528,660,467.00	
#$24-02-00;985-2022;gabastidas@invias.gov.co#$					
CONSORCIO VIAS COLOMBIA 055					
ESTA CONFORMADO POR:					
HIDALGO E HIDALGO S.A. SUCURSAL COLOMBIA (25% - 900.397.334 - 3)					
HIDALGO E HIDALGO COLOMBIA S.A.S (75% - 900.354.637 - 5)					
SON:			**SUBTOTAL**	$	2,509,342,762.00
CERO PESOS Mcte			**IVA**	$	19,317,705.00
			TOTAL	**$**	**2,528,660,467.00**

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA		
		CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-4-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1

FECHA: 31-jul-24

UNIDAD EJECUTORA: SMCN-GRUPO SUR OCCIDENTE **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** PUTUMAYO **ACTA No.** 25 **VALOR BÁSICO ACTA:** $ 2,643,475,447.00 **MES** 1 al 31 de julio

ACTA FINAL ☐

CONTRATO No : 985 de 2022

PLAZO INICIAL: 97 MESES — PLAZO ACUMULADO: 97 MESES (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

OBJETO:

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA VILLAGARZON - SAN JOSE DEL FRAGUA Y PUENTE SOBRE EL RIO CAQUETA EN LOS DEPARTAMENTOS DE PUTUMAYO, CAUCA Y CAQUETA EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA VIAS PARA LA CONEXION DE TERRITORIOS, EL CRECIMIENTO SOSTENIBLE Y LA REACTIVACIÓN 2.0

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 26/07/2022 — FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/07/2030

FECHA DE SUSPENSIÓN: N/A (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) — FECHA DE REANUDACIÓN: N/A (Indique día/mes/año)

CONTRATISTA: CONSORCIO VÍAS COLOMBIA 055 (Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial)

VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: $ 319,366,761,001.00 — VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**: $ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 988 de 2022 INTERVENTOR: CONSORCIO VIAL JAC 2022

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ 319,366,761,001.00

No. DE ORDEN	GRUPO DE AJUTE	ITEM DE PAGO	ESPECIFICACIÓN		CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)					CONDICIONES ACTUALIZADAS — Última Acta de Modificación No._3_ de fecha __25/04/2024__		OBRA EJECUTADA — PRESENTE ACTA		OBRA EJECUTADA — ACUMULADO	
			GRAL.	PART.	DESCRIPCIÓN ITEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
EXPLANACIONES															
1	11601	200.2	200-22		Desmonte y limpieza en zonas no boscosas	Ha	16.00	$ 1,083,131.00	$ 17,330,096.00	5.00	$ 5,415,655.00	0.00	$ -	0.00	$ -
2	11601	201.7	201-22		Demolición de Estructuras	m3	132.00	$ 107,114.00	$ 14,139,048.00	1,770.00	$ 189,591,780.00	0.00	$ -	189.00	$ 20,244,546.00
3	11601	210.1.2	210-22		Excavación sin clasificar de préstamos	m3	150,000.00	$ 12,300.00	$ 1,845,000,000.00	21,975.40	$ 270,297,420.00	0.00	$ -	0.00	$ -
4	11601	210.2.2	210-22		Excavaciones en material común de la Explanación y Canales	m3	24,314.00	$ 10,685.00	$ 259,795,090.00	197,776.70	$ 2,113,244,040.00	0.00	$ -	26945.70	$ 287,914,806.00
5	11602	220.1	220-22		Terraplenes	m3	150,000.00	$ 12,800.00	$ 1,920,000,000.00	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
6	11606	223.2	223-22		Geomalla de refuerzo tipo Asphalt 160 o similar	m2	297,712.00	$ 11,100.00	$ 3,304,603,200.00	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
7	11602	230.1P		230.1P	Mejoramiento de la subrasante con material aluvial - crudo de rio y/o material de cantera tipo seleccionado (compacto) (incluye transporte)	m3	86,400.00	$ 92,500.00	$ 7,992,000,000.00	73,572.00	$ 6,805,410,000.00	5.60	$ 518,000.00	30987.20	$ 2,866,316,000.00
Subtotal									**$ 15,352,867,434.00**		**$ 9,383,958,895.00**		**$ 518,000.00**		**$ 3,174,475,352.00**
SUBBASES Y AFIRMADOS															
8	11602	310.1	310-22		Conformación de la calzada existente	m2	350,000.00	$ 925.00	$ 323,750,000.00	1,201,386.80	$ 1,111,282,790.00	67,290.00	$ 62,243,250.00	871425.40	$ 806,068,498.00
9	11602	311.1	311-22		Afirmado	m3	73,000.00	$ 90,000.00	$ 6,570,000,000.00	52,833.00	$ 4,754,970,000.00	943.30	$ 84,897,000.00	15888.10	$ 1,429,929,011.00
10	11602	320.1	320-22		Subbase Granular clase A	m3	105,120.00	$ 127,410.00	$ 13,393,339,200.00	377,848.50	$ 48,141,677,385.00	1,197.10	$ 152,522,511.00	79210.30	$ 10,092,184,323.00
Subtotal									**$ 20,287,089,200.00**		**$ 54,007,930,175.00**		**$ 299,662,761.00**		**$ 12,328,181,832.00**
BASES															
11	11602	330.1	330-22		Base granular clase A	m3	101,972.00	$ 139,500.00	$ 14,225,094,000.00	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
12	11602	330.4	330-22		Base granular para bacheo clase A	m3	14,000.00	$ 143,000.00	$ 2,002,000,000.00	200.00	$ 28,600,000.00	0.00	$ -	0.00	$ -
Subtotal									**$ 16,227,094,000.00**		**$ 28,600,000.00**		**$ -**		**$ -**
PAVIMENTOS ASFALTICOS															
13	11603	420.2	420-22		Riego de imprimación con emulsión asfáltica CRL-1	m2	525,600.00	$ 2,921.00	$ 1,535,277,600.00	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
14	11603	421.1	421-22		Riego de liga con emulsión asfáltica CRR-1	m2	525,600.00	$ 1,852.00	$ 973,411,200.00	12,680.00	$ 23,483,360.00	0.00	$ -	0.00	$ -
15	11603	450.1P		450.1P	Mezcla densa en caliente Tipo MDC-25	m3	36,792.00	$ 807,000.00	$ 29,691,144,000.00	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
16	11603	450.2P		450.2P	Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19	m3	33,752.00	$ 811,000.00	$ 27,372,872,000.00	634.00	$ 514,174,000.00	0.00	$ -	0.00	$ -
17	11603	450.9P		450.9P	Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19 para bacheos	m3	7,000.00	$ 825,000.00	$ 5,775,000,000.00	100.00	$ 82,500,000.00	0.00	$ -	0.00	$ -
18	11603	460.1P		460.1P	Fresado de pavimento asfaltico	m3	3,500.00	$ 65,590.00	$ 229,565,000.00	100.00	$ 6,559,000.00	0.00	$ -	0.00	$ -
19	11603	465.1	465-22		Excavación para reparación de pavimento asfáltico existente incluyendo el corte y la remoción de las capas asfálticas y de las subyacentes.	m3	7,000.00	$ 71,686.00	$ 501,802,000.00	998.90	$ 71,607,145.00	0.00	$ -	0.00	$ -
Subtotal									**$ 66,079,071,800.00**		**$ 698,323,505.00**		**$ -**		**$ -**
ESTRUCTURAS Y DRENAJES															
20	11604	600.1.1	600-22		Excavaciones varias sin clasificar	m3	10,390.00	$ 25,170.00	$ 261,516,300.00	12,369.00	$ 311,327,730.00	9.90	$ 249,183.00	2614.10	$ 65,796,897.00
21	11601	600.2.4	600-22		Excavaciones varias en material comun bajo agua	m3	1,039.00	$ 59,656.00	$ 61,982,584.00	11,081.70	$ 661,089,895.00	0.00	$ -	6807.00	$ 406,078,392.00
22	11604	610.1	610-22		Rellenos para Estructuras con suelo	m3	2,078.00	$ 38,696.00	$ 80,410,288.00	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
23	11604	610.2	610-22		Reellenos para Estructuras con recebo	m3	52,672.00	$ 102,000.00	$ 5,372,544,000.00	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
24	11604	610.3	610-22		Rellenos para estructuras con material granular tipo SBG.	m3	3,117.00	$ 165,162.00	$ 514,809,954.00	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
25	14103	621.1.4P		621.1.4P	Pilote en concreto de 35 Mpa de diametro D=2,50 m. Incluye excavación con piloteadora tipo Kelly, camisa no recuperable en acero de D=250 cm y e = 3/8"(9,5mm). No incluye acero de refuerzo.	m	1,334.00	$ 7,250,000.00	$ 9,671,500,000.00	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
26	14103	630.1.P		630.1.P	Concreto clase 42 MPA, para viga cajon voladizos de puentes	m3	2,014.00	$ 2,000,000.00	$ 4,028,000,000.00	11,844.60	$ 23,689,200,000.00	0.00	$ -	0.00	$ -
27	14103	630.2.P		630.2.P	Concreto clase 42 MPA, para vigas preesforzadas lanzadas de puentes	m3	8,054.00	$ 1,900,000.00	$ 15,302,600,000.00	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
28	14103	630.1.1P		630.1.1P	Concreto clase 35 MPA, para vigas puentes tipo 1.	m3	1,882.00	$ 1,300,000.00	$ 2,446,600,000.00	428.40	$ 556,920,000.00	0.00	$ -	0.00	$ -
29	14103	630.1.2P		630.1.2P	Concreto clase 35 MPA, para pilas de puentes	m3	14,354.00	$ 1,320,000.00	$ 18,947,280,000.00	176.20	$ 232,584,000.00	0.00	$ -	0.00	$ -
30	14103	630.3.1P		630.3.1P	Concreto clase 35 MPA para Zapatas, Estribos, Aletas, dados y placas	m3	10,120.00	$ 1,100,000.00	$ 11,132,000,000.00	2,791.60	$ 3,070,760,000.00	0.00	$ -	0.00	$ -
31	14103	630.3.4P		630.3.4P	Concreto clase 35 MPA para tablero y anden	m3	936.00	$ 1,254,299.00	$ 1,174,023,864.00	476.60	$ 597,798,903.00	0.00	$ -	0.00	$ -
32	14103	630.3.5P		630.3.5P	Concreto clase 28 MPA para Zapatas, Estribos, Aletas, dados y placas	m3	254.00	$ 1,010,000.00	$ 256,540,000.00	7,270.50	$ 7,343,205,000.00	20.60	$ 20,806,000.00	943.80	$ 953,238,000.00
33	11604	630.4	630-22		Concreto clase 21 MPA	m3	847.00	$ 720,000.00	$ 609,840,000.00	719.70	$ 518,184,000.00	0.00	$ -	0.00	$ -
34	11604	630.6	630-22		Concreto clase 14 MPA	m3	169.00	$ 509,329.00	$ 86,076,601.00	1,515.20	$ 771,735,301.00	0.40	$ 203,732.00	62.80	$ 31,985,865.00
35	16.5-106	632.1P		632.1P	Baranda Metalica	m	3,041.00	$ 665,000.00	$ 2,022,265,000.00	3,190.60	$ 2,121,749,000.00	0.00	$ -	0.00	$ -
36	16.5-106	640.1	640-22		Acero de refuerzo Fy=420 Mpa.	kg	7,427,664.00	$ 6,752.00	$ 50,151,587,328.00	4,522,519.00	$ 30,536,048,288.00	51,733.00	$ 349,301,216.00	99138.00	$ 669,379,776.00
37	16.5-106	641.1	641-22		Acero de Preesfuerzo	Tf-m	4,228,628.00	$ 2,426.00	$ 10,258,651,528.00	8,947,060.00	$ 21,705,567,560.00	0.00	$ -	0.00	$ -
38	14103	642.1	642-22		Apoyo elastomérico de neopreno, dureza 60 (60x60x5cm con 2 platinas)	u	64.00	$ 723,081.00	$ 46,277,184.00	77.00	$ 55,677,237.00	0.00	$ -	0.00	$ -
39	14103	642.2	642-22		Sello para juntas para puentes (Suministro e instalación de junta de dilatación Tablero-Estribo A=5cm, en ángulo 4"x4"x3/8". Incluye lleno de junta en Sikaflex y banda SIKA OVC O-22 o equivalentes)	m	120.00	$ 372,145.00	$ 44,657,400.00	427.80	$ 159,203,631.00	0.00	$ -	0.00	$ -
40	11604	661.1	661-22		Tubería de Concreto Reforzado CLASE III, de 900mm de diámetro interior	m	1,724.00	$ 670,000.00	$ 1,155,080,000.00	1,896.00	$ 1,270,320,000.00	0.00	$ -	426.10	$ 285,487,000.00
41	11604	671.1	671-22		Cuneta de concreto vaciada insitu, no incluye la conformacion de la superficie de apoyo	m3	6,250.00	$ 560,000.00	$ 3,500,000,000.00	7,167.40	$ 4,013,744,000.00	0.00	$ -	0.00	$ -
42	11604	673.1	673-22		Geotextil Tipo II no tejido	m2	126.00	$ 7,777.00	$ 979,902.00	172,705.00	$ 1,343,126,785.00	2,085.00	$ 16,215,045.00	40629.90	$ 315,978,733.00
43	11604	673.2	673-22		Material granular drenante	m3	1,230.00	$ 122,801.00	$ 151,045,230.00	13,121.00	$ 1,611,271,921.00	0.00	$ -	745.00	$ 91,486,745.00
44	11604	673.3	673-22		Material de cobertura tipo SBG	m3	560.00	$ 172,304.00	$ 96,490,240.00	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
45	11606	683.4P		683.4P	Muro en suelo mecánicamente estabilizado en malla hexagonal doble torsión, alambre con recubrimiento 90Zn10Al revestido . Rellenos y conformación realizados mecanicamente y armados manualmente. Incluye transporte.	m2	12,184.00	$ 440,000.00	$ 5,360,960,000.00	30,558.20	$ 13,445,607,943.00	0.00	$ -	0.00	$ -
Subtotal									**$ 142,733,717,403.00**		**$ 114,015,121,194.00**		**$ 386,775,176.00**		**$ 2,819,431,408.00**
SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD															
46	11607	1P		MSV-2015	Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para líneas de demarcación de pavimentos	m	218,321.00	$ 1,989.00	$ 434,240,469.00	95,423.90	$ 189,798,137.00	0.00	$ -	0.00	$ -
47	11607	2P		MSV-2015	Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para marca Vial con pintura en frío	m2	1,160.00	$ 24,098.00	$ 27,953,680.00	1,568.00	$ 37,785,735.00	0.00	$ -	0.00	$ -
48	11607	4P		MSV-2015	Suministro e instalación de tachas reflectiva bidireccionales	u	44,212.00	$ 8,377.00	$ 370,363,924.00	18,793.00	$ 157,428,961.00	0.00	$ -	0.00	$ -
49	11607	5P		MSV-2015	Suministro e instalación de señal vertical de transito sp, sr y si (75cm*75cm) con lamina acero galvanizado retroreflectiva	u	244.00	$ 399,456.00	$ 97,467,264.00	264.00	$ 105,456,384.00	0.00	$ -	16.00	$ 6,391,296.00
50	16.5-106	730.1	730-22		Defensa metalica	m	3,214.00	$ 233,492.00	$ 750,443,288.00	1,800.00	$ 420,285,600.00	0.00	$ -	0.00	$ -
51	16.5-106	730.2	730-22		Sección final	u	84.00	$ 103,783.00	$ 8,717,772.00	60.00	$ 6,226,980.00	0.00	$ -	0.00	$ -
52	11607	740.1	740-22		Captafaros	u	7,498.00	$ 22,154.00	$ 166,110,692.00	3,470.00	$ 76,874,380.00	0.00	$ -	0.00	$ -
Subtotal									**$ 1,855,297,089.00**		**$ 993,856,177.00**		**$ -**		**$ 6,391,296.00**
OBRAS VARIAS															
53	11606	810.1	810-22		Protección de Taludes con bloques de césped	m2	144,000.00	$ 17,900	$ 2,577,600,000.00	48,491.00	$ 867,988,900.00	0.00	$ -	0.00	$ -
Subtotal									**$ 2,577,600,000.00**		**$ 867,988,900.00**		**$ -**		**$ -**
TRANSPORTES															
54	11608	900.2	900-22		Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y préstamos para distancias mayores de mil metros (1000 m), medido a partir de cien metros (100 m)	m3-km	7,144,729.00	$ 1,060	$ 7,573,412,740.00	1,589,200.90	$ 1,684,552,954.00	0.00	$ -	62525.80	$ 66,277,348.00
Subtotal									**$ 7,573,412,740.00**		**$ 1,684,552,954.00**		**$ -**		**$ 66,277,348.00**
ITEMS NO PREVISTOS															
55	11603	500.1	500-22		PAVIMENTO EN CONCRETO HIDRÁULICO MR-45 (Sector Putumayo)	m3		$ 1,101,441.00	$ -	37,930.00	$ 41,777,657,130.00	0.00	$ -	0.00	$ -
56	14103	NP-05			SUMINISTRO E INSTALACIÓN BARRA DE ALTA RESISTENCIA TIPO Y1035 DIAMETRO=57 mm L=5.05 m c/u o similar (Apoyo Temporal)	u		$ 8,156,902.00	$ -	320.00	$ 2,610,208,640.00	0.00	$ -	0.00	$ -
57	14103	NP-06			JUNTA ELASTOMÉRICA SISMICA DE DILATACIÓN DE MOVIMIENTO 600 (±300) TIPO 1 o similar PARA PILA 2 Y EJE 12 (suministro)	m		$ 31,499,390.00	$ -	22.80	$ 718,186,092.00	0.00	$ -	0.00	$ -
58	14103	NP-07			JUNTA T-250 PARA ESTRIBOS 1 y 2 o similar (suministro)	m		$ 15,057,059.00	$ -	22.80	$ 343,300,945.00	0.00	$ -	0.00	$ -
59	14103	NP-08			JUNTA ELASTOMERICA SISMICA DE DILATACION DE MOVIMIENTO 800 (±400) TIPO 3 o similar PARA PILA 6 (suministro)	m		$ 36,175,223.00	$ -	11.40	$ 412,397,542.00	0.00	$ -	0.00	$ -
60	14103	621.1P			PILOTE DE CONCRETO VACIADO IN SITU DE 35 MPA, DIÁMETRO Ø = 1.80 m. INCLUYE EXCAVACIÓN, (NO INCLUYE CAMISA NO RECUPERABLE. NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO.)	m		$ 6,212,436.00	$ -	2,084.00	$ 12,946,716,624.00	0.00	$ -	0.00	$ -
61	14103	621.5P			CAMISA PERMANENTE DE DÍAMETRO 1.80 m (en acero A-36; e= 15mm)	m		$ 14,963,102.00	$ -	1,320.00	$ 19,751,294,640.00	126.00	$ 1,885,350,852.00	256.50	$ 3,838,035,663.00
62	14103	NP-09			AISLADOR DE PÉNDULO FRICCIONAL TIPO 1 FPS PUENTE 1 (Pila 3-4-5) o similar	u		$ 240,175,334.00	$ -	6.00	$ 1,441,052,004.00	0.00	$ -	0.00	$ -
63	14103	NP-10			AISLADOR DE PÉNDULO FRICCIONAL TIPO 2 FPS Puente 2 (Pila 7-8-9-10-11) o similar	u		$ 396,887,878.00	$ -	10.00	$ 3,968,878,780.00	0.00	$ -	0.00	$ -
64	14103	642.1.1			APOYO ELASTOMÉRICO HDRB-H 500X107 (Vigas Postensadas) o similar	u		$ 41,366,523.00	$ -	34.00	$ 1,406,461,782.00	0.00	$ -	0.00	$ -
65	14103	642.1.2			APOYO ELASTOMÉRICO HDRB-H 930X163 (Pilas 2-6-12) o similar	u		$ 154,812,009.00	$ -	8.00	$ 1,238,496,072.00	0.00	$ -	0.00	$ -
66	11601	800.5			CERCA DE ALAMBRE DE PÚAS CON POSTES DE PLASTICO CON (4 HILOS)	m		$ 39,679.00	$ -	56,000.00	$ 2,222,024,000.00	0.00	$ -	2,877.00	$ 114,156,483.00
67	11601	201.16			REMOCIÓN DE CERCAS DE ALAMBRE (Incluye traslado)	m		$ 6,174.00	$ -	56,000.00	$ 345,744,000.00	0.00	$ -	8,164.00	$ 50,404,536.00
68	11601	201.15			REMOCIÓN DE ALCANTARILLAS	m		$ 134,575.00	$ -	1,377.00	$ 185,309,775.00	0.00	$ -	259.00	$ 34,854,925.00
69	11608	900.1			TRANSPORTE DE MATERIALES PROVENIENTES DE LA EXCAVACIÓN DE LA EXPLANACIÓN, CANALES Y PRÉSTAMOS, ENTRE CIEN METROS(100 M) Y MIL METROS(1.000 M) DE DISTANCIA.	m3-E		$ 1,889.00	$ -	66,600.00	$ 125,807,400.00	0.00	$ -	36,092.70	$ 68,179,111.00
70	11604	NP-01			Cinta PVC V15 o similar	m		$ 68,117.00	$ -	1,590.00	$ 108,306,030.00	14.90	$ 1,014,943.00	216.30	$ 14,733,707.00
71	11604	NP-02			Tubería perforada PVC, ASTM D 1785, de Diámetro 100 mm (4") o similar	m		$ 24,478.00	$ -	15,365.00	$ 376,104,470.00	0.00	$ -	1,012.20	$ 24,776,632.00
72	11604	NP-03			Tubería perforada PVC, ASTM D 1785, de Diámetro 200 mm (8") o similar	m		$ 70,616.00	$ -	3,215.00	$ 227,030,440.00	0.00	$ -	0.00	$ -
73	11601	NP-11			HUMECTACION DE VIA (Consumo Agua = 0.4 l/m2 - Lado Putumayo)	Día		$ 3,203,366.00	$ -	250.00	$ 800,841,500.00	21.90	$ 70,153,715.00	33.30	$ 106,672,087.00
Subtotal									**$ -**		**$ 91,005,817,866.00**		**$ 1,956,519,510.00**		**$ 4,251,813,144.00**

Concepto	Condiciones iniciales	Condiciones actualizadas	Presente acta	Acumulado
SUBTOTAL BASICO DE OBRAS (A)	$ 272,686,149,666.00	$ 272,686,149,666.00	$ 2,643,475,447.00	$ 22,646,570,380.00
PROVISIÓN PARA AJUSTES, USO DE OPCIÓN, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES (B)	$ 31,859,511,698.00	$ 31,859,511,698.00	$ -	$ 2,377,207,292.00
PROVISIÓN PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA (C)	$ 300,000,000.00	$ 300,000,000.00	$ -	$ -
VALOR BASICO DEL CONTRATO INCLUYE OBRAS COMPLEMENTARIAS Y AJUSTES D=(A+B+C)	$ 304,845,661,364.00	$ 304,845,661,364.00	$ 2,643,475,447.00	$ 25,023,777,672.00
VALOR IVA (OBRA) (19% SOBRE UTILIDAD OBRA) (E)	$ 1,992,706,478.00	$ 1,992,706,478.00	$ 19,317,705.00	$ 165,494,169.00
VALOR IVA (ACTAS DE AJUSTE) (19% SOBRE UTILIDAD OBRA) (F)	$ 232,819,509.00	$ 232,819,509.00	$ -	$ 17,412,101.00
VALOR IVA (JORNADAS 24 HORAS (19% SOBRE UTILIDAD OBRA) (G)	$ 2,192,308.00	$ 2,192,308.00	$ -	$ -
SUBTOTAL OBRAS (INCLUYE IVA) H=(D+E+F+G)	**$ 307,073,379,659.00**	**$ 307,073,379,659.00**	**$ 2,662,793,152.00**	**$ 25,206,683,942.00**
REVISIÓN Y/O AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O INCORPORACIÓN Y/U OPTIMIZACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS A FASE III. (I)	$ 3,340,000,000.00	$ 3,340,000,000.00	$ -	$ 3,088,681,864.00
IVA - REVISION Y/O AJUSTE Y/O ACTUALIZACION Y/O MODIFICACION Y/O INCORPORACION Y/U OPTIMIZACION Y/O COMPLEMENTACION DE LOS ESTUDIOS Y DISENOS A FASE III. J = (I * 19%)	$ 634,600,000.00	$ 634,600,000.00	$ -	$ 586,849,554.00
TOTAL REVISION Y/O AJUSTE Y/O ACTUALIZACION Y/O MODIFICACION Y/O INCORPORACION Y/U OPTIMIZACION Y/O COMPLEMENTACION DE LOS ESTUDIOS Y DISENOS A FASE III. K =(I+J)	**$ 3,974,600,000.00**	**$ 3,974,600,000.00**	**$ -**	**$ 3,675,531,418.00**
TOTAL GESTIÓN SOCIAL , PREDIAL , AMBIENTAL Y SOSTENIBILIDAD (Incluye EIA,PAGA e IVA19%) (L)	**$ 7,814,781,342.00**	**$ 7,814,781,342.00**	**$ -**	**$ 28,605,220.00**
VALOR BASICO PROVISION PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19 = (M)	$ 501,675,164.00	$ 501,675,164.00	$ -	$ -
VALOR IVA (PROVISION PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19)= (O)	$ 2,324,836.00	$ 2,324,836.00	$ -	$ -
TOTAL PROVISION PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19 (INCLUYE IVA) P = (M+O)	**$ 504,000,000.00**	**$ 504,000,000.00**	**$ -**	**$ -**
TOTAL BASICO ACTA. Q = (D+I+M)	$ 308,687,336,528.00	$ 308,687,336,528.00	$ 2,643,475,447.00	$ 28,112,459,536.00
TOTAL IVA ACTA. R = (E+F+G+J+O)	$ 2,864,643,131.00	$ 2,864,643,131.00	$ 19,317,705.00	$ 769,755,824.00
VALOR TOTAL. S = (H+K+L+P)	**$ 319,366,761,001.00**	**$ 319,366,761,001.00**	**$ 2,662,793,152.00**	**$ 28,910,820,580.00**

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contratual.

AIU 30 %
Utilidad 5 %

	Valor	%
Valor Anticipo Otorgado	$ 15,000,000,000.00	100.00%
Valor Amortizado Presenta Acta	$ 134,132,685.00	0.89%
Valor Amortizado Acumulado	**$ 260,984,236.00**	**1.74%**
Valor Saldo por Amortizar	**$ 14,739,015,764.00**	**98.26%**

RESUMEN PRESENTE MES PARA PAGO

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada sin incluir ajustes.

	VALOR BÁSICO PRESENTE MES	IVA	TOTAL PRESENTE MES
OBRA	$ 2,643,475,447.00	$ 19,317,705.00	$ 2,662,793,152.00
PROVISIÓN PARA AJUSTES, USO DE OPCIÓN, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES	$ -	$ -	$ -
PROVISIÓN PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA	$ -	$ -	$ -
ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ -	$ -	$ -
GESTIÓN PREDIAL (PREACTA)	$ -	$ -	$ -
GESTIÓN SOCIAL (PREACTA)	$ -	$ -	$ -
GESTIÓN AMBIENTAL (PREACTA)	$ -	$ -	$ -
PROVISION PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD	$ -	$ -	$ -
VALOR TOTAL PRESENTE MES	$ 2,643,475,447.00	$ 19,317,705.00	$ 2,662,793,152.00

RESUMEN GRANDES PARTIDAS DE PAGO (si aplica)

G.P.P.	VALOR PRESENTE ACTA	VR. ACUMULADO
E	$ 518,000.00	$ 3,209,330,277.00
SB	$ 299,662,761.00	$ 12,328,181,832.00
B	$ -	$ -
P	$ -	$ -
OA	$ 2,273,140,971.00	$ 6,696,977,410.00
SCT	$ -	$ 6,391,296.00
OV	$ 70,153,715.00	$ 271,233,106.00
T	$ -	$ 134,456,459.00
TOTAL	$ 2,643,475,447.00	$ 22,646,570,380.00

RESUMEN GRUPOS DE AJUSTE (si aplica) ICOCIV

* Debe corresponder con los grupos de ajuste señalados por el DANE.

GRUPOS	VALOR PRESENTE ACTA	VALOR ACUMULADO
11601. Preliminares y explanacion	$ 70,153,715.00	$ 1,020,325,775.00
11602. Afirmados, subbases y bases	$ 300,180,761.00	$ 15,194,497,832.00
11603. Pavimentos asfalticos / Concreto	$ -	$ -
11604. Estructuras hidráulicas y drenajes	$ 17,682,903.00	$ 830,245,579.00
11606. Obras geotécnicas y mitigación ambiental	$ -	$ -
11607. Señalización y control de transito	$ -	$ 6,391,296.00
11608. Transporte y sobre acarreos	$ -	$ 134,456,459.00
14103. Estructura, subestructura, superestructura, y andenes	$ 2,255,458,068.00	$ 5,460,653,439.00
(N) Ítems no sujetos a ajuste	$ -	$ 5,465,889,156.00
TOTAL	$ 2,643,475,447.00	$ 28,112,459,536.00

VALOR BÁSICO PRESENTE MES SIN AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO: $ 2,643,475,447.00
VALOR BÁSICO PRESENTE MES CON AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO: $ 2,509,342,762.00

VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA: $ 2,528,660,467.00 (Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo)

VALOR EN LETRAS: DOS MIL QUINIENTOS VEINTIOCHO MILLONES SEISCIENTOS SESENTA MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS M/CTE

El recibo por parte de la Interventoría de las obras ejecutadas no exime al Contratista de su responsabilidad y de las obligaciones a que hace referencia el contrato de obra.

OBSERVACIONES

NOTAS:
1. Si por efecto de la suspensión en la ejecución del contrato o del cambio de Interventor se hace necesario tramitar dos actas correspondientes a un mismo mes, la segunda acta se numera con el número que corresponda a la primera acta del periodo seguida de la letra A, situación que debe indicarse en el campo de "Observaciones" del presente formato.
2. El Interventor certifica que revisó y verificó el pago de la Seguridad Social y Aportes de Ley por parte del Contratista, con base en los soportes presentados por éste y el cumplimiento por parte del Contratista de la normatividad vigente relacionada con la nómina electrónica cuando aplique.
3. El Interventor y el Contratista asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información, los valores, así como por las operaciones aritméticas contenidas en esta Acta.
4. El pago de la presente acta se realizará con base en el principio de confiabilidad y responsabilidad con la que la Interventoría y el Contratista realizan las mediciones en campo y las revisiones efectuadas por parte de la interventoría, que deben corresponder con las calculadas en las pre-actas respectivas (Obra, Estudios y Diseños, Ambiental, Social, Predial, Sostenibilidad, Mantenimiento Rutinario, Operación y las demás pre-actas que sean requeridas).
5. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor y el Contratista certifican que las obras recibidas cumplen con los requerimientos de calidad, con las normas, especificaciones generales y particulares de construcción y demás condiciones contractuales, de acuerdo con los diseños, planos y especificaciones estipuladas para el proyecto.
6. El valor a pagar en la presente Acta debe coincidir con el valor consignado en la factura presentada por el Contratista después de amortizar el anticipo cuando sea del caso.
7. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor deja constancia de que el Contratista cumplió la normatividad y gestión ambiental, calidad de los materiales y el PMT.
8. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor y el Contratista certifican que han verificado cuales de las actividades de la licencia ambiental y/o P.A.G.A. se encuentran inmersas dentro de los ítems de obra o costos administrativos, de tal manera que estas no serán reconocidas con el valor de las provisiones establecidas en el contrato.

Para constancia de lo anterior firman

Firma:
Nombre : JORGE EDUARDO [illegible] RODRIGUEZ
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
CONTRATISTA.: CONSORCIO VIAS COLOMBIA 055
Matricula Profesional No.: 215422 CSJ

Firma:
Nombre: JORGE ALVARO [illegible] BLANCO
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
INTERVENTORÍA: CONSORCIO VIAL JAC 2022
Matricula profesional: [illegible] CND

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE **AFECTACION PRESUPUESTAL DE OBLIGACIONES**	CÓDIGO	AFINCO-FR-12	
		VERSIÓN	1	
		PÁGINA	1 DE 1	

CONTRATO N°: 985 de 2022

		%	**TIPO PAGO:**		NUMERO DE ACTA O CUENTA DE COBRO	PERIODO
ANTICIPO			ACTA DE OBRA	X	No. 25	1 al 31 de julio
PAGO ANTICIPADO			ACTA DE INTERVENTORIA			
			ACTA DE AJUSTE			
DESEMBOLSO			PRESTACION DE SERVICIOS			
			OTRO			
			CUAL?			

RECURSO PRESUPUESTAL : Registre el No. de Recurso Presupuestal que financia el proyecto.
(Consulte la información en el Registro Presupuestal del Contrato)

No. COMPROMISO **240324** RUBRO No. **C-2401-0600-132-51102D-2401008-02** RECURSO No. **11** VALOR AFECTADO $ 2,528,660,467.00

TOTAL ACTA **$ 2,528,660,467.00**

JOSE RICARDO BURBANO BARCENAS
Firmado digitalmente por JOSE RICARDO BURBANO BARCENAS
Fecha: 2024.08.13 06:55:42 -05'00'

SUPERVISOR DE CONTRATO DE INTERVENTORIA
NOMBRE: JOSÉ RICARDO BURBANO BARCENAS
Matricula profesional No. : 52202-46096 NRÑ

Formulado RP240324;11;2528660467
Texto Libre SMCN-GRUPO SUR OCCIDENTE- ACTA DE OBRA 25 CONT 985 CONSORCIO VIAS COLOMBIA 055 NIT: 901584893-4
Asunto **SMCN-GRUPO SUR OCCIDENTE- ACTA DE OBRA 25 CONT 985 CONSORCIO VIAS COLOMBIA 055 NIT: 901584893-4RP240324;11;2528660467**

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE **IDENTIFICACION DE EJECUCION CONTRACTUAL**	CÓDIGO	AFINCO-FR-13		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	1	DE	1

Contrato N° 985 de 2022 Contratista CONSORCIO VÍAS COLOMBIA 055

Objeto del Contrato MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA VILLAGARZON - SAN JOSE DEL FRAGUA Y PUENTE SOBRE EL RIO CAQUETA EN LOS DEPARTAMENTOS DE PUTUMAYO, CAUCA Y CAQUETA EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA VIAS PARA LA CONEXION DE TERRITORIOS, EL CRECIMIENTO SOSTENIBLE Y LA REACTIVACIÓN 2.0

Acta N° **25** Valor basico $ **$ 2,643,475,447.00** Período: 1 al 31 de julio

Valor Incluido Iva $ **$ 2,662,793,152.00**

VALOR DISCRIMINADO POR VIAS Y TIPO DE OBRAS:

Item	Ruta (codigo vía)	Denominación (Carretera - Puente-Tunel)	Valor incluido IVA (Construcción, Rehabilitación, Mejoramiento)	Valor incluido IVA Estudios diseños	Valor incluido IVA (Mantenimiento y/o Conservación)	Subtotal
1	65-01	CARRETERA	$ 274,151,043.00	$ -	$ 148,215,506.00	$ 422,366,549.00
2	65-01	PUENTE	$ 2,240,426,603.00	$ -	$ -	$ 2,240,426,603.00
3	65-01	ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ -		$ -	$ -
		TOTALES	**$ 2,514,577,646.00**	**$ -**	**$ 148,215,506.00**	**$ 2,662,793,152.00**

VALOR DISCRIMINADO POR DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS

NIT	DEPARTAMENTO (PUTUMAYO)		VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
800054249-0	VILLAGARZON	MANTENIMIENTO	$ 75,942,861.00	$ 75,391,920.00
800054249-0	VILLAGARZON	MEJORAMIENTO	$ 233,154,168.00	$ 231,462,710.00
8000102891-6	MOCOA	MANTENIMIENTO	$ 3,142,096.00	$ 3,119,301.00
8000102891-6	MOCOA	MEJORAMIENTO	$ 7,056,402.00	$ 7,005,210.00
800222489-2	PUERTO GUZMAN	MANTENIMIENTO	$ 69,152,738.00	$ 68,651,057.00
800222489-2	PUERTO GUZMAN	MEJORAMIENTO	$ 2,274,344,887.00	$ 2,257,845,249.00
	TOTAL DEPARTAMENTO (PUTUMAYO)		**$ 2,662,793,152.00**	**$ 2,643,475,447.00**

NIT	DEPARTAMENTO (CAUCA)	VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
	TOTAL DEPARTAMENTO (CAUCA)	**$ -**	**$ -**

NIT	DEPARTAMENTO (CAQUETA)	VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
	TOTAL DEPARTAMENTO (CAQUETA)	**$ -**	**$ -**

JORGE EDUARDO DUARTE RODRIGUEZ
Representante Legal
CONTRATISTA.: CONSORCIO VIAS COLOMBIA 065
cc. 1015396432

JORGE ÁLVARO SÁNCHEZ BLANCO
Representante Legal
INTERVENTOR.: CONSORCIO JAC VIAL 2022
cc. 79.785.874

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-N-15-FR-8
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1

FECHA: 31/07/2024

UNIDAD EJECUTORA: SIMCN-GRUPO SUR OCCIDENTE **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** PUTUMAYO

CONTRATO DE OBRA No: 985 de 2022 **CONTRATISTA:** CONSORCIO VÍAS COLOMBIA 055

MES INFORME MENSUAL: Julio-24 **PROYECTO:** Troncal Villagarzon - Saravena, Ruta 65 - Tramo 01

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 988 de 2022 **INTERVENTOR:** CONSORCIO VIAL JAC 2022

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO DE OBRA

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Contrato Principal / Adicional No.	Valor	Saldo del Acta Anterior
2022	585822	C-2401-0600-132-0-2401008-02	11	Nación	985 de 2022	$ 7,387,955,642.00	$ -
		C-2401-0600-132-0-2401023-02	11	Nación	985 de 2022	$ 79,593,413.00	$ -
2023	159623	C-2401-0600-132-0-2401008-02	11	Nación	985 de 2022	$ 4,818,364,735.00	$ -
		C-2401-0600-132-0-2401017-02	11	Nación	985 de 2022	$ 5,021,987,798.00	$ -
		C-2401-0600-132-0-2401023-02	11	Nación	985 de 2022	$ 84,276,679.00	$ -
2024	240324	C-2401-0600-132-51102D-2401023-02	11	Nación	985 de 2022	$ 203,749,724	$ -
		C-2401-0600-132-51102D-2401023-02	16	Nación	985 de 2022	$ 56,955,253	$ -
		C-2401-0600-132-51102D-2401008-02	11	Nación	985 de 2022	$ 15,124,971,919	$ 4,227,738,810.00
		C-2401-0600-132-51102D-2401017-02	11	Nación	985 de 2022	$ 798,403,983	$ -
		C-2401-0600-132-51102D-2401017-02	16	Nación	985 de 2022	$ 8,869,155,092	$ -
		C-2401-0600-132-51102D-2401008-02	16	Nación	985 de 2022	$ 6,123,163,678	$ 6,123,163,678.00
	377724	C-2401-0600-132-51102D-2401017-02	11	Nación	985 de 2022	$ 18,400,000,000	$ 12,867,559,095.00
		TOTAL				$ 66,868,297,887.00	$ 23,218,461,543.00

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: $ **319,366,761,001.00**

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

Acta No.	Tipo de Acta	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total Ejecutado Acumulado Acta	Anticipo Amortizado Acta	Valor Total Pagado Descontando Anticipo	Saldo Anticipo por Amortizar	No. de Registro y fecha	Saldo Registro Presupuestal	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Indicar pago según reporte SIIF SI	Indicar pago según reporte SIIF NO	Observaciones
									585822 de 2022-05-20	$ 7,467,559,055.00	$ 319,366,761,001.00				
1	Obra	**jul-22**	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	585822 de 2022-05-20	$ 7,467,559,055.00	$ 319,366,761,001.00	PCC2 de 11/23/2022			Registro Presupuestal No 585822 Fecha de Registro 2022-05-20, Rubro No C-2401-0600-132-0-2401023-02 Recurso:11
2	Obra	**ago-22**	$ 34,827,838.00	$ 253,050.00	$ 34,880,888.00	$ -	$ 34,880,888.00	$ -	585822 de 2022-05-20	$ 7,432,678,167.00	$ 319,331,880,113.00	PCC2 de 11/23/2022			Registro Presupuestal No 585822 Fecha de Registro 2022-05-20, Rubro No C-2401-0600-132-0-2401023-02 Recurso:11
3	Obra	**sep-22**	$ 429,513,302.00	$ 55,910,399.00	$ 485,424,321.00	$ -	$ 485,424,321.00	$ -	585822 de 2022-05-20	$ 6,947,253,846.00	$ 318,846,455,792.00	PCC3 de 11/23/2022			Registro Presupuestal No 585822 Fecha de Registro 2022-05-20, Rubro No C-2401-0600-132-0-2401023-02, Rubro No C-2401-0600-132-0-2401008-02. Recurso:11
4	Obra	**oct-22**	$ 194,738,517.00	$ 16,515,989.00	$ 211,254,506.00	$ -	$ 211,254,506.00	$ -	585822 de 2022-05-20	$ 6,735,999,340.00	$ 318,635,201,286.00	PCC4 de 12/07/2022			Registro Presupuestal No 585822 Fecha de Registro 2022-05-20, Rubro No C-2401-0600-132-0-2401008. Recurso:11
1D	Ajuste	**jul-22**	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	585822 de 2022-05-20	$ 6,735,999,340.00	$ 318,635,201,286.00	PCC8 de 12/19/2022			Registro Presupuestal No 585822 Fecha de Registro 2022-05-20, Rubro No C-2401-0600-132-0-2401008. Recurso:11
2D	Ajuste	**ago-22**	$ 907,942.00	$ 6,635.00	$ 914,577.00	$ -	$ 914,577.00	$ -	585822 de 2022-05-20	$ 6,735,084,763.00	$ 318,634,286,709.00	PCC8 de 12/19/2022			Registro Presupuestal No 585822 Fecha de Registro 2022-05-20, Rubro No C-2401-0600-132-0-2401008. Recurso:11
3D	Ajuste	**sep-22**	$ 3,942,661.00	$ 28,812.00	$ 3,971,473.00	$ -	$ 3,971,473.00	$ -	585822 de 2022-05-20	$ 6,731,113,290.00	$ 318,630,315,236.00	PCC9 de 12/19/2022			Registro Presupuestal No 585822 Fecha de Registro 2022-05-20, Rubro No C-2401-0600-132-0-2401008. Recurso:11
4D	Ajuste	**oct-22**	$ 4,189,281.00	$ 30,614.00	$ 4,219,895.00	$ -	$ 4,219,895.00	$ -	585822 de 2022-05-20	$ 6,726,893,395.00	$ 318,626,095,341.00	PCC10 de 12/20/2022			Registro Presupuestal No 585822 Fecha de Registro 2022-05-20, Rubro No C-2401-0600-132-0-2401008. Recurso:11
5	Obra	**nov-22**	$ 2,101,797,305.00	$ 113,303,348.00	$ 2,215,300,653.00	$ -	$ 2,215,300,653.00	$ -	585822 de 2022-05-20	$ 4,511,592,742.00	$ 316,410,794,688.00	PCC5 de 12/17/2022			Registro Presupuestal No 585822 Fecha de Registro 2022-05-20, Rubro No C-2401-0600-132-0-2401008. Recurso:11
SP	Ajuste	**nov-22**	$ 55,299,951.00	$ 404,115.00	$ 55,704,066.00	$ -	$ 55,704,066.00	$ -	585822 de 2022-05-20	$ 4,455,888,676.00	$ 316,355,090,622.00	PCC11 de 12/20/2022			Registro Presupuestal No 585822 Fecha de Registro 2022-05-20, Rubro No C-2401-0600-132-0-2401008. Recurso:11
6	Obra	**dic-22**	$ 3,969,824,318.00	$ 286,053,247.00	$ 4,255,877,565.00	$ -	$ 4,255,877,565.00	$ -	585822 de 2022-05-20	$ 200,011,111.00	$ 312,099,213,057.00	PCC6 de 12/17/2022			Registro Presupuestal No 585822 Fecha de Registro 2022-05-20, Rubro No C-2401-0600-132-0-2401008. Recurso:11
6P	Ajuste	**dic-22**	$ 88,930,870.00	$ 649,880.00	$ 89,580,850.00	$ -	$ 89,580,850.00	$ -	585822 de 2022-05-20	$ 110,430,261.00	$ 312,059,632,207.00	PCC12 de 12/20/2022			Registro Presupuestal No 585822 Fecha de Registro 2022-05-20, Rubro No C-2401-0600-132-0-2401008. Recurso:11
									159623 de 2023-02-17	$ 10,024,829,193.00					
7	Obra	**ene-23**	$ 489,097,323.00	$ 3,574,173.00	$ 492,671,496.00	$ -	$ 492,671,496	$ -	159623 de 2023-02-17	$ 9,642,387,958.00	$ 311,516,960,711.00	PCC16 de 23/03/2023			Registro Presupuestal No 585822 Fecha de Registro 2022-05-20, Rubro No C-2401-0600-132-0-2401008. Recurso:11. Registro Presupuestal No 159623 Fecha de Registro 2023-02-17, Rubro No C-2401-0600-132-0-2401023. Recurso:11. Registro Presupuestal No 159623 Fecha de Registro 2023-02-17, Rubro No C-2401-0600-132-0-2401008. Recurso:11.
8	Obra	**feb-23**	$ 537,260,607.00	$ 3,926,135.00	$ 541,186,742.00	$ -	$ 541,186,742	$ -	159623 de 2023-02-17	$ 9,101,201,216.00	$ 310,975,773,969.00	PCC17 de 23/03/2023			Registro Presupuestal No 159623 Fecha de Registro 2023-02-17, Rubro No C-2401-0600-132-0-2401008. Recurso:11.
7D	Ajuste	**ene-23**	$ 51,358,181.00	$ 375,310.00	$ 51,733,491.00	$ -	$ 51,733,491	$ -	159623 de 2023-02-17	$ 9,049,467,725.00	$ 310,924,040,478.00	PCC18 de 28/04/2023			Registro Presupuestal No 585822 Fecha de Registro 2022-05-20, Rubro No C-2401-0600-132-0-2401008. Recurso:11.Registro Presupuestal No 159623 Fecha de Registro 2023-02-17, Rubro No C-2401-0600-132-0-2401008. Recurso:11.
8D	Ajuste	**feb-23**	$ 51,451,517.00	$ 375,992.00	$ 51,827,509.00	$ -	$ 51,827,509	$ -	159623 de 2023-02-17	$ 8,997,640,216.00	$ 310,872,212,969.00	PCC19 de 28/04/2023			Registro Presupuestal No 159623 Fecha de Registro 2023-02-17, Rubro No C-2401-0600-132-0-2401008. Recurso:11.
9	Obra	**mar-23**	$ 872,255,617.00	$ 6,374,176.00	$ 878,629,793.00	$ -	$ 878,629,793	$ -	159623 de 2023-02-17	$ 8,119,010,423.00	$ 309,993,583,176.00	PCC20 de 28/04/2023			Registro Presupuestal No 159623 Fecha de Registro 2023-02-17, Rubro No C-2401-0600-132-0-2401008. Recurso:11.
9D	Ajuste	**mar-23**	$ 85,261,340.00	$ 623,064.00	$ 85,884,404.00	$ -	$ 85,884,404	$ -	159623 de 2023-02-17	$ 8,033,126,019.00	$ 309,907,698,772.00	PCC21 de 17/05/2023			Registro Presupuestal No 159623 Fecha de Registro 2023-02-17, Rubro No C-2401-0600-132-0-2401008. Recurso:11.
10	Obra	**abr-23**	$ 1,290,439,133.00	$ 9,430,132.00	$ 1,299,869,255.00	$ -	$ 1,299,869,255	$ -	159623 de 2023-02-17	$ 6,733,256,764.00	$ 308,607,829,517.00	PCC22 de 17/05/2023			Registro Presupuestal No 159623 Fecha de Registro 2023-02-17, Rubro No C-2401-0600-132-0-2401008. Recurso:11.
10D	Ajuste	**abr-23**	$ 165,952,133.00	$ 1,212,800.00	$ 167,174,933.00	$ -	$ 167,174,933	$ -	159623 de 2023-02-17	$ 6,568,081,831.00	$ 308,440,654,584.00	PCC23 de 19/07/2023			Registro Presupuestal No 159623 Fecha de Registro 2023-02-17, Rubro No C-2401-0600-132-0-2401008. Recurso:11.
11	Obra	**may-23**	$ 1,159,320,039.00	$ 8,471,954.00	$ 1,167,791,993.00	$ -	$ 1,167,791,993	$ -	159623 de 2023-02-17	$ 5,398,289,838.00	$ 307,272,862,591.00	PCC24 de 10/07/2023			Registro Presupuestal No 159623 Fecha de Registro 2023-02-17, Rubro No C-2401-0600-132-0-2401008. Recurso:11.
11D	Ajuste	**may-23**	$ 171,475,030.00	$ 1,253,087.00	$ 172,728,117.00	$ -	$ 172,728,117.00	$ -	159623 de 2023-02-17	$ 5,225,561,721.00	$ 307,100,134,474.00	PCC25 de 12/07/2023			Registro Presupuestal No 159623 Fecha de Registro 2023-02-17, Rubro No C-2401-0600-132-0-2401008. Recurso:11.
12	Obra	**jun-23**	$ 2,114,518,527.00	$ 15,452,251.00	$ 2,129,970,778.00	$ -	$ 2,129,970,778.00	$ -	159623 de 2023-02-17	$ 3,095,590,943.00	$ 304,970,163,696.00	PCC26 de 28/07/2023			Registro Presupuestal No 159623 Fecha de Registro 2023-02-17, Rubro No C-2401-0600-132-0-2401008. Recurso:11, Rubro No C-2401-0600-133-0-2401017-02. Recurso:11.
12D	Ajuste	**jun-23**	$ 327,710,229.00	$ 2,394,806.00	$ 330,105,035.00	$ -	$ 330,105,035.00	$ -	159623 de 2023-02-17	$ 2,765,485,908.00	$ 304,640,058,661.00	PCC28 de 20/09/2023			Registro Presupuestal No 159623 Fecha de Registro 2023-02-17, Rubro No C-2401-0600-132-0-2401017-02. Recurso:11.
13	Obra	**jul-23**	$ 1,073,344,848.00	$ 7,843,674.00	$ 1,081,188,522.00	$ -	$ 1,081,188,522.00	$ -	159623 de 2023-02-17	$ 1,684,297,386.00	$ 303,558,870,139.00	PCC27 de 30/08/2023			Registro Presupuestal No 159623 Fecha de Registro 2023-02-17, Rubro No C-2401-0600-132-0-2401017-02. Recurso:11.
13D	Ajuste	**jul-23**	$ 166,228,420.00	$ 1,214,746.00	$ 167,443,166.00	$ -	$ 167,443,166.00	$ -	159623 de 2023-02-17	$ 1,516,854,220.00	$ 303,391,426,973.00	PCC29 de 27/09/2023			Registro Presupuestal No 159623 Fecha de Registro 2023-02-17, Rubro No C-2401-0600-132-0-2401017-02. Recurso:11.
14	Obra	**ago-23**	$ 1,189,120,370.00	$ 8,729,926.00	$ 1,197,850,296.00	$ -	$ 1,197,850,296.00	$ -	159623 de 2023-02-17	$ 319,003,924.00	$ 302,193,576,677.00	PCC30 de 01/10/2024			Registro Presupuestal No 159623 Fecha de Registro 2023-02-17, Rubro No C-2401-0600-132-0-2401017-02. Recurso:11.
14D	Ajuste	**ago-23**	$ 150,725,469.00	$ 1,101,456.00	$ 151,826,955.00	$ -	$ 151,826,955.00	$ -	159623 de 2023-02-17	$ 167,176,969.00	$ 302,041,749,722.00	PCC31 de 25/10/2023			Registro Presupuestal No 159623 Fecha de Registro 2023-02-17, Rubro No C-2401-0600-132-0-2401017-02. Recurso:11.
15	Obra	**sep-23**	$ 144,458,120.00	$ 1,055,655.00	$ 145,513,775.00	$ -	$ 145,513,775.00	$ -	159623 de 2023-02-17	$ 21,663,194.00	$ 301,896,235,947.00	PCC32 de 25/10/2024			Registro Presupuestal No 159623 Fecha de Registro 2023-02-17, Rubro No C-2401-0600-132-0-2401017-02. Recurso:11.
15P	Ajuste	**sep-23**	$ 21,505,999.00	$ 157,159.00	$ 21,663,158.00	$ -	$ 21,663,158.00	$ -	159623 de 2023-02-17	$ 36.00	$ 301,874,572,789.00	PCC33 de 31/10/2024			Registro Presupuestal No 159623 Fecha de Registro 2023-02-17, Rubro No C-2401-0600-132-0-2401017-02. Recurso:11.
16	Obra	**oct-23**	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	159623 de 2023-02-17	$ 36.00	$ 301,874,572,789.00				Registro Presupuestal No 159623 Fecha de Registro 2023-02-17, Rubro No C-2401-0600-132-0-2401017-02. Recurso:11.
17	Obra	**nov-23**	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	159623 de 2023-02-17	$ 36.00	$ 301,874,572,789.00				Registro Presupuestal No 159623 Fecha de Registro 2023-02-17, Rubro No C-2401-0600-132-0-2401017-02. Recurso:11.
18	Obra	**dic-23**	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	159623 de 2023-02-17	$ 36.00	$ 301,874,572,789.00				Registro Presupuestal No 159623 Fecha de Registro 2023-02-17, Rubro No C-2401-0600-132-0-2401017-02. Recurso:11.
									240324 de 2024-03-20	$ 30,976,109,639.00					
19	obra	**ene-24**	$ 1,550,017,688.00	$ 121,882,423.00	$ 1,671,900,111.00	$ -	$ 1,671,900,111.00	$ -	240324 de 2024-03-20	$ 29,304,209,564.00	$ 300,202,672,678.00	PCC34 de 02/04/2024			Registro Presupuestal No 159623 Fecha de Registro 2023-02-17, Rubro No C-2401-0600-132-0-2401017-02. Recurso:11. Registro Presupuestal No 240324 Fecha de Registro 2024-03-20, Rubro No C-2401-0600-132-51102D-2401023-02. Recurso:11, Registro Presupuestal No 240324 Fecha de Registro 2024-03-20, Rubro No C-2401-0600-132-51102D-2401023-02. Recurso:16, Registro Presupuestal No 240324 Fecha de Registro 2024-03-20, Rubro No C-2401-0600-132-51102D-2401008-02. Recurso:11.
15D	Ajuste	**sep-23**	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	240324 de 2024-03-20	$ 29,304,209,564.00	$ 300,202,672,678.00				El Acta de Ajuste 15D negativa se ajusta dentro del Acta de Ajuste 19D
16D	Ajuste	**oct-23**	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	240324 de 2024-03-20	$ 29,304,209,564.00	$ 300,202,672,678.00				
17D	Ajuste	**nov-23**	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	240324 de 2024-03-20	$ 29,304,209,564.00	$ 300,202,672,678.00				
18D	Ajuste	**dic-23**	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	240324 de 2024-03-20	$ 29,304,209,564.00	$ 300,202,672,678.00				
19P	Ajuste	**ene-24**	$ 145,709,202.00	$ 1,064,798.00	$ 146,774,000.00	$ -	$ 146,774,000.00	$ -	240324 de 2024-03-20	$ 29,157,435,564.00	$ 300,055,898,678.00	PCC44 de 16/05/2024			Registro Presupuestal No 240324 Fecha de Registro 2024-03-20, Rubro No C-2401-0600-132-51102D-2401008-02. Recurso:11.
20	Obra	**feb-24**	$ 1,015,476,457.00	$ 7,420,789.00	$ 1,022,897,246.00	$ -	$ 1,022,897,246.00	$ -	240324 de 2024-03-20	$ 28,134,538,318.00	$ 299,033,001,432.00	PCC35 de 02/04/2024			Registro Presupuestal No 240324 Fecha de Registro 2024-03-20, Rubro No C-2401-0600-132-51102D-2401008-02. Recurso:11.
19D	Ajuste	**ene-24**	$ 26,047,766.00	$ 190,349.00	$ 26,238,115.00	$ -	$ 26,238,115.00	$ -	240324 de 2024-03-20	$ 28,108,300,203.00	$ 299,006,763,317.00	PCC40 de 07/05/2024			Registro Presupuestal No 240324 Fecha de Registro 2024-03-20, Rubro No C-2401-0600-132-51102D-2401008-02. Recurso:11. Se descontó Acta de Ajuste 15D con valores negativos
20P	Ajuste	**feb-24**	$ 191,870,693.00	$ 1,402,132.00	$ 193,272,825.00	$ -	$ 193,272,825.00	$ -	240324 de 2024-03-20	$ 27,915,027,378.00	$ 298,813,490,492.00	PCC41 de 07/05/2024			Registro Presupuestal No 240324 Fecha de Registro 2024-03-20, Rubro No C-2401-0600-132-51102D-2401008-02. Recurso:11.
21	Obra	**mar-24**	$ 752,230,866.00	$ 9,242,812.00	$ 761,473,678.00	$ -	$ 761,473,678.00	$ -	240324 de 2024-03-20	$ 27,153,553,700.00	$ 298,052,016,814.00	PCC38 de 23/04/2024			Registro Presupuestal No 240324 Fecha de Registro 2024-03-20, Rubro No C-2401-0600-132-51102D-2401008-02. Recurso:11.
20D	Ajuste	**feb-24**	$ 18,444,618.00	$ 134,788.00	$ 18,579,406.00	$ -	$ 18,579,406.00	$ -	240324 de 2024-03-20	$ 27,134,974,294.00	$ 298,033,437,408.00	PCC42 de 07/05/2024			Registro Presupuestal No 240324 Fecha de Registro 2024-03-20, Rubro No C-2401-0600-132-51102D-2401008-02. Recurso:11.
21P	Ajuste	**mar-24**	$ 152,747,467.00	$ 1,116,232.00	$ 153,863,719.00	$ -	$ 153,863,719.00	$ -	240324 de 2024-03-20	$ 26,981,110,575.00	$ 297,879,573,689.00	PCC43 de 07/05/2024			Registro Presupuestal No 240324 Fecha de Registro 2024-03-20, Rubro No C-2401-0600-132-51102D-2401008-02. Recurso:11.
22	Obra	**abr-24**	$ 747,526,952.00	$ 5,462,697.00	$ 752,989,649.00	$ -	$ 752,989,649.00		240324 de 2024-03-20	$ 26,228,120,926.00	$ 297,126,584,040.00	PCC45 de 27/05/2024			Registro Presupuestal No 240324 Fecha de Registro 2024-03-20, Rubro No C-2401-0600-132-51102D-2401008-02. Recurso:11.
21D	Ajuste	**mar-24**	$ 5,569,547.00	$ 40,700.00	$ 5,610,247.00	$ -	$ 5,610,247.00		240324 de 2024-03-20	$ 26,222,510,679.00	$ 297,120,973,793.00	PCC48 de 29/05/2024			Registro Presupuestal No 240324 Fecha de Registro 2024-03-20, Rubro No C-2401-0600-132-51102D-2401008-02. Recurso:11.
22P	Ajuste	**abr-24**	$ 160,895,520.00	$ 1,175,775.00	$ 162,071,295.00	$ -	$ 162,071,295.00		240324 de 2024-03-20	$ 26,060,439,384.00	$ 296,958,902,498.00	PCC49 de 14/06/2024			Registro Presupuestal No 240324 Fecha de Registro 2024-03-20, Rubro No C-2401-0600-132-51102D-2401008-02. Recurso:11.
									377724 de 2024-04-30	$ 18,400,000,000.00					
23	Obra	**may-24**	$ 1,087,608,451.00	$ 38,619,360.00	$ 1,126,227,811.00	$ -	$ 1,126,227,811.00	$ -	240324 de 2024-03-20	$ 43,334,211,573.00	$ 295,832,674,687.00	PCC50 de 25/05/2024			Registro Presupuestal No 240324 Fecha de Registro 2024-03-20, Rubro No C-2401-0600-132-51102D-2401008-02. Recurso:11.
22D	Ajuste	**abr-24**	$ 2,280,667.00	$ 16,666.00	$ 2,297,333.00	$ -	$ 2,297,333.00	$ -	240324 de 2024-03-20	$ 43,331,914,240.00	$ 295,830,377,354.00	PCC51 de 27/06/2024			Registro Presupuestal No 240324 Fecha de Registro 2024-03-20, Rubro No C-2401-0600-132-51102D-2401008-02. Recurso:11.
23P	Ajuste	**may-24**	$ 188,350,117.00	$ 1,376,405.00	$ 189,726,522.00	$ -	$ 189,726,522.00	$ -	240324 de 2024-03-20	$ 43,142,187,718.00	$ 295,640,650,832.00	PCC54 de 10/07/2024			Registro Presupuestal No 240324 Fecha de Registro 2024-03-20, Rubro No C-2401-0600-132-51102D-2401008-02. Recurso:11.
	Anticipo	**jun-24**	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 15,000,000,000.00	240324 de 2024-03-20	$ 28,142,187,718.00					Las afectaciones presupuestales del Anticipo fueron las siguientes: Registro Presupuestal No 240324 Fecha de Registro 2024-03-20, Rubro No C-2401-0600-132-51102D-2401017-02. Recurso:11 por $ 798,403,983 ; Registro Presupuestal No 240324 Fecha de Registro 2024-03-20, Rubro No C-2401-0600-132-51102D-2401008-02. Recurso:16, por $ 8,869,155,092 ; Registro Presupuestal No 377724 Fecha de Registro 2024-04-30, Rubro No C-2401-0600-132-51102D-2401008-02. Recurso:11, por $ 5,532,440,945
24	Obra	**jun-24**	$ 2,500,164,997.00	$ 18,916,254.00	$ 2,519,081,251.00	$ 126,851,551.00	$ 2,392,229,700.00	$ 14,873,148,449.00	240324 de 2024-03-20	$ 25,749,958,018.00	$ 293,121,569,581.00	PCC55 de 17/07/2024			Registro Presupuestal No 240324 Fecha de Registro 2024-03-20, Rubro No C-2401-0600-132-51102D-2401008-02. Recurso:11.
23D	Ajuste	**jun-24**	$ 2,815,434.00	$ 20,574.00	$ 2,836,008.00		$ 2,836,008.00		240324 de 2024-03-20	$ 25,747,122,010.00	$ 293,118,733,573.00				Registro Presupuestal No 240324 Fecha de Registro 2024-03-20, Rubro No C-2401-0600-132-51102D-2401008-02. Recurso:11.
25	Obra	**jul-24**	$ 2,643,475,447.00	$ 19,317,705.00	$ 2,662,793,152.00	$ 134,132,685.00	$ 2,528,660,467.00	$ 14,739,015,764.00	240324 de 2024-03-20	$ 23,218,461,543.00	$ 290,455,940,421.00				Registro Presupuestal No 240324 Fecha de Registro 2024-03-20, Rubro No C-2401-0600-132-51102D-2401008-02. Recurso:11.
TOTALES			**$ 28,136,497,536.00**	**$ 774,323,044.00**	**$ 28,910,820,580.00**	**$ 260,984,236.00**	**$ 28,649,836,344.00**	**$ 14,739,015,764.00**		**$ 23,218,461,543.00**	**$ 290,455,940,421.00**				

Todas las Actas aprobadas por la Interventoria deben relacionarse esten o no facturadas.

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO

	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL
OBRA	$ 22,645,570,380.00	$ 165,494,169.00	**$ 22,812,064,549.00**
OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES	$ 2,377,207,292.00	$ 17,412,101.00	**$ 2,394,619,393.00**
JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DÍAS DE LA SEMANA E ILUMINACIÓN	$ -	$ -	**$ -**
ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ 3,088,681,864.00	$ 586,849,554.00	**$ 3,675,531,418.00**
GESTIÓN PREDIAL, GESTIÓN SOCIAL Y GESTIÓN AMBIENTAL	$ 24,038,000.00	$ 4,567,220.00	**$ 28,605,220.00**
PROVISION PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19	$ -	$ -	**$ -**
VALOR TOTAL	**$ 28,136,497,536.00**	**$ 774,323,044.00**	**$ 28,910,820,580.00**

***Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.**

NOTA:
Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIF e incluir las aclaraciones pertinentes.

Firma
Nombre: RUBÉN DARÍO FUENTES PEÑA
Director de [redacted]
Matrícula Profesional No. 63202-62814QND

Firma [redacted]
NOMBRE: RAÚL ANTONIO PEREZ G.
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 25202-39452 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES

UNIDAD EJECUTORA: [illegible]

DIRECCIÓN TERRITORIAL: [illegible]

CONTRATO No: [illegible] 2022

OBJETO: [illegible]


CONTRATISTA: [illegible]

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: [illegible] 2022

INTERVENTOR: [illegible] 2022

[illegible]	97 MESES
[illegible]	26/07/2022
[illegible]	N.A.
[illegible] (A)	$ 319,366,761,001.00
[illegible] (C=A+B)	$ 319,366,761,001.00
[illegible]	97 MESES
[illegible]	31/07/2030
[illegible] (B)	$

GRANDES PARTIDAS DE PAGO (GPP)	VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA Miles de pesos / VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA Miles de pesos	(%) OBRA PROGRAMADA / (%) ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA	(%) EJECUTADO / VALOR TOTAL OBRA PROGRAMADA / VALOR OBRA EJECUTADA ACUMULADA Miles de pesos
VALOR BÁSICO DE OBRA (A)	272,686,149.666	[illegible]00.00	8.30
VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO (A')	272,686,149.666	[illegible]00.00	[illegible]22,6[illegible]6,570.38

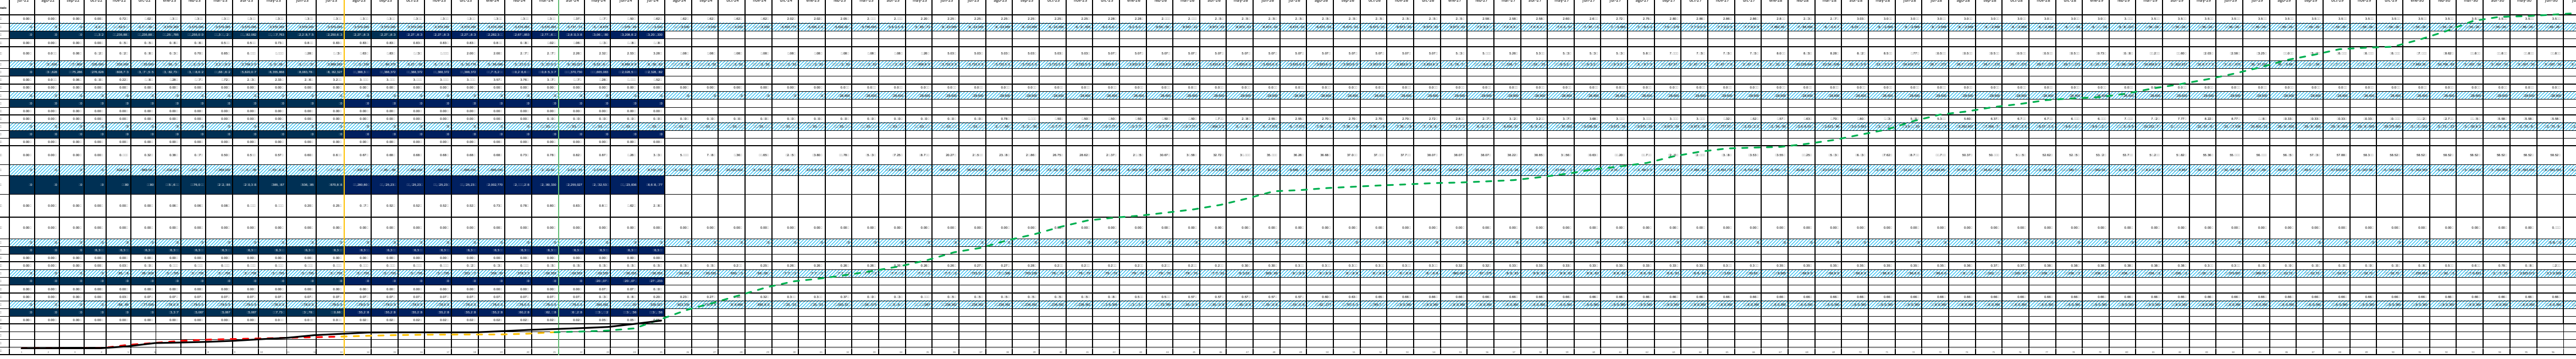

NOTAS SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES:

REPROGRAMACIÓN 1

REPROGRAMACIÓN 2

CONVENCIONES				
TIPO DE DIBUJO	PROGRAMADO	EJECUTADO	RE- PROGRAMACION 1	RE- PROGRAMACION 2
BARRAS				
CURVAS				

NOTA:

OBSERVACIONES:

PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS*	VALOR INICIAL / VALOR ACTUALIZADO	VALOR EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN
[illegible]	[illegible]	[illegible]2,377,207.2[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]300,000.00	[illegible]	0.00
VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO	$319,366,761,001.00		
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO (CONTRATO)	$319,366,761,001.00	$ 26,813,000,000.00	8.4%

UNIDAD EJECUTORA: SMCN-GRUPO ORIENTE **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** PUTUMAYO

PROGRAMA DE INVERSIONES:

REPROGRAMACIÓN PROGRAMA DE INVERSIONES No. 2 (Se debe llevar de forma consecutiva la numeración)

OBJETO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA VILLAGARZON - SAN JOSE DEL FRAGUA Y PUENTE SOBRE EL RIO CAQUETA EN LOS DEPARTAMENTOS DE PUTUMAYO, CAUCA Y CAQUETA EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA VIAS PARA LA CONEXION DE TERRITORIOS, EL CRECIMIENTO SOSTENIBLE Y LA REACTIVACIÓN 2.0

CONTRATISTA: CONSORCIO VÍAS COLOMBIA 055

CONTRATO DE INTERVENTORÍA: 988 de 2022 **INTERVENTOR:** CONSORCIO VIAL JAC 2022

PLAZO INICIAL:	97 MESES (En meses según contrato principal)
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO:	26/07/2022 (Indique día/mes/año)
FECHA DE SUSPENSIÓN:	N.A (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)
VALOR INICIAL (incluido IVA) (A):	$ 319,366,761,001.00 (Según contrato principal)
VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):	$ 319,366,761,001.00
PLAZO ACUMULADO:	97 MESES (En meses según las prórrogas sin suspensiones)
FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:	31/07/2030 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)
FECHA DE REANUDACIÓN:	(Indique día/mes/año)
VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B):	$ -

GRANDES PARTIDAS DE PAGO (GPP)	VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA Miles de pesos / VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA Miles de pesos	(%) OBRA PROGRAMADA / (%) ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA	(%) EJECUTADO / VALOR TOTAL OBRA PROGRAMADA / VALOR OBRA EJECUTADA ACUMULADA Miles de pesos
EXPLANACIONES (E) (Item(s): 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 68)	15,352,867.43	5.63%	1.02%
	9,569,268.67	3.51%	2,774,648.91
SUBBASES Y AFIRMADOS (SB) (Item(s): 8, 9, 10)	20,287,089.20	7.44%	3.97%
	54,007,930.18	19.81%	10,815,347.28
BASES (B) (Item(s): 11, 12)	16,227,094.00	5.95%	0.00%
	28,600.00	0.01%	-
PAVIMENTOS (P) (Item(s): 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 55)	66,079,071.80	24.23%	0.00%
	42,475,980.64	15.58%	-
ESTRUCTURAS Y OBRAS DE DRENAJE (OA) (Item(s): 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 70, 71, 72)	142,733,717.40	52.34%	0.80%
	159,563,555.26	58.52%	2,180,330.08
SEÑALIZACION Y CONTROL DE TRANSITO (SCT) (Item(s): 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52)	1,855,297.09	0.68%	0.00%
	993,856.18	0.36%	6,391.30
OBRAS VARIAS (OV) (Item(s): 53, 66, 67, 73)	2,577,600.00	0.95%	0.00%
	4,236,598.40	1.55%	-
TRANSPORTES (T) (Item(s): 54, 69)	7,573,412.74	2.78%	0.02%
	1,810,360.35	0.66%	62,497.81
TOTAL OTROS ITEMS	$ -	0.00%	0.00%
	$ -	0.00%	-
VALOR BÁSICO DE OBRA (A)	**272,686,149.666**	100.00%	5.81%
VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO (A')	**272,686,149.666**	100.00%	$ 15,839,215.38

Periodos (% Programado / $ Valor programado / $ Valor Ejecutado / % Ejecutado): 1 jul-22, 2 ago-22, 3 sep-22, 4 oct-22, 5 nov-22, 6 dic-22, 7 ene-23, 8 feb-23, 9 mar-23, 10 abr-23, 11 may-23, 12 jun-23, 13 jul-23, 14 ago-23, 15 sep-23, 16 oct-23, 17 nov-23, 18 dic-23, 19 ene-24, 20 feb-24, 21 mar-24, 22 abr-24, 23 may-24, 24 jun-24, 25 jul-24, 26 ago-24, 27 sep-24, 28 oct-24, 29 nov-24, 30 dic-24, 31 ene-25, 32 feb-25, 33 mar-25, 34 abr-25, 35 may-25, 36 jun-25, 37 jul-25, 38 ago-25, 39 sep-25, 40 oct-25, 41 nov-25, 42 dic-25, 43 ene-26, 44 feb-26, 45 mar-26, 46 abr-26, 47 may-26, 48 jun-26, 49 jul-26, 50 ago-26, 51 sep-26, 52 oct-26, 53 nov-26, 54 dic-26, 55 ene-27, 56 feb-27, 57 mar-27, 58 abr-27, 59 may-27 …

EXPLANACIONES (E) — % P: 0.00%, 0.00%, 0.00%, 0.00%, 0.72%, 1.02%, 1.31%, 1.31%, 1.31%, 1.31%, 1.31%, 1.31%, 1.31%, 1.31%, 1.31%, 1.31%, 1.31%, 1.31%, 1.31%, 1.31%, 1.31%, 1.37%, 1.47%, 1.50%, 1.62%, 1.62%, 1.62%, 1.62%, 1.62%, 2.02%, 2.02%, 2.05%, 2.11%, 2.14%, 2.20%, 2.25%, 2.25%, 2.25%, 2.25%, 2.25%, 2.25%, 2.28%, 2.28%, 2.44%, 2.44%, 2.45%, 2.45%, 2.45%, 2.45%, 2.45%, 2.45%, 2.45%, 2.45%, 2.45%, 2.45%, 2.58%, 2.58%, 2.58%, 2.60% …
$ E: $0, $0, $0, $4,392, $1,235,884, $1,235,884, $1,251,785, $1,255,010, $1,399,929, $1,482,082, $1,997,763, $2,218,795, $2,250,643, $2,271,893, $2,271,893, $2,271,893, $2,271,893, $2,271,893, $2,282,311, $2,674,853, $2,774,649
% E: 0.00%, 0.00%, 0.00%, 0.00%, 0.45%, 0.45%, 0.46%, 0.46%, 0.51%, 0.54%, 0.73%, 0.81%, 0.83%, 0.83%, 0.83%, 0.83%, 0.83%, 0.83%, 0.84%, 0.98%, 1.02%

REPROGRAMACIÓN 1

REPROGRAMACIÓN 2

PROGRAMADO EJECUTADO RE. PROGRAMACIÓN 1 RE. PROGRAMACIÓN 2

		jul-22	ago-22	sep-22
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES	%	0.00%	0.01%	[illegible]
	VALOR (Miles de Pesos)	$0.0	$34,600.0	$140,0[illegible]
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	%	0.00%	0.01%	[illegible]
	VALOR (Miles de Pesos)	$0.0	$34,600.0	$174,6[illegible]
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES	%	0.00%	0.01%	[illegible]
	VALOR (Miles de Pesos)	$0.0	$34,627.8	$140,6[illegible]
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	%	0.00%	0.01%	[illegible]
	VALOR (Miles de Pesos)	$0.0	$34,627.8	$175,2[illegible]

* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contractual.
Incluye IVA, debe sumar el valor total del contrato.

PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS*	VALOR INICIAL / VALOR ACTUALIZADO	VALOR EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN
PROVISIÓN PARA AJUSTES, USO DE OPCIÓN, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES (B)	$ 31,859,511.698 / $ 31,859,511.698	$ 1,846,103.90	5.79%
PROVISIÓN PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA (C)	$ 300,000.000 / $ 300,000.000	$ -	0.00%
VALOR IVA OBRA (19% de la Utilidad del 5%) (E)	$ 2,227,718.295 / $ 2,227,718.295	$ 129,279.07	5.80%
REVISIÓN Y/O AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ 3,340,000.000 / $ 3,340,000.000	$ 2,920,796.02	87.45%
IVA - REVISIÓN Y/O AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ 634,600.000 / $ 634,600.000	$ 554,951.24	87.45%
GESTIÓN SOCIAL , PREDIAL , AMBIENTAL Y SOSTENIBILIDAD (Incluye EIA,PAGA e IVA19%) (J)	$ 7,814,781.342 / $ 7,814,781.342	$ 24,398.57	0.31%
PROVISION PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19 (INCLUYE IVA) (K)	$ 504,000.000 / $ 504,000.000	$ -	0.00%
VALOR TOTAL PROVISIONES (B) / VALOR TOTAL PROVISIONES (B')	$ 46,680,611.335 / $ 46,680,611.335	$ 5,475,528.81	11.73%
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B) / VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO C'=(A'+B')	**$ 319,366,761,001.00 / $ 319,366,761,001.00**	**$ 21,314,744,187.00**	**6.67%**

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

NOTA:

1. En los eventos de suspensión del plazo contractual, el periodo real de suspensión debe reflejarse en la gráfica.
2. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP.
3. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado.
4. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".
5. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA). En consecuencia, no son aceptables programaciones mensuales de inversión en $0.
6. El porcentaje correspondiente al valor básico de la obra programada se calcula con respecto al Valor Básico de Obra (A) o el Valor Básico de Obra Actualizado (A').
7. El Programa de Inversiones o la Reprogramación al Programa de Inversiones se considera aprobado una vez suscrito el presente formato por las partes.
8. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

OBSERVACIONES:
LA PRESENTE REPROGRAMACIÓN 2, CORRESPONDE A LA MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA 3

Aprueba Firma:
Nombre: JORGE EDUARDO DUARTE RODRIGUEZ
Representante legal o apoderado del Contratista (S)
Matrícula Profesional No.: 215422 CSJ
CONSORCIO VÍAS COLOMBIA 055

Aprueba Firma:
Nombre: [illegible]
Representante legal o apoderado del Interventor
Matrícula Profesional No.: 25202-100584 CND
CONSORCIO VIAL JAC 2022

Revisó Firma: Karol Roca Pacheco
NOMBRE: KAROL ROCA PACHECO
Titular Gerencia: COORDINADOR GRUPO ORIENTE
Matrícula profesional No. : 13202115547 BLV

Aprueba Firma: Karol Roca Pacheco
NOMBRE: KAROL ROCA PACHECO
Jefe de Unidad Ejecutora
Matrícula profesional No. : 13202115547 BLV

Firmado digitalmente por JOSE RICARDO BURBANO BARCENA
Revisó Firma:
Nombre: JOSÉ RICARDO BURBANO BARCENAS
Supervisor de Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 52202-46096 NRÑ

Firmado digitalmente por JOSE RICARDO BURBANO BARCENA
Revisó Firma:
Nombre: JOSÉ RICARDO BURBANO BARCENAS
Director Territorial
Matrícula Profesional No.: 52202-46096 NRÑ

Revisó Firma:
Nombre: MIGUEL ANGEL GUACALES DIAZ
Gestor Técnico de Proyecto
Matrícula Profesional No.: 19202-215720 CAU

CANTIDADES EJECUTADAS CONTRATO N° 985 DE 2022

OBJETO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA VILLAGARZON - SAN JOSE DEL FRAGUA Y PUENTE SOBRE EL RIO CAQUETA EN LOS DEPARTAMENTOS DE PUTUMAYO, CAUCA Y CAQUETA EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA VIAS PARA LA CONEXION DE TERRITORIOS, EL CRECIMIENTO SOSTENIBLE Y LA REACTIVACIÓN 2.0

Consorcio Vías Colombia 055

PREACTA PARCIAL DE OBRA No. 025 - CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2024

ÍTEM	ÍTEM	ITEM DE PAGO	ESPECIF. GENERAL	ESPECIF. PARTICULAR	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UNIDAD	VR. UNITARIO ACTUALIZADO	CANTIDAD	VALOR	FACTOR DE INCREMENTO POR DISTANCIA	ACUMULADO ACTA ANTERIOR		EJECUTADO DEL MES		ACUMULADO FINAL	
											CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL
					EXPLANACIONES				$ 9.383.958.895.00			$ 3,173,957,352.00		$ 518,000.00		$ 3,174,475,352.00
200.2	1	200.2	200-13		Desmonte y limpieza en zonas no boscosas	Ha	$ 1,083,131.00	5.00	$ 5,415,655.00	1	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
201.7	2	201.7	201-13		Demolición de Estructuras	m3	$ 107,114.00	1,770.00	$ 189,591,780.00	1	189.00	$ 20,244,546.00	0.00	$ -	189.00	$ 20,244,546.00
210.1.2	3	210.1.2	210-13		Excavación sin clasificar de préstamos	m3	$ 12,300.00	21,975.40	$ 270,297,420.00	1	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
210.2.2	4	210.2.2	210-13		Excavaciones en material común de la Explanación y Canales	m3	$ 10,885.00	197,775.70	$ 2,113,244,040.00	1	26,945.70	$ 287,914,806.00	0.00	$ -	26,945.70	$ 287,914,806.00
220.1	5	220.1	220-13		Terraplenes	m3	$ 12,800.00	-	$ -	1	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
223.2	6	223.2	223-13		Geomalla de refuerzo tipo Asphalt 160 o similar	m2	$ 11,100.00	-	$ -	1	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
230.1P	7	230.1P		230.1P	Mejoramiento de la subrasante con material aluvial - crudo de río y/o material de cantera tipo seleccionado (compacto) (incluye transporte)	m3	$ 92,500.00	73,572.00	$ 6,805,410,000.00	1	30,981.60	$ 2,865,798,000.00	5.60	$ 518,000.00	30,987.20	$ 2,866,316,000.00
					BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS				$ 54.036.530.175.00			$ 12.028.519.071.00		$ 299.662.761.00		$ 12.328.181.832.00
310.1	8	310.1	310-13		Conformación de la calzada existente	m2	$ 925.00	1,201,386.80	$ 1,111,282,790.00	1	804,135.40	$ 743,825,248.00	67,290.00	$ 62,243,250.00	871,425.40	$ 806,068,498.00
311.1	9	311.1	311-13		Afirmado	m3	$ 90,000.00	52,833.00	$ 4,754,970,000.00	1	14,944.80	$ 1,345,032,011.00	943.30	$ 84,897,000.00	15,888.10	$ 1,429,929,011.00
320.1	10	320.1	320-13		Subbase Granular clase A	m3	$ 157,410.00	377,846.50	$ 48,141,677,385.00	1	78,013.20	$ 9,939,661,812.00	1,197.10	$ 152,522,511.00	79,210.30	$ 10,092,184,323.00
330.1	11	330.1	330-13		Base granular clase A	m3	$ 139,500.00	0.00	$ -	1	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
330.4	12	330.4	330-13		Base granular para bacheo clase A	m3	$ 143,000.00	200.00	$ 28,600,000.00	1	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
					PAVIMENTOS ASFALTICOS				$ 698.323.505.00			$ -		$ -		$ -
420.2	13	420.2	420-13		Riego de imprimación con emulsión asfáltica CRL-1	m2	$ 2,921.00	0.00	$ -	1	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
421.1	14	421.1	421-13		Riego de liga con emulsión asfáltica CRR-1	m2	$ 1,852.00	12,880.00	$ 23,483,360.00	1	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
450.1P	15	450.1P		450.1P	Mezcla densa en caliente Tipo MDC-25	m3	$ 807,000.00	0.00	$ -	1	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
450.2P	16	450.2P		450.2P	Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19	m3	$ 811,000.00	634.00	$ 514,174,000.00	1	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
450.9P	17	450.9P		450.9P	Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19 para bacheos	m3	$ 825,000.00	100.00	$ 82,500,000.00	1	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
460.1P	18	460.1P		460.1P	Fresado de pavimento asfaltico	m3	$ 65,590.00	100.00	$ 6,559,000.00	1	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
465.1	19	465.1	465-13		Excavación para reparación de pavimento asfáltico existente incluyendo el corte y la remoción de las capas asfálticas y de las subyacentes.	m3	$ 71,686.00	998.90	$ 71,607,145.00	1	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
					ESTRUCTURAS Y DRENAJES				$ 114.815.121.194.00			$ 2.432.656.232.00		$ 386.775.176.00		$ 2.819.431.408.00
600.1.1	20	600.1.1	600-13		Excavaciones varias sin clasificar	m3	$ 25,170.00	12,369.00	$ 311,327,730.00	1	2,604.20	$ 65,547,714.00	9.90	$ 249,183.00	2,614.10	$ 65,796,897.00
600.2.4	21	600.2.4	600-13		Excavaciones varias en material conso bajo agua	m3	$ 59,656.00	11,081.70	$ 661,089,895.00	1	6,807.00	$ 406,078,392.00	0.00	$ -	6,807.00	$ 406,078,392.00
610.1	22	610.1	610-13		Rellenos para Estructuras con suelo	m3	$ 38,696.00	0.00	$ -	1	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
610.2	23	610.2	610-13		Rellenos para Estructuras con recebo	m3	$ 102,000.00	0.00	$ -	1	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
610.3	24	610.3	610-13		Rellenos para estructuras con material granular tipo SBG	m3	$ 165,162.00	0.00	$ -	1	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
621.1.4P	25	621.1.4P		621.1.4P	Pilote en concreto de 35 Mpa de diametro D=2,50 m. Incluye excavación con piloteadora tipo Kelly, camisa no recuperable en acero de D=250 cm y e = 3/8"(9,5mm). No incluye acero de refuerzo.	m	$ 7,250,000.00	0.00	$ -	1	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
630.1.P	26	630.1.P		630.1.P	Concreto clase 42 MPA, para viga calon voladizos de puentes	m3	$ 2,000,000.00	11,844.60	$ 23,689,200,000.00	1	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
630.2.P	27	630.2.P		630.2.P	Concreto clase 42 MPA, para vigas presforzadas largadas de puentes	m3	$ 1,900,000.00	0.00	$ -	1	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
630.1.1P	28	630.1.1P		630.1.1P	Concreto clase 35 MPA, para vigas puentes tipo 1	m3	$ 1,300,000.00	428.40	$ 556,920,000.00	1	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
630.1.2P	29	630.1.2P		630.1.2P	Concreto clase 35 MPA, para pilas de puentes	m3	$ 1,320,000.00	176.20	$ 232,584,000.00	1	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
630.3.1P	30	630.3.1P		630.3.1P	Concreto clase 35 MPA, para Zapatas, Estribos, Aletas, dados y placas	m3	$ 1,100,000.00	2,791.00	$ 3,070,760,000.00	1	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
630.3.4P	31	630.3.4P		630.3.4P	Concreto clase 35 MPA para tablero y anden	m3	$ 1,254,299.00	476.60	$ 597,798,903.00	1	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
630.3.5P	32	630.3.5P		630.3.5P	Concreto clase, 28 MPA para Zapatas, Estribos, Aletas, dados y placas	m3	$ 1,010,000.00	7,770.50	$ 7,848,205,000.00	1	923.20	$ 932,432,000.00	20.80	$ 20,806,000.00	943.80	$ 953,238,000.00
630.4	33	630.4	630-13		Concreto clase 21 MPA	m3	$ 720,000.00	719.70	$ 518,184,000.00	1	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
630.6	34	630.6	630-13		Concreto clase 14 MPA	m3	$ 509,329.00	1,515.20	$ 771,735,301.00	1	62.40	$ 31,782,133.00	0.40	$ 203,732.00	62.80	$ 31,985,865.00
632.1P	35	632.1P		632.1P	Baranda Metalica	m	$ 885,000.00	3,190.60	$ 2,823,749,000.00	1	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
640.1	36	640.1	640-13		Acero de refuerzo Fy=420 Mpa	kg	$ 6,752.00	4,522,519.00	$ 30,536,048,288.00	1	47,405.00	$ 320,078,560.00	51,733.00	$ 349,301,216.00	99,138.00	$ 669,379,776.00
641.1	37	641.1	641-13		Acero de Preesfuerzo	Tf-m	$ 2,426.00	8,947,060.00	$ 21,705,587,560.00	1	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
642.1	38	642.1	642-13		Apoyo elastomérico de neopreno, dureza 60 (60x60x5cm con 2 platinas)	u	$ 723,081.00	77.00	$ 55,677,237.00	1	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
642.2	39	642.2	642-13		Sello para juntas para puentes (Suministro e instalación de junta de dilatación Tablero-Estribo A=5cm, en ángulo 4"x4"x3/8". Incluye lleno de junta en Sikaflex y banda SIKA OVC O-22 o equivalentes)	m	$ 372,145.00	427.80	$ 159,203,631.00	1	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
661.1	40	661.1	661-13		Tubería de Concreto Reforzado CLASE II, de 900mm de diámetro interior	m	$ 670,000.00	1,896.00	$ 1,270,320,000.00	1	426.10	$ 285,487,000.00	0.00	$ -	426.10	$ 285,487,000.00
671.1	41	671.1	671-13		Cuneta de concreto vaciada insitu, no incluye la conformación de la superficie de apoyo	m3	$ 560,000.00	7,167.40	$ 4,013,744,000.00	1	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
673.1	42	673.1	673-13		Geotextil Tipo II no tejido	m2	$ 7,777.00	172,705.00	$ 1,343,126,785.00	1	38,544.90	$ 299,763,688.00	2,085.00	$ 16,215,045.00	40,629.90	$ 315,978,733.00
673.2	43	673.2	673-13		Material granular drenante	m3	$ 122,801.00	13,121.00	$ 1,611,271,921.00	1	745.00	$ 91,486,745.00	0.00	$ -	745.00	$ 91,486,745.00
673.3	44	673.3	673-13		Material de cobertura tipo SBG	m3	$ 172,304.00	0.00	$ -	1	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
683.4P	45	683.4P		683.4P	Muro en suelo mecánicamente estabilizado en malla hexagonal doble torsión, alambre con recubrimiento 90Zn/10Al revestido . Relleno y conformación realizados mecanicamente y armados manualmente. Incluye transporte.	m2	$ 440,000.00	30,558.20	$ 13,445,607,943.00	1	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
					SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD				$ 993.856.177.00			$ 6.391.296.00		$ -		$ 6.391.296.00
1P	46	1P	Manual de Señalización Vial 2015		Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para lineas de demarcación de pavimentos	m	$ 1,989.00	95,423.90	$ 189,798,137.00	1	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
2P	47	2P	Manual de Señalización Vial 2015		Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para marca Vial con pintura en frío	m2	$ 24,098.00	1,568.00	$ 37,785,735.00	1	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
4P	48	4P	Manual de Señalización Vial 2015		Suministro e instalación de tachas reflectiva bidireccionales	u	$ 8,377.00	18,793.00	$ 157,428,961.00	1	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
5P	49	5P	Manual de Señalización Vial 2015		Suministro e instalación de señal vertical de transito sp, sr y si (75cm*75cm) con lamina acero galvanizado retroreflectiva	u	$ 399,456.00	264.00	$ 105,456,384.00	1	16.00	$ 6,391,296.00	0.00	$ -	16.00	$ 6,391,296.00
730.1	50	730.1	730-13		Defensa metalica	m	$ 233,492.00	1,800.00	$ 420,285,600.00	1	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
730.2	51	730.2	730-13		Sección final	u	$ 103,783.00	60.00	$ 6,226,980.00	1	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
740.1	52	740.1	740-13		Captafaros	u	$ 22,154.00	3,470.00	$ 76,874,380.00	1	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
					OBRAS VARIAS				$ 867.988.900.00			$ -		$ -		$ -
810.1	53	810.1	810-13		Protección de Taludes con bloques de césped	m2	$ 17,900	48,491.00	$ 867,988,900.00	1	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
					TRANSPORTES				$ 1.684.552.954.00			$ 66,277,348.00		$ -		$ 66,277,348.00
900.2	54	900.2	900-13		Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y préstamos para distancias mayores de mil metros (1000 m), medido a partir de cien metros (100 m)	m3-km	$ 1,060	1,589,200.90	$ 1,684,552,954.00	1	62,525.80	$ 66,277,348.00	0.00	$ -	62,525.80	66,277,348.00
					NO PREVISTOS				$ 91.005.817.866.40			$ 2.295.293.634.00		$ 1.956.519.510.00		$ 4.251.813.144.00
500.1	55	500.1	500-22		PAVIMENTO EN CONCRETO HIDRÁULICO MR-45 (Sector Putumayo)	m3	$ 1,101,441.00	37,930.00	$ 41,777,657,130.00	1	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
	56	NP-05			SUMINISTRO E INSTALACION BARRA DE ALTA RESISTENCIA TIPO Y1035 DIAMETRO=57 mm L=5.05 m c/u o similar (Apoyo Temporal)	u	$ 8,156,902.00	320.00	$ 2,610,208,640.00	1	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
	57	NP-06			JUNTA ELASTOMERICA SISMICA DE DILATACIÓN DE MOVIMIENTO 600 (±300) TIPO 1 o similar PARA PILA 2 Y EJE 12 (suministro)	m	$ 31,499,390.00	22.80	$ 718,186,092.00	1	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
	58	NP-07			JUNTA T-250 PARA ESTRIBOS 1 y 2 o similar (suministro)	m	$ 15,057,059.00	22.80	$ 343,300,945.20	1	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
	59	NP-08			JUNTA ELASTOMERICA SISMICA DE DILATACION DE MOVIMIENTO 800 (±400) TIPO 3 o similar PARA PILA 6 (suministro)	m	$ 36,175,223.00	11.40	$ 412,397,542.20	1	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
	60	621.1P			PILOTE DE CONCRETO VACIADO IN SITU DE 35 MPA, DIÁMETRO Ø = 1.80 m. INCLUYE EXCAVACIÓN, (NO INCLUYE CAMISA NO RECUPERABLE. NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO.)	m	$ 6,212,436.00	2,084.00	$ 12,946,716,624.00	1	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
	61	621.2P			CAMARA PERMANENTE DE DIAMETRO 1.80 m, con acero A-36 as 15mm	m	$ 14,983,100.00	1,100.00	$ 19,751,284,640.00	1	130.50	$ 1,955,484,811.00	126.00	$ 1,882,808,823.00	256.50	$ 3,838,035,663.00
	62	NP-09			AISLADOR DE PENDULO FRICCIONAL TIPO I FPS PUENTE 1 (Pila 3-4-5) o similar	u	$ 240,125,600.00	6.00	$ 1,441,052,004.00	1	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
	63	NP-10			AISLADOR DE PENDULO FRICCIONAL TIPO 2 FPS Puente 2 (Pila 7-8-9-10-11) o similar	u	$ 396,887,878.00	10.00	$ 3,968,878,780.00	1	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
	64	642.1.1			APOYO ELASTOMERICO HDRB-H 500X617 (Pilas 1-2) o similar	u	$ 41,384,553.00	34.00	$ 1,406,481,780.00	1	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
	65	642.1.2			APOYO ELASTOMÉRICO HDSB-H 930X163 (Pilas 2-6-12) o similar	u	$ 154,812,009.00	8.00	$ 1,238,496,072.00	1	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
	66	800.5			CERCA DE ALAMBRE DE PUAS CON POSTES DE PLASTICO CON (4 HILOS)	m	$ 39,679.00	56,000.00	$ 2,222,024,000.00	1	2,877.00	$ 114,156,483.00	0.00	$ -	2,877.00	$ 114,156,483.00
	67	201.16			REMOCIÓN DE CERCAS DE ALAMBRE (incluye traslado)	m	$ 6,176.00	56,000.00	$ 345,744,000.00	1	8,164.00	$ 50,404,536.00	0.00	$ -	8,164.00	$ 50,404,536.00
	68	201.15			REMOCIÓN DE ALCANTARILLAS	m	$ 134,575.00	1,377.00	$ 185,309,775.00	1	259.00	$ 34,854,925.00	0.00	$ -	259.00	$ 34,854,925.00
	69	900.1			TRANSPORTE DE MATERIALES PROVENIENTES DE LA EXCAVACIÓN DE LA EXPLANACIÓN, CANALES Y PRESTAMOS, ENTRE CIEN METROS(100 M) Y MIL METROS(1.000 M) DE DISTANCIA.	m3-E	$ 1,889.00	66,600.00	$ 125,807,400.00	1	36,092.70	$ 68,179,111.00	0.00	$ -	36,092.70	$ 68,179,111.00
	70	NP-01			Cinta PVC V15 o similar	m	$ 68,117.00	1,590.00	$ 108,306,030.00	1	201.40	$ 13,718,764.00	14.90	$ 1,014,943.00	216.30	$ 14,733,707.00
	71	NP-02			Tubería perforada PVC, ASTM D 1785, de Diámetro 100 mm (4") o similar	m	$ 24,478.00	15,365.00	$ 376,104,470.00	1	1,012.20	$ 24,776,632.00	0.00	$ -	1,012.20	$ 24,776,632.00
	72	NP-03			Tubería perforada PVC, ASTM D 1785, de Diámetro 200 mm (8") o similar	m	$ 70,618.00	3,215.00	$ 227,030,440.00	1	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
	73	NP-11			HUMECTACION DE VIA (Consumo Agua = 0.4 l/m2 - Lado Putumayo)	Día	$ 3,203,366.00	250.00	$ 800,841,500.00	1	11.40	$ 36,518,372.00	21.90	$ 70,153,715.00	33.30	$ 106,672,087.00
													-	$ -		
													-	$ -		
					TOTALES		$		$ 272,686,149,666.40		$	$ 20,003,094,933.00	$	$ 2,643,475,447.00	$	$ 22,646,570,380.00

SUBTOTAL BASICO DE OBRAS (A)	$ 272,686,149,666.40	$ 20,003,094,933.00	$ 2,643,475,447.00	$ 22,646,570,380.00
PROVISIÓN PARA AJUSTES, USO DE OPCIÓN, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES (B)	$ 31,859,511,698.00	$ 2,377,207,292.00	$ -	$ 2,377,207,292.00
PROVISIÓN PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA (C)	$ 300,000,000.00	$ -	$ -	$ -
VALOR BASICO DEL CONTRATO INCLUYE OBRAS COMPLEMENTARIAS Y AJUSTES D=(A+B+C)	$ 304,845,661,364.40	$ 22,380,302,225.00	$ 2,643,475,447.00	$ 25,023,777,672.00
VALOR IVA (OBRA) (19% SOBRE UTILIDAD OBRA) (E)	$ 1,992,706,478.00	$ 146,176,464.00	$ 19,317,705.00	$ 165,494,169.00
VALOR IVA (ACTAS DE AJUSTE) (19% SOBRE UTILIDAD OBRA) (F)	$ 232,819,509.00	$ 17,412,101.00	$ -	$ 17,412,101.00
VALOR IVA (JORNADAS 24 HORAS (19% SOBRE UTILIDAD OBRA) (G)	$ 2,192,308.00	$ -	$ -	$ -
SUBTOTAL OBRAS (INCLUYE IVA) H=(D+E+F+G)	$ 307,073,379,659.40	$ 22,543,890,790.00	$ 2,662,793,152.00	$ 25,206,683,942.00
REVISIÓN AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O INCORPORACIÓN Y/U OPTIMIZACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS A FASE III. (I)	$ 3,340,000,000.00	$ 3,088,681,864.00	$ -	$ 3,088,681,864.00
IVA - REVISIÓN Y/O AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O INCORPORACIÓN Y/U OPTIMIZACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS A FASE III. J = (I * 19%)	$ 634,600,000.00	$ 586,849,554.00	$ -	$ 586,849,554.00
TOTAL REVISIÓN Y/O AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O INCORPORACIÓN Y/U OPTIMIZACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS A FASE III. K	$ 3,974,600,000.00	$ 3,675,531,418.00	$ -	$ 3,675,531,418.00
TOTAL GESTIÓN SOCIAL , PREDIAL , AMBIENTAL Y SOSTENIBILIDAD (Incluye EIA,PAGA e IVA19%) (L)	$ 7,814,781,342.00	$ 28,605,220.00	$ -	$ 28,605,220.00
VALOR BASICO PROVISION PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19 = (M)	$ 501,675,164.00	$ -	$ -	$ -
VALOR IVA (PROVISION PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19= (O)	$ 2,324,836.00	$ -	$ -	$ -
TOTAL PROVISION PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19 (INCLUYE IVA) P = (M+O)	$ 504,000,000.00	$ -	$ -	$ -
TOTAL BASICO ACTA. Q = (D+I+M)	$ 308,687,336,528.40	$ 25,468,984,089.00	$ 2,643,475,447.00	$ 28,112,459,536.00
TOTAL IVA ACTA. R = (E+F+G+J+O)	$ 2,864,643,131.00	$ 750,438,119.00	$ 19,317,705.00	$ 769,755,824.00
VALOR TOTAL. S = (H+K+L+P)	$ 319,366,761,001.40	$ 26,248,027,428.00	$ 2,662,793,152.00	$ 28,910,820,580.00

VALOR TOTAL	**26,248,027,428.00**	$ 2,662,793,152.00	$ 28,910,820,580.00
VALOR TOTAL A FACTURAR	**$ 2,662,793,152.00**		

Firma:

Nombre: IVAN DARIO LONDOÑO CELIS
Residente de Obra
Matrícula No. : 63202-63757

Nombre: RAUL ANTONIO PEREZ G.
Director de Interventoría
Matrícula No.: 25202-39452 CND

OBJETO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA VILLAGARZON - SAN JOSE DEL FRAGUA Y PUENTE SOBRE EL RIO CAQUETA EN LOS DEPARTAMENTOS DE PUTUMAYO, CAUCA Y CAQUETA EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA VIAS PARA LA CONEXION DE TERRITORIOS, EL CRECIMIENTO SOSTENIBLE Y LA REACTIVACIÓN 2.0

Consorcio Vías Colombia 055


MEMORIA DE CALCULO ITEM 230.1P MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE

CONTRATO N°: CONTRATO 985 DE 2021
CONTRATISTA: CONSORCIO VIAS COLOMBIA 055
DIRECTOR DE OBRA: ING. RUBÉN DARIO FUENTES PEÑA
TRAMO: VILLAGARZON - SAN JOSE DEL FRAGUA Y PUENTE SOBRE EL RIO CAQUETA

PERIODO: 1 al 31 DE JULIO DE 2024
INTERVENTORÍA: CONSORCIO VIAL JAC 2022
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA: ING. RAÚL ANTONIO PÉREZ G.

UNIDAD DE MEDIDA: M3 TOTAL **5.6**

MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE

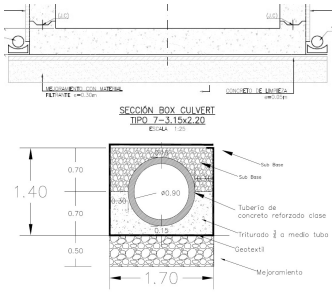

ESTRUCTURA	UBICACIÓN	Estructura	COSTADO	Longitud	Ancho	Altura	Volumen	TOTAL
Alcantarilla	3+245	Encole	Izquierdo	3.32	2.85	0.30	2.84	2.8
Alcantarilla	3+245	Encole	Izquierdo	3.32	2.85	0.30	2.84	2.8





Observaciones: Se presenta perfil de las capas presentes en la instalacion de Boxculvert y verificacion con medidas en campo.
*Se emplea método de redondeo de la norma INV E-823. Según normas y especificaciones 2022 INVIAS Capitulo 2- Explanaciones Art. 230 Mejoramiento de la subrasante. Numeral 230.6 Medida Materiales de cobertura será el métro cúbico (m3), aproximado a la decima (0,1), de material suministrado y colocado en obra"

	Nombre	Cargo	Firma
Revisó	Iván Darío Londoño Celis	Residente de obra	
Revisó Interventoría 2	Héctor Escobar	Inspector Obra Interventoría	
Aceptación Interventoría	Raúl Antonio Pérez G.	Director Interventoría	

OBJETO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA VILLAGARZON - SAN JOSE DEL FRAGUA Y PUENTE SOBRE EL RIO CAQUETA EN LOS DEPARTAMENTOS DE PUTUMAYO, CAUCA Y CAQUETA EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA VIAS PARA LA CONEXION DE TERRITORIOS, EL CRECIMIENTO SOSTENIBLE Y LA REACTIVACIÓN 2.0

Consorcio Vías Colombia 055

MEMORIA DE CALCULO ITEM 310.1 CONFORMACION DE LA CALZADA EXISTENTE

CONTRATO N°:	CONTRATO 985 DE 2021	PERIODO:	1 al 31 DE JULIO DE 2024
CONTRATISTA:	CONSORCIO VIAS COLOMBIA 055	INTERVENTORÍA:	CONSORCIO VIAL JAC 2022
DIRECTOR DE OBRA:	ING. RUBEN DARIO FUENTES PEÑA	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA:	ING. RAUL ANTONIO PÉREZ G.
TRAMO:	VILLAGARZON - SAN JOSE DEL FRAGUA Y PUENTE SOBRE EL RIO CAQUETA		

UNIDAD DE MEDIDA: M2 TOTAL **67,290.0**

MANTENIMIENTO DE VIA

ABSCISA INICIAL	ABSCISA FINAL	LONGITUD (m)	ANCHO (m)	ÁREA(M2)	TOTAL
PR9+000.00	PR9+100.00	100.00	13.0	1,300.00	1,300.0
PR9+100.00	PR10+200.00	1100.00	8.5	9,350.00	9,350.0
PR10+200.00	PR10+850.00	650.00	8.0	5,200.00	5,200.0
PR10+900.00	PR11+080.00	180.00	8.0	1,440.00	1,440.0
PR11+150.00	PR11+300.00	150.00	8.0	1,200.00	1,200.0
PR12+100.00	PR12+400.00	300.00	7.5	2,250.00	2,250.0
PR12+400.00	PR13+300.00	900.00	8.0	7,200.00	7,200.0
PR13+400.00	PR13+500.00	100.00	8.0	800.00	800.0
PR14+300.00	PR14+600.00	300.00	7.5	2,250.00	2,250.0
PR17+500.00	PR18+500.00	1000.00	7.5	7,500.00	7,500.0
PR18+520.00	PR18+550.00	30.00	7.5	225.00	225.0
PR18+570.00	PR19+000.00	430.00	7.5	3,225.00	3,225.0
PR19+000.00	PR19+600.00	600.00	7.5	4,500.00	4,500.0
PR20+400.00	PR21+300.00	900.00	8.0	7,200.00	7,200.0
PR21+300.00	PR21+700.00	400.00	7.5	3,000.00	3,000.0
PR21+700.00	PR22+300.00	600.00	7.5	4,500.00	4,500.0
PR22+300.00	PR22+400.00	100.00	9.0	900.00	900.0
PR22+400.00	PR23+000.00	600.00	7.5	4,500.00	4,500.0
PR23+900.00	PR24+000.00	100.00	7.5	750.00	750.0







Observaciones: Se realiza un abscisado por la via existente para tener mayor claridad de los tramos realizados.
*Se emplea método de redondeo de la norma INV E-823. Según normas y especificaciones 2022 INVIAS Capitulo 3- Afirmados, subbases y bases Art. 310 Conformación de la calzada existente Numeral 310.6 Medida "La unidad de medida para la conformación de la calzada será el metro cuadrado (m2), aproximado al decimo (0,1), de trabajo realizado".

	Nombre	Cargo	Firma
Proyectó	Jhon René Mosquera	Ing. Costos y Presupuestos	
Revisó	Iván Darío Londoño Celis	Residente de obra	
Revisó Interventoría 1	Jairo Ramiro Cuesvas Muñoz	Topógrafo Interventoría	
Aceptación Interventoría	Raúl Antonio Pérez G.	Director Interventoría	

OBJETO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA VILLAGARZON - SAN JOSE DEL FRAGUA Y PUENTE SOBRE EL RIO CAQUETA EN LOS DEPARTAMENTOS DE PUTUMAYO, CAUCA Y CAQUETA EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA VIAS PARA LA CONEXION DE TERRITORIOS, EL CRECIMIENTO SOSTENIBLE Y LA REACTIVACIÓN 2.0

Consorcio Vías Colombia 055

MEMORIA DE CALCULO ITEM 311.1 AFIRMADO

CONTRATO N°:	CONTRATO 985 DE 2021	PERIODO:	1 al 31 DE JULIO DE 2024
CONTRATISTA:	CONSORCIO VIAS COLOMBIA 055	INTERVENTORÍA:	CONSORCIO VIAL JAC 2022
DIRECTOR DE OBRA:	ING. RUBEN DARIO FUENTES PEÑA	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA:	ING. RAÚL ANTONIO PÉREZ G.
TRAMO:	VILLAGARZON - SAN JOSE DEL FRAGUA Y PUENTE SOBRE EL RIO CAQUETA		

UNIDAD DE MEDIDA: M3 TOTAL **943.3**

MANTENIMIENTO DE VIA

INSTALACIÓN DE AFIRMADO

PR INICIAL	PR FINAL	LONGITUD (m)	ANCHO (m)	ESPESOR (m3)	VOLUMEN (m3)	TOTAL (m3)
PR2+750.00	PR2+800.00	50.0	9.00	0.12	55.80	55.8
PR6+000.00	PR6+040.00	40.0	8.00	0.61	196.16	196.2
PR6+050.00	PR6+070.00	20.0	8.00	0.18	28.00	28.0
PR6+900.00	PR6+930.00	30.0	8.00	0.18	42.00	42.0
PR6+940.00	PR6+960.00	20.0	8.00	0.18	28.00	28.0
PR6+950.00	PR6+970.00	20.0	8.00	0.18	28.00	28.0
PR6+970.00	PR6+990.00	20.0	8.00	0.18	28.00	28.0
PR11+080.00	PR11+100.00	20.0	8.00	0.18	28.00	28.0
PR11+110.00	PR11+150.00	40.0	8.00	0.35	112.00	112.0
PR17+100.00	PR17+450.00	350.0	7.50	0.13	341.25	341.3
PR18+500.00	PR18+520.00	20.0	7.50	0.28	42.00	42.0
PR18+550.00	PR18+570.00	20.0	7.00	0.10	14.00	14.0









Observaciones: Se presenta archivo dwg, mostrando el área ejecutada. Dibujo realizado mediante un levantamiento topografico. Se realiza un abscisado por la vía existente para tener mayor claridad de los tramos realizados.
*Se emplea método de redondeo de la norma INV E-823. Según normas y especificaciones 2022 INVIAS Capitulo 3- Afirmados, subbases y bases. Art. 311 Afirmado, Numeral 311.6 Medida "La unidad de medida para la el afirmado será el metro cubico (m3), aproximado al decimo (0,1), de trabajo realizado".

	Nombre	Cargo	Firma
Proyectó	Jhon René Mosquera	Ing. Costos y Presupuestos	
Revisó	Iván Darío Londoño Celis	Residente de obra	
Revisó Interventoría 1	Jairo Ramiro Cuesvas Muñoz	Topógrafo Interventoría	
Aceptación Interventoría	Raúl Antonio Pérez G.	Director Interventoría	

OBJETO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA VILLAGARZON - SAN JOSE DEL FRAGUA Y PUENTE SOBRE EL RIO CAQUETA EN LOS DEPARTAMENTOS DE PUTUMAYO, CAUCA Y CAQUETA EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA VIAS PARA LA CONEXION DE TERRITORIOS, EL CRECIMIENTO SOSTENIBLE Y LA REACTIVACIÓN 2.0

Consorcio Vías Colombia 055

MEMORIA DE CALCULO ITEM 320.1 SUBBASE GRANULAR CLASE A

CONTRATO N°: CONTRATO 985 DE 2021
CONTRATISTA: CONSORCIO VIAS COLOMBIA 055
DIRECTOR DE OBRA: ING. RUBÉN DARIO FUENTES PEÑA
TRAMO: VILLAGARZON - SAN JOSE DEL FRAGUA Y PUENTE SOBRE EL RIO CAQUETA

PERIODO: 1 al 31 DE JULIO DE 2024
INTERVENTORÍA: CONSORCIO VIAL JAC 2022
DIRECTOR DE INTERV ING. RAÚL ANTONIO PÉREZ G.

UNIDAD DE MEDIDA: M3 TOTAL 1,197.1

CONSTRUCCIÓN DE VÍA PK 2+794- PK 2+940

Abscisa	Area (m2)	Volumen (m3)	Volumen Acumulado (m3)
PR2+800.00	1.75	0.00	
PR2+810.00	1.74	17.44	17.44
PR2+820.00	1.35	15.53	32.97
PR2+830.00	0.73	10.50	43.47
PR2+840.00	1.55	11.50	54.97
PR2+850.00	1.60	15.89	70.86
PR2+860.00	1.70	16.50	87.36
PR2+870.00	0.78	12.38	99.74
PR2+880.00	0.74	7.62	107.36
PR2+890.00	0.79	7.68	115.04
PR2+900.00	0.44	6.16	121.20
PR2+910.00	0.04	2.37	123.57
PR2+920.00	0.01	0.23	123.80
PR2+930.00	0.07	0.40	124.20
PR2+940.00	0.92	4.93	129.13
PR2+950.00	0.53	7.23	136.36
PR2+960.00	0.54	5.38	141.74
PR2+970.00	0.43	4.91	146.65
PR2+980.00	0.38	4.02	150.67
PR2+990.00	0.19	2.81	153.48
PR3+000.00	0.20	1.99	155.47
PR3+010.00	0.42	3.12	158.59
PR3+020.00	0.38	4.03	162.62
PR3+030.00	0.27	3.30	165.92
PR3+040.00	0.11	1.89	167.81
PR3+050.00	0.46	2.85	170.66
PR3+060.00	0.31	3.87	174.53
PR3+070.00	0.52	4.14	178.67
PR3+080.00	0.32	4.19	182.86
PR3+090.00	0.44	3.79	186.65
PR3+100.00	1.28	8.59	195.24
PR3+110.00	0.30	7.89	203.13
PR3+120.00	0.51	4.04	207.17
PR3+130.00	0.77	6.41	213.58
PR3+140.00	1.33	10.49	224.07
PR3+150.00	12.17	67.48	291.55
PR3+160.00	5.87	90.20	381.75
PR3+170.00	9.03	75.01	456.76
		TOTAL	456.8

CONSTRUCCIÓN DE VÍA PK 8+970 - PK 9+080

Abscisa	Area (m2)	Volumen (m3)	Volumen Acumulado (m3)
PR3+181.60	2.49	3.85	
PR3+190.00	4.00	27.53	27.53
PR3+200.00	3.64	38.31	65.84
PR3+210.00	6.70	51.79	117.63
PR3+220.00	7.41	70.64	188.27
PR3+230.00	7.13	72.69	260.96
PR3+240.00	6.89	70.09	331.05
PR3+250.00	2.90	48.93	379.98
PR3+260.00	5.62	42.57	422.55
PR3+270.00	7.57	65.94	488.49
PR3+280.00	7.04	73.06	561.55
PR3+290.00	5.23	61.34	622.89
PR3+300.00	5.62	54.22	677.11
PR3+310.00	1.44	35.30	712.41
PR3+320.00	1.52	14.82	727.23
PR3+330.00	0.51	10.13	737.36
PR3+340.00	0.09	2.97	740.33
		TOTAL	740.3



Observaciones: Se presentan volúmenes soportados con los levantamientos topográficos procesados en Civil 3D, se cuenta la subbase clase A instalada , asi como la sección típica para el cálculo de la actividad.
*Se emplea método de redondeo de la norma INV E-823. Según normas y especificaciones 2012 INVIAS Capitulo 3- Afirmados, subbases y bases Art. 320 Sub-base granular Numeral 320.6 Medida "Según lo descrito en el numeral 300.6.1- La unidad de medida será el metro cúbico (m3), aproximado a la décima (0,1)."

	Nombre	Cargo	Firma
Proyectó	Jhon René Mosquera	Ing. Costos y Presupuestos	
Revisó	Iván Darío Londoño Celis	Residente de obra	
Revisó Interventoría 1	Jairo Ramiro Cuesvas Muñoz	Topógrafo Interventoría	
Aceptación Interventoría	Raúl Antonio Pérez G.	Director Interventoría	

OBJETO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA VILLAGARZON - SAN JOSE DEL FRAGUA Y PUENTE SOBRE EL RIO CAQUETA EN LOS DEPARTAMENTOS DE PUTUMAYO, CAUCA Y CAQUETA EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA VIAS PARA LA CONEXION DE TERRITORIOS, EL CRECIMIENTO SOSTENIBLE Y LA REACTIVACIÓN 2.0

Consorcio Vías Colombia 055

MEMORIA DE CALCULO ITEM 600.1.1 EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR

CONTRATO N°: CONTRATO 985 DE 2021
CONTRATISTA: CONSORCIO VIAS COLOMBIA 055
DIRECTOR DE OBRA: ING. RUBÉN DARIO FUENTES PEÑA
TRAMO: VILLAGARZON - SAN JOSE DEL FRAGUA Y PUENTE SOBRE EL RIO CAQUETA

PERIODO: 1 al 31 DE JULIO DE 2024
INTERVENTORÍA: CONSORCIO VIAL JAC 2022
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA: ING. RAÚL ANTONIO PÉREZ G.

UNIDAD DE MEDIDA: M3 TOTAL **9.9**

OBRAS DE ARTE

Abscisa	Tipo Obra	Elemento	Costado	VOLUMEN DE EXCAVACION				TOTAL
				Longitud (m)	Ancho (m)	Altura (m)	Volumen (m3)	Volumen (m3)
3+245	**Alcantarilla**	Encole	Izquierdo	3.32	2.85	0.55	5.20	5.2
3+195	**Alcantarilla**	Encole	Izquierdo	3.32	2.85	0.50	4.73	4.7





Observaciones:

	Nombre	Cargo	Firma
Revisó	Iván Darío Londoño Celis	Residente de obra	
Revisó Interventoría 2	Héctor Escobar	Inspector Obra Interventoría	
Aceptación Interventoría	R□□□□□□□□□r□□□.	Director Interventoría	

OBJETO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA VILLAGARZON - SAN JOSE DEL FRAGUA Y PUENTE SOBRE EL RIO CAQUETA EN LOS DEPARTAMENTOS DE PUTUMAYO, CAUCA Y CAQUETA EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA VIAS PARA LA CONEXION DE TERRITORIOS, EL CRECIMIENTO SOSTENIBLE Y LA REACTIVACIÓN 2.0

Consorcio Vías Colombia 055

MEMORIA DE CALCULO ITEM 621.5P CAMISA PERMANENTE DE DÍAMETRO 1.80 m (en acero A-36; e= 15mm)

CONTRATO N°: CONTRATO 985 DE 2021
CONTRATISTA: CONSORCIO VIAS COLOMBIA 055
DIRECTOR DE OBRA: ING. RUBEN DARIO FUENTES PEÑA
TRAMO: VILLAGARZON - SAN JOSE DEL FRAGUA Y PUENTE SOBRE EL RIO CAQUETA

PERIODO: 1 al 31 DE JULIO DE 2024
INTERVENTORÍA: CONSORCIO VIAL JAC 2022
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA: ING. RAUL ANTONIO PEREZ G.

ML TOTAL **126.0**

PUENTE RIO CAQUETA

Camisa permanente e=15mm de diámetro exterior 1.83m (en acero A-36; e= 15mm)

EJE	DIAMETRO (m)	(A) LONGITUD (m)	(B) CANTIDAD (Und)	(C) LONGITUD TOTAL (m)
Eje 1 - Estribo 1	1.8	20	2	40.00
Eje 2 - Pila 1'	1.8	20	2	40.00
Eje 3 - Pila 1	1.8	20	2	40.00
Eje 4 - Pila 2	1.8	20	2	40.00
Eje 5 - Pila 3	1.8	20	6	120.00
Eje 6 - Pila 4	1.8	20	6	120.00
Eje 7 - Pila 5	1.8	20	6	120.00
Eje 8 - Pila 6	1.8	20	4	80.00
Eje 9 - Pila 7	1.8	20	6	120.00
Eje 10 - Pila 8	1.8	20	6	120.00
Eje 11 - Pila 9	1.8	20	6	120.00
Eje 12 - Pila 10	1.8	20	6	120.00
Eje 13 - Pila 11	1.8	20	6	120.00
Eje 14 - Pila 12	1.8	20	2	40.00
Eje 15 - Pila 13	1.8	20	2	40.00
Eje 16 - Estribo 2	1.8	20	2	40.00

C = (A*B) TOTAL (m)	1,320.00 [redacted]

Pila	Pilote	Longitud	Porcentaje por elaboracion y suministro	Total
Pila 2	Pilote 2	15	90%	13.5
Pila 3	Pilote 1	20	90%	18.0
Pila 3	Pilote 2	20	90%	18.0
Pila 3	Pilote 3	20	90%	18.0
Pila 3	Pilote 4	20	90%	18.0
Pila 3	Pilote 5	20	90%	18.0
Pila 3	Pilote 6	20	90%	18.0
Pila 4	Pilote 1	5	90%	4.5









Observaciones: Se presenta el esquema de la estructura existente y la longitud respectiva según medidas tomadas en obra
*Se emplea método de redondeo de la norma INV E-823. Según normas y especificaciones 2022 INVIAS Capitulo 6- Estructuras y Drenajes Art. 661. Tuberia de concreto reforzado Numeral 661.6 Medida "La unidad de medida de la tubería será el metro (m), aproximado a la decima (0,1), de tubería de concreto reforzado suministrada y colocada"

	Nombre	Cargo	Firma
Revisó	Iván Darío Londoño Celis	Residente de obra	
Aceptación Interventoría	Raúl Antonio Pérez G.	Director Interventoría	[redacted]

OBJETO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA VILLAGARZON - SAN JOSE DEL FRAGUA Y PUENTE SOBRE EL RIO CAQUETA EN LOS DEPARTAMENTOS DE PUTUMAYO, CAUCA Y CAQUETA EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA VIAS PARA LA CONEXION DE TERRITORIOS, EL CRECIMIENTO SOSTENIBLE Y LA REACTIVACIÓN 2.0

Consorcio Vías Colombia 055


MEMORIA DE CALCULO ITEM 630.3.5P CONCRETO CLASE 28 MPA

CONTRATO N°: CONTRATO 985 DE 2021
CONTRATISTA: CONSORCIO VIAS COLOMBIA 055
DIRECTOR DE OBRA: ING. RUBEN DARIO FUENTES PEÑA
TRAMO: VILLAGARZON - SAN JOSE DEL FRAGUA Y PUENTE SOBRE EL RIO CAQUETA

PERIODO: 1 al 31 DE JULIO DE 2024
INTERVENTORÍA: CONSORCIO VIAL JAC 2022
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA: ING. RAUL ANTONIO PEREZ G.

UNIDAD DE MEDIDA: M3 TOTAL **20.6**

CONCRETO PARA ALCANTARILLAS




UBICACIÓN	Costado	Estructura General	Cantidad	Ancho	Altura	Largo	Volumen
3+245	Izquierdo	Dentellon	1.00	0.30	0.20	3.06	0.18
3+245		Placa Bajo Tubo S1	1.00	1.00	0.25	5.94	1.49
3+245		Aleta Derecha	1.00	2.47	0.25	1.40	0.86
3+245		Aleta Izquierda	1.00	2.47	0.25	1.40	0.86
3+245		Cabezote	1.00	1.00	1.80	0.38	0.68
3+245		Tuberia	-1.00	0.24			-0.24
							3.8



UBICACIÓN	Costado	Estructura General	Cantidad	Ancho	Altura	Largo	Volumen
3+195	Izquierdo	Dentellon	1.00	0.30	0.20	3.06	0.18
3+195		Placa Bajo Tubo S1	1.00	1.00	0.25	5.94	1.49
3+195		Aleta Derecha	1.00	2.47	0.25	1.40	0.86
3+195		Aleta Izquierda	1.00	2.47	0.25	1.40	0.86
3+195		Cabezote	1.00	1.00	1.80	0.38	0.68
3+195		Tuberia	-1.00	0.24			-0.24
							3.8

CONCRETO PARA BOX CULVERT



UBICACIÓN	Costado	Estructura General	Cantidad	Ancho	Altura	Largo	Volumen
3+175	Izquierdo	Placa superior	1.00	0.25	2.50	7.45	4.66
3+175		Placa inferior	1.00	0.25	2.50	7.45	4.66
3+175		Muro derecho	1.00	0.25	1.00	7.45	1.86
3+175		Muro izquierdo	1.00	0.25	1.00	7.45	1.86
							13.0









Observaciones: Se presenta diseño de Boxculvert y verificacion con medidas en campo.
*Se emplea método de redondeo de la norma INV E-823. Según normas y especificaciones 2022 INVIAS Capitulo 6- Estructuras y Drenajes Art. 630 Concreto clase 28 MPA. Numeral 630.6 La unidad de medida del concreto estructural debe ser el metro cúbico (m3), aproximado a la décima (0,1), de mezcla de concreto realmente suministrada.

	Nombre	Cargo	Firma
Revisó	Iván Darío Londoño Celis	Residente de obra	
Revisó Interventoría 2	Héctor Escobar	Inspector Obra Interventoría	
Aceptación Interventoría	Raúl Antonio Pérez G.	Director Interventoría	

OBJETO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA VILLAGARZON - SAN JOSE DEL FRAGUA Y PUENTE SOBRE EL RIO CAQUETA EN LOS DEPARTAMENTOS DE PUTUMAYO, CAUCA Y CAQUETA EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA VIAS PARA LA CONEXION DE TERRITORIOS, EL CRECIMIENTO SOSTENIBLE Y LA REACTIVACIÓN 2.0


Consorcio Vías Colombia 055

MEMORIA DE CALCULO ITEM 630.6 CONCRETO CLASE 14 MPA

CONTRATO N°:	CONTRATO 985 DE 2021	PERIODO:	1 al 31 DE JULIO DE 2024
CONTRATISTA:	CONSORCIO VIAS COLOMBIA 055	INTERVENTORÍA:	CONSORCIO VIAL JAC 2022
DIRECTOR DE OBRA:	ING. RUBÉN DARIO FUENTES PEÑA	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA:	ING. RAÚL ANTONIO PÉREZ G.
TRAMO:	VILLAGARZON - SAN JOSE DEL FRAGUA Y PUENTE SOBRE EL RIO CAQUETA		

UNIDAD DE MEDIDA: M3 TOTAL **0.4**

CONCRETO DE LIMPIEZA PARA DESCOLE ALCANTARILLA



ALZADO
ENCOLE / DESCOLE T1
ALCANTARILLA

Ubicación	Elemento	Estructura	Costado	Ancho	Altura	Largo	Volumen
3+245	ENCOLE	Dentellon 1	Izquierdo	2.32	0.05	2.60	0.300
		Placa inferiror	Izquierdo	0.80	0.05	3.00	0.120
							0.4







Observaciones:
Se presenta diseño de Alcantarilla y verificacion con medidas en campo.
*Se emplea método de redondeo de la norma INV E-823. Según normas y especificaciones 2022 INVIAS Capitulo 6- Estructuras y Drenajes Art. 630 Concreto clase 14 MPA. Numeral 630.6 La unidad de medida del concreto estructural debe ser el metro cúbico (m3), aproximado a la décima (0,1), de mezcla de concreto realmente suministrada.

	Nombre	Cargo	Firma
Revisó	Iván Darío Londoño Celis	Residente de obra	
Revisó Interventoría 2	Héctor Escobar	Inspector Obra Interventoría	
Aceptación Interventoría	Raúl Antonio Pérez G.	Director Interventoría	

OBJETO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA VILLAGARZON - SAN JOSE DEL FRAGUA Y PUENTE SOBRE EL RIO CAQUETA EN LOS DEPARTAMENTOS DE PUTUMAYO, CAUCA Y CAQUETA EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA VIAS PARA LA CONEXION DE TERRITORIOS, EL CRECIMIENTO SOSTENIBLE Y LA REACTIVACIÓN 2.0


Consorcio Vías Colombia 055


MEMORIA DE CALCULO ITEM 640.1 ACERO DE REFUERZO Fy=420 Mpa.


CONTRATO N°:	CONTRATO 985 DE 2021	PERIODO:	1 al 31 DE JULIO DE 2024
CONTRATISTA:	CONSORCIO VIAS COLOMBIA 055	INTERVENTORÍA:	CONSORCIO VIAL JAC 2022
DIRECTOR DE OBRA:	ING. RUBEN DARIO FUENTES PEÑA	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA:	ING. RAUL ANTONIO PEREZ G.
TRAMO:	VILLAGARZON - SAN JOSE DEL FRAGUA Y PUENTE SOBRE EL RIO CAQUETA		

UNIDAD DE MEDIDA: KG TOTAL **744**

ACERO DE REFUERZO Fy=420 Mpa. PARA ENCOLE Y DESCOLE ALCANTARILLA

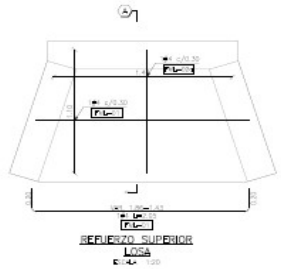

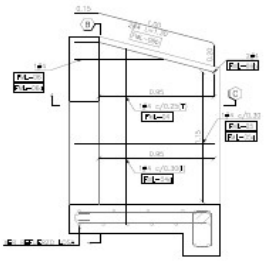

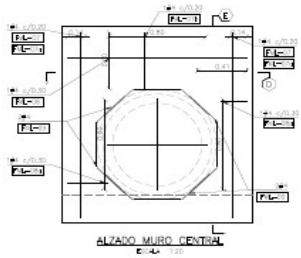

PR 3+245 **MARGEN** Izquierda

POSICIÓN	UBICACIÓN	No VARILLA	LONGITUD PARCIAL	PESO VARILLA (Kg/m)	CANTIDAD	LONGITUD TOTAL	PESO (Kg)
FML-01	Losa inferior	5	1.88	1.552	1	1.88	2.92
FML-01	Losa inferior	5	1.99	1.552	1	1.99	3.09
FML-01	Losa inferior	5	2.11	1.552	1	2.11	3.27
FML-01	Losa inferior	5	2.23	1.552	1	2.23	3.46
FML-01	Losa inferior	5	2.35	1.552	1	2.35	3.65
FML-01	Losa inferior	5	2.47	1.552	1	2.47	3.83
FML-01	Losa inferior	5	2.59	1.552	1	2.59	4.02
FML-01	Losa inferior	5	2.71	1.552	1	2.71	4.21
FML-01	Losa inferior	5	2.82	1.552	1	2.82	4.38
FML-01	Losa inferior	5	2.94	1.552	1	2.94	4.56
FML-01	Losa inferior	5	3.06	1.552	1	3.06	4.75
FML-01	Losa inferior	5	3.19	1.552	1	3.19	4.95
FML-01a	Losa inferior	4	1.88	0.994	1	1.88	1.87
FML-01a	Losa inferior	4	2.06	0.994	1	2.06	2.05
FML-01a	Losa inferior	4	2.25	0.994	1	2.25	2.24
FML-01a	Losa inferior	4	2.44	0.994	1	2.44	2.43
FML-01a	Losa inferior	4	2.62	0.994	1	2.62	2.60
FML-01a	Losa inferior	4	2.81	0.994	1	2.81	2.79
FML-01a	Losa inferior	4	3	0.994	1	3.00	2.98
FML-01a	Losa inferior	4	3.19	0.994	1	3.19	3.17
FML-01b	Dentellón	5	2.92	1.552	2	5.84	9.06
FML-01c	Dentellón	4	2.92	0.994	2	5.84	5.80
FML-02	Losa inferior	4	2.79	0.994	6	16.74	16.64
FML-02	Losa inferior	4	1.52	0.994	2	3.04	3.02
FML-02a	Losa inferior	4	2.79	0.994	6	16.74	16.64
FML-02a	Losa inferior	4	1.52	0.994	2	3.04	3.02
FML-03	Dentellón	4	1.2	0.994	10	12.00	11.93
FML-04	Aletas	4	2.22	0.994	2	4.44	4.41
FML-04	Aletas	4	2.17	0.994	2	4.34	4.31
FML-04	Aletas	4	2.12	0.994	2	4.24	4.21
FML-04	Aletas	4	2.06	0.994	2	4.12	4.10
FML-04	Aletas	4	2.01	0.994	2	4.02	4.00
FML-04	Aletas	4	1.96	0.994	2	3.92	3.90
FML-04	Aletas	4	1.907	0.994	2	3.81	3.79
FML-04	Aletas	4	1.854	0.994	2	3.71	3.69
FML-04	Aletas	4	1.8	0.994	2	3.60	3.58
FML-04	Aletas	4	1.75	0.994	2	3.50	3.48
FML-04	Aletas	4	1.69	0.994	2	3.38	3.36
FML-04	Aletas	4	1.64	0.994	2	3.28	3.26
FML-04	Aletas	4	1.59	0.994	2	3.18	3.16
FML-04	Aletas	4	1.53	0.994	2	3.06	3.04
FML-04	Aletas	4	1.48	0.994	2	2.96	2.94
FML-04	Aletas	4	1.43	0.994	2	2.86	2.84
FML-04a	Aletas	4	2.13	0.994	2	4.26	4.23
FML-04a	Aletas	4	2.03	0.994	2	4.06	4.04
FML-04a	Aletas	4	1.93	0.994	2	3.86	3.84
FML-04a	Aletas	4	1.83	0.994	2	3.66	3.64
FML-04a	Aletas	4	1.73	0.994	2	3.46	3.44
FML-04a	Aletas	4	1.63	0.994	2	3.26	3.24
FML-04a	Aletas	4	1.53	0.994	2	3.06	3.04
FML-04a	Aletas	4	1.43	0.994	2	2.86	2.84
FML-05	Aletas	4	2.87	0.994	8	22.96	22.82
FML-05a	Aletas	4	2.87	0.994	8	22.96	22.82
FML-06	Aletas	4	2.48	0.994	2	4.96	4.93
FML-06	Aletas	4	2.48	0.994	2	4.96	4.93
FML-06	Aletas	4	2.02	0.994	2	4.04	4.02
FML-06	Aletas	4	2.02	0.994	2	4.04	4.02
FML-06	Aletas	4	1.72	0.994	2	3.44	3.42
FML-06	Aletas	4	1.72	0.994	2	3.44	3.42
FML-06a	Aletas	4	1.27	0.994	2	2.54	2.52
FML-06a	Aletas	4	1.27	0.994	2	2.54	2.52
FML-06a	Aletas	4	0.96	0.994	2	1.92	1.91
FML-06a	Aletas	4	0.96	0.994	2	1.92	1.91
FML-06b	Aletas	4	3.07	0.994	4	12.28	12.21
FML-07	Cabezote	4	2.22	0.994	4	8.88	8.83
FML-07a	Cabezote	4	2.22	0.994	4	8.88	8.83
FML-07b	Cabezote	4	1.94	0.994	6	11.64	11.57
FML-08	Cabezote	4	1.92	0.994	8	15.36	15.27
FML-08a	Cabezote	4	0.92	0.994	6	5.52	5.49
FML-08a	Cabezote	4	1.46	0.994	4	5.84	5.80
FML-09	Cabezote	4	1.3	0.994	4	5.20	5.17
							372

OBJETO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA VILLAGARZON - SAN JOSE DEL FRAGUA Y PUENTE SOBRE EL RIO CAQUETA EN LOS DEPARTAMENTOS DE PUTUMAYO, CAUCA Y CAQUETA EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA VIAS PARA LA CONEXION DE TERRITORIOS, EL CRECIMIENTO SOSTENIBLE Y LA REACTIVACIÓN 2.0

Consorcio Vías Colombia 055

MEMORIA DE CALCULO ITEM 640.1 ACERO DE REFUERZO Fy=420 Mpa.

CONTRATO N°: CONTRATO 985 DE 2021
CONTRATISTA: CONSORCIO VIAS COLOMBIA 055
DIRECTOR DE OBRA: ING. RUBEN DARIO FUENTES PEÑA
TRAMO: VILLAGARZON - SAN JOSE DEL FRAGUA Y PUENTE SOBRE EL RIO CAQUETA

PERIODO: 1 al 31 DE JULIO DE 2024
INTERVENTORÍA: CONSORCIO VIAL JAC 2022
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA: ING. RAUL ANTONIO PEREZ G.

PR 3+195 **MARGEN** Izquierda

POSICIÓN	UBICACIÓN	No VARILLA	LONGITUD PARCIAL	PESO VARILLA (Kg/m)	CANTIDAD	LONGITUD TOTAL	PESO (Kg)
FML-01	Losa inferior	5	1.88	1.552	1	1.88	2.92
FML-01	Losa inferior	5	1.99	1.552	1	1.99	3.09
FML-01	Losa inferior	5	2.11	1.552	1	2.11	3.27
FML-01	Losa inferior	5	2.23	1.552	1	2.23	3.46
FML-01	Losa inferior	5	2.35	1.552	1	2.35	3.65
FML-01	Losa inferior	5	2.47	1.552	1	2.47	3.83
FML-01	Losa inferior	5	2.59	1.552	1	2.59	4.02
FML-01	Losa inferior	5	2.71	1.552	1	2.71	4.21
FML-01	Losa inferior	5	2.82	1.552	1	2.82	4.38
FML-01	Losa inferior	5	2.94	1.552	1	2.94	4.56
FML-01	Losa inferior	5	3.06	1.552	1	3.06	4.75
FML-01	Losa inferior	5	3.19	1.552	1	3.19	4.95
FML-01a	Losa inferior	4	1.88	0.994	1	1.88	1.87
FML-01a	Losa inferior	4	2.06	0.994	1	2.06	2.05
FML-01a	Losa inferior	4	2.25	0.994	1	2.25	2.24
FML-01a	Losa inferior	4	2.44	0.994	1	2.44	2.43
FML-01a	Losa inferior	4	2.62	0.994	1	2.62	2.60
FML-01a	Losa inferior	4	2.81	0.994	1	2.81	2.79
FML-01a	Losa inferior	4	3	0.994	1	3.00	2.98
FML-01a	Losa inferior	4	3.19	0.994	1	3.19	3.17
FML-01b	Dentellón	5	2.92	1.552	2	5.84	9.06
FML-01c	Dentellón	4	2.92	0.994	2	5.84	5.80
FML-02	Losa inferior	4	2.79	0.994	6	16.74	16.64
FML-02	Losa inferior	4	1.52	0.994	2	3.04	3.02
FML-02a	Losa inferior	4	2.79	0.994	6	16.74	16.64
FML-02a	Losa inferior	4	1.52	0.994	2	3.04	3.02
FML-03	Dentellón	4	1.2	0.994	10	12.00	11.93
FML-04	Aletas	4	2.22	0.994	2	4.44	4.41
FML-04	Aletas	4	2.17	0.994	2	4.34	4.31
FML-04	Aletas	4	2.12	0.994	2	4.24	4.21
FML-04	Aletas	4	2.06	0.994	2	4.12	4.10
FML-04	Aletas	4	2.01	0.994	2	4.02	4.00
FML-04	Aletas	4	1.96	0.994	2	3.92	3.90
FML-04	Aletas	4	1.907	0.994	2	3.81	3.79
FML-04	Aletas	4	1.854	0.994	2	3.71	3.69
FML-04	Aletas	4	1.8	0.994	2	3.60	3.58
FML-04	Aletas	4	1.75	0.994	2	3.50	3.48
FML-04	Aletas	4	1.69	0.994	2	3.38	3.36
FML-04	Aletas	4	1.64	0.994	2	3.28	3.26
FML-04	Aletas	4	1.59	0.994	2	3.18	3.16
FML-04	Aletas	4	1.53	0.994	2	3.06	3.04
FML-04	Aletas	4	1.48	0.994	2	2.96	2.94
FML-04	Aletas	4	1.43	0.994	2	2.86	2.84
FML-04a	Aletas	4	2.13	0.994	2	4.26	4.23
FML-04a	Aletas	4	2.03	0.994	2	4.06	4.04
FML-04a	Aletas	4	1.93	0.994	2	3.86	3.84
FML-04a	Aletas	4	1.83	0.994	2	3.66	3.64
FML-04a	Aletas	4	1.73	0.994	2	3.46	3.44
FML-04a	Aletas	4	1.63	0.994	2	3.26	3.24
FML-04a	Aletas	4	1.53	0.994	2	3.06	3.04
FML-04a	Aletas	4	1.43	0.994	2	2.86	2.84
FML-05	Aletas	4	2.87	0.994	8	22.96	22.82
FML-05a	Aletas	4	2.87	0.994	8	22.96	22.82
FML-06	Aletas	4	2.48	0.994	2	4.96	4.93
FML-06	Aletas	4	2.48	0.994	2	4.96	4.93
FML-06	Aletas	4	2.02	0.994	2	4.04	4.02
FML-06	Aletas	4	2.02	0.994	2	4.04	4.02
FML-06	Aletas	4	1.72	0.994	2	3.44	3.42
FML-06	Aletas	4	1.72	0.994	2	3.44	3.42
FML-06a	Aletas	4	1.27	0.994	2	2.54	2.52
FML-06a	Aletas	4	1.27	0.994	2	2.54	2.52
FML-06a	Aletas	4	0.96	0.994	2	1.92	1.91
FML-06a	Aletas	4	0.96	0.994	2	1.92	1.91
FML-06b	Aletas	4	3.07	0.994	4	12.28	12.21
FML-07	Cabezote	4	2.22	0.994	4	8.88	8.83
FML-07a	Cabezote	4	2.22	0.994	4	8.88	8.83
FML-07b	Cabezote	4	1.94	0.994	6	11.64	11.57
FML-08	Cabezote	4	1.92	0.994	8	15.36	15.27
FML-08a	Cabezote	4	0.92	0.994	6	5.52	5.49
FML-08a	Cabezote	4	1.46	0.994	4	5.84	5.80
FML-09	Cabezote	4	1.3	0.994	4	5.20	5.17
TOTAL ACERO ALCANTARILLA							**372**

OBJETO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA VILLAGARZON - SAN JOSE DEL FRAGUA Y PUENTE SOBRE EL RIO CAQUETA EN LOS DEPARTAMENTOS DE PUTUMAYO, CAUCA Y CAQUETA EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA VIAS PARA LA CONEXION DE TERRITORIOS, EL CRECIMIENTO SOSTENIBLE Y LA REACTIVACIÓN 2.0

Consorcio Vías Colombia 055

MEMORIA DE CALCULO ITEM 640.1 ACERO DE REFUERZO Fy=420 Mpa.

CONTRATO N°:	CONTRATO 985 DE 2021	PERIODO:	1 al 31 DE JULIO DE 2024
CONTRATISTA:	CONSORCIO VIAS COLOMBIA 055	INTERVENTORÍA:	CONSORCIO VIAL JAC 2022
DIRECTOR DE OBRA:	ING. RUBEN DARIO FUENTES PEÑA	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA:	ING. RAUL ANTONIO PEREZ G.
TRAMO:	VILLAGARZON - SAN JOSE DEL FRAGUA Y PUENTE SOBRE EL RIO CAQUETA		







Observaciones:
Se presenta diseño de Alcantarilla y verificacion con medidas en campo.
*Se emplea método de redondeo de la norma INV E-823. Según normas y especificaciones 2022 INVIAS Capitulo 6- Estructuras y Drenajes Art. 640 Acero de refuerzo fy=420 Mpa. Numeral 640.6 La unidad de medida debe ser el kilogramo (kg), aproximado al entero.

	Nombre	Cargo	Firma
Revisó	Iván Darío Londoño Celis	Residente de obra	
Revisó Interventoría 2	Héctor Escobar	Inspector Obra Interventoría	
Aceptación Interventoría	Raúl Antonio Pérez G.	Director Interventoría	

OBJETO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA VILLAGARZON - SAN JOSE DEL FRAGUA Y PUENTE SOBRE EL RIO CAQUETA EN LOS DEPARTAMENTOS DE PUTUMAYO, CAUCA Y CAQUETA EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA VIAS PARA LA CONEXION DE TERRITORIOS, EL CRECIMIENTO SOSTENIBLE Y LA REACTIVACIÓN 2.0

Consorcio Vías Colombia 055

MEMORIA DE CALCULO ITEM 640.1 ACERO DE REFUERZO Fy=420 Mpa.

CONTRATO N°: CONTRATO 985 DE 2021
CONTRATISTA: CONSORCIO VIAS COLOMBIA 055
DIRECTOR DE OBRA: ING. RUBEN DARIO FUENTES PEÑA
TRAMO: VILLAGARZON - SAN JOSE DEL FRAGUA Y PUENTE SOBRE EL RIO CAQUETA

PERIODO: 1 al 31 DE JULIO DE 2024
INTERVENTORÍA: CONSORCIO VIAL JAC 2022
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA: ING. RAUL ANTONIO PEREZ G.

UNIDAD DE MEDIDA: KG TOTAL **993**

ACERO DE REFUERZO Fy=420 Mpa. PARA BOX CULVERT

PR 3+175 **MARGEN** Izquierda

POSICIÓN	UBICACIÓN	No VARILLA	LONGITUD PARCIAL	PESO VARILLA (Kg/m)	CANTIDAD	LONGITUD TOTAL	PESO (Kg)
FML-01b	Placa inferior	4	2.84	0.994	37	105.08	104.45
FML-01	Placa inferior	4	5.93	0.994	37	219.41	218.09
FML-02	Placa inferior	4	8	0.994	18	144.00	143.14
FML-01c	Muro izquierdo	4	1.8	0.994	37	66.60	66.20
FML-02	Muro izquierdo	4	8	0.994	8	64.00	63.62
FML-01c	Muro derecho	4	1.8	0.994	37	66.60	66.20
FML-02	Muro derecho	4	8	0.994	8	64.00	63.62
FML-01b	Placa superior	4	2.84	0.994	37	105.08	104.45
FML-02	Placa superior	4	8	0.994	18	144.00	143.14
FML-01	Separadores	4	1.1	0.994	18	19.80	19.68
							993









Observaciones:
Se presenta diseño de Alcantarilla y verificacion con medidas en campo.
*Se emplea método de redondeo de la norma INV E-823. Según normas y especificaciones 2022 INVIAS Capitulo 6- Estructuras y Drenajes Art. 640 Acero de refuerzo fy=420 Mpa. Numeral 640.6 La unidad de medida debe ser el kilogramo (kg), aproximado al entero.

	Nombre	Cargo	Firma
Revisó	Iván Darío Londoño Celis	Residente de obra	
Revisó Interventoría 2	Héctor Escobar	Inspector Obra Interventoría	
Aceptación Interventoría	Raúl Antonio Pérez G.	Director Interventoría	

OBJETO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA VILLAGARZON - SAN JOSE DEL FRAGUA Y PUENTE SOBRE EL RIO CAQUETA EN LOS DEPARTAMENTOS DE PUTUMAYO, CAUCA Y CAQUETA EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA VIAS PARA LA CONEXION DE TERRITORIOS, EL CRECIMIENTO SOSTENIBLE Y LA REACTIVACIÓN 2.0

Consorcio Vías Colombia 055

MEMORIA DE CALCULO ITEM 640.1 ACERO DE REFUERZO Fy=420 Mpa.

CONTRATO N°: CONTRATO 985 DE 2021
CONTRATISTA: CONSORCIO VIAS COLOMBIA 055
DIRECTOR DE OBRA: ING. RUBEN DARIO FUENTES PEÑA
TRAMO: VILLAGARZON - SAN JOSE DEL FRAGUA Y PUENTE SOBRE EL RIO CAQUETA

PERIODO: 1 al 31 DE JULIO DE 2024
INTERVENTORÍA: CONSORCIO VIAL JAC 2022
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA: ING. RAUL ANTONIO PEREZ G.

UNIDAD DE MEDIDA: KG TOTAL **49,996**

ACERO DE REFUERZO Fy=420 Mpa. PARA PILOTES

CUADRO DE DESPIECE PILOTES ø1.80m L=27.00m CANTIDADES PARA: 1 (SON:2)

POSC.	No.	N° PIEZAS	LONGITUD (m) PARCIAL	FORMA L=(m)	LONGITUD TOTAL (m)
1	5	366	6.00	R0.81	2196.37
1a	6	73	6.00	R0.81	438.07
2	10	32	12.00	11.55	384.00
3	10	16	12.00	12.00	192.00
3a	10	16	9.00	9.00	144.00
4	10	16	8.55	8.55	136.80
4a	10	16	11.55	11.55	184.80
5	8	15	12.00	12.00	180.00
6	8	15	6.00	6.00	90.00

PILA ESTRIBO 1 **PILOTE** 1

POSICIÓN	No VARILLA	LONGITUD PARCIAL	PESO VARILLA (Kg/m)	CANTIDAD	LONGITUD TOTAL	PESO (Kg)
1	5	6.00	1.56	366	2196.00	3425.76
1a	6	6.00	2.25	73	438.00	985.50
2	10	12.00	6.40	32	384.00	2457.60
3	10	12.00	6.40	16	192.00	1228.80
3a	10	9.00	6.40	16	144.00	921.60
4	10	8.55	6.40	16	136.80	875.52
4a	10	11.55	6.40	16	184.80	1182.72
5	8	12.00	4.00	15	180.00	720.00
6	8	6.00	4.00	15	90.00	360.00
				TOTAL ACERO PILOTE 1 ESTRIBO 1		12158.00
				INSUMO ACERO TOTAL PILOTE 1 ESTRIBO 1 (94%) (ACTA DE OBRA No. 25)		11429.00
				INSTALACIÓN ACERO PILOTE 1 ESTRIBO 1 (6%)		729.00

PILA ESTRIBO 1 **PILOTE** 2

POSICIÓN	No VARILLA	LONGITUD PARCIAL	PESO VARILLA (Kg/m)	CANTIDAD	LONGITUD TOTAL	PESO (Kg)
1	5	6.00	1.56	366	2196.00	3425.76
1a	6	6.00	2.25	73	438.00	985.50
2	10	12.00	6.40	32	384.00	2457.60
3	10	12.00	6.40	16	192.00	1228.80
3a	10	9.00	6.40	16	144.00	921.60
4	10	8.55	6.40	16	136.80	875.52
4a	10	11.55	6.40	16	184.80	1182.72
5	8	12.00	4.00	15	180.00	720.00
6	8	6.00	4.00	15	90.00	360.00
				TOTAL ACERO PILOTE 1 ESTRIBO 1		12158.00
				INSUMO ACERO TOTAL PILOTE 1 ESTRIBO 1 (94%) (ACTA DE OBRA No. 25)		11429.00
				INSTALACIÓN ACERO PILOTE 1 ESTRIBO 1 (6%)		729.00

CUADRO DE DESPIECE PILOTES ø1.80m L=28.00m CANTIDADES PARA: 1 (SON:4)

POSC.	No.	N° PIEZAS	LONGITUD (m) PARCIAL	FORMA L=(m)	LONGITUD TOTAL (m)
1	5	400	6.00	R0.81	2400.40
1a	6	73	6.00	R0.81	437.71
2	10	32	12.00	11.55	384.00
3	10	16	12.00	12.00	192.00
3a	10	32	9.00	9.00	288.00
4	10	16	9.55	9.55	152.80
4a	10	16	5.10	5.10	81.60
5	8	15	12.00	12.00	180.00
6	8	15	6.00	6.00	90.00

PILA 1' **PILOTE** 1

POSICIÓN	No VARILLA	LONGITUD PARCIAL	PESO VARILLA (Kg/m)	CANTIDAD	LONGITUD TOTAL	PESO (Kg)
1	5	6.00	1.56	400	2400.00	3744.00
1a	6	6.00	2.25	73	438.00	985.50
2	10	12.00	6.40	32	384.00	2457.60
3	10	12.00	6.40	16	192.00	1228.80
3a	10	9.00	6.40	32	288.00	1843.20
4	10	9.55	6.40	16	152.80	977.92
4a	10	5.10	6.40	16	81.60	522.24
5	8	12.00	4.00	15	180.00	720.00
6	8	6.00	4.00	15	90.00	360.00
				TOTAL ACERO PILOTE 1 ESTRIBO 1		12839.00
				INSUMO ACERO TOTAL PILOTE 1 PILA 1' (94%) (ACTA DE OBRA No. 25)		12069.00
				INSTALACIÓN ACERO PILOTE 1 PILA 1' (6%)		770.00

PILA 1' **PILOTE** 2

POSICIÓN	No VARILLA	LONGITUD PARCIAL	PESO VARILLA (Kg/m)	CANTIDAD	LONGITUD TOTAL	PESO (Kg)
1	5	6.00	1.56	400	2400.00	3744.00
1a	6	6.00	2.25	73	438.00	985.50
2	10	12.00	6.40	32	384.00	2457.60
3	10	12.00	6.40	16	192.00	1228.80
3a	10	9.00	6.40	32	288.00	1843.20
4	10	9.55	6.40	16	152.80	977.92
4a	10	5.10	6.40	16	81.60	522.24
5	8	12.00	4.00	15	180.00	720.00
6	8	6.00	4.00	15	90.00	360.00
				TOTAL ACERO PILOTE 12 ESTRIBO 1		12839.00
				INSUMO ACERO TOTAL PILOTE 2 PILA 1' (94%) (ACTA DE OBRA No. 25)		12069.00
				INSTALACIÓN ACERO PILOTE 2 PILA 1' (6%)		770.00

OBJETO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA VILLAGARZON - SAN JOSE DEL FRAGUA Y PUENTE SOBRE EL RIO CAQUETA EN LOS DEPARTAMENTOS DE PUTUMAYO, CAUCA Y CAQUETA EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA VIAS PARA LA CONEXION DE TERRITORIOS, EL CRECIMIENTO SOSTENIBLE Y LA REACTIVACIÓN 2.0

Consorcio Vías Colombia 055

MEMORIA DE CALCULO ITEM 640.1 ACERO DE REFUERZO Fy=420 Mpa.

CONTRATO N°:	CONTRATO 985 DE 2021	PERIODO:	1 al 31 DE JULIO DE 2024
CONTRATISTA:	CONSORCIO VIAS COLOMBIA 055	INTERVENTORÍA:	CONSORCIO VIAL JAC 2022
DIRECTOR DE OBRA:	ING. RUBEN DARIO FUENTES PEÑA	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA:	ING. RAÚL ANTONIO PEREZ G.
TRAMO:	VILLAGARZON - SAN JOSE DEL FRAGUA Y PUENTE SOBRE EL RIO CAQUETA		

CUADRO DE DESPIECE PILOTES ø1.80m
L=30.00m CANTIDADES PARA: 1 (SON:2)

POSC.	No.	N° PIEZAS	LONGITUD (m) PARCIAL	FORMA L=(m)	LONGITUD TOTAL (m)
1	5	454	6.00	R0.81	2724.45
1a	6	73	6.00	R0.81	438.07
2	10	32	12.00	11.55	384.00
3	10	16	6.00	6.00	96.00
3a	10	48	9.00	9.00	432.00
4	10	16	7.10	7.10	113.60
4a	10	16	10.10	10.10	161.60
5	8	32	12.00	12.00	384.00
6	8	32	9.00	9.00	288.00

PILA 1 **PILOTE** 1

POSICIÓN	No VARILLA	LONGITUD PARCIAL	PESO VARILLA (Kg/m)	CANTIDAD	LONGITUD TOTAL	PESO (Kg)
1	5	6.00	1.56	341	2046.00	3191.76
					TOTAL ACERO PILOTE 1 PILA 1	3192.00
					INSUMO ACERO TOTAL PILOTE 1 PILA 1 (94%) (ACTA DE OBRA No. 25)	3000.00
					INSTALACIÓN ACERO PILOTE 1 PILA 1 (6%)	192.00








Observaciones: Se presenta diseño de Alcantarilla y verificacion con medidas en campo.
*Se emplea método de redondeo de la norma INV E-823. Según normas y especificaciones 2022 INVIAS Capitulo 6- Estructuras y Drenajes Art. 640 Acero de refuerzo fy=420 Mpa. Numeral 640.6 La unidad de medida debe ser el kilogramo (kg), aproximado al entero.

	Nombre	Cargo	Firma
Revisó	Iván Darío Londoño Celis	Residente de obra	
Revisó Interventoría 2	Hector Escobar	Inspector Obra Interventoría	
Aceptación Interventoría	Raúl Antonio Pérez G.	Director Interventoría	

OBJETO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA TRANSVERSAL DE LA MACARENA (MESETAS – LA URIBE) EN EL DEPARTAMENTO DEL META, EN EL MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

MEMORIA DE CÁLCULO ITEM 673.1 GEOTEXTIL TIPO II NO TEJIDO

CONTRATO N°: CONTRATO 985 DE 2021
CONTRATISTA: CONSORCIO VIAS COLOMBIA 055
DIRECTOR DE OBRA: ING. RUBÉN DARIO FUENTES PEÑA
TRAMO: VILLAGARZON - SAN JOSE DEL FRAGUA Y PUENTE SOBRE EL RIO CAQUETA

PERIODO: 1 al 31 DE JULIO DE 2024
INTERVENTORÍA: CONSORCIO VIAL JAC 2022
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA: ING. RAÚL ANTONIO PÉREZ G.

UNIDAD DE MEDIDA: M2 TOTAL **2,085.00**

GEOTEXTIL PARA MEJORAMIENTO DE LA VIA

BORDE	ABSCISA SECCIÓN	SOBRE ANCHO I	LADO IZQUIERDO	BASE	LADO DERECHO	SOBRE ANCHO D	SUMA	PROMEDIO	DISTANCIA	AREA
IZQUIERDO	PR 2 + 800.00	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
IZQUIERDO	PR 2 + 810.00	1	0.566	7.096	0	0	8.662	4.331	10.00	43.31
IZQUIERDO	PR 2 + 820.00	1	0.556	7.123	0	0	8.679	8.6705	10.00	86.71
IZQUIERDO	PR 2 + 830.00	1	0.681	7.869	0	0	9.55	9.1145	10.00	91.15
IZQUIERDO	PR 2 + 840.00	1	0.519	8.213	0	0	9.732	9.641	10.00	96.41
IZQUIERDO	PR 2 + 850.00	1	0.604	7.924	0	0	9.528	9.63	10.00	96.30
IZQUIERDO	PR 2 + 860.00	1	0.512	8.816	0	0	10.328	9.928	10.00	99.28
IZQUIERDO	PR 2 + 870.00	1	0.517	10.008	0	0	11.525	10.9265	10.00	109.27
IZQUIERDO	PR 2 + 880.00	1	0.532	8.91	0	0	10.442	10.9835	10.00	109.84
IZQUIERDO	PR 2 + 890.00	1	0.344	8.94	0	0	10.284	10.363	10.00	103.63
IZQUIERDO	PR 2 + 900.00	0	0	0	0	0	0	5.142	10.00	51.42
										887.3

IZQUIERDO	3260	SOBRE ANCHO I	LADO IZQUIERDO	BASE	LADO DERECHO	SOBRE ANCHO D	SUMA	PROMEDIO	DISTANCIA	AREA
IZQUIERDO	PR 3 + 250.00	1	2.206	12.89	0	0	16.096	16.096	0.00	0.00
IZQUIERDO	PR 3 + 260.00	1	1.305	16.915	0	0	19.22	17.658	10.00	176.58
IZQUIERDO	PR 3 + 270.00	1	1.347	17.538	0	0	19.885	19.5525	10.00	195.53
IZQUIERDO	PR 3 + 280.00	1	0.709	18.166	0	0	19.875	19.88	10.00	198.80
IZQUIERDO	PR 3 + 290.00	1	0.852	18.689	0	0	20.541	20.208	10.00	202.08
IZQUIERDO	PR 3 + 300.00	1	1.121	18.823	0	0	20.944	20.7425	10.00	207.43
IZQUIERDO	PR 3 + 310.00	1	0.793	16.018	0	0	17.811	19.3775	10.00	193.78
IZQUIERDO	PR 3 + 311.33	1	0.738	5.11	0	0	6.848	17.6525	1.33	23.48
										1197.7












Observaciones: Se presenta sección de acuerdo a los diseños y medidas de campo.
*Se emplea método de redondeo de la norma INV E-823. Según normas y especificaciones 2012 INVIAS Capítulo 6- Estructuras y drenajes Art. 673 Subdrenes con geotextil y material granular Numeral 673.6.1 Medida Geotextil "La unidad de medida del geotextil será el metro cuadrado (m2) aproximado a la décima de metro cuadrado, de geotextil medido en obra,"

	Nombre	Cargo	Firma
Revisó	Iván Darío Londoño Celis	Residente de obra	
Revisó Interventoría 1	Jairo Ramiro Cuesvas Muñoz	Topógrafo Interventoría	
Aceptación Interventoría	Raúl Antonio Pérez G.	Director Interventoría	

OBJETO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA VILLAGARZON - SAN JOSE DEL FRAGUA Y PUENTE SOBRE EL RIO CAQUETA EN LOS DEPARTAMENTOS DE PUTUMAYO, CAUCA Y CAQUETA EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA VIAS PARA LA CONEXION DE TERRITORIOS, EL CRECIMIENTO SOSTENIBLE Y LA REACTIVACIÓN 2.0


Consorcio Vías Colombia 055

MEMORIA DE CALCULO ITEM NP-01 CINTA PVC V15 O SIMILAR

CONTRATO N°:	CONTRATO 985 DE 2021	PERIODO:	1 al 31 DE JULIO DE 2024
CONTRATISTA:	CONSORCIO VIAS COLOMBIA 055	INTERVENTORÍA:	CONSORCIO VIAL JAC 2022
DIRECTOR DE OBRA:	ING. RUBEN DARIO FUENTES PEÑA	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA:	ING. RAÚL ANTONIO PEREZ G.
TRAMO:	VILLAGARZON - SAN JOSE DEL FRAGUA Y PUENTE SOBRE EL RIO CAQUETA		

UNIDAD DE MEDIDA: M3 TOTAL **14.9**

CINTA PVC PARA BOX CULVERT



UBICACIÓN	MARGEN	LONG MURO DERECHO	LONG MURO IZQUIERDO	LONG TOTAL
3+175	IZQUIERDO	7.45	7.45	14.90
				14.9







Observaciones: Se presenta diseño de Boxculvert y verificacion con medidas en campo.
*Se emplea método de redondeo de la norma INV E-823. Según normas y especificaciones 2022 INVIAS Capitulo 6- Estructuras y Drenajes Art. 630 Concreto clase 28 MPA. Numeral 630.6 La unidad de medida del concreto estructural debe ser el metro cúbico (m3), aproximado a la décima (0,1), de mezcla de concreto realmente suministrada.

	Nombre	Cargo	Firma
Revisó	Iván Darío Londoño Celis	Residente de obra	
Revisó Interventoría 2	Héctor Escobar	Inspector Obra Interventoría	
Aceptación Interventoría	Raúl Antonio Pérez G.	Director Interventoría	

OBJETO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA VILLAGARZON - SAN JOSE DEL FRAGUA Y PUENTE SOBRE EL RIO CAQUETA EN LOS DEPARTAMENTOS DE PUTUMAYO, CAUCA Y CAQUETA EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA VIAS PARA LA CONEXION DE TERRITORIOS, EL CRECIMIENTO SOSTENIBLE Y LA REACTIVACIÓN 2.0

Consorcio Vías Colombia 055

MEMORIA DE CALCULO ITEM NP-11. HUMECTACION DE VIA (Consumo Agua = 0.4 l/m2 - Lado Putumayo)

CONTRATO N°: CONTRATO 985 DE 2021
CONTRATISTA: CONSORCIO VIAS COLOMBIA 055
DIRECTOR DE OBRA: ING. RUBEN DARIO FUENTES PEÑA
TRAMO: VILLAGARZON - SAN JOSE DEL FRAGUA Y PUENTE SOBRE EL RIO CAQUETA

PERIODO: 1 al 31 DE MAYO DE 2024
INTERVENTORÍA: CONSORCIO VIAL JAC 2022
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA: ING. RAUL ANTONIO PEREZ G.

UNIDAD DE MEDIDA: KG TOTAL **21.9**

FECHA / CENTRO POBLADO	El Porvenir	San Isidro	Jordania	Meson	Villa Gloria	La Pasera	San Pedro	La Padria	El Jauno	Dist Dia	Litros	Lts / m2	Area m2	Ancho Promedio	Dia
miércoles, 13 de marzo de 2024	750	750	0	0	400	660	1020	420	2000	6000	14640	0.40	36600	6.1	0.81
viernes, 15 de marzo de 2024	0	750	0	0	0	660	1020	420	2000	4850	11834	0.40	29585	6.1	0.65
sábado, 16 de marzo de 2024	750	750	700	750	400	660	1020	420	0	5450	13298	0.40	33245	6.1	0.73
lunes, 18 de marzo de 2024	750	750	700	750	400	660	1020	420	2000	7450	18178	0.40	45445	6.1	1.00
martes, 19 de marzo de 2024	0	750	0	750	400	660	1020	420	2000	6000	14640	0.40	36600	6.1	0.81
miércoles, 3 de abril de 2024	0	750	0	750	0	0	0	0	0	1500	3660	0.40	9150	6.1	0.20
viernes, 5 de abril de 2024	0	750	0	0	0	0	0	420	2000	3170	7735	0.40	19337	6.1	0.43
martes, 9 de abril de 2024	0	750	700	750	400	0	1020	420	0	4040	9858	0.40	24644	6.1	0.54
miércoles, 10 de abril de 2024	750	750	0	750	0	0	0	0	0	2250	5490	0.40	13725	6.1	0.30
jueves, 11 de abril de 2024	0	0	0	0	0	0	0	0	2000	2000	4880	0.40	12200	6.1	0.27
viernes, 12 de abril de 2024	750	750	700	0	400	0	0	0	2000	4600	11224	0.40	28060	6.1	0.62
lunes, 15 de abril de 2024	750	750	0	750	400	0	0	0	0	2650	6466	0.40	16165	6.1	0.36
martes, 16 de abril de 2024	0	0	0	750	0	0	0	0	0	750	1830	0.40	4575	6.1	0.10
martes, 23 de abril de 2024	750	0	0	750	400	0	1020	420	0	3340	8150	0.40	20374	6.1	0.45
miércoles, 24 de abril de 2024	750	750	0	750	400	0	1020	420	2000	6090	14860	0.40	37149	6.1	0.82
viernes, 26 de abril de 2024	0	0	0	0	0	0	1020	0	2000	3020	7369	0.40	18422	6.1	0.41
martes, 30 de abril de 2024	0	750	0	750	400	0	1020	420	2000	5340	13030	0.40	32574	6.1	0.72
jueves, 2 de mayo de 2024	0	0	0	750	400	0	1020	420	2000	4590	11200	0.40	27999	6.1	0.62
viernes, 3 de mayo de 2024	750	750	0	0	0	0	0	0	0	1500	3660	0.40	9150	6.1	0.20
sábado, 4 de mayo de 2024	0	750	0	750	400	0	1020	420	2000	5340	13030	0.40	32574	6.1	0.72
lunes, 6 de mayo de 2024	0	750	0	750	400	0	1020	420	2000	5340	13030	0.40	32574	6.1	0.72
viernes, 10 de mayo de 2024	0	750	700	750	400	0	1020	420	2000	6040	14738	0.40	36844	6.1	0.81
sábado, 11 de mayo de 2024	750	750	0	750	400	0	1020	420	2000	6090	14860	0.40	37149	6.1	0.82
jueves, 16 de mayo de 2024	750	0	0	750	400	0	0	0	0	1900	4636	0.40	11590	6.1	0.26
viernes, 17 de mayo de 2024	0	750	0	0	400	0	1020	420	2000	4590	11200	0.40	27999	6.1	0.62
sábado, 18 de mayo de 2024	750	750	0	0	400	0	0	0	0	1900	4636	0.40	11590	6.1	0.26
martes, 21 de mayo de 2024	750	750	700	750	400	0	1020	420	2000	6790	16568	0.40	41419	6.1	0.91
viernes, 24 de mayo de 2024	750	750	0	0	0	0	1020	0	2000	4520	11029	0.40	27572	6.1	0.61
lunes, 27 de mayo de 2024	750	750	0	750	400	0	0	0	0	2650	6466	0.40	16165	6.1	0.36
jueves, 6 de junio de 2024	0	0	700	0	0	0	0	0	0	700	1708	0.40	4270	6.1	0.09
sábado, 8 de junio de 2024	0	750	0	0	400	0	1020	420	0	2590	6320	0.40	15799	6.1	0.35
miércoles, 12 de junio de 2024	750	0	0	750	400	0	0	420	0	2320	5661	0.40	14152	6.1	0.31
martes, 18 de junio de 2024	750	750	0	0	0	0	0	0	0	1500	3660	0.40	9150	6.1	0.20
sábado, 22 de junio de 2024	750	750	0	0	400	0	0	420	2000	4320	10541	0.40	26352	6.1	0.58
jueves, 27 de junio de 2024	0	750	0	0	400	0	0	420	2000	3570	8711	0.40	21777	6.1	0.48
viernes, 28 de junio de 2024	750	750	0	750	400	0	1020	420	2000	6090	14860	0.40	37149	6.1	0.82
sábado, 29 de junio de 2024	750	0	0	750	400	0	1020	420	0	3340	8150	0.40	20374	6.1	0.45
jueves, 4 de julio de 2024	750	0	0	750	400	0	0	420	0	2320	5661	0.40	14152	6.1	0.31
lunes, 8 de julio de 2024	750	750	0	750	400	0	0	0	0	2650	6466	0.40	16165	6.1	0.36
martes, 9 de julio de 2024	750	750	0	750	400	0	1020	420	0	4090	9980	0.40	24949	6.1	0.55
martes, 16 de julio de 2024	750	0	0	0	0	0	0	0	0	750	1830	0.40	4575	6.1	0.10
viernes, 19 de julio de 2024	750	0	0	0	400	0	0	420	0	1570	3831	0.40	9577	6.1	0.21
martes, 23 de julio de 2024	750	0	0	750	400	0	1020	0	0	2920	7125	0.40	17812	6.1	0.39
miércoles, 24 de julio de 2024	750	750	0	750	400	0	0	0	2000	4650	11346	0.40	28365	6.1	0.62
															21.9







Observaciones:
Se presenta diseño de Alcantarilla y verificacion con medidas en campo.
*Se emplea método de redondeo de la norma INV E-823. Según normas y especificaciones 2022 INVIAS Capitulo 6- Estructuras y Drenajes Art. 640 Acero de refuerzo fy=420 Mpa. Numeral 640.6 La unidad de medida debe ser el kilogramo (kg), aproximado al entero.

	Nombre	Cargo	Firma
Revisó	Iván Darío Londoño Celis	Residente de obra	
Aceptación Interventoría	Raúl Antonio Pérez G.	Director Interventoría	

(logo)	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA PRE-ACTA MENSUAL DE INVERSIÓN AMBIENTAL	

FECHA:	3	7	202

UNIDAD EJECUTORA ______ **DIRECCIÓN TERRITORIAL** ______

PRE-ACTA MENSUAL DE INVERSIÓN AMBIENTAL 25
(Debe corresponder con el No. del Acta de Recibo Parcial de Obra)

1. DATOS DEL PROYECTO

LICENCIADO ______ **Resolución N°** ______ (Indicar N° de Resolución día, mes y año)

NO LICENCIADO (PMA o PAGA) X

CONTRATISTA: CONSORCIO VÍAS COLOMBIA 055

INTERVENTORIA CONSORCIO VIAL JAC 2022

OBJETO "MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA VILLAGARZÓN - SAN JOSÉ DE FRAGUA Y PUENTE SOBRE EL RÍO CAQUETÁ EN LOS DEPARTAMENTOS DE PUTUMAYO, CAUCA Y CAQUETÁ EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE LAS VÍAS PARA LA CONEXIÓN DE TERRITORIOS, EL CRECIMIENTO SOSTENIBLE Y LA REACTIVACIÓN 2,0"

OBJETO "INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA VILLAGARZÓN -SAN JOSÉ DE FRAGUA Y PUENTE SOBRE EL RÍO CAQUETÁ EN LOS DEPARTAMENTOS DE PUTUMAYO, CAUCA Y CAQUETÁ EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA VÍAS PARA LA CONEXIÓN DE TERRITORIOS, EL CRECIMIENTO SOSTENIBLE Y LA REACTIVACIÓN 2.0"

N° CONTRATO 985 de 2022 **FECHA DE INICIO** 26/07/2022 **FECHA DE TERMINACIÓN** 31/07/2030

N° CONTRATO 988 de 2022 **FECHA DE INICIO** 26/07/2022 **FECHA DE TERMINACIÓN** 31/07/2030

Valor Inicial Contrato Obra	$	319.366.761.001,00
Valor Adicional No.	$	-
Valor Adicional No.	$	-
Valor Adicional No.	$	-
Valor Total	$	319.366.761.001,00

Valor Provisión Ambiental Inicial	
Valor Adicional Provisión Ambiental No.	
Valor Adicional Provisión Ambiental No.	
Valor Adicional Provisión Ambiental No.	
Valor Total Provisión Ambiental	
Valor Provisión Ambiental ejecutado acumulado	
Valor Provisión Ambiental por ejecutar	

Valor Inicial Contrato Interventoría	$	-
Valor Adicional No.	$	-
Valor Adicional No.	$	-
Valor Adicional No.	$	-
Valor Total	$	-

AIU %:	30%
U %:	5%

2. COSTOS DE ACTIVIDADES AMBIENTALES DEL CONTRATO DE OBRA

CODIGO / FICHA	NOMBRE DEL INSUMO O ITEM			MEDIDA A EJECUTAR					CONDICIONES ACTUALIZADAS PLAN DE INVERSIÓN AMBIENTAL N° _____ Fecha _______												EJECUTADO EN EL MES								ACUMULADO EJECUTADO		VALOR POR EJECUTAR		REGISTRO DE CUMPLIMENTO (Anexar soporte correspondiente)	OBSERVACIONES
												VALOR BÁSICO SIN IVA CON CARGO A			VALOR TOTAL IVA CON CARGO A:			TOTAL BASICO MAS IVA CON CARGO A:				VALOR BÁSICO SIN IVA EJECUTADO				TOTAL BASICO MAS IVA CON CARGO A:								
	PROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	CONTROL	PREVENCIÓN	MITIGACIÓN	CORRECCIÓN	COMPENSACIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	VALOR UNITARIO BASICO (sin IVA) ($)	VALOR REEMBOLSO DE GASTOS ($)	VALOR ITEM NO PREVISTO ($)	OTRO	VALOR REEMBOLSO DE GASTOS ($)	VALOR ITEM NO PREVISTO ($)	OTRO	VALOR REEMBOLSO DE GASTOS ($)	VALOR ITEM NO PREVISTO ($)	OTRO	CANTIDAD	VALOR REEMBOLSO DE GASTOS ($)	VALOR ITEM NO PREVISTO ($)	OTRO		VALOR REEMBOLSO DE GASTOS ($)	VALOR ITEM NO PREVISTO ($)	OTRO	CANTIDAD	VALORTOTAL ACUMULADO ($)	CANTIDAD	VALORTOTAL ($)		
												0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0	0,00										

VALOR REEMBOLSO DE GASTOS	0,00
VALOR BASICO GESTION	0,00
VALOR TOTAL BASICO PRE-ACTA	0,00
VALOR IVA	0,00
VALOR TOTAL PRE-ACTA GESTION AMBIENTAL	0,00

Nombre: JORGE EDUARDO DUARTE RODRIGUEZ

Nombre: JORGE ÁLVARO SANCHEZ BLANCO

Nombre : EDGAR DARIO ORTIZ VARGAS

Nombre : JESUS DAVID ANGARITA

CALIDAD INVIAS	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA PRE-ACTA MENSUAL DE INVERSIÓN SOCIAL - SEGUIMIENTO FINAL A LA INVERSIÓN SOCIAL DEL PROYECTO	[illegible]	M[illegible]M[illegible]3[illegible]R[illegible]6
		[illegible]	[illegible]
		[illegible]	[illegible]

TIPO DE DOCUMENTO	PRE-ACTA	PRE-ACTA MENSUAL DE INVERSIÓN SOCIAL No. (coincide con No. Acta de Recibo Parcial de Obra)	14	[illegible]	3[illegible] [illegible] 202[illegible] D[illegible]M[illegible]

1. DATOS DEL PROYECTO

UNIDAD EJECUTORA	[illegible]	OBJETO DEL CONTRATO	"MEJORAMIENTO, M[illegible] [illegible] –SAN [illegible] REACTIVACIÓN 2.0"	No. CONTRATO DE OBRA / AÑO	[illegible]85[illegible]d[illegible]2022
DIRECCIÓN TERRITORIAL	D[illegible]			No. CONTRATO DE INTERVENTORIA / AÑO	[illegible]88[illegible]d[illegible]2022

2. BALANCE DE LA INVERSIÓN SOCIOAMBIENTAL EN EL CONTRATO DE OBRA

NOMBRE DEL INSUMO O ÍTEM		CONDICIONES ACTUALES PLAN DE INVERSIÓN				No. / FECHA			INFORMACIÓN PRE-ACTA MENSUAL					INFORMACIÓN BALANCE DE INVERSIÓN SOCIAL			
PROYECTO	ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO ($)	VALOR BÁSICO GESTIÓN SOCIOAMBIENTAL($)	REEMB	ÍTEM (X)	VALOR GESTIÓN SOCIOAMBIENTAL (incluye OTROS*) ($)	[illegible]	VALOR BÁSICO EJECU. MES ($)	OTROS * (%)	VALOR OTROS MES ($)	[illegible]	[illegible]	VALOR EJECUTADO ACUMULADO ($) **	VALOR POR EJECUTAR ($)	OBSERVACIONES
M[illegible]d[illegible]	[illegible]6[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible].8[illegible]7.252.085,[illegible]6	[illegible].8[illegible]7.252.085,[illegible]6	[illegible]		[illegible].[illegible]53.6[illegible]5.335,00	0	[illegible]	2,5[illegible]	[illegible]	[illegible]	0	[illegible]	[illegible].[illegible]53.6[illegible]5.335,00	
					[illegible]			[illegible]	0	[illegible]	2,5[illegible]	[illegible]	[illegible]	0	[illegible]	[illegible]	
					[illegible]			[illegible]	0	[illegible]	2,5[illegible]	[illegible]	[illegible]	0	[illegible]	[illegible]	
					[illegible]			[illegible]	0	[illegible]	2,5[illegible]	[illegible]	[illegible]	0	[illegible]	[illegible]	
					[illegible]			[illegible]	0	[illegible]	2,5[illegible]	[illegible]	[illegible]	0	[illegible]	[illegible]	

3. BALANCE DE LA INVERSIÓN SOCIOPREDIAL EN EL CONTRATO DE OBRA

NOMBRE DEL INSUMO O ÍTEM		CONDICIONES ACTUALES PLAN DE INVERSIÓN				No. / FECHA			INFORMACIÓN PRE-ACTA MENSUAL					INFORMACIÓN BALANCE DE INVERSIÓN SOCIAL			
PROYECTO	ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO ($)	VALOR BÁSICO GESTIÓN SOCIOPREDIAL($)	REEMB	ÍTEM (X)	VALOR GESTIÓN SOCIOPREDIAL (incluye OTROS*) ($)	[illegible]	VALOR BÁSICO EJECU. MES ($)	OTROS * (%)	VALOR OTROS MES ($)	[illegible]	[illegible]	VALOR EJECUTADO ACUMULADO ($) **	VALOR POR EJECUTAR ($)	OBSERVACIONES
[illegible]r[illegible]d[illegible]	R[illegible]d[illegible]r[illegible]d[illegible]		0	[illegible]	[illegible]	[illegible]			0	[illegible]	0,0[illegible]	[illegible]	[illegible]	0	[illegible]	[illegible]	
			0	[illegible]	[illegible]				0	[illegible]	0,0[illegible]	[illegible]	[illegible]	0	[illegible]	[illegible]	

4. RESUMEN

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
D	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible].[illegible]53.6[illegible]5.335,00	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible].[illegible]53.6[illegible]5.335,00	[illegible]	[illegible]	0,00[illegible]

5. OBSERVACIONES, CONCLUSIONES Y/O RECOMENDACIONES

6. FIRMAS

[illegible]
Representante Legal Contratista ☑ **Apoderado** ☐
M[illegible]r[illegible].[illegible]2[illegible]5[illegible]22[illegible]

[illegible]
Profesional Social Contratista
M[illegible]r[illegible].[illegible]6[illegible]65323[illegible]

[illegible]
Representante Legal Interventoría ☑ **Apoderado** ☐
M[illegible]r[illegible].[illegible]25202[illegible]0058[illegible]D

[illegible]
Profesional Social Interventoría
M[illegible]r[illegible]

NOTAS:

[illegible]
2.[illegible]
3.[illegible]
[illegible]
5.[illegible]2,3[illegible]5[illegible]

[illegible]
[illegible]

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **PRE-ACTA MENSUAL DE GESTIÓN Y ADQUISICIÓN PREDIAL**	CÓDIGO	MASPS-MN1-IN-5-FR-11
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1

FECHA: 31/07/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACION GENERAL

1.UNIDAD EJECUTORA:	SMCN-GRUPO SUR OCCIDENTE	2. DIRECCIÓN TERRITORAL:	PUTUMAYO
3. AÑO **2024**	MES 1 2 3 4 5 6 **7** 8 9 10 11 12	4. FECHA DE ELABORACIÓN	**31/07/2024**
5. LOCALIZACIÓN: Villagarzon - Puerto Bello - San Jose del Fragua	RUTA: 65	TRAMO:	01
6. CONTRATO DE OBRA No:	985 de 2022		
7. OBJETO:	MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA VILLAGARZON - SAN JOSE DEL FRAGUA Y PUENTE SOBRE EL RIO CAQUETA EN LOS DEPARTAMENTOS DE PUTUMAYO, CAUCA Y CAQUETA EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA VIAS PARA LA CONEXION DE TERRITORIOS, EL CRECIMIENTO SOSTENIBLE Y LA REACTIVACIÓN 2.0		
8. CONTRATISTA:	CONSORCIO VIAS COLOMBIA 055	NIT	901.584.983-4
9. INTERVENTOR:	CONSORCIO VIAL JAC 2022	NIT	901.582.956-0
10. CONTRATO DE INTERVENTORÍA No:	988 de 2022		

11. PLAZO INICIAL:	97 meses	12. FECHA DE INICIO:	26/07/2022	13. FECHA DE REANUDACIÓN:	
14. PLAZO ACUMULADO:	97 meses	15. FECHA DE SUSPENSIÓN:		16. FECHA DE VENCIMIENTO:	31/07/2030
17. TIPO DE GESTIÓN:	PREDIAL	18. VR. DE LA GESTIÓN:	$ -	19. VR. PROVISIÓN GESTIÓN PREDIAL:	$ 1.953.695.336,00

II. INFORMACION FINANCIERA

20. VR. INICIAL (INCLUIDO IVA):	$	1.953.695.336,00
21. VR. ANTICIPO:	$	-
22. VR. ADICIÓN No:	$	-
23. VR. ADICIÓN No:	$	-
24. VR. TOTAL ADICIONES:	$	-
25. VR. TOTAL ACUMULADO:	$	1.953.695.336,00

III. INFORMACION BASE LIQUIDACIÓN

1. GESTIÓN MENSUAL PREDIAL (B) (Valor / Cantidad)		**CANTIDAD**	**V/R UNIDAD.**	**TOTAL**
ELABORACIÓN DE FICHA PREDIAL	26. ELABORACIÓN FICHA PREDIAL, COMPONENTE TÉCNICO Y TOPOGRÁFICO CON SOPORTES INMUEBLE	0	$ 1.421.500,00	$ -
	27. ELABORACIÓN DE FICHA PREDIAL, COMPONENTE TÉCNICO Y TOPOGRAFICO CON SOPORTES DEL INMUEBLE + REQUERIMIENTO DE IDENTIFICACIÓN ENCARGO VALUATORIO (RES. 2684/2015)	0	$ 2.842.500,00	$ -
	28. MODIFICAR Y/O ACTUALIZAR FICHA PREDIAL POR RAZON INHERENTE AL PROYECTO, PREVIA AUTORIZACION INVIAS, CON TRABAJO DE CAMPO	0	$ 1.066.000,00	$ -
	29. ELABORACIÓN DE LA FICHA TÉCNICA SIN COMPONENTE TOPOGRÁFICO (TERRENO)	0	$ 355.500,00	$ -
	30. ELABORACION DE LA FICHA PREDIAL CON LOS RESPECTIVOS SOPORTES PARA CONSTRUCCIONES, MEJORAS Y ESPECIES	0	$ 1.095.000,00	$ -
	31. MODIFICAR Y/O ACTUALIZAR FICHA PREDIAL POR RAZON INHERENTE AL PROYECTO, PREVIA AUTORIZACION INVIAS, SIN NECESIDAD DE REALIZAR TRABAJO DE CAMPO	0	$ 821.500,00	$ -
	32. ELABORACIÓN DE LA FICHA TÉCNICA SIN COMPONENTE TOPOGRÁFICO (MEJORA)	0	$ 273.500,00	$ -
ELABORACIÓN DE TÍTULOS	33. ELABORACIÓN DE ESTUDIO DE TÍTULOS PROPIETARIO CON LOS RESPECTIVOS SOPORTES (TERRENO)	0	$ 769.000,00	$ -
	34. AJUSTE AL ESTUDIO DE TÍTULOS POR CAMBIOS EN LA SITUACION JURÍDICA DEL INMUEBLE POSTERIORES A SU APROBACIÓN	0	$ 384.500,00	$ -
	35. ESTUDIO DE TITULOS (DIAGNÓSTICO JURÍDICO) PARA MEJORAS	0	$ 384.500,00	$ -
ACLARACIÓN DE CABIDA Y LINDEROS	36. SOLICITUD ANTE IGAC O AUTORIDAD CATASTRAL CORRESPONDIENTE PARA ACTUALIZACIÓN CABIDA Y/O LINDEROS	0	$ 326.500,00	$ -
	37. LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO DE ÁREA RESTANTE POR HECTÁREA (INCLUYE PLANO CON COORDENADAS GEOGRÁFICAS)	0	$ 221.500,00	$ -
ELABORACIÓN DE AVALUO COMERCIAL	38. ELABORACIÓN DE AVALÚO COMERCIAL PARA INMUEBLES CON PROPIEDAD DEL TERRENO	0	$ 1.366.000,00	$ -
	39. AVALÚO COMERCIAL PARA INMUEBLES CON PROPIEDAD DEL TERRENO + VALORACIÓN COMPONENTES DE LA RESOLUCIÓN MINISTERIO DE TRANSPORTE 2684 DE 2015, CON LOS COMPONENTES DE DAÑO EMERGENTE Y LUCRO CESANTE LIQUIDADO PARA PAGO.	0	$ 2.732.500,00	$ -
	40. ELABORACIÓN DE AVALÚO COMERCIAL PARA MEJORAS SIN TERRENO, CONSTRUCCIONES, ANEXOS Y ESPECIES PARA AVALÚOS CON VALORES SUPERIORES A 2 SMMLV	0	$ 877.000,00	$ -
	41. AVALÚOS ENTRE 1,5 HASTA 2 SMMLV	0	$ 438.500,00	$ -
	42. AVALÚOS ENTRE 1 HASTA 1,5 SMMLV	0	$ 653.000,00	$ -
	43. AVALÚOS ENTRE 0 HASTA 1 SMMLV	0	$ 326.500,00	$ -
1.1. ENAJENACIÓN VOLUNTARIA (Valor / Cantidad)	44. OFERTA DE COMPRA Y NOTIFICACIÓN	0	$ 353.500,00	$ -
	45. INSCRIPCIÓN DE OFERTA DE COMPRA	0	$ 235.500,00	$ -
	46. PERMISO DE INTERVENCIÓN VOLUNTARIO DEBIDAMENTE SUSCRITO X ENTIDAD Y EL TITULAR INSCRITO EN FOLIO MATRÍC. INMOBILIARIA	0	$ 353.500,00	$ -
	47. ELABORACIÓN, LEGALIZACIÓN PROMESA DE COMPRA	0	$ 235.500,00	$ -
	48. TRÁMITE DE PRIMER PAGO – VERIFICACIÓN DE RECIBO A SATISFACCIÓN POR PARTE DEL VENDEDOR	0	$ 118.000,00	$ -
	49. ESCRITURA OTORGADA Y REGISTRADA DE DOMINIO A FAVOR DE INVIAS	0	$ 471.000,00	$ -
	50. TRÁMITE DE PAGO – VERIFICACIÓN DE RECIBO A SATISFACCIÓN DEL ÚLTIMO CONTADO POR PARTE DEL VENDEDOR	0	$ 235.500,00	$ -
	51. RADICACIÓN SOLICITUD ANTE IGAC O CATASTROS DESCENTRALIZADOS PARA ASIGNACIÓN N° PREDIAL NACIONAL Y/O ACTUALIZ. INFORMACIÓN CATASTRAL	0	$ 235.500,00	$ -
1.2. TRÁMITES ADICIONALES PARA INICIO DE EXPROPIACIÓN JUDICIAL (Valor / Cantidad)	52. ELABORACIÓN Y NOTIFICACIÓN DE RESOLUCIÓN DE EXPROPIACIÓN (PREVIO AGOTAMIENTO ETAPA ENAJENACIÓN VOLUNTARIA)	0	$ 327.500,00	$ -
	53. CONTESTACIÓN DE RECURSO DE REPOSICIÓN EN VÍA ADMINISTRATIVA	0	$ 327.500,00	$ -
	54. NOTIFICACIÓN DE RECURSO DE REPOSICIÓN EN VÍA ADMINISTRATIVA	0	$ 109.000,00	$ -
	55. PRESENTACIÓN DEMANDA ADMITIDA CON SOLICITUD ENTREGA ANTICIPADA	0	$ 763.500,00	$ -
	56. ENTREGA REAL Y MATERIAL DEL INMUEBLE POR PARTE DEL JUEZ O QUIEN ESTE COMISIONE	0	$ 654.500,00	$ -
1.3. COMPRA DE MEJORAS PREVIUA AUORIZACION DE SMA (Valor / Cantidad)	57. PROPUESTA COMPRA DE MEJORAS	0	$ 153.000,00	$ -
	58. DOCUMENTO DE COMPRAVENTA DE MEJORAS Y LEGALIZACIÓN	0	$ 306.000,00	$ -
	59. ENTREGA PREDIO LIBRE DE SERVICIOS PÚBLICOS, PREVIO CUMPLIMIENTO REQUISITOS DE DOCUMENTO COMPRAVENTA	0	$ 153.000,00	$ -
	60.TRÁMITE DE PAGO Y RECIBO A SATISFACCIÓN DEL ÚLTIMO CONTADO POR PARTE DEL VENDEDOR	0	$ 153.000,00	$ -
1.4. RESTITUCIÓN DE BIENES DE USO PÚBLICO (Valor / Cantidad)	61. TRÁMITE DE ACCIÓN POLICIVA ANTE AUTORIDAD COMPETENTE LOGRANDO LA RESTITUCIÓN	0	$ 652.500,00	$ -
SUBTOTAL GESTION PREDIAL (1) = Suma casillas 44 a 79		0		$ -
IVA				$ -
VALOR A PAGAR POR GESTIÓN PREDIAL				$ -

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA PRE-ACTA MENSUAL DE GESTIÓN Y ADQUISICIÓN PREDIAL	CÓDIGO	MASPS-MN1-IN-5-FR-11
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1

FECHA: 31/07/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACION GENERAL

1.UNIDAD EJECUTORA:	SMCN-GRUPO SUR OCCIDENTE	2. DIRECCIÓN TERRITORIAL:	PUTUMAYO
3. AÑO **2024**	MES 1 2 3 4 5 6 **7** 8 9 10 11 12	4. FECHA DE ELABORACIÓN	**31/07/2024**
5. LOCALIZACIÓN: Villagarzon - Puerto Bello - San Jose del Fragua	RUTA: 65	TRAMO:	01
6. CONTRATO DE OBRA No:	985 de 2022		
7. OBJETO:	MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA VILLAGARZON - SAN JOSE DEL FRAGUA Y PUENTE SOBRE EL RIO CAQUETA EN LOS DEPARTAMENTOS DE PUTUMAYO, CAUCA Y CAQUETA EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA VIAS PARA LA CONEXION DE TERRITORIOS, EL CRECIMIENTO SOSTENIBLE Y LA REACTIVACIÓN 2.0		
8. CONTRATISTA:	CONSORCIO VIAS COLOMBIA 055	NIT	901.584.983-4
9. INTERVENTOR:	CONSORCIO VIAL JAC 2022	NIT	901.582.956-0
10. CONTRATO DE INTERVENTORÍA No:	988 de 2022		
11. PLAZO INICIAL: 97 meses	12. FECHA DE INICIO: 26/07/2022	13. FECHA DE REANUDACIÓN:	
14. PLAZO ACUMULADO: 97 meses	15. FECHA DE SUSPENSIÓN:	16. FECHA DE VENCIMIENTO:	31/07/2030
17. TIPO DE GESTIÓN: PREDIAL	18. VR. DE LA GESTIÓN: $ -	19. VR. PROVISIÓN GESTIÓN PREDIAL:	$ 1.953.695.336,00

2. PAGOS MENSUALES POR ADQUISICIÓN PREDIAL (A)

FICHA PREDIAL No.	Predio: **P** Mejora: **M**	TRADENTE	NUM DOC TRADENTE	MATRÍCULA INMOBILIARIA MATRIZ	**ESCRITURA** (E: Numero-Fecha-Notaria-Ciudad) **PROMESA VENTA** (CV: Numero-Fecha-Notaria-Ciudad)	No. MATRÍCULA INMOBILIARIA A NOMBRE DE INVÍAS	VALOR AVALÚO TERRENO	PAGO(S) ACUMULADO(S) DEL TERRENO	VALOR TOTAL AVALÚO	VALOR PAGADO CON ESTA PRE-ACTA(SIN IVA)	OBSERVACIONES DEL PAGO DEL TERRENO

Si la información excede las casillas dispuestas para tal fin, favor utilizar un anexo con la relación completa indicando aquí la cantidad de folios y el anexo parte integral de la pre-acta

62. TOTAL PAGADO POR ADQUISICIÓN DE LOS PREDIOS EN ESTA PRE ACTA (A)	**$ -**
63. SUBTOTAL PAGOS PREDIALES (2)	$ -
64. OTROS	$ -
65. IVA	$ -
66. VALOR A PAGAR POR ADQUISICIÓN DE PREDIOS	$ -

IV. VALORES LIQUIDADOS

67. VALOR TOTAL BASICO PRESENTE PREACTA	$ -
68. IVA PRESENTE PREACTA	$ -
69. VALOR TOTAL PRESENTE PREACTA (1+2)	$ -
70. VALOR GESTIÓN PREDIAL	$ -

V. CONTROL DE VALORES LIQUIDADOS

71. VALOR ACUMULADO ACTIVIDADES PREDIALES	$ 24.038.000,00
72. GESTIÓN PREDIAL	$ 24.038.000,00
73. DESEMBOLSOS PREDIALES	$ -
74. OTROS	$ -
75. IVA	$ 4.567.220,00
76. VALOR TOTAL ACUMULADO	$ 28.605.220,00
77. SALDO POR EJECUTAR	$ 1.925.090.116,00

VI. FIRMAS

FIRMA DEL CONTRATISTA			FIRMA DEL INTERVENTOR		
NOMBRES Y APELLIDOS	**JORGE EDUARDO DUARTE RODRIGUEZ**		**NOMBRES Y APELLIDOS**	**JORGE ALVARO SANCHEZ BLANCO**	
C.C. _X_ C.E. __	NUMERO	1015396432	C.C. X	NUMERO	79.785.874
MATRICULA PROFESIONAL	NUMERO	215422 CSJ	MATRICULA PROFESIONAL	NUMERO	25202-100584 CND
Representante Legal [X]	Apoderado [ ]		Representante Legal [X]	Apoderado [ ]	

NOTAS

1. Las cantidades y valores consignados en la presente Preacta son responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra e Interventoría.
2. El Interventor certifica que revisó, verificó y aprobó las actividades de gestión y adquisición predial de responsabilidad del Contratista.
3. Las cantidades, precios unitarios y valores totales consignados en la presente preacta no pueden superar el valor de la provisión predial vigente.
4. El número de la presente preacta debe coincidir con el número del Acta de Recibo Parcial de Obra correspondiente. Si en el mes no se ejecutan actividades de gestión y adquisición predial susceptibles de pago, la preacta debe presentarse en cero ($0) pesos.

ORIGINAL: Acta de recibo parcial de obra — Archivo de Gestión del INVIAS
Copias: Contratista, Interventor, Dirección Territorial, Subdirección de Sostenibilidad

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA RELACION DE ADQUISICION PREDIAL	CÓDIGO	MASPS-MN1-IN-5-FR-8
		VERSIÓN	2
		PÁGINA	2

FECHA	31/07/2024

(Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SMCN-GRUPO SUR OCCIDENTE **DIRECCIÓN TERRITORAL:** PUTUMAYO

1. DATOS GENERALES DEL PROYECTO

OBJETO DEL CONTRATO	MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA VILLAGARZON - SAN JOSE DEL FRAGUA Y PUENTE SOBRE EL RIO CAQUETA EN LOS DEPARTAMENTOS DE PUTUMAYO, CAUCA Y CAQUETA EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA VIAS PARA LA CONEXION DE TERRITORIOS, EL CRECIMIENTO SOSTENIBLE Y LA REACTIVACIÓN 2.0		
CONTRATO DE OBRA No	985 de 2022	**CONTRATO DE INTERVENTORÍA No**	988 de 2022
NOMBRE DEL CONTRATISTA	CONSORCIO VIAS COLOMBIA 055	**NOMBRE INTERVENTORIA**	CONSORCIO VIAL JAC 2022
LOCALIZACIÓN (RUTA Y TRAMO)			

2. DESCRIPCIÓN

PREDIO	Cedula Ciudadanía	Propietario	Abs. Inicial	Abs. Final	Avalúo

Firma
Nombre : ANDRES TAPIAS RODRIGUEZ
Profesional Predial Contratista
Matrícula Profesional No: 25222-3144739 CND

Firma
Nombre: JHONNY FABIAN PEREZ FAJARDO
Profesional Predial Interventor
Matrícula Profesional No: 52202086649 NRÑ

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Contratista, Interventor, Subdirección de Sostenibilidad.

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS GESTION AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA **RESUMEN MENSUAL GESTIÓN PREDIAL**	CÓDIGO	MASPS-MN1-IN-5-FR-9
		VERSIÓN	2
		PÁGINA	3

FECHA: 31/07/2024 (Dia / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SMCN-GRUPO SUR OCCIEDENTE

DIRECCIÓN TERRITORIAL: PUTUMAYO

PRE ACTA PREDIAL No: 25
PERIODO - MES: 01 AL 31 DE JULIO DEL 2024
FECHA ELABORACION: 31/07/2024

1. DATOS GENERALES DEL PROYECTO

CONTRATO DE OBRA No: 985 de 2022

PLAZO ACUMULADO: 97 meses

OBJETO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA VILLAGARZON - SAN JOSE DEL FRAGUA Y PUENTE SOBRE EL RIO CAQUETA EN LOS DEPARTAMENTOS DE PUTUMAYO, CAUCA Y CAQUETA EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA VIAS PARA LA CONEXION DE TERRITORIOS, EL CRECIMIENTO SOSTENIBLE Y LA REACTIVACIÓN 2.0

CONTRATISTA: CONSORCIO VIAS COLOMBIA 055

FECHA DE SUSPENSIÓN:

FECHA DE VENCIMIENTO: 31/07/2030

LOCALIZACIÓN (RUTA Y TRAMO): RUTA 65 TRAMO 1

VALOR ADICIÓN No: $ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 988 de 2022

VALOR TOTAL ADICIONES: $ -

2. DESCRIPCIÓN

No. Predio	Propietario y/o Mejoratario	Ficha	Ajuste Ficha	Estudio Título y/o Diagnostico	Ajuste Estudio Título y/o Diagnostico	Avaluo Comercial	Ajuste Avaluo comercial	Oferta	Oficio de Inscripción	Gestión Predios						Gestión Expropiaciones				Gestión Mejoras			Restitución de bienes de uso publico
										Permiso de intervencion	Promesa	Pago No. 1	Escritura	Pago No. 2	IGAC	Elab. y noti. Resol. exprop.	Resolver recurso de reposición en vía admin. y su noti.	Pres. de demanda admitida - con sol. de entrega anticipada	Entrega real y material del predio por parte del juez	Entrega mejoratario	Compraventa Mejoras	Pago Mejoras	Trámite de acción policiva logrando la restitución
007IT1MCVSF	FLORO HERNAN ALVAREZ MORA									21													
010IT1MCVSF	AGREGADOS Y CONCRETOS PUTUMAYO S.A.S. "AGRECON PUTUMAYO S.A.S."									24													
011IT1MCVSF	AGREGADOS Y CONCRETOS PUTUMAYO S.A.S. "AGRECON PUTUMAYO S.A.S."									24													
012AIT1MCVSF	FRANKLIN YOBANY QUINTERO NARVAEZ									24													
013IT1MCVSF	DIEGO FERNANDO SERNA CHAMORRO									21													
014DT1MCVSF	COOPERATIVA MULTIACTIVA DE PISCICULTORES LA FORTALEZA LTDA									21													
015DIT1MCVSF	NORBERTO AURELIO CORDOBA BENAVIDES									21													
016DT1MCVSF	RUFINA ALVAREZ MARCO TULIO PANTOJA CALDERON									21													
017IT1MCVSF	NORBERTO AURELIO CORDOBA BENAVIDES									21													
018DT1MCVSF	RUFINA ALVAREZ									21													
020IT1MCVSF	HECTOR PANTOJA ALVAREZ ERFILIA DORA GUALGUAN JOSA									21													
021IT1MCVSF	HERMENCIO LAUREANO CALDERÓN									21													
022DT1MCVSF	ROBER ARLEY CHAVES MUÑOS MYRIAM DEL CARMEN VARGAS RODRIGUEZ									21													
023IT1MCVSF	LUIS GUERRERO RUIZ									21													
024DT1MCVSF	LUIS GUERRERO RUIZ									21													
025IT1MCVSF	GRUPO UNIVERSAL ADELANTE S.A.S									21													
026DT1MCVSF	DIANA YURLEDY AVILEZ MUÑOZ									21													
031DT1MCVSF	NOHEMY GUTIERREZ HURTADO									21													
032IT1MCVSF	LUIS GUERRERO RUIZ									21													
034DT1MCVSF	MUNICIPIO DE VILLAGARZON									21													
035IT1MCVSF	LORGIO DILBER YELA PONCE Y OTROS									21													
036IT1MCVSF	MANUEL ORTIZ RODRIGUEZ									21													
040DT1MCVSF	JUAN CUERO VALLEJO									21													
041DIT1MCVSF	AMANDA GOMEZ ARCINIEGAS									21													
042DT1MCVSF	LUZ NERY ORDOÑEZ CLAROS									21													
044DT1MCVSF	SERGIO LUIS JIMENEZ RENDON									21													
045DT1MCVSF	MARIA EMERITA BRAVO									21													
046AIT1MCVSF	BERTILDE SEMANATE Y OTROS									21													
046IT1MCVSF	MAYELI AVENDAÑO SOLARTE									21													
050DT1MCVSF	RUBEN DARIO MORENO PANTOJA DOLLY YANETH CORDOBA VALLEJO									21													
051IT1MCVSF	EVER STEINER ZAMBRANO SOLARTE									21													
052IT1MCVSF	MIGUEL ANGEL BOLAÑOS BOTINA									21													
053DT1MCVSF	FLOR ALBA BOLAÑOS BOTINA									21													
054DT1MCVSF	MILLER OBANDO ROJAS GLORIA ROCIO DELGADO RENZA									21													
056DT1MCVSF	JUAN DIEGO ORDOÑEZ MELENDES									21													
057DT1MCVSF	ERIKA YULIETH VARGAS MEDINA									21													
058DT1MCVSF	BRITNEY KAROL JULIANA PANTOJA GUALGUAN WHINDY ERIKA GUERRERO GUALGUAN									21													
059DT1MCVSF	DARGUIN WUEYMAR GUALGUAN JACANAMEJOY									21													
060DT1MCVSF	DIEGO ALEJANDRO TORRES LOPERA CLAUDIA ROCIO LEON									21													
061IT1MCVSF	MIGUEL ANGEL BOLAÑOS BOTINA									21													
062IT1MCVSF	JOSE SEGUNDO BOLIVAR SOLARTE YELA									21													
063IT1MCVSF	FABIAN CARABALI JIMENEZ									21													
068IT1MCVSF	YOLIMA ORTEGA RAMOS									24													
069AIT1MCVSF	MARIA LEONOR BOLAÑOS									21													
069BIT1MCVSF	NEREO ÑAÑEZ JANSASOY									21													
069IT1MCVSF	GRAN TIERRA ENERGY COLOMBIA LTD									21													
076IT1MCVSF	OMAR UBERTINO TONGUINO MARIA FRANCIA RAMIREZ									21													
081ADT1MCVSF	JORGE ORLANDO TOVAR RENZA									21													
081BDT1MCVSF	MARIA ROSALIA JOSA DE GUALGUAN									24													
095DT1MCVSF	OLGA ARANDIA VARGAS									21													
105IT1MCVSF	JOSE ABRAHAM DELGADO DELGADO									21													
107IDT1MCVSF	GLADYS DEL CARMEN BOTINA DELGADO									21													
117DIT1MCVSF	HERMINDA FIDELINA ERASO VDA DE SAMUDIO									24													
118DT1MCVSF	PEDRO NEL CASTILLO ANGULO									21													
120DT1MCVSF	ELBANO HECTOR ERAZO VALLEJO									24													
121DIT1MCVSF	JAIRO EDGAR ZAMUDIO ERAZO									24													
129DT1MCVSF	JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LA PATRIA									24													
146DIT1MCVSF	JORGE ENRIQUE MEJIA RAMIREZ									21													
154DIT1MCVSF	GERARDO PORTILLA CEBALLOS									21													

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS GESTION AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA RESUMEN MENSUAL GESTIÓN PREDIAL	CÓDIGO	MASPS-MN1-IN-5-FR-9
		VERSIÓN	2
		PÁGINA	3

FECHA: 31/07/2024
(Dia / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SMCN-GRUPO SUR OCCIEDENTE

PRE ACTA PREDIAL No: 25

DIRECCIÓN TERRITORAL: PUTUMAYO

PERIODO - MES: 01 AL 31 DE JULIO DEL 2024

FECHA ELABORACION: 31/07/2024

1. DATOS GENERALES DEL PROYECTO

156DT1MCVSF	MARCIAL FERNANDEZ MERA JORGE ISAAC FERNANDEZ MERA									21													
009AIT1MCVSF	MUNICIPIO DE VILLAGARZON									21													
009BIT1MCVSF	MUNICIPIO DE VILLAGARZON									21													
012DIT1MCVSF	SAMUEL ALEJANDRO URQUIJO ARCOS NATALIA ADRIANA ARCOS QUINTERO ALEJANDRO NICOLAS URQUIJO ARCOS CLEOFE YANET QUINTERO NARVAEZ ADRIAN QUINTERO CAICEDO FRANCO ELIAS QUINTERO NARVAEZ FRANKLIN YOBANY QUINTERO NARVAEZ LUZ ANDREA QUINTERO CAICEDO									21													
043IT1MCVSF	OSCAR EDUARDO AVILEZ MUÑOZ									21													
065IT1MCVSF	HUMBERTO JIMENEZ SALAZAR									21													
100DIT1MCVSF	ROSA MONICA LOPEZ DE BURBANO									21													
126DIT1MCVSF	ROBERTH ALVEIRO ROJAS LÓPEZ									24													
159IT1MCVSF	MARIA MIRIAM LOZADA MUTUMBAJOY									21													
TOTAL		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**68**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Preacta gestión y adquisición No 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Preacta gestión y adquisición No 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Preacta gestión y adquisición No 3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Preacta gestión y adquisición No 4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Preacta gestión y adquisición No 5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Preacta gestión y adquisición No 6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Preacta gestión y adquisición No 7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Preacta gestión y adquisición No 8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Preacta gestión y adquisición No 9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Preacta gestión y adquisición No 10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Preacta gestión y adquisición No 11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Preacta gestión y adquisición No 12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Preacta gestión y adquisición No 13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Preacta gestión y adquisición No 14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Preacta gestión y adquisición No 15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Preacta gestión y adquisición No 16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Preacta gestión y adquisición No 17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Preacta gestión y adquisición No 18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Preacta gestión y adquisición No 19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Preacta gestión y adquisición No 20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Preacta gestión y adquisición No 21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	58	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Preacta gestión y adquisición No 22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Preacta gestión y adquisición No 23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Preacta gestión y adquisición No 24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Preacta gestión y adquisición No 25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL ACUMULADO A LA PRESENTE ACTA	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**68**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Firma

Nombre : ANDRES TAPIAS RODRIGUEZ
Profesional Predial Contratista

Matrícula Profesional No: 25222-3144739 CND

Firma

Nombre: JHONNY FABIAN PEREZ FAJARDO
Profesional Predial Interventor

Matrícula Profesional No: 52202086649 NRÑ

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Contratista, Interventor, Subdirección de Sostenibilidad.

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA RESUMEN MENSUAL DE GESTION Y ADQUISICIÓN PREDIAL	CÓDIGO	MASPS-MN1-IN-5-FR-10
		VERSIÓN	2
		PÁGINA	4

	FECHA	31/07/2024
		(Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SMCN-GRUPO SUR OCCIDENTE

DIRECCIÓN TERRITORAL: PUTUMAYO

Pre-acta Predial No. 25

PERIODO - MES: 01 AL 31 DE JULIO DE 2024

FECHA ELABORACION: 31/07/2024

1. DATOS GENERALES DEL PROYECTO

CONTRATO DE OBRA No: 985 de 2022

PLAZO ACUMULADO: 97 meses

OBJETO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA VILLAGARZON - SAN JOSE DEL FRAGUA Y PUENTE SOBRE EL RIO CAQUETA EN LOS DEPARTAMENTOS DE PUTUMAYO, CAUCA Y CAQUETA EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA VIAS PARA LA CONEXION DE TERRITORIOS, EL CRECIMIENTO SOSTENIBLE Y LA REACTIVACIÓN 2.0

FECHA DE SUSPENSIÓN:

CONTRATISTA: CONSORCIO VIAS COLOMBIA 055

FECHA DE VENCIMIENTO: 31/07/2030

LOCALIZACIÓN (RUTA Y TRAMO): RUTA 65 TRAMO 1

VALOR ADICIÓN No 1: $ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 988 de 2022

VALOR TOTAL ADICIONES: $ -

2. DESCRIPCIÓN

COMPROBANTE DE PAGO	FECHA COMPROBANTE	FICHA PREDIAL	ÁREA ADQUIRIDA	MEJORA, CULTIVOS, ESPECIES (SI/NO)	ABS. INICIAL	ABS. FINAL	No. MATRICULA INMOBILIARIA PREDIO MATRIZ	ESCRITURA (E: Numero-Fecha-Notaria-Ciudad) PROMESA VENTA (CV: Numero-Fecha-Notaria-Ciudad)	MATRICULA INMOBILIARIA A NOMBRE DE INVIAS	NUMERO DOCUMENTO BENEFICIARIO Y/O TRADENTE	BENEFICIARIO Y/O TRADENTE	FECHA AVALÚO	VALOR AVALÚO	VALOR ADQUISICIÓN PREDIAL NO.		DESCRIPCION DEL PAGO (PORCENTAJE DE FORMA DE PAGO)
														VALOR PAGO	SALDO POR PAGAR	
														$ -	$ -	
														$ -	$ -	
														$ -	$ -	
														$ -	$ -	
														$ -	$ -	
														$ -	$ -	
														$ -	$ -	
														$ -	$ -	
														$ -	$ -	
														$ -	$ -	
														$ -	$ -	
														$ -	$ -	
														$ -	$ -	
														$ -	$ -	
														$ -	$ -	
														$ -	$ -	
														$ -	$ -	
													TOTAL	$ -	$ -	

NOTA:
En la casilla Descripcion del pago el interventor debe relacionar la actividad ejecutada

Firma

Nombre : ANDRES TAPIAS RODRIGUEZ
Profesional Predial Contratista
Matrícula Profesional No: 25222-3144739 CND

Firma

Nombre: JHONNY FABIAN PEREZ FAJARDO
Profesional Predial Interventor
Matrícula Profesional No: 52202086649 NRÑ

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Contratista, Interventor, Subdirección de Sostenibilidad.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA PRE-ACTA MENSUAL DE INVERSIÓN DE LA SOSTENIBILIDAD	[illegible]	[illegible]
		[illegible]	[illegible]
		[illegible]	[illegible]

FECHA: 3[illegible]07[illegible]202[illegible]

UNIDAD EJECUTORA [illegible] **DIRECCIÓN TERRITORIAL** [illegible] **PERIODO:** [illegible] 3[illegible] [illegible] 202[illegible]

[illegible]

PREACTA N°	25	[illegible]	[illegible]	[illegible]	202[illegible]	[illegible]	3[illegible]	[illegible]	202[illegible]
			[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA N°	25	[illegible]	[illegible]	[illegible]	202[illegible]	[illegible]	3[illegible]	[illegible]	202[illegible]
			[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]

1. DATOS DEL PROYECTO

OBJETO DEL PROYECTO								
TIPO DE PROYECTO	**LICENCIADO**		**Resolución N°**	[illegible]	[illegible]	[illegible]	**NO LICENCIADO - PAGA**	[illegible]

CONTRATISTA	[illegible] 055	**INTERVENTORÍA**	[illegible] 2022
OBJETO	[illegible] 2.0	**OBJETO**	"INTERVENTORÍA [illegible] CRECIMIENTO SOSTENIBLE Y LA REACTIVACIÓN 2.0".
N° CONTRATO	[illegible]85[illegible]2022	**N° CONTRATO**	[illegible]88[illegible]2022
FECHA DE INICIO	26 [illegible] 2022	**FECHA DE INICIO**	26 [illegible] 2022
FECHA DE TERMINACIÓN	3[illegible] [illegible] 2030	**FECHA DE TERMINACIÓN**	3[illegible] [illegible] 2030

[illegible]	[illegible]3[illegible],366,76[illegible],00[illegible].00
[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]
Vr. Total	**$ 319,366,761,001.00**

2[illegible]7[illegible]2 [illegible] 055 [illegible]	[illegible],880,5[illegible]7,308.00
[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible],880,5[illegible]7,308.00
[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible],880,5[illegible]7,308.00

[illegible]	[illegible]8,[illegible],8[illegible]6,708.00
[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]
Vr. Total	[illegible]8,[illegible],8[illegible]6,708.00

AIU %:	30[illegible]
U %:	5[illegible]

2. COSTOS DE ACTIVIDADES SOSTENIBILIDAD DEL CONTRATO DE OBRA

N°	ACTIVIDAD	COMPONENTE (TÉCNICO, AMBIENTAL, SOCIAL)			CONDICIONES ACTUALIZADAS PLAN DE INVERSIÓN SOSTENIBILIDAD N° _____ Fecha _______											
					CANTIDAD	UNIDAD	VR. UNITARIO BASICO (sin IVA) ($)	VALOR TOTAL BÁSICO SIN IVA CON CARGO A:			VALOR TOTAL IVA CON CARGO A:			TOTAL BASICO MAS IVA CON CARGO A:		
		TÉCNICO	AMBIENTAL	SOCIAL				VR. REEMBOLSO DE GASTOS ($)	VR. ITEM NO PREVISTO ($)	OTRO	VR. REEMBOLSO DE GASTOS ($)	VR. ITEM NO PREVISTO ($)	OTRO	VR. REEMBOLSO DE GASTOS ($)	VR. ITEM NO PREVISTO ($)	OTRO
	[illegible]				0		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
							[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
							[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
							[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
							[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

N°	ACTIVIDAD	COMPONENTE			EJECUTADO EN EL MES								
					CANTIDAD	VALOR TOTAL BÁSICO SIN IVA EJECUTADO			VALOR TOTAL IVA MENSUAL		TOTAL BASICO MAS IVA CON CARGO A:		
		TÉCNICO	AMBIENTAL	SOCIAL		VR. REEMBOLSO DE GASTOS ($)	VR. ITEM NO PREVISTO ($)	OTRO	VR. ITEM NO PREVISTO ($)	OTRO	VR. REEMBOLSO DE GASTOS ($)	VR. ITEM NO PREVISTO ($)	OTRO
	[illegible]				0	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible] [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
						[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible] [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
						[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible] [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
						[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible] [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
						[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible] [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

N°	ACTIVIDAD	COMPONENTE			ACUMULADO EJECUTADO CON IVA		VALOR POR EJECUTAR CON IVA		REGISTRO DE CUMPLIMIENTO (Anexar soporte correspondiente)	OBSERVACIONES
		TÉCNICO	AMBIENTAL	SOCIAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL ACUMULADO ($)	CANTIDAD	VALOR TOTAL ($)		
	[illegible]				0	[illegible]		$ -		
						[illegible]		$ -		
						[illegible]		$ -		
						[illegible]		$ -		
						[illegible]		$ -		

VALOR PRE-ACTA TRAMITADO POR REEMBOLSO DE GASTOS	[illegible]
VALOR PRE-ACTA TRAMITADO ITEM NO PREVISTOS SIN IVA	[illegible]
[illegible]	[illegible]
VALOR PRE-ACTA TRAMITADO OTROS SIN IVA	[illegible]
[illegible]	[illegible]
VALOR TOTAL PRE-ACTA SOSTENIBILIDAD SIN IVA (K70+K71+K73)	[illegible]
VALOR TOTAL IVA PRE-ACTA (K72+K74)	[illegible]

NOTAS:

[illegible]

2. [illegible]

3. [illegible]

[illegible]

[illegible] [illegible] 055 [illegible] 2[illegible]5[illegible]22

[illegible] 055 [illegible]523666[illegible]73

[illegible] [illegible]25202[illegible]005[illegible] [illegible]

[illegible] [illegible]83.0[illegible]3

[illegible]

CERTIFICACIÓN

Yo, **JORGE EDUARDO DUARTE RODRÍGUEZ**, identificado con cédula de ciudadanía No. **1.015.396.432** de Bogotá D.C., en mi condición de Representante Legal del **CONSORCIO VIAS COLOMBIA 055**, NIT 901.584.893-4, certifico que, para el periodo del 1 al 31 de julio de 2024, el precitado ente económico ha dado cumplimiento a lo previsto en el ordenamiento legal colombiano en lo que tiene que ver con el pago de los aportes a seguridad social (pensión, salud y riesgos laborales) y parafiscales (ICBF, SENA y CCF), encontrándose al día y/o a paz y salvo. La presente certificación se expide para efectos de dar cumplimiento al artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y demás normas concordantes.

Se expide en la ciudad de Bogotá el día treinta y uno (31) del mes de julio de 2024.

Cordialmente,

JORGE EDUARDO DUARTE RODRIGUEZ
C.C. n°. 1.015.396.432 de Bogotá
D.C. Representante Legal

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 14897640598

(415)7707212489984(8020) 000001489764059 8

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 5 8 4 8 9 3	4	Impuestos de Bogotá 3 2	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	27. Fecha expedición
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
CONSORCIO VÍAS COLOMBIA 055

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Bogotá D.C. 1 1	Bogotá, D.C. 0 0 1

41. Dirección principal
AV EL DORADO 69 B 45 OF 605

42. Correo electrónico notificaciones@hehcol.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	6 0 1 7 4 5 0 9 1 2	3 1 3 2 4 9 2 1 1 6

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades			Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2	51. Código	52. Número establecimientos
4 2 1 0	2 0 2 2 0 1 0 4							

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	7	1	4	4	8	5	2	5	5																	

07- Retención en la fuente a título de rent
14- Informante de exogena
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico
55 - Informante de Beneficiarios Finales

Usuarios aduaneros

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
54. Código																				

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2023 - 02 - 21 / 10 : 01: 57

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre DUARTE RODRIGUEZ JORGE EDUARDO

985. Cargo Representante legal Certificado

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14897640598

(415)7707212489984(8020) **000001489764059 8**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 5 8 4 8 9 3	4	Impuestos de Bogotá 3 2	

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza	2	63. Formas asociativas		64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados	
65. Fondos		66. Cooperativas		67. Sociedades y organismos extranjeros	
68. Sin personería jurídica	3	69. Otras organizaciones no clasificadas		70. Beneficio	1

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	0 4	
72. Número		
73. Fecha	2 0 2 2 0 1 0 4	
74. Número de notaría		
75. Entidad de registro	9 8	
76. Fecha de registro		
77. No. Matrícula mercantil		
78. Departamento	1 1	
79. Ciudad/Municipio	0 0 1	
Vigencia		
80. Desde	2 0 2 2 0 4 0 4	
81. Hasta	2 0 3 1 1 2 0 4	

Composición del Capital

82. Nacional	0 %
83. Nacional público	0 . 0 %
84. Nacional privado	0 . 0 %
85. Extranjero	0 %
86. Extranjero público	0 . 0 %
87. Extranjero privado	0 . 0 %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1		Año Mes Día		-
2		Año Mes Día		-
3		Año Mes Día		-
4		Año Mes Día		-
5		Año Mes Día		-

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Representación

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14897640598

(415)7707212489984(8020) **000001489764059 8**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 5 8 4 8 9 3	4	Impuestos de Bogotá	3 2

Representación

1

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL PRIN 1 8	2 0 2 2 1 2 0 1

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadaní 1 3	1 0 1 5 3 9 6 4 3 2		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
DUARTE	RODRIGUEZ	JORGE	EDUARDO

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

2

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL SUPL 1 9	2 0 2 2 1 2 0 1

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadan 1 3	7 4 4 5 1 7 9 2		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
GUISA	VELANDIA	CARLOS	RICARDO

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

3

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

4

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

5

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14897640598

(415)7707212489984(8020) **000001489764059 8**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 5 8 4 8 9 3	4	Impuestos de Bogotá 3 2	

Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

1

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
NIT 3 1	9 0 0 3 5 4 6 3 7	5	COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social: HIDALGO E HIDALGO COLOMBIA S.A.S

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
	7 5	2 0 2 2 0 1 0 4	

2

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
NIT 3 1	9 0 0 3 9 7 3 3 4	3	COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social: HIDALGO E HIDALGO S A SUCURSAL COLOMBIA

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
	2 5	2 0 2 2 0 1 0 4	

3

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

4

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

5

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Revisor Fiscal y Contador

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14897640598

(415)7707212489984(8020) **000001489764059 8**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 5 8 4 8 9 3	4	Impuestos de Bogotá 3 2	

Revisor Fiscal y Contador

Revisor fiscal principal

124. Tipo de documento	125. Número de identificación	126. DV	127. Número de tarjeta profesional

128. Primer apellido	129. Segundo apellido	130. Primer nombre	131. Otros nombres

132. Número de Identificación Tributaria (NIT)	133. DV	134. Sociedad o firma designada

135. Fecha de nombramiento

Revisor fiscal suplente

136. Tipo de documento	137. Número de identificación	138. DV	139. Número de tarjeta profesional

140. Primer apellido	141. Segundo apellido	142. Primer nombre	143. Otros nombres

144. Número de Identificación Tributaria (NIT)	145. DV	146. Sociedad o firma designada

147. Fecha de nombramiento

Contador

148. Tipo de documento	149. Número de identificación	150. DV	151. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadanía 1 3	7 9 8 6 3 4 5 7		2 0 0 0 4 0 T

152. Primer apellido	153. Segundo apellido	154. Primer nombre	155. Otros nombres
GARCIA	RICO	ALDEMAR	

156. Número de Identificación Tributaria (NIT)	157. DV	158. Sociedad o firma designada

159. Fecha de nombramiento
2 0 2 2 1 1 2 3

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 02 Actualización

4. Número de formulario 14916237043

(415)7707212489984(8020) 000001491623704 3

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 0 3 5 4 6 3 7	5	Impuestos de Bogotá 3 2	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	27. Fecha expedición
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
HIDALGO E HIDALGO COLOMBIA S.A.S

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Bogotá D.C. 1 1	Bogotá, D.C. 0 0 1

41. Dirección principal
AV EL DORADO 69 B 45 ED CORPORATE CENTER OF 605

42. Correo electrónico notificaciones@hehcol.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	7 4 5 0 9 1 2	

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades			Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2	51. Código	52. Número establecimientos
4 2 1 0	2 0 1 0 0 4 2 9	3 9 0 0	2 0 1 0 0 4 2 9	4 2 9 0	0 8 1 1			

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	3	5	7	9	1 0	1 4	1 8	2 6	4 2	4 8	5 2	5 5														

03- Impuesto al patrimonio
05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
07- Retención en la fuente a título de rent
09- Retención en la fuente en el impuesto
10- Obligado aduanero
14- Informante de exogena
18- Precios de transferencia
26- Declaración individual precios de tran
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico
55 - Informante de Beneficiarios Finales

Usuarios aduaneros

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54. Código	2 2	2 3								

	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
1	1	57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2023 - 05 - 26 / 10 : 10: 08

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre DUARTE RODRIGUEZ JORGE EDUARDO

985. Cargo Representante legal Certificado

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14916237043

(415)7707212489984(8020) **000001491623704 3**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 0 3 5 4 6 3 7	5	Impuestos de Bogotá 3 2	

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza	2	63. Formas asociativas	1 2	64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados	
65. Fondos		66. Cooperativas		67. Sociedades y organismos extranjeros	
68. Sin personería jurídica		69. Otras organizaciones no clasificadas		70. Beneficio	1

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	0 4	0 1
72. Número		1 2
73. Fecha	2 0 1 0 0 4 2 3	2 0 1 7 0 8 0 2
74. Número de notaría		
75. Entidad de registro	0 3	0 3
76. Fecha de registro	2 0 1 0 0 4 2 9	2 0 1 7 0 8 2 8
77. No. Matrícula mercantil	0 1 9 8 6 9 6 2	0 1 9 8 6 9 6 2
78. Departamento	1 1	1 1
79. Ciudad/Municipio	4	4
Vigencia		
80. Desde	2 0 1 0 0 4 2 3	2 0 1 7 0 8 0 2
81. Hasta	2 9 9 9 1 2 3 1	2 9 9 9 1 2 3 1

Composición del Capital

82. Nacional	0 %
83. Nacional público	0 . 0 %
84. Nacional privado	0 . 0 %
85. Extranjero	1 0 0 %
86. Extranjero público	0 . 0 %
87. Extranjero privado	1 0 0 . 0 %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control: Superintendencia de Sociedades 5

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1	7 9	2 0 1 5 0 1 0 1		-
2		Año Mes Día		-
3		Año Mes Día		-
4		Año Mes Día		-
5		Año Mes Día		-

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.
2			

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante: HIFDALGO E HIDALGO SOCIEDAD ANONIMA

170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Representación

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14916237043

(415)7707212489984(8020) **000001491623704 3**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 0 3 5 4 6 3 7	5	Impuestos de Bogotá	3 2

Representación

1

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación		
REPRS LEGAL PRIN 1 8	2 0 2 2 1 2 0 7		
100. Tipo de documento	**101. Número de identificación**	**102. DV**	**103. Número de tarjeta profesional**
Cédula de Ciudadaní 1 3	1 0 1 5 3 9 6 4 3 2		
104. Primer apellido	**105. Segundo apellido**	**106. Primer nombre**	**107. Otros nombres**
DUARTE	RODRIGUEZ	JORGE	EDUARDO
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	**109. DV**	**110. Razón social representante legal**	

2

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación		
REPRS LEGAL SUPL 1 9	2 0 2 2 1 2 0 7		
100. Tipo de documento	**101. Número de identificación**	**102. DV**	**103. Número de tarjeta profesional**
Cédula de Ciudadan 1 3	7 4 4 5 1 7 9 2		
104. Primer apellido	**105. Segundo apellido**	**106. Primer nombre**	**107. Otros nombres**
GUISA	VELANDIA	CARLOS	RICARDO
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	**109. DV**	**110. Razón social representante legal**	

3

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación		
100. Tipo de documento	**101. Número de identificación**	**102. DV**	**103. Número de tarjeta profesional**
104. Primer apellido	**105. Segundo apellido**	**106. Primer nombre**	**107. Otros nombres**
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	**109. DV**	**110. Razón social representante legal**	

4

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación		
100. Tipo de documento	**101. Número de identificación**	**102. DV**	**103. Número de tarjeta profesional**
104. Primer apellido	**105. Segundo apellido**	**106. Primer nombre**	**107. Otros nombres**
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	**109. DV**	**110. Razón social representante legal**	

5

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación		
100. Tipo de documento	**101. Número de identificación**	**102. DV**	**103. Número de tarjeta profesional**
104. Primer apellido	**105. Segundo apellido**	**106. Primer nombre**	**107. Otros nombres**
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	**109. DV**	**110. Razón social representante legal**	

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Revisor Fiscal y Contador

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14916237043

(415)7707212489984(8020) **000001491623704 3**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 0 3 5 4 6 3 7	5	Impuestos de Bogotá 3 2	

Revisor Fiscal y Contador

Revisor fiscal principal

124. Tipo de documento	125. Número de identificación	126. DV	127. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadanía 1 3	3 9 7 5 9 7 2 4		9 8 8 4 7 T

128. Primer apellido	129. Segundo apellido	130. Primer nombre	131. Otros nombres
RAMIREZ		NORMA	LILIAM

132. Número de Identificación Tributaria (NIT)	133. DV	134. Sociedad o firma designada
9 0 0 7 1 5 3 6 3	2	JPA COLOMBIA S A S

135. Fecha de nombramiento: 2 0 2 2 0 6 1 3

Revisor fiscal suplente

136. Tipo de documento	137. Número de identificación	138. DV	139. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadanía 1 3	1 1 4 3 4 8 6 4		5 0 1 8 0 T

140. Primer apellido	141. Segundo apellido	142. Primer nombre	143. Otros nombres
PARDO	RODRIGUEZ	JOSE	RAMIRO

144. Número de Identificación Tributaria (NIT)	145. DV	146. Sociedad o firma designada
9 0 0 7 1 5 3 6 3	2	JPA COLOMBIA S A S

147. Fecha de nombramiento: 2 0 2 2 0 6 1 3

Contador

148. Tipo de documento	149. Número de identificación	150. DV	151. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadanía 1 3	5 3 1 2 4 2 9 7		1 3 7 4 7 8 T

152. Primer apellido	153. Segundo apellido	154. Primer nombre	155. Otros nombres
PAJARITO	RODRIGUEZ	LUZ	AIDA

156. Número de Identificación Tributaria (NIT)	157. DV	158. Sociedad o firma designada

159. Fecha de nombramiento: 2 0 2 3 0 5 1 0

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 02 Actualización

4. Número de formulario 14916601152

(415)7707212489984(8020) 000001491660115 2

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 0 3 9 7 3 3 4	3	Impuestos de Bogotá 3 2	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	27. Fecha expedición
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
HIDALGO E HIDALGO S A SUCURSAL COLOMBIA

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Bogotá D.C. 1 1	Bogotá, D.C. 0 0 1

41. Dirección principal
AV EL DORADO 69 B 45 ED CORPORATE CENTER OF 605

42. Correo electrónico notificaciones@hehcol.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	7 4 5 0 9 1 2	3 1 3 2 4 9 2 1 1 6

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades			Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2	51. Código	52. Número establecimientos
4 2 1 0	2 0 1 0 1 1 2 5	3 9 0 0	2 0 1 7 1 0 1 7		0 8 1 1	4 2 9 0		

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	5	7	9	1 0	1 4	4 2	4 8	5 2	5 5																	

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
07- Retención en la fuente a título de rent
09- Retención en la fuente en el impuesto
10- Obligado aduanero
14- Informante de exogena
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico
55 - Informante de Beneficiarios Finales

Usuarios aduaneros

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54. Código	2 2	2 3								

	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
1	3	57. Modo	1	1	
		58. CPC	5 4	9 7	

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2023 - 05 - 26 / 09 : 57: 17

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre DUARTE RODRIGUEZ JORGE EDUARDO
985. Cargo Representante Legal Suplente Certificado

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14916601152

(415)7707212489984(8020) 000001491660115 2

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 0 3 9 7 3 3 4	3	Impuestos de Bogotá 3 2	

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza	2	63. Formas asociativas		64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados	
65. Fondos		66. Cooperativas		67. Sociedades y organismos extranjeros	1 0
68. Sin personería jurídica		69. Otras organizaciones no clasificadas		70. Beneficio	1

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	0 5	
72. Número	4 7 0 2	
73. Fecha	2 0 1 0 0 8 0 2	
74. Número de notaría	1 4	
75. Entidad de registro		
76. Fecha de registro	2 0 1 1 0 4 0 1	
77. No. Matrícula mercantil	0 2 0 8 2 9 8 4	
78. Departamento	1 1	
79. Ciudad/Municipio	4	
Vigencia		
80. Desde	2 0 1 0 0 8 0 2	
81. Hasta	2 0 3 1 0 3 1 1	

Composición del Capital

82. Nacional	0 %
83. Nacional público	0 . 0 %
84. Nacional privado	0 . 0 %
85. Extranjero	1 0 0 %
86. Extranjero público	0 . 0 %
87. Extranjero privado	1 0 0 . 0 %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control: Superintendencia de Sociedades 5

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1	7 9	2 0 1 5 0 1 0 1		-
2		Año Mes Día		-
3		Año Mes Día		-
4		Año Mes Día		-
5		Año Mes Día		-

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP
1790059111001	ECUADOR 2 3 9	

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Representación

001

Página 3 de 4 **Hoja 3**

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14916601152

(415)7707212489984(8020) 000001491660115 2

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 0 3 9 7 3 3 4	3	Impuestos de Bogotá 3 2	

Representación

1

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL PRIN 1 8	2 0 1 7 0 4 2 8

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Extranjerí 2 2	6 5 9 3 1 2		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
ARAUJO	GRIJALVA	MARIA	DEL CARMEN

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

2

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL SUPL 1 9	2 0 1 9 0 5 0 9

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadan 1 3	1 0 1 5 3 9 6 4 3 2		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
DUARTE	RODRIGUEZ	JORGE	EDUARDO

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

3

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

4

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

5

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Revisor Fiscal y Contador

001

Página 4 de 4 **Hoja 5**

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14916601152

(415)7707212489984(8020) 000001491660115 2

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 0 3 9 7 3 3 4	3	Impuestos de Bogotá 3 2	

Revisor Fiscal y Contador

Revisor fiscal principal

124. Tipo de documento	125. Número de identificación	126. DV	127. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadanía 1 3	3 9 7 5 9 7 2 4		9 8 8 4 7 T

128. Primer apellido	129. Segundo apellido	130. Primer nombre	131. Otros nombres
RAMIREZ		NORMA	LILIAM

132. Número de Identificación Tributaria (NIT)	133. DV	134. Sociedad o firma designada
9 0 0 7 1 5 3 6 3	2	JPA COLOMBIA S A S

135. Fecha de nombramiento: 2 0 2 2 1 2 2 2

Revisor fiscal suplente

136. Tipo de documento	137. Número de identificación	138. DV	139. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadanía 1 3	1 1 4 3 4 8 6 4		5 0 1 8 0 T

140. Primer apellido	141. Segundo apellido	142. Primer nombre	143. Otros nombres
PARDO	RODRIGUEZ	JOSE	RAMIRO

144. Número de Identificación Tributaria (NIT)	145. DV	146. Sociedad o firma designada
9 0 0 7 1 5 3 6 3	2	JPA COLOMBIA S A S

147. Fecha de nombramiento: 2 0 2 2 1 2 2 2

Contador

148. Tipo de documento	149. Número de identificación	150. DV	151. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadanía 1 3	5 3 1 2 4 2 9 7		1 3 7 4 7 8 T

152. Primer apellido	153. Segundo apellido	154. Primer nombre	155. Otros nombres
PAJARITO	RODRIGUEZ	LUZ	AIDA

156. Número de Identificación Tributaria (NIT)	157. DV	158. Sociedad o firma designada

159. Fecha de nombramiento: 2 0 2 3 0 5 1 0

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA **ACTA DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA**	
		CÓDIGO: MEPI-MN1-IN-7-FR-1
		VERSIÓN: 1
		PÁGINA: 1 de 1

FECHA: 25/04/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SMCN-GRUPO ORIENTE

DIRECCIÓN TERRITORIAL: PUTUMAYO

ACTA No: 3 (Numerar de manera consecutiva)

POR CANTIDADES DE OBRA ☑
POR CONTRATO ADICIONAL ☐ No. (Indicar No. y fecha)

CONTRATO No.: 985 de 2022 (Indique número y año)

OBJETO:
MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA VILLAGARZON - SAN JOSE DEL FRAGUA Y PUENTE SOBRE EL RIO CAQUETA EN LOS DEPARTAMENTOS DE PUTUMAYO, CAUCA Y CAQUETA EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA VIAS PARA LA CONEXION DE TERRITORIOS, EL CRECIMIENTO SOSTENIBLE Y LA REACTIVACIÓN 2.0

CONTRATISTA: CONSORCIO VÍAS COLOMBIA 055

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 988 de 2022 INTERVENTOR: CONSORCIO VIAL JAC 2022

PLAZO INICIAL: 97 MESES (En meses según contrato principal)
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 26/07/2022 (Indique día/mes/año)
FECHA DE SUSPENSIÓN: N/A (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)
VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): $ 319,366,761,001.00 (Según contrato principal)
VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B): $ 319,366,761,001.00

PLAZO ACUMULADO: 97 MESES (En meses según las prórrogas sin suspensiones)
FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/07/2030 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)
FECHA DE REANUDACIÓN: N/A (Indique día/mes/año)
VALOR ADICIONES (Incluido IVA) (B): $ -

No. DE ORDEN	ÍTEM DE PAGO	ESPECIFICACIÓN GR.	ESPECIFICACIÓN PART.	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA) DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	MODIFICACIONES: CONDICIONES ACTUALIZADAS ANTERIOR ACTA No. 2 FECHA 24/08/2023 CANTIDAD	VALOR	PRESENTES + / -	PRESENTES CANTIDAD	PRESENTES VALOR	EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 21 de fecha 31/03/2024 CANTIDAD	VALOR	CONDICIONES ACTUALIZADAS CANTIDAD	VALOR
EXPLANACIONES																	
1	200.2	200-22		Desmonte y limpieza en zonas no boscosas	Ha	16.00	$ 1,083,131.00	$ 17,330,096.00	16.00	$ 17,330,096.00	-	-11.00	-11,914,441.00	0.00	0.00	5.00	$ 5,415,655.00
2	201.7	201-22		Demolición de Estructuras	m3	132.00	$ 107,114.00	$ 14,139,048.00	2,839.00	$ 304,096,646.00	-	-1,069.00	-114,504,866.00	189.00	20,244,546.00	1,770.00	$ 189,591,780.00
3	210.1.2	210-22		Excavación sin clasificar de préstamos	m3	150,000.00	$ 12,300.00	$ 1,845,000,000.00	57,117.00	$ 702,539,100.00	-	-35,141.60	-432,241,680.00	0.00	0.00	21,975.40	$ 270,297,420.00
4	210.2.2	210-22		Excavaciones en material común de la Explanación y Canales	m3	24,314.00	$ 10,685.00	$ 259,795,090.00	161,709.00	$ 1,727,860,665.00	+	36,067.70	385,383,375.00	23,827.90	254,601,113.00	197,776.70	$ 2,113,244,040.00
5	220.1	220-22		Terraplenes	m3	150,000.00	$ 12,800.00	$ 1,920,000,000.00	0.00	$ -	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	$ -
6	223.2	223-22		Geomalla de refuerzo tipo Asphalt 160 o similar	m2	297,712.00	$ 11,100.00	$ 3,304,603,200.00	0.00	$ -	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	$ -
7	230.1P		230.1P	Mejoramiento de la subrasante con material aluvial - crudo de rio y/o material de cantera tipo seleccionado (compacto) (incluye transporte)	m3	86,400.00	$ 92,500.00	$ 7,992,000,000.00	116,693.00	$ 10,794,102,500.00	-	-43,121.00	-3,988,692,500.00	27,024.90	2,499,803,250.00	73,572.00	$ 6,805,410,000.00
Subtotal								**$ 15,352,867,434.00**		**$ 13,545,929,007.00**			**$ (4,161,970,112.00)**		**$ 2,774,648,909.00**		**$ 9,383,958,895.00**
SUBBASES Y AFIRMADOS																	
8	310.1	310-22		Conformación de la calzada existente	m2	350,000.00	$ 925.00	$ 323,750,000.00	836,486.00	$ 773,749,550.00	+	364,900.80	337,533,240.00	592,221.50	547,804,890.00	1,201,386.80	$ 1,111,282,790.00
9	311.1	311-22		Afirmado	m3	73,000.00	$ 90,000.00	$ 6,570,000,000.00	68,000.00	$ 6,120,000,000.00	-	-15,167.00	-1,365,030,000.00	13,377.10	1,203,939,000.00	52,833.00	$ 4,754,970,000.00
10	320.1	320-22		Subbase Granular clase A	m3	105,120.00	$ 127,410.00	$ 13,393,339,200.00	465,693.00	$ 59,333,945,130.00	-	-87,844.50	-11,192,267,745.00	71,137.30	9,063,603,393.00	377,848.50	$ 48,141,677,385.00
Subtotal								**$ 20,287,089,200.00**		**$ 66,227,694,680.00**			**$ (12,219,764,505.00)**		**$ 10,815,347,283.00**		**$ 54.007.930.175.00**
BASES																	
11	330.1	330-22		Base granular clase A	m3	101,972.00	$ 139,500.00	$ 14,225,094,000.00	0.00	$ -	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	$ -
12	330.4	330-22		Base granular para bacheo clase A	m3	14,000.00	$ 143,000.00	$ 2,002,000,000.00	600.00	$ 85,800,000.00	-	-400.00	-57,200,000.00	0.00	0.00	200.00	$ 28,600,000.00
Subtotal								**$ 16,227,094,000.00**		**$ 85,800,000.00**			**$ (57,200,000.00)**		**$ -**		**$ 28,600,000.00**
PAVIMENTOS ASFALTICOS																	
13	420.2	420-22		Riego de imprimación con emulsión asfáltica CRL-1	m2	525,600.00	$ 2,921.00	$ 1,535,277,600.00	0.00	$ -	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	$ -
14	421.1	421-22		Riego de liga con emulsión asfáltica CRR-1	m2	525,600.00	$ 1,852.00	$ 973,411,200.00	10,000.00	$ 18,520,000.00	+	2,680.00	4,963,360.00	0.00	0.00	12,680.00	$ 23,483,360.00
15	450.1P		450.1P	Mezcla densa en caliente Tipo MDC-25	m3	36,792.00	$ 807,000.00	$ 29,691,144,000.00	0.00	$ -	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	$ -
16	450.2P		450.2P	Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19	m3	33,752.00	$ 811,000.00	$ 27,372,872,000.00	0.00	$ -	+	634.00	514,174,000.00	0.00	0.00	634.00	$ 514,174,000.00
17	450.9P		450.9P	Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19 para bacheos	m3	7,000.00	$ 825,000.00	$ 5,775,000,000.00	300.00	$ 247,500,000.00	-	-200.00	-165,000,000.00	0.00	0.00	100.00	$ 82,500,000.00
18	460.1P		460.1P	Fresado de pavimento asfaltico	m3	3,500.00	$ 65,590.00	$ 229,565,000.00	0.00	$ -	+	100.00	6,559,000.00	0.00	0.00	100.00	$ 6,559,000.00
19	465.1	465-22		Excavación para reparación de pavimento asfáltico existente incluyendo el corte y la remoción de las capas asfálticas y de las subyacentes.	m3	7,000.00	$ 71,686.00	$ 501,802,000.00	300.00	$ 21,505,800.00	+	698.90	50,101,345.00	0.00	0.00	998.90	$ 71,607,145.00
Subtotal								**$ 66,079,071,800.00**		**$ 287,525,800.00**			**$ 410,797,705.00**		**$ -**		**$ 698,323,505.00**
ESTRUCTURAS Y DRENAJES																	
20	600.1.1	600-22		Excavaciones varias sin clasificar	m3	10,390.00	$ 25,170.00	$ 261,516,300.00	8,914.00	$ 224,365,380.00	-	3,455.00	86,962,350.00	2,391.70	60,199,089.00	12,369.00	$ 311,327,730.00
21	600.2.4	600-22		Excavaciones varias en material común bajo agua	m3	1,039.00	$ 59,656.00	$ 61,982,584.00	6,000.00	$ 357,936,000.00	+	5,081.70	303,153,895.00	6,000.00	357,936,000.00	11,081.70	$ 661,089,895.00
22	610.1	610-22		Rellenos para Estructuras con suelo	m3	2,078.00	$ 38,696.00	$ 80,410,288.00	0.00	$ -	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	$ -
23	610.2	610-22		Relleno para estructuras con recebo	m3	52,672.00	$ 102,000.00	$ 5,372,544,000.00	2,501.00	$ 255,102,000.00	-	-2,501.00	-255,102,000.00	0.00	0.00	0.00	$ -
24	610.3	610-22		Rellenos para estructuras con material granular tipo SBG.	m3	3,117.00	$ 165,162.00	$ 514,809,954.00	3,500.00	$ 578,067,000.00	-	-3,500.00	-578,067,000.00	0.00	0.00	0.00	$ -
25	621.1.4P		621.1.4P	Pilote en concreto de 35 Mpa de diámetro D=2,50 m. Incluye excavación con piloteadora tipo Kelly, camisa no recuperable en acero de D=250 cm y e = 3/8"(9,5mm). No incluye acero de refuerzo.	m	1,334.00	$ 7,250,000.00	$ 9,671,500,000.00	2,114.00	$ 15,326,500,000.00	-	-2,114.00	-15,326,500,000.00	0.00	0.00	0.00	$ -
26	630.1.P		630.1.P	Concreto clase 42 MPA, para viga cajón voladizos de puentes	m3	2,014.00	$ 2,000,000.00	$ 4,028,000,000.00	11,839.00	$ 23,678,000,000.00	+	5.60	11,200,000.00	0.00	0.00	11,844.60	$ 23,689,200,000.00
27	630.2.P		630.2.P	Concreto clase 42 MPA, para vigas preesforzadas lanzadas de puentes	m3	8,054.00	$ 1,900,000.00	$ 15,302,600,000.00	502.00	$ 953,800,000.00	-	-502.00	-953,800,000.00	0.00	0.00	0.00	$ -
28	630.1.1P		630.1.1P	Concreto clase 35 MPA, para vigas puentes tipo 1.	m3	1,882.00	$ 1,300,000.00	$ 2,446,600,000.00	42.00	$ 54,600,000.00	+	386.40	502,320,000.00	0.00	0.00	428.40	$ 556,920,000.00
29	630.1.2P		630.1.2P	Concreto clase 35 MPA, para pilas de puentes	m3	14,354.00	$ 1,320,000.00	$ 18,947,280,000.00	1,974.00	$ 2,605,680,000.00	-	-1,797.80	-2,373,096,000.00	0.00	0.00	176.20	$ 232,584,000.00
30	630.3.1P		630.3.1P	Concreto clase 35 MPA para Zapatas, Estribos, Aletas, dados y placas	m3	10,120.00	$ 1,100,000.00	$ 11,132,000,000.00	6,660.00	$ 7,326,000,000.00	-	-3,868.40	-4,255,240,000.00	0.00	0.00	2,791.60	$ 3,070,760,000.00
31	630.3.4P		630.3.4P	Concreto clase 35 MPA para tablero y anden	m3	936.00	$ 1,254,299.00	$ 1,174,023,864.00	900.00	$ 1,128,869,100.00	-	-423.40	-531,070,197.00	0.00	0.00	476.60	$ 597,798,903.00
32	630.3.5P		630.3.5P	Concreto clase 28 MPA para Zapatas, Estribos, Aletas, dados y placas	m3	254.00	$ 1,010,000.00	$ 256,540,000.00	4,058.00	$ 4,098,580,000.00	+	3,212.50	3,244,625,000.00	872.80	881,528,000.00	7,270.50	$ 7,343,205,000.00
33	630.4	630-22		Concreto clase 21 MPA	m3	847.00	$ 720,000.00	$ 609,840,000.00	4,120.00	$ 2,966,400,000.00	-	-3,400.30	-2,448,216,000.00	0.00	0.00	719.70	$ 518,184,000.00
34	630.6	630-22		Concreto clase 14 MPA	m3	169.00	$ 509,329.00	$ 86,076,601.00	355.00	$ 180,811,795.00	+	1,160.20	590,923,506.00	52.00	26,485,111.00	1,515.20	$ 771,735,301.00
35	632.1P		632.1P	Baranda Metálica	m	3,041.00	$ 665,000.00	$ 2,022,265,000.00	2,940.00	$ 1,955,100,000.00	+	250.60	166,649,000.00	0.00	0.00	3,190.60	$ 2,121,749,000.00
36	640.1	640-22		Acero de refuerzo Fy=420 Mpa.	kg	7,427,664.00	$ 6,752.00	$ 50,151,587,328.00	4,474,050.00	$ 30,208,785,600.00	+	48,469.00	327,262,688.00	42,457.00	286,669,664.00	4,522,519.00	$ 30,536,048,288.00
37	641.1	641-22		Acero de Preesfuerzo	Tf-m	4,228,628.00	$ 2,426.00	$ 10,258,651,528.00	10,517,210.00	$ 25,514,751,460.00	-	-1,570,150.00	-3,809,183,900.00	0.00	0.00	8,947,060.00	$ 21,705,567,560.00
38	642.1	642-22		Apoyo elastomérico de neopreno, dureza 60 (60x60x5cm con 2 platinas)	u	64.00	$ 723,081.00	$ 46,277,184.00	110.00	$ 79,538,910.00	-	-33.00	-23,861,673.00	0.00	0.00	77.00	$ 55,677,237.00
39	642.2	642-22		Sello para juntas para puentes (Suministro e instalación de junta de dilatación Tablero-Estribo A=5cm, en ángulo 4"x4"x3/8". Incluye lleno de junta en Sikaflex y banda SIKA OVC O-22 o equivalentes)	m	120.00	$ 372,145.00	$ 44,657,400.00	260.00	$ 96,757,700.00	+	167.80	62,445,931.00	0.00	0.00	427.80	$ 159,203,631.00
40	661.1	661-22		Tubería de Concreto Reforzado CLASE III, de 900mm de diámetro interior	m	1,724.00	$ 670,000.00	$ 1,155,080,000.00	1,988.00	$ 1,331,960,000.00	-	-92.00	-61,640,000.00	390.40	261,568,000.00	1,896.00	$ 1,270,320,000.00
41	671.1	671-22		Cuneta de concreto vaciada insitu, no incluye la conformación de la superficie de apoyo	m3	6,250.00	$ 560,000.00	$ 3,500,000,000.00	8,780.00	$ 4,916,800,000.00	-	-1,612.60	-903,056,000.00	0.00	0.00	7,167.40	$ 4,013,744,000.00
42	673.1	673-22		Geotextil Tipo II no tejido	m2	126.00	$ 7,777.00	$ 979,902.00	525,580.00	$ 4,087,435,660.00	-	-352,875.00	-2,744,308,875.00	34,334.10	267,016,296.00	172,705.00	$ 1,343,126,785.00
43	673.2	673-22		Material granular drenante	m3	1,230.00	$ 122,801.00	$ 151,045,230.00	700.00	$ 85,960,700.00	+	12,421.00	1,525,311,221.00	317.00	38,927,917.00	13,121.00	$ 1,611,271,921.00
44	673.3	673-22		Material de cobertura tipo SBG	m3	560.00	$ 172,304.00	$ 96,490,240.00	0.00	$ -	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	$ -
45	683.4P		683.4P	Muro en suelo mecánicamente estabilizado en malla hexagonal doble torsión, alambre con recubrimiento 90Zn10Al revestido . Rellenos y conformación realizados mecánicamente y armados manualmente. Incluye transporte.	m2	12,184.00	$ 440,000.00	$ 5,360,960,000.00	20,550.00	$ 9,041,999,943.00	+	10,008.20	4,403,608,000.00	0.00	0.00	30,558.20	$ 13,445,607,943.00
Subtotal								**$ 142,733,717,403.00**		**$ 137,053,801,248.00**			**$ (23,038,680,054.00)**		**$ 2.180.330.077.00**		**$ 114,015,121,194.00**
SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD																	
46	1P		MSV-2015	Suministro y aplicación de pintura en frio acrílica pura base agua para líneas de demarcación de pavimentos	m	218,321.00	$ 1,989.00	$ 434,240,469.00	124,600.00	$ 247,829,400.00	-	-29,176.10	-58,031,263.00	0.00	0.00	95,423.90	$ 189,798,137.00
47	2P		MSV-2015	Suministro y aplicación de pintura en frio acrílica pura base agua para marca Vial con pintura en frio	m2	1,160.00	$ 24,098.00	$ 27,953,680.00	1,160.00	$ 27,953,680.00	+	408.00	9,832,055.00	0.00	0.00	1,568.00	$ 37,785,735.00
48	4P		MSV-2015	Suministro e instalación de tachas reflectiva bidireccionales	u	44,212.00	$ 8,377.00	$ 370,363,924.00	24,920.00	$ 208,754,840.00	-	-6,127.00	-51,325,879.00	0.00	0.00	18,793.00	$ 157,428,961.00
49	5P		MSV-2015	Suministro e instalación de señal vertical de transito sp, sr y si (75cm*75cm) con lamina acero galvanizado retroreflectiva	u	244.00	$ 399,456.00	$ 97,467,264.00	3,810.00	$ 1,521,927,360.00	-	-3,546.00	-1,416,470,976.00	16.00	6,391,296.00	264.00	$ 105,456,384.00
50	730.1	730-22		Defensa metálica	m	3,214.00	$ 233,492.00	$ 750,443,288.00	3,000.00	$ 700,476,000.00	-	-1,200.00	-280,190,400.00	0.00	0.00	1,800.00	$ 420,285,600.00
51	730.2	730-22		Sección final	u	84.00	$ 103,783.00	$ 8,717,772.00	100.00	$ 10.378.300.00	-	-40.00	-4,151,320.00	0.00	0.00	60.00	$ 6,226,980.00
52	740.1	740-22		Captafaros	u	7,498.00	$ 22,154.00	$ 166,110,692.00	5,000.00	$ 110,770,000.00	-	-1,530.00	-33,895,620.00	0.00	0.00	3,470.00	$ 76,874,380.00
Subtotal								**$ 1,855,297,089.00**		**$ 2,828,089,580.00**			**$ (1,834,233,403.00)**		**$ 6,391,296.00**		**$ 993,856,177.00**
OBRAS VARIAS																	
53	810.1	810-22		Protección de Taludes con bloques de césped	m2	144,000.00	$ 17,900.00	$ 2,577,600,000.00	71,957.00	$ 1,288,030,300.00	-	-23,466.00	-420,041,400.00	0.00	0.00	48,491.00	$ 867,988,900.00
Subtotal								**$ 2,577,600,000.00**		**$ 1,288,030,300.00**			**$ (420,041,400.00)**		**$ -**		**$ 867,988,900.00**
TRANSPORTES																	
54	900.2	900-22		Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y préstamos para distancias mayores de mil metros (1000 m), medido a partir de cien metros (100 m)	m3-km	7,144,729.00	$ 1,060.00	$ 7,573,412,740.00	3,062,472.00	$ 3,246,220,320.00	-	-1,473,271.10	-1,561,667,366.00	58,960.20	62,497,812.00	1,589,200.90	$ 1,684,552,954.00
Subtotal								**$ 7,573,412,740.00**		**$ 3,246,220,320.00**			**$ (1,561,667,366.00)**		**$ 62,497,812.00**		**$ 1,684,552,954.00**
ÍTEMS NO PREVISTOS																	
55	500.1	500-22		PAVIMENTO EN CONCRETO HIDRÁULICO MR-45 (Sector Putumayo)	m3	0.00	$ 1,101,441.00	$ -	43,691.00	$ 48,123,058,731.00	-	-5,761.00	-6,345,401,601.00			37,930.00	$ 41,777,657,130.00
56	NP-05			SUMINISTRO E INSTALACIÓN BARRA DE ALTA RESISTENCIA TIPO Y1035 DIAMETRO=57 mm L=5.05 m c/u o similar (Apoyo Temporal)	u	0.00	$ 8,156,902.00	$ -		$ -	+	320.00	2,610,208,640.00			320.00	$ 2,610,208,640.00
57	NP-06			JUNTA ELASTOMÉRICA SISMICA DE DILATACIÓN DE MOVIMIENTO 600 (±300) TIPO 1 o similar PARA PILA 2 Y EJE 12 (suministro)	m	0.00	$ 31,499,390.00	$ -		$ -	+	22.80	718,186,092.00			22.80	$ 718,186,092.00
58	NP-07			JUNTA T-250 PARA ESTRIBOS 1 y 2 o similar (suministro)	m	0.00	$ 15,057,059.00	$ -		$ -	+	22.80	343,300,945.00			22.80	$ 343,300,945.00
59	NP-08			JUNTA ELASTOMERICA SISMICA DE DILATACION DE MOVIMIENTO 800 (±400) TIPO 3 o similar PARA PILA 6 (suministro)	m	0.00	$ 36,175,223.00	$ -		$ -	+	11.40	412,397,542.00			11.40	$ 412,397,542.00
60	621.1P			PILOTE DE CONCRETO VACIADO IN SITU DE 35 MPA, DIÁMETRO Ø = 1.80 m. INCLUYE EXCAVACIÓN, (NO INCLUYE CAMISA NO RECUPERABLE. NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO.)	m	0.00	$ 6,212,436.00	$ -		$ -	+	2,084.00	12,946,716,624.00			2,084.00	$ 12,946,716,624.00
61	621.5P			CAMISA PERMANENTE DE DÍAMETRO 1.80 m (en acero A-36; e= 15mm)	m	0.00	$ 14,963,102.00	$ -		$ -	+	1,320.00	19,751,294,640.00			1,320.00	$ 19,751,294,640.00
62	NP-09			AISLADOR DE PÉNDULO FRICCIONAL TIPO 1 FPS PUENTE 1 (Pila 3-4-5) o similar	u	0.00	$ 240,175,334.00	$ -		$ -	+	6.00	1,441,052,004.00			6.00	$ 1,441,052,004.00
63	NP-10			AISLADOR DE PÉNDULO FRICCIONAL TIPO 2 FPS Puente 2 (Pila 7-8-9-10-11) o similar	u	0.00	$ 396,887,878.00	$ -		$ -	+	10.00	3,968,878,780.00			10.00	$ 3,968,878,780.00
64	642.1.1			APOYO ELASTOMÉRICO HDRB-H 500X107 (Vigas Postensadas) o similar	u	0.00	$ 41,366,523.00	$ -		$ -	+	34.00	1,406,461,782.00			34.00	$ 1,406,461,782.00
65	642.1.2			APOYO ELASTOMÉRICO HDRB-H 930X163 (Pilas 2-6-12) o similar	u	0.00	$ 154,812,009.00	$ -		$ -	+	8.00	1,238,496,072.00			8.00	$ 1,238,496,072.00
66	800.5			CERCA DE ALAMBRE DE PÚAS CON POSTES DE PLASTICO CON (4 HILOS)	m	0.00	$ 39,679.00	$ -		$ -	+	56,000.00	2,222,024,000.00			56,000.00	$ 2,222,024,000.00
67	201.16			REMOCIÓN DE CERCAS DE ALAMBRE (Incluye traslado)	m	0	$ 6,174.00	$ -		$ -	+	56,000.00	345,744,000.00			56,000.00	$ 345,744,000.00
68	201.15			REMOCIÓN DE ALCANTARILLAS	m	0	$ 134,575.00	$ -		$ -	+	1,377.00	185,309,775.00			1,377.00	$ 185,309,775.00
69	900.1			TRANSPORTE DE MATERIALES PROVENIENTES DE LA EXCAVACIÓN DE LA EXPLANACIÓN, CANALES Y PRÉSTAMOS, ENTRE CIEN METROS(100 M) Y MIL METROS(1.000 M) DE DISTANCIA.	m3-E	0	$ 1,889.00	$ -		$ -	+	66,600.00	125,807,400.00			66,600.00	$ 125,807,400.00
70	NP-01			Cinta PVC V15 o similar	m	0	$ 68,117.00	$ -		$ -	+	1,590.00	108,306,030.00			1,590.00	$ 108,306,030.00
71	NP-02			Tubería perforada PVC, ASTM D 1785, de Diámetro 100 mm (4") o similar	m	0	$ 24,478.00	$ -		$ -	+	15,365.00	376,104,470.00			15,365.00	$ 376,104,470.00
72	NP-03			Tubería perforada PVC, ASTM D 1785, de Diámetro 200 mm (8") o similar	m	0	$ 70,616.00	$ -		$ -	+	3,215.00	227,030,440.00			3,215.00	$ 227,030,440.00
73	NP-11			HUMECTACION DE VIA (Consumo Agua = 0.4 l/m2 - Lado Putumayo)	Día	0	$ 3,203,366.00	$ -		$ -	+	250.00	800,841,500.00			250.00	$ 800,841,500.00
Subtotal								**$ -**		**$ 48,123,058,731.00**			**$ 42,882,759,135.00**				**$ 91,005,817,866.00**
TOTAL OBRAS								**$ 272,686,149,666.00**		**$ 272,686,149,666.00**			**$ -**		**15,839,215,377.00**		**$ 272,686,149,666.00**
Ajuste al peso																	

CONCEPTO	VALOR TOTAL	ANTERIOR	PRESENTES	EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA	CONDICIONES ACTUALIZADAS
* SUBTOTAL BÁSICO DE OBRAS (A)	$ 272,686,149,666.00	$ 272,686,149,666.00	$ -	$ 15,839,215,377.00	$ 272,686,149,666.00
PROVISIÓN PARA AJUSTES, USO DE OPCIÓN, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES (B)	$ 31,859,511,698.00	$ 31,859,511,698.00	$ -	$ 1,846,103,902.00	$ 31,859,511,698.00
PROVISIÓN PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DÍAS DE LA SEMANA (C)	$ 300,000,000.00	$ 300,000,000.00	$ -	$ -	$ 300,000,000.00
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO INCLUYE OBRAS COMPLEMENTARIAS Y AJUSTES D=(A+B+C)	$ 304,845,661,364.00	$ 304,845,661,364.00	$ -	$ 17,685,319,279.00	$ 304,845,661,364.00
VALOR IVA (OBRA) (19% SOBRE UTILIDAD OBRA) (E)	$ 1,992,706,478.00	$ 1,992,706,478.00	$ -	$ 115,748,113.00	$ 1,992,706,478.00
VALOR IVA (ACTAS DE AJUSTE) (19% SOBRE UTILIDAD OBRA) (F)	$ 232,819,509.00	$ 232,819,509.00	$ -	$ 13,530,961.00	$ 232,819,509.00
VALOR IVA (JORNADAS 24 HORAS (19% SOBRE UTILIDAD OBRA) (G)	$ 2,192,308.00	$ 2,192,308.00	$ -	$ -	$ 2,192,308.00
SUBTOTAL OBRAS (INCLUYE IVA) H=(D+E+F+G)	**$ 307,073,379,659.00**	**$ 307,073,379,659.00**	**$ -**	**$ 17,814,598,353.00**	**$ 307,073,379,659.00**
* REVISIÓN Y/O AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O INCORPORACIÓN Y/U OPTIMIZACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS A FASE III. (I)	$ 3,340,000,000.00	$ 3,340,000,000.00	$ -	$ 2,920,796,020.00	$ 3,340,000,000.00
* IVA - REVISIÓN Y/O AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O INCORPORACIÓN Y/U OPTIMIZACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS A FASE III. J = (I * 19%)	$ 634,600,000.00	$ 634,600,000.00	$ -	$ 554,951,244.00	$ 634,600,000.00
* **TOTAL REVISIÓN Y/O AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O INCORPORACIÓN Y/U OPTIMIZACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS A FASE III. K =(I+J)**	**$ 3,974,600,000.00**	**$ 3,974,600,000.00**	**$ -**	**$ 3,475,747,264.00**	**$ 3,974,600,000.00**
* **TOTAL GESTIÓN SOCIAL , PREDIAL , AMBIENTAL Y SOSTENIBILIDAD (Incluye EIA,PAGA e IVA19%) (L)**	**$ 7,814,781,342.00**	**$ 7,814,781,342.00**	**$ -**	**$ 24,398,570.00**	**$ 7,814,781,342.00**
* VALOR BÁSICO PROVISION PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19 = (M)	$ 501,675,164.00	$ 501,675,164.00	$ -	$ -	$ 501,675,164.00
* VALOR IVA (PROVISION PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19)= (O)	$ 2,324,836.00	$ 2,324,836.00	$ -	$ -	$ 2,324,836.00
* **TOTAL PROVISION PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19 (INCLUYE IVA) P = (M+O)**	**$ 504,000,000.00**	**$ 504,000,000.00**	**$ -**	**$ -**	**$ 504,000,000.00**
* TOTAL BÁSICO ACTA. Q = (D+I+M)	$ 308,687,336,528.00	$ 308,687,336,528.00	$ -	$ 20,606,115,299.00	$ 308,687,336,528.00
* TOTAL IVA ACTA. R = (E+F+G+J+O)	**$ 2,864,643,131.00**	$ 2,864,643,131.00	$ -	$ 684,230,318.00	$ 2,864,643,131.00
* **VALOR TOTAL. S = (H+K+L+P)**	**$ 319,366,761,001.00**	**$ 319,366,761,001.00**	**$ -**	**$ 21,314,744,187.00**	**$ 319,366,761,001.00**

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

CAUSALES DE LA MODIFICACIÓN (campo obligatorio). Cuando la causal de la modificación corresponda a variación en las cantidades de obra por necesidades del proyecto, se debe indicar la justificación. Cuando la causal de la modificación corresponda a una adición, prórroga o modificación del contrato debe indicarse el número de la adición, prórroga o modificación y la fecha de suscripción. Cuando la modificación corresponda a un trámite de ítems no previstos, se debe indicar el número del Acta de Fijación de Ítems No Previstos y la fecha de suscripción:

La presente modificación se realiza debido a la actualización de "REVISIÓN Y/O AJUSTES Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O INCORPORACIÓN Y/U OPTIMIZACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS", donde, de acuerdo con los capítulos VOLUMEN I. ESTUDIO DE TRANSITO, CAPACIDAD Y NIVELES DE SERVICIO, VOLUMEN II. ESTUDIO DE TRAZADO Y DISEÑO GEOMÉTRICO, SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD VIAL, VOLUMEN III. ESTUDIO DE GEOLOGÍA, VOLUMEN IV. ESTUDIO DE SUELOS PARA EL DISEÑO DE FUNDACIONES DE PUENTES, OBRAS DE DRENAJE Y ESTRUCTURAS DE CONTENCIÓN, VOLUMEN VI. ESTUDIO GEOTÉCNICO PARA EL DISEÑO DEL PAVIMENTO, VOLUMEN VII. ESTUDIO DE HIDROLOGÍA, HIDRÁULICA Y SOCAVACIÓN, VOLUMEN VIII. ESTUDIO Y DISEÑO DE ESTRUCTURAS, VOLUMEN XIII. ESTUDIO DE CANTIDADES DE OBRAS, ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS NO PREVISTOS Y PRESUPUESTOS, se incorporan los ítem necesarios para desarrollar las actividades de vía y puente, los cuales no estan incluidos dentro del listado de los rubros contractuales; razón por la cual se debe generar los NP SUMINISTRO E INSTALACIÓN BARRA DE ALTA RESISTENCIA TIPO Y1035 DIÁMETRO=57 mm L=5.05 m c/u o similar (Apoyo Temporal), JUNTA ELASTOMÉRICA SÍSMICA DE DILATACIÓN DE MOVIMIENTO 600 (±300) TIPO 1 o similar PARA PILA 2 Y EJE 12 (suministro), JUNTA T-250 PARA ESTRIBOS 1 y 2 o similar (suministro), JUNTA ELASTOMÉRICA SÍSMICA DE DILATACIÓN DE MOVIMIENTO 800 (±400) TIPO 3 o similar PARA PILA 6 (suministro), PILOTE DE CONCRETO VACIADO IN SITU DE 35 MPA, DIÁMETRO Ø = 1.80 m. INCLUYE EXCAVACIÓN, (NO INCLUYE CAMISA NO RECUPERABLE. NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO.), CAMISA PERMANENTE DE DIÁMETRO 1.80 m (en acero A-36; e= 15mm), AISLADOR DE PÉNDULO FRICCIONAL TIPO 1 FPS PUENTE 1 (Pila 3-4-5) o similar, AISLADOR DE PÉNDULO FRICCIONAL TIPO 2 FPS Puente 2 (Pila 7-8-9-10-11) o similar, APOYO ELASTOMÉRICO HDRB-H 500X107 (Vigas Postensadas) o similar, APOYO ELASTOMÉRICO HDRB-H 930X163 (Pilas 2-6-12) o similar, CERCA DE ALAMBRE DE PÚAS CON POSTES DE PLÁSTICO CON (4 HILOS), REMOCIÓN DE CERCAS DE ALAMBRE (Incluye traslado), REMOCIÓN DE ALCANTARILLAS, TRANSPORTE DE MATERIALES PROVENIENTES DE LA EXCAVACIÓN DE LA EXPLANACIÓN, CANALES Y PRÉSTAMOS, ENTRE CIEN METROS(100 M) Y MIL METROS(1.000 M) DE DISTANCIA, Cinta PVC V15 o similar, Tubería perforada PVC ASTM D 1785 de Diámetro 100 mm (4") o similar, Tubería perforada PVC ASTM D 1785 de Diámetro 200 mm (8") o similar, HUMECTACIÓN DE VÍA (Consumo Agua = 0.4 l/m2 - Lado Putumayo). Las actividades, luego de surtido el correspondiente proceso de aprobación por parte de interventoría e INVIAS mediante actas de fijación de precios no previstos firmadas No.2 del 14/03/2024, se incluye en la presente acta.

Por otra parte y con base en la actualización de cantidades de obra luego de la implantación en campo de los diseños, se requirió realizar la presente acta de modificación de mayores y menores cantidades de obra. Balance realizado por el contratista; verificado y aprobado por la interventoría, según las necesidades del proyecto. Los ítem actualmente afectados son los siguientes: 200.2, 201.7, 210.1.2, 210.2.2, 230.1P, 310.1, 311.1, 320.1, 330.4, 421.1, 450.2P, 450.9P, 460.1P, 465.1, 600.1.1, 600.2.4, 610.2, 610.3, 621.1.4P, 630.1.P, 630.2.P, 630.1.1P, 630.1.2P, 630.3.1P, 630.3.4P, 630.3.5P, 630.4, 630.6, 632.1P, 640.1, 641.1, 642.1, 642.2, 661.1, 671.1, 673.1, 673.2, 683.4P, 1P, 4P, 5P, 730.1, 730.2, 740.1, 810.1, 900.2, 500.1., NP-05, NP-06, NP-07, NP-08, 621.1P, 621.5P, NP-09, NP-10, 642.1.1, 642.1.2, 800.5, 201.16, 201.15, 900.1, NP-02, NP-03, NP-04, NP-11

La presente acta de modificación de cantidades de obra se suscribe por el Jefe de la Unidad Ejecutora con base en la evaluación y justificación técnica presentada por el Contratista y la Interventoría, de acuerdo con lo estipulado contractualmente.

Firma:
NOMBRE: JORGE EDUARDO DUARTE RODRIGUEZ
Representante Legal o Apoderado
Contratista
Matrícula profesional No. : 215422 CSJ

Firma:
NOMBRE: JORGE ÁLVARO SANCHEZ BLANCO
Representante Legal o Apoderado
Interventoría
Matrícula profesional No. : 2520200584 CND

Firma: Karol Roca Pacheco
NOMBRE: KAROL ROCA PACHECO
Titular Gerencia: SMCN-GRUPO ORIENTE
Matrícula profesional No. : 13202115547 BLV

Firma: Karol Roca Pacheco
NOMBRE: KAROL ROCA PACHECO
Jefe Unidad Ejecutora
Matrícula profesional No. : 13202115547 BLV

Firmado digitalmente por JOSE RICARDO BURBANO BARCENA

Revisión:

Supervisor del Contrato de Interventoría — NOMBRE: JOSÉ RICARDO BURBANO BARCENAS — Matrícula profesional No. : 52202-46096 NRÑ — Firma (Suscribe según su competencia)

Director Territorial — NOMBRE: JOSÉ RICARDO BURBANO BARCENAS — Matrícula profesional No. : 52202-46096 NRÑ — Firma (Suscribe según su competencia funcional)

Gestor Técnico de Proyecto — NOMBRE: MIGUEL ANGEL GUACALES DIAZ — Matrícula profesional No. : 19202-215720 CAU — Firma: Miguel Angel Guacales Diaz (Suscribe según su competencia)

Original: Archivo Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA ACTA DE FIJACIÓN DE ÍTEMS NO PREVISTOS	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-10-FR-4
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA 14/03/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SMCN-GRUPO ORIENTE **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** PUTUMAYO **ACTA No:** 2

CONTRATO No. 985 de 2022 (Indicar número de contrato y año)

OBJETO DEL CONTRATO:
MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA VILLAGARZON - SAN JOSE DEL FRAGUA Y PUENTE SOBRE EL RIO CAQUETA EN LOS DEPARTAMENTOS DE PUTUMAYO, CAUCA Y CAQUETA EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA VIAS PARA LA CONEXION DE TERRITORIOS, EL CRECIMIENTO SOSTENIBLE Y LA REACTIVACIÓN 2.0

PROYECTO: Villagarzon - Puerto Bello - San Jose del Fragua

CONTRATISTA: CONSORCIO VÍAS COLOMBIA 055

INTERVENTOR: CONSORCIO VIAL JAC 2022 **CONTRATO No.** 985 de 2022 (Indicar número de contrato y año)

FECHA CIERRE PROCESO DE SELECCIÓN CONTRATO DE OBRA: 9 (Día) 2 (Mes) 2022 (Año)

FECHA DE INICIO: 26 (Día) 7 (Mes) 2022 (Año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: (Día) (Mes) (Año) **VALOR INICIAL:** $ 319,366,761,001

FECHA DE REANUDACIÓN: (Día) (Mes) (Año) **VALOR ACUMULADO:** $ 319,366,761,001

FECHA DE VENCIMIENTO: 31 (Día) 7 (Mes) 2030 (Año)

A.I.U : 30 % **A** 20 % **I** 5 % **U** 5 %

Se establecen los precios que se resumen a continuación:

ITEM	GRUPO DE AJUSTE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
800.5	11601	CERCA DE ALAMBRE DE PÚAS CON POSTES DE PLASTICO CON (4 HILOS)	m	56,000.00	$ 39,679.00	$ 2,222,024,000.00
201.16	11601	REMOCIÓN DE CERCAS DE ALAMBRE (Incluye traslado)	m	56,000.00	$ 6,174.00	$ 345,744,000.00
201.15	11601	REMOCIÓN DE ALCANTARILLAS	m	1,377.00	$ 134,575.00	$ 185,309,775.00
900.1	11608	TRANSPORTE DE MATERIALES PROVENIENTES DE LA EXCAVACIÓN DE LA EXPLANACIÓN, CANALES Y PRÉSTAMOS, ENTRE CIEN METROS(100 M) Y MIL METROS(1.000 M) DE DISTANCIA.	m3-E	66,600.00	$ 1,889.00	$ 125,807,400.00
NP-01	11604	Cinta PVC V15 o similar	m	1,590.00	$ 68,117.00	$ 108,306,030.00
NP-02	11604	Tubería perforada PVC, ASTM D 1785, de Diámetro 100 mm (4") o similar	m	15,365.00	$ 24,478.00	$ 376,104,470.00
NP-03	11604	Tubería perforada PVC, ASTM D 1785, de Diámetro 200 mm (8") o similar	m	3,215.00	$ 70,616.00	$ 227,030,440.00
NP-05	14103	SUMINISTRO E INSTALACIÓN BARRA DE ALTA RESISTENCIA TIPO Y1035 DIAMETRO=57 mm L=5.05 m c/u o similar (Apoyo Temporal)	u	320.00	$ 8,156,902.00	$ 2,610,208,640.00
NP-06	14103	JUNTA ELASTOMÉRICA SISMICA DE DILATACIÓN DE MOVIMIENTO 600 (±300) TIPO 1 o similar PARA PILA 2 Y PILA 12 (suministro)	m	22.80	$ 31,499,390.00	$ 718,186,092.00
NP-07	14103	JUNTA T-250 PARA ESTRIBOS 1 y 2 o similar (suministro)	m	22.80	$ 15,057,059.00	$ 343,300,945.00
NP-08	14103	JUNTA ELASTOMERICA SISMICA DE DILATACION DE MOVIMIENTO 800 (±400) TIPO 3 o similar PARA PILA 6 (suministro)	m	11.40	$ 36,175,223.00	$ 412,397,542.00
621.1P	14103	PILOTE DE CONCRETO VACIADO IN SITU DE 35 MPA, DIÁMETRO Ø = 1.80 m. INCLUYE EXCAVACIÓN, (NO INCLUYE CAMISA NO RECUPERABLE. NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO.)	m	2,084	$ 6,212,436.00	$ 12,946,716,624.00
621.5P	14103	CAMISA PERMANENTE DE DÍAMETRO 1.80 m (en acero A-36; e= 15mm)	m	1,320	$ 14,963,102.00	$ 19,751,294,640.00
NP-09	14103	AISLADOR DE PÉNDULO FRICCIONAL TIPO 1 FPS PUENTE 1 (Pila 3-4-5) o similar	u	6.00	$ 240,175,334.00	$ 1,441,052,004.00
NP-10	14103	AISLADOR DE PÉNDULO FRICCIONAL TIPO 2 FPS Puente 2 (Pila 7-8-9-10-11) o similar	u	10.00	$ 396,887,878.00	$ 3,968,878,780.00
642.1.1	14103	APOYO ELASTOMÉRICO HDRB-H 500X107 (Vigas Postensadas) o similar	u	34.00	$ 41,366,523.00	$ 1,406,461,782.00
642.1.2	14103	APOYO ELASTOMÉRICO HDRB-H 930X163 (Pilas 2-6-12) o similar	u	8.00	$ 154,812,009.00	$ 1,238,496,072.00
NP-11	11601	HUMECTACION DE VIA (Consumo Agua = 0.4 l/m2 - Lado Putumayo)	DIA	250.00	$ 3,203,366.00	$ 800,841,500.00

NOTAS:

1. Para los contratos pactados con ajustes, los precios unitarios correspondientes a los Ítems no previstos están referidos al origen del contrato (I_o) y se han fijado tomando como base los costos vigentes en el mercado.
2. Para los contratos pactados sin ajustes, se tomarán los costos vigentes en el mercado al momento del estudio de la solicitud.
3. Hacen parte de la presente Acta de Fijación de precios no previstos los documentos relacionados en el instructivo MEPI-MN1-IN-10 del presente formato.
4. Es responsabilidad del Contratista la presentación de los ítems no previstos, con los documentos anexos que permitan verificar su utilización y justificación, manteniendo los precios aprobados en desarrollo del contrato.
5. Es reponsabilidad de la Interventoría la aprobación del análisis del precio unitario, la especificación particular, la cantidad y presentar la justificación técnica, económica y jurídica al Instituto de la fijacion de ítems no previstos.
6. La presente Acta se suscribe por parte del Instituto, con base en el concepto de aprobación emitido por la Interventoría.

OBSERVACIONES:

Firma
Nombre: JORGE EDUARDO DUARTE RODRIGUEZ
Representante Legal o su Apoderado
Contratista
Matricula profesional No. : 215422 CSJ

Firma
Nombre: JORGE ALVARO SANCHEZ BLANCO
Representante Legal o su Apoderado
Interventoría
Matricula profesional No. : 25202-100584 CND

Firma:
Nombre: GUSTAVO ADOLFO BASTIDAS GODOY
Titular Gerencia:
Matricula profesional No. : 25202-103081CND

Firma
Nombre: GUSTAVO ADOLFO BASTIDAS GODOY
Jefe Unidad Ejecutora
Matricula profesional No. : 25202-103081CND

Revisión:

Supervisor del Contrato de Interventoría	Nombre: JOSÉ RICARDO BURBANO BARCENAS	Firma (Suscribe según su competencia)	Firmado digitalmente por JOSE RICARDO BURBANO BARCENA
Director Territorial	Nombre: JOSÉ RICARDO BURBANO BARCENAS	Firma (Suscribe según su competencia funcional)	Firmado digitalmente por JOSE RICARDO BURBANO BARCENA
Gestor Técnico de Proyecto	Nombre: MIGUEL ÁNGEL GUACALES DÍAZ	Firma (Suscribe según su competencia)	

Original: Archivo Gestión del INVIAS.
Copia: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor, Dirección Territorial y Subdirección de Reglamentación Técnica e Innovación.

Certificación
Bancaria

Fecha: **12 de junio de 2024**

Señores:
A quien pueda interesar

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que la empresa **CONSORCIO VIAS COLOMBIA 055,** identificado con **NIT** No **901584893** denominada **CONSORCIO VIAS COLOMBIA 055**, a la fecha **06/12/2024**, presenta la siguiente información:

TIPO DE CUENTA	CUENTA	FECHAAPERT	ESTADO	NOMBRE_SUCURSAL	NUMERO_DE_SUCURSAL
CUENTA CORRIENTE	**04000003322**	**05/11/2022 (M/D/A)**	**ACTIVA**	**CENTRO 93**	**40**

Quedamos a su disposición, por eso en caso de requerir ampliar la anterior información podrá comunicarse con su comercial o gerenciado, en el momento que lo estime conveniente.

Atentamente,



Elizabeth Rivero Jimenez

*** Importante:** Esta constancia sólo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
BANCOLOMBIA SA Establecimiento Bancario.

Bancolombia

jasb
Jorge Álvaro Sánchez
Desarrollo Integral de Proyectos
Transversal 55A No. 115A-06
Barrio Ilarco
Tel: +57(1) 300 3053
Cel: +57(1) 301 3369740
Bogotá D.C., Colombia
Código postal: 111111
info@jasb.com.co

CONSORCIO VIAL JAC 2022
NIT. 901582956-0

CERTIFICA:

[illegible] **CONSORCIO VÍAS COLOMBIA 055** [illegible] 0[illegible].58[illegible].8[illegible]3[illegible] [illegible] 85 [illegible] 2022, cuyo objeto es “MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, [illegible] 2.0". [illegible]

[illegible]

[illegible] 2 [illegible] 202[illegible]

[illegible]

ING. JORGE ALVARO SÁNCHEZ BLANCO
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO VIAL JAC 2022

[illegible]
