MESA INTERDISCIPLINARIA EN EL MARCO DEL CONTRATO LP-006-2023

OBJETO: Optimización red de distribución de agua potable en 355mm centro histórico y conexiones domiciliarias para aguas residuales domésticas casco urbano en el Municipio de Galapa - Departamento del Atlántico.

SESIÓN No. 003			
Fecha de celebración	Miércoles, dos (2) de octubre de 2024.		
Hora de Inicio	2:16 PM	**Hora de fin**	3:30 PM
Lugar	Oficina de Secretaría de Desarrollo Territorial.		
Llamado a lista y verificación del Quorum	Juan Guillermo Clavijo Bolívar		**Jefe Oficina Jurídica**
	Guillermo González Navarro		**Secretario de Desarrollo Territorial**
	Daniela López Bossio		**Asesora Jurídica Externa**
	Javier Sandoval		**Interventor**
	María García Aguirre		**Representante legal Consorcio Redes Galapa 2023**
Objeto de la Sesión	Estudio de viabilidad de reinicio del Contrato de Obra No. LP-006-2023 y Contrato de Interventoría No. CMC-027-2023.		
Desarrollo de la Sesión	**1.** Contextualización mesa a cargo del jefe de oficina asesora jurídica, quien indica que el día 2 de septiembre del año en curso se suscribió acta de suspensión tanto del Contrato de Obra como del Contrato de Interventoría que nos ocupa, debido a las fuertes lluvias ocasionadas por la llegada del fenómeno de La Niña, en la cual se estableció, específicamente, en la cláusula décimo tercera que la suspensión sería por el término de 30 días calendario o hasta que se superen las situaciones que dieron lugar a la misma. Así las cosa, hoy se cumplen los 30 días, surgiendo la necesidad de evaluar las condiciones para reinicio de los contratos en mención. **2.** Interviene Humberto Orozco Ramírez, en representación del Consorcio Redes Galapa 2023, quien reitera las problemáticas climatológicas que están afectando el cumplimiento de los plazos establecidos del contrato, donde por los fenómenos climatológicos ocurridos durante el mes		

Dirección: Calle 13 No. 17-117 Galapa, Atlántico
Correo institucional: contactenos@galapa-atlantico.gov.co
Línea de servicio a la ciudadanía: (+57) 3160272493
www.galapa-atlantico.gov.co
NIT: 890.102.472-0
AlcaldiaGalapa

	de septiembre de lluvias intensas, vendavales y tormentas eléctricas, se ha perjudicado la ejecución de las actividades. Así mismo, expresa que en el presente mes de octubre del año 2024 se estima según el IDEAM un aumento entre el 10% al 30% de la intensidad de lluvias frente al registro de años anteriores. Agrega que es importante mencionar que en el municipio se encuentra vigente calamidad pública declarada mediante Decreto No. 158 del 17 de agosto de 2024 y ante una urgencia manifiesta declarada a través de Decreto No. 159 de la misma fecha, basado en las fuertes lluvias ocasionadas por fenómeno de la niña que han empezado a causar estragos en Galapa, no solo a nivel social sino en la economía, ambiente e inclusive en la ejecución de las obras. Por lo que, manifiesta que aún no se han superados los inconvenientes que justificaron la suspensión actual y el reinicio de los trabajos para la fecha estimada de 2 de octubre del 2024. Finalmente, manifiesta al municipio la necesidad de prolongar la suspensión actual que se tiene del contrato LP-006-2023 hasta la normalización de las condiciones climatológicas que permitan el reinicio de los trabajos sin afectar la calidad de los trabajos y tiempo de desarrollo de estos. **3.** El interventor Javier Sandoval señala que no es conveniente reiniciar el Contrato de Obra, pues las lluvias persisten, inclusive el día de hoy llovió fuertemente, lo cual impide la ejecución de las actividades para concluir la obra. **4.** El Secretario de Desarrollo Territorial, Guillermo González, indicó que en visita realizada a las obras, el día de hoy, 2 de octubre, pudo constatar que las condiciones actuales imposibilitan continuar la ejecución de la obra, hasta tanto no cesen las lluvias, por lo cual recomienda, mantener suspendido los contratos por un término de 15 días más o

Dirección: Calle 13 No. 17-117 Galapa, Atlántico
Correo institucional: contactenos@galapa-atlantico.gov.co
Línea de servicio a la ciudadanía: (+57) 3160272493
www.galapa-atlantico.gov.co
NIT: 890.102.472-0
AlcaldiaGalapa

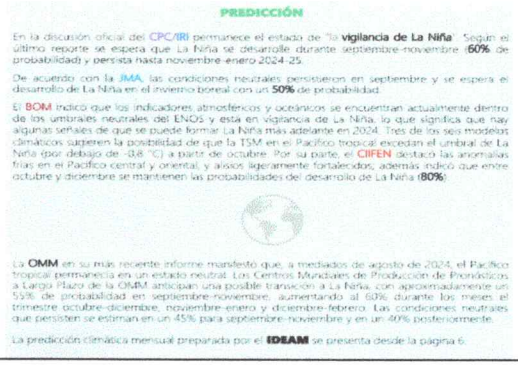
	hasta que se superen las condiciones que dieron lugar a la suspensión.
Decisión	Mantener la suspensión de los contratos LP-006-2023 y CMC-027-2023, por quince (15) días más o hasta que se superen las situaciones que dieron lugar a la suspensión.

FIRMAS PARA CONSTANCIA		
Nombre	**Cargo**	**Firma**
Juan Guillermo Clavijo Bolívar	**Jefe Oficina Jurídica**	
Guillermo González Navarro	**Secretario de Desarrollo Territorial**	
Daniela López Bossio	**Asesora Jurídica Externa**	
Javier Sandoval	**Interventor**	
María García Aguirre	**Representante legal de Consorcio Redes Galapa 2023**	

Dirección: Calle 13 No. 17-117 Galapa, Atlántico
Correo institucional: contactenos@galapa-atlantico.gov.co
Línea de servicio a la ciudadanía: (+57) 3160272493
www.galapa-atlantico.gov.co
NIT: 890.102.472-0
AlcaldiaGalapa

MESA INTERDISCIPLINARIA EN EL MARCO DEL CONTRATO LP-006-2023

OBJETO: Optimización red de distribución de agua potable en 355mm centro histórico y conexiones domiciliarias para aguas residuales domésticas casco urbano en el Municipio de Galapa - Departamento del Atlántico.

SESIÓN No. 004			
Fecha de celebración	Jueves, diecisiete (17) de octubre de 2024.		
Hora de Inicio	10:20 PM	**Hora de fin**	11:38 PM
Lugar	Oficina de Secretaría de Desarrollo Territorial.		
Llamado a lista y verificación del Quorum	Juan Guillermo Clavijo Bolívar		**Jefe Oficina Jurídica**
	Guillermo González Navarro		**Secretario de Desarrollo Territorial**
	Daniela López Bossio		**Asesora Jurídica Externa**
	Javier Sandoval		**Interventor**
	María García Aguirre		**Representante legal Consorcio Redes Galapa 2023**
Objeto de la Sesión	Estudio de viabilidad de reinicio del Contrato de Obra No. LP-006-2023 y Contrato de Interventoría No. CMC-027-2023.		
Desarrollo de la Sesión	1. Atendiendo el compromiso de la mesa de seguimiento del 02 de octubre de 2024, se procede a estudiar la viabilidad para reiniciar el Contrato de Obra No. LP-006-2023 y en consecuencia el Contrato de Interventoría No. CMC-027-2023. 2. El interventor Javier Sandoval señala que las lluvias aún no cesan en el municipio y que en publicación No. 358 del 11 de octubre de 2024, el IDEAM indicó lo siguiente: 		

PREDICCIÓN

En la discusión oficial del CPC/IRI permanece el estado de "la **vigilancia de La Niña**". Según el último reporte se espera que La Niña se desarrolle durante septiembre-noviembre (**60%** de probabilidad) y persista hasta noviembre-enero 2024-25.

De acuerdo con la JMA, las condiciones neutrales persistieron en septiembre y se espera el desarrollo de La Niña en el invierno boreal con un **50%** de probabilidad.

El BOM indicó que los indicadores atmosféricos y oceánicos se encuentran actualmente dentro de los umbrales neutrales del ENOS y está en vigilancia de La Niña, lo que significa que hay algunas señales de que se puede formar La Niña más adelante en 2024. Tres de los seis modelos climáticos sugieren la posibilidad de que la TSM en el Pacífico tropical excedan el umbral de La Niña (por debajo de -0.8 °C) a partir de octubre. Por su parte, el CIFEN destacó las anomalías frías en el Pacífico central y oriental, y aisos ligeramente fortalecidos, además indicó que entre octubre y diciembre se mantienen las probabilidades del desarrollo de La Niña (**80%**).

La **OMM** en su más reciente informe manifestó que, a mediados de agosto de 2024, el Pacífico tropical permanecía en un estado neutral. Los Centros Mundiales de Producción de Pronósticos a Largo Plazo de la OMM anticipan una posible transición a La Niña, con aproximadamente un 55% de probabilidad en septiembre-noviembre, aumentando al 60% durante los meses el trimestre octubre-diciembre, noviembre-enero y diciembre-febrero. Las condiciones neutrales que persisten se estiman en un 45% para septiembre-noviembre y en un 40% posteriormente.

La predicción climática mensual preparada por el **IDEAM** se presenta desde la página 6.

Dirección: Calle 13 No. 17-117 Galapa, Atlántico
Correo institucional: contactenos@galapa-atlantico.gov.co
Línea de servicio a la ciudadanía: (+57) 3160272493
www.galapa-atlantico.gov.co
NIT: 890.102.472-0
AlcaldíaGalapa

	Además, señaló que el mismo boletín indicó que en octubre y noviembre hace parte de la segunda temporada de lluvias en las regiones Andina y Caribe y procede a presentar el boletín. En tal sentido, expresa que no es conveniente reiniciar el Contrato de Obra, teniendo en cuenta que las lluvias aún persisten, sin embargo propone mantener el contrato suspendido por quince (15) días más o hasta que se superen las situaciones que dieron lugar a la suspensión. **3.** La representante legal del contratista solicita que se mantenga el contrato suspendido por quince (15) días más o hasta que se superen las situaciones que dieron lugar a la suspensión, atendiendo las mismas razones expuestas por el interventor. **4.** El Secretario de Desarrollo Territorial, Guillermo González indica estar de acuerdo con mantener suspendido los contratos por un término de 15 días más o hasta que se superen las condiciones que dieron lugar a la suspensión, haciendo la salvedad que semanalmente se evaluaran las condiciones y los boletines emitidos por el IDEAM, teniendo en cuenta que el porcentaje de ejecución que hace falta es mínimo y es prioridad que el municipio reciba a satisfacción la obra.
Decisión	Mantener la suspensión de los contratos LP-006-2023 y CMC-027-2023, por quince (15) días más o hasta que se superen las situaciones que dieron lugar a la suspensión.

FIRMAS PARA CONSTANCIA

Nombre	Cargo	Firma
Juan Guillermo Clavijo Bolívar	**Jefe Oficina Jurídica**	
Guillermo González Navarro	**Secretario de Desarrollo Territorial**	
Daniela López Bossio	**Asesora Jurídica Externa**	
Javier Sandoval	**Interventor**	
María García Aguirre	**Representante legal de Consorcio Redes Galapa 2023**	María García

Dirección: Calle 13 No. 17-117 Galapa, Atlántico
Correo institucional: contactenos@galapa-atlantico.gov.co
Línea de servicio a la ciudadanía: (+57) 3160272493
www.galapa-atlantico.gov.co
NIT: 890.102.472-0
AlcaldíaGalapa

MESA INTERDISCIPLINARIA EN EL MARCO DEL CONTRATO LP-006-2023

OBJETO: Optimización red de distribución de agua potable en 355mm centro histórico y conexiones domiciliarias para aguas residuales domésticas casco urbano en el Municipio de Galapa - Departamento del Atlántico.

SESIÓN No. 005			
Fecha de celebración	Martes, cinco (05) de noviembre de 2024.		
Hora de Inicio	2:20 PM	**Hora de fin**	3:18 PM
Lugar	Oficina de Secretaría de Desarrollo Territorial.		
Llamado a lista y verificación del Quorum	Juan Guillermo Clavijo Bolívar		**Jefe Oficina Jurídica**
	Guillermo González Navarro		**Secretario de Desarrollo Territorial**
	Daniela López Bossio		**Asesora Jurídica Externa**
	Javier Sandoval		**Interventor**
	María García Aguirre		**Representante legal Consorcio Redes Galapa 2023**
Objeto de la Sesión	Estudio de viabilidad de reinicio del Contrato de Obra No. LP-006-2023 y Contrato de Interventoría No. CMC-027-2023.		
Desarrollo de la Sesión	**1.** Atendiendo el compromiso de la mesa de seguimiento del 17 de octubre de 2024, se procede a estudiar la viabilidad para reiniciar el Contrato de Obra No. LP-006-2023 y en consecuencia el Contrato de Interventoría No. CMC-027-2023. **2.** La representante legal del contratista solicita que se mantenga el contrato suspendido por quince (15) días más o hasta que se superen las situaciones que dieron lugar a la suspensión, toda vez que las lluvias persisten y desde que inició el mes todos los días ha llovido. **3.** El interventor coadyuvó la solicitud, indicando que pese a que falta poco, no ve viable reiniciar el contrato puesto que las lluvias no permitirían culminar. **4.** El Secretario de Desarrollo Territorial, Guillermo González indica estar de acuerdo con mantener suspendido los contratos por un término de 15 días más, haciendo la salvedad que es el último plazo y no se prorrogará más.		

Dirección: Calle 13 No. 17-117 Galapa, Atlántico
Correo institucional: contactenos@galapa-atlantico.gov.co
Línea de servicio a la ciudadanía: (+57) 3160272493
www.galapa-atlantico.gov.co
NIT: 890.102.472-0
AlcaldíaGalapa

	Además expresó que semanalmente se evaluaran las condiciones y los boletines emitidos por el IDEAM, teniendo en cuenta que el porcentaje de ejecución que hace falta es mínimo y es prioridad que el municipio reciba a satisfacción la obra. **5.** Tanto la representante legal del consorcio como el interventor manifiestan estar de acuerdo con que sean 15 días sin posibilidad de prórroga, asumiendo lo que ello conlleve.
Decisión	Mantener la suspensión de los contratos LP-006-2023 y CMC-027-2023, por quince (15) días más, sin que haya lugar a prorroga.

FIRMAS PARA CONSTANCIA		
Nombre	**Cargo**	**Firma**
Juan Guillermo Clavijo Bolívar	**Jefe Oficina Jurídica**	
Guillermo González Navarro	**Secretario de Desarrollo Territorial**	
Daniela López Bossio	**Asesora Jurídica Externa**	
Javier Sandoval	**Interventor**	
María García Aguirre	**Representante legal de Consorcio Redes Galapa 2023**	

Dirección: Calle 13 No. 17-117 Galapa, Atlántico
Correo institucional: contactenos@galapa-atlantico.gov.co
Línea de servicio a la ciudadanía: (+57) 3160272493
www.galapa-atlantico.gov.co
NIT: 890.102.472-0
AlcaldíaGalapa
