Gobernación de Norte de Santander

SECRETARÍA DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES

**SDGR-025000**

**Para Cualquier Respuesta Cite este Radicado:**
**Rad No. 2024-25000-029326-3**
2024-11-20 11:33 -RIESGO
Destino: 11400
cc:
Rem/D: ADRIANA BOADA ARGUEL
Asunto: CUENTA DE COBRO JESV
Folios: 67
Anexos: INFORME

San José de Cúcuta,

Doctora

**ADRIANA BOADA ARGUELLO**

Profesional especializado, Grado 10

Área de Presupuesto

Secretaria de Hacienda Departamental

Gobernación de Norte de Santander

REFERENCIA: **TRAMITE DE PAGO.** **SECOP II**

Para dar cumplimiento a las disposiciones de la secretaria de Hacienda, estoy enviando los respectivos documentos para la cancelación del compromiso relacionado a continuación:

JESVAR MULTIPROYECTOS SAS, se identifica con **NIT: 9 0 1 4 4 2 4 4 7- 3,** CONTRATISTA la suma de **DOCIENTOS TRES MILLONES OCHOCIENTOS VEINTISIETE MIL CIENTO CINCUENTA Y NUEVE PESOS CON NOVENTA CENTAVOS MTC ( $ 203,827,159,90),**POR CONCEPTO CONTRATO N° RE-SGRD-03331-2024, CUYO OBJETO ATENCIÓN Y MANTENIMIENTO DE PUENTE JULIO SOBRE EL RÍO ARBOLEDAS, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE ARBOLEDAS, EN EL MARCO DE LA DECLARATORIA DE CALAMIDAD PUBLICA REALIZADA MEDIANTE DECRETO 001287 DEL 06 DE JUNIO DE 2024 POR EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER

Cordialmente,

**WILLIAM VERA ARIAS**

Secretaria Departamental de Gestión de Riesgos

**JESVAR MULTIPROYECTOS SAS**
NIT 901.442.447-3
CL 10 8 56 OF 201 Brr El Llano
Tel: (607) 3156232869
Cúcuta - Colombia
jesvarmultiproyectos@gmail.com

Factura electrónica de venta
**No. JEVS 44**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Señores** | DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER | | |
| **NIT** | 800.103.927-7 | **Teléfono** | (607) 0000000 - Ext. 000 |
| **Dirección** | AV 5 CLL 13 Y 14 | **Ciudad** | Cúcuta - Colombia |

| **Fecha y hora Factura** | |
|---|---|
| **Generación** | 19/11/2024, 09:26 |
| **Expedición** | 19/11/2024, 09:27 |
| **Vencimiento** | 18/12/2024 |

| Ítem | Descripción | Cantidad | Vr. Unitario | Vr. Bruto | Valor Impto.Cargo | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ATENCIÓN Y MANTENIMIENTO DE PUENTE JULIO SOBRE EL RÍO ARBOLEDAS, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE ARBOLEDA | 1.00 | 156,790,123.00 | 156,790,123.00 | 0.00 | 156,790,123.00 |
| 2 | ADMINISTRACION 23% | 1.00 | 36,061,728.29 | 36,061,728.29 | 0.00 | 36,061,728.29 |
| 3 | IMPREVISTOS 1% | 1.00 | 1,567,901.23 | 1,567,901.23 | 0.00 | 1,567,901.23 |
| 4 | UTILIDAD 6% | 1.00 | 9,407,407.38 | 9,407,407.38 | 0.00 | 9,407,407.38 |

**Total items:** 4

| | |
|---|---|
| **Total Bruto** | 203,827,159.90 |
| **Total a Pagar** | 203,827,159.90 |

**Valor en Letras:**
Doscientos tres millones ochocientos veintisiete mil ciento cincuenta y nueve pesos m/cte con noventa cent.

**Forma de pago:**
Crédito

**Medio de pago:**
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-12-18 por $ 203,827,159.90

**Observaciones:**
ACTA 1 DEL CONTRATO RE-SGRD-03331-2024 CUYO OBJETO ES ATENCIÓN Y MANTENIMIENTO DE PUENTE JULIO SOBRE EL RÍO ARBOLEDAS, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE ARBOLEDAS, EN EL MARCO DE LA DECLARATORIA DE CALAMIDAD PUBLICA REALIZADA MEDIANTE DECRETO 001287 DEL 06 DE JUNIO DE 2024 POR EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER.

Somos autoretenedores de ICA en el municipio de Cucuta según acuerdo 025 de 2019

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764066838489 aprobado en 20240305 prefijo JEVS desde el número 1 al 500 Vigencia: 12 Meses**

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

Responsable de IVA - Actividad Económica 4290 Construcción de otras obras de ingeniería civil Tarifa
**CUFE:** 2bd322ef339c7f3e0016005df924f88e6c5567454972deaab893d6b2215aaa8e1005814e368aba39eee22a0038d0d0d4

2

Banco AV Villas
NIT. 860.035.827-5

**BANCO COMERCIAL**
**"AV VILLAS"**
NIT 860035827 - 5
CRA. 13 No. 27-47 P-24 BOGOTA D.C.

**C E R T I F I C A :**

Que JESVAR MULTIPROYECTOS SAS identificado con el documento No. 901.442.447

posee en la oficina CUCUTA PRINCIPAL (951) una cuenta corriente

No. 951262880 desde el 3 de abril de 2024

Se expide la presente a solicitud del interesado a los 10 dias del mes de abril de 2024

Atentamente,

Gerente Oficina 951

Esta certificación tiene un costo de $ 13.950,00 , el cual será debitado de su cuenta y se verá reflejado en el extracto de la misma.

CAP-IM1-119-V1

DIAN

# Formulario del Registro Único Tributario

**001**

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 14939005762

(415)7707212489984(8020) 000001493900576 2

| 5. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 6. DV | 12. Dirección seccional | 14. Buzón electrónico |
|---|---|---|---|
| 8 8 2 1 1 8 1 3 | 7 | Impuestos de Cúcuta 7 | |

## IDENTIFICACIÓN

| 24. Tipo de contribuyente | 25. Tipo de documento | 26. Número de Identificación | 27. Fecha expedición |
|---|---|---|---|
| Persona natural o sucesión ilíquida 2 | Cédula de Ciudadanía 1 3 | 8 8 2 1 1 8 1 3 | 1 9 9 3 0 3 1 0 |

| Lugar de expedición | 28. País | 29. Departamento | 30. Ciudad/Municipio |
|---|---|---|---|
| COLOMBIA | 1 6 9 | Norte de Santander 5 4 | Cúcuta 0 0 1 |

| 31. Primer apellido | 32. Segundo apellido | 33. Primer nombre | 34. Otros nombres |
|---|---|---|---|
| VARGAS | RODRIGUEZ | JESUS | ENRIQUE |

35. Razón social

| 36. Nombre comercial | 37. Sigla |
|---|---|
| | |

## UBICACIÓN

| 38. País | 39. Departamento | 40. Ciudad/Municipio |
|---|---|---|
| COLOMBIA 1 6 9 | Norte de Santander 5 4 | Cúcuta 0 0 1 |

41. Dirección principal: CL 10 8 56 AP 202 ED EL TREBOL BRR EL LLANO

42. Correo electrónico: jevar_civil_contabilidad@hotmail.com

| 43. Código postal | 44. Teléfono 1 | 45. Teléfono 2 |
|---|---|---|
| 5 4 0 0 1 | 3 1 3 3 9 0 3 8 0 3 | |

## CLASIFICACIÓN

| Actividad económica | | | | Ocupación | |
|---|---|---|---|---|---|
| Actividad principal | | Actividad secundaria | | Otras actividades | | | |
| 46. Código | 47. Fecha inicio actividad | 48. Código | 49. Fecha inicio actividad | 50. Código 1 | 2 | 51. Código | 52. Número establecimientos |
| 4 2 9 0 | 2 0 1 3 0 1 3 0 | 4 2 1 0 | 2 0 1 3 0 1 3 0 | 0 2 4 0 | 8 1 3 0 | 2 1 4 2 | |

## Responsabilidades, Calidades y Atributos

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53. Código 5 | 1 4 | 2 2 | 4 8 | 5 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
14- Informante de exogena
22- Obligado a cumplir deberes formales a
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico

| Usuarios aduaneros | | | | | | | | | | Exportadores | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 55. Forma | 56. Tipo | Servicio | 1 | 2 | 3 |
| 54. Código | | | | | | | | | | | | 57. Modo | | | |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | | | 58. CPC | | | |

**IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación**

## Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2023 - 08 - 17 / 21 : 47: 46

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre VARGAS RODRIGUEZ JESUS ENRIQUE
985. Cargo CONTRIBUYENTE

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

Fecha generación documento PDF: 06-03-2024 04:00:32PM

DIAN

# Formulario del Registro Único Tributario
## Revisor Fiscal y Contador

**001**



Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14939005762

(415)7707212489984(8020) 000001493900576 2

| 5. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 6. DV | 12. Dirección seccional | 14. Buzón electrónico |
|---|---|---|---|
| 8 8 2 1 1 8 1 3 | 7 | Impuestos de Cúcuta | 7 |

**Revisor Fiscal y Contador**

**Revisor fiscal principal**

| 124. Tipo de documento | 125. Número de identificación | 126. DV | 127. Número de tarjeta profesional |
|---|---|---|---|
| | | | |

| 128. Primer apellido | 129. Segundo apellido | 130. Primer nombre | 131. Otros nombres |
|---|---|---|---|
| | | | |

| 132. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 133. DV | 134. Sociedad o firma designada |
|---|---|---|
| | | |

| 135. Fecha de nombramiento |
|---|
| |

**Revisor fiscal suplente**

| 136. Tipo de documento | 137. Número de identificación | 138. DV | 139. Número de tarjeta profesional |
|---|---|---|---|
| | | | |

| 140. Primer apellido | 141. Segundo apellido | 142. Primer nombre | 143. Otros nombres |
|---|---|---|---|
| | | | |

| 144. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 145. DV | 146. Sociedad o firma designada |
|---|---|---|
| | | |

| 147. Fecha de nombramiento |
|---|
| |

**Contador**

| 148. Tipo de documento | 149. Número de identificación | 150. DV | 151. Número de tarjeta profesional |
|---|---|---|---|
| Cédula de Ciudadanía 1 3 | 1 0 9 0 4 2 2 8 2 2 | 7 | 2 0 9 3 8 8 T |

| 152. Primer apellido | 153. Segundo apellido | 154. Primer nombre | 155. Otros nombres |
|---|---|---|---|
| CASTELLANOS | SILVA | JOSE | ISRAEL |

| 156. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 157. DV | 158. Sociedad o firma designada |
|---|---|---|
| | | |

| 159. Fecha de nombramiento |
|---|
| 2 0 2 3 0 1 0 3 |

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

5

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

# POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

## RCE CONTRATOS

| CIUDAD DE EXPEDICIÓN | SUCURSAL | COD.SUC | NO.PÓLIZA | ANEXO |
|---|---|---|---|---|
| CUCUTA | AGENCIA CUCUTA | 49 | 49-40-101011106 | 0 |

| FECHA EXPEDICIÓN DÍA | MES | AÑO | VIGENCIA DESDE DÍA | MES | AÑO | A LAS HORAS | VIGENCIA HASTA DÍA | MES | AÑO | A LAS HORAS | TIPO MOVIMIENTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 11 | 2024 | 01 | 11 | 2024 | 00:00 | 01 | 01 | 2025 | 23:59 | EMISION ORIGINAL |

### DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

| NOMBRE O RAZON SOCIAL | IDENTIFICACIÓN |
|---|---|
| JESVAR MULTIPROYECTOS SAS | NIT: 901.442.447-3 |

| DIRECCIÓN | CIUDAD | TELÉFONO |
|---|---|---|
| CL 10 NRO. 8 - 56 | CUCUTA, NORTE DE SANTANDER | 3156232869 |

### DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

| ASEGURADO | IDENTIFICACIÓN |
|---|---|
| DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER | NIT: 800.103.927-7 |

| DIRECCIÓN | CIUDAD | TELÉFONO |
|---|---|---|
| AV 5 CALLE NRO. 13 - 14 ESQUINA | CUCUTA, NORTE DE SANTANDER | 5710290 |

BENEFICIARIO: 800103927 - DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER

### OBJETO DEL SEGURO

**CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN 15-05-2020 - 1329-P-06-00000-E-RCE-002A-D00I / 31-03-22 -1329-P-06-00000-E-RCE-001P-D00I, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:**

AMPARAR LA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DEL CONTRATO DE OBRA NO. RE-SGRD-03331-2024 - ID DEL CONTRATO EN SECOP CO1.SLCNTR.13798708, CUYO OBJETO ES ATENCION Y MANTENIMIENTO DE PUENTE JULIO SOBREEL RIO ARBOLEDAS, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE ARBOLEDAS, EN EL MARCO DE LA DECLARATORIA DE CALAMIDAD PUBLICA REALIZADA MEDIANTE DECRETO 001287 DEL 06 DE JUNIO DE 2024 POR EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER.

BENEFICIARIOS: TERCEROS AFECTADOS. SE EXCLUYE LA RESPONSABILIDAD CIVIL CONTRACTUAL.

### AMPAROS

RIESGO: CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES

| AMPAROS | DEDUCIBLE | VIGENCIA DESDE | VIGENCIA HASTA | SUMA ASEG ACTUAL |
|---|---|---|---|---|
| **PREDIOS LABORES Y OPERACIONES** | **10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV** | **01/11/2024** | **01/01/2025** | **$260,000,000.00** |

### ACLARACIONES

| VALOR PRIMA NETA | GASTOS EXPEDICIÓN | IVA | TOTAL A PAGAR | VALOR ASEGURADO TOTAL | PLAN DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|
| $ *****108,630.00 | $ *******3,000.00 | $ ******21,209.00 | $ **********132,839.00 | $ ******260,000,000.00 | CONTADO |

| INTERMEDIARIO | | | DISTRIBUCION COASEGURO | | |
|---|---|---|---|---|---|
| NOMBRE | CLAVE | % DE PART. | NOMBRE COMPAÑÍA | % PART. | VALOR ASEGURADO |
| MARIA ALEXANDRA TOLOZA SANDOVAL | 133110 | 100.00 | | | |

**LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO.**
**QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.**
**NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN**
***PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES AV. 1E NO. 17 - 88 - TELEFONO: 5835460 - CUCUTA***

49-40-101011106

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

# POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

## DECRETO 1082 DE 2015

| CIUDAD DE EXPEDICIÓN | SUCURSAL | COD.SUC | NO.PÓLIZA | ANEXO |
|---|---|---|---|---|
| CUCUTA | AGENCIA CUCUTA | 49 | 49-44-101034761 | 0 |

| FECHA EXPEDICIÓN DÍA | MES | AÑO | VIGENCIA DESDE DÍA | MES | AÑO | A LAS HORAS | VIGENCIA HASTA DÍA | MES | AÑO | A LAS HORAS | TIPO MOVIMIENTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 11 | 2024 | 01 | 11 | 2024 | 00:00 | 30 | 12 | 2029 | 23:59 | EMISION ORIGINAL |

### DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

| NOMBRE O RAZON SOCIAL | | IDENTIFICACIÓN |
|---|---|---|
| | JESVAR MULTIPROYECTOS SAS | NIT: 901.442.447-3 |

| DIRECCIÓN: | | CIUDAD: | | TELÉFONO: |
|---|---|---|---|---|
| | CL 10 NRO. 8 - 56 | | CUCUTA, NORTE DE SANTANDER | 3156232869 |

### DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

| ASEGURADO / BENEFICIARIO: | | IDENTIFICACIÓN |
|---|---|---|
| | DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER | NIT: 800.103.927-7 |

| DIRECCIÓN: | | CIUDAD: | | TELÉFONO |
|---|---|---|---|---|
| | AV 5 CALLE NRO. 13 - 14 ESQUINA | | CUCUTA, NORTE DE SANTANDER | 5710290 |

ADICIONAL:

### OBJETO DEL SEGURO

**CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN ECU010B, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:**

GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES EN LA EJECUCION DEL CONTRATO DE OBRA NO. RE-SGRD-03331-2024 - ID DEL CONTRATO EN SECOP CO1.SLCNTR.13798708, CUYO OBJETO ES ATENCION Y MANTENIMIENTO DE PUENTE JULIO SOBRE EL RIO ARBOLEDAS, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE ARBOLEDAS, EN EL MARCO DE LA DECLARATORIA DE CALAMIDAD PUBLICA REALIZADA MEDIANTE DECRETO 001287 DEL 06 DE JUNIO DE 2024 POR EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER.

NOTA:
LA GARANTIA DE ESTABILIDAD SE OTORGA POR CINCO (5) AÑOS CONTADOS DESDE LA FECHA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCION DE LAS OBRAS Y SU VIGENCIA SE AJUSTARA CON LA PRESENTACION DEL ACTA RESPECTIVA.

### AMPAROS

RIESGO: CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES

| AMPAROS | VIGENCIA DESDE | VIGENCIA HASTA | SUMA ASEG/ACTUAL |
|---|---|---|---|
| **CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO** | 01/11/2024 | 01/07/2025 | $74,295,552.70 |
| **PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES** | 01/11/2024 | 01/01/2028 | $37,147,776.35 |
| **ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA** | SI AMPARA 5 AÑOS, 0 MESES Y 0 DÍAS * | | $74,295,552.70 |

### ACLARACIONES

* ESTE AMPARO INICIA VIGENCIA UNA VEZ SE HA FINALIZADO LA EJECUCION DEL CONTRATO Y/O CON LA FIRMA DEL ACTA DE ENTREGA A SATISFACCION DEL MISMO

| VALOR PRIMA NETA | GASTOS EXPEDICIÓN | IVA | TOTAL A PAGAR | VALOR ASEGURADO TOTAL | PLAN DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|
| $ ***1,184,902.00 | $ ******20,000.00 | $ *****228,931.00 | $ **********1,433,833.00 | $ ******185,738,881.75 | CONTADO |

| INTERMEDIARIO | | | DISTRIBUCION COASEGURO | | |
|---|---|---|---|---|---|
| NOMBRE | CLAVE | % DE PART. | NOMBRE COMPAÑÍA | % PART. | VALOR ASEGURADO |
| MARIA ALEXANDRA TOLOZA SANDOVAL | 133110 | 100.00 | | | |

**QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.**

**NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN**

49-44-101034761

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

# ACTA DE APROBACIÓN DE POLIZAS

| GENERALIDADES | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **CONTRATO / CONVENIO Nº Y FECHA:** | RE-SGRD-03331-2024 | | | |
| **VALOR INICIAL** (En números)**:** | $ 742.955.527,00 | | | |
| **PLAZO:** | **2 MESES** | | | |
| **DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL:** | No. 00 000105 de Fecha 18 septiembre de 2024 | | | |
| **GARANTÍAS:** | **AMPAROS INICIALES:** | **(%)** | **AMPAROS NUEVOS (Si hay lugar a ello).** | **(%)** |
| Garantía de seriedad del ofrecimiento | | | | |
| Buen manejo y correcta inversión del anticipo. | | | | |
| Pago anticipado. | | | | |
| Cumplimiento de las obligaciones surgidas del contrato estatal. | X | 10 | | |
| Pago de salarios, prestaciones sociales, indemnizaciones y aportes parafiscales. | X | 5 | | |
| Estabilidad de la obra. | | | | |
| Calidad de los bienes y equipos suministrados. | | | | |
| Correcto funcionamiento de los equipos. | | | | |
| Calidad del servicio. | X | 10 | | |
| Provisión de repuestos y accesorios. | | | | |
| Pago de multas y cláusula penal pecuniaria, cuando se han pactado en el contrato. | | | | |
| Responsabilidad civil extracontractual. | X | | | |
| Otros amparos. | | | | |
| **MODIFICATORIOS Y ADICIONALES** (si hay lugar a ello y especificando si se trata de adicional de amparos, tiempo, dinero o ambos) | | | | |
| **DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL DEL MODIFICATORIO O ADICIONAL** (Si hay lugar a ello) | | | | |
| **VALOR DEL MODIFICATORIO O ADICIONAL** (Si hay lugar a ello) | | | | |
| **TIEMPO DEL MODIFICATORIO O ADICIONAL** (Si hay lugar a ello) | | | | |
| **VALOR TOTAL** (En números)**:** | $ 742.955.527,00 | | | |
| **ASEGURADORA:** | **SEGUROS DEL ESTADO S.A.** | | | |
| **-POLIZA DE GARANTIA Nº:** | No. 49-44-101034761 Anexo No.0 | | | |
| **POLIZA RESPONSABILIDAD CIVIL N°:** | No. 49-40-101011106 Anexo No.0 | | | |
| VIGENCIA G. (dd/mm/aa): | DEL 01/11/2024 al 30/12/2024 | **VIGENCIA RC. (dd/mm/aa):** | DEL 01/11/2024 al 01/01/2025 | |

En San José de Cúcuta, el 5 día del mes de noviembre del año 2024, en La Secretaría para la Gestión del Riesgo de Desastre, se reunieron Los suscritos: **WILLIAM VERA ARIAS,** Ordenador del Gasto **JESVAR MULTIPROYECTOS SAS NIT** 9 0 1 4 4 2 4 4 7- 3 Representada Legalmente por **KAREN ALEXANDRA BUITRAGO PAEZ,** identificado con la cedula de ciudadanía **No.** 1 .090.176.820; actuando como contratista para dar cumplimiento a la normatividad vigente.

En constancia firman, el 5 día noviembre de 2024.

POR EL DEPARTAMENTO

**WILLIAM VERA ARIAS**
Secretario para la Gestión del Riesgo de Desastres
Ordenador del Gasto - Supervisor

POR EL CONTRATISTA

**JESVAR MULTIPROYECTOS SAS**
**Nit 9 0 1 4 4 2 4 4 7- 3**
R/L **KAREN ALEXANDRA BUITRAGO PAEZ**
C.C. No. 1 .090.176.820
**Contratista**

# ACTA DE INICIO A LA EJECUCIÓN DE CONTRATO

| FECHA DEL ACTA | 5 noviembre 2024 |
|---|---|

| 1. GENERALIDADES DEL CONTRATO | |
|---|---|
| CONTRATO No. - FECHA | RE-SGRD-03331-2024 |
| TIPO DE CONTRATO | Obra |
| DEPENDENCIA CONTRATANTE | Secretaría para la Gestión del Riesgo de Desastres |
| CONTRATISTA | JESVAR MULTIPROYECTOS SAS |
| C.C. o N.I.T. | 9 0 1 4 4 2 4 4 7- 3 |
| REPRESENTANTE LEGAL | KAREN ALEXANDRA BUITRAGO PAEZ |
| C.C. | 1 .090.176.820 |
| OBJETO DEL CONTRATO | ATENCIÓN Y MANTENIMIENTO DE PUENTE JULIO SOBRE EL RÍO ARBOLEDAS, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE ARBOLEDAS, EN EL MARCO DE LA DECLARATORIA DE CALAMIDAD PUBLICA REALIZADA MEDIANTE DECRETO 001287 DEL 06 DE JUNIO DE 2024 POR EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER |
| VALOR DEL CONTRATO | SETECIENTOS CUARENTA Y DOS MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS VEINTISIETE PESOS MTC ( $ 742.955.527,00) |
| PLAZO O DURACIÓN | 2 meses |
| FORMA DE PAGO | EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER, realizó los análisis de precios unitarios de las obras requeridas, fijándose como valor total para el contrato a ejecutar la suma de SETECIENTOS CUARENTA Y DOS MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS VEINTISIETE PESOS MTC ( $ 742.955.527,00), Valor que será pagado por el DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER al CONTRATISTA mediante actas parciales, previa presentación por parte del Contratista del informe de ejecución de las actividades relacionadas con el objeto del contrato, certificación de cumplimiento a satisfacción expedida por el supervisor del contrato, y de la prestación de los respectivos soportes de pago de aportes al sistema de seguridad social en salud, pensión, y riesgos profesionales, de conformidad con lo establecido en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, en el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, y en la Ley 1562 de 2012, y demás normas vigentes. Ante el incumplimiento de estas obligaciones, el DEPARTAMENTO dará aviso de tal situación a las autoridades competentes. |
| LUGAR DE EJECUCIÓN | Departamento Norte de Santander |
| RUBRO | 2.3.2.02.02.008 Servicios prestados a las empresas y servicios de producción |
| DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL | No. 00 000105 de Fecha 18 septiembre de 2024 |
| SUPERVISOR (Acto administrativo y fecha Designación) | William Vera Arias, secretario para la Gestión del Riesgo de Desastres Mediante Memorando de Designación de Supervisión de Fecha 5 de noviembre de 2024 |
| INTERVENTOR (Acto administrativo y fecha Designación) | No Aplica |

| Gobernación de Norte de Santander | MACROPROCESO: SOPORTE | MS-CC-CS-01 | |
|---|---|---|---|
| | GESTIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIÓN | FECHA 10/07/2017 | VERSIÓN 1 |
| | CONTROL Y SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL | Página 2 de 2 | |

**ACTA DE INICIO A LA EJECUCIÓN DE CONTRATO**

| 2. VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO Y LEGALIZACIÓN PARA INICIO DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL | |
|---|---|
| **2.1 REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO** | |
| **REQUISITO** | **FECHA** |
| **Fecha de suscripción** | 31 octubre de 2024 |
| **Registro Presupuestal** | No.00 000127 de Fecha 31 octubre de 2024 |

| **2.2 REQUISITOS DE LEGALIZACIÓN** | | | |
|---|---|---|---|
| **REQUISITO** | **FECHA** | | |
| **Impuesto de timbre** | No Aplica | | |
| **Publicación Gaceta** | No Aplica | | |
| **Garantía Única.**<br>No. 49-44-101034761 Anexo No.0<br>Aseguradora: Seguros Del Estado S.A.<br>Fecha de Expedición: 01/11/2024<br>Fecha de aprobación: 05/11/2024 | Amparos | Valor asegurado | Vigencia |
| | Cumplimiento del Contrato | $74,295,552.70 | 01/11/2024 al 01/07/2025 |
| | Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e Indemnizaciones Laborales | $37,147,776.35 | 01/11/2024 al 01/01/2028 |
| | Estabilidad y calidad de obra | $74,295,552.70 | 5 AÑOS |
| **Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual**<br>No. 49-40-101011106 Anexo No.0<br>Aseguradora: Seguros Del Estado S.A.<br>Fecha de Expedición: 01/11/2024<br>Fecha de aprobación: 05/11/2024 | Amparos | Valor asegurado | Vigencia |
| | | | 01/11/2024 hasta 01/01/2025 |
| | Predios labores y operaciones | $ 260.000.000 | |
| | | | |
| | | | |
| **Otros (según el contrato):** | | | |

En San José de Cúcuta en las oficinas de la SECRETARÍA PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES, se reunieron los suscritos a saber: WILLIAM VERA ARIAS, Ordenador del Gasto - Supervisor, interventor Interno, NO APLICA Interventor Externo No Aplica y **JESVAR MULTIPROYECTOS SAS NIT** 9 0 1 4 4 2 4 4 7- 3 Representada Legalmente por **KAREN ALEXANDRA BUITRAGO PAEZ,** identificado con la cedula de ciudadanía **No.** 1 .090.176.820, en calidad de Contratista, con el fin de acordar el inicio del contrato en mención, a partir de la fecha de la presente acta.

**OBSERVACIONES**

Se firma la presente por los que en ella intervienen,

**WILLIAM VERA ARIAS**
Secretario para la Gestión del Riesgo de Desastres
Ordenador del Gasto - Supervisor

**JESVAR MULTIPROYECTOS SAS**
**Nit 9 0 1 4 4 2 4 4 7- 3**
R/L **KAREN ALEXANDRA BUITRAGO PAEZ**
C.C. No. 1 .090.176.820
**Contratista**

***Nota 1:*** *Si el contrato contempla la interventoría externa, tanto el Supervisor como el interventor deberán suscribir el presente documento.*
***Nota 2:*** *Toda suspensión y reiniciación que afecte el contrato debe ser notificada a la compañía garante con el fin de que se extienda la vigencia de los amparos por el término de duración efectiva del mismo.*

| Gobernación de Norte de Santander | MACROPROCESO ESTRATÉGICO | ME-IE-CI-03 | |
|---|---|---|---|
| | PROCESO: GESTIÓN DE COMUNICACIONES INTERNAS Y EXTERNAS | FECHA 05/05/2009 | VERSIÓN 1 |
| | PROTOCOLO DE COMUNICACIONES INTERNAS | Página 1 de 8 | |

# ACTA DE REUNIÓN

| | | |
|---|---|---|
| Fecha: 18 de noviembre de 2024 | Hora de inicio: 10:00 AM | Hora de finalización: 11:00 AM |
| Lugar: Reunión virtual | Responsable de la reunión: SGRD | |
| Tipo de Reunión: comité de obra del contrato RE-SGRD-03331-2024 | | Acta No 01 |

## TEMAS A TRATAR

1. Avance de la obra para el mantenimiento de la estructura metálica puente julio
2. Imprevistos presentados durante la ejecución

## DESARROLLO DE LA REUNIÓN

En el Municipio de Cúcuta, Departamento Norte de Santander a los dieciocho (18) días del mes de noviembre de 2024, en las instalaciones de la Secretaría para la Gestión del Riesgo de Desastres, se reunieron mediante comunicación virtual, el Ingeniero WILLIAM VERA ARIAS, Secretario para la Gestión del Riesgo de Desastres departamental, en calidad de Supervisor del Contrato, representantes del contratista JESVAR MULTIPROYECTOS SAS con nit 9 0 1 4 4 2 4 4 7- 3representado legalmente por KAREN ALEXANDRA BUITRAGO PAEZ identificado con C.C. N° 1 .090.176.820, en su calidad de CONTRATISTA, y el ingeniero LUIS FERNANDO BARON ORTIZ, identificado con C.C. 1.090.455.569 apoyo a la secretaria de gestión del riesgo del departamento con C.C. 1.090.475.033 ; para dejar constancia por medio de la presente acta de Comité de Obra, las actividades realizadas a la fecha y contempladas dentro del contrato en mención, cuyo objeto es "ATENCIÓN Y MANTENIMIENTO DE PUENTE JULIO SOBRE EL RÍO ARBOLEDAS, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE ARBOLEDAS, EN EL MARCO DE LA DECLARATORIA DE CALAMIDAD PUBLICA REALIZADA MEDIANTE DECRETO 001287 DEL 06 DE JUNIO DE 2024 POR EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER" por un valor económico de SETECIENTOS CUARENTA Y DOS MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS VEINTISIETE PESOS MTC ( $ 742.955.527,00), y un plazo de ejecución de 2 MESES, lo anterior según lo descrito a continuación:

| | |
|---|---|
| **CONTRATO No. - FECHA** | RE-SGRD-03331-2024 |
| **TIPO DE CONTRATO** | Obra |
| **DEPENDENCIA CONTRATANTE** | Secretaría para la Gestión del Riesgo de Desastres |

| Gobernación de Norte de Santander | MACROPROCESO ESTRATÉGICO | ME-IE-CI-03 | |
|---|---|---|---|
| | PROCESO: GESTIÓN DE COMUNICACIONES INTERNAS Y EXTERNAS | FECHA 05/05/2009 | VERSIÓN 1 |
| | PROTOCOLO DE COMUNICACIONES INTERNAS | Página 2 de 8 | |

## ACTA DE REUNIÓN

| | |
|---|---|
| **CONTRATISTA** | JESVAR MULTIPROYECTOS SAS |
| **C.C. o N.I.T.** | 901442447-3 |
| **REPRESENTANTE LEGAL** | KAREN ALEXANDRA BUITRAGO PAEZ |
| **C.C.** | 1 .090.176.820 |
| **OBJETO DEL CONTRATO** | ATENCIÓN Y MANTENIMIENTO DE PUENTE JULIO SOBRE EL RÍO ARBOLEDAS, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE ARBOLEDAS, EN EL MARCO DE LA DECLARATORIA DE CALAMIDAD PUBLICA REALIZADA MEDIANTE DECRETO 001287 DEL 06 DE JUNIO DE 2024 POR EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER |
| **VALOR DEL CONTRATO** | SETECIENTOS CUARENTA Y DOS MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS VEINTISIETE PESOS MTC ( $ 742.955.527,00) |
| **PLAZO O DURACIÓN** | 2 meses |
| **FORMA DE PAGO** | EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER, realizó los análisis de precios unitarios de las obras requeridas, fijándose como valor total para el contrato a ejecutar la suma de SETECIENTOS CUARENTA Y DOS MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS VEINTISIETE PESOS MTC ( $ 742.955.527,00), Valor que será pagado por el DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER al CONTRATISTA mediante actas parciales, previa presentación por parte del Contratista del informe de ejecución de las actividades relacionadas con el objeto del contrato, certificación de cumplimiento a satisfacción expedida por el supervisor del contrato, y de la prestación de los respectivos soportes de pago de aportes al sistema de seguridad social en salud, pensión, y riesgos profesionales, de conformidad con lo establecido en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, en el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, y en la Ley 1562 de 2012, y demás normas vigentes. Ante el incumplimiento de estas obligaciones, el DEPARTAMENTO dará aviso de tal situación a las autoridades competentes. |
| **LUGAR DE EJECUCIÓN** | Departamento Norte de Santander |

## ACTA DE REUNIÓN

| | |
|---|---|
| **RUBRO** | 2.3.2.02.02.008 Servicios prestados a las empresas y servicios de producción |
| **DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL** | 2.3.2.02.02.008 Servicios prestados a las empresas y servicios de producción |
| **SUPERVISOR**<br>(Acto administrativo y fecha de designación) | No. 00 000105 de Fecha 18 septiembre de 2024 |
| **INTERVENTOR**<br>(Acto administrativo y fecha de designación) | William Vera Arias, secretario para la Gestión del Riesgo de Desastres Mediante Memorando de Designación de Supervisión de Fecha 5 de noviembre de 2024 |

**1. VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO Y LEGALIZACIÓN PARA INICIO DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL**

**2.1 REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO**

| REQUISITO | FECHA |
|---|---|
| **Fecha de suscripción** | 31 octubre de 2024 |
| **Registro Presupuestal** | No.00 000127 de Fecha 31 octubre de 2024 |

**2.2 REQUISITOS DE LEGALIZACIÓN**


| REQUISITO | FECHA | | |
|---|---|---|---|
| **Impuesto de timbre** | No Aplica | | |
| **Publicación Gaceta** | No Aplica | | |
| **Garantía Única.**<br>No. 49-44-101034761 Anexo No.0<br>Aseguradora: Seguros Del Estado S.A.<br>Fecha de Expedición: 01/11/2024<br>Fecha de aprobación: 05/11/2024 | Amparos | Valor asegurado | Vigencia |
| | Cumplimiento del Contrato | $74,295,552.70 | 01/11/2024 al 01/07/2025 |
| | Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e Indemnizaciones Laborales | $37,147,776.35 | 01/11/2024 al 01/01/2028 |

## ACTA DE REUNIÓN

| | | | |
|---|---|---|---|
| | Estabilidad y calidad de obra | $74,295,552.70 | 5 AÑOS |
| **Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual**<br>No. 49-40-101011106 Anexo No.0<br>Aseguradora: Seguros Del Estado S.A.<br>Fecha de Expedición: 01/11/2024<br>Fecha de aprobación: 05/11/2024 | Valor asegurado<br>$ 260.000.000 | Vigencia<br>01/11/2024 hasta 01/01/2025 | |


La ingeniera Karen Alexandra Buitrago toma la palabra para poner en conocimiento al Secretario de gestión del riesgo de desastres acerca del avance en la ejecución del contrato en detalle, donde se han avanzado con múltiples trabajos en las tres actividades principales del contrato como lo son mantenimiento a estructura metálica, Restauración y construcción de estribos y muros laterales de protección y obras complemantarias que incluyen dragado y manejo de aguas.


Desde el día 5 d noviembre del 2024 se iniciaron los actividades con tres frentes de trabajo uno sobre el rio realizando labores de dragado con una retroexcavadora sobre oruga, buscando ahondar y aumentar la capacidad hidrahulica de la sección del rio 55 metros aguas arriba y 55 aguas abajo con referencia al puente, ya que se se presentaban gran acumulación de sedimentos y generaban pequeños islotes y ante el crecimiento del mismo por precipitaciones en la parte alta ocasionaba que este se tratara de desbordar a lotes y cultivos aledaños.

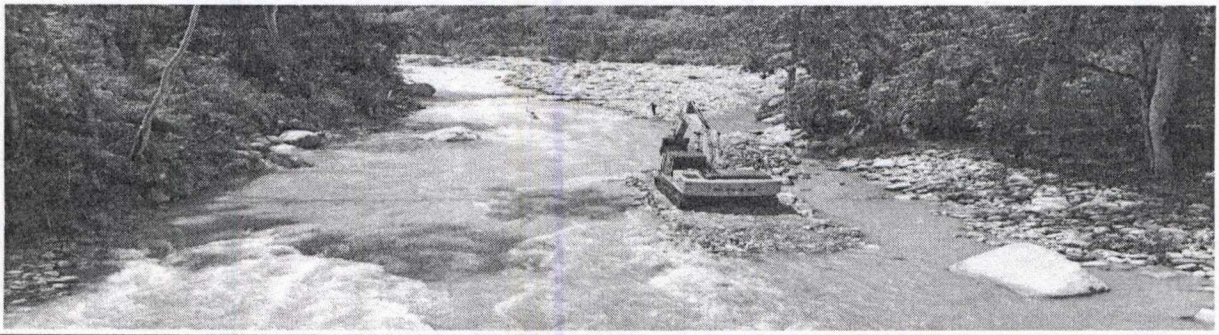


| Gobernación de Norte de Santander | MACROPROCESO ESTRATÉGICO | ME-IE-CI-03 | |
|---|---|---|---|
| | PROCESO: GESTIÓN DE COMUNICACIONES INTERNAS Y EXTERNAS | FECHA 05/05/2009 | VERSIÓN 1 |
| | PROTOCOLO DE COMUNICACIONES INTERNAS | Página 5 de 8 | |

## ACTA DE REUNIÓN

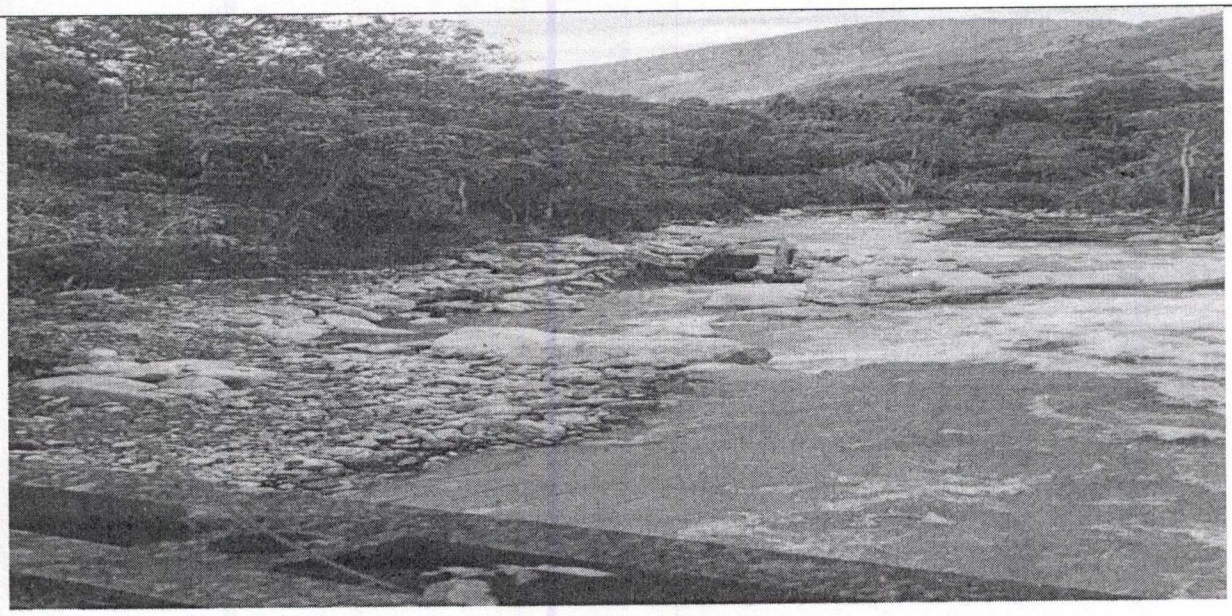

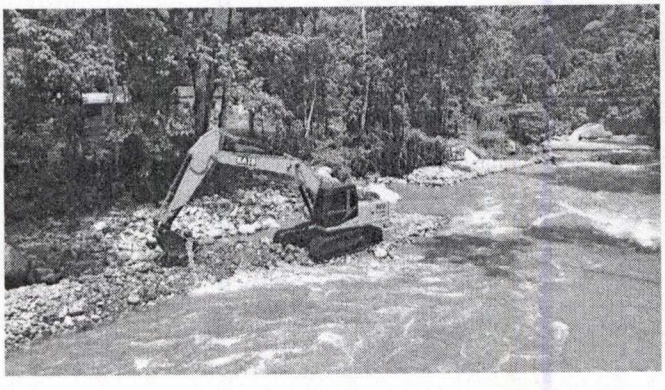


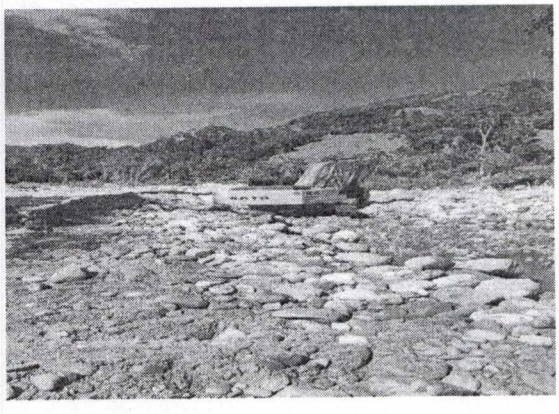



El segundo frente de trabajo de centro en la limpieza de los muros y estribos del puente para restaurar e impermeabilizar con aditivos SIKA, al retirar la capa vegetal del mismo se identifica una fisura que va desde la corona del muro hasta la parte baja, y se procede a realizar los procesos de curado del de la estructura con acero de refuerzo y aditivos idóneos para homogenizar la mezclas.

| Gobernación de Norte de Santander | MACROPROCESO ESTRATÉGICO | ME-IE-CI-03 | |
|---|---|---|---|
| | PROCESO: GESTIÓN DE COMUNICACIONES INTERNAS Y EXTERNAS | FECHA 05/05/2009 | VERSIÓN 1 |
| | PROTOCOLO DE COMUNICACIONES INTERNAS | Página 6 de 8 | |

**ACTA DE REUNIÓN**

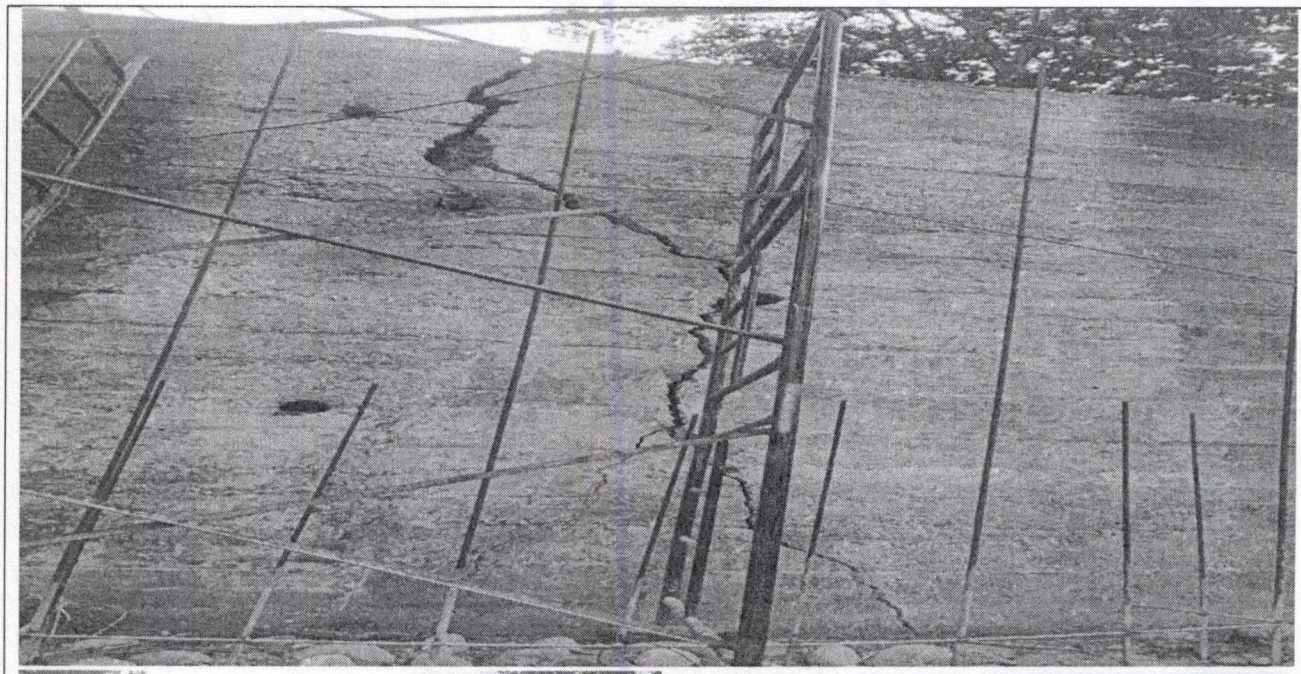

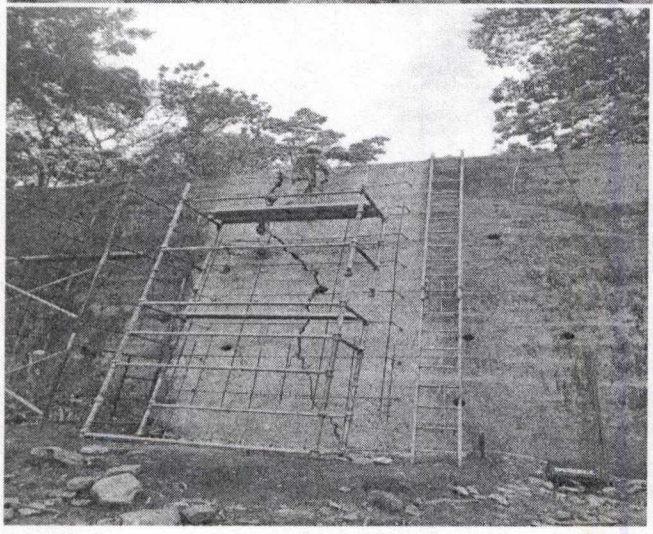

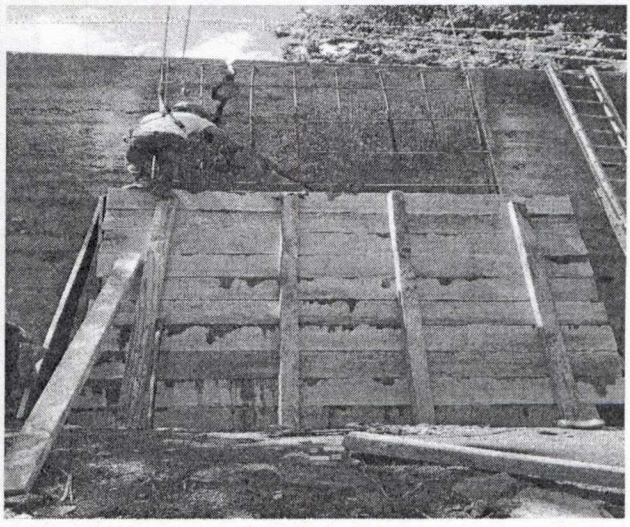


Asi mismo el tercer grupo de trabajo adelanta las actividades de limpieza soldadura, engrase y pintura de la estructura metálica del puente tipo militar.


| Gobernación de Norte de Santander | MACROPROCESO ESTRATÉGICO | ME-IE-CI-03 | |
|---|---|---|---|
| | PROCESO: GESTIÓN DE COMUNICACIONES INTERNAS Y EXTERNAS | FECHA 05/05/2009 | VERSIÓN 1 |
| | PROTOCOLO DE COMUNICACIONES INTERNAS | Página 7 de 8 | |


## ACTA DE REUNIÓN

La limpieza se hizo mediante hidro arenado y samblasteado la cual es una técnica de limpieza que consiste en utilizar un material abrasivo para eliminar suciedades y preparar una superficie para ser recubierta, asi mismo ya se adelanto la construcción de los tableros de rodadura y se prevé su instalación bajo cierres parciales durante las próximas semanas garantizando el flujo vehicular y teniendo como prioridad la prestación de del servicio ante alguna emergencia.

Ya se ha adelantado la actividad de aplicación de anticorrosivo, y se espera el buen tiempo para dar inicio a la aplicación de la pintura final del mismo, de igual forma se vienen adelanto los ajustes de y cambio de pernos que se encuentran obsoletos y engrasando las articulaciones.

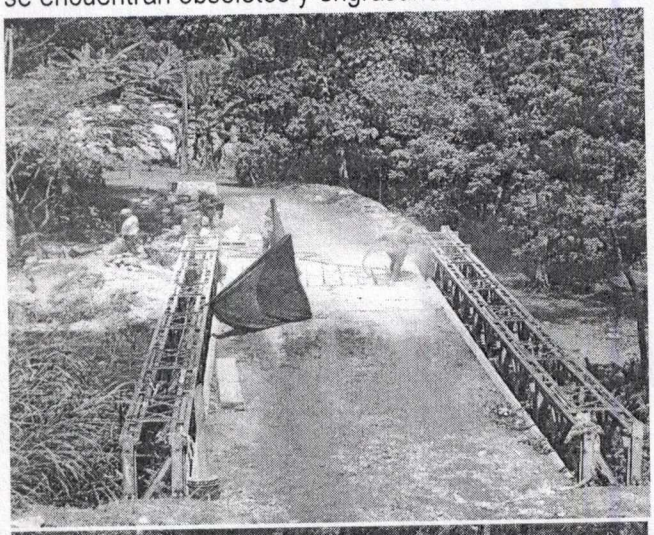

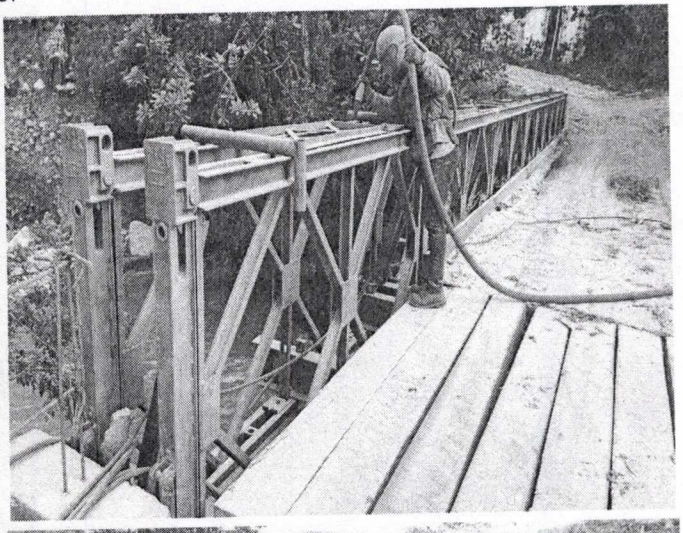

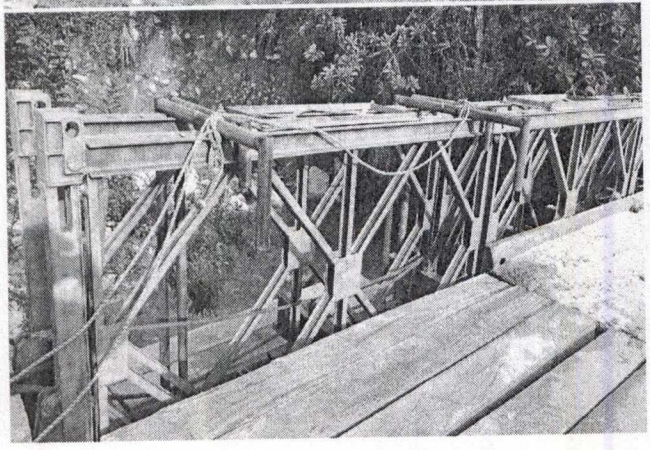



| Gobernación de Norte de Santander | MACROPROCESO ESTRATÉGICO | ME-IE-CI-03 | |
|---|---|---|---|
| | PROCESO: GESTIÓN DE COMUNICACIONES INTERNAS Y EXTERNAS | FECHA 05/05/2009 | VERSIÓN 1 |
| | PROTOCOLO DE COMUNICACIONES INTERNAS | Página 8 de 8 | |

## ACTA DE REUNIÓN

La ingeniera Karen Alexandra Buitrago deja claridad que en los últimos días se han presentado fuertes precipitaciones que han dificultado seguir realizando las actividades continuas con total normalidad y que esto puede generar retrocesos en la programación de la obra.

**WILLIAM VERA ARIAS**

Secretario para la Gestión del Riesgo de Desastres

Ordenador del Gasto - Supervisor

**JESVAR MULTIPROYECTOS SAS**

**NIT 901442447-3**

R/L **KAREN ALEXANDRA BUITRAGO PAEZ**

C.C. No. 1 .090.176.820

**Contratista**

**LUIS FERNANDO BARON ORTIZ**

**ING. APOYO SECRETARIA DEPARTAMENTAL GESTION DEL RIESGO**

| *ANEXOS* *SI (X ) NO ( ) - Balance* | *Fecha de aprobación del acta:* |
|---|---|

| *Elaboró: Luis Fernando Baron Ortiz– Contratista* | *Revisó: **William Vera Arias – Jefe de Oficina*** | *Próxima Reunión:* |
|---|---|---|

*Una vez leída y aprobada la presente acta, se valida con quienes intervinieron:*

JESVAR
MULTIPROYECTOS S.A.S

San José de Cúcuta, 19 noviembre de 2024

Señores
**TESORERIA DEPARTAMENTAL**
San José de Cúcuta

REFERENCIA: ° RE-SGRD-03331-2024 SUSCRITO EL 31 DE OCTUBRE DE 2024, CUYO OBJETO ES: ATENCIÓN Y MANTENIMIENTO DE PUENTE JULIO SOBRE EL RÍO ARBOLEDAS, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE ARBOLEDAS, EN EL MARCO DE LA DECLARATORIA DE CALAMIDAD PUBLICA REALIZADA MEDIANTE DECRETO 001287 DEL 06 DE JUNIO DE 2024 POR EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER

Asunto: **Autorización Descuento Estampilla**

El presente tiene como fin autorizar por medio de esta notificación se descuente el porcentaje % correspondiente a las estampillas departamentales y descuentos de ley de la referencia a la factura de la referencia, por concepto Acta Parcial No. 01 de fecha 19 de noviembre 2024

Sin otro particular

**JESVAR MULTIPROYECTOS SAS**
**R/L KAREN ALEXANDRA BUITRAGO PAEZ**
CONTRATISTA

# RESUMEN PLANILLA PAGADA

ASOPAGOS s.a.

## DATOS GENERALES DEL APORTANTE

| IDENTIFICACIÓN | DV | RAZÓN SOCIAL | CLASE | CÓDIGO | ARL | F. PRESENTACIÓN | ACT. ECO | TIPO DE EMPRESA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NI 901442447 | 3 | JESVAR MULTIPROYECTOS SAS | B | 0 | SEGUROS COLPATRIA - 14-4 | ÚNICA | 4210 | Jurídica |
| MUN-DEP | | DIRECCIÓN | | TELÉFONO | | EMAIL | | EXENTO DE PARAFISCALES |
| 54-1 | | CALLE 10 8 56 APTO 202 EL LLANO | | 3156232869 | | JESVARMULTIPROYECTOS@GMAIL.COM | | S |

## DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN

| PERÍODO PENSIÓN | PERÍODO SALUD | PLANILLA | TIPO PLANILLA | FECHA PAGO | CENTRO DE TRABAJO | DEPARTAMENTO | MUNICIPIO | VALOR PAGO | INTERÉS X MORA | ENTIDAD RECAUDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-10 | 2024-11 | 31644729 | E | 2024-11-19 | TODOS LOS CENTROS | TODOS | TODOS | 1.025.500 | 3.800 | BANCO AV VILLAS |
| Nº AFILIADOS | REF. DE PAGO (PIN) | FECHA LÍMITE PAGO | ESTADO PLANILLA | | | | | | | |
| 2 | 31644729 | 2024-11-14 | Pagada | | | | | | | |

| | EMPLEADO | | | | NOVEDADES | | | | | | | | | | | | | | | | DÍAS | | | PENSIÓN | | | | | SALUD | | | CCF | | | RIESGOS | | TARIFA | PARAF | SENA | ICBF | ESAP | MIN | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N | ID | EMPLEADO | SALARIO | MODALIDAD DE SALARIO | INGR | RET | TDAS | TAHU | TDAP | VSP | VST | SLN | IGE | LMA | VACR | VACT | AVP | VCT | INR | LNR | SUS | EPST | AFPT | AFP | EPS | ARL | NOMBRE | IBC | Cot | FNSOL | FNRUB | NOMBRE | IBC | Cot | NOMBRE | IBC | Cot | IBC | Ges. | ARL | IBC | Cot. | Gen. | Cot. | Cot. | Tipo Cot. | Sub. Tipo Cot. | Total | Exento de Parafiscales | Ap Co |
| 1 | CC 1090176820 | HUITRAGO PAEZ KAREN ALEXANDRA | 2.900.000 | F | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | 30 | 30 | 30 | PORVENIR - 230301 | 2.900.000 | 320.000 | 0 | | SANITAS - EPS005 | 2.900.000 | 80.000 | COMFAORIENTE-CCF36 | 2.900.000 | 80.000 | 2.900.000 | 139.200 | 0,06960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01 | 0 | 619.200 | S | 44 |
| 2 | CC 1090452600 | PUERTO ESCALANTE NEYLEEN ANDREA | 1.300.000 | F | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | 30 | 30 | 30 | PORVENIR - 230301 | 1.300.000 | 208.000 | 0 | | NUEVA E.P.S. S.A. MOV - EPS041 | 1.300.000 | 52.000 | COMFAORIENTE-CCF36 | 1.300.000 | 52.000 | 1.300.000 | 90.500 | 0,06960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01 | 0 | 402.500 | S | 44 |


# RESUMEN PLANILLA PAGADA

ASOPAGOS s.a.

## DATOS GENERALES DEL APORTANTE

| IDENTIFICACIÓN | DV | RAZÓN SOCIAL | CLASE | CÓDIGO | ARL | F. PRESENTACIÓN | ACT. ECO | TIPO DE EMPRESA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NI 901442447 | 3 | JESVAR MULTIPROYECTOS SAS | B | 0 | SEGUROS COLPATRIA - 14-4 | ÚNICA | 4210 | Jurídica |
| MUN-DEP | | DIRECCIÓN | | TELÉFONO | | EMAIL | | EXENTO DE PARAFISCALES |
| 54-1 | | CALLE 10 8 56 APTO 202 EL LLANO | | 3156232869 | | JESVARMULTIPROYECTOS@GMAIL.COM | | S |

## DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN

| PERÍODO PENSIÓN | PERÍODO SALUD | PLANILLA | TIPO PLANILLA | FECHA PAGO | CENTRO DE TRABAJO | DEPARTAMENTO | MUNICIPIO | VALOR PAGO | INTERÉS X MORA | ENTIDAD RECAUDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-10 | 2024-11 | 31644729 | E | 2024-11-19 | TODOS LOS CENTROS | TODOS | TODOS | 1.025.500 | 3.800 | BANCO AV VILLAS |
| Nº AFILIADOS | REF. DE PAGO (PIN) | FECHA LÍMITE PAGO | ESTADO PLANILLA | | | | | | | |
| 2 | 31644729 | 2024-11-14 | Pagada | | | | | | | |


## TOTALES IBC

| IBC PENSIÓN | IBC SALUD | IBC RIESGOS | IBC CAJAS | IBC PARAF |
|---|---|---|---|---|
| 3.300.000 | 3.300.000 | 3.300.000 | 3.300.000 | 0 |

| SUBSISTEMA | CÓDIGO | NIT | DV | AFILIADOS | VALOR LIQUIDADO | VALOR UPC | INTERESES MORA | SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS | VALOR A PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AFP(Administradoras: 1) | | | | 2 | 528.000 | 0 | 1.900 | 0 | 529.900 |
| PORVENIR | 230301 | 800224808 | 8 | 2 | 528.000 | 0 | 1.900 | 0 | 529.900 |
| EPS(Administradoras: 2) | | | | 2 | 132.000 | 0 | 500 | 0 | 132.500 |
| NUEVA E.P.S. S.A. MOV | EPS041 | 900156264 | 2 | 1 | 52.000 | 0 | 200 | 0 | 52.200 |
| SANITAS | EPS005 | 800251440 | 6 | 1 | 80.000 | 0 | 300 | 0 | 80.300 |
| ARP(Administradoras: 1) | | | | 2 | 229.700 | 0 | 900 | 0 | 230.600 |
| SEGUROS COLPATRIA | 14-4 | 860002183 | 9 | 2 | 229.700 | 0 | 900 | 0 | 230.600 |
| CCF(Administradoras: 1) | | | | 2 | 132.000 | 0 | 500 | 0 | 132.500 |
| COMFAORIENTE | CCF36 | 890500675 | 6 | 2 | 132.000 | 0 | 500 | 0 | 132.500 |

**MODELO CERTIFICACION ACREDITACION PAGO DE APORTES DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES (PERSONA JURIDICA)**

**(Use la opción que corresponda, según certifique el Representante Legal o el Revisor Fiscal)**

Yo, JORGE IVAN RAMIREZ MANTILLA, identificado con cedula No 13.439.500, y con Tarjeta Profesional No.____ de la Junta de Contadores de Colombia, en mi condición de Revisor Fiscal de JESVAR MULTIPROYECTOS SAS identificada con Nit : 901442447-3, debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de Cúcuta, luego de examinar de acuerdo con las normas de auditoria generalmente aceptadas en Colombia, los estados financieros de la compañía, certifico el pago de los aportes realizados por la compañía durante los últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles a la fecha de presentación de la propuesta para el presente proceso de selección, por los conceptos de salud, pensiones, riesgos profesionales, cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA)

Estos pagos, corresponden a los montos contabilizados y pagados por la compañía durante dichos 6 meses. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Dada en Cúcuta, a los (15) del mes de noviembre de 2024

FIRMA:

NOMBRE DE QUIEN CERTIFICA:
JORGE IVAN RAMIREZ MANTILLA
identificado con cedula No 13.439.500

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 13.439.500
RAMIREZ MANTILLA
APELLIDOS
JORGE IVAN
NOMBRES

FIRMA





INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 14-OCT-1957
CUCUTA
(NORTE DE SANTANDER)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.70 ESTATURA | O+ G.S. RH | M SEXO

07-MAY-1977 CUCUTA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

A-2500100-00125742-M-0013439500-20081107 0005458482A 1 7050006784

República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

**110595-T**



JORGE IVAN
RAMIREZ MANTILLA
C.C. 13439500
RESOLUCION INSCRIPCION 067 FECHA 2005/05/26
UNIVERSIDAD LIBRE

PRESIDENTE

LUZ MYRIAM DIAZ MUNOZ 115-16

IDEOS

Jorge Ivan Ramírez M.

FIRMA DEL TITULAR 30783

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla al Ministerio de Educación Nacional - Junta Central de Contadores.

LOGOFORMAS COMP. 2001/00

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

BFF3CE4EDC37973B

**LA REPUBLICA DE COLOMBIA**

**MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO**

**UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL**

**JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

**CERTIFICA A:**
QUIEN INTERESE

Que el contador público **JORGE IVAN RAMIREZ MANTILLA** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 13439500 de CUCUTA (N. DE SANTANDER) Y Tarjeta Profesional No 110595-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

**NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS** **********
**********
**********

EL CONTADOR PUBLICO NO HA CUMPLIDO CON LA OBLIGACION DE ACTUALIZAR EL REGISTRO

Dado en BOGOTA a los 29 días del mes de Agosto de 2024 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

Sandra Barrios

**DIRECTOR GENERAL**

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

| | MACROPROCESO: SOPORTE | MS-CC-CS-03 | |
|---|---|---|---|
| | GESTIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIÓN | FECHA 27/07/10 | VERSIÓN 1 |
| | CONTROL Y SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL | Página 1 de 3 | |

# ACTA PARCIAL DE OBRA No. 01

| | |
|---|---|
| **FECHA DEL ACTA** | 19/noviembre /2024 |

| **1. GENERALIDADES DEL CONTRATO** | |
|---|---|
| **CONTRATO No. – FECHA** | RE-SGRD-03331-2024 |
| **TIPO DE CONTRATO** | Obra |
| **DEPENDENCIA CONTRATANTE** | Secretaría para la Gestión del Riesgo de Desastres |
| **CONTRATISTA** | JESVAR MULTIPROYECTOS SAS |
| **NIT.** | 9 0 1 4 4 2 4 4 7- 3 |
| **REPRESENTANTE LEGAL** | KAREN ALEXANDRA BUITRAGO PAEZ |
| **C.C. o N.I. T** | 1 .090.176.820 |
| **OBJETO DEL CONTRATO** | ATENCIÓN Y MANTENIMIENTO DE PUENTE JULIO SOBRE EL RÍO ARBOLEDAS, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE ARBOLEDAS, EN EL MARCO DE LA DECLARATORIA DE CALAMIDAD PUBLICA REALIZADA MEDIANTE DECRETO 001287 DEL 06 DE JUNIO DE 2024 POR EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER |
| **DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL** | No. 00 000105 de Fecha 18 septiembre de 2024 |
| **VALOR INICIAL DEL CONTRATO** | SETECIENTOS CUARENTA Y DOS MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS VEINTISIETE PESOS MTC ( $ 742.955.527,00) |
| **PLAZO O DURACIÓN** | DOS MESES |
| **SUPERVISOR** (Acto administrativo y fecha de designación) | William Vera Arias, secretario para la Gestión del Riesgo de Desastres Mediante Memorando de Designación de Supervisión de Fecha 5 de noviembre de 2024 |
| **INTERVENTOR** | NO APLICA |
| **FECHA ACTA DE INICIO** | 5 NOVIEMBRE 2024 |
| **ACTAS DE SUSPENSIÓN** | - |

## ACTA PARCIAL DE OBRA No. 01

| | | | |
|---|---|---|---|
| **ACTAS DE REINICIO** | - | | |
| **FECHA DE TERMINACION** | - | | |
| **Garantía Única.**<br>No. 49-44-101034761 Anexo No.0<br>Aseguradora: Seguros Del Estado S.A.<br>Fecha de Expedición: 01/11/2024<br>Fecha de aprobación: 05/11/2024 | Amparos | Valor asegurado | Vigencia |
| | Cumplimiento del Contrato | $74,295,552.70 | 01/11/2024 al 01/07/2025 |
| | Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e Indemnizaciones Laborales | $37,147,776.35 | 01/11/2024 al 01/01/2028 |
| | Estabilidad y calidad de obra | $74,295,552.70 | 5 AÑOS |
| **Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual**<br>No. 49-40-101011106 Anexo No.0<br>Aseguradora: Seguros Del Estado S.A.<br>Fecha de Expedición: 01/11/2024<br>Fecha de aprobación: 05/11/2024 | Valor asegurado | | Vigencia |
| | $ 260.000.000 | | 01/11/2024 hasta 01/01/2025 |
| **ACTAS DE APROBACIÓN DE PRECIOS UNITARIOS NO PREVISTOS** | NO APLICA | | |
| **ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES** | NO APLICA | | |
| **ACTAS DE RECIBO PREVIAS** | NO APLICA | | |
| **% EJECUTADO SEGÚN PRESENTE ACTA** | 27.43 % | | |
| **% EJECUTADO ACUMULADO** | 27.43 % | | |
| **% DE TIEMPO TRANSCURRIDO** | =14 Dias trabajados / 60 Total Días: 23.33 % | | |

En San José de Cúcuta el 19 días del mes de noviembre de 2024, en las oficinas de la Secretaria Departamental de Gestión de Riesgo, se reunieron los suscritos a saber: **William Vera Arias**, Ordenador del Gasto por delegación, interventor Interno, NO APLICA Interventor Externo NO APLICA, JESVAR MULTIPROYECTOS SAS NIT 9 0 1 4 4 2 4 4 7- 3 Representada Legalmente por

| | MACROPROCESO: SOPORTE | MS-CC-CS-03 | |
|---|---|---|---|
| | GESTIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIÓN | FECHA 27/07/10 | VERSIÓN 1 |
| | CONTROL Y SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL | Página 3 de 3 | |

## ACTA PARCIAL DE OBRA No. 01

KAREN ALEXANDRA BUITRAGO PAEZ, identificado con la cedula de ciudadanía No. 1 .090.176.820, con el fin de realizar **Acta Parcial de Obra No. 01** al contrato en referencia, atendiendo a las cantidades y precios establecidos en el mismo, de acuerdo al detalle consignado en el Anexo No. 01 que forma parte integral de la presente acta.

Se firma la presente por los que en ella intervienen,

**WILLIAM VERA ARIAS**
Secretario para la Gestión del Riesgo de Desastres
Ordenador del Gasto - Supervisor

**JESVAR MULTIPROYECTOS SAS**
**Nit 9 0 1 4 4 2 4 4 7- 3**
R/L **KAREN ALEXANDRA BUITRAGO PAEZ**
C.C. No. 1 .090.176.820
**Contratista**

| | | |
|---|---|---|
| NGRD Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres - Colombia. Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres. Gobernación de Norte de Santander | UNIDAD NACIONAL PARA LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES | MS-CC-CS-03 (ANEXO) |
| | ANEXO No. 1 AL ACTA DE RECIBO No. 1 | FECHA DEL ACTA: 19-nov-24 |
| | CONTRATO DE OBRA RE-SGRD-03331-SUSCRITO 31 OCTUBRE 2024 | |

| CONDICIONES DEL CONTRATO INICIAL O MODIFICADO | | | | | ACTA PARCIAL No. 01 | | EJECUTADO ACUMULADO | | | POR EJECUTAR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ITEM | DESCRIPCION | UNID. | V/R. UNIT. | CANT. | VR/PARC. | CANT. | VALOR | % | CANT. | VALOR |
| 1 | ESTRUCTURA METALICA | | | | | | | | | |
| 1,1 | Limpieza de estructura metalica | M2 | $ 205.620,00 | 91,8 | $ 18.875.916,00 | 91,8 | $ 18.875.916,00 | 100,00% | 0,00 | $ - |
| 1,2 | Suministro, preparacion y apliacion de fondo anticorrisvo mecanica ( estructuras superiores, interiores y laterales) icluye andamios colgantes | M2 | $ 193.044,00 | 91,8 | $ 17.721.439,00 | 91,8 | $ 17.721.439,00 | 100,00% | 0,00 | $ - |
| 1,3 | Suministro e instalacion de pintura esmaltada reflectiva ( incluye andamios colgantes ) | M2 | $ 212.408,00 | 0,0 | $ - | 0,0 | $ - | 0,00% | 91,80 | $ 19.499.054,00 |
| 1,4 | Desmonte y retiro de laminas metalicas existentes | UND | $ 563.655,00 | 0,0 | $ - | 0,0 | $ - | 0,00% | 47,00 | $ 26.491.785,00 |
| 1,5 | Suministro de tableros de rodadura con de Laminas de piso según diseño. (TIPO U). | UND | $ 1.329.851,00 | 32,0 | $ 42.555.232,00 | 32,0 | $ 42.555.232,00 | 68,09% | 15,00 | $ 19.947.765,00 |
| 1,6 | Instalacion de tableros metalicos para carpeta de rodadura | UND | $ 831.438,00 | 0,0 | $ - | 0,0 | $ - | 0,00% | 47,00 | $ 39.077.586,00 |
| 1,7 | Suministro e instalacion de pernos con tuercas presion | UND | $ 36.000,00 | 240,0 | $ 8.640.000,00 | 240,0 | $ 8.640.000,00 | 100,00% | 0,00 | $ - |
| 1,8 | Mantenimiento y reparacion de soldadura en conexciones principales y zonas fatigadas de la estructura metalica | M2 | $ 90.237,00 | 48,0 | $ 4.331.376,00 | 48,0 | $ 4.331.376,00 | 52,29% | 43,80 | $ 3.952.381,00 |
| 1,9 | Engrase general de piezas mecanicas moviles y tensores principales. | M2 | $ 202.205,00 | 48,0 | $ 9.705.840,00 | 48,0 | $ 9.705.840,00 | 52,29% | 43,80 | $ 8.856.579,00 |
| | | | SUB TOTAL | | $ 101.829.803,00 | 0,0 | | | | |
| 2 | Restauracion y construccion de estribos y muros laterales de proteccion | | | | | | | | | |
| 2,1 | Excavación mecánica en material tipo grava arcIllosa con afloramineto rocoso. Altura superior a 2 m. | M3 | $ 32.969,00 | 80,0 | $ 2.637.520,00 | 80,0 | $ 2.637.520,00 | 22,22% | 280,00 | $ 9.231.320,00 |
| 2,2 | Relleno con material seleccionado de la excavación, incluye compactacion en capas de 30 cm. | M3 | $ 42.073,00 | 0,0 | $ - | 0,0 | $ - | 0,00% | 162,00 | $ 6.815.826,00 |
| 2,3 | Acero de refuerzo | Kg | $ 10.385,00 | 180,0 | $ 1.869.300,00 | 180,0 | $ 1.869.300,00 | 40,00% | 270,00 | $ 2.803.950,00 |
| 2,4 | Construccion de barrera de proteccion en concreto ciclopedo 3000 psi para Relleno laterales de muros dosificacion 70-30, incluye sika grout y Sika® Stabilizer-4 R CO. | M3 | $ 998.165,89 | 0,0 | $ - | 0,0 | $ - | 0,00% | 240,00 | $ 239.559.814,00 |
| 2,5 | Limpieza de muros con hidroarenado. | M2 | $ 42.000,00 | 168,0 | $ 7.056.000,00 | 168,0 | $ 7.056.000,00 | 100,00% | 0,00 | $ - |
| 2,6 | Suministro e instalacion de concreto impermeabilizado para recubrimiento y restauracion de muros. | M2 | $ 36.382,00 | 168,0 | $ 6.112.176,00 | 168,0 | $ 6.112.176,00 | 100,00% | 0,00 | $ - |
| 2,7 | Cargue y retiro de material de construccion. | M3 | $ 39.448,00 | 0,0 | $ - | 0,0 | $ - | 0,00% | 234,00 | $ 9.230.832,00 |
| 2,8 | zarpa en concreto de 4000 psi para barrera de construuccion | m3 | $ 1.419.525,00 | 0,0 | $ - | 0,0 | $ - | 0,00% | 3,16 | $ 4.488.840,00 |
| | | | SUB TOTAL | | $ 17.674.996,00 | | $ - | | | |
| 3 | OBRAS COMPLEMENTARIAS | | | | | | | | | |
| 3,1 | Dragado mecanico de cauce natural (Ampliacion de la seccion hidrahulica aguas arriba y aguas abajo ) 55 metros aguas arriba y 55 metros aguas abajo * 2m*3m | M3 | $ 45.076,00 | 660,0 | $ 29.750.160,00 | 660,0 | $ 29.750.160,00 | 100,00% | 0,00 | $ - |
| 3,2 | Manejo de aguas (Incluye Bombas, planta electrica) | Dia | $ 538.226,00 | 14,0 | $ 7.535.164,00 | 14,0 | $ 7.535.164,00 | 23,33% | 46,00 | $ 24.758.396,00 |
| | | | SUB TOTAL | | $ 37.285.324,00 | | | | | |
| | | | COSTO DIRECTO | | $ 156.790.123,00 | | $ 156.790.123,00 | | | $ 414.714.128,28 |
| | ADMINISTRACION | | 23% | 23% | $ 36.061.728 | | $ 36.061.728 | | | $ 95.384.249,50 |
| | IMPREVISTO | | 1% | 1% | $ 1.567.901,23 | | $ 1.567.901,23 | | | $ 4.147.141,28 |
| | UTILIDAD | | 6% | 6% | $ 9.407.407,38 | | $ 9.407.407,38 | | | $ 24.882.847,70 |
| | COSTO TOTAL AIU | | | | $ 47.037.036,90 | | $ 47.037.036,90 | | | $ 124.414.238,48 |
| | COSTO TOTAL | | | | $ 203.827.159,90 | | $ 203.827.159,90 | | | $ 539.128.367,10 |
| | VALOR A PAGAR SEGÚN ACTA DE RECIBO No. 01 DEL 19 DE NOVIEMBRE 2024 | | | 27,43% | | 27,43% | | | 72,57% | |

DOCIENTOS TRES MILLONES OCHOCIENTOS VEINTISIETE MIL CIENTO CINCUENTA Y NUEVE PESOS CON NOVENTA CENTAVOS MTC ( $ 203,827,159,90)

SE FIRMA POR LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON:

**JESVAR MULTIPROYECTOS SAS**
**R/L KAREN ALEXANDRA BUITRAGO PAEZ**
CONTRATISTA

**WILLIAM VERA ARIAS**
SUPERVISOR

2

Gobernación de Norte de Santander


# MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

| | | | |
|---|---|---|---|
| **SOPORTE DEL ACTA No.** | ACTA PARCIAL 1 | **PERIODO DEL ACTA CORRESPONDIENTE** | **19-nov-24** |
| **OBJETO** | ATENCIÓN Y MANTENIMIENTO DE PUENTE JULIO SOBRE EL RÍO ARBOLEDAS, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE ARBOLEDAS, EN EL MARCO DE LA DECLARATORIA DE CALAMIDAD PUBLICA REALIZADA MEDIANTE DECRETO 001287 DEL 06 DE JUNIO DE 2024 POR EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER | | |
| **CONTRATO No.** | RE-SGRD-03331-SUSCRITO 31 OCTUBRE 2024 | **SUPERVISOR** | WILLIAM VERA ARIAS |
| **CONTRATISTA** | JESVAR MULTIPROYECTOS SAS | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **ITEM** | **1.1** | Limpieza de estructura metalica | **UNIDAD** | M2 |

| LOCALIZACION | DESCRIPCION | DIMENSIONES | | | CANT | UND | TOTAL ACUMULADO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Long | Ancho | Altura | | | |
| ARBOLEDAS | LIMPIEZA ESTRUCTURA METALICA | 18,00 | 5,10 | | 1,00 | UND | 91,80 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | TOTAL | 91,80 |

**ESQUEMA**

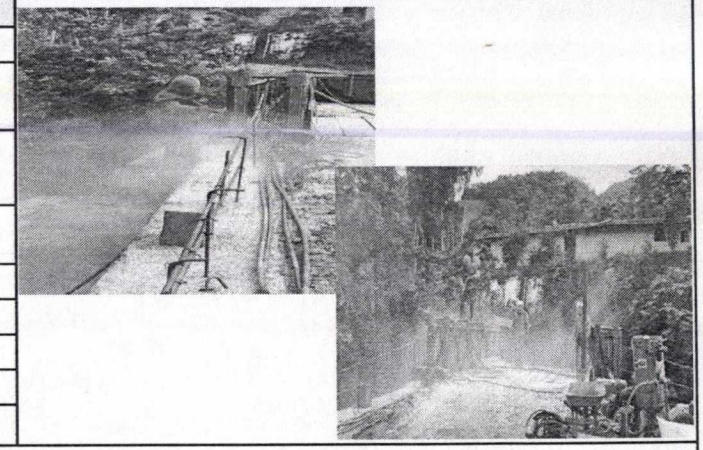

Elaboró
EL CONTRATISTA:

Firma:

| | | |
|---|---|---|
| Nombre: | JESVAR MULTIPROYECTOS SAS | WILLIAM VERA ARIAS |
| CONTRATISTA | R/L KAREN ALEXANDRA BUITRAGO PAEZ | Supervisor ente territorial |



28

Gobernación de Norte de Santander


# MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

| | | | |
|---|---|---|---|
| **SOPORTE DEL ACTA No.** | ACTA PARCIAL 1 | **PERIODO DEL ACTA CORRESPONDIENTE** | **19-nov-24** |
| **OBJETO** | ATENCIÓN Y MANTENIMIENTO DE PUENTE JULIO SOBRE EL RÍO ARBOLEDAS, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE ARBOLEDAS, EN EL MARCO DE LA DECLARATORIA DE CALAMIDAD PUBLICA REALIZADA MEDIANTE DECRETO 001287 DEL 06 DE JUNIO DE 2024 POR EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER | | |
| **CONTRATO No.** | RE-SGRD-03331-SUSCRITO 31 OCTUBRE 2024 | **SUPERVISOR** | WILLIAM VERA ARIAS |
| **CONTRATISTA** | JESVAR MULTIPROYECTOS SAS | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **ITEM** | **2,1** | Excavación mecánica en material tipo grava arcIllosa con afloramineto rocoso. Altura superior a 2 m. | **UNIDAD** | M3 |

| LOCALIZACION | DESCRIPCION | DIMENSIONES | | | CANT | UND | TOTAL ACUMULADO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Long | Ancho | Altura | | | |
| ARBOLEDAS | EXCAVACION MECANICA | 4,00 | 10,00 | 2,00 | | UND | 80,00 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | TOTAL | | 80,00 |

**ESQUEMA**

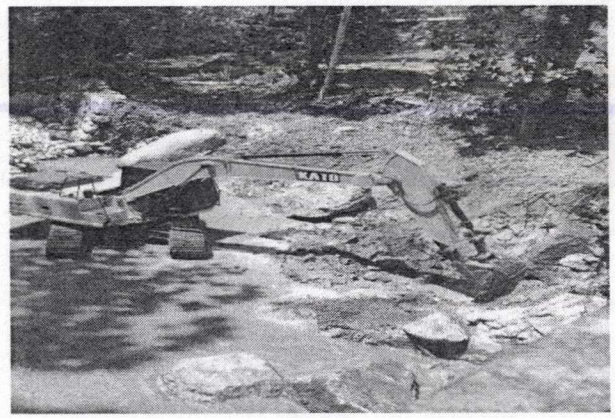

Elaboró
EL CONTRATISTA:

Firma:
Nombre: JESVAR MULTIPROYECTOS SAS
CONTRATISTA R/L KAREN ALEXANDRA BUITRAGO PAEZ

WILLIAM VERA ARIAS
Supervisor ente territorial



29


Gobernación de Norte de Santander

# MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

| | | | |
|---|---|---|---|
| **SOPORTE DEL ACTA No.** | ACTA PARCIAL 1 | **PERIODO DEL ACTA CORRESPONDIENTE** | **19-nov-24** |
| **OBJETO** | ATENCIÓN Y MANTENIMIENTO DE PUENTE JULIO SOBRE EL RÍO ARBOLEDAS, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE ARBOLEDAS, EN EL MARCO DE LA DECLARATORIA DE CALAMIDAD PUBLICA REALIZADA MEDIANTE DECRETO 001287 DEL 06 DE JUNIO DE 2024 POR EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER | | |
| **CONTRATO No.** | RE-SGRD-03331-SUSCRITO 31 OCTUBRE 2024 | **SUPERVISOR** | WILLIAM VERA ARIAS |
| **CONTRATISTA** | JESVAR MULTIPROYECTOS SAS | | |
| **ITEM** **2,3** | Acero de refuerzo | **UNIDAD** | KG |

| LOCALIZACION | DESCRIPCION | DIMENSIONES | | | CANT | UND | TOTAL ACUMULADO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Long | Ancho | Altura | | | |
| ARBOLEDAS | INSTALACION ACERO DE REFUERZO | | | | 180,00 | UND | 180,00 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | TOTAL | **180,00** |

**ESQUEMA**

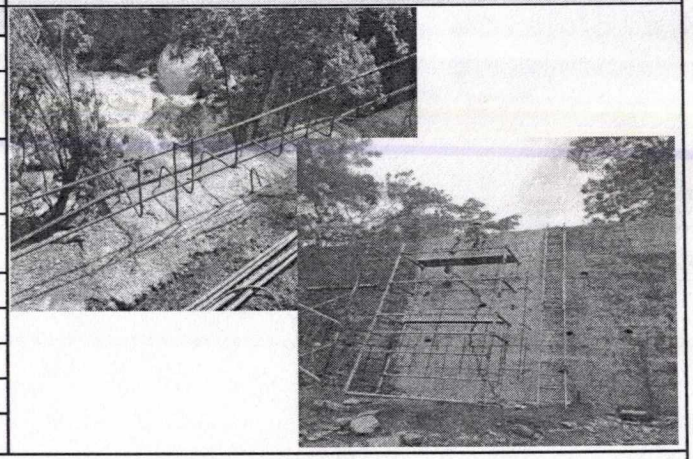

Elaboró
EL CONTRATISTA:

Firma:

Nombre: JESVAR MULTIPROYECTOS SAS
CONTRATISTA R/L KAREN ALEXANDRA BUITRAGO PAEZ

**WILLIAM VERA ARIAS**
**Supervisor ente territorial**



30

Gobernación de Norte de Santander

# MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

| | | | |
|---|---|---|---|
| **SOPORTE DEL ACTA No.** | ACTA PARCIAL 1 | **PERIODO DEL ACTA CORRESPONDIENTE** | **19-nov-24** |
| **OBJETO** | ATENCIÓN Y MANTENIMIENTO DE PUENTE JULIO SOBRE EL RÍO ARBOLEDAS, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE ARBOLEDAS, EN EL MARCO DE LA DECLARATORIA DE CALAMIDAD PUBLICA REALIZADA MEDIANTE DECRETO 001287 DEL 06 DE JUNIO DE 2024 POR EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER | | |
| **CONTRATO No.** | RE-SGRD-03331-SUSCRITO 31 OCTUBRE 2024 | **SUPERVISOR** | WILLIAM VERA ARIAS |
| **CONTRATISTA** | JESVAR MULTIPROYECTOS SAS | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **ITEM** | **2,5** | Limpieza de muros con hidroarenado. | **UNIDAD** | M2 |

| LOCALIZACION | DESCRIPCION | DIMENSIONES | | | CANT | UND | TOTAL ACUMULADO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Long | Ancho | Altura | | | |
| ARBOLEDAS | RETIRO DE SUCIEDAD EN PIEZAS METALICAS Y HORMIGOS EXISTENTE | | 14,00 | 6,00 | 2,00 | UND | 168,00 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | TOTAL | 168,00 |

**ESQUEMA**



Elaboró
EL CONTRATISTA:

Firma:

Nombre: JESVAR MULTIPROYECTOS SAS
R/L KAREN ~~ALEXANDRA~~ BUITRAGO PAEZ

WILLIAM VERA ARIAS
Supervisor ente territorial



3

Gobernación de Norte de Santander


# MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

| | | | |
|---|---|---|---|
| **SOPORTE DEL ACTA No.** | ACTA PARCIAL 1 | **PERIODO DEL ACTA CORRESPONDIENTE** | **19-nov-24** |
| **OBJETO** | ATENCIÓN Y MANTENIMIENTO DE PUENTE JULIO SOBRE EL RÍO ARBOLEDAS, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE ARBOLEDAS, EN EL MARCO DE LA DECLARATORIA DE CALAMIDAD PUBLICA REALIZADA MEDIANTE DECRETO 001287 DEL 06 DE JUNIO DE 2024 POR EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER | | |
| **CONTRATO No.** | RE-SGRD-03331-SUSCRITO 31 OCTUBRE 2024 | **SUPERVISOR** | WILLIAM VERA ARIAS |
| **CONTRATISTA** | JESVAR MULTIPROYECTOS SAS | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **ITEM** | **2,6** | Suministro e instalacion de concreto impermeabilizado para recubrimiento y restauracion de muros. | **UNIDAD** | M2 |

| LOCALIZACION | DESCRIPCION | DIMENSIONES | | | CANT | UND | TOTAL ACUMULADO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Long | Ancho | Altura | | | |
| CAMPO DOS | RESTAURACION E IMPERMEABILIZACION DE MURO | | 14,00 | 6,00 | 2,00 | UND | 168,00 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | TOTAL | 168,00 |

**ESQUEMA**

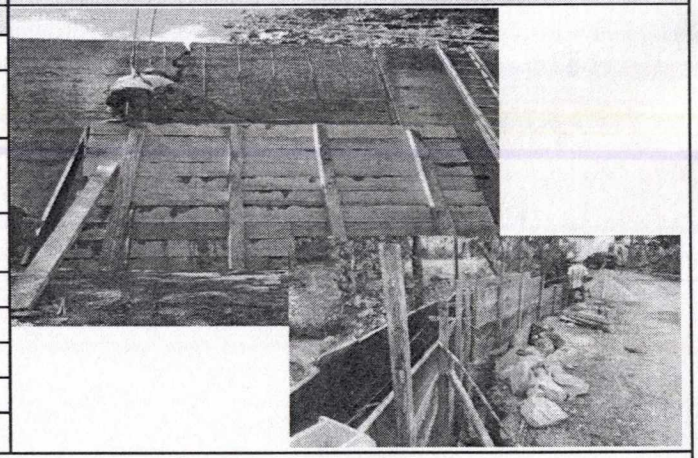

Elaboró
EL CONTRATISTA:

Firma:

| | | |
|---|---|---|
| Nombre: | JESVAR MULTIPROYECTOS SAS | WILLIAM VERA ARIAS |
| CONTRATISTA | R/L KAREN ALEXANDRA BUITRAGO PAEZ | Supervisor ente territorial |



32

Gobernación de Norte de Santander


# MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

| | | | |
|---|---|---|---|
| **SOPORTE DEL ACTA No.** | ACTA PARCIAL 1 | **PERIODO DEL ACTA CORRESPONDIENTE** | **19-nov-24** |
| **OBJETO** | ATENCIÓN Y MANTENIMIENTO DE PUENTE JULIO SOBRE EL RÍO ARBOLEDAS, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE ARBOLEDAS, EN EL MARCO DE LA DECLARATORIA DE CALAMIDAD PUBLICA REALIZADA MEDIANTE DECRETO 001287 DEL 06 DE JUNIO DE 2024 POR EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER | | |
| **CONTRATO No.** | RE-SGRD-03331-SUSCRITO 31 OCTUBRE 2024 | **SUPERVISOR** | WILLIAM VERA ARIAS |
| **CONTRATISTA** | JESVAR MULTIPROYECTOS SAS | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **ITEM** | **1.2** | Suministro, preparacion y apliacion de fondo anticorrisvo mecanica ( estructuras superiores, interiores y laterales) icluye andamios colgantes | **UNIDAD** | M2 |

| LOCALIZACION | DESCRIPCION | DIMENSIONES | | | CANT | UND | TOTAL ACUMULADO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Long | Ancho | Altura | | | |
| CAMPO DOS | SUMINISTRO E INSTALACION PINTURA ANTICORROSIVA | 18,00 | 5,10 | | 1,00 | UND | 91,80 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | TOTAL | 91,80 |

**ESQUEMA**

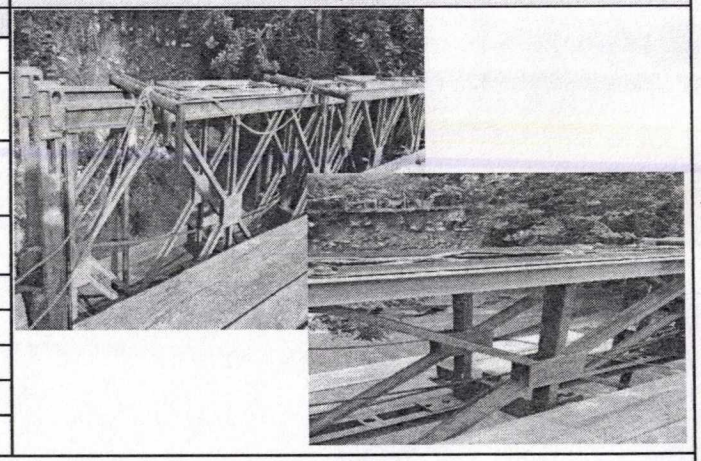

Elaboró
EL CONTRATISTA:

Firma:

| | | |
|---|---|---|
| Nombre: | JESVAR MULTIPROYECTOS SAS | WILLIAM VERA ARIAS |
| CONTRATISTA | R/L KAREN ALEXANDRA SUITRAGO PAEZ | Supervisor ente territorial |

Gobernación de Norte de Santander

# MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

| | | | |
|---|---|---|---|
| **SOPORTE DEL ACTA No.** | ACTA PARCIAL 1 | **PERIODO DEL ACTA CORRESPONDIENTE** | **19-nov-24** |
| **OBJETO** | ATENCIÓN Y MANTENIMIENTO DE PUENTE JULIO SOBRE EL RÍO ARBOLEDAS, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE ARBOLEDAS, EN EL MARCO DE LA DECLARATORIA DE CALAMIDAD PUBLICA REALIZADA MEDIANTE DECRETO 001287 DEL 06 DE JUNIO DE 2024 POR EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER | | |
| **CONTRATO No.** | RE-SGRD-03331-SUSCRITO 31 OCTUBRE 2024 | **SUPERVISOR** | WILLIAM VERA ARIAS |
| **CONTRATISTA** | JESVAR MULTIPROYECTOS SAS | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **ITEM** | **3,1** | Dragado mecanico de cauce natural (Ampliacion de la seccion hidrahulica aguas arriba y aguas abajo ) 55 metros aguas arriba y 55 metros aguas abajo * 2m*3m | **UNIDAD** | M3 |

| LOCALIZACION | DESCRIPCION | DIMENSIONES | | | CANT | UND | TOTAL ACUMULADO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Long | Ancho | Altura | | | |
| ARBOLEDAS | RECUPERACION HIDRAULICA CON OBRAS DE DRAGADO | 55,00 | 3,00 | 2,00 | 2,00 | UND | 660,00 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | TOTAL | 660,00 |

**ESQUEMA**



Elaboró
EL CONTRATISTA:

Firma:

| | | |
|---|---|---|
| Nombre: | JESVAR MULTIPROYECTOS SAS | WILLIAM VERA ARIAS |
| CONTRATISTA | R/L KAREN ALEXANDRA BUITRAGO PAEZ | Supervisor ente territorial |

Gobernación de Norte de Santander


# MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

| | | | |
|---|---|---|---|
| **SOPORTE DEL ACTA No.** | ACTA PARCIAL 1 | **PERIODO DEL ACTA CORRESPONDIENTE** | **19-nov-24** |
| **OBJETO** | ATENCIÓN Y MANTENIMIENTO DE PUENTE JULIO SOBRE EL RÍO ARBOLEDAS, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE ARBOLEDAS, EN EL MARCO DE LA DECLARATORIA DE CALAMIDAD PUBLICA REALIZADA MEDIANTE DECRETO 001287 DEL 06 DE JUNIO DE 2024 POR EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER | | |
| **CONTRATO No.** | RE-SGRD-03331-SUSCRITO 31 OCTUBRE 2024 | **SUPERVISOR** | WILLIAM VERA ARIAS |
| **CONTRATISTA** | JESVAR MULTIPROYECTOS SAS | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **ITEM** | **3,2** | Manejo de aguas (Incluye Bombas, planta electrica) | **UNIDAD** | DIA |

| LOCALIZACION | DESCRIPCION | DIMENSIONES | | | CANT | UND | TOTAL ACUMULADO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Long | Ancho | Altura | | | |
| CAMPO DOS | SUMINISTRO E INSTALCION DE MOTOBOMBAS | | | | 14,00 | UND | 14,00 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | TOTAL | 14,00 |

**ESQUEMA**

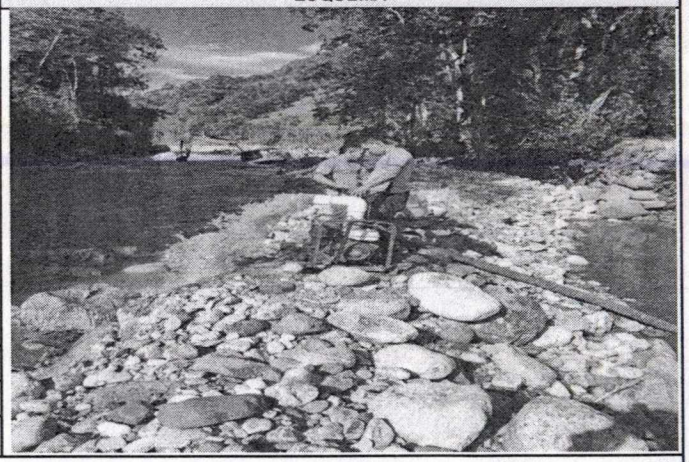

Elaboró
EL CONTRATISTA:

Firma:

| | | |
|---|---|---|
| Nombre: | JESVAR MULTIPROYECTOS SAS | WILLIAM VERA ARIAS |
| CONTRATISTA | R/L KAREN ALEXANDRA BUITRAGO PAEZ | Supervisor ente territorial |



35


Gobernación de Norte de Santander

# MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

| | | | |
|---|---|---|---|
| **SOPORTE DEL ACTA No.** | ACTA PARCIAL 1 | **PERIODO DEL ACTA CORRESPONDIENTE** | **19-nov-24** |
| **OBJETO** | ATENCIÓN Y MANTENIMIENTO DE PUENTE JULIO SOBRE EL RÍO ARBOLEDAS, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE ARBOLEDAS, EN EL MARCO DE LA DECLARATORIA DE CALAMIDAD PUBLICA REALIZADA MEDIANTE DECRETO 001287 DEL 06 DE JUNIO DE 2024 POR EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER | | |
| **CONTRATO No.** | RE-SGRD-03331-SUSCRITO 31 OCTUBRE 2024 | **SUPERVISOR** | WILLIAM VERA ARIAS |
| **CONTRATISTA** | JESVAR MULTIPROYECTOS SAS | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **ITEM** | **1,5** | Suministro de tableros de rodadura con de Laminas de piso según diseño. (TIPO U). | **UNIDAD** | UND |

| LOCALIZACION | DESCRIPCION | DIMENSIONES | | | CANT | UND | TOTAL | ESQUEMA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Long | Ancho | Altura | | | ACUMULADO | |
| ARBOLEDAS | ELABORACION Y SUMINISTRO DE TABLEROS TIPO U | 3,00 | 0,80 | | 32,00 | UND | 32,00 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | TOTAL | 32,00 | |

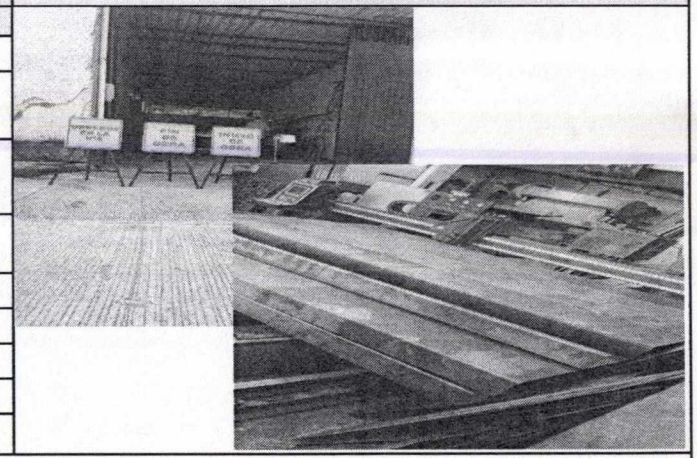

Elaboró
EL CONTRATISTA:

Firma:
Nombre: JESVAR MULTIPROYECTOS SAS
CONTRATISTA R/L KAREN ALEXANDRA BUITRAGO PAEZ

WILLIAM VERA ARIAS
Supervisor ente territorial

Gobernación de Norte de Santander


# MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

| | | | |
|---|---|---|---|
| **SOPORTE DEL ACTA No.** | ACTA PARCIAL 1 | **PERIODO DEL ACTA CORRESPONDIENTE** | **19-nov-24** |
| **OBJETO** | ATENCIÓN Y MANTENIMIENTO DE PUENTE JULIO SOBRE EL RÍO ARBOLEDAS, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE ARBOLEDAS, EN EL MARCO DE LA DECLARATORIA DE CALAMIDAD PUBLICA REALIZADA MEDIANTE DECRETO 001287 DEL 06 DE JUNIO DE 2024 POR EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER | | |
| **CONTRATO No.** | RE-SGRD-03331-SUSCRITO 31 OCTUBRE 2024 | **SUPERVISOR** | WILLIAM VERA ARIAS |
| **CONTRATISTA** | JESVAR MULTIPROYECTOS SAS | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **ITEM** | **1,7** | Suministro e instalacion de pernos con tuercas presion | **UNIDAD** | UND |

| LOCALIZACION | DESCRIPCION | DIMENSIONES | | | CANT | UND | TOTAL ACUMULADO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Long | Ancho | Altura | | | |
| ARBOLEDAS | ISNTALCION DE TORNILLERIA | | | | 240,00 | UND | 240,00 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | TOTAL | | | 240,00 |

ESQUEMA

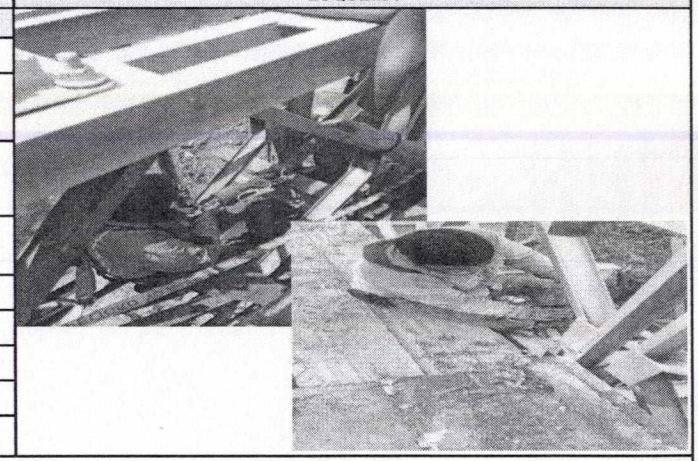

Elaboró
EL CONTRATISTA:

Firma:
Nombre: JESVAR MULTIPROYECTOS SAS
CONTRATISTA R/L KAREN ALEXANDRA BUITRAGO PAEZ

WILLIAM VERA ARIAS
Supervisor ente territorial



37

Gobernación de Norte de Santander


# MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

| | | | |
|---|---|---|---|
| **SOPORTE DEL ACTA No.** | ACTA PARCIAL 1 | **PERIODO DEL ACTA CORRESPONDIENTE** | **19-nov-24** |
| **OBJETO** | ATENCIÓN Y MANTENIMIENTO DE PUENTE JULIO SOBRE EL RÍO ARBOLEDAS, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE ARBOLEDAS, EN EL MARCO DE LA DECLARATORIA DE CALAMIDAD PUBLICA REALIZADA MEDIANTE DECRETO 001287 DEL 06 DE JUNIO DE 2024 POR EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER | | |
| **CONTRATO No.** | RE-SGRD-03331-SUSCRITO 31 OCTUBRE 2024 | **SUPERVISOR** | WILLIAM VERA ARIAS |
| **CONTRATISTA** | JESVAR MULTIPROYECTOS SAS | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **ITEM** | **1.9** | Engrase general de piezas mecanicas moviles y tensores principales. | **UNIDAD** | M2 |

| LOCALIZACION | DESCRIPCION | DIMENSIONES | | | CANT | UND | TOTAL ACUMULADO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Long | Ancho | Altura | | | |
| ARBOLEDAS | LUBRICACION Y ENGRASE DE PIEZAS METALICAS | 19,20 | 1,25 | | 2,00 | UND | 48,00 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | TOTAL | 48,00 |

**ESQUEMA**

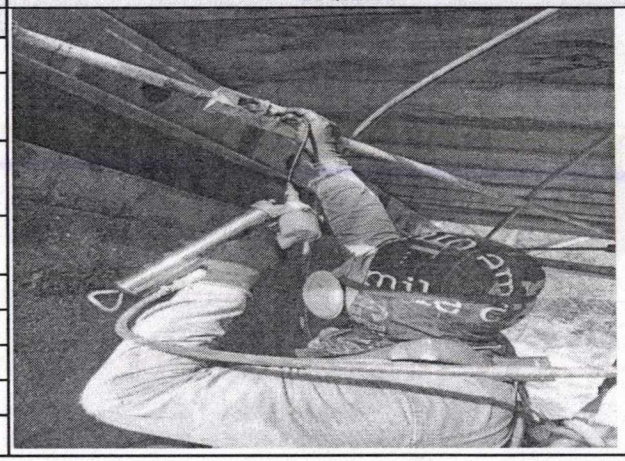

**Elaboró**
**EL CONTRATISTA:**

**Firma:**

| | | |
|---|---|---|
| **Nombre:** | **JESVAR MULTIPROYECTOS SAS** | **WILLIAM VERA ARIAS** |
| **CONTRATISTA** | **R/L KAREN ALEXANDRA BUITRAGO PAEZ** | **Supervisor ente territorial** |

| | MACROPROCESO: SOPORTE | MS-CC-CS-12 | |
|---|---|---|---|
| | GESTIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIÓN | FECHA 24/10/2017 | VERSIÓN 1 |
| | CONTROL Y SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL | Página 1 de 3 | |

# INFORME DE SUPERVISIÓN Y CUMPLIMIENTO CONTRATO DE OBRA

| | |
|---|---|
| **FECHA :** | 19 de noviembre 2024 |

| **1. GENERALIDADES DEL CONTRATO** | |
|---|---|
| **FECHA Y No DEL CONTRATO** | RE-SGRD-03331-2024 |
| **TIPO DE CONTRATO** | Obra |
| **DEPENDENCIA CONTRATANTE** | Secretaría para la Gestión del Riesgo de Desastres |
| **CONTRATISTA** | JESVAR MULTIPROYECTOS SAS |
| **C.C. o N.I.T.** | 9 0 1 4 4 2 4 4 7- 3 |
| **REPRESENTANTE LEGAL** | KAREN ALEXANDRA BUITRAGO PAEZ |
| **N.I.T** | 1 .090.176.820 |
| **OBJETO DEL CONTRATO** | ATENCIÓN Y MANTENIMIENTO DE PUENTE JULIO SOBRE EL RÍO ARBOLEDAS, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE ARBOLEDAS, EN EL MARCO DE LA DECLARATORIA DE CALAMIDAD PUBLICA REALIZADA MEDIANTE DECRETO 001287 DEL 06 DE JUNIO DE 2024 POR EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER |
| **VALOR INICIAL DEL CONTRATO** | SETECIENTOS CUARENTA Y DOS MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS VEINTISIETE PESOS MTC ( $ 742.955.527,00) |
| **VALOR ADICIONAL CONTRATO** | No Aplica |
| **LUGAR DE EJECUCIÓN** | Departamento Norte de Santander |
| **PLAZO INICIAL** | 2 meses |
| **FORMA DE PAGO** | EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER, realizó los análisis de precios unitarios de las obras requeridas, fijándose como valor total para el contrato a ejecutar la suma de SETECIENTOS CUARENTA Y DOS MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS VEINTISIETE PESOS MTC ( $ 742.955.527,00), Valor que será pagado por el DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER al CONTRATISTA mediante actas parciales, previa presentación por parte del Contratista del informe de ejecución de las actividades relacionadas con el objeto del contrato, certificación de cumplimiento a satisfacción expedida por el supervisor del contrato, y de la prestación de los respectivos soportes de pago de aportes al sistema de seguridad social en salud, pensión, y riesgos profesionales, de conformidad con lo establecido en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, en el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, y en la Ley 1562 de 2012, y demás normas vigentes. Ante el incumplimiento de estas obligaciones, el DEPARTAMENTO dará aviso de tal situación a las autoridades competentes. |
| **DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL** | No. 00 000105 de Fecha 18 septiembre de 2024 |
| **REGISTRO PRESUPUESTAL** | No.00 000127 de Fecha 31 octubre de 2024 |
| **SUPERVISOR** | William Vera Arias, secretario para la Gestión del Riesgo de Desastres Mediante Memorando de Designación de Supervisión de Fecha 5 de noviembre de 2024 |
| **INTERVENTOR EXTERNO** | - |
| **ACTA DE INICIO** | 5 de noviembre de 2024 |
| **ACTA DE SUSPENSIÓN** | - |
| **ACTA DE REINICIO** | - |


Gobernación de Norte de Santander

# MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

| | | | |
|---|---|---|---|
| **SOPORTE DEL ACTA No.** | ACTA PARCIAL 1 | **PERIODO DEL ACTA CORRESPONDIENTE** | **19-nov-24** |
| **OBJETO** | ATENCIÓN Y MANTENIMIENTO DE PUENTE JULIO SOBRE EL RÍO ARBOLEDAS, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE ARBOLEDAS, EN EL MARCO DE LA DECLARATORIA DE CALAMIDAD PUBLICA REALIZADA MEDIANTE DECRETO 001287 DEL 06 DE JUNIO DE 2024 POR EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER | | |
| **CONTRATO No.** | RE-SGRD-03331-SUSCRITO 31 OCTUBRE 2024 | **SUPERVISOR** | WILLIAM VERA ARIAS |
| **CONTRATISTA** | JESVAR MULTIPROYECTOS SAS | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **ITEM** | **1.5** | Mantenimiento y reparacion de soldadura en conexciones principales y zonas fatigadas de la estructura metalica | **UNIDAD** | M2 |

| LOCALIZACION | DESCRIPCION | DIMENSIONES | | | CANT | UND | TOTAL ACUMULADO | ESQUEMA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Long | Ancho | Altura | | | | |
| ARBOLEDAS | SOLDARURA DE AJUSTE Y REFROZAIENTO ESTRUCTURA GENERAL | 6,40 | 7,50 | | | UND | 48,00 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | TOTAL | 48,00 | |

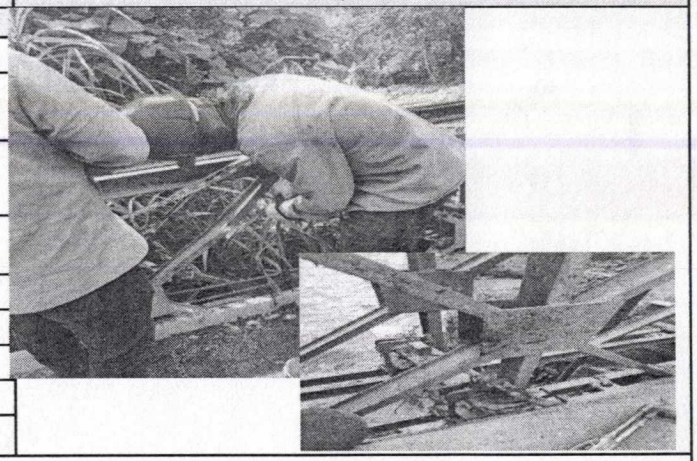

Elaboró
EL CONTRATISTA:

Firma:
Nombre: JESVAR MULTIPROYECTOS SAS
CONTRATISTA R/L KAREN ALEXANDRA BUITRAGO PAEZ

WILLIAM VERA ARIAS
Supervisor ente territorial

## INFORME DE SUPERVISIÓN Y CUMPLIMIENTO CONTRATO DE OBRA

| | | |
|---|---|---|
| **ACTAS PARCIALES DE OBRAS ACTAS DE MODIFICACIÓN** | - | **FECHA** |
| | | |
| | | |
| **ACTAS DE MODIFICACIÓN ACTAS DE PRECIOS NO PREVISTOS** | **NA** | **FECHA** |
| | | |
| | | |
| **RELACIÓN DE GARANTÍAS** | | |

| | Amparos | Valor asegurado | Vigencia |
|---|---|---|---|
| **Garantía Única.**<br>No. 49-44-101034761 Anexo No.0<br>Aseguradora: Seguros Del Estado S.A.<br>Fecha de Expedición: 01/11/2024<br>Fecha de aprobación: 05/11/2024 | Cumplimiento del Contrato | $74,295,552.70 | 01/11/2024 al 01/07/2025 |
| | Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e Indemnizaciones Laborales | $37,147,776.35 | 01/11/2024 al 01/01/2028 |
| | Estabilidad y calidad de obra | $74,295,552.70 | 5 AÑOS |

| | Valor asegurado | Vigencia |
|---|---|---|
| **Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual**<br>No. 49-40-101011106 Anexo No.0<br>Aseguradora: Seguros Del Estado S.A.<br>Fecha de Expedición: 01/11/2024<br>Fecha de aprobación: 05/11/2024 | $ 260.000.000 | 01/11/2024 hasta 01/01/2025 |

### 2. ESTADO FINANCIERO

| CONCEPTO | FECHA | VALOR ACTA | COMPROBANTE DE EGRESO | VALOR PAGADO |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| | | | | |

| | |
|---|---|
| VALOR INICIAL CONTRATADO | $ 742.955.527,00 |
| ACTA PARCIAL 1 | $ 203.827.159,90 |
| **SALDO POR EJECUTAR** | $ 539.128.367,10 |

### 3. DESARROLLO DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO

## INFORME DE SUPERVISIÓN Y CUMPLIMIENTO CONTRATO DE OBRA

### ANEXO REGISTRO FOTOGRAFICO SEGÚN ACTA PARCIAL DE OBRA DEL 19 NOVIEMBRE 2024

**4. CERTIFICACIÓN AL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE PAGO DEL CONTRATO**
Dando cumplimiento al Artículo 82 y 83 de lo establecido en la Ley 1474 de 2011 "Estatuto Anticorrupción", Yo WILLIAM ARIAS VERA con cedula de ciudadanía No. 88.158.521 de pamplona en mi condición de ordenador del gasto (a) del contrato de Obra RE-SGRD-03331-2024, **CERTIFICO** que:


KAREN ALEXANDRA BUITRAGO PAEZ, en calidad de Representante Legal de la EMPRESA CONTRATISTA JESVAR MULTIPROYECTOS SAS, hizo entrega del informe de actividades relacionado con la de ejecución del (objeto contractual) durante el período comprendido del **5 NOVIEMBRE AL 19 DE NOVIEMBRE 2024 ATENCIÓN Y MANTENIMIENTO DE PUENTE JULIO SOBRE EL RÍO ARBOLEDAS, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE ARBOLEDAS, EN EL MARCO DE LA DECLARATORIA DE CALAMIDAD PUBLICA REALIZADA MEDIANTE DECRETO 001287 DEL 06 DE JUNIO DE 2024 POR EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER.**
El valor a reconocer y pagar es la suma de **DOCIENTOS TRES MILLONES OCHOCIENTOS VEINTISIETE MIL CIENTO CINCUENTA Y NUEVE PESOS MTC ( $ 203,827,159.90),** correspondiente al pago Acta Recibo PARCIAL, del contrato en referencia.

De igual forma **CERTIFICO** que el contratista acredito los siguientes pagos en materia de seguridad social y prestaciones de ley (se anexa planillas de pago)

**WILLIAM VERA ARIAS**
Secretario para la Gestión del Riesgo de Desastres
Ordenador del Gasto - Supervisor

**JESVAR MULTIPROYECTOS SAS**
**Nit 901442447-3**
R/L **KAREN ALEXANDRA BUITRAGO PAEZ**
C.C. No. 1 .090.176.820
**Contratista**

**INFORME DE SUPERVISIÓN Y CUMPLIMIENTO CONTRATO DE OBRA**

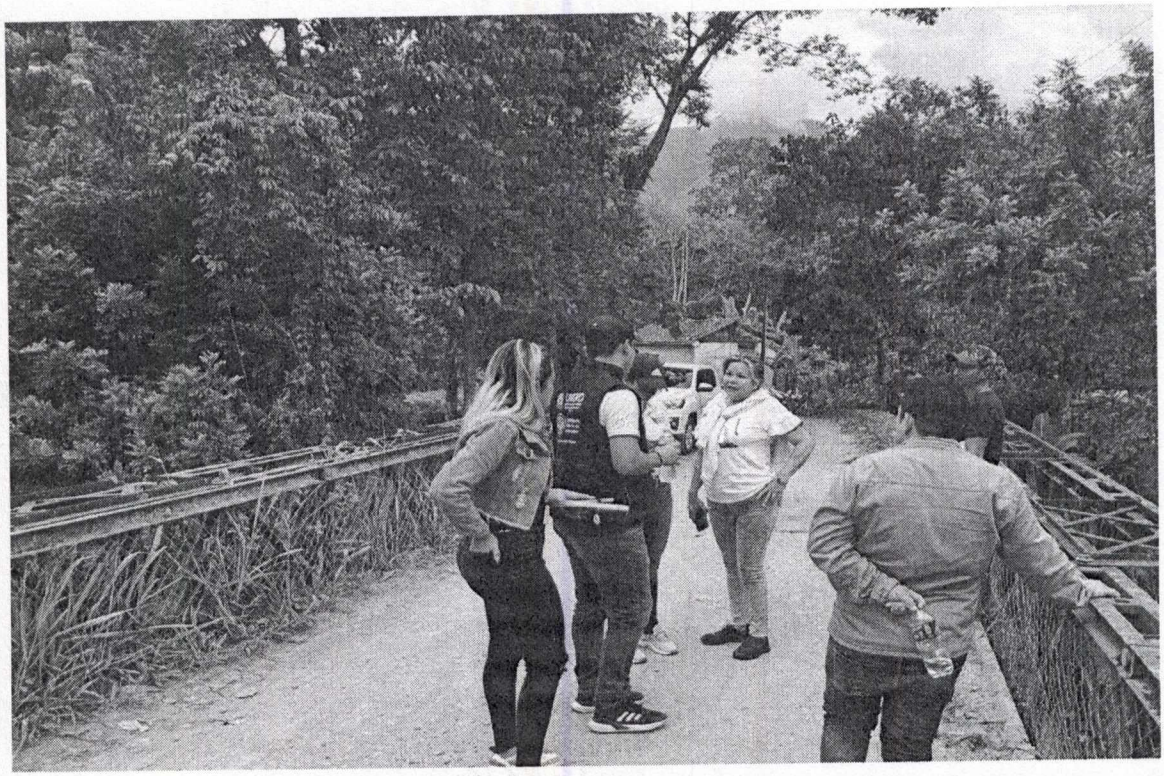




| Gobernación de Norte de Santander | MACROPROCESO: SOPORTE | MS-CC-CS-12 | |
|---|---|---|---|
| | GESTIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIÓN | FECHA 24/10/2017 | VERSIÓN 1 |
| | CONTROL Y SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL | Página 5 de 10 | |


**INFORME DE SUPERVISIÓN Y CUMPLIMIENTO CONTRATO DE OBRA**

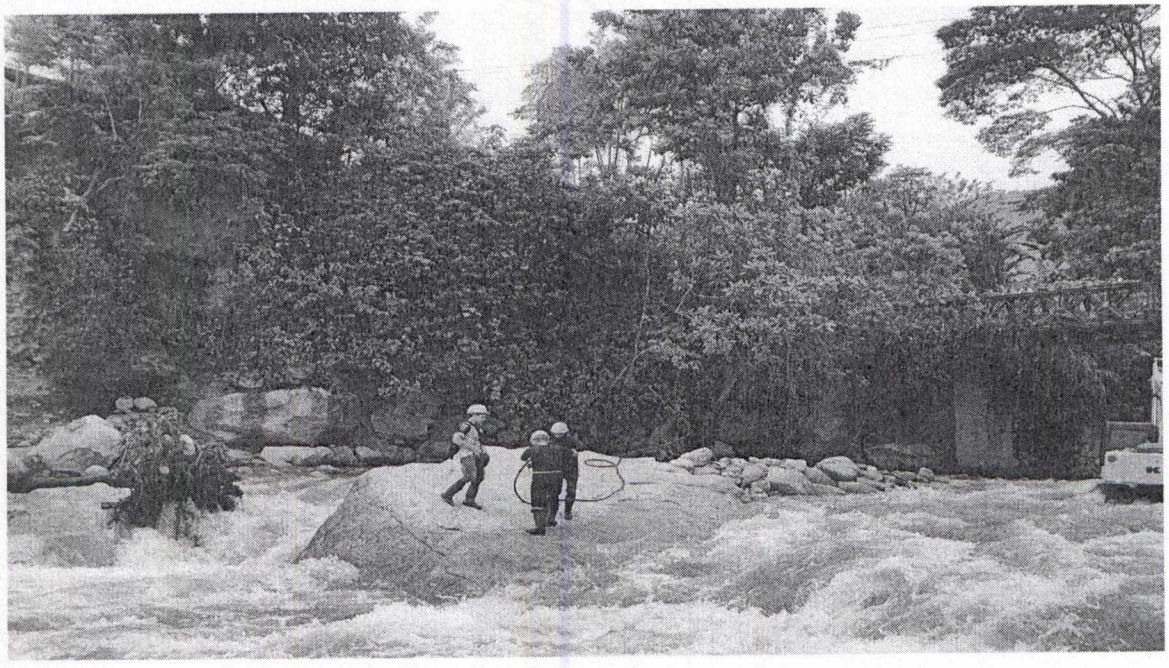



| Gobernación de Norte de Santander | MACROPROCESO: SOPORTE | MS-CC-CS-12 | |
|---|---|---|---|
| | GESTIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIÓN | FECHA 24/10/2017 | VERSIÓN 1 |
| | CONTROL Y SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL | Página 6 de 10 | |

**INFORME DE SUPERVISIÓN Y CUMPLIMIENTO CONTRATO DE OBRA**



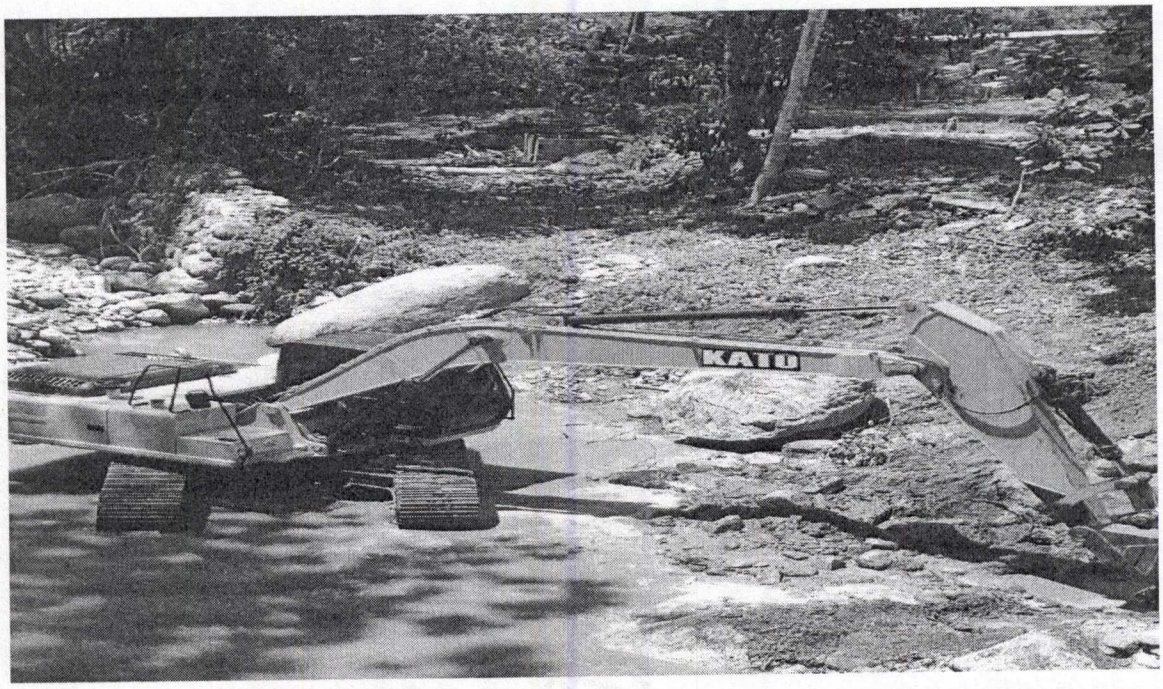


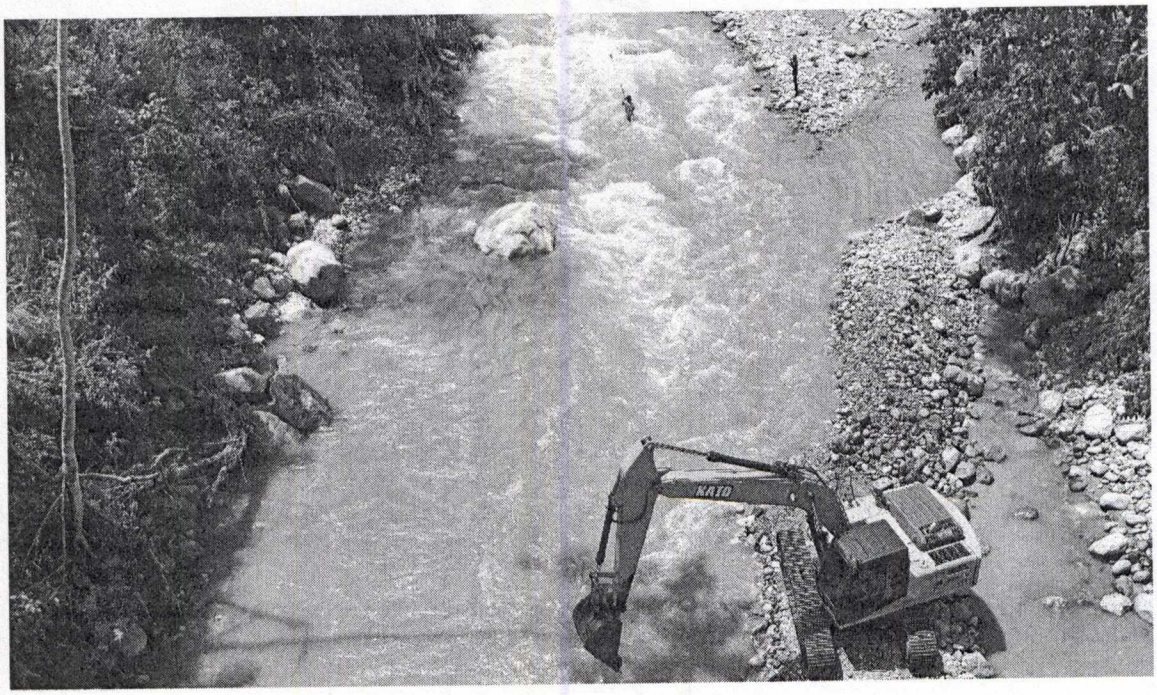
**INFORME DE SUPERVISIÓN Y CUMPLIMIENTO CONTRATO DE OBRA**

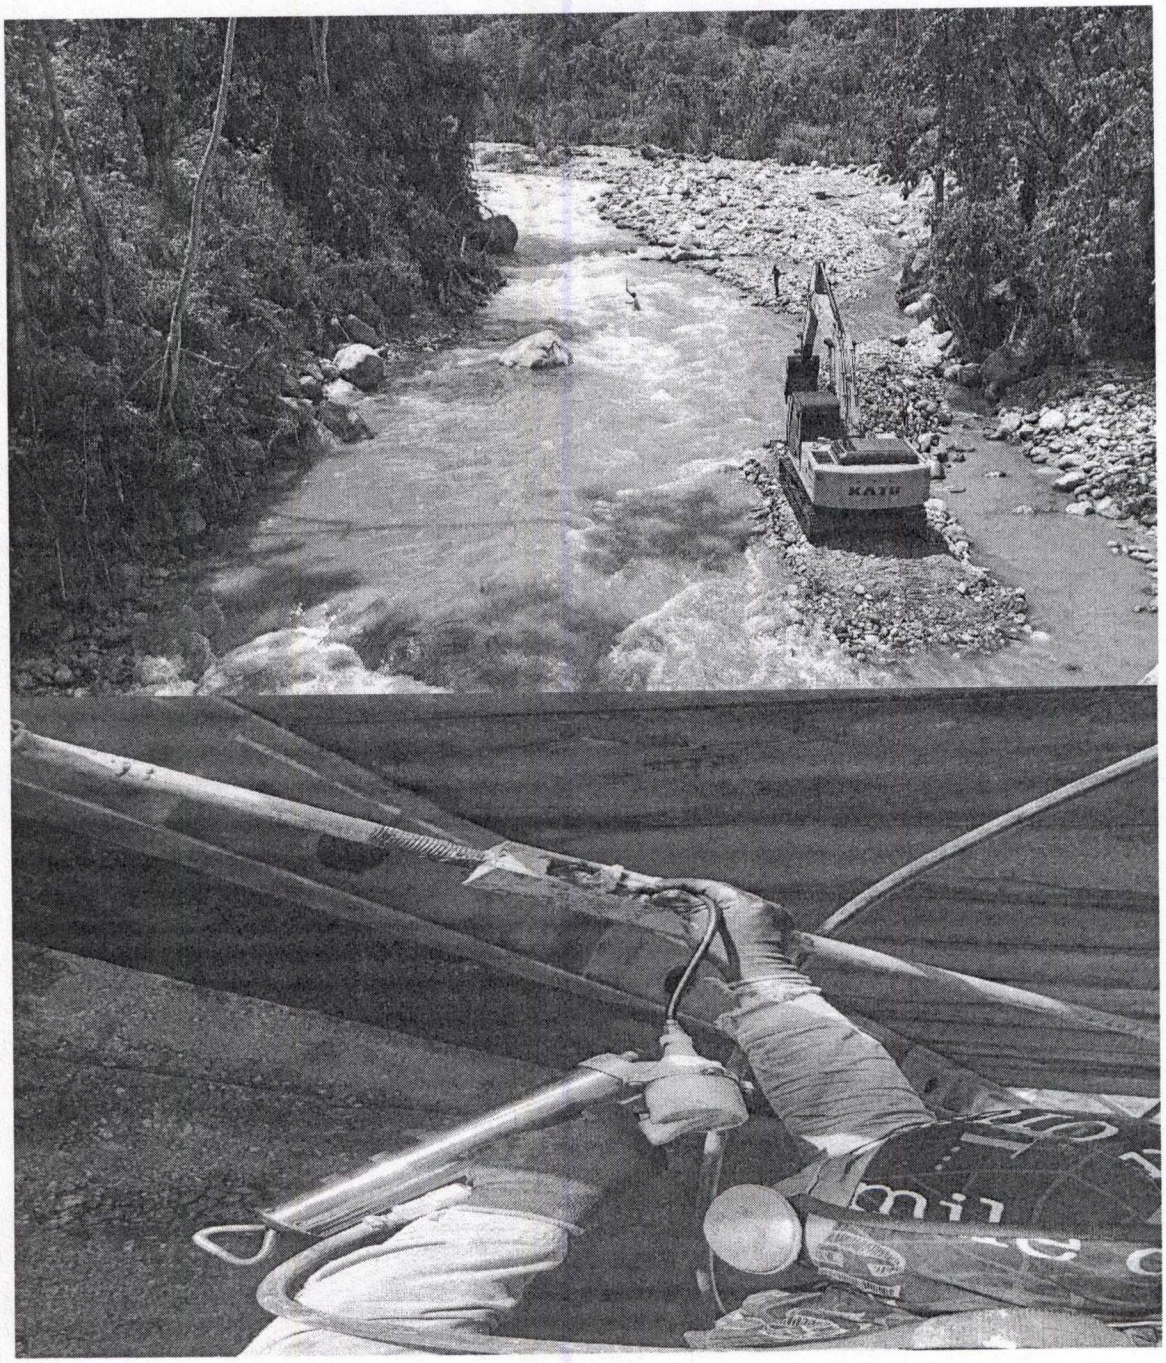



| Gobernación de Norte de Santander | MACROPROCESO: SOPORTE | MS-CC-CS-12 | |
|---|---|---|---|
| | GESTIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIÓN | FECHA 24/10/2017 | VERSIÓN 1 |
| | CONTROL Y SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL | Página 8 de 10 | |

**INFORME DE SUPERVISIÓN Y CUMPLIMIENTO CONTRATO DE OBRA**

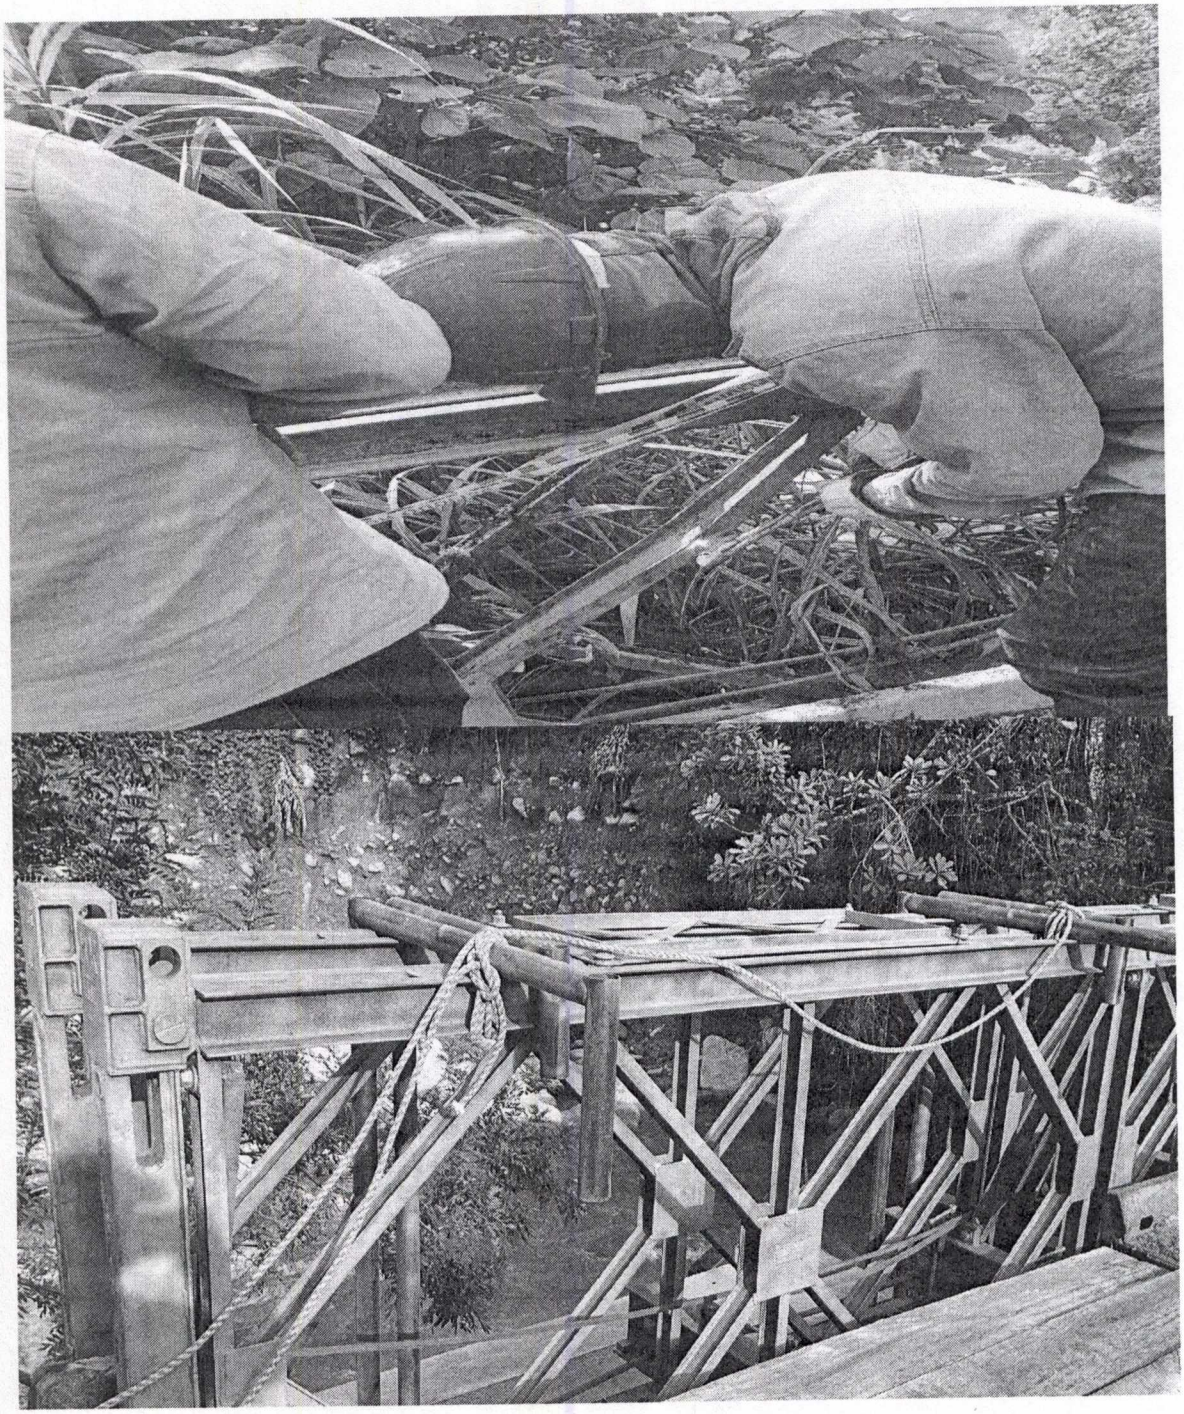


**INFORME DE SUPERVISIÓN Y CUMPLIMIENTO CONTRATO DE OBRA**

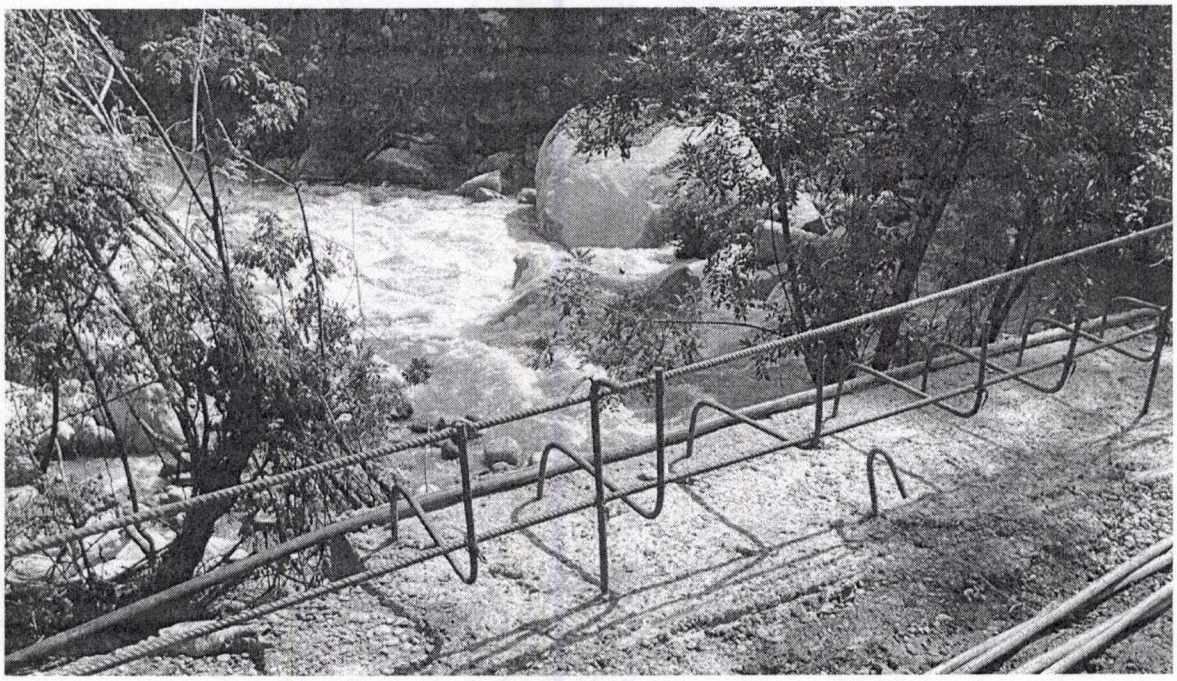


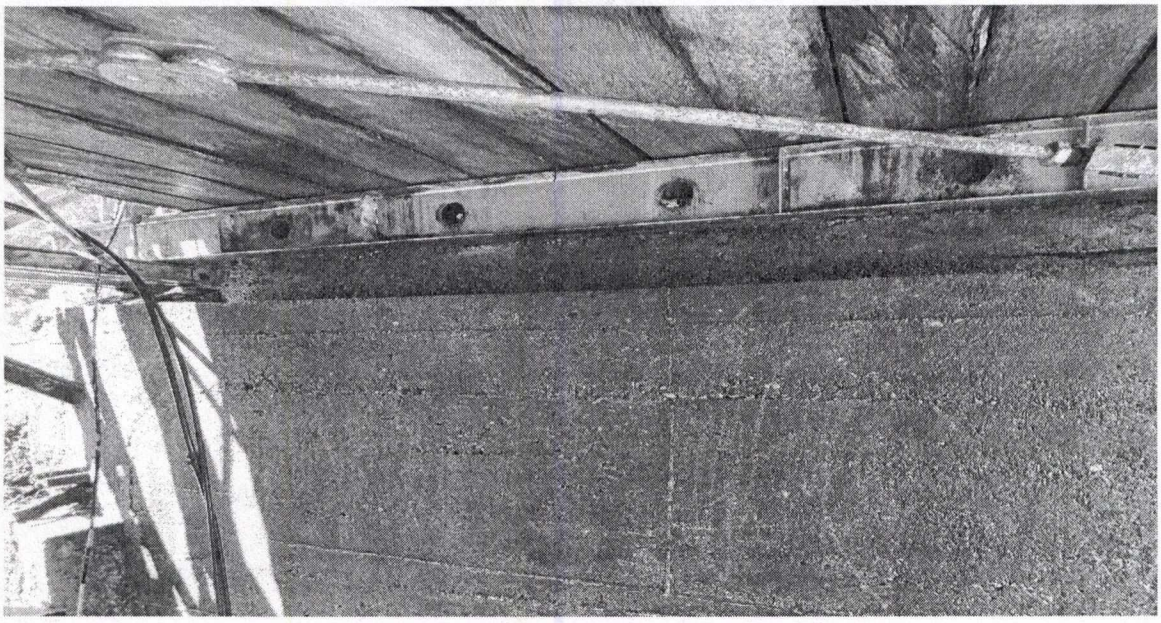

| Gobernación de Norte de Santander | MACROPROCESO: SOPORTE | MS-CC-CS-12 | |
|---|---|---|---|
| | GESTIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIÓN | FECHA 24/10/2017 | VERSIÓN 1 |
| | CONTROL Y SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL | Página 10 de 10 | |

**INFORME DE SUPERVISIÓN Y CUMPLIMIENTO CONTRATO DE OBRA**

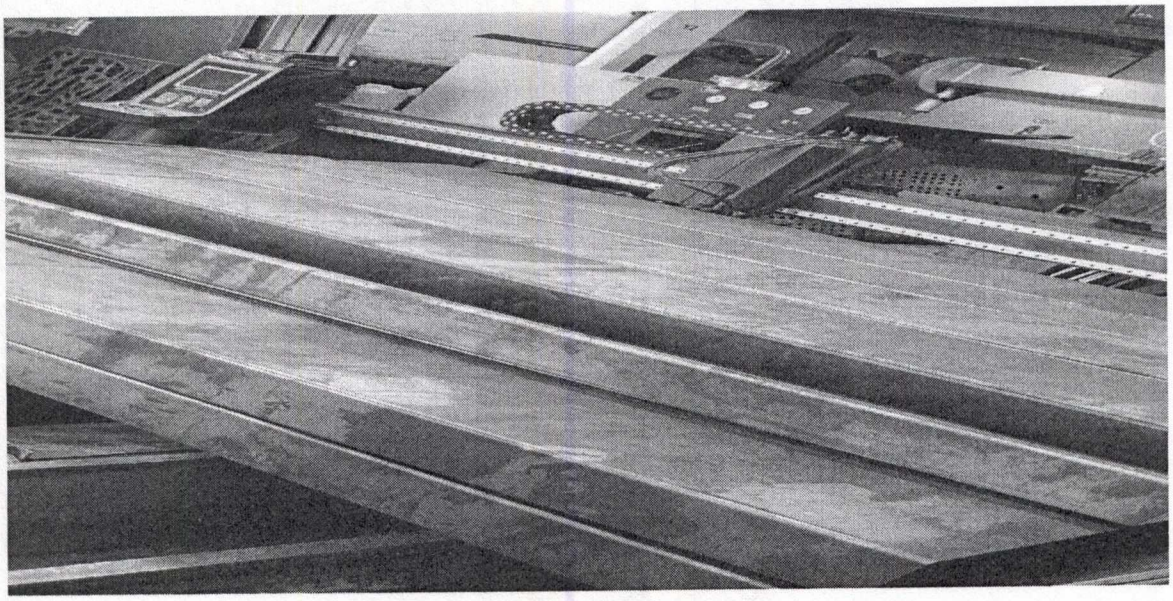

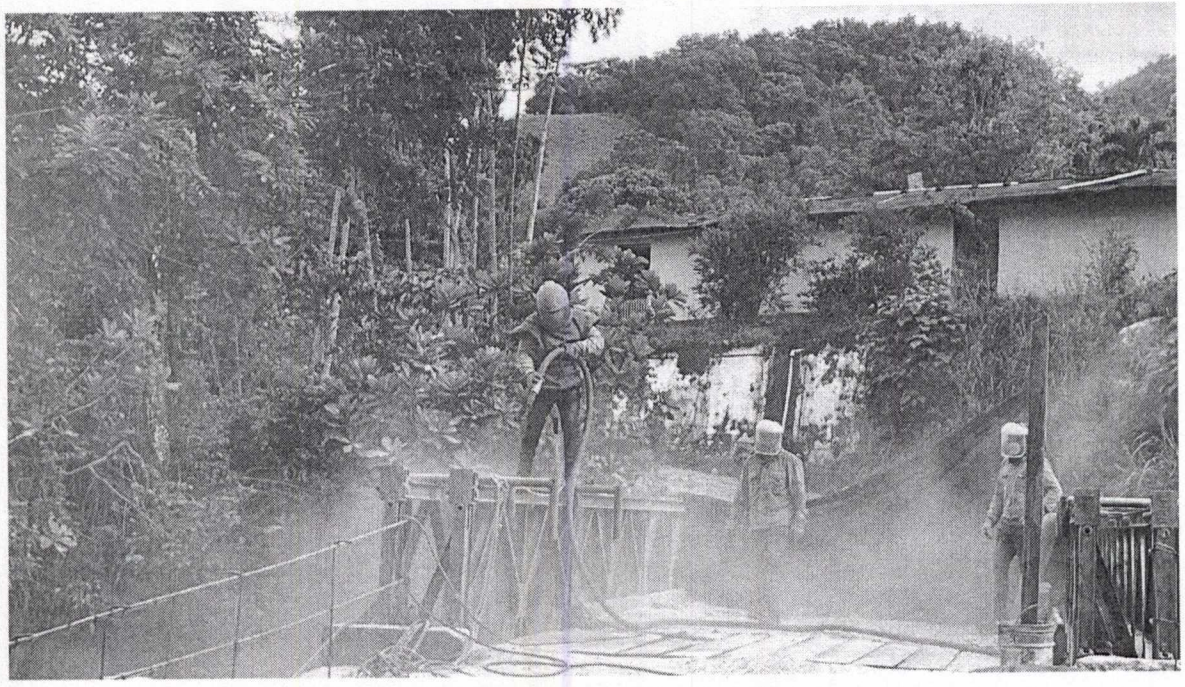

JESVAR
MULTIPROYECTOS S.A.S

## ACTA DE JUSTIFICACION DE IMPREVISTOS


A continuación, se relaciona lo correspondiente al valor cobrado por imprevistos, y las actividades que se ejecutaron, ha de aclararse que estos no dan un mayor valor al contrato, pero que además de justificar lo cobrado se quiere dejar evidencia de lo realizado.

El ítem que se relaciona a continuación y que se encuentra consolidado en la tabla anexa a este documento, va debidamente soportado con su correspondiente análisis de precios unitarios APU, como con su memoria de cantidades. (aquellos que lo requieran).

Es de anotar que la actividad que se realizó es en pro del mejoramiento de la obra y de las zonas circundantes a ella, y se ha llevado a cabo con los mecanismos de seguridad necesarios y con información previa a la alcaldía municipal municipio de arboledas como ente veedor y al ingeniero Fernando barón ingeniero apoyo a la secretaria departamental de gestión del riesgo durante su visita técnica al sitio de trabajo.

DESCRIPCION DE IMPREVISTOS.

Durante la ejecución de las actividades de dragado, para la recuperación de la capacidad hidráulica del rio se encuentra una roca de gran tamaño en el centro de la corriente agua que estaba obstruyendo el flujo normal del mismo y que generaba dos corrientes de agua la cual una de ellas golpeaba a uno de los costados generando una erosión de grandes magnitudes y que estaba colocando expuesto el terreno para una futura remoción en masa.

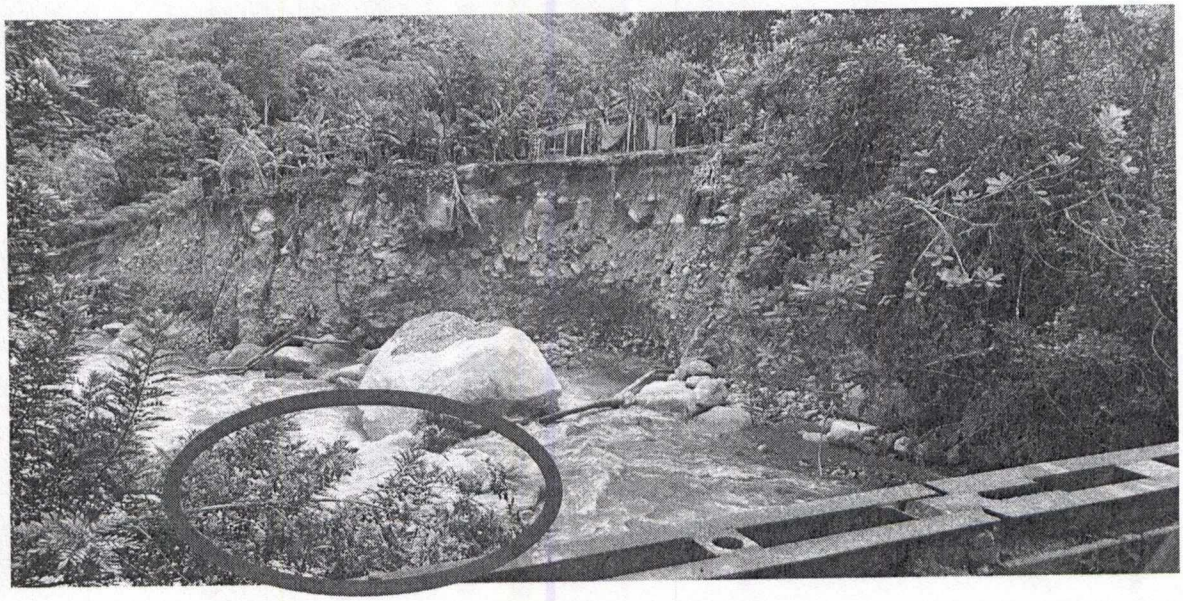



Como se alcanza a ver esa roca de gran tamaño estaba desviando el rio hacia el costado derecho de la imagen y esta provocando esa socavación, por ende se procede a realizar la

actividad de alistamiento y detonación de roca, una vez reventada ese mismo material se procede a acomodar en el vacío generado por la socavación para redireccionar el rio y minimizar el impacto.



Alistamiento de explosivos

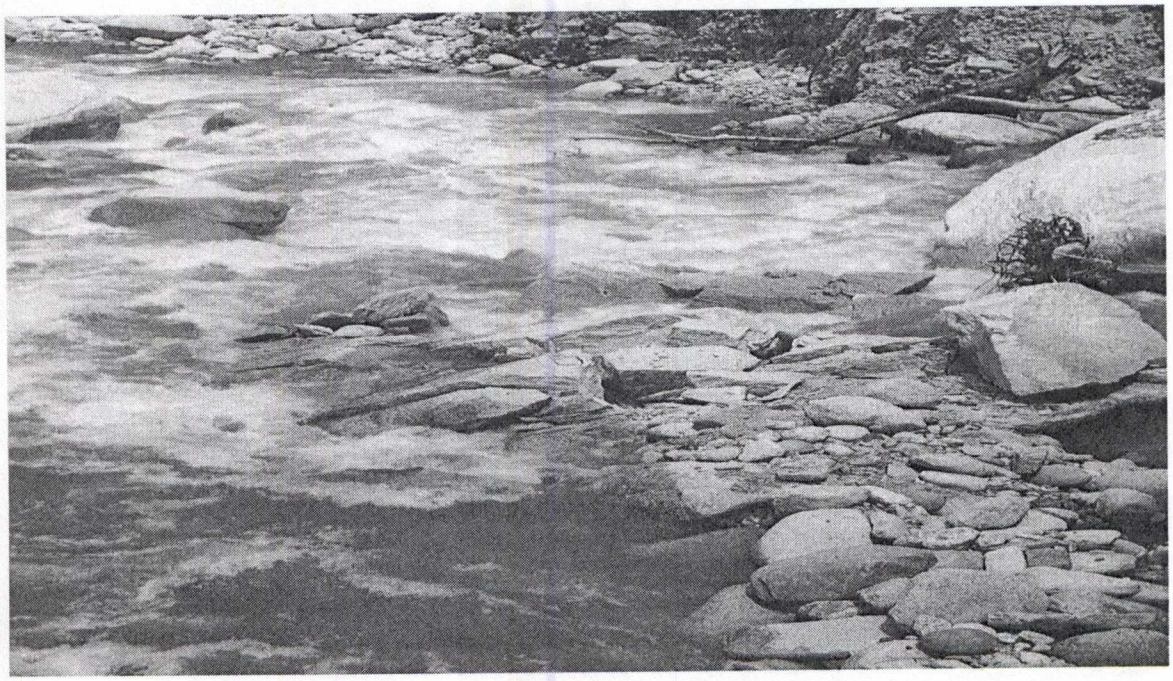

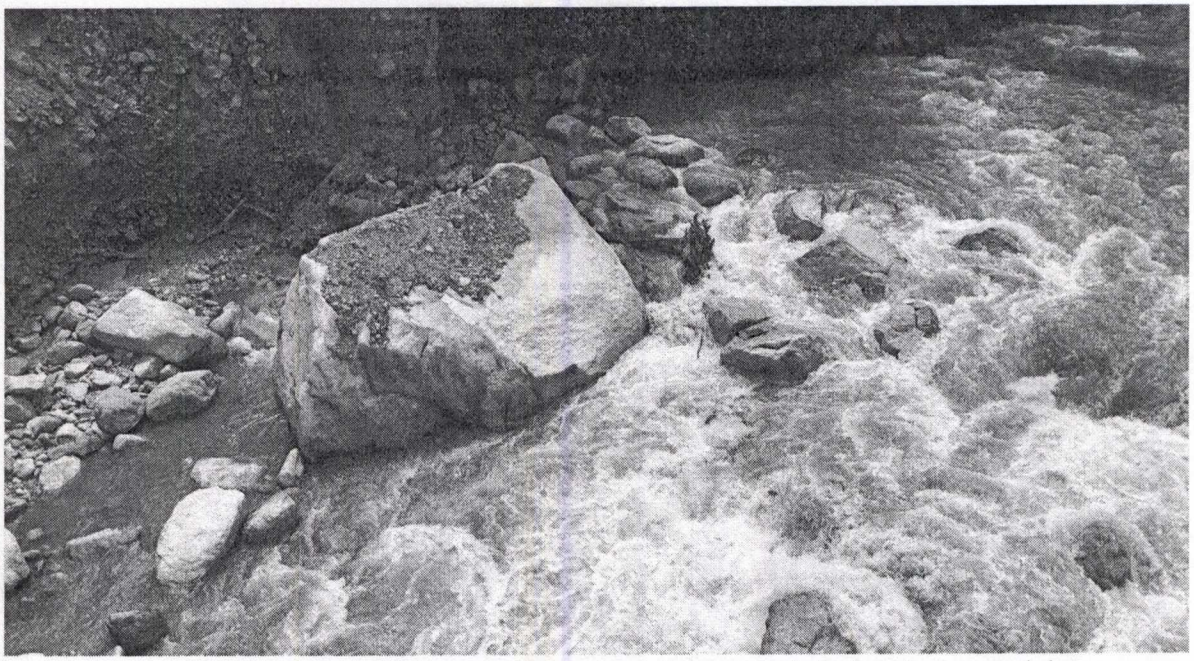

Roca estallada y material acomodado en el vacío mara minimizar impacto del agua

A continuación relaciono ítem y APU del maneo de Alistamiento de Roca con Suministro de puntos de detonación controlada Por indugel 32•2.soap detonación eléctrico y/o anclajes en rocas existentes perforación.
APU.

| | ATENCIÓN Y MANTENIMIENTO DE PUENTE JULIO SOBRE EL RÍO ARBOLEDAS, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE ARBOLEDAS, EN EL MARCO DE LA DECLARATORIA DE CALAMIDAD PUBLICA REALIZADA MEDIANTE DECRETO 001287 DEL 06 DE JUNIO DE 2024 POR EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ITEM | DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD | UND | CANT. | Vr, UNITARIO | Vr, PARCIAL |
| 1 | ALISTAMIENTO DE ROCA CON PUNTOS DE DETONACION | | | | $ 1.567.901 |
| 1,01 | Alistamiento de Roca con Suministro de puntos de detonación controlada Por indugel 32•2.soap detonación eléctrico y/o anclajes en rocas existentes perforación. | UND | 5,1 | $ 305.205 | $ 1.567.901 |
| | | | | | |
| | TOTAL COSTO DIRECTO | | | | $ 1.567.901 |

# JESVAR
MULTIPROYECTOS S.A.S

| | |
|---|---|
| Gobernación de Norte de Santander / SGRD Secretaría para la Gestión del Riesgo de Desastres de Norte de Santander | ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS<br>SECRETARÍA PARA LA GESTIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES |

**ITEM:** **Alistamiento de Roca con Suministro de puntos de detonación controlada Por indugel 32•2.soap** **UNIDAD** **UND**
**detonación eléctrico y/o anclajes en rocas existentes perforación.**

**I. EQUIPO**

| Descripción | Tipo | Tarifa/Hora | Rendimiento | Valor-Unit. | |
|---|---|---|---|---|---|
| Planta Electrica 3 HP, con martillo percusor. | | $ 120.000,00 | 15 | $ 8.000,00 | |
| Mecha perforadorara Acero punta de diamante 1" | | $ 40.000,00 | 15 | $ 2.666,67 | |
| Retroexcavadora sobre oruga, potencia 138 HP, balde de 1,5 m3. | hm | $ 320.000,00 | 3 | $ 106.666,67 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| HERRAMIENTA MENOR (%) | | | 5% | $ 2.055,00 | |
| | | | | **Sub-Total** | 119.388,33 |

**II. MATERIALES EN OBRA**

| Descripción | Unidad | Precio-Unit. | Cantidad | Valor-Unit. | |
|---|---|---|---|---|---|
| AnfoR | kg | $ 75.000,00 | 0,3 | $ 22.500,00 | |
| Cordón Detonante | m | $ 15.400,00 | 3 | $ 46.200,00 | |
| Explosivos 75% INDUGEL | lb | $ 17.641,28 | 0,2 | $ 3.528,26 | |
| Fulminantes | u | $ 6.105,00 | 1 | $ 6.105,00 | |
| Mecha Lenta | m | $ 6.500,00 | 0,3 | $ 1.950,00 | |
| Escolta y Transporte (40%) por cada m3 transportado | % | $ 78.333,26 | 0,4 | $ 31.333,30 | |
| Derechos de explotación y/o disposición de materiales | m3 | $ 50.000,00 | 0,662 | $ 33.100,00 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | **Sub-Total** | 144.716,56 |

**III. TRANSPORTES**

| Material | Vol-peso ó Cant. | Distancia | M3-Km | Tarifa | Valor-Unit. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | **Sub-Total** | 0,00 |

**IV. MANO DE OBRA**

| Trabajador | Descripción | Jornal | Prestaciones | Jornal Total | Rendimiento | Valor-Unit. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C1 = 1O + 1AY | | $ 222.162,75 | $ 188.838,34 | $ 411.001,09 | 10,00 | 41.100,11 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | **Sub-Total** | 41.100,11 |

| | |
|---|---|
| **COSTO DIRECTO** | 305.205,00 |

**JESVAR MULTIPROYECTOS SAS**
**R/L KAREN ALEXANDRA BUITRAGO PAEZ**
CONTRATISTA

JESVAR
MULTIPROYECTOS S.A.S

**FECHA DEL INFORME: 19 de Noviembre del 2023**

| 1. GENERALIDADES DEL CONTRATO DE OBRA | |
|---|---|
| **CONTRATO No. – FECHA** | RE-SGRD-03331-2024 |
| **TIPO DE CONTRATO** | Obra |
| **CONTRATANTE** | Secretaría para la Gestión del Riesgo de Desastres |
| **CONTRATISTA** | JESVAR MULTIPROYECTOS SAS |
| **NIT.** | 9 0 1 4 4 2 4 4 7- 3 |
| **REPRESENTANTE LEGAL** | KAREN ALEXANDRA BUITRAGO PAEZ |
| **IDENTIFICACIÓN** | 1 .090.176.820 |
| **OBJETO DEL CONTRATO** | ATENCIÓN Y MANTENIMIENTO DE PUENTE JULIO SOBRE EL RÍO ARBOLEDAS, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE ARBOLEDAS, EN EL MARCO DE LA DECLARATORIA DE CALAMIDAD PUBLICA REALIZADA MEDIANTE DECRETO 001287 DEL 06 DE JUNIO DE 2024 POR EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER |
| **VALOR TOTAL** | SETECIENTOS CUARENTA Y DOS MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS VEINTISIETE PESOS MTC ( $ 742.955.527,00) |
| **PLAZO O DURACIÓN** | El plazo de ejecución será de dos (2) meses, contados a partir de la firma del acta de inicio. |
| **FORMA DE PAGO** | Se realizara mediante pagos parciales, previa presentación de acta de recibo parcial, memorias de cantidades, factura correspondiente y demás documentos requeridos. |
| **LUGAR DE EJECUCIÓN** | MUNICIPIO DE ARBOLEDAS |
| **DISPONIBILIDAD** | No. 00 000105 de Fecha 18 septiembre de 2024 |
| **INTERVENTOR** | N/A |
| **SUPERVISOR** | **N/A** |

| 3.2 REQUISITOS DE LEGALIZACIÓN | | | |
|---|---|---|---|
| **REQUISITO** | **FECHA** | | |
| Impuesto de timbre | NO APLICA | | |
| | Amparos | Valor asegurado. | Vigencia |
| **Garantía Única.**<br>No. 49-44-101034761 Anexo No.0<br>Aseguradora: Seguros Del Estado S.A.<br>Fecha de Expedición: 01/11/2024<br>Fecha de aprobación: 05/11/2024 | Cumplimiento del Contrato | $74,295,552.70 | 01/11/2024 al 01/07/2025 |
| | Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e Indemnizaciones Laborales | $37,147,776.35 | 01/11/2024 al 01/01/2028 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | Estabilidad y calidad de obra | $74,295,552.70 | 5 AÑOS |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual**<br>No. 49-40-101011106 Anexo No.0<br>Aseguradora: Seguros Del Estado S.A.<br>Fecha de Expedición: 01/11/2024<br>Fecha de aprobación: 05/11/2024 | Predios labores y operaciones | $ 260.000.000 | 01/11/2024 hasta 01/01/2025 |

## AVANCE DE OBRA A LA FECHA

| ITEM | DESCRIPCION | UNID. | V/R. UNIT. | CANT. | VR/PARC. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ESTRUCTURA METALICA | | | | |
| 1,1 | Limpieza de estructura metalica | M2 | $ 205.620,00 | 91,8 | $ 18.875.916,00 |
| 1,2 | Suministro, preparacion y apliacion de fondo anticorrisvo mecanica ( estructuras superiores, interiores y laterales) icluye andamios colgantes | M2 | $ 193.044,00 | 91,8 | $ 17.721.439,00 |
| 1,3 | Suministro e instalacion de pintura esmaltada reflectiva ( incluye andamios colgantes ) | M2 | $ 212.408,00 | 0,0 | $ - |
| 1,4 | Desmonte y retiro de laminas metalicas existentes | UND | $ 563.655,00 | 0,0 | $ - |
| 1,5 | Suministro de tableros de rodadura con de Laminas de piso según diseño. (TIPO U). | UND | $ 1.329.851,00 | 32,0 | $ 42.555.232,00 |
| 1,6 | Instalacion de tableros metalicos para carpeta de rodadura | UND | $ 831.438,00 | 0,0 | $ - |
| 1,7 | Suministro e instalacion de pernos con tuercas presion | UND | $ 36.000,00 | 240,0 | $ 8.640.000,00 |
| 1,8 | Mantenimiento y reparacion de soldadura en conexciones principales y zonas fatigadas de la estructura metalica | M2 | $ 90.237,00 | 48,0 | $ 4.331.376,00 |
| 1,9 | Engrase general de piezas mecanicas moviles y tensores principales. | M2 | $ 202.205,00 | 48,0 | $ 9.705.840,00 |
| | | | SUB TOTAL | | $ 101.829.803,00 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Restauracion y construccion de estribos y muros laterales de proteccion | | | | |
| 2,1 | Excavación mecánica en material tipo grava arcillosa con afloramineto rocoso. Altura superior a 2 m. | M3 | $ 32.969,00 | 80,0 | $ 2.637.520,00 |
| 2,2 | Relleno con material seleccionado de la excavación, incluye compactacion en capas de 30 cm. | M3 | $ 42.073,00 | 0,0 | $ - |
| 2,3 | Acero de refuerzo | Kg | $ 10.385,00 | 180,0 | $ 1.869.300,00 |
| 2,4 | Construccion de barrera de proteccion en concreto ciclopedo 3000 psi para Relleno laterales de muros dosificacion 70-30, incluye sika grout y Sika® Stabilizer-4 R CO. | M3 | $ 998.165,89 | 0,0 | $ - |
| 2,5 | Limpieza de muros con hidroarenado. | M2 | $ 42.000,00 | 168,0 | $ 7.056.000,00 |
| 2,6 | Suministro e instalacion de concreto impermeabilizado para recubrimiento y restauracion de muros. | M2 | $ 36.382,00 | 168,0 | $ 6.112.176,00 |
| 2,7 | Cargue y retiro de material de construccion. | M3 | $ 39.448,00 | 0,0 | $ - |
| 2,8 | zarpa en concreto de 4000 psi para barrera de construuccion | m3 | $ 1.419.525,00 | 0,0 | $ - |
| | | | SUB TOTAL | | $ 17.674.996,00 |
| 3 | OBRAS COMPLEMENTARIAS | | | | |
| 3,1 | Dragado mecanico de cauce natural (Ampliacion de la seccion hidrahulica aguas arriba y aguas abajo ) 55 metros aguas arriba y 55 metros aguas abajo * 2m*3m | M3 | $ 45.076,00 | 660,0 | $ 29.750.160,00 |
| 3,2 | Manejo de aguas (Incluye Bombas, planta electrica) | Dia | $ 538.226,00 | 14,0 | $ 7.535.164,00 |
| | | | SUB TOTAL | | $ 37.285.324,00 |
| | | | COSTO DIRECTO | | $ 156.790.123,00 |
| | ADMINISTRACION | | 23% | 23% | $ 36.061.728 |
| | IMPREVISTO | | 1% | 1% | $ 1.567.901,23 |
| | UTILIDAD | | 6% | 6% | $ 9.407.407,38 |
| | COSTO TOTAL AIU | | | | $ 47.037.036,90 |
| | COSTO TOTAL | | | | $ 203.827.159,90 |

**AVANCE DE OBRA:** SE PRESENTA UN AVANCE DE OBRA DEL 27.43% A LA FECHA DE ESTE INFORME

**OBSERVACIONES:** se han realizado actividades dentro del periodo comprendido del 8 de noviembre al 19 de noviembre de 2024 en la estructura metálica del puente julio ubicado sobre el corredor vial entre el municipio de arboledas y cucutilla.

Se iniciaron con los trabajos de dragado para buscar aumentar la capacidad hidráulica del rio ya que por las fuertes precipitaciones y ante la cantidad de material represado allí el rio tiende a desbordarse, se empleó una retroexcavadora sobre oruga realizando labores de 8 horas diarias laboradas con un rendimiento optimo garantizando la calidad de trabajo, aguas arriba y aguas abajo.

De igual forma se inician con actividades para la restauración y mantenimiento de la estructura metálica del puente tipo militar de 18 ml de longitud por 5.1 m de ancho, se evidencia que sobre el tablero de rodadura se encuentra una capa de aproximadamente 50cm de espesor de diferentes tipos de materiales que se adhirieron a los tableros de rodadura, ya que este llevaba mas de 30 años si realizarles limpieza ni retiro de sedimentos o residuos de asfalto o concreto rígido.

JESVAR
MULTIPROYECTOS S.A.S

Se realiza extracción de un tablero metálico tipo guía de 6 metros de longitud tipo U para empezar la construcción y ensamble de los nuevos donde a la fecha ya se tienen 32 tableros listos para instalar pero se requiere contar con buen clima para el manejo de equipos de soldadura

Por medio de un sistema de hidro arenado o samblasteado, se procede a retirar suciedades y materiales adheridos para después empezar con las actividades de instalación de pintura anticorrosiva.
A la fecha el rendimiento que se lleva a cabo es idóneo y acorde a lo estimado dentro de lo establecido del contrato pues por medio de la presente acta se realiza un cobro con un porcentaje del 27.43% y un tiempo transcurrido de 14 días de 60 estipulados para un porcentaje en tiempo del 23.33%.

***KAREN ALEXANDRA BUITRAGO PAEZ***
R/L: JESVAR MULTIPROYECTOS S.A.S
CONTRATISTA


JESVAR
MULTIPROYECTOS S.A.S


REGISTRO FOTOGRAFICO




JESVAR
MULTIPROYECTOS S.A.S


1. ACTIVIDADES DE DRAGADO

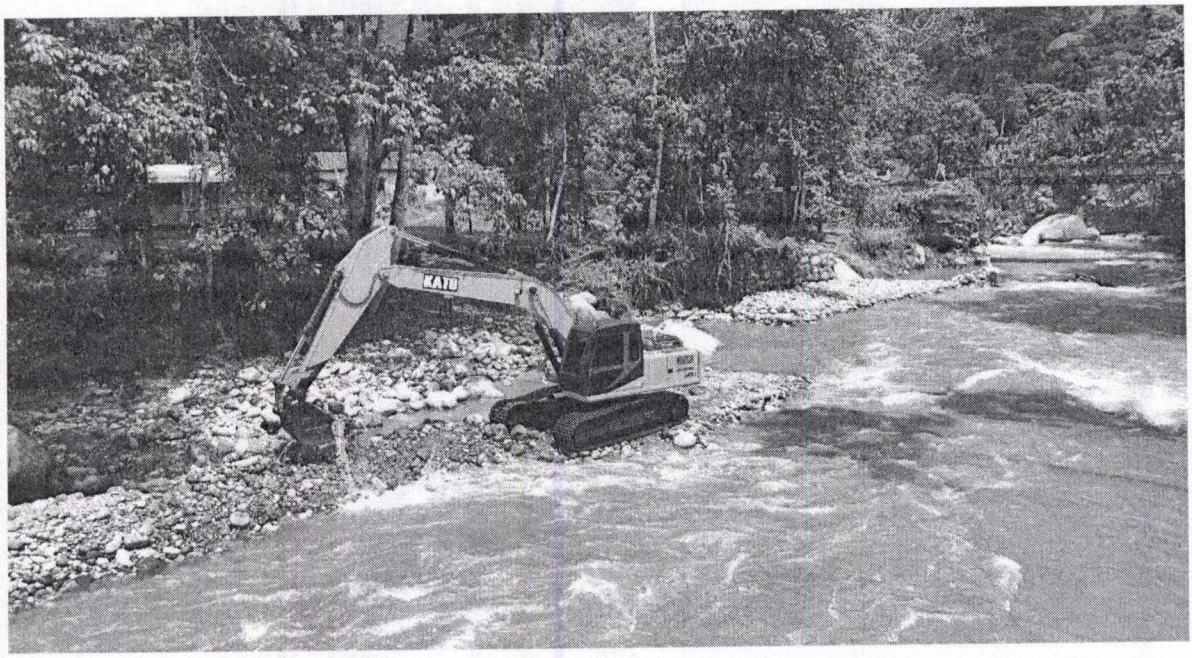
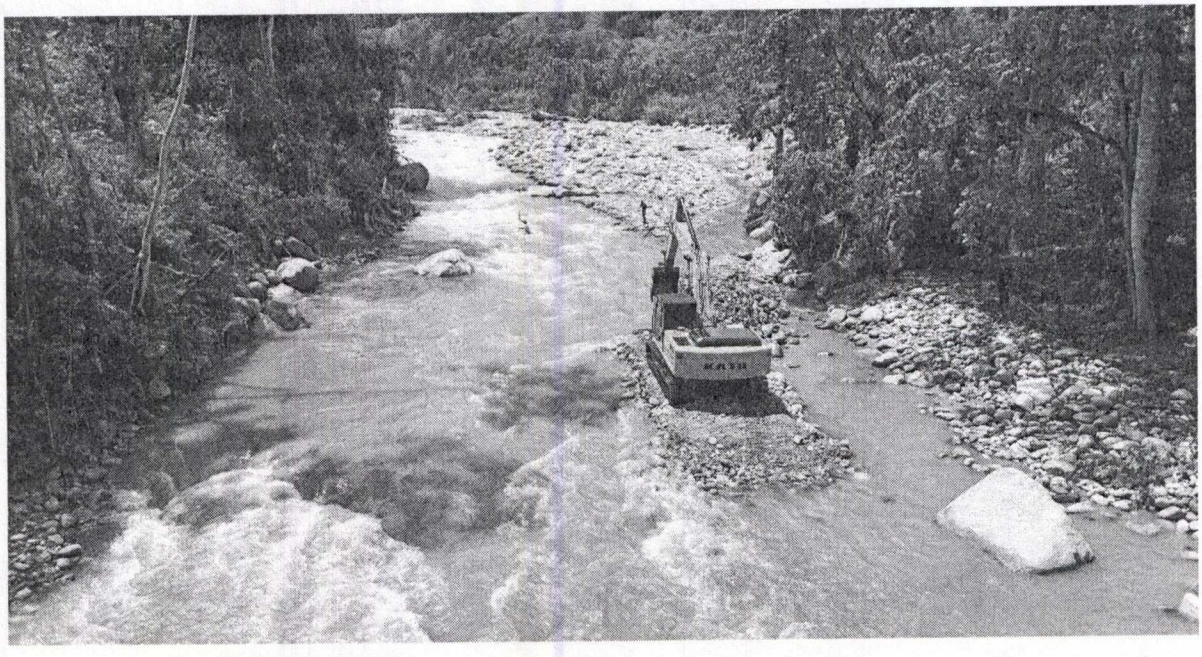
# JESVAR
MULTIPROYECTOS S.A.S




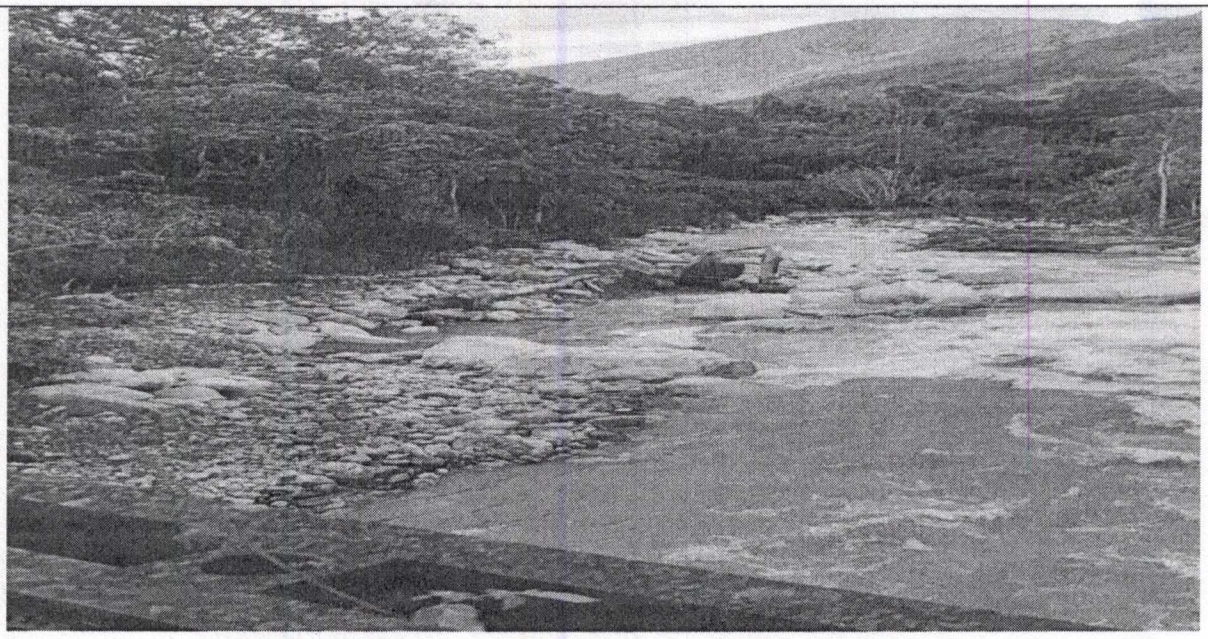


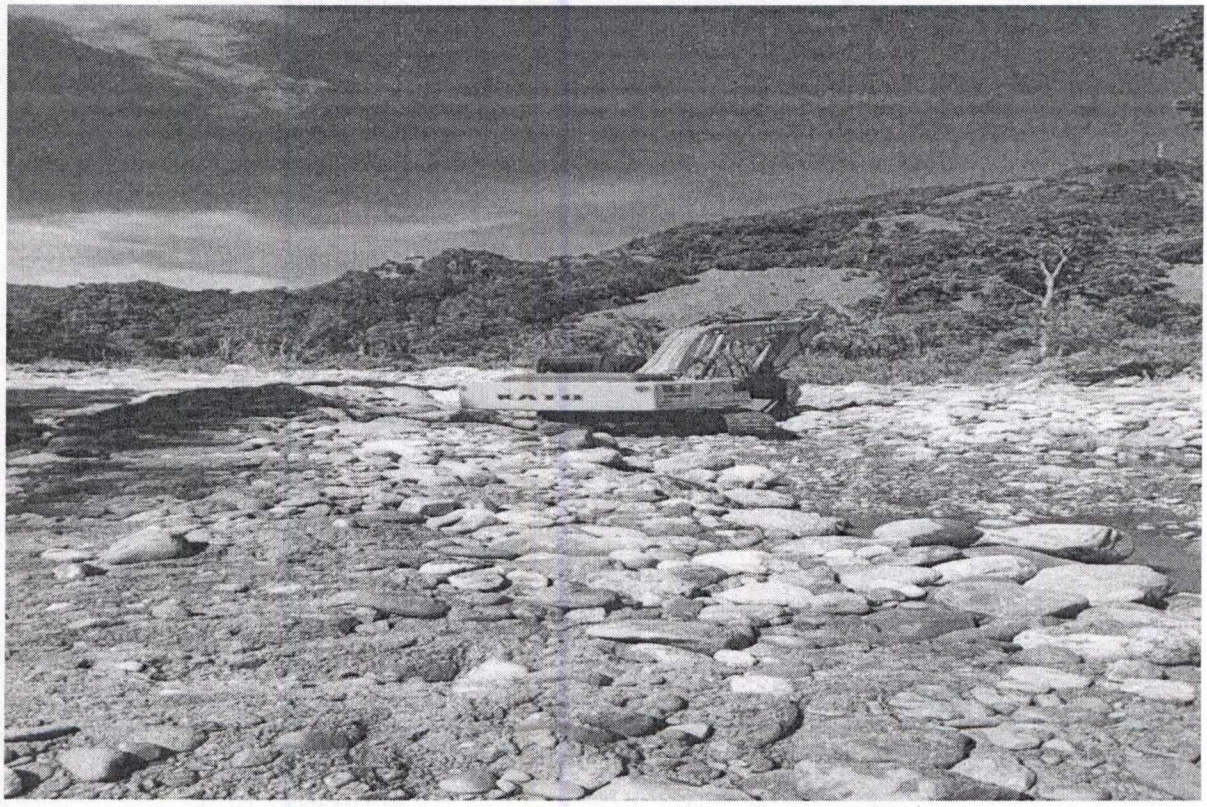*Cl. 10 No 8-56 OFI 201 El llano Cel. 3156232869 mail jesvarmultiproyectos@gmail.com*
*Cúcuta – Colombia.*

JESVAR
MULTIPROYECTOS S.A.S

2. ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO ESTRUCTURA METALICA

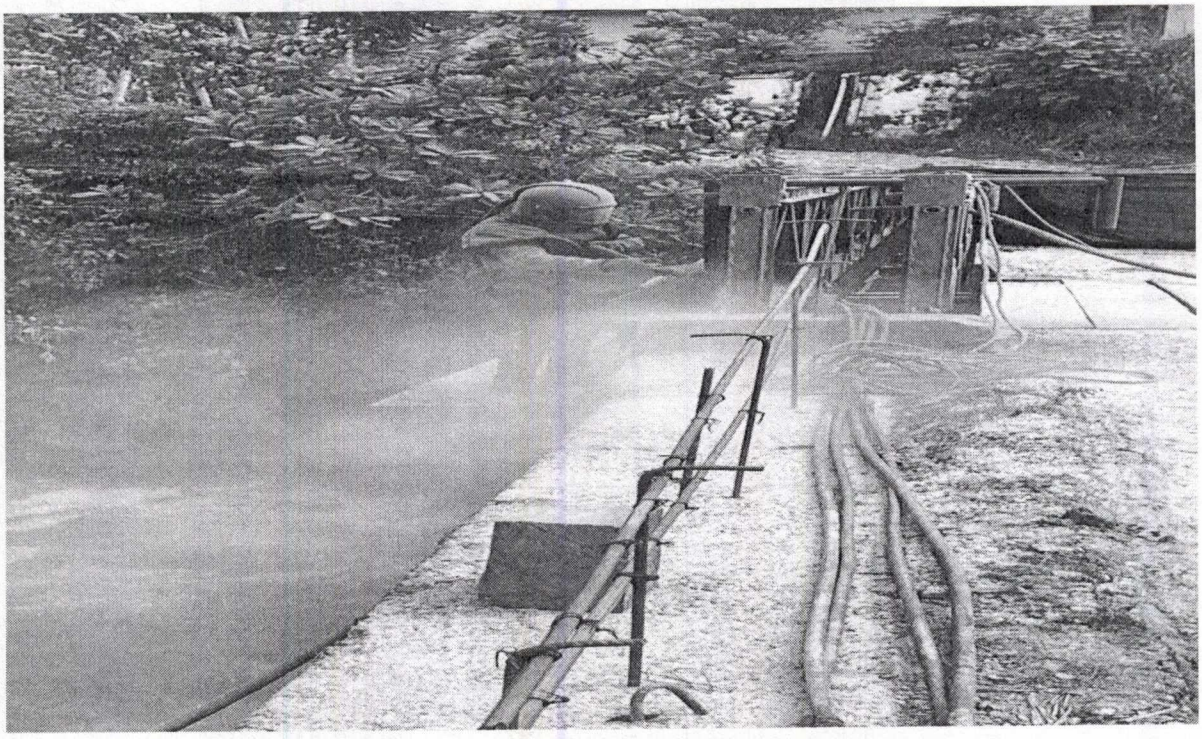

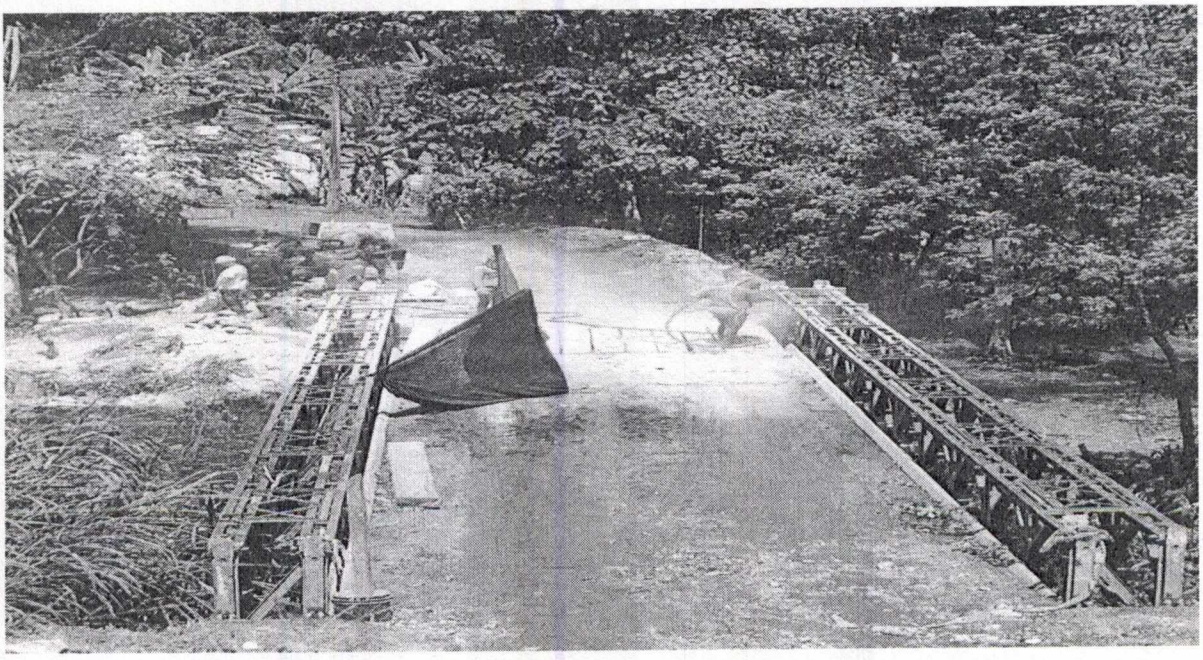


# JESVAR
MULTIPROYECTOS S.A.S







*Cl. 10 No 8-56 OFI 201 El llano Cel. 3156232869 mail jesvarmultiproyectos@gmail.com*
*Cúcuta – Colombia.*


JESVAR
MULTIPROYECTOS S.A.S

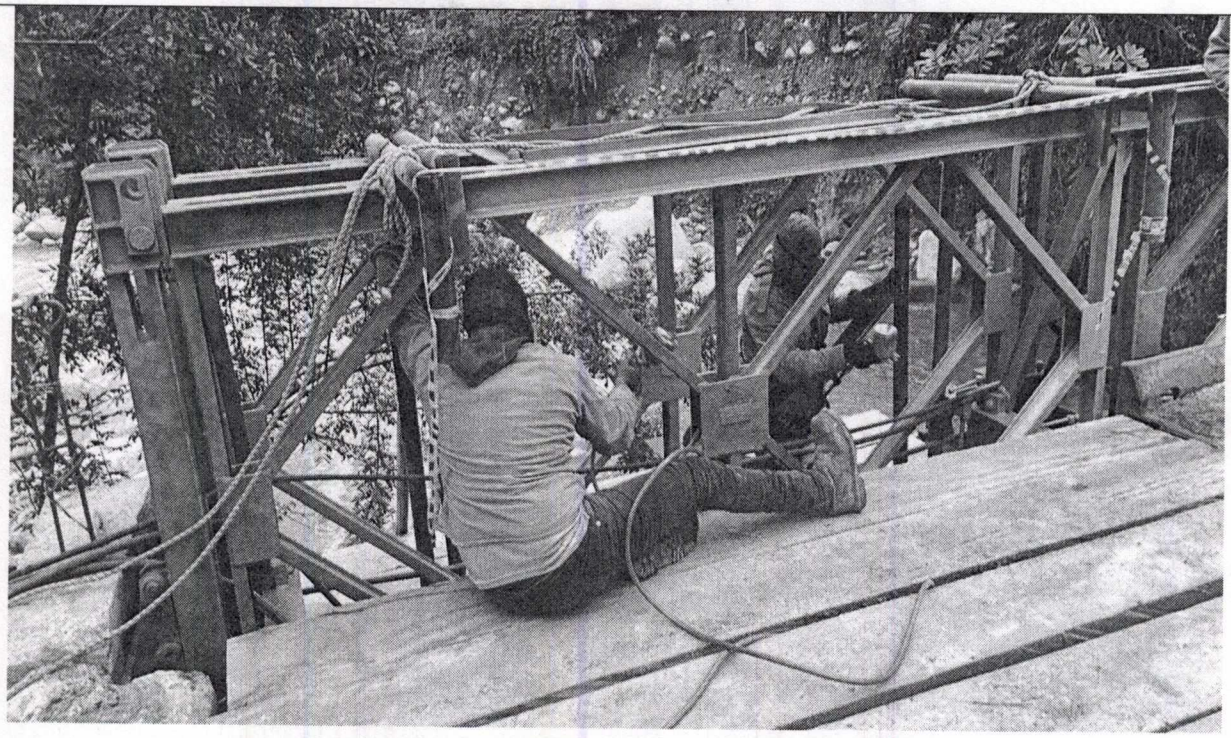

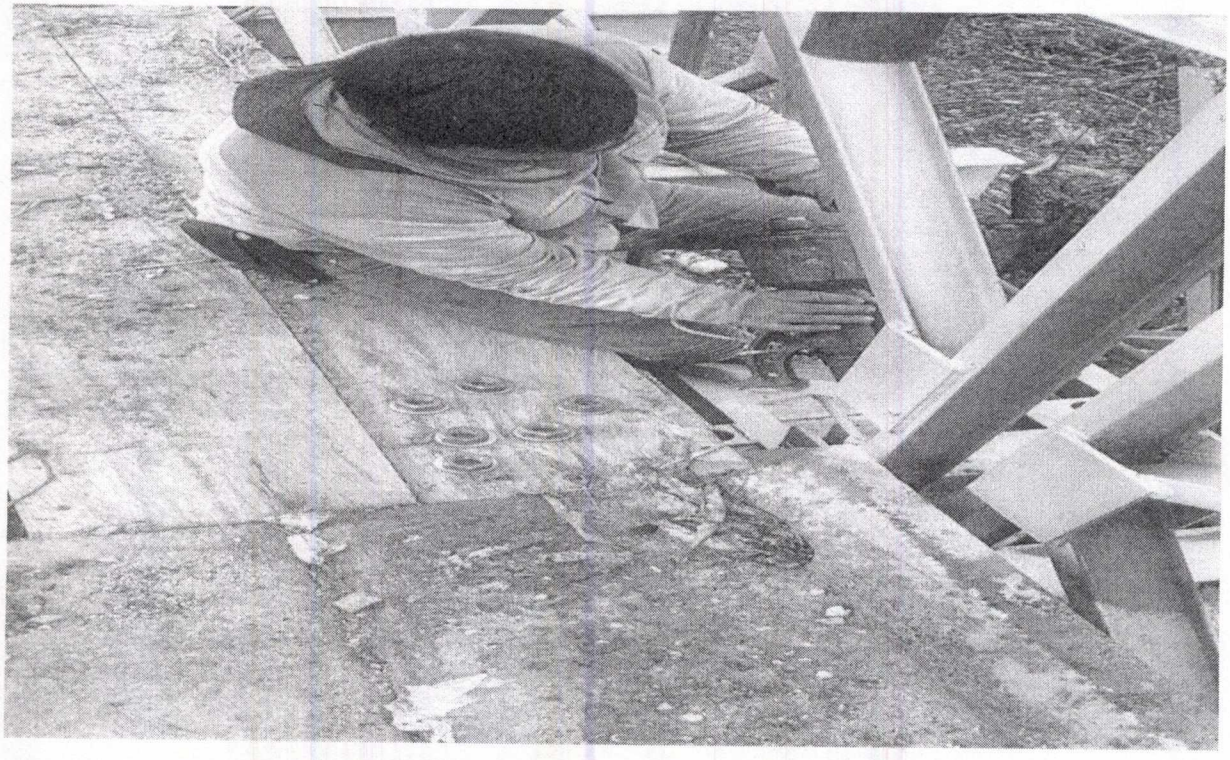


Cl. 10 No 8-56 OFI 201 El llano Cel. 3156232869 mail jesvarmultiproyectos@gmail.com
Cúcuta – Colombia.

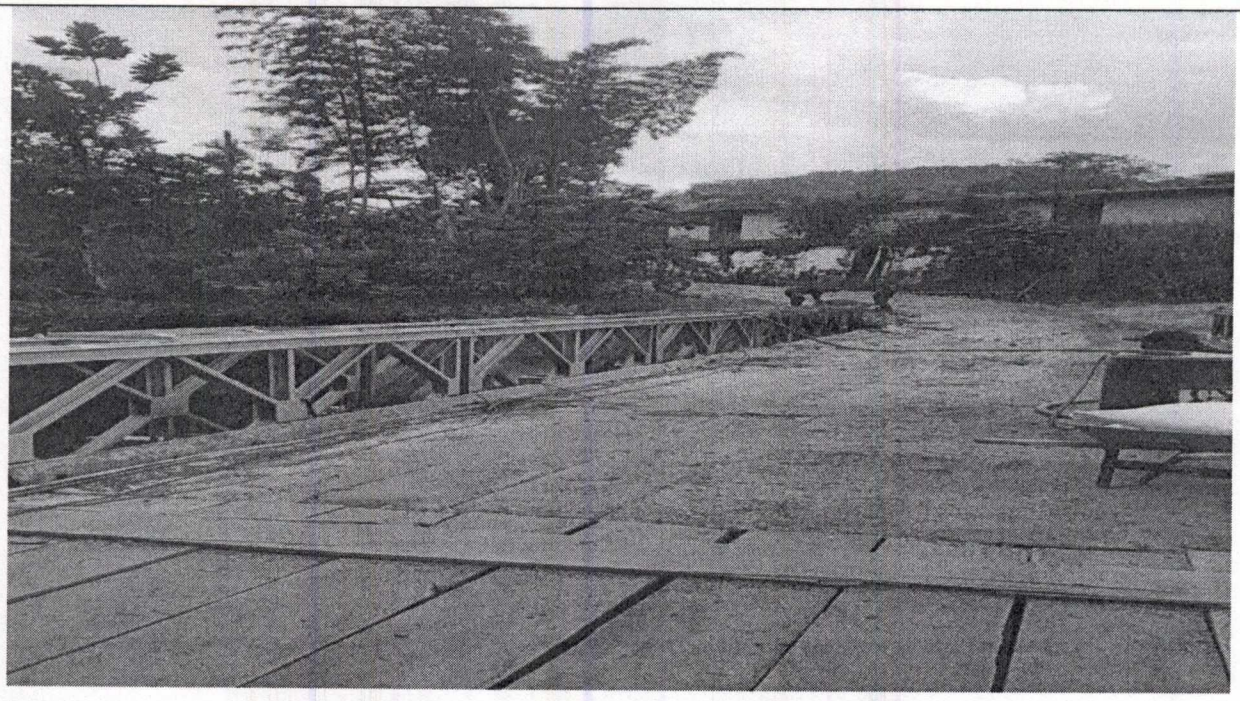


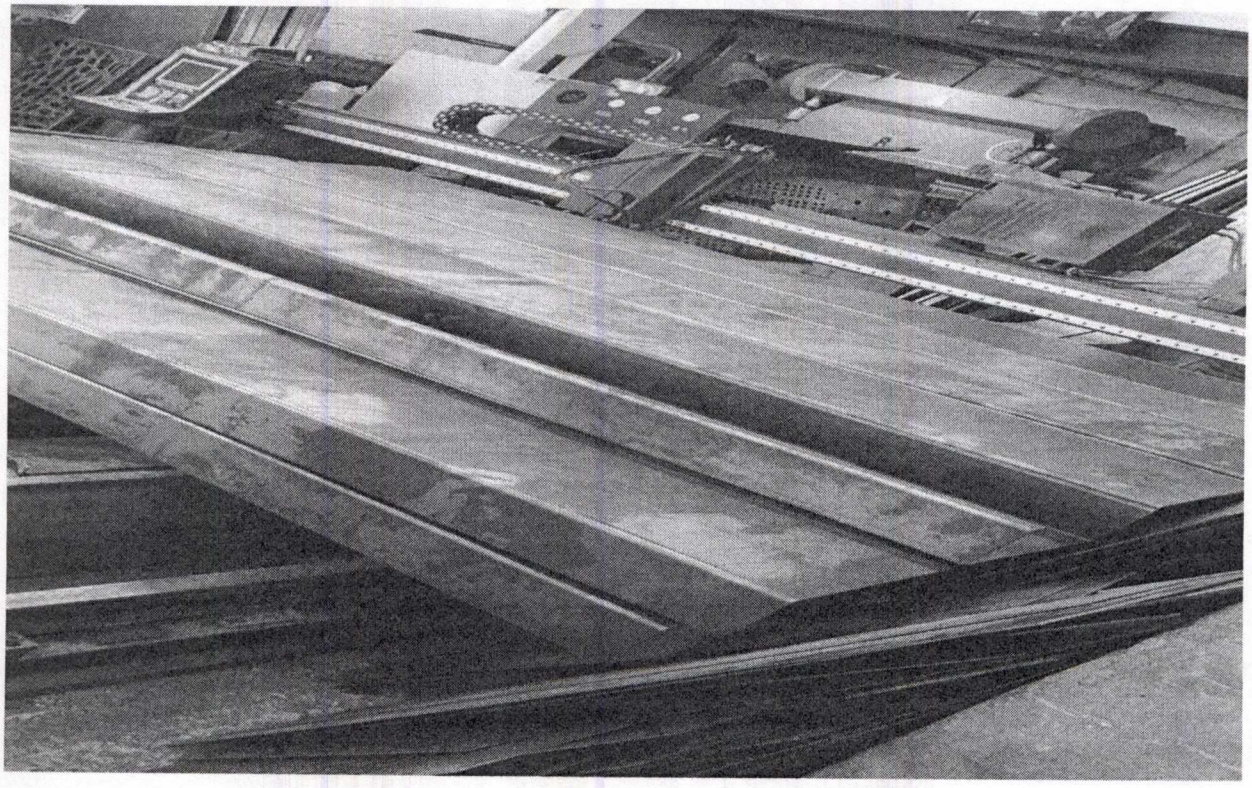

3. RESTAURACION Y COSTRUCCION DE MUROS Y ESTRIBOS


JESVAR
MULTIPROYECTOS S.A.S

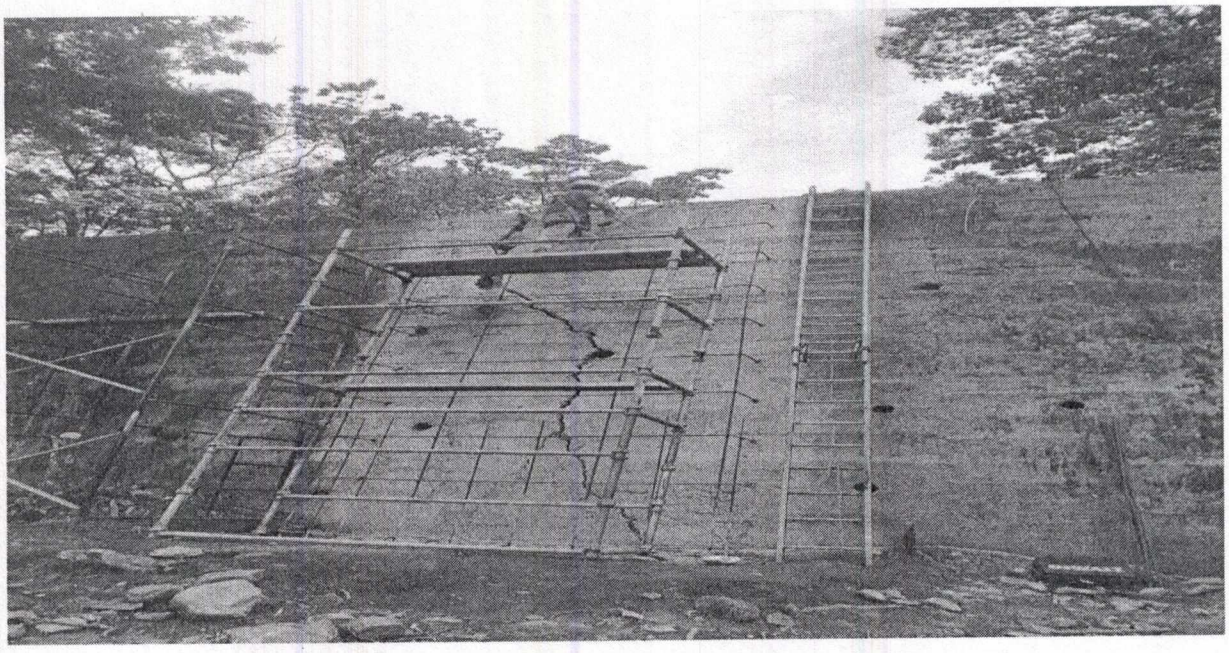


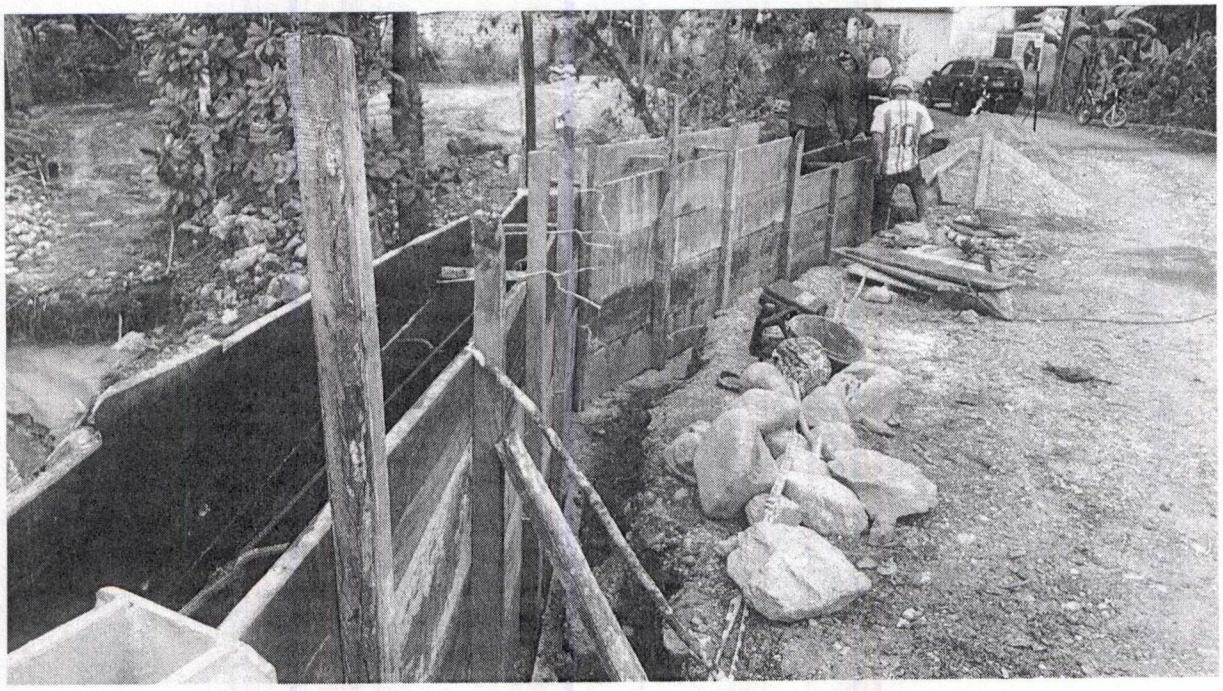

*Cl. 10 No 8-56 OFI 201 El llano Cel. 3156232869 mail jesvarmultiproyectos@gmail.com*
*Cúcuta – Colombia.*


JESVAR
MULTIPROYECTOS S.A.S

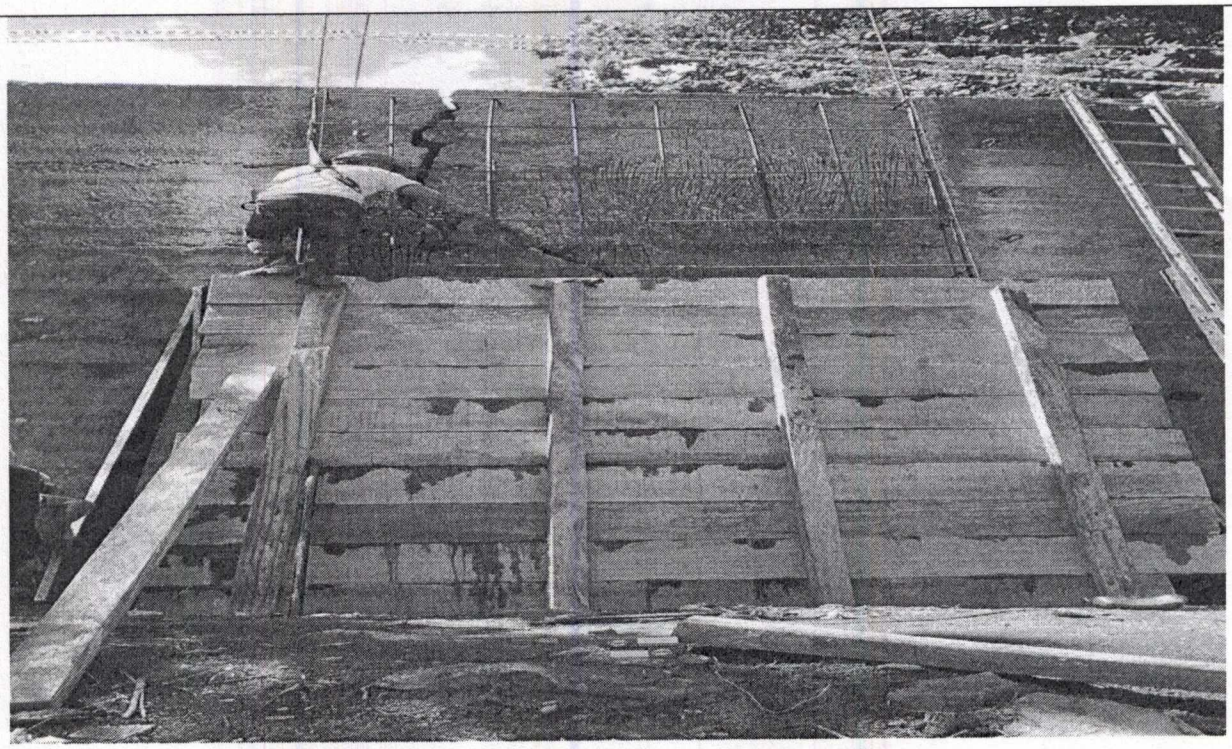

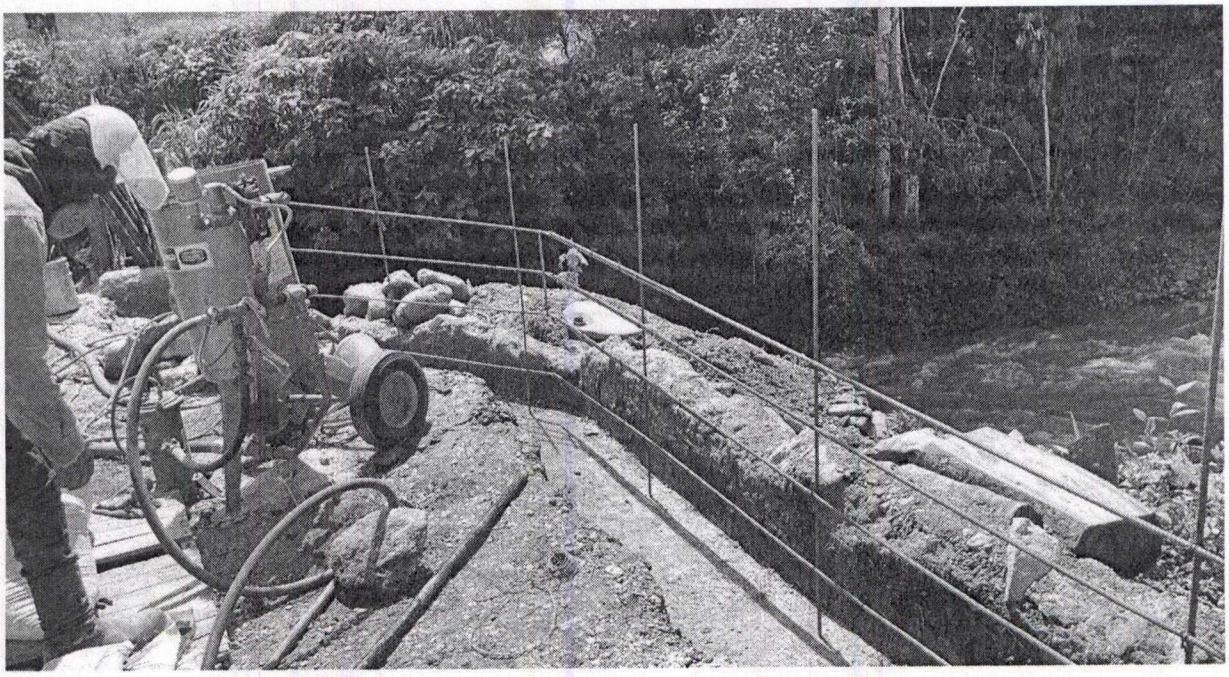

Cl. 10 No 8-56 OFI 201 El llano Cel. 3156232869 mail jesvarmultiproyectos@gmail.com
Cúcuta – Colombia.

JESVAR
MULTIPROYECTOS S.A.S

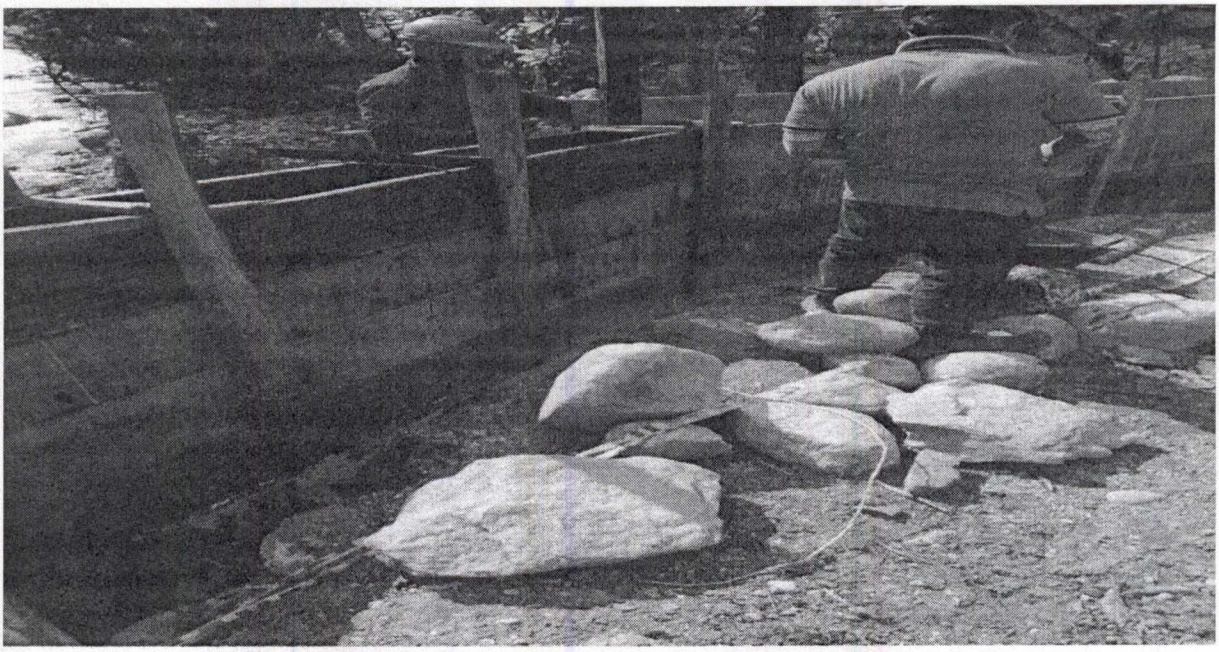



*Cl. 10 No 8-56 OFI 201 El llano Cel. 3156232869 mail jesvarmultiproyectos@gmail.com*
*Cúcuta – Colombia.*
