ESE Hospital Regional de Duitama

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
HOSPITAL REGIONAL DE DUITAMA

ORDEN DE PAGO

2024 03 14 280.768.918,00

CONSORCIO MEJORAMIENTO HOSPITALARIO 2023

DOSCIENTOS OCHENTA MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS DIECIOCHO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

ORDENADOR DEL GASTO

SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

TESORERO

CHEQUE:

BANCO: BANCO CAJA SOCIAL S.A.

RECIBÍ: CONSORCIO MEJORAMIENTO HOS

C.C. O NIT:

IMPUTACIÓN CONTABLE

CÓDIGO	DETALLE		MOVIMIENTO
11100601	Bco Caja Social Cta 26504943391	0,00	280.768.918,00
24010101	PAGO PROVEEDORES BIENES Y SERVICIOS	280.768.918,00	0,00

ORDEN DE PAGO GENERADA

Consecutivo	Rubro	Nombre	Valor
565	2.1.2.02.02.008.04	MANTENIMIENTO	287.369.519,00

Detalle: PAGO FAC PEV7 SE AMORTIZA EL 30%, QUEDANDO AMORTIZADA LA TOTALIDAD DEL ANTICIPO POR REPOR ZAMIENTO DE ESTRUCTURA DE CUBIERTA, CAMBIO DE CUBIERTA, MANTENIMIENTO A LA PINTURA DE FACHADAS Y MEJORAS PARA LA CARPINTERIA METALICA DE LA ESE HRD, S/G ADICION No. 01 DE 2024 AL CONTRATO No. 004 DE 2023 .

CONTRATO DE OBRA No. 004 DE 2023

CIUDAD Y FECHA	DUITAMA 14 de Marzo de 2024
ACTA No.	06 Mes MARZO
OBJETO	REFORZAMIENTO DE ESTRUCTURA DE CUBIERTA, CAMBIO DE CUBIERTA, MANTENIMIENTO A LA PINTURA DE FACHADAS Y MEJORAS PARA LA CARPINTERÍA METÁLICA DE LA E.S.E HOSPITAL REGIONAL DE DUITAMA
CONTRATISTA	CONSORCIO MEJORAMIENTO HOSPITALARIO 2023 R/L. GERARDO IVÁN MÁRQUEZ RINCÓN
NIT/CC	NIT. 901729479-2 R/L. C.C. 1.049.638.664 DE TUNJA
CDP (No. CDP, código, nombre y Fecha de expedición)	No. 557 del diecisiete (17) de mayo de dos mil veintitrés (2023) RUBRO 2.1.2.02.02.008.04 MANTENIMIENTO
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	TRES MIL SETECIENTOS VEINTE MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS M/CTE. ($3.720.757.472)
DURACIÓN DEL CONTRATO	CINCO (5) MESES
REGISTRO PRESUPUESTAL (No RP. rubro, nombre y Fecha de expedición)	No. 1149 del doce (12) de julio de dos mil veintitrés (2023) RUBRO 2.1.2.02.02.008.04 MANTENIMIENTO
FECHA DE SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO	24 de julio de 2023
FECHA DE TERMINACIÓN	31 de diciembre de 2023
SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES	9455018050
CARGO DE SUPERVISOR	Subgerente Administrativa
VALOR ADICIÓN 1	Novecientos setenta y seis millones seis cientos once mil cuatrocientos cincuenta pesos ($ 976.611.450)
CDP (No. CDP, código, nombre y Fecha de expedición)	331 del 30 de enero de 2024, rubro 212020200804 Mantenimiento
REGISTRO PRESUPUESTAL (No RP. rubro, nombre y Fecha de expedición)	391 del 09 febrero de 2024
VALOR ADICIÓN 2	N.A.
CDP (No. CDP, código, nombre y Fecha de expedición)	N.A.
REGISTRO PRESUPUESTAL(No RP. rubro, nombre y Fecha de expedición)	N.A.
VALOR ADICIÓN 3	N.A.
CDP (No. CDP, código, nombre y Fecha de expedición)	N.A.

Este documento es propiedad de la Empresa Social del Estado Hospital Regional de Duitama.
Su reproducción es estará dada por el líder del proceso de gestión de calidad

REGISTRO PRESUPUESTAL (No RP. rubro, nombre y Fecha de expedición)	N.A.
MODIFICACION EN VALOR 1	N.A.
MODIFICACION EN VALOR 2	N.A.
VALOR FINAL DEL CONTRATO	CUATRO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SIETE MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS VEINTIDOS PESOS M/CTE. ($4.697.378.922)
PRORROGA 1	*SIETE (7) DIAS CALENDARIO*
PRORROGA 2	30 días calendario
PRORROGA 3	61 días calendario
PLAZO TOTAL DEL CONTRATO	8 MESES y OCHO (8) DIAS CALENDARIO

ESTADO FINANCIERO:

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	*$ 3.720.757.472,00*	
VALOR ADICION (SI HAY LUGAR A ELLO)	*$ 976.611.450*	
VALOR REDUCCIONES	*$ 0,00*	
VALOR TOTAL DE PAGOS ANTERIORES A LA PRESENTE ACTA		*$ 3.800.977.182,00*
VALOR A PAGAR PRESENTE ACTA		*$426.637.045,00*
SALDO A EJECUTAR		*$ 426.637.045,00*
SUMAS IGUALES	***$ 4.697.378.922,00***	***$ 4.697.378.922,00***

Las cantidades y valores consignados en la presente acta son responsabilidad exclusiva del contratista o supervisor y/o interventor, el pago de la presente acta se realizará con base en el principio de confiabilidad y responsabilidad con el que el supervisor y contratista realizan los pagos parciales de acuerdo a la ejecución establecida en el contrato

En constancia se firma a los 14 días del mes de Marzo del año 2024

FIRMA DEL CONTRATISTA
CONSORCIO MEJORAMIENTO HOSPITALARIO 2023
R/L. GERARDO IVÁN MÁRQUEZ RINCÓN

CONTRATISTA

FIRMA DEL SUPERVISOR
Erika Natalia Sánchez Medina

SUPERVISORA HRD

ANEXOS:

- Acta parcial suscrita por el supervisor y contratista en dos copias.
- Factura o cuenta de cobro en original y copia.
- Informe de avance y seguimiento de actividades del mes firmado por el contratista y el supervisor en dos copias.
- Soporte de Planilla de Seguridad Social del correspondiente al mes facturado en dos copias.
- Para el caso de cesiones, se debe anexar copia de acta de cesión y Registro de Compromiso Presupuestal

Este documento es propiedad de la Empresa Social del Estado Hospital Regional de Duitama.
Su reproducción es estará dada por el líder del proceso de gestión de calidad

CONSORCIO MEJORAMIENTO HOSPITALARIO 2023
NIT 901.729.479-2
FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N° FEV 7

	SERVICIOS DE INGENIERIA LOGISTICA 40% REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION	JORGE ALBERTO VILLAMIL MORA 60%	TOTAL CONSORCIO
Acta parcial N° 06 contrato 004-2023	131.272.936,93	196.909.405,39	328.182.342,32
Administración 20%	26.254.587,38	39.381.881,08	65.636.468,46
Imprevistos 5%	6.563.646,85	9.845.470,27	16.409.117,12
Utilidad 5%	5.515.669,61	8.273.504,42	13.789.174,03
SUBTOTAL	**169.606.840,77**	**254.410.261,16**	**424.017.101,93**
IVA 19%	1.047.977,23	1.571.965,84	2.619.943,07
TOTAL FACTURA	**170.654.818,00**	**255.982.227,00**	**426.637.045,00**
RF RENTA CONTRATOS OBRA 2%	0,00	5.088.205,00	5.088.205,00
RF IVA	157.196,00	235.795,00	392.991,00
RF ICA 4,4 X 1000	0,00	1.119.405,00	1.119.405,00
SUBTOTAL	**170.497.622,00**	**249.538.822,00**	**420.036.444,00**
Amortizacion 30%			139.267.526,00
NETO A PAGAR		Son	**280.768.918,00**

NOTA: NO SE REALIZA RF ICA NI RF RENTA A CONSORCIADO SERVICIOS DE INGENIERIA LOGISTICA POR SER DEL REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION.

VALOR OBLIGACION PRESUPUESTAL (V/R FACTURA MENOS ANTICIPO) Pie **287.369.519,00**

NOTA: SE CAUSA 100% EN CXP Y SE CRUZA EL ANTICIPO EN PRESUPUESTO, PERO EN CONTABILIDAD NOS TOCA HACERLE EL TRASLADO DESDE PAGOS- UTILIDADES - TRASLADOS, APLICANDO EL ANTICIPO A LA CXP.

Contadora ESE HLD

TRASLADO

Consecutivo: 44 **Fecha:** 14/03/2024 **Estado:** Confirmado

Tercero: NIT - 901729479 - CONSORCIO MEJORAMIENTO HOSPITALARIO 2023

Anticipo: 0000002562

Cuenta contable: 19060401 - Anticipo para adquisición de Bienes y servicios

Centro de costos:

Observaciones: SE AMORTIZA SALDO ANTICIPO DE $139.267.526 SOBRE LA CXP DE FRA FEV7

CUENTAS POR PAGAR

Cuenta por pagar	Cuenta contable	Centro de costos	Valor
FEV7	24010101 - BIENES Y SERVICIOS		$ 139.267.526,00

CUENTA POR PAGAR

Consecutivo: 41966 **Factura:** FEV7 **Estado:** Confirmado
Tercero: Nit - 901729479 - CONSORCIO MEJORAMIENTO HOSPITALARIO 2023
Proveedor: 901729479 - CONSORCIO MEJORAMIENTO HOSPITALARIO 2023
Fecha: 14/03/2024 **Fecha Vencimiento:** 13/04/2024 **Plazo:** 30 Días
Cuenta: 24010101 - BIENES Y SERVICIOS
Valor: $ 420.193.640,00

Valor: CUATROCIENTOS VEINTE MILLONES CIENTO NOVENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS CUARENTA PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Observaciones: REFORZAMIENTO DE ESTRUCTURA DE CUBIERTA, CAMBIO DE CUBIERTA, MANTENIMIENTO A LA PINTURA DE FACHADAS Y MEJORAS PARA LA CARPINTERIA METALICA DE LA ESE HOSPITAL REGIONAL DE DUITAMA, SEGUN CONTRATO DE OBRA 004 - 2023 ACTA PARCIAL 06 DEL 14/03/2024

CONCEPTOS

Concepto	Cuenta	Centro	Naturaleza	Valor
Valor Base de Retención				
0241 - MANTENIMIENTO- ADMINISTRACION	51111501	321-1	Debito	$ 33.235.819,00
0241 - MANTENIMIENTO- ADMINISTRACION	51111501	372-1	Debito	$ 44.313.034,00
0241 - MANTENIMIENTO- ADMINISTRACION	51111501	373-1	Debito	$ 6.413.667,00
0241 - MANTENIMIENTO- ADMINISTRACION	51111501	361-1	Debito	$ 31.562.858,00
0262 - MANTENIMIENTO - CUIDADOS INTENSIVOS UCI	73210215	241-1-3	Debito	$ 41.452.689,00
0257 - MANTENIMIENTO- HOSPITALIZACION GENERAL	73200215	241-1-4	Debito	$ 45.877.579,00
0257 - MANTENIMIENTO- HOSPITALIZACION GENERAL	73200215	241-1-6	Debito	$ 49.180.250,00
0257 - MANTENIMIENTO- HOSPITALIZACION GENERAL	73200215	241-1-7	Debito	$ 82.624.120,00
0257 - MANTENIMIENTO- HOSPITALIZACION GENERAL	73200215	241-1-10	Debito	$ 9.192.358,00
0257 - MANTENIMIENTO- HOSPITALIZACION GENERAL	73200215	241-1-11	Debito	$ 42.801.741,00
0241 - MANTENIMIENTO- ADMINISTRACION	51111501	351-1	Debito	$ 6.783.131,00
0241 - MANTENIMIENTO- ADMINISTRACION	51111501	314-1	Debito	$ 12.239.856,00
0241 - MANTENIMIENTO- ADMINISTRACION	51111501	401-1	Debito	$ 6.250.916,00
0241 - MANTENIMIENTO- ADMINISTRACION	51111501	171-1	Debito	$ 5.576.343,00
0241 - MANTENIMIENTO- ADMINISTRACION	51111501	391-1	Debito	$ 9.132.684,00
0907 - RF. IVA REG COMUN	24362501		Credito	$ 235.795,00

ESE HOSPITAL REGIONAL DE DUITAMA

891855438

Fecha Actual : jueves, 14 marzo 2024

NOTA DE PAGOS

Consecutivo : 3046 **Estado :** Confirmado

Tercero: 901729479 CONSORCIO MEJORAMIENTO HOSPITALARIO 2023

Proveedor: 901729479 CONSORCIO MEJORAMIENTO HOSPITALARIO 2023

Fecha de la Nota : 14/03/2024 3:09:36 p. m. **Naturaleza de la Nota :** Debito

Valor : $ 157.196,00

Detalle : PARA AJUSTAR RF IVA, SOLO SE REALIZO RF SOBRE EL 60% Y DEBE SER SOBRE EL 100%

Son :CIENTO CINCUENTA Y SIETE MIL CIENTO NOVENTA Y SEIS PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

DESCRIPCIÓN DE CONCEPTOS

Concepto	Cuenta	Centro	Nombre de la cuenta	Naturaleza	Valor
0007 AJUSTE R.F IVA	24362501		RF IVA REGIMEN COMUN	Debito	$ 235.795,00
0007 AJUSTE R.F IVA	24362501		RF IVA REGIMEN COMUN	Credito	- $ 392.991,00

DESCRIPCIÓN DE FACTURAS

Factura	Fecha	Vencimiento	Cuenta	Valor
FEV7	14/03/2024 2:48:56 p. m.	13/04/2024 2:48:00 p. m.	24010101	$ 157.196,00

CONSORCIO MEJORAMIENTO HOSPITALARIO 2023
NIT 901.729.479-2
FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N° FEV 7

	SERVICIOS DE INGENIERIA LOGISTICA 40% REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION	JORGE ALBERTO VILLAMIL MORA 60%	TOTAL CONSORCIO
Acta parcial N° 06 contrato 004-2023	131.272.936,93	196.909.405,39	328.182.342,32
Administración 20%	26.254.587,38	39.381.881,08	65.636.468,46
Imprevistos 5%	6.563.646,85	9.845.470,27	16.409.117,12
Utilidad 5%	5.515.669,61	8.273.504,42	13.789.174,03
SUBTOTAL	**169.606.840,77**	**254.410.261,16**	**424.017.101,93**
IVA 19%	1.047.977,23	1.571.965,84	2.619.943,07
TOTAL FACTURA	**170.654.818,00**	**255.982.227,00**	**426.637.045,00**
RF RENTA CONTRATOS OBRA 2%	0,00	5.088.205,00	5.088.205,00
RF IVA	157.196,00	235.795,00	392.991,00
RF ICA 4,4 X 1000	0,00	1.119.405,00	1.119.405,00
SUBTOTAL	**170.497.622,00**	**249.538.822,00**	**420.036.444,00**
Amortizacion 30%			139.267.526,00
NETO A PAGAR			**280.768.918,00**

NOTA: NO SE REALIZA RF ICA NI RF RENTA A CONSORCIADO SERVICIOS DE INGENIERIA LOGISTICA POR SER DEL REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION.

VALOR OBLIGACION PRESUPUESTAL (V/R FACTURA MENOS ANTICIPO) 287.369.519,00

NOTA: SE CAUSA 100% EN CXP Y SE CRUZA EL ANTICIPO EN PRESUPUESTO, PERO EN CONTABILIDAD NOS TOCA HACERLE EL TRASLADO DESDE PAGOS- UTILIDADES - TRASLADOS, APLICANDO EL ANTICIPO A LA CXP.

Hospital Regional de Duitama	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION Y CALIDAD	CODIGO: 315-1 F3
		Paginas : 01
	CERTIFICACION DE COSTOS	Versión: 03
		Vigente a partir de: 01 DE DICIEMBRE DE 2020

E.S.E. HOSPITAL REGIONAL DE DUITAMA

Nit: 891.855.438-4

CONTRATISTA: CONSORCIO MEJORAMIENTO HOSPITALARIO **NIT:** 901.729.479

CONTRATO No. OBR 004 - 2023 **VALOR** 426.637.045

FACTURA ELECTRONICA No. FEV 7

FECHA FACTURA O FACTURA ELECTRONICA:

CAUSACION FACTURA ELECTRONICA POR PAGAR No. 4966 - PI 3046 - TR 44

OBJETO: REFORZAMIENTO DE ESTRUCTURA DE CUBIERTA, CAMBIO DE CUBIERTA, MANTENIMIENTO A LA PINTURA DE FACHADAS Y MEJORAS PARA LA CARPINTERIA METALICA DE LA ESE HOSPITAL REGIONAL DE DUITAMA

DISTRIBUCION SEGÚN CENTRO DE COSTOS

COD	CENTRO DE COSTOS	CONCEPTO	DISTRIBUCION COSTOS
321-1	GESTION DOCUMENTAL HRD	0241	$ 33.235.819
372-1	SERVICIOS DE ALIMENTACION HRD	0241	$ 44.313.034
373-1	SERVICIO DE ROPA HOSPITALARIA HRD	0241	$ 6.413.667
361-1	MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA HRD	0241	$ 31.562.858
241-1-3	ATENCION AL PACIENTE HOSPITALIZADO HRD - UCI CUIDADOS INTENSIVOS (B1)	0262	$ 41.452.689
241-1-4	ATENCION AL PACIENTE HOSPITALIZADO HRD - SARS COVID 19 (B2)	0257	$ 45.877.579
241-1-6	ATENCION AL PACIENTE HOSPITALIZADO HRD - GINECOBSTETRICIA (C2)	0257	$ 49.180.250
241-1-7	ATENCION AL PACIENTE HOSPITALIZADO HRD - MEDICINA INTERNA Y OTRAS ESPECIALIDADES (C3)	0257	$ 82.624.120
241-1-10	ATENCION AL PACIENTE HOSPITALIZADO HRD - ZONA EXTENDIDA (A5)	0257	$ 9.192.358
241-1-11	ATENCION AL PACIENTE HOSPITALIZADO HRD - (A1)	0257	$ 42.801.741
351-1	ADMINISTRACION DEL SISTEMA HRD	0241	$ 6.783.131
314-1	FACTURACION HRD	0241	$ 12.239.856
401-1	AUDITORIA MEDICA DE CUENTAS HRD	0241	$ 6.250.916
171-1	REVISORIA FISCAL HRD	0241	$ 5.576.343
391-1	EDUCACION CONTINUADA HRD	0241	$ 9.132.684
		TOTAL	$ 426.637.045

Fecha de Certificacion: 14/03/2024 14:13

Elaborado por: NOHORA ELSA RIVERA MARIÑO
Cargo LIDER DE PRESUPUESTO E.S.E HOSPITAL REGIONAL DE DUITAMA

Elaborado por: FELIPE ANDRES SIERRA RODRIGUEZ
Cargo LÍDER DE COSTOS E.S.E HOSPITAL REGIONAL DE DUITAMA

Revisado por: LEIDY YOHANA GONZALEZ BOTIA
Cargo CONTADOR PÚBLICO 2 E.S.E HOSPITAL REGIONAL DE DUITAMA

Aprobado por: LUIS GABRIEL TELLEZ CARDENAS
Cargo LÍDER DE CONTABILIDAD E.S.E HOSPITAL REGIONAL DE DUITAMA

CONSORCIO MEJORAMIENTO HOSPITALARIO 2023
901.729.479-2
CLL 26 6 56 OF 101 ED SAN JORGE
(311) 8617112
Tunja - Colombia
silyconingenieria@gmail.com

Factura electrÃ³nica de venta N°. FEV 7

Cliente: EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL REGIONAL DE DUITAMA
Nit: 891.855.438-4
Teléfono: (608) 7632330 - Ext. 1506
Dirección: Av de las Américas #Carrera 35
Ciudad: Duitama - Colombia
Correo: subadministrativa@hrd.gov.co

Fecha y hora Factura	
Generación	14/03/2024, 08:43
Expedición	14/03/2024, 10:59
Vencimiento	14/03/2024
Vendedor	CONSORCIO MEJORAMIENTO HOSPITALARIO
Centro de costo	0
Cotización	

Ítem	Descripción	Vr. Total	Impto. Cargo 2
1	Acta Parcial # 6,Contrato No. 004-2023 REFORZAMIENTO DE ESTRUCTURA DE CUBIERTA,CAMBIO DE CUBIERTA, MANTENIMIENTO A LA PINTURA DE FACHADAS Y MEJORAS PARA LA CARPINTERÍA METÁLICA DE LA E.S.E. HOSPITAL REGIONAL DE DUITAMA	328,182,342.32	0 %
2	ADMINISTRACIÓN 20%	65,636,468.46	0 %
3	IMPREVISTOS 5%	16,409,117.12	0 %
4	UTILIDAD 5%	16,409,117.10	0 %

Total ítems: 4

Valor en Letras:
Cuatrocientos veintiseis millones seiscientos treinta y siete mil cuarenta y cinco pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Transferencia $ 426,637,045.00

Total Bruto	424,017,101.93
IVA 19%	2,619,943.07
Total a Pagar	426,637,045.00

Observaciones:
En la presente factura se finaliza la amortización del anticipo según las condiciones estipuladas en el contrato de obra

Porcentaje de participación de los miembros:

SERVICIOS DE INGENIERIA LOGISTICA Y CONSTRUCCION S.A.S - NIT 901.400.064 - 40%
JORGE ALBERTO VILLAMIL MORA - Cédula de ciudadanía 7.173.560 - 60%

Elaborado por

Firma recibido

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764054391870 aprobado en 20230824 prefijo FEV desde el número 1 al 20 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4290 Construcción de otras obras de ingeniería civil Tarifa
CUFE: bf2ba9e0535cb4169aaa7806bd841d6cbf177df105783c8586fd57efd9deaf710cbe89e6d34b175bb9b77b1b689d70a0

Fabricante Software y Proveedor tecnológico Siigo S.A.S. - Nit 830.048.115-8. Nombre Software Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML.

CONSORCIO
MEJORAMIENTO HOSPITALARIO
2023

CERTIFICACION PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES LEGALES ARTICULO 50 LEY 789 DE 2002

Yo, GERARDO IVAN MARQUEZ RINCON, identificado con cédula de ciudadanía No. 1.049.638.664 de Tunja, en Representación Legal del CONSORCIO MEJORAMIENTO HOSPITALARIO 2023, certifico que el pago de los aportes de Salud, Riesgos Profesionales, Pensiones y Aportes a Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje (Artículo 65 Ley 1819 de 2016), están pagados durante los últimos seis (6) meses.

Yo, JENNY MARIBEL ESPINOSA CEPEDA, identificado con cédula de ciudadanía No. 23.434.187 de Ciénega y portador de la Tarjeta Profesional No. 165.295 - T, dela Junta Central de Contadores de Colombia, en mi calidad de Contador Público del CONSORCIO MEJORAMIENTO HOSPITALARIO 2023 identificado con NIT No. 901.729.479-2, luego de examinar de acuerdo con las normas de auditoria generalmente aceptadas en Colombia, los Estados Financieros, me permito "CERTIFICAR" el pago de los aportes de Salud, Riesgos Profesionales, Pensiones y Aportes a Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y ServicioNacional de Aprendizaje (Artículo 65 Ley 1819 de 2016), pagados durante los últimos seis (6) meses.

Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Lo anterior se certifica, en Tunja a los catorce (14) días del mes de Marzo de 2024.

CONSORCIO MEJORAMIENTO HOSPPITALARIO 2023
GERARDO IVAN MARQUEZ RINCON
CONTRATISTA
CC. 1049638664

JENNY MARIBEL ESPINOSA CEPEDA
CONTADOR PÚBLICO
T.P. 165.295-T

SILYCON INGENIERÍA

CERTIFICACION PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES LEGALES
ARTICULO 50 LEY 789 DE 2002

Yo, **GERARDO IVAN MARQUEZ RINCON**, identificado con cédula de ciudadanía No. 1.049.638.664, en Representación del SILYCON INGENIERIA SAS, identificado con Nit. 901400064-6, certifico que el pago de los aportes de Salud, Riesgos Profesionales, Pensiones y Aportes a Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje (Artículo 65 Ley 1819 de 2016), están pagados durante los últimos seis (6) meses.

Yo, **JENNY MARIBEL ESPINOSA CEPEDA**, identificada con cédula de ciudadanía No. 23.434.187 de Ciénega y portador de la Tarjeta Profesional No. 165.295 - T, de la Junta Central de Contadores de Colombia, en mi calidad de Contador Público de SILYCON INGENIERIA SAS, identificado con Nit. 901400064-6, luego de examinar de acuerdo con las normas de auditoria generalmente aceptadas en Colombia, los Estados Financieros, me permito "CERTIFICAR" el pago de los aportes de Salud, Riesgos Profesionales, Pensiones y Aportes a Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje (Artículo 65 Ley 1819 de 2016), pagados durante los últimos seis (6) meses. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Lo anterior se certifica, en Tunja a los catorce (14) días del mes de Marzo de 2024.

GERARDO IVAN MARQUEZ RINCON
CC. 1049638664
Representante legal CBD

JENNY MARIBEL ESPINOSA CEPEDA
Contador Público

Jorge Alberto
Villamil Mora
Ingeniero Civil

CERTIFICACION PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES LEGALES ARTICULO 50 LEY 789 DE 2002

Yo, JORGE ALBERTO VILLAMIL MORA, identificado con cédula de ciudadanía No. 7.173.560, en Representación propia, certifico que el pago de los aportes de Salud, Riesgos Profesionales, Pensiones y Aportes a Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje (Artículo 65 Ley 1819 de 2016), estan pagados y al dia durante los últimos seis (6) meses

Yo, JENNY MARIBEL ESPINOSA CEPEDA, identificado con cédula de ciudadanía No. 23.434.187 de Ciénega y portador de la Tarjeta Profesional No. 165.295 - T, de la Junta Central de Contadores de Colombia, en mi calidad de Contador Público JORGE ALBERTO VILLAMIL MORA identificado con NIT No. 7.173.560, luego de examinar de acuerdo con las normas de auditoria generalmente aceptadas en Colombia, los Estados Financieros, me permito "CERTIFICAR" el pago de los aportes de Salud, Riesgos Profesionales, Pensiones y Aportes a Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje (Artículo 65 Ley 1819 de 2016), estan pagados y al dia durante los últimos seis (6) meses.

Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Se certifica, en Tunja a los catorce *(14) días del mes de* Marzo *de 2024.*

JORGE ALBERTO VILLAMIL MORA
CONTRATISTA
CC. 7173560

JENNY MARIBEL ESPINOSA CEPEDA
CONTADOR PUBLICO
T.P. 165.295-T

Calle 26 # 6 - 56 Of. 101 Tunja. Tel: 313 297 7457 - 7470779 E-mail: jorgevillamil77@gmail.com

CARLOS EDUARDO ROBLES SÁENZ

APOYO A LA SUPERVISIÓN DE LA ESE HOSPITAL REGIONAL DUITAMA

CERTIFICA QUE:

El contratista, **GERARDO IVAN MÁRQUEZ RINCÓN R/L del CONSORCIO MEJORAMIENTO HOSPITALARIO 2023**, con **NIT 901729479-2**, ha desarrollado y cumplido con toda la documentación requerida para el pago del **Acta Parcial No.006.** correspondiente al contrato de obra **No. 004 de 2023** que tiene por objeto **"REFORZAMIENTO DE ESTRUCTURA DE CUBIERTA, CAMINO DE CUBIERTA, MANTENIMIENTO A LA PINTURA DE FACHADAS Y MEJORAS PARA LA CARPINTERIA METALICA DE LA E.S.E. HOSPITAL REGIONAL DE DUITAMA".**

La presente se expide en Tunja, a los trece días (13) días del mes de marzo de 2024.

Cordialmente,

ING. CARLOS EDUARDO ROBLES SÁENZ
APOYO A LA SUPERVISIÓN CONTRATO DE OBRA
No. 004 de 2023

Dirección: Avenida Universitaria No. 75 A – 00 Bloque A Oficina 22A
Teléfono: (098) 7459962 -3106098739
Email: apoyoalasupervisionduitama@gmail.com

SC BUILDINGS
DISEÑO Y CONTRUCCIÓN PARA TU VIDA

Duitama, 13 de marzo de 2024

Doctora:
ERIKA NATALIA SANCHEZ MEDINA
Supervisora
Ciudad

REFERENCIA: contrato # 001-2024 cuyo objeto es "INTERVENTORIA TECNICA, FINANCIERA, ADMINISTRATIVA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES REFORZAMIENTO DE ESTRUCTURA DE CUBIERTA, CAMBIO DE CUBIERTA, MANTENIMIENTO A LA PINTURA DE FACHADAS Y MEJORAS PARA LA CARPINTERÍA METÁLICA DE LA E.S.E HOSPITAL REGIONAL DE DUITAMA".

CERTIFICA:

Con la presente en ejercicio de sus funciones de seguimiento y control del contrato de Obra 004 de 2023 cuyo objeto del Contrato es ***"REFORZAMIENTO DE ESTRUCTURA DE CUBIERTA, CAMBIO DECUBIERTA, MANTENIMIENTO A LA PINTURA DE FACHADAS Y MEJORAS PARA LA CARPINTERÍAMETÁLICA DE LA E.S.E HOSPITAL REGIONAL DE DUITAMA"*** se permite presentar luego de revisiones pertinentes el **ACTA PARCIAL 06** del contrato de Obra, con su sabana y memorias de cantidades con su respectivo registro fotográfico presentado por el Contratista de Obra y revisado por parte de la Interventoria.

Dando cumplimiento a las funciones al CONTRATO DE CONSULTORIA No.001 DE 2024 se da por revisada y aprobada ACTA PARCIAL N° 6 de corte al 07 marzo de 2024.

Cordialmente,

Arq. SERGIO CAMARGO
Director de Interventoría

3163204104-3162779908
SCBUILDINGS2019@GMAIL.COM
TUNJA BOYACÁ
AV. UNIVERSITARIA 41-50 OFICINA 4
ED. MIRADOR DE LA COLINA

CONSORCIO
MEJORAMIENTO HOSPITALARIO
2023

Tunja, 14 de marzo de 2024

CMH-004-2023-0049
Medio de radicado: digital

Doctora
ERIKA NATALIA SANCHEZ MEDINA
Supervisora
supervisioncubiertashrd@gmail.com
Ciudad

REFERENCIA: CONTRATO N° 04 DE 2023. Objeto "REFORZAMIENTO DE ESTRUCTURA DE CUBIERTA, CAMBIO DE CUBIERTA, MANTENIMIENTO A LA PINTURA DE FACHADAS Y MEJORAS PARA LA CARPINTERÍA METÁLICA DE LA E.S.E HOSPITAL REGIONAL DE DUITAMA".

ASUNTO: RADICACION ACTA PARCIAL No. 6

Cordial saludo,
De acuerdo con lo estipulado en la forma de pago del contrato de la referencia me permito radicar EL ACTA PARCIAL No.6 equivalente al 9.08 % del valor total del mismo, el porcentaje total acumulado ejecutado a la presente acta es del 90 %; para proceder con el trámite correspondiente la mencionada acta viene complementada por los siguientes documentos:

1. Formato Acta Parcial No. 6
2. Factura de Electrónica de Venta No. FEV 7.
3. Certificación de pago a seguridad social y aportes parafiscales
4. RUT Consorcio Mejoramiento Hospitalario 2023
5. Certificación cuenta bancaria
6. RUT Consorciados
7. Cédula representante legal Consorcio Mejoramiento Hospitalario 2023
8. Formato sabana cantidades de obra Acta Parcial No. 6
9. Balance No. 5
10. Memorias de Cantidades de Obra Ejecutada Acta Parcial No. 6
11. Certificación supervisión HRD Acta Parcial 6.
12. Certificación Interventoría Acta Parcia 6.

Agradezco la atención prestada y estaré atento a sus comentarios.

CONSORCIO MEJORAMIENTO HOSPITALARIO 2023
RL/ GERARDO IVAN MARQUEZ RINCON
CONTRATISTA

Anexos:
Los anunciados en el oficio

ESE HOSPITAL REGIONAL DE DUITAMA	OBJETO:	GENERALIDADES DEL CONTRATO:		DATOS FINANCIEROS:	
	REFORZAMIENTO DE ESTRUCTURA DE CUBIERTA, CAMBIO DE CUBIERTA, MANTENIMIENTO A LA PINTURA DE FACHADAS Y MEJORAS PARA LA CARPINTERÍA METÁLICA DE LA E.S.E. HOSPITAL REGIONAL DE DUITAMA	PLAZO DE EJECUCIÓN:	5 MESES	VALOR CONTRATADO:	$ 3,720,757,472.00
BALANCE DE OBRA No.5	CONTRATISTA:	PRÓRROGA No. 01:	7 DIAS CALENDARIO		
Fecha:	CONSORCIO MEJORAMIENTO HOSPITALARIO 2023 NIT. 901729479-2	PRÓRROGA No. 02:	1 MES	VALOR ANTICIPO:	$ 1,116,227,241.60
06 MARZO DE 2024	RL GERARDO IVAN MARQUEZ RINCON C.C. 1,049,638,664	PLAZO ACUMULADO:	6 MESES Y 7 DIAS CALENDARIO		
	SUPERVISOR DEL CONTRATO	FECHA DE INICIO:	24 DE JULIO DE 2023	VALOR ADICIÓN No.1:	$ 976,611,605.00
	ERIKA NATALIA SANCHEZ MEDINA	FECHA DE SUSPENSIÓN No. 01:	29 DE DICIEMBRE DE 2023		
	APOYO A SUPERVISIÓN	FECHA DE REINICIO No. 01:	09 DE ENERO DE 2024		
	CARLOS EDUARDO ROBLES SAENZ	FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	24 DE DICIEMBRE DE 2023	VALOR TOTAL ACUMULADO:	$ 4,697,369,077.00
	INTERVENTORIA:	FECHA DE TERMINACIÓN ACUMULADA:	10 DE ABRIL DE 2024		
	SC BUILDING S.A.S. NIT. 901336035-9				
	RL SEBASTIAN ALONSO CAMARGO CASTILLO C.C. 1,049,638,664				

ID	ITEM CONTRACTUAL	DESCRIPCION	CONDICIONES CONTRACTUALES				CONDICIONES ACTUALIZADAS BALANCE 4 DEL 02/02/2024		BALANCE 5					CONDICIONES ACTUALIZADAS BALANCE 5	
			UNIDAD	CANTIDAD	V. UNITARIO	V. TOTAL	CANTIDAD	V. TOTAL	MAYORES	MENORES	VR. CANT MAYORES	VR. CANT MENORES	RESULTADO DE MAYORES / MENORES CANTIDADES BALANCE N°4	CANTIDAD	V. TOTAL
CUBIERTA						$ 2,573,286,479.25		$ 2,840,967,679.28							$ 2,840,968,201.42
1	1	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO OBRA ARQUITECTONICA ALTURA MAYOR DE 3 MTS (INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO ISO 9001)	M2	5,331.00	$ 6,357.00	$ 33,889,167.00	5,073.65	$ 32,253,193.05						5,073.65	$ 32,253,193.05
2	2	DESMONTE CUBIERTAS TEJA DE ASBESTO Y/O ASBESTO CEMENTO CANALETA ALTURA MAYOR DE 3 MTS INCLUYE POLEAS Y MANILAS	M2	5,331.00	$ 11,926.00	$ 63,577,506.00	4,819.72	$ 57,479,980.72	0.01		$ 119			4,819.73	$ 57,480,099.85
3	3	TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL RESIDUOS DE ASBESTO CEMENTO A SITIO AUTORIZADO	KG	63,972.0	$ 600.00	$ 38,383,200.00	82,494.07	$ 49,496,442.00						82,494.07	$ 49,496,442.00
4	4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CUBIERTA EN TEJA PANEL METÁLICO DE ALUZINC - CAL 26 TIPO SANDUCHE, CON POLIURETANO EXPANDIDO, ACABADO EN PINTURA POLIESTER.	M2	4,621.9	$ 203,928.00	$ 942,532,783.92	4,368.73	$ 890,906,371.44						4,368.73	$ 890,906,371.44
5	5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CUBIERTA EN TEJA PANEL METÁLICO DE ALUZINC - CAL 26 TIPO SANDUCHE, CON POLIURETANO EXPANDIDO, ACABADO EN PINTURA POLIESTER. CIRCULACIONES AREA ASISTENCIAL	M2	710.00	$ 218,169.00	$ 154,899,990.00	704.92	$ 153,791,991.48						704.92	$ 153,791,991.48
6	6	SUMINISTRO E INSTALACION DE FLANCHE EN LAMINA	ML	542.00	$ 48,217.00	$ 26,133,614.00	1,231.89	$ 59,398,040.13						1,231.89	$ 59,398,040.13
7	7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PERFILERIA METÁLICA PARA ESTRUCTURA DE CUBIERTA, DIMENSIONES Y CALIBRES SEGÚN DISEÑO (CORREAS Y SUPLEMENTOS)	KG	50,840.79	$ 17,133.00	$ 871,055,255.07	62,949.77	$ 1,078,518,409.41						62,949.77	$ 1,078,518,409.41
8	8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PERFILERIA METÁLICA PARA ESTRUCTURA DE CUBIERTA, DIMENSIONES Y CALIBRES SEGÚN DISEÑO (CORREAS Y SUPLEMENTOS) CIRCULACIONES AREA ASISTENCIAL	KG	7,810.00	$ 20,056.00	$ 156,671,560.00	9,763.04	$ 196,502,141.44	0.01		$ 205			9,763.05	$ 196,502,346.32
9	9	SUMINISTRO, TRANSPORTE, FABRICACIÓN, ENSAMBLAJE Y MONTAJE DE ESTRUCTURA METALICA (CERCHAS)	KG	1,000.00	$ 23,970.00	$ 23,970,000.00	-	$ -						0.00	$ -
10	10	SUMINISTRO E INSTALACION CANAL EN LAMINA CAL 22	ML	50.00	$ 108,481.00	$ 5,424,050.00	30.00	$ 3,254,430.00						30.00	$ 3,254,430.00
11	11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CABALLETE METALICO ALTURA MAYOR DE 3 MTS	ML	306.00	$ 89,070.00	$ 27,255,420.00	294.00	$ 26,186,580.00						294.00	$ 26,186,580.00
12	12	LIMPIEZA DE CANAL EXISTENTE	ML	668.66	$ 5,155.00	$ 3,446,942.30	598.67	$ 3,086,143.85						598.67	$ 3,086,143.85
13	13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN IMPERMEABILIZACIÓN EN MANTO ASFALTICO	MI	668.66	$ 79,272.00	$ 53,006,015.52	598.67	$ 47,457,765.24						598.67	$ 47,457,765.24
14	14	PINTURA DE LA ESTRUCTURA METALICA	KG	51,840.79	$ 3,336.00	$ 172,940,675.44	72,732.82	$ 242,638,687.52						72,732.82	$ 242,636,687.52
FACHADA						$ 246,951,785.89		$ 312,404,569.88						0	$ 287,592,126.21
15	15	LIMPIEZA DE FACHADA CON HIDROLAVADORA	M2	4,409.74	$ 2,789.00	$ 12,296,764.86	4,922.08	$ 13,727,681.12						4,922.08	$ 13,727,681.12
16	16	LIMPIEZA DE FACHADA CON HIDROLAVADORA ANCHO MENOR A .50MTS	ML	2,365.86	$ 1,395.00	$ 3,328,274.70	3,014.35	$ 4,205,018.25						3,014.35	$ 4,205,018.25
17	17	MEDIA CAÑA EN MORTERO IMPERMEABILIZADO	ML	775.00	$ 36,472.00	$ 28,265,600.00	430.37	$ 15,696,454.64						430.37	$ 15,696,454.64
18	18	IMPRIMANTE	M2	4,409.74	$ 8,939.00	$ 39,418,665.86	5,507.96	$ 49,235,654.44						5,507.96	$ 49,235,654.44
19	19	IMPRIMANTE ANCHO MENOR A 0.50MTS	ML	661.46	$ 4,499.00	$ 2,956,089.21	3,908.08	$ 17,465,209.52						3,908.08	$ 17,465,209.52

ESE HOSPITAL REGIONAL DE DUITAMA	OBJETO:	GENERALIDADES DEL CONTRATO:		DATOS FINANCIEROS:	
	REFORZAMIENTO DE ESTRUCTURA DE CUBIERTA, CAMBIO DE CUBIERTA, MANTENIMIENTO A LA PINTURA DE FACHADAS Y MEJORAS PARA LA CARPINTERÍA METÁLICA DE LA E.S.E. HOSPITAL REGIONAL DE DUITAMA	PLAZO DE EJECUCIÓN:	5 MESES	VALOR CONTRATADO:	$ 3,720,757,472.00
	CONTRATISTA:	PRÓRROGA No. 01:	7 DIAS CALENDARIO		
	CONSORCIO MEJORAMIENTO HOSPITALARIO 2023 NIT. 901728479-2	PRÓRROGA No. 02:	1 MES		
BALANCE DE OBRA No.5	RL GERARDO IVAN MARQUEZ RINCON C.C. 1,049,636,664	PLAZO ACUMULADO:	6 MESES Y 7 DIAS CALENDARIO	VALOR ANTICIPO:	$ 1,116,227,241.60
	SUPERVISOR DEL CONTRATO	FECHA DE INICIO:	24 DE JULIO DE 2023		
Fecha:	ERIKA NATALIA SANCHEZ MEDINA	FECHA DE SUSPENSIÓN No. 01:	29 DE DICIEMBRE DE 2023	VALOR ADICIÓN No.1:	$ 976,611,605.00
08 MARZO DE 2024	APOYO A SUPERVISIÓN	FECHA DE REINICIO No. 01:	08 DE ENERO DE 2024		
	CARLOS EDUARDO ROBLES SAENZ				
	INTERVENTORIA:	FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	24 DE DICIEMBRE DE 2023	VALOR TOTAL ACUMULADO:	$ 4,697,369,077.00
	SO BUILDING S.A.S. NIT. 901336035-9				
	RL SEBASTIAN ALONSO CAMARGO CASTILLO C.C. 1,049,638,664	FECHA DE TERMINACIÓN ACUMULADA:	10 DE ABRIL DE 2024		

ID	ITEM CONTRACTUAL	DESCRIPCION	CONDICIONES CONTRACTUALES				CONDICIONES ACTUALIZADAS BALANCE 4 DEL 02/02/2024		BALANCE 5					CONDICIONES ACTUALIZADAS BALANCE 5	
			UNIDAD	CANTIDAD	V. UNITARIO	V. TOTAL	CANTIDAD	V. TOTAL	MAYORES	MENORES	VR. CANT MAYORES	VR. CANT MENORES	RESULTADO DE MAYORES / MENORES CANTIDADES BALANCE N°4	CANTIDAD	V. TOTAL
20	21	PINTURA FACHADA EN VINILO PARA EXTERIORES	M2	4,409.74	$ 17,558.00	$ 77,426,214.92	4,849.62	$ 85,149,627.96	452.67		$ 7,947,980			5,302.29	$ 93,097,607.82
21	22	PINTURA FACHADA EN VINILO PARA EXTERIORES ANCHO MENOR A 0.50MTS	ML	2,365.86	$ 8,709.00	$ 20,921,606.34	3,480.46	$ 30,520,153.74		-600.68		-$ 5,267,386		2,879.78	$ 25,252,766.09
22	23	PAÑETE IMPERMEABILIZADO	M2	825.00	$ 30,757.00	$ 25,374,525.00	913.50	$ 28,096,519.50		-600.00		-$ 18,454,200		313.50	$ 9,642,319.50
23	24	PAÑETE IMPERMEABILIZADO ANCHO MENOR A 0.50MTS	ML	360.00	$ 15,336.00	$ 5,520,960.00	684.44	$ 10,496,571.64		-104.90		-$ 1,608,676		579.54	$ 8,887,895.98
24	25	REPARACION FILOS	ML	360.00	$ 9,834.00	$ 3,540,240.00	507.30	$ 4,988,766.20						507.30	$ 4,988,766.20
25	26	FACHADA EN GRANIPLAS	M2	825.00	$ 33,619.00	$ 27,900,675.00	1,561.93	$ 52,522,910.67		-220.00		-$ 7,440,160		1,341.93	$ 45,362,730.67
VENTANERIA						$ 32,548,573.16		$ 15,555,840.00						0	$ 19,164,814.40
26	27	ESMALTE LAMINA LINEAL 3 MANOS ANCHO HASTA 60 CM 3 CARAS	ML	2,365.86	$ 7,369.00	$ 17,431,093.16	60.00	$ 438,360.00						60.00	$ 438,360.00
27	28	VENTANA EN ALUMINIO PROYECTANTE CON VIDRIO TRASLUCIDO	M2	70.00	$ 215,964.00	$ 15,117,480.00	70.00	$ 15,117,480.00	18.71		$ 3,608,974			88.71	$ 18,726,454.40
OTROS						$ 9,334,284.00		$ 14,001,426.00						0	$ 14,001,426.00
28	29	LINEA DE VIDA HORIZONTAL	UN	4	$ 2,333,571.00	$ 9,334,284.00	6.00	$ 14,001,426.00						6.00	$ 14,001,426.00
ITEMS ADICIONALES NO PREVISTOS						$ -		$ 430,430,973.89						0	$ 451,644,253.28
29	NP1	SUMINISTRO E INSTALACION DE ANCLAJE CON VARILLA ROSCADA ¾" X 150 MM ACERO ASTM 193 B 7 CON EPOXICO, TUERCA Y ARANDELA	UND	0	$ 19,352.00	$ -	1,740.00	$ 33,672,480.00						1,740.00	$ 33,672,480.00
30	NP2	DEMOLICIÓN MUROS LADRILLO E = 0.15 mts	M2	0	$ 13,629.00	$ -	318.81	$ 4,345,061.49						318.81	$ 4,345,061.49
31	NP3	RASPADO Y DEMOLICIÓN SUPERFICIE MURO FACHADA	M2	0	$ 10,854.00	$ -	866.37	$ 9,403,579.98						866.37	$ 9,403,579.98
32	NP4	RASPADO Y DEMOLICIÓN SUPERFICIE MURO FACHADA ANCHO MENOR A 0.50 m	M	0	$ 6,187.00	$ -	1,321.80	$ 8,151,540.60						1,321.80	$ 8,151,540.60
33	NP5	RESANE SUPERFICIE MURO FACHADA	M2	0	$ 17,505.00	$ -	405.94	$ 7,105,979.70						405.94	$ 7,105,979.70
34	NP6	RESANE SUPERFICIE MURO FACHADA ANCHO MENOR A 0.50 m	M	0	$ 12,025.00	$ -	1,097.19	$ 13,193,709.75						1,097.19	$ 13,193,709.75
35	NP7	VENTANA EN ALUMINIO CORREDIZA	M2	0	$ 348,524.00	$ -	259.88	$ 90,080,645.12						259.88	$ 90,080,645.12
36	NP8	DESMONTE VIDRIO	M2	0	$ 3,045.47	$ -	329.88	$ 1,004,639.64						329.88	$ 1,004,639.64
37	NP9	DESMONTE MARCOS PUERTAS Y VENTANAS	M2	0	$ 13,629.00	$ -	335.25	$ 4,569,122.25						335.25	$ 4,569,122.25
38	NP10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN POSTE METÁLICO H=1.4M PARA ANCLAJE DE LÍNEA DE VIDA PROVISIONAL.	UND	0	$ 590,000.00	$ -	10.00	$ 5,900,000.00						10.00	$ 5,900,000.00
39	NP11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN POSTE METÁLICO H=0.3 M PARA ANCLAJE DE LÍNEA DE VIDA PROVISIONAL.	UND	0	$ 156,875.00	$ -	2.00	$ 313,750.00						2.00	$ 313,750.00
40	NP 12	DESMONTE REJA METÁLICA	M2	0	$ 14,421.17	$ -	156.00	$ 2,249,702.52		-156.00		-$ 2,249,703		0.00	$ -

ESE HOSPITAL REGIONAL DE DUITAMA	OBJETO: REFORZAMIENTO DE ESTRUCTURA DE CUBIERTA, CAMBIO DE CUBIERTA, MANTENIMIENTO A LA PINTURA DE FACHADAS Y MEJORAS PARA LA CARPINTERÍA METÁLICA DE LA E.S.E. HOSPITAL REGIONAL DE DUITAMA	GENERALIDADES DEL CONTRATO:	DATOS FINANCIEROS:
BALANCE DE OBRA No.5 Fecha: 08 MARZO DE 2024	CONTRATISTA: CONSORCIO MEJORAMIENTO HOSPITALARIO 2023 — NIT. 901726479-2 RL GERARDO IVAN MARQUEZ RINCON — C.C. 1,049,638,664 SUPERVISOR DEL CONTRATO ERIKA NATALIA SANCHEZ MEDINA APOYO A SUPERVISIÓN CARLOS EDUARDO ROBLES SAENZ INTERVENTORIA: SC BUILDING S.A.S. — NIT. 901336035-9 RL SEBASTIAN ALONSO CAMARGO CASTILLO — C.C. 1,049,638,664	PLAZO DE EJECUCIÓN: 5 MESES PRÓRROGA No. 01: 7 DIAS CALENDARIO PRÓRROGA No. 02: 1 MES PLAZO ACUMULADO: 6 MESES Y 7 DIAS CALENDARIO FECHA DE INICIO: 24 DE JULIO DE 2023 FECHA DE SUSPENSIÓN No. 01: 29 DE DICIEMBRE DE 2023 FECHA DE REINICIO No. 01: 09 DE ENERO DE 2024 FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL: 24 DE DICIEMBRE DE 2023 FECHA DE TERMINACIÓN ACUMULADA: 10 DE ABRIL DE 2024	VALOR CONTRATADO: $ 3,720,757,472.00 VALOR ANTICIPO: $ 1,116,227,241.60 VALOR ADICIÓN No.1: $ 976,611,605.00 VALOR TOTAL ACUMULADO: $ 4,697,369,077.00

ID	ITEM CONTRACTUAL	DESCRIPCION	CONDICIONES CONTRACTUALES				CONDICIONES ACTUALIZADAS BALANCE 4 DEL 02/02/2024		BALANCE 5					CONDICIONES ACTUALIZADAS BALANCE 5	
			UNIDAD	CANTIDAD	V. UNITARIO	V. TOTAL	CANTIDAD	V. TOTAL	MAYORES	MENORES	VR. CANT MAYORES	VR. CANT MENORES	RESULTADO DE MAYORES / MENORES CANTIDADES BALANCE N°4	CANTIDAD	V. TOTAL
41	NP13	CAMBIO PERFILERIA REJAS CERRAMIENTO PERIMETRAL ACERO ESTRUCT. ASTM A-36. (SUMNISTRO E INSTALACIÓN)	Kg	0	$ 15,168.00	$ -	329.00	$ 4,996,852.00						329.00	$ 4,996,852.00
42	NP 14	MANTENIMIENTO REJA CERRAMIENTO PERIMETRAL H=1.57 (INCLUYE LIJADO, LIMPIEZA CON CEPILLO CERDA METÁLICA, PINTADO CON ANTICORROSIVO Y PINTURA TIPO ESMALTE)	ML	0	$ 109,775.00	$ -	239.65	$ 26,309,534						239.65	$ 26,309,533.75
43	NP 15	REMATE MURO DRYWALL UNA CARA ANCHO MENOR 50 cm	ML	0	$ 29,132.00	$ -	89.07	$ 2,594,787						89.07	$ 2,594,787.24
44	NP 16	FACHADA EN GRANIPLAST. ANCHO MENOR A 0.50 m	ML	0	$ 16,909.00	$ -	363.06	$ 6,138,982						363.06	$ 6,138,981.54
45	NP 17	DESMONTE DE CIELO RASO EN LAMINA DE PVC (NO INCLUYE ESTRUCTURA)	M2	0	$ 5,673.00	$ -	2,480.73	$ 14,073,181	226.74		$ 1,286,273			2,707.47	$ 15,359,454.62
46	NP 18	REINSTLACIÓN DE LAMINA DE CIELO RASO PVC	M2	0	$ 9,013.00	$ -	2,324.68	$ 20,954,143	296.47		$ 2,672,109			2,621.35	$ 23,626,252.79
47	NP 19	SUMINISTRO E INSTALACION DE CIELO RASO EN LAMINA DE PVC (INCLUYE ESTRUCTURA)	M2	0	$ 74,951.00	$ -	155.85	$ 11,681,113	117.00		$ 8,769,042			272.85	$ 20,450,155.50
48	NP 20	REUBICACIÓN PUNTO REVENTILACIÓN EXISTENTE 2" (INCLUYE SALIDA POR ENCIMA DE CUBIERTA)	UND	0	$ 60,364.00	$ -	12.00	$ 724,368						12.00	$ 724,368.00
49	NP 21	REUBICACIÓN PUNTO REVENTILACIÓN EXISTENTE 3" (INCLUYE SALIDA POR ENCIMA DE CUBIERTA).	UND	0	$ 110,776.00	$ -	71.00	$ 7,865,238						71.00	$ 7,865,238.00
50	NP 22	MURO EN DRY WALL 1/2" DOBLE CARA E=0,12 MTS	M2	0	$ 77,319.00	$ -	31.91	$ 2,467,249						31.91	$ 2,467,249.29
51	NP 23	MURO EN DRY WALL 1/2" UNA CARA E=0,12 MTS.	M2	0	$ 42,359.00	$ -	95.38	$ 4,040,201						95.38	$ 4,040,201.42
52	NP 24	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA PARA CIELO RASO PVC (NO INCLUYE LAMINA PVC)	M2	0	$ 29,429.00	$ -	102.03	$ 3,002,641						102.03	$ 3,002,640.87
53	NP 25	DESMONTE Y TRASLADO DE MURO PROVISIONALIEN DRYWALL UNA CARA	M2	0	$ 12,333.00	$ -	350.13	$ 4,318,153						350.13	$ 4,318,153.29
54	NP 26	SUMINISTRO E INSTALACIÓN VENTANA EN ALUMINIO. INCLUYE VIDRIO LAMINADO 3+3	M2	0	$ 388,745.00	$ -	102.64	$ 39,900,787	27.54		$ 10,704,988			130.18	$ 50,605,774.19
55	NP 27	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLAS PLASTICAS 20x20 EN FACHADA PARA VENTILACIÓN	UND	0	$ 25,088.00	$ -	8.00	$ 200,704						8.00	$ 200,704.00
56	NP 28	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA DE ACCESO EN VIDRIO TEMPLADO 10mm PARA AUDITORIO (3,00*2,68)m. INCLUYE HERRAJES, CERRADURA Y ACCESORIOS. SEGÚN DISEÑO	UND	0	$ 6,785,000.00	$ -	1.00	$ 6,785,000						1.00	$ 6,785,000.00
57	NP 29	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA DE ACCESO EN VIDRIO TEMPLADO 10mm PARA ACCESO PRINCIPAL (9,36*3,03)m. INCLUYE HERRAJES, CERRADURA Y ACCESORIOS. SEGÚN DISEÑO	UND	0	$ 16,425,000.00	$ -	1.00	$ 16,425,000						1.00	$ 16,425,000.00
58	NP 30	VINILO TIPO I SOBRE PAÑETE TRES MANOS SOBRE ESTUCO	M2	0	$ 9,880.00	$ -	111.88	$ 1,104,123						111.88	$ 1,104,122.80
59	NP 31	VINILO TIPO I SOBRE PAÑETE TRES MANOS SOBRE ESTUCO	ML	0	$ 5,496.00	$ -	187.65	$ 1,031,324						187.65	$ 1,031,324.40
60	NP 32	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CUBIERTA LAMINA POLICARBONATO Cal. 8 mm	M2	0	$ 139,772.00	$ -	144.00	$ 20,127,168	0.20		$ 27,954			144.20	$ 20,155,122.40
61	NP 33	DESMONTE CUBIERTA LAMINA POLICARBONATO EXISTENTE	M2	0	$ 13,100.00	$ -	144.00	$ 1,886,400	0.20		$ 2,620			144.20	$ 1,889,020.00
62	NP 34	SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMINA SUPERBOARD E= 8 MM	M2	0	$ 123,047.00	$ -	93.64	$ 11,522,121						93.64	$ 11,522,121.08

ESE HOSPITAL REGIONAL DE DUITAMA	OBJETO:	GENERALIDADES DEL CONTRATO:		DATOS FINANCIEROS:	
	REFORZAMIENTO DE ESTRUCTURA DE CUBIERTA, CAMBIO DE CUBIERTA, MANTENIMIENTO A LA PINTURA DE FACHADAS Y MEJORAS PARA LA CARPINTERÍA METÁLICA DE LA E.S.E. HOSPITAL REGIONAL DE DUITAMA	PLAZO DE EJECUCIÓN:	5 MESES	VALOR CONTRATADO:	$ 3,720,757,472.00
	CONTRATISTA:	PRÓRROGA No. 01:	7 DIAS CALENDARIO		
	CONSORCIO MEJORAMIENTO HOSPITALARIO 2023 NIT. 901729479-2	PRÓRROGA No. 02:	1 MES		
BALANCE DE OBRA No.5	RL GERARDO IVAN MARQUEZ RINCON C.C. 1,049,638,664	PLAZO ACUMULADO:	6 MESES Y 7 DIAS CALENDARIO	VALOR ANTICIPO:	$ 1,116,227,241.60
	SUPERVISOR DEL CONTRATO	FECHA DE INICIO:	24 DE JULIO DE 2023		
Fecha:	ERIKA NATALIA SANCHEZ MEDINA	FECHA DE SUSPENSIÓN No. 01:	29 DE DICIEMBRE DE 2023	VALOR ADICIÓN No.1:	$ 976,611,605.00
08 MARZO DE 2024	APOYO A SUPERVISIÓN	FECHA DE REINICIO No. 01:	09 DE ENERO DE 2024		
	CARLOS EDUARDO ROBLES SAENZ				
	INTERVENTORIA:	FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	24 DE DICIEMBRE DE 2023	VALOR TOTAL ACUMULADO:	$ 4,697,369,077.00
	SC BUILDING S.A.S. NIT. 901336035-9				
	RL SEBASTIAN ALONSO CAMARGO CASTILLO C.C. 1,049,638,664	FECHA DE TERMINACIÓN ACUMULADA:	10 DE ABRIL DE 2024		

ID	ITEM CONTRACTUAL	DESCRIPCION	CONDICIONES CONTRACTUALES				CONDICIONES ACTUALIZADAS BALANCE 4 DEL 02/02/2024		BALANCE 5					CONDICIONES ACTUALIZADAS BALANCE 5	
			UNIDAD	CANTIDAD	V. UNITARIO	V. TOTAL	CANTIDAD	V. TOTAL	MAYORES	MENORES	VR. CANT MAYORES	VR. CANT MENORES	RESULTADO DE MAYORES / MENORES CANTIDADES BALANCE N°4	CANTIDAD	V. TOTAL
63	NP 35	PROTECCIONES PROVISIONALES EN MADERA PARA PARA EQUIPOS	M2	0	$ 116,154.00	$ -	199.30	$ 23,149,492						199.30	$ 23,149,492.20
64	NP 36	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA DE ACCESO EN VIDRIO TEMPLADO 10mm PARA CONSULTA EXTERNA (4,20*2,70)m. INCLUYE HERRAJES, CERRADURA Y ACCESORIOS, SEGÚN DISEÑO	UND	0	$ 8,075,000.00	$ -	1.00	$ 8,075,000						1.00	$ 8,075,000.00
65	NP 37	RECONFORMACIÓN DE REMATES, FILOS Y/O DILATACIONES EN ESTUCO.	ML	0	$ 8,502.00	$ -	742.54	$ 6,313,075						742.54	$ 6,313,075.08
66	NP 38	REPARACION ALBARDA SOBRE MUROS INCLUYE DEMOLICIÓN LONGITUD PROMEDIO 25 cm	UND	0	$ 26,965.00	$ -	88.00	$ 2,372,920						88.00	$ 2,372,920.00
67	NP 39	RECONSTRUCCIÓN DE ALBARDA SOBRE MUROS INCLUYE DEMOLICIÓN	ML	0	$ 67,463.00	$ -	35.00	$ 2,361,205						35.00	$ 2,361,205.00

ESE HOSPITAL REGIONAL DE DUITAMA	OBJETO:	GENERALIDADES DEL CONTRATO:		DATOS FINANCIEROS:		
	REFORZAMIENTO DE ESTRUCTURA DE CUBIERTA, CAMBIO DE CUBIERTA, MANTENIMIENTO A LA PINTURA DE FACHADAS Y MEJORAS PARA LA CARPINTERÍA METÁLICA DE LA E.S.E. HOSPITAL REGIONAL DE DUITAMA	PLAZO DE EJECUCIÓN:	5 MESES	VALOR CONTRATADO:	$	3,720,757,472.00
	CONTRATISTA:	PRÓRROGA No. 01:	7 DIAS CALENDARIO			
	CONSORCIO MEJORAMIENTO HOSPITALARIO 2023 NIT. 901729479-2	PRÓRROGA No. 02:	1 MES			
BALANCE DE OBRA No.5	RL GERARDO IVAN MARQUEZ RINCON C.C. 1,049,638,664	PLAZO ACUMULADO:	6 MESES Y 7 DIAS CALENDARIO	VALOR ANTICIPO:	$	1,116,227,241.60
	SUPERVISOR DEL CONTRATO	FECHA DE INICIO:	24 DE JULIO DE 2023			
Fecha:	ERIKA NATALIA SANCHEZ MEDINA	FECHA DE SUSPENSIÓN No. 01:	29 DE DICIEMBRE DE 2023	VALOR ADICIÓN No.1:	$	976,611,605.00
06 MARZO DE 2024	APOYO A SUPERVISIÓN	FECHA DE REINICIO No. 01:	09 DE ENERO DE 2024			
	CARLOS EDUARDO ROBLES SAENZ					
	INTERVENTORIA:	FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	24 DE DICIEMBRE DE 2023	VALOR TOTAL ACUMULADO:	$	4,697,369,077.00
	SC BUILDING S.A.S. NIT. 901336035-9					
	RL SEBASTIAN ALONSO CAMARGO CASTILLO C.C. 1,049,638,664	FECHA DE TERMINACIÓN ACUMULADA:	10 DE ABRIL DE 2024			

ID	ITEM CONTRACTUAL	DESCRIPCION	CONDICIONES CONTRACTUALES				CONDICIONES ACTUALIZADAS BALANCE 4 DEL 02/02/2024		BALANCE 5					CONDICIONES ACTUALIZADAS BALANCE 5	
			UNIDAD	CANTIDAD	V. UNITARIO	V. TOTAL	CANTIDAD	V. TOTAL	MAYORES	MENORES	VR. CANT MAYORES	VR. CANT MENORES	RESULTADO DE MAYORES / MENORES CANTIDADES BALANCE N°4	CANTIDAD	V. TOTAL
		SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS				2,862,121,132.30		3,613,350,709.05			35,020,265.31	-35,020,146.05	119.26		3,613,360,828.31
		ADMINISTRACION			20%	572,424,226.46		722,672,141.81			7,004,053.06	-7,004,029.21	23.85		722,672,165.66
		IMPREVISTOS			5%	143,106,056.61		180,668,035.45			1,751,013.27	-1,751,007.30	5.96		180,668,041.42
		UTILIDAD			5%	143,106,056.61		180,668,035.45			1,751,013.27	-1,751,007.30	5.96		180,668,041.42
		VALOR TOTAL DEL PROYECTO				3,720,757,471.99		4,697,358,921.77			45,526,344.90	-45,526,189.86	155.04		4,697,369,078.81
		VALOR TOTAL DEL PROYECTO APROXIMADO AL PESO				3,720,757,472.00		4,697,368,922.00			45,526,345.00	-45,526,190.00	155.00		4,697,369,077.00

CONTRATISTA
CONSORCIO MEJORAMIENTO HOSPITALARIO 2023
R.L. GERARDO IVÁN MÁRQUEZ RINCÓN

SUPERVISOR DEL CONTRATO:
ERIKA NATALIA SANCHEZ MEDINA

INTERVENTORIA
SC BUILDINGS SAS
R.L. SEBASTIAN ALONSO CAMARGO CASTILLO

APOYO A SUPERVISION
CARLOS EDUARDO ROBLES SAENZ

Certificación Bancaria

Bancolombia

Tunja, 8 de Marzo de 2024.

Señor

A quien pueda Interesar

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que CONSORCIO MEJORAMIENTO HOSPITALARIO identificado(a) con NIT No. 901729479 a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el Banco los siguientes productos:

Nombre Producto	Número Producto	Fecha Apertura (aaaa/mm/dd)	Estado
CUENTA AHORROS CUENTA MAESTRA PJ	25800004651	2023/07/06	A ACTIVA

VIGILADO SUPERFINANCIERA COLOMBIA
BANCOLOMBIA S.A. Establecimiento Bancario

* **Importante:** Esta constancia solo hace referencia al producto mencionado anteriormente.
*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia los siguientes números: Medellín - Local: (57-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (57-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (575) 361 88 88 - Cali - Local: (57-2) 554 05 05 – Resto del país: 01800 09 12345. Sucursales Telefónicas en el exterior: España (34) 900 995 717 - Estados Unidos (1) 1 866 379 97 14.

PROCEDIMIENTOS SUPERVISION
ACTA DE RECIBO PARCIAL Nº 6

HOSPITAL REGIONAL DE ZACATECA

ACTA DE RECIBO PARCIAL No. 06
Fecha:
11 MARZO DE 2024

OBJETO:
PERFECCIONAMIENTO DE EN PISO PARA RECUBRIR EL CUBIERTA A CAMBIO DE CUBIERTA QUE ESTABA EN MAL ESTADO Y ACTUALMENTE ESTA CON FILTRACIONES Y GOTERAS LA CUAL AFECTA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LAS AREAS QUE SE ENCUENTRAN DEBAJO DE LA MISMA

CONTRATISTA:
CONSORCIO MEJORAMIENTO HOSPITALARIO 2023 NIT. 901124479-2
EL GERARDO NOMBRE DE LA PERSONA C.C. 1.020.833.054
SUPERVISION DEL CONTRATO
ERIKA NATALIA SANCHEZ MEDINA
APOYO A SUPERVISION
CARLOS EDUARDO ROBLES BAENZ
INTERVENTORIA
3D BUILDINGS SAS NIT. 901338035-9
R. L. SEBASTIAN ALONSO CAMARGO CASTILLO C.C. 1.020.844.872
DIRECTOR INTERVENTORIA: SERGIO CAMARGO

GENERALIDADES DEL CONTRATO:

FECHA DE INICIO:	24 DE JULIO DE 2023
PLAZO DE EJECUCIÓN:	5 MESES
PRÓRROGA No. 01:	7 DIAS CALENDARIO
Fecha de inicio prórroga No. 1	29 de septiembre de 2023
Fecha de Prórroga No. 1	5 de enero de 2024
PRÓRROGA No. 02:	30 DIAS CALENDARIO
ADICIÓN No. 1 y PRÓRROGA No. 03:	90 DIAS CALENDARIO
PLAZO DE EJECUCIÓN ACUMULADO:	5 MESES Y 6 DIAS CALENDARIO
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	24 DE DICIEMBRE DE 2023
FECHA DE TERMINACIÓN ACUMULADA:	10 DE ABRIL DE 2024

DATOS FINANCIEROS:

VALOR CONTRATAD
VALOR ANTICIP
VALOR ADICIÓN No
VALOR TOTAL ACUMULADO
ACUMULADO AMORTIZACIÓN ANTICIP
VALOR PENDIENTE POR AMORTIZ
VALOR PENDIENTE POR PAGA
VALOR ACTA DE RECIBO PARCIAL No
VALOR ACTA DE RECIBO PARCIAL No
VALOR ACTA DE RECIBO PARCIAL No
VALOR ACTA DE RECIBO PARCIAL No
VALOR ACTA DE RECIBO PARCIAL No
VALOR PRESENTE ACTA DE RECIBO PARCIAL No

CONDICIONES CIRCULARES							CONDICIONES ACTUALIZADAS A BALANCE 5. DEL 07/03/2024			ACTA DE RECIBO PARCIAL No. 01 DEL 16/10/2023			ACTA DE RECIBO PARCIAL No. 02 DEL 29/11/2023			ACTA DE RECIBO PARCIAL No. 03 DEL 20/12/2023			ACTA DE RECIBO PARCIAL No. 04			ACTA DE RECIBO PARCIAL No. 05			PRESENTE ACTA DE RECIBO PARCIAL No. 06			TOTAL AC	
ID	ITEM	DESCRIPCION DE LA OBRA	UND	CANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANT. (ADICIONAL)	CANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR UNITARIO
		CUBIERTA																											
1	1	LEVANTAMIENTO REPARTIDO OBRA ARQUITECTONICA ALTURA MAYOR DE 3 MTS Y MENOR A 6 MTS	M2	5,561.00	$ 8,357.00	$ 33,040,177.00	-	5,673.85	$ 8,357.00	$ 32,243,193.95		8,357.00	$ -		8,357.00	$ -		8,357.00	$ -		8,357.00	$ -		8,357.00	$ -		8,357.00	$ -	0.00	8,357.00
2	2	DESMONTE CUBIERTAS TELA DE ASBESTO Y/O ASBESTO CEMENTO CANALETA ALTURA MAYOR DE 2 MTS INCLUYE POLEAS Y VARILLAS	M2	5,338.00	$ 11,928.00	$ 63,677,664.00	-	5,819.25	$ 11,928.00	$ 67,462,098.51	5,668.97	11,928.00	$ 12,750,951.21	811.64	11,928.00	$ 11,911,227.81	1,213.50	$ 11,928.00	$ 14,782,217.37	766.12	$ 11,928.00	$ 9,462,564.48	764.27	$ 11,928.00	$ 9,361,158.32	-	$ 11,928.00	$ -	4,870.23	11,928.00
3	3	TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL RESIDUOS DE ASBESTO CEMENTO A SITIO AUTORIZADO	KG	63,672.00	$ 800.00	$ 50,941,200.00	-	42,494.97	$ 800.00	$ 41,696,442.00		800.00	$ -	31,700.00	800.00	$ 24,236,800.00	28,340.00	$ 800.00	$ 18,404,000.00	8,200.00	$ 800.00	$ 6,560,000.00	12,530.00	$ 800.00	$ 8,211,000.00	-	$ 800.00	$ -	8,209.00	800.00
4	4	SUMINISTRO E INSTALACION CUBIERTA SISTEMA PANEL METALICO DE ALIVIO - CAL 26 TIPO SANDWICH, CONFORMADO EXPANDIDO, ACABADO EN PINTURA POLIESTER	M2	4,824.9	$ 203,928.00	$ 983,532,794.52	-	4,969.73	$ 203,928.00	$ 1,013,539,311.44	1,068.17	203,928.00	$ 217,811,203.56	931.88	203,928.00	$ 190,060,841.27	681.00	$ 203,928.00	$ 138,867,068.00	638.78	$ 203,928.00	$ 130,253,796.55	764.27	$ 203,928.00	$ 155,853,756.56	6,451	$ 203,928.00	$ 1,317,210.00	6,715.82	203,928.00
5	5	SUMINISTRO E INSTALACION CUBIERTA SISTEMA PANEL METALICO DE ALIVIO - CAL 26 TIPO SANDWICH, CONFORMADO EXPANDIDO, ACABADO EN PINTURA POLIESTER, EXCEPCIONES A BASISTENCIAL	M2	7,107.00	$ 218,159.00	$ 554,863,990.00	+	704.92	$ 218,159.00	$ 153,759,961.68		218,159.00	$ -		218,159.00	$ -	378.50	$ 218,159.00	$ 82,578,671.50	326.43	$ 218,159.00	$ 71,215,615.63		218,159.00	$ -	704.92	218,159.00
6	6	SUMINISTRO E INSTALACION DE FLANCHE EN LAMINA	KL	942.00	$ 43,217.00	$ 28,139,814.00	+	1,231.99	$ 43,217.00	$ 53,236,040.13	297.75	43,217.00	$ 9,727,773.75	382.03	43,217.00	$ 13,536,440.51	323.50	$ 43,217.00	$ 13,978,647.50	282.70	$ 43,217.00	$ 12,216,506.95	147.17	$ 43,217.00	$ 7,072,065.89	-	$ 43,217.00	$ -	1,231.15	43,217.00
7	7	SUMINISTRO E INSTALACION PERFILERIA METALICA PARA ESTRUCTURA DE CUBIERTA, INCLUIDOS TIPOS Y CALIBRES SEGUN DISEÑO (CORREAS Y SUPLEMENTOS)	KG	80,640.70	$ 17,133.00	$ 971,955,295.07	-	63,849.77	$ 17,133.00	$ 1,077,818,409.41	15,937.66	17,133.00	$ 273,091,794.13	13,662.13	17,133.00	$ 206,357,621.42	11,517.87	$ 17,133.00	$ 197,373,704.34	9,250.00	$ 17,133.00	$ 158,502,250.21	10,760.18	$ 17,133.00	$ 184,347,308.61	1,010.54	$ 17,133.00	$ 17,316,000.00	87,782.93	17,133.00
8	8	SUMINISTRO E INSTALACION PERFILERIA METALICA PARA ESTRUCTURA DE CUBIERTA, INCLUIDOS TIPOS Y CALIBRES SEGUN DISEÑO (CORREAS Y SUPLEMENTOS) INCLUIDAS CONEXIONES AREA ASISTENCIAL	KG	5,616.00	$ 17,000.00	$ 107,472,000.00	-	6,783.95	$ 20,000.00	$ 135,679,000.00		20,000.00	$ -		20,000.00	$ -	5,067.50	$ 20,000.00	$ 101,351,000.00	4,715.00	$ 20,000.00	$ 94,707,357.70		20,000.00	$ -	516	$ 20,000.00	$ 10,320.00	9,783.00	20,000.00
9	9	SUMINISTRO, TRANSPORTE, FABRICACIÓN, ENSAMBLAJE Y MONTAJE DE ESTRUCTURA METALICA (GERCHAR)	KG	1,000.00	$ 23,870.00	$ 23,870,000.00	-	0.00	$ 23,870.00	$ -		23,870.00	$ -		23,870.00	$ -		23,870.00	$ -		23,870.00	$ -		23,870.00	$ -		23,870.00	$ -	0.00	23,870.00
10	10	SUMINISTRO E INSTALACION CANALETA EN LAMINA CAL 22	KL	920.00	$ 106,481.00	$ 97,962,520.00	-	0.00	$ 106,481.00	$ 2,254,413.00		106,481.00	$ -		106,481.00	$ -		106,481.00	$ -		106,481.00	$ -		106,481.00	$ -		106,481.00	$ -	0.00	106,481.00
11	11	SUMINISTRO E INSTALACION CIMBRA DE METALICO A ALTURA MAYOR DE 3 MTS	KL	300.00	$ 83,070.00	$ 27,231,120.00	-	294.00	$ 83,070.00	$ 25,195,980.00	47.35	83,070.00	$ 3,933,064.50	59.50	83,070.00	$ 4,942,965.00	54.00	$ 83,070.00	$ 4,485,780.00	53.05	$ 83,070.00	$ 4,406,363.50	43.11	$ 83,070.00	$ 4,137,017.70	-	$ 83,070.00	$ -	256.41	83,070.00
12	12	LIMPIEZA DE CANAL EXISTENTE	KL	958.00	$ 5,155.00	$ 3,414,543.20	-	646.67	$ 5,155.00	$ 3,334,133.85	123.33	5,155.00	$ 635,789.15	120.86	5,155.00	$ 623,013.40	160.00	$ 5,155.00	$ 824,800.00	102.25	$ 5,155.00	$ 527,054.75	63.68	$ 5,155.00	$ 328,180.50	-	$ 5,155.00	$ -	580.42	5,155.00
13	13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN IMPERMEABILIZANTE MANTO ASFALTICO	KL	438.00	$ 73,272.00	$ 32,098,136.52	-	596.67	$ 73,272.00	$ 47,417,748.24	121.33	73,272.00	$ 8,773,911.75	120.86	73,272.00	$ 7,564,160.96	100.00	$ 73,272.00	$ 7,327,200.00	102.25	$ 73,272.00	$ 7,353,501.00	63.68	$ 73,272.00	$ 5,000,308.00	-	$ 73,272.00	$ -	580.42	73,272.00
14	14	PINTURA DE LA ESTRUCTURA METALICA	KG	374,617.70	$ 3,336.00	$ 723,540,974.44	-	717,32.83	$ 3,336.00	$ 242,852,237.52	15,937.66	3,336.00	$ 62,105,220.96	11,568.13	3,336.00	$ 38,592,843.73	11,517.87	$ 3,336.00	$ 38,425,497.16	13,542.21	$ 3,336.00	$ 28,406,137.26	12,760.00	$ 3,336.00	$ 42,569,497.37	1,010.54	$ 3,336.00	$ 3,370,944.00	67,442.22	3,336.00
		FACHADA																											
15	15	LIMPIEZA DE FACHADA CON HIDROLAVADORA	M2	44,037.0	$ 2,769.00	$ 13,254,720.00	-	4,123.06	$ 2,769.00	$ 13,727,691.12	1,358.74	2,769.00	$ 3,763,059.65	1,067.07	2,769.00	$ 2,955,126.64	307.50	$ 2,769.00	$ 851,467.50		$ 2,769.00	$ -		$ 2,769.00	$ -		$ 2,769.00	$ -	2,781.30	2,769.00
16	16	LIMPIEZA DE FACHADA CON HIDROLAVADORA ANCHO MENOR A 3 MTS	ML	2,581.69	$ 1,395.00	$ 3,601,574.77	+	3,014.39	$ 1,395.00	$ 4,205,918.25	1,358.74	1,395.00	$ 1,895,763.30	823.71	1,395.00	$ 701,210.45	118.40	$ 1,395.00	$ 276,318.00		$ 1,395.00	$ -		$ 1,395.00	$ -		$ 1,395.00	$ -	5,991.25	1,395.00
17	17	VELOCIDAD ESTUCO TIPO SUPERFICIE LISO	ML	775	$ 36,672.00	$ 28,419,600.00	-	4,00.32	$ 36,672.00	$ 15,686,438.83	295.00	36,672.00	$ 10,818,481.28	5.00	36,672.00	$ 183,360.00	41.50	$ 36,672.00	$ 1,522,488.00		$ 36,672.00	$ -		$ 36,672.00	$ -		$ 36,672.00	$ -	3.49.00	36,672.00
18	18	REPARANTE	M2	4,109.11	$ 6,933.00	$ 28,413,197.63	-	4,607.06	$ 6,933.00	$ 19,233,854.64	1,764.42	6,933.00	$ 12,233,854.64	1,267.07	6,933.00	$ 8,784,365.76	696.79	$ 6,954.00	$ 5,067,567.42		$ 6,933.00	$ -	2,161.18	$ 6,933.00	$ 14,985,000.00	8,473.56	6,933.00
19	19	APLANANTE ANCHO MENOR A 0.50MTS	ML	884.461	$ 4,409.00	$ 3,900,000.21	+	3,914.06	$ 4,409.00	$ 17,648,200.52	0.00	4,409.00	$ -		4,409.00	$ -	2,724.66	$ 4,409.00	$ 12,010,037.97		$ 4,409.00	$ -		$ 4,409.00	$ -		$ 4,409.00	$ -	2,784.98	4,409.00
20	21	PINTURA FACHADA EN VINILO PARA EXTERIORES	M2	4,664.74	$ 17,556.00	$ 77,429,217.83	-	7,362.36	$ 17,556.00	$ 81,097,607.83	1,321.71	17,556.00	$ 19,762,119.42	258.50	17,556.00	$ 4,714,305.44	1,213.13	$ 17,556.00	$ 21,968,185.56		$ 17,556.00	$ -	2,361.10	$ 17,556.00	$ 41,450,000.00	16,202.29	17,556.00
21	22	PINTURA FACHADA EN VINILO PARA EXTERIORES ANCHO MENOR A 0.50MTS	ML	2,965.61	$ 8,799.00	$ 26,921,309.34	+	2,879.78	$ 8,799.00	$ 25,332,845.69	994.25	8,799.00	$ 8,663,303.26	76.68	8,799.00	$ 674,707.32	1,304.05	$ 8,799.00	$ 11,479,956.95		$ 8,799.00	$ -		$ 8,799.00	$ -		$ 8,799.00	$ -	2,357.58	8,799.00
22	23	PINTE SUPERFICIE LISO DO	KG	825	$ 30,757	$ 25,374,525.00	-	213.63	$ 30,757.00	$ 6,643,315.00	223.40	30,757.00	$ 6,872,142.38		30,757.00	$ -	43.85	$ 30,757.00	$ 1,401,230.34		$ 30,757.00	$ -		$ 30,757.00	$ -		$ 30,757.00	$ -	271.29	30,757.00
23	24	PINTURA ESPECIALIZADA EN DOS ANCHO MENOR A 0.50MTS	ML	500	$ 18,336	$ 9,168,000.00	-	579.64	$ 18,336.00	$ 3,307,120.80	162.34	18,336.00	$ 2,976,169.56	125.24	18,336.00	$ 1,959,582.58	43.00	$ 18,336.00	$ 914,120.00		$ 18,336.00	$ -		$ 18,336.00	$ -		$ 18,336.00	$ -	317.61	18,336.00
24	25	REPARACIÓN FISS	ML	500	$ 9,634	$ 5,540,249.00	+	517.30	$ 9,634.00	$ 4,966,764.20		9,634.00	$ -	126.61	9,634.00	$ 1,219,613.54	43.00	$ 9,634.00	$ 422,262.00		$ 9,634.00	$ -		$ 9,634.00	$ -		$ 9,634.00	$ -	179.37	9,634.00
25	29	FACHADA EN GRANILAS	M2	625	$ 33,819	$ 27,000,575.00	+	1,341.93	$ 33,819.00	$ 41,212,730.67	527.19	33,819.00	$ 17,826,172.64	320.32	33,819.00	$ 10,831,446.83	180.43	$ 33,819.00	$ 6,101,643.81		$ 33,819.00	$ -		$ 33,819.00	$ -		$ 33,819.00	$ -	1,200.63	33,819.00
		VENTANERIA						0.00																					
26	27	ESTRUCTURA PARA LA REALIZACION DE SUMIDERO HASTA 1.00 DE ANCHO	UN	2,161.00	$ 7,304	$ 15,641,275.10	-	2,020.3	$ 7,304.00	$ 14,756,360.00		7,304.00	$ -					7,304.00	$ -					7,304.00	$ -		7,304.00	$ -	0.00	7,304.00
27	28	VENTANERIA ALUMINIO PROTECTANTE CON VIDRIO TRASLUCIDO	M2	70	$ 215,964	$ 15,117,480.00	-	68.71	$ 215,964.00	$ 14,838,454.44		215,964.00	$ -	3.50	215,964.00	$ 2,772,544.18	20.94	$ 215,964.00	$ 4,522,757.79		$ 215,964.00	$ -		$ 215,964.00	$ -	23.33	$ 215,964.00	$ 5,041,203.26	65.72	215,964.00
		OTROS						0.00																					
28	30	LINEA DE VIDA HORIZONTAL	UN	4	$ 2,333,571.00	$ 9,334,284.00	+	0.00	$ 2,333,571.00	$ 14,668,428.00	2.00	2,333,571.00	$ 9,334,284.00	2.00	2,333,571.00	$ 4,667,142.00	0.00	2,333,571.00	$ -		2,333,571.00	$ -		2,333,571.00	$ -		2,333,571.00	$ -	0.00	2,333,571.00
ITEMS ADICIONALES								0.00																					0.00
29	NP1	SUMINISTRO E INSTALACION DE ANCLAJE CON VARILLA ROSCADA No. 3 EN ACERO ASTM A 36 CON EPOXICO, TUERCA Y ARANDELA	UND		$ 19,352.00		+	674.00	$ 19,352.00	$ 13,045,648.00							540.00	$ 19,352.00	$ 10,450,080.00	350.00	$ 19,352.00	$ 6,773,200.00	338.00	$ 19,352.00	$ 6,541,576.00	-	$ 19,352.00	$ -	1,912.00	19,352.00
30	NP2	DEMOLICION MURO DE LADRILLO E=0.15 MTS	M2		$ 13,829.00		+	346.81	$ 13,829.00	$ 4,915,987.49							99.32	$ 13,829.00	$ 1,373,565.78	71.05	$ 13,829.00	$ 982,519.00		$ 13,829.00	$ -		$ 13,829.00	$ -	134.38	13,829.00
31	NP3	RASPADO Y DEMOLICION SUPERFICIE MURO FACHADA	M2		$ 10,154.00		+	696.37	$ 10,154.00	$ 9,403,378.06							189.57	$ 10,154.00	$ 2,561,003.42	32.76	$ 10,154.00	$ 332,673.00		$ 10,154.00	$ -		$ 10,154.00	$ -	224.20	10,154.00
32	NP4	MOVIMIENTO DE ESCOMBROS, INCLUYE CARGUE, RETIRO Y DISPOSICION FINAL	-		$ 6,167.00		+	1,161.84	$ 6,167.00	$ 6,915,794.21							644.64	$ 6,167.00	$ 3,975,644.88	494.4	$ 6,167.00	$ 3,051,664.80		$ 6,167.00	$ -		$ 6,167.00	$ -	696.87	6,167.00
33	NP5	RESANE SUPERFICIE LISO FACHADA	M2		$ 17,505.00		+	407.64	$ 17,505.00	$ 7,136,617.20							151.87	$ 17,505.00	$ 2,658,756.52	0.00	$ 17,505.00	$ 47,625.00		$ 17,505.00	$ -		$ 17,505.00	$ -	151.87	17,505.00
34	NP6	RESANE SUPERFICIE MURO FACHADA ANCHO MENOR A 0.50 m	M2		$ 13,829.00		+	1,097.10	$ 13,829.00	$ 13,191,709.72							190.23	$ 13,829.00	$ 2,630,838.58	24.81	$ 13,829.00	$ 342,974.49		$ 13,829.00	$ -		$ 13,829.00	$ -	963.82	13,829.00
35	NP7	VENTANA EN ALUMINIO CORREDIZA	M2		$ 346,824.00		+	259.02	$ 346,824.00	$ 89,803,845.12										0.00	$ 346,824.00	$ -		$ 346,824.00	$ -	87.75	$ 346,824.00	$ 30,435,000.12	87.75	346,824.00
36	NP8	CEMENTO VERDE	M2		$ 3,045.47		+	322.65	$ 3,045.47	$ 1,024,413.94							32.29	$ 3,045.47	$ 98,340.38	97.84	$ 3,045.47	$ 297,911.75		$ 3,045.47	$ -		$ 3,045.47	$ -	49.07	3,045.47
37	NP9	DESMONTE MARCOS PUERTAS Y VENTANAS	M2		$ 13,829.00		+	333.25	$ 13,829.00	$ 4,547,122.25							73.92	$ 13,829.00	$ 478,507.71	19.55	$ 13,829.00	$ 267,711.75		$ 13,829.00	$ -		$ 13,829.00	$ -	55.74	13,829.00

PROCEDIMIENTO: SUPERVISION
ACTA DE RECIBO PARCIAL N° 6

OBJETO:

ESE HOSPITAL REGIONAL DE UYUTAMA

ACTA DE RECIBO PARCIAL No. 06

Fecha:
10 MARZO DE 2024

PERFORACIÓN DE 651 PUNTOS DE CUBIERTA, MANTENIMIENTO A LOSAS Y MUROS DE FACHADA Y VELOVIA PARA LA EMPRESA QUE ACTÁNASE LADRILLOMONTE A PISOS, DESDE AL

CONTRATISTA:

CONSORCIO MEJORAMIENTO HOSPITALARIO 2023
REPRESENTANTE LEGAL DEL CONTRATISTA
ERIKA NATALIA SANCHEZ MEDINA
APOYO A SUPERVISIÓN
CARLOS EDUARDO AGUILERA SÁNCHEZ
INTERVENTORIA

NIT. 901234170-3
C.C. 1.023.444.654

SG SUMINISTROS
R.L. SEBASTIAN ALONSO CAMARGO CASTILLO
DIRECTOR INTERVENTORIA, SERGIO CAMACHO

NIT. 901123005-9
C.C. 1.049.644.870

GENERALIDADES DEL CONTRATO:

FECHA DE INICIO:	24 DE JULIO DE 2023
PLAZO DE EJECUCIÓN	8 MESES
PRÓRROGA No. 01	7 DIAS CALENDARIO
Fecha de suspensión No. 1	28 de febrero de 2024
Fecha de Reinicio No. 1	9 de marzo de 2024
PRÓRROGA No. 02	30 DIAS CALENDARIO
ADICIÓN No. 1 Y PRÓRROGA No. 03	90 DIAS CALENDARIO
PLAZO DE EJECUCIÓN ACUMULADO:	8 MESES Y 4 DIAS CALENDARIO
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	24 DE DICIEMBRE DE 2023
FECHA DE TERMINACIÓN ACUMULADO:	10 DE ABRIL DE 2024

LAS DE TRAMIENTO:

VALOR CONTRATAL
VALOR ANTICI
VALOR ADICIÓN No
VALOR TOTAL ACUMULAD
VALOR ACUMULADO AMORTIZACIÓN ANTICI
VALOR PENDIENTE POR AMORTIZ
VALOR PENDIENTE POR PAG
VALOR ACTA DE RECIBO PARCIAL N
VALOR ACTA DE RECIBO PARCIAL N
VALOR ACTA DE RECIBO PARCIAL N
VALOR ACTA DE RECIBO PARCIAL N
VALOR ACTA DE RECIBO PARCIAL N
VALOR PRESENTE ACTA DE RECIBO PARCIAL N

CONDICIONES ORIGINALES						CONDICIONES ACTUALIZADAS A BALANCE No. DEL 07/03/2024				ACTA DE RECIBO PARCIAL No. 01 DEL 16/10/2023			ACTA DE RECIBO PARCIAL No. 02 DEL 29/11/2023			ACTA DE RECIBO PARCIAL No. 03 DEL 29/12/2023			ACTA DE RECIBO PARCIAL No. 04			ACTA DE RECIBO PARCIAL No. 05			PRESENTE ACTA DE RECIBO PARCIAL No. 06			TOTAL AC	
ÍTEM	DESCRIPCION DE LA OBRA	UND	CANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANT. (ADICIONAL)	CANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR UNITARIO
11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN POSTE METÁLICO H=3.0 M PARA ANCLAJE DE LÍNEA DE VIDA PROVISIONAL	UND		$ 580,000.00		+ 10.00	$ 580,000.00	$ 5,800,000.00				10.00	$ 580,000.00	$ 5,800,000.00	0.00	$ 580,000.00	$ -		$ 580,000.00	$ -		580.000.00	$ -		$ 580,000.00	$ -	10.00	$ 580,000.00	
21	SUMINISTRO E INSTALACIÓN POSTE METÁLICO H=3.0 M PARA ANCLAJE DE LÍNEA DE VIDA PROVISIONAL	UND		$ 158,874.00		+ 2.00	$ 158,874.00	$ 317,748.00				2.00	$ 158,874.00	$ 317,748.00	0.00	$ 158,874.00	$ -		$ 158,874.00	$ -		158.874.00	$ -		$ 158,874.00	$ -	2.00	$ 158,874.00	
40	RETIRO DE REJA METÁLICA	M2		$ 14,421.17		+ 0.00	$ 14,421.17	$ -					$ 14,421.17	$ -		$ 14,421.17	$ -		$ 14,421.17	$ -		14.421.17	$ -		$ 14,421.17	$ -	0.00	$ 14,421.17	
41	CAMBIO PERFILERIA REJAS CERRAMIENTO FERRETRAL ACERO ESTRUCT. ASTM A-36, (INCLUYENTO DE MATERIALES)	KG		$ 18,186.00		+ 300.00	$ 18,186.00	$ 5,455,800.00				300.00	$ 18,186.00	$ 5,455,800.00	320.00	$ 18,186.00	$ -		$ 18,186.00	$ -		18.186.00	$ -		$ 18,186.00	$ -	320.00	$ 18,186.00	
42	MANTENIMIENTO REJA CERRAMIENTO PERIMETRAL H=1.57 (INCLUYE LIJADO, LIMPIEZA CON CEPILLO CERDA METÁLICA, PINTADO CON BROCHA RODILLO Y PULVERIZADO ESMALTE)	KL		$ 109,775.00		+ 2,300.65	$ 109,775.00	$ 252,523,553.75				2300.0	$ 109,775.00	$ 252,523,553.75	190.65	$ 109,775.00	$ -		$ 109,775.00	$ -		109.775.00	$ -		$ 109,775.00	$ -	2290.65	$ 109,775.00	
43	RETIRO DE CIELO RASO DRYWALL UNA CARA ANCHO LISO A 60 cm	KL		$ 28,132.00		+ 0.07	$ 28,132.00	$ 3,954,782.24																			0.00	$ 28,132.00	
44	SUMINISTRO EN DRYWALL ANCHO VARIOS A 0.30 m	KL		$ 13,909.00		+ 535.66	$ 13,909.00	$ 8,334,961.94																			184.71	$ 13,909.00	
45	SUMINISTRO DE CIELO RASO ESTANDAR DE PVC NO INCLUYE ESTRUCTURA	M2		$ 5,873.00		+ 2,737.47	$ 5,873.00	$ 16,358,434.62																			2,784.18	$ 5,873.00	
46	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CIELO RASO PVC	M2		$ 9,013.00		+ 2,452.39	$ 9,013.00	$ 22,099,132.79																			2,452.39	$ 9,013.00	
47	SUMINISTRO E INSTALACION DE CIELO RASO EN LAMINA DE PVC INCLUYE ESTRUCTURA	M2		$ 74,951.00		+ 222.85	$ 74,951.00	$ 20,452,196.50																			272.85	$ 74,951.00	
48	SUMINISTRO PUNTO REVERTILACIÓN SENCILLO INCLUYE SALIDA PARA REGILLA DE CUBIERTA	UND		$ 60,360.00		+ 12.00	$ 60,360.00	$ 724,320.00																			0.00	$ 60,360.00	
49	REUBICACIÓN PUNTO REVERTILACIÓN SENCILLO INCLUYE SALIDA PARA REGILLA DE CUBIERTA	UND		$ 113,778.00		+ 71.00	$ 113,778.00	$ 7,855,218.00																			69.00	$ 113,778.00	
50	MURO EN DRY WALL 92" DOBLE CARA E=0.12 MTS	M2		$ 77,319.00		+ 34.91	$ 77,319.00	$ 3,497,249.29																			0.00	$ 77,319.00	
51	MURO EN DRY WALL 92" UNA CARA + 0.10 MTS	M2		$ 42,352.00		+ 93.58	$ 42,352.00	$ 4,046,521.42																			0.00	$ 42,352.00	
52	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA PARA CIELO RASO PVC UND INCLUYE LAMINA PVC	M2		$ 28,429.00		+ 102.53	$ 28,429.00	$ 3,022,441.87																			0.00	$ 28,429.00	
53	DESMONTE Y TRASLADO DE MURO PROVISIONAL EN DRYWALL UNA CARA	M2		$ 12,333.00		+ 330.13	$ 12,333.00	$ 4,191,153.29																			0.00	$ 12,333.00	
54	SUMINISTRO E INSTALACION VENTANA EN MALLA NO. 8 INCLUYE VIDRIO LAMINADO 3+3	M2		$ 154,245.00		+ 139.18	$ 154,245.00	$ 21,465,774.10																			139.18	$ 154,245.00	
55	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLAS PLASTICAS 20x20 DE ENTRAMADA PARA VENTILACION	UND		$ 29,068.00		+ 0.00	$ 29,068.00	$ 290,700.00																			0.00	$ 29,068.00	
56	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA DE ACCESO EN VIDRIO TEMPLADO 10mm PARA ACCESO PRINCIPAL DE 2.70 m, INCLUYE HERRAJES, CERRADURA Y ACCESORIOS, SEGÚN DISEÑO	GLB		$ 9,715,000.00		+ 1.00	$ 9,715,000.00	$ 9,715,000.00																			1.00	$ 9,715,000.00	
57	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA DE ACCESO EN VIDRIO TEMPLADO 10mm PARA ACCESO PRINCIPAL DE 2.70 m, INCLUYE HERRAJES, CERRADURA Y ACCESORIOS, SEGÚN DISEÑO	GLB		$ 18,435,000.00		+ 1.00	$ 18,435,000.00	$ 18,435,000.00																			1.00	$ 18,435,000.00	
58	VELO TIPO 1 SOBRE MURETE TRES MANOS SOBRE ESTUCO	M2		$ 8,869.00		+ 111.26	$ 8,869.00	$ 1,304,413.80																			0.00	$ 8,869.00	
59	VELO TIPO 1 SOBRE MURETE TRES MANOS SOBRE ESTUCO	UL		$ 5,429.00		+ 137.65	$ 5,429.00	$ 1,561,303.45																			0.00	$ 5,429.00	
60	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CUBIERTA ALUMINIO PARA POLICARBONATO CAL 6 mm	M2		$ 139,772.00		+ 144.29	$ 139,772.00	$ 20,166,123.43																			141.20	$ 139,772.00	
61	DESMONTE CUBIERTA LAMINA POLICARBONATO EXISTENTE	M2		$ 13,100.00		+ 144.29	$ 13,100.00	$ 1,891,009.00																			141.20	$ 13,100.00	
62	SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMINA SUPERBOARD E= 8MM	ME		$ 123,047.00		+ 0.00	$ 123,047.00	$ 19,332,379.00																			0.00	$ 123,047.00	
63	PROTECCIONES PROVISIONALES EN MADERA PARA EQUIPOS	M2		$ 118,154.00		+ 170.00	$ 118,154.00	$ 20,140,873.20																			170.84	$ 118,154.00	
64	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA DE ACCESO EN VIDRIO TEMPLADO 10mm PARA CONSULTA EXTERNA (4.21 m), INCLUYE HERRAJES, CERRADURA Y ACCESORIOS, SEGÚN DISEÑO	UND		$ 8,874,000.00		+ 1.00	$ 8,874,000.00	$ 8,874,000.00																			1.00	$ 8,874,000.00	
65	DESCOPE MANUAL (INCLUYE DESMONTE, RETIRO Y DISPOSICIÓN EN ESCOMBRERA)	UL		$ 8,903.00		+ 742.84	$ 8,903.00	$ 6,613,975.48																			0.00	$ 8,903.00	
66	REPARACIÓN ALBAÑIL SOBRE MURO PORTANTE DESPUES DE RETIRO PROMEDIO 25 cm	UND		$ 28,999.00		+ 84.00	$ 28,999.00	$ 2,435,916.00																			0.00	$ 28,999.00	
67	RECOLECTAR ESCOMBROS ALBAÑILERIA SOBRE EL PISO (INCLUYE DEMOLICIÓN)	KL		$ 67,493.00		+ 20.00	$ 67,493.00	$ 2,361,755.00																			0.00	$ 67,493.00	
SUB-TOTAL COSTOS DIRECTOS					$ 3,430,127,132.70			$ 3,613,362,709.05			$ 672,855,724.83			$ 294,139,934.94			$ 736,572,254.90			$ 451,707,421.95			$ 413,127,819.62			$ 329,782,342.52				
ADMINISTRACIÓN			20%		$ 575,424,626.40			$ 722,672,141.81			$ 134,571,144.97			$ 58,827,986.99			$ 147,314,450.98			$ 90,341,484.39			$ 82,625,563.92			$ 65,956,468.50				
IMPREVISTOS			5%		$ 143,856,156.61			$ 180,668,035.45			$ 33,642,786.24			$ 14,706,996.75			$ 36,828,612.74			$ 22,585,371.10			$ 20,640,954.81			$ 16,489,117.12				
UTILIDAD			5%		$ 143,856,156.61			$ 180,668,035.45			$ 33,642,786.24			$ 14,706,996.75			$ 36,828,612.74			$ 22,585,371.10			$ 20,640,954.81			$ 16,489,117.12				
VALOR TOTAL DEL CONTRATO - COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS					$ 3,730,711,071.30			$ 4,697,369,921.56			$ 874,712,661.42			$ 382,381,915.43			$ 957,214,911.36			$ 587,219,613.36			$ 537,035,092.87			$ 429,117,040.90				
VALOR TOTAL DEL CONTRATO AJUSTADO AL PESO					$ 3,730,711,071.30			$ 4,697,369,921.56			$ 874,712,661.42			$ 382,381,915.43			$ 957,214,911.36			$ 587,219,613.36			$ 537,035,092.87			$ 429,117,040.90				

VALOR TOTAL PRESENTE ACTA DE RECIBO PARCIAL No. 06	$ 429,117,040.90
AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO - PRESENTE ACTA EN VALOR PACTADO DEL CONTRATO	$ 139,781,525.10
VALOR TOTAL PRESENTE ACTA DE RECIBO PARCIAL No. 6 - BIENES AMORTIZACIÓN	$ 289,335,515.80

VALOR EN LETRAS PRESENTE ACTA DE RECIBO PARCIAL No.6: Cuatrocientos veintinueve millones ciento diecisiete mil cuarenta y uno pesos con 0/100 m/cte

BALANCE PRESUPUESTAL

VALOR INICIAL CONTRATO	$	3,730,711,071.30	VALOR ANTICIPO	$	1,119,213,321.39
VALOR ADICIONES	$	870,441,150.00	% ANTICIPO		30.00%
VALOR ACUMULADO:	$	4,601,152,221.30			

ACTA DE RECIBO PARCIAL No.		VALOR ACTA	% PAGADO	VALOR AMORTIZACIÓN ANTICIPO		VALOR SALDO POR AMORTIZAR	% PAGADO ACUMULADO
1	$	874,712,661.00	19.01%	$	262,413,798.30	$ 855,813,594.00	19.01%
2	$	382,381,915.00	8.31%	$	114,714,574.50	$ 822,912,317.50	27.32%
3	$	1,001,195,295.00	21.75%	$	300,358,588.50	$ 522,553,729.00	49.07%
4	$	587,219,613.00	12.76%	$	176,165,883.90	$ 346,387,845.10	61.83%
5	$	537,035,092.00	11.67%	$	-	$ 346,387,845.10	73.50%
6	$	429,117,040.90	9.33%	$	128,735,112.27	$ 217,652,732.83	82.83%
7	$	-	0.00%	$	-	$ 217,652,732.83	82.83%
8	$	-	0.00%	$	-	$ 217,652,732.83	82.83%
TOTAL	$	4,013,661,237.90	87.23%	$	982,388,157.47	$ 217,652,732.83	82.83%

Firmo la presente de la presente acta, de los cuales ejecutados fueron debidamente verificados y aceptados a satisfacción por el supervisor del contrato.

No siendo otro el motivo de la presente acta, se firma la presente acta por la persona autorizada para ello en nombre de quienes en ella intervinieron, a los: CINCO (5) días del mes de MARZO de 2024

CONTRATISTA
CONSORCIO MEJORAMIENTO HOSPITALARIO 2023
REPRESENTANTE LEGAL DEL CONSORCIO

SUPERVISOR
SG SUMINISTROS
REPRESENTANTE LEGAL

SUPERVISOR DEL CONTRATO
ERIKA NATALIA SANCHEZ MEDINA

APOYO A SUPERVISIÓN
CARLOS EDUARDO AGUILERA SÁNCHEZ


MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA ACTA PARCIAL N° 6

CONTRATO DE OBRA 004 de 2023	REFORZAMIENTO DE ESTRUCTURA DE CUBIERTA, CAMBIO DE CUBIERTA, MANTENIMIENTO A LA PINTURA DE FACHADAS Y MEJORAS PARA LA CARPINTERÍA METÁLICA DE LA E.S.E HOSPITAL REGIONAL DE DUITAMA
	CONSORCIO MEJORAMIENTO HOSPITALARIO 2023 R/L. GERARDO IVÁN MÁRQUEZ RINCÓN

ACTA	No. 6	PERIODO DESDE:	16 de febrero de 2024	HASTA:	7 de marzo de 2024
CAPÍTULO	ITEM	UNIDAD	DESCRIPCIÓN		
CUBIERTA	4	M2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CUBIERTA EN TEJA PANEL METÁLICO DE ALUZINC - CAL 28 TIPO SANDUCHE, CON POLIURETANO EXPANDIDO, ACABADO EN PINTURA POLIESTER.		

LOCALIZACIÓN		DIMENSIONES			TOTAL Kg	CANTIDAD UNITARIA	CANTIDAD ELEMENTO	TOTAL
		LONGITUD (m)	ANCHO (m)	AREA m2				
ZONA TERRAZA PISO 3 EDIFICIO ADMINISTRACIÓN								
1	TERRAZA	7.13	4.50	32.09		1.00	1.00	32.09
2	TERRAZA	5.05	4.50	22.73		1.00	1.00	22.73
								-
								-
								-


ESQUEMA

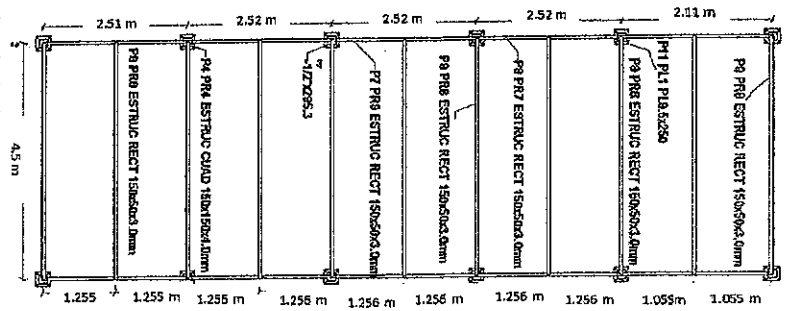



CANTIDAD TOTAL ACTA NO. 1							1,069.17
CANTIDAD TOTAL ACTA NO. 2							831.63
CANTIDAD TOTAL ACTA NO. 3							841.60
CANTIDAD TOTAL ACTA NO. 4							498.69
CANTIDAD TOTAL ACTA NO. 5							764.27
CANTIDAD TOTAL ACTA NO. 6							94.61



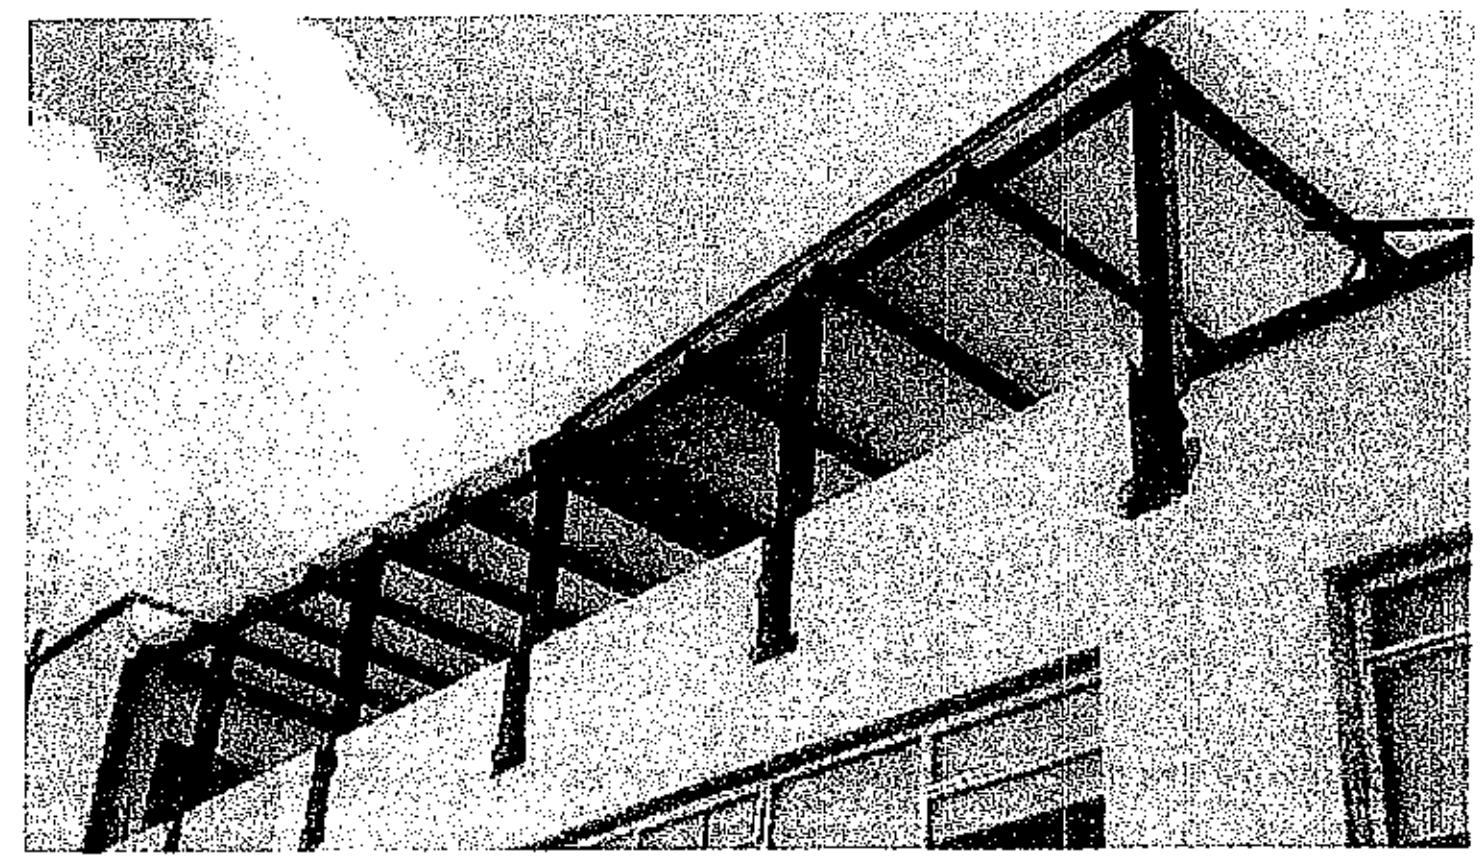

Elaboró:

RESIDENTE - CONTRATISTA DE OBRA
Ing. Victor Hernando Prieto

RESIDENTE DE INTERVENTIRIA
Ing. Diana Carolina Dallos

Vo.Bo.:

RL: CONTRATISTA DE OBRA
Ing. Gerardo Iván Márquez

RL: CONTRATISTA DE INTERVENTORIA
Arq. Sebastian Alonso Camargo Castillo


MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA ACTA PARCIAL N° 6


CONTRATO DE OBRA 054 de 2023	REFORZAMIENTO DE ESTRUCTURA DE CUBIERTA, CAMBIO DE CUBIERTA, MANTENIMIENTO A LA PINTURA DE FACHADAS Y MEJORAS PARA LA CARPINTERÍA METÁLICA DE LA E.S.E HOSPITAL REGIONAL DE DUITAMA
CONSORCIO MEJORAMIENTO HOSPITALARIO 2023 R/L. GERARDO IVÁN MÁRQUEZ RINCÓN	

ACTA	No. 6	PERIODO DESDE:	19 de febrero de 2024	HASTA:	7 de marzo de 2024
CAPÍTULO	ITEM	UNIDAD	DESCRIPCIÓN		
CUBIERTA	7	KG	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PERFILERÍA METÁLICA PARA ESTRUCTURA DE CUBIERTA, DIMENSIONES Y CALIBRES SEGÚN DISEÑO (CORREAS Y SUPLEMENTOS)		

	LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES LONGITUD (m)	MASA (Kg/m)	AREA	SUB TOTAL Kg	CANTIDAD UNITARIA	CANTIDAD ELEMENTO	TOTAL Kg
ZONA TERRAZA PISO 3 EDIFICIO ADMINISTRACIÓN								
1	P9 PR8 CORREA 150 X 50 X 3 mm	4,60	9,22		41,49	1,00	1,00	41,49
2	P9 PR8 CORREA 150 X 50 X 3 mm	4,60	9,22		41,49	1,00	1,00	41,49
3	P9 PR8 CORREA 150 X 50 X 3 mm	4,60	9,22		41,49	1,00	1,00	41,49
4	P9 PR8 CORREA 150 X 50 X 3 mm	4,60	9,22		41,49	1,00	1,00	41,49
5	P9 PR8 CORREA 150 X 50 X 3 mm	4,60	9,22		41,49	1,00	1,00	41,49
6	P9 PR8 CORREA 150 X 50 X 3 mm	4,60	9,22		41,49	1,00	1,00	41,49
7	P9 PR8 CORREA 150 X 50 X 3 mm	4,60	9,22		41,49	1,00	1,00	41,49
8	P9 PR8 CORREA 150 X 50 X 3 mm	4,60	9,22		41,49	1,00	1,00	41,49
9	P9 PR8 CORREA 150 X 50 X 3 mm	4,60	9,22		41,49	1,00	1,00	41,49
10	P9 PR8 CORREA 150 X 50 X 3 mm	4,60	9,22		41,49	1,00	1,00	41,49
11	P9 PR8 CORREA 150 X 50 X 3 mm	4,60	9,22		41,49	1,00	1,00	41,49
1	P9 PR9 VIGA 150 X 50 X 3 mm	2,11	9,22		19,45	1,00	1,00	19,45
2	P9 PR9 VIGA 150 X 50 X 3 mm	2,11	9,22		19,45	1,00	1,00	19,45
3	P9 PR9 VIGA 150 X 50 X 3 mm	2,52	9,22		23,23	1,00	1,00	23,23
4	P9 PR9 VIGA 150 X 50 X 3 mm	2,52	9,22		23,23	1,00	1,00	23,23
5	P9 PR9 VIGA 150 X 50 X 3 mm	2,52	9,22		23,23	1,00	1,00	23,23
6	P9 PR9 VIGA 150 X 50 X 3 mm	2,52	9,22		23,23	1,00	1,00	23,23
7	P9 PR9 VIGA 150 X 50 X 3 mm	2,52	9,22		23,23	1,00	1,00	23,23
8	P9 PR9 VIGA 150 X 50 X 3 mm	2,52	9,22		23,23	1,00	1,00	23,23
9	P9 PR9 VIGA 150 X 50 X 3 mm	2,51	9,22		23,14	1,00	1,00	23,14
10	P9 PR9 VIGA 150 X 50 X 3 mm	2,51	9,22		23,14	1,00	1,00	23,14
1	P8 PR8 150 X 150 X 4 mm	3,00	18,58		55,74	1,00	1,00	55,74
2	P8 PR8 150 X 150 X 4 mm	3,00	18,58		55,74	1,00	1,00	55,74
3	P4 PR4 150 X 150 X 4 mm	2,80	18,58		52,02	1,00	1,00	52,02
4	P4 PR4 150 X 150 X 4 mm	2,80	18,58		52,02	1,00	1,00	52,02
5	P3 PR3 150 X 150 X 4 mm	2,60	18,58		48,31	1,00	1,00	48,31
6	P3 PR3 150 X 150 X 4 mm	2,60	18,58		48,31	1,00	1,00	48,31
7	P1 PR1 150 X 150 X 4 mm	2,40	18,58		44,59	1,00	1,00	44,59
8	P1 PR1 150 X 150 X 4 mm	2,40	18,58		44,59	1,00	1,00	44,59
9	P2 PP2 150 X 150 X 4 mm	2,58	18,58		47,84	1,00	1,00	47,84
10	P2 PP2 150 X 150 X 4 mm	2,58	18,58		47,84	1,00	1,00	47,84
11	P2 PP2 150 X 150 X 4 mm	2,75	18,58		51,10	1,00	1,00	51,10
12	P0 PP1 150 X 150 X 4 mm	2,75	18,58		51,10	1,00	1,00	51,10
	PERFIL 100 X 65 X 3 mm	0,80	6,66		5,49	1,00	13,00	71,34
								-
	PLATINAS	BASE (m)	ALTURA (m)	MASA (Kg/m2)	SUBTOTAL Kg			
1	PLACA 250 X 250 X 6,5 mm	0,30	0,250	74,60	5,61	1,00	12,00	67,32
	RIGIDIZADOR TRIANGULAR 90 X 10 cm en 6 mm CORREAS	0,10	0,10	47,1	0,24	1,00	22,00	5,18
	ZONA TERRAZA PISO 3 EDIFICIO ADMINISTRACION REMATES PARA SUPERBOARD							
	PERFIL 100 X 50 mm	0,57	6,66		3,61	1,00	2,00	7,92

ESQUEMA

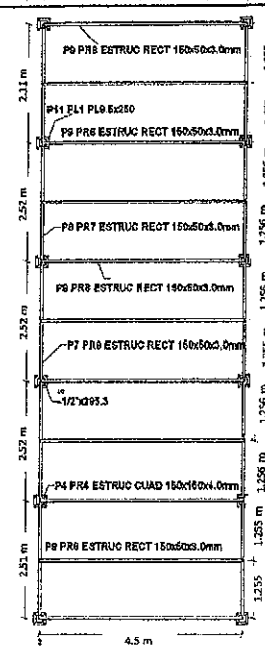





MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA ACTA PARCIAL Nº 6


CONTRATO DE OBRA 004 de 2023	REFORZAMIENTO DE ESTRUCTURA DE CUBIERTA, CAMBIO DE CUBIERTA, MANTENIMIENTO A LA PINTURA DE FACHADAS Y MEJORAS PARA LA CARPINTERIA METÁLICA DE LA E.S.E HOSPITAL REGIONAL DE DUITAMA
CONSORCIO MEJORAMIENTO HOSPITALARIO 2023 R/L. GERARDO IVAN MÁRQUEZ RINCÓN	

ACTA				No. 6		PERIODO DESDE:			18 de febrero de 2024 HASTA: 7 de marzo de 2024	
CAPITULO				ITEM		UNIDAD			DESCRIPCIÓN	
CUBIERTA				7		KG			SUMINISTRO E INSTALACIÓN PERFILERIA METÁLICA PARA ESTRUCTURA DE CUBIERTA, DIMENSIONES Y CALIBRES SEGÚN DISEÑO (CORREAS Y SUPLEMENTOS)	
	PERFIL 100 X 50 mm		0,70	6,00		4,60	1,00	2,00	9,60	
	PERFIL 100 X 50 mm		0,92	6,00		6,31	1,00	2,00	12,62	
	PERFIL 100 X 50 mm		1,10	6,00		7,55	1,00	2,00	15,09	
	PERFIL 100 X 50 mm		1,00	6,00		6,88	1,00	2,00	13,72	
	PERFIL 100 X 50 mm		0,80	6,00		5,49	1,00	5,00	27,44	



PLACA1 (e = 9,6 mm)




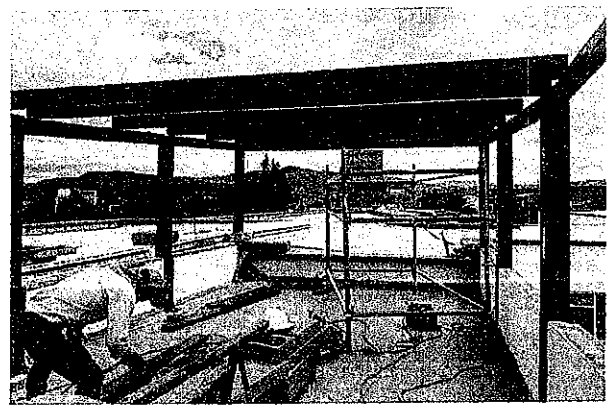


MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA ACTA PARCIAL Nº 6

CONTRATO DE OBRA 004 de 2023	REFORZAMIENTO DE ESTRUCTURA DE CUBIERTA, CAMBIO DE CUBIERTA, MANTENIMIENTO A LA PINTURA DE FACHADAS Y MEJORAS PARA LA CARPINTERÍA METÁLICA DE LA E.S.E HOSPITAL REGIONAL DE DUITAMA
CONSORCIO MEJORAMIENTO HOSPITALARIO 2023 R/L. GERARDO IVÁN MÁRQUEZ RINCÓN	

ACTA	No. 6	PERIODO DESDE:	16 de febrero de 2024	HASTA:	7 de marzo de 2024
CAPÍTULO	ITEM	UNIDAD	DESCRIPCIÓN		
CUBIERTA	7	KG	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PERFILERIA METÁLICA PARA ESTRUCTURA DE CUBIERTA, DIMENSIONES Y CALIBRES SEGÚN DISEÑO (CORREAS Y SUPLEMENTOS)		

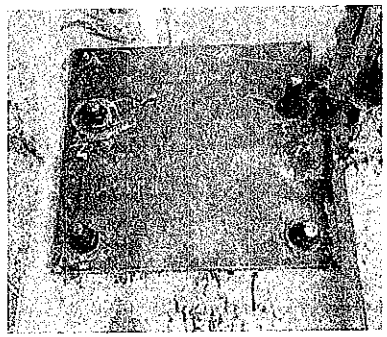

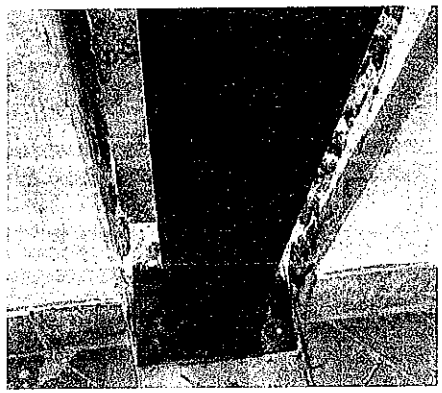

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA ACTA PARCIAL N° 6

CONTRATO DE OBRA 004 de 2023	REFORZAMIENTO DE ESTRUCTURA DE CUBIERTA, CAMBIO DE CUBIERTA, MANTENIMIENTO A LA PINTURA DE FACHADAS Y MEJORAS PARA LA CARPINTERÍA METÁLICA DE LA E.S.E HOSPITAL REGIONAL DE DUITAMA
CONSORCIO MEJORAMIENTO HOSPITALARIO 2023 R/L. GERARDO IVÁN MÁRQUEZ RINCÓN	

ACTA		No. 6	PERIODO DESDE:	16 de febrero de 2024	HASTA:	7 de marzo de 2024
CAPÍTULO		ITEM	UNIDAD	DESCRIPCIÓN		
CUBIERTA		7	KG	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PERFILERIA METÁLICA PARA ESTRUCTURA DE CUBIERTA, DIMENSIONES Y CALIBRES SEGÚN DISEÑO (CORREAS Y SUPLEMENTOS)		
	CANTIDAD TOTAL ACTA NO. 1			15,697.06		
	CANTIDAD TOTAL ACTA NO. 2			11,988.10		
	CANTIDAD TOTAL ACTA NO. 3			11,977.87		
	CANTIDAD TOTAL ACTA NO. 4			8,290.60		
	CANTIDAD TOTAL ACTA NO. 5			10,750.16		
	CANTIDAD TOTAL ACTA NO. 6			1,510.34		

Elaboró:

RESIDENTE - CONTRATISTA DE OBRA
Ing. Víctor Hernando Pineda

RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
Ing. Diana Carolina Bellos

Vo.Bo.:

R/L CONTRATISTA DE OBRA
Ing. Gerardo Iván Márquez

R/L CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA
Arq. Edwin Alexis Ortega Castillo


MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA ACTA PARCIAL N° 6


CONTRATO DE OBRA 004 de 2023	REFORZAMIENTO DE ESTRUCTURA DE CUBIERTA, CAMBIO DE CUBIERTA, MANTENIMIENTO A LA PINTURA DE FACHADAS Y MEJORAS PARA LA CARPINTERÍA METÁLICA DE LA E.S.E HOSPITAL REGIONAL DE DUITAMA
	CONSORCIO MEJORAMIENTO HOSPITALARIO 2023 RVL. GERARDO IVÁN MÁRQUEZ RINCÓN

ACTA	No. 6	PERIODO DESDE:	16 de febrero de 2024	HASTA:	7 de marzo de 2024
CAPÍTULO	ITEM	UNIDAD	DESCRIPCIÓN		
CUBIERTA	14	KG	PINTURA DE LA ESTRUCTURA METALICA		

	LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			SUB TOTAL Kg	CANTIDAD UNITARIA	CANTIDAD ELEMENTO	TOTAL Kg
		LONGITUD (m)	MASA (Kg/m)	AREA				
ZONA TERRAZA PISO 3 EDIFICIO ADMINISTRACIÓN								
1	P9 PR8 CORREA 150 X 50 X 3 mm	4,50	9,22		41,49	1,00	1,00	41,49
2	P9 PR8 CORREA 150 X 50 X 3 mm	4,50	9,22		41,49	1,00	1,00	41,49
3	P9 PR8 CORREA 150 X 50 X 3 mm	4,50	9,22		41,49	1,00	1,00	41,49
4	P9 PR8 CORREA 150 X 50 X 3 mm	4,50	9,22		41,49	1,00	1,00	41,49
5	P9 PR8 CORREA 150 X 50 X 3 mm	4,50	9,22		41,49	1,00	1,00	41,49
6	P9 PR8 CORREA 150 X 50 X 3 mm	4,50	9,22		41,49	1,00	1,00	41,49
7	P9 PR8 CORREA 150 X 50 X 3 mm	4,50	9,22		41,49	1,00	1,00	41,49
8	P9 PR8 CORREA 150 X 50 X 3 mm	4,50	9,22		41,49	1,00	1,00	41,49
9	P9 PR8 CORREA 150 X 50 X 3 mm	4,50	9,22		41,49	1,00	1,00	41,49
10	P9 PR8 CORREA 150 X 50 X 3 mm	4,50	9,22		41,49	1,00	1,00	41,49
11	P9 PR8 CORREA 150 X 50 X 3 mm	4,50	9,22		41,49	1,00	1,00	41,49
1	P9 PR9 VIGA 150 X 50 X 3 mm	2,11	9,22		19,45	1,00	1,00	19,45
2	P9 PR9 VIGA 150 X 50 X 3 mm	2,11	9,22		19,45	1,00	1,00	19,45
3	P9 PR9 VIGA 150 X 50 X 3 mm	2,52	9,22		23,23	1,00	1,00	23,23
4	P9 PR9 VIGA 150 X 50 X 3 mm	2,52	9,22		23,23	1,00	1,00	23,23
5	P9 PR9 VIGA 150 X 50 X 3 mm	2,52	9,22		23,23	1,00	1,00	23,23
6	P9 PR9 VIGA 150 X 50 X 3 mm	2,52	9,22		23,23	1,00	1,00	23,23
7	P9 PR9 VIGA 150 X 50 X 3 mm	2,52	9,22		23,23	1,00	1,00	23,23
8	P9 PR9 VIGA 150 X 50 X 3 mm	2,52	9,22		23,23	1,00	1,00	23,23
9	P9 PR9 VIGA 150 X 50 X 3 mm	2,51	9,22		23,14	1,00	1,00	23,14
10	P9 PR9 VIGA 150 X 50 X 3 mm	2,51	9,22		23,14	1,00	1,00	23,14
1	P5 PR5 150 X 150 X 4 mm	3,00	18,58		55,74	1,00	1,00	55,74
2	P5 PR5 150 X 150 X 4 mm	3,00	18,58		55,74	1,00	1,00	55,74
3	P4 PR4 150 X 150 X 4 mm	2,80	18,58		52,02	1,00	1,00	52,02
4	P4 PR4 150 X 150 X 4 mm	2,80	18,58		52,02	1,00	1,00	52,02
5	P3 PR3 150 X 150 X 4 mm	2,60	18,58		48,31	1,00	1,00	48,31
6	P3 PR3 150 X 150 X 4 mm	2,60	18,58		48,31	1,00	1,00	48,31
7	P1 PR1 150 X 150 X 4 mm	2,40	18,58		44,59	1,00	1,00	44,59
8	P1 PR1 150 X 150 X 4 mm	2,40	18,58		44,59	1,00	1,00	44,59
9	P2 PR2 150 X 150 X 4 mm	2,58	18,58		47,94	1,00	1,00	47,94
10	P2 PR2 150 X 150 X 4 mm	2,58	18,58		47,94	1,00	1,00	47,94
11	P9 PR9 150 X 150 X 4 mm	2,75	18,58		51,10	1,00	1,00	51,10
12	P9 PR1 150 X 150 X 4 mm	2,75	18,58		51,10	1,00	1,00	51,10
	PERFIL 100 X 50 X 3 mm	0,80	6,88		5,48	1,00	13,00	71,24
								-
	PLATINAS	BASE (m)	ALTURA (m)	MASA (Kg/m2)	SUBTOTAL Kg			
1	PLACA 250 X 250 X 9,5 mm	0,30	0,250	74,60	5,61	1,00	12,00	67,32
	RIGIDIZADOR TRIANGULAR 10 X 10 cm en 6 mm CORREAS	0,10	0,10	47,1	0,24	1,00	22,00	5,18
	ZONA TERRAZA PISO 3 EDIFICIO ADMINISTRACIÓN REMATES PARA SUPERBOARD							
	PERFIL 100 X 50 mm	0,57	6,88		3,91	1,00	2,00	7,82

ESQUEMA

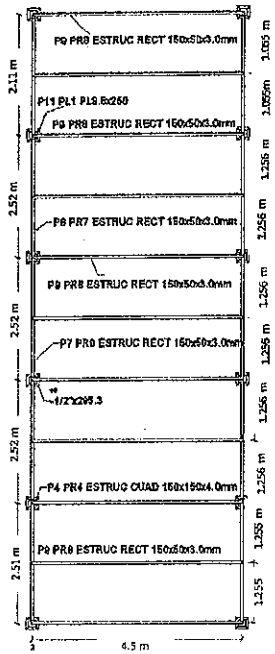




MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA ACTA PARCIAL N° 6

CONTRATO DE OBRA 094 de 2023	REFORZAMIENTO DE ESTRUCTURA DE CUBIERTA, CAMBIO DE CUBIERTA, MANTENIMIENTO A LA PINTURA DE FACHADAS Y MEJORAS PARA LA CARPINTERÍA METÁLICA DE LA E.S.E HOSPITAL REGIONAL DE DUITAMA


CONSORCIO MEJORAMIENTO HOSPITALARIO 2023 R/L. GERARDO IVÁN MÁRQUEZ RINCÓN


ACTA	No. 6	PERIODO DESDE:	18 de febrero de 2024	HASTA:	7 de marzo de 2024
CAPÍTULO	ITEM	UNIDAD	DESCRIPCIÓN		
CUBIERTA	14	KG	PINTURA DE LA ESTRUCTURA METÁLICA		

	PERFIL 100 X 50 mm	0,70	9,86		4,90	1,00	2,00	9,60
	PERFIL 100 X 50 mm	0,92	9,86		6,31	1,00	2,00	12,62
	PERFIL 100 X 50 mm	1,10	9,86		7,55	1,00	2,00	15,09
	PERFIL 100 X 50 mm	1,00	9,86		6,86	1,00	2,00	13,72
	PERFIL 100 X 50 mm	0,80	9,86		5,49	1,00	6,00	27,44

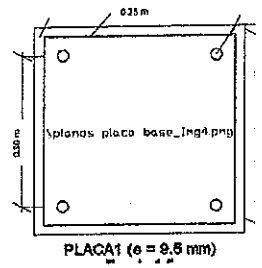

PLACA1 (e = 9.5 mm)



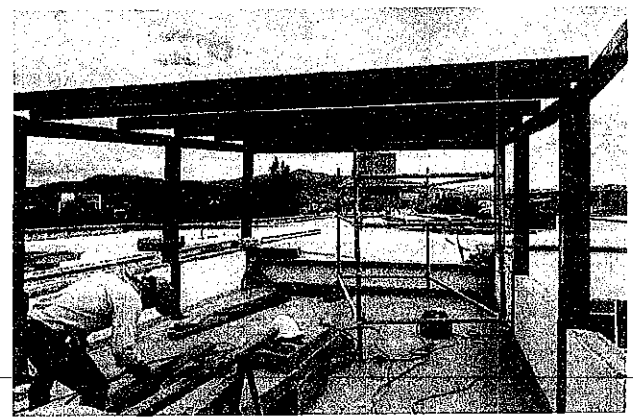


MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA ACTA PARCIAL N° 6

CONTRATO DE OBRA 004 de 2023	REFORZAMIENTO DE ESTRUCTURA DE CUBIERTA, CAMBIO DE CUBIERTA, MANTENIMIENTO A LA PINTURA DE FACHADAS Y MEJORAS PARA LA CARPINTERÍA METÁLICA DE LA E.S.E HOSPITAL REGIONAL DE DUITAMA

CONSORCIO MEJORAMIENTO HOSPITALARIO 2023 R/L. GERARDO IVÁN MÁRQUEZ RINCÓN

ACTA	No. 6	PERIODO DESDE:	16 de febrero de 2024	HASTA:	7 de marzo de 2024
CAPÍTULO	ITEM	UNIDAD	DESCRIPCIÓN		
CUBIERTA	14	KG	PINTURA DE LA ESTRUCTURA METALICA		

CANTIDAD TOTAL ACTA NO. 1	15,637,08
CANTIDAD TOTAL ACTA NO. 2	11,885,10
CANTIDAD TOTAL ACTA NO. 3	11,577,87
CANTIDAD TOTAL ACTA NO. 4	10,412,13
CANTIDAD TOTAL ACTA NO. 5	10,750,16
CANTIDAD TOTAL ACTA NO. 6	1,510,34

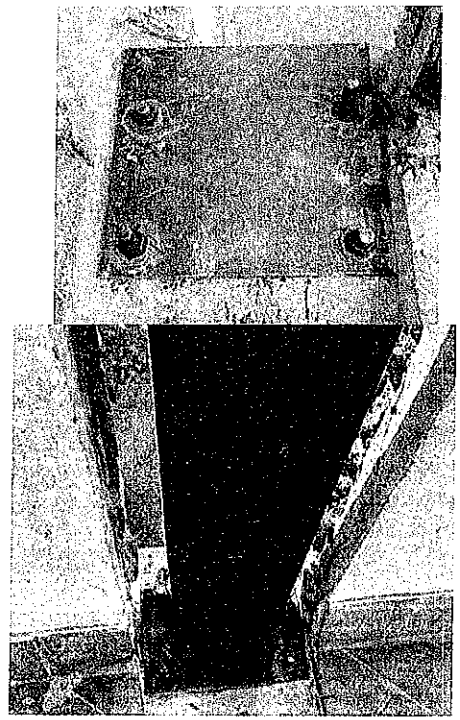

Elaboró:

RESIDENTE - CONTRATISTA DE OBRA
Ing. Víctor Hernando Puerto

RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
Ing. Diana Carolina Dallos

Vo.Bo.:

R/L. CONTRATISTA DE OBRA
Ing. Gerardo Iván Márquez

R/L. CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA
Arq. Sebastián Alcazar Camargo Castillo

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

CONTRATO DE OBRA 004 de 2023	REFORZAMIENTO DE ESTRUCTURA DE CUBIERTA, CAMBIO DE CUBIERTA, MANTENIMIENTO A LA PINTURA DE FACHADAS Y MEJORAS PARA LA CARPINTERÍA METÁLICA DE LA E.S.E HOSPITAL REGIONAL DE DUITAMA
	CONSORCIO MEJORAMIENTO HOSPITALARIO 2023 R/L. GERARDO IVAN MÁRQUEZ RINCÓN


INFORME DE CANTIDADES REALES EJECUTADAS

Acta	No. 6	PERIODO DESDE:	18 de febrero de 2024	HASTA:	7 de marzo de 2024
CAPÍTULO	ITEM	UNIDAD	DESCRIPCIÓN		
FACHADA	18	M2	IMPRIMANTE		

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			AREA	CANTIDAD UNITARIA	CANTIDAD ELEMENTO	TOTAL
	LONGITUD	ANCHO	ALTURA				
EDIFICIO ADMINISTRACION AUDITORIO							
FACHADA POSTERIOR EDIFICIO ADMINISTRACIÓN ZONA VERDE	26,02		10,10	281,79	1,00	1,00	281,79
PUERTA AUDITORIO	0,85		2,00	1,70	1,00	-1,00	-1,70
VENTANA	3,03		1,50	4,55	1,00	-3,00	-13,64
VENTANA	5,55		1,50	8,33	1,00	-9,00	-74,93
VENTANA JUNTO A AUDITORIO	1,58		0,35	0,73	1,00	-1,00	-0,73
VENTANA JUNTO A AUDITORIO	1,88		1,50	2,82	1,00	-2,00	-5,64
AUDITORIO COSTADO ZONA VERDE	14,8		7,20	106,56	1,00	1,00	106,56
AUDITORIO FACHADA PRINCIPAL	8,5		7,2	61,20	1,00	1,00	61,20
EDIFICIO ADMINISTRACIÓN AUDITORIO - CONSULTA EXTERNA							
FACHADA ZONA TERRAZA PISO 2	6,40		6,70	42,88	1,00	1,00	42,88
VENTANA	5,8		1,50	8,70	1,00	-2,00	-17,40
MURO FACHADA POSTERIOR Z TERRAZA P2	1,64		6,70	10,99	1,00	1,00	10,99
MURO FACHADA POSTERIOR Z TERRAZA P3	5,6		6,70	37,52	1,00	1,00	37,52
VENTANA	5,10		1,50	7,65	1,00	-2,00	-15,30
FACHADA ZONA TERRAZA PISO 3	5,60		3,75	21,75	1,00	1,00	21,75
VENTANA	4,1		1,50	6,15	1,00	-1,00	-6,15
PUERTA	2,25		1	2,25	1,00	1,00	2,25
ZONA CONTIGUA A4	12		3,4	40,80	1,00	1,00	40,80
VENTANA	1,7		1,50	2,55	1,00	-1,00	-2,55
VENTANA	3,4		2,50	8,50	1,00	-1,00	-8,50
VENTANA	1,35		3,50	4,73	1,00	-1,00	-4,73
VENTANA	3,9		4,50	17,55	1,00	-1,00	-17,55
ANTEPECHO A ZONA VERDE	7,60		0,65	4,94	1,00	1,00	4,94
A4 COSTADO COCINA	21,10		3,27	69,00	1,00	1,00	69,00
VENTANA ZONA COCINA	6		0,38	2,28	1,00	-1,00	-2,28
VENTANA ZONA COCINA	5,1		1,45	7,69	1,00	-1,00	-7,69
ZONA TERRAZ PISO 3	4,6		3,7	17,02	1,00	1,00	17,02
PUERTA ACCESO A TERRAZA PISO 3	3,85		2,33	8,97	1,00	-1,00	-8,97
MURO CONTIGUO A PUERTA	1,05		2,33	2,45	1,00	1,00	2,45
TECHO EN PLACA SOBRE PUERTA	3,85		1,05	4,04	1,00	1,00	4,04
ANTEPECHO TERRAZA	12,8		0,65	8,00	1,00	1,00	8,00
ANTEPECHO TERRAZA	12,2		0,65	7,93	1,00	1,00	7,93
AUDITORIO COSTADO IZQUIERDO	14,8		7,2	106,56	1,00	1,00	106,56
COSTADO IZQUIERDO EDF ADMON - AUDITORIO	3,3		11,4	37,62	1,00	1,00	37,62
COSTADO DERECHO AUDITORIO ENTRADA	2,2		7,2	15,84	1,00	1,00	15,84
COSTADO IZQUIERDO EDF ADMON JUNTO A AUDITORIO	2,2		10,5	23,10	1,00	1,00	23,10
PLACA TECHO ENTRADA A AUDUTORIO	2,3		2,6	5,98	1,00	1,00	5,98
ENTRADA A AUDITORIO	3		10,5	31,50	1,00	1,00	31,50
PUERTA AUDITORIO	3		2,3	6,90	1,00	-1,00	-6,90
VENTANAS PISO 2 y 3	3		1,5	4,50	1,00	-2,00	-9,00
FACHADA PRINCIPAL EDIFICIO ADMINISTRACIÓN	20,5		10,5	215,25	1,00	1,00	215,25
VENTANAS PISO 1, 2 y 3	7,92		3,5	4,38	1,00	-15,00	-65,70
ENTRADA A CONSULTA EXTERNA	20,5		4	82,00	1,00	1,00	82,00
VENTANA	2,05		1	2,05	1,00	-1,00	-2,05
VENTANA	2		1	2,00	1,00	-1,00	-2,00

ESQUEMA



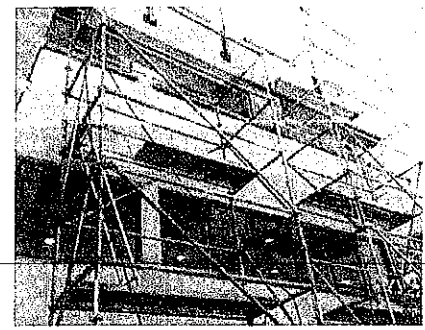


MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA


CONTRATO DE OBRA 004 de 2023	REFORZAMIENTO DE ESTRUCTURA DE CUBIERTA, CAMBIO DE CUBIERTA, MANTENIMIENTO A LA PINTURA DE FACHADAS Y MEJORAS PARA LA CARPINTERÍA METÁLICA DE LA E.S.E HOSPITAL REGIONAL DE DUITAMA
	CONSORCIO MEJORAMIENTO HOSPITALARIO 2023 R/L. GERARDO IVÁN MÁRQUEZ RINCÓN

INFORME DE CANTIDADES REALES EJECUTADAS

Acta			No. 8		PERIODO DESDE:		16 de febrero de 2024	HASTA:	7 de marzo de 2024		
CAPÍTULO			ITEM		UNIDAD				DESCRIPCIÓN		
FACHADA			19		M2				IMPRIMANTE		
VENTANA	2			1	2.00	1.00	-1.00	-2.00			
VENTANA	2.9			1	2.90	1.00	-1.00	-2.90			
VENTANA	2.92			1	2.92	1.00	-1.00	-2.92			
VENTANA	1.66			1	1.66	1.00	-1.00	-1.66			
PUERTA ENTRADA CONSULTA EXTERNA	4.2			2.58	10.84	1.00	1.00	10.84			
MUROS ENTRADAS CONSULTA EXTERNA	1			2.56	2.56	1.00	2.00	5.12			
TECHO EN PLACA SOBRE PUERTA	4.2			0.8	3.36	1.00	2.00	6.72			
DESCUENTO APERTOR VOCADO ENTRADA PRINCIPAL COSTADO DERECHO SUPERIOR	2.3			1.08	2.48	1.00	-1.00	-2.48			
PATIO INTERNO DIVINO NIÑO											
COSTADO PASILLO ENTRADA PRINCIPAL	12.9			6.9	89.01	1.00	2.00	178.02			
VENTANA	2.7			2.01	5.45	1.00	-1.00	-5.45			
VENTANA	5.77			2.02	11.66	1.00	-1.00	-11.66			
VENTANA	1.72			2.02	3.47	1.00	-1.00	-3.47			
COSTADO PASILLO DE A a B	10			6.9	69.00	1.00	1.00	69.00			
VENTANA	3.9			1.5	5.85	1.00	-1.00	-5.85			
VENTANA	4.8			1.5	7.20	1.00	-1.00	-7.20			
MUROS BAJO PLACA ZONA PASILLO DE A a B	3.3			2.57	3.84	1.00	3.00	10.02			
TECHO EN PLACA SOBRE PUERTA Y VENTANAS PASILLO DE A a B	10			3.3	13.00	1.00	1.00	13.00			
VENTANAS PASILLO DE A a B	9.7			1.5	14.55	1.00	-1.00	-14.55			
PUERTA	0.95			2.3	2.19	1.00	-1.00	-2.19			
MURO CONTRA LABORATORIO	12.9			4.2	54.18	1.00	1.00	54.18			
MURO CONTRA ZONA RAMPA PISO 2	4.6			2.7	12.42	1.00	1.00	12.42			
PUERTA	0.95			2.3	2.19	1.00	-1.00	-2.19			
VENTANA	4.03			1	4.03	1.00	-1.00	-4.03			
VENTANA	1			1	1.00	1.00	-1.00	-1.00			
VENTANA	1			1	1.00	1.00	-1.00	-1.00			
PATIO INTERNO DESCENSO RAMPA (FELICIA)											
COSTADO PASILLO INTERCONEXIÓN BLOQUES B y C	10			10.3	103.00	1.00	1.00	103.00			
VENTANA PISO 1 y 2	2.74			1.5	4.11	1.00	-2.00	-8.22			
VENTANA PISO 1 y 2	6.1			1.5	9.15	1.00	-2.00	-18.30			
VENTANA PISO 3	2.74			1.5	4.11	1.00	-1.00	-4.11			
VENTANA PISO 3	5.7			1.5	8.55	1.00	-1.00	-8.55			
COSTADO RAMPA	6.6			6.6	43.56	1.00	1.00	43.56			
VENTANA	5.7			1.5	8.55	1.00	-1.00	-8.55			
PUERTA	0.6			2.3	1.38	1.00	-1.00	-1.38			
VENTANA PISO 2	1.3			1.5	2.85	1.00	-1.00	-2.85			
TECHO BAJO PLACA	6.6			0.65	4.29	1.00	1.00	4.29			
COSTADO ZONA RAYOS X	10.1			4.15	41.92	1.00	1.00	41.92			
VENTANAS	3			1	3.00	1.00	-1.00	-3.00			
VENTANAS	3			1	3.00	1.00	-1.00	-3.00			
COSTADO SALAS DE CIRUGIA	6.6			4.15	27.39	1.00	1.00	27.39			
VENTANA	5.1			1.5	5.30	1.00	-1.00	-5.30			
BLOQUE C											
MURO FACHADA BLOQUE C CONTIGUO A BLOQUE B	6.85			3.5	23.28	1.00	1.00	23.28			
VENTANA	4.35			1.3	5.66	1.00	-1.00	-5.66			
VENTANA	6.1			1.3	7.93	1.00	-1.00	-7.93			
BLOQUE C FACHADA HACIA Rx	6.1			3.5	21.35	1.00	1.00	21.35			

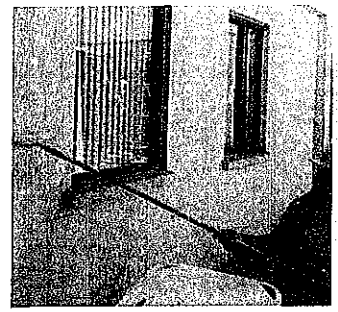



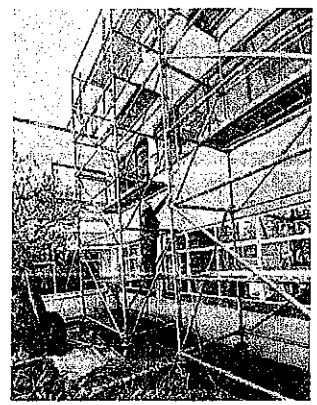



MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

CONTRATO DE OBRA 004 de 2023	REFORZAMIENTO DE ESTRUCTURA DE CUBIERTA, CAMBIO DE CUBIERTA, MANTENIMIENTO A LA PINTURA DE FACHADAS Y MEJORAS PARA LA CARPINTERÍA METÁLICA DE LA E.S.E HOSPITAL REGIONAL DE DUITAMA
	CONSORCIO MEJORAMIENTO HOSPITALARIO 2023 R/L. GERARDO IVÁN MÁRQUEZ RINCÓN

INFORME DE CANTIDADES REALES EJECUTADAS

Acta		No. 6	PERIODO DESDE:	18 de febrero de 2024	HASTA:	7 de marzo de 2024	
CAPÍTULO		ITEM	UNIDAD			DESCRIPCIÓN	
FACHADA		18	M2			IMPRIMANTE	
PARQUEO AMBULANCIAS							
MURO PADUEO AMBULANCIAS COSTADO MANTENIMIENTO	16,50		4,10	67,65	1,00	1,00	67,65
VENTANA	1.1		1,50	1,65	1,00	-6,00	-9,90
COSTADO BASE AMBLANCIAS	12,5		1,05	13,13	1,00	1,00	13,13
COSTADO DESCARGUE AMBULANCIAS	12,5		1,05	13,13	1,00	1,00	13,13
ZONA CONSULTA EXTERNA							
COSTADO VENTANA BAÑO	2,66		3,80	9,98	1,00	1,00	9,98
VENTANA	0,9		0,90	0,81	1,00	-1,00	-0,81
COSTADO FACHADA PARALELO A VIA URBANAS	22,7		4,1	93,07	1,00	1,00	93,07
VENTANA 139	3		1,00	3,00	1,00	-1,00	-3,00
VENTANA 140	3		1,00	3,00	1,00	-1,00	-3,00
VENTANA 141	3		1,00	3,00	1,00	-1,00	-3,00
VENTANA 142	3		1,00	3,00	1,00	-1,00	-3,00
VENTANA 143	3		1,00	3,00	1,00	1,00	3,00
VENTANA 144	2,85		1,00	2,85	1,00	1,00	2,85
VENTANA 145	3		1,00	3,00	1,00	-1,00	-3,00
ZONA TERRAZA C2							
MURO CONTRA PATIO	5,4		0,8	5,12	1,00	1,00	5,12
MURO COSTADO URGENCIAS	6,4		1,65	10,56	1,00	1,00	10,56
MURO COSTADO RX	2,17		0,8	1,74	1,00	1,00	1,74
MURO COSTADO BLOQUE C	2,1		4,36	9,16	1,00	1,00	9,16
VENTANA	0,95		1,3	1,24	1,00	-1,00	-1,24
PUERTA	0,7		2,2	1,54	1,00	-1,00	-1,54
ZONA TERRAZA C3							
MURO CONTRA SALAS CIRUGIA	6,5		1	6,50	1,00	1,00	6,50
MURO COSTADO BLOQUE C	5,6		3,6	20,76	1,00	1,00	20,76
MURO COSTADO RX	1,9		1	1,90	1,00	1,00	1,90
MURO COSTADO BLOQUE C	2		3,6	7,20	1,00	1,00	7,20
VENTANA	2,97		1,3	3,86	1,00	-1,00	-3,86
VENTANA	1,2		1,3	1,56	1,00	-1,00	-1,56
PUERTA	0,8		2,35	1,88	1,00	-1,00	-1,88
ZONA HOSPITALIACIÓN BLOQUE C							
COSTADO DERECHO BLOQUE C	36,10		7,28	255,53	1,00	1,00	255,53
VENTANAS	1,1		1,50	1,65	1,00	-20,00	-33,00
ZONA EXTERNA FOSO ASCENSOR	1,1		11,10	21,12	1,00	1,00	21,12
ZONA EXTERNA FOSO ASCENSOR SOBRE C3	5,3		2,40	12,72	1,00	1,00	12,72
FACHADA POSTERIOR BLOQUE C ENTRADA UCI DOMO DERECHO	1,85		7,28	13,47	1,00	1,00	13,47
VENTANAS	1,1		1,58	1,74	1,00	-2,00	-3,48
FACHADA POSTERIOR BLOQUE C ANTERIOR A ENTRADA UCI DOMO DERECHO	3,2		7,28	23,30	1,00	1,00	23,30
MURO ANTEPECHO DOMO FACHADA POSTERIOR	4,9		1,00	4,90	1,00	1,00	4,90
MURO ANTEPECHO DOMO COSTADO DERECHO	33,6		1,50	49,68	1,00	1,00	49,68
FACHADA POSTERIOR BLOQUE C ANTERIOR A ENTRADA UCI DOMO DERECHO	3,2		7,28	23,30	1,00	1,00	23,30
HALL DE ACCESO							
MURO COSTADO DERECHO CONTIGUO A ADMINISTRACIÓN	11,30		7,50	85,88	1,00	1,00	85,88
ZONA VENTANA PATIO DOMO UCI	10,1		3,72	37,57	1,00	1,00	37,57



MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

CONTRATO DE OBRA 004 de 2023	REFORZAMIENTO DE ESTRUCTURA DE CUBIERTA, CAMBIO DE CUBIERTA, MANTENIMIENTO A LA PINTURA DE FACHADAS Y MEJORAS PARA LA CARPINTERÍA METÁLICA DE LA E.S.E HOSPITAL REGIONAL DE DUITAMA
CONSORCIO MEJORAMIENTO HOSPITALARIO 2023 RL. GERARDO IVÁN MÁRQUEZ RINCÓN	

INFORME DE CANTIDADES REALES EJECUTADAS

Acta			No. 6		PERIODO DESDE:	18 de febrero de 2024	HASTA:	7 de marzo de 2024	
CAPITULO			ITEM		UNIDAD			DESCRIPCIÓN	
FACHADA			18		M2			INPRIMANTE	
VENTANA PATIO DIVINO NIÑO		9.5		2.7	25.65	1.00	-1.00	-25.65	
	CANTIDAD TOTAL ACTA NO. 1							1704,42	Observaciones:
	CANTIDAD TOTAL ACTA NO. 2							1937,07	
	CANTIDAD TOTAL ACTA NO. 3							565,76	
	CANTIDAD TOTAL ACTA NO. 4							0,00	
	CANTIDAD TOTAL ACTA NO. 5							0,00	
	CANTIDAD TOTAL ACTA NO. 6							2108,59	

Elaboró:

RESIDENTE – CONTRATISTA DE OBRA
Ing. Víctor Hernando Prieto

RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
Ing. Diana Carolina Ballos

Vo.Bo.:

RL: CONTRATISTA DE OBRA
Ing. Gerardo Iván Márquez

RL: CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA
Ing. Lina Mercedes Sánchez


MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA


CONTRATO DE OBRA 004 de 2023	REFORZAMIENTO DE ESTRUCTURA DE CUBIERTA, CAMBIO DE CUBIERTA, MANTENIMIENTO A LA PINTURA DE FACHADAS Y MEJORAS PARA LA CARPINTERÍA METÁLICA DE LA E.S.E HOSPITAL REGIONAL DE DUITAMA
	CONSORCIO MEJORAMIENTO HOSPITALARIO 2023 R/L. GERARDO IVAN MÁRQUEZ RINCÓN
	INFORME DE CANTIDADES REALES EJECUTADAS

Acta	No. 6	PERIODO DESDE:	18 de febrero de 2024	HASTA:	7 de marzo de 2024
CAPÍTULO	ITEM	UNIDAD	DESCRIPCIÓN		
FACHADA	25	M2	PINTURA FACHADA EN VINILO PARA EXTERIORES		

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			AREA	CANTIDAD UNITARIA	CANTIDAD ELEMENTO	TOTAL
	LONGITUD	ANCHO	ALTURA				
EDIFICIO ADMINISTRACIÓN AUDITORIO :							
FACHADA POSTERIOR EDIFICIO ADMINISTRACIÓN ZONA VERDE	25,92		10,10	261,79	1,00	1,00	261,79
PUERTA AUDITORIO	0,85		2,00	1,70	1,00	-1,00	-1,70
VENTANA	3,05		1,50	4,55	1,00	-3,00	-13,64
VENTANA	5,55		1,50	8,33	1,00	-9,00	-74,93
VENTANA JUNTO A AUDITORIO	1,58		0,29	0,73	1,00	-1,00	-0,73
VENTANA JUNTO A AUDITORIO	1,58		1,50	2,82	1,00	-2,00	-5,64
AUDITORIO COSTADO ZONA VERDE	14,8		7,20	106,56	1,00	1,00	106,56
AUDITORIO FACHADA PRINCIPAL	8,5		7,2	61,20	1,00	1,00	61,20
EDIFICIO ADMINISTRACIÓN AUDITORIO - CONSULTA EXTERNA							
FACHADA ZONA TERRAZA PISO 2	6,60		6,70	42,88	1,00	1,00	42,88
VENTANA	5,8		1,50	8,70	1,00	-2,00	-17,40
MURO FACHADA POSTERIOR Z TERRAZA P2	1,64		6,70	10,99	1,00	1,00	10,99
MURO FACHADA POSTERIOR Z TERRAZA P3	5,6		6,70	37,52	1,00	1,00	37,52
VENTANA	5,10		1,50	7,65	1,00	-2,00	-15,30
FACHADA ZONA TEPRAZA PISO 3	5,80		3,75	21,75	1,00	1,00	21,75
VENTANA	4,1		1,50	6,15	1,00	-1,00	-6,15
PUERTA	2,25		1	2,25	1,00	1,00	2,25
ZONA CONTIGUA A4	12		3,4	40,80	1,00	1,00	40,80
VENTANA	1,7		1,50	2,55	1,00	-1,00	-2,55
VENTANA	3,4		2,50	8,50	1,00	-1,00	-8,50
VENTANA	3,15		3,50	4,73	1,00	-1,00	-4,73
VENTANA	3,9		4,50	17,55	1,00	-1,00	-17,55
ANTEPECHO A ZONA VERDE	7,60		0,65	4,94	1,00	1,00	4,94
A4 COSTADO COCINA	21,10		3,27	69,00	1,00	1,00	69,00
VENTANA ZONA COCINA	6		0,38	2,28	1,00	-1,00	-2,28
VENTANA ZONA COCINA	5,3		1,45	7,69	1,00	-1,00	-7,69
ZONA TERRAZ PISO 3	4,6		3,7	17,02	1,00	1,00	17,02
PUERTA ACCESO A TERRAZA PISO 3	3,65		2,33	8,97	1,00	-1,00	-8,97
MURO CONTIGUO A PUERTA	1,05		2,33	2,45	1,00	1,00	2,45
TECHO EN PLACA SOBRE PUERTA	3,85		1,05	4,04	1,00	1,00	4,04
ANTEPECHO TERRAZA	12,3		0,65	8,00	1,00	1,00	8,00
ANTEPECHO TERRAZA	12,2		0,65	7,93	1,00	1,00	7,93
AUDITORIO COSTADO IZQUIERDO	14,8		7,2	106,56	1,00	1,00	106,56
COSTADO IZQUIERDO EDF ADMON - AUDITORIO	3,3		11,4	37,62	1,00	1,00	37,62
COSTADO DERECHO AUDITORIO ENTRADA	2,1		7,2	15,84	1,00	1,00	15,84
COSTADO IZQUIERDO EDF ADMON JUNTO A AUDITORIO	2,2		10,5	23,10	1,00	1,00	23,10
PLACA TECHO ENTRADA A AUDITORIO	2,3		2,6	5,98	1,00	1,00	5,98
ENTRADA A AUDITORIO	3		10,5	31,50	1,00	1,00	31,50
PUERTA AUDITORIO	3		2,3	6,90	1,00	-1,00	-6,90
VENTANAS PISO 2 y 3	3		1,5	4,50	1,00	-2,00	-9,00
FACHADA PRINCIPAL EDIFICIO ADMINISTRACIÓN	20,5		10,5	215,25	1,00	1,00	215,25
VENTANAS PISO 1, 2 y 3	2,92		3,5	4,38	1,00	-15,00	-65,70
ENTRADA A CONSULTA EXTERNA	20,5		4	82,00	1,00	1,00	82,00
VENTANA	2,05		1	2,05	1,00	-1,00	-2,05
VENTANA	2		1	2,00	1,00	-1,00	-2,00

ESQUEMA

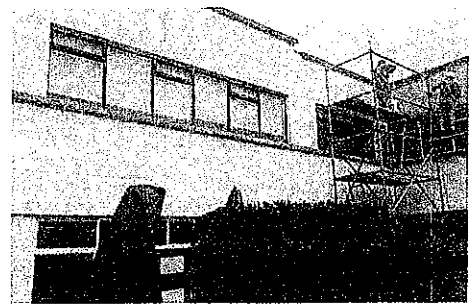

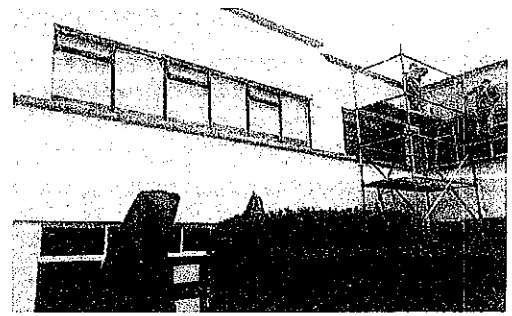



MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA


CONTRATO DE OBRA 004 de 2023	REFORZAMIENTO DE ESTRUCTURA DE CUBIERTA, CAMBIO DE CUBIERTA, MANTENIMIENTO A LA PINTURA DE FACHADAS Y MEJORAS PARA LA CARPINTERÍA METÁLICA DE LA E.S.E HOSPITAL REGIONAL DE DUITAMA
	CONSORCIO MEJORAMIENTO HOSPITALARIO 2023 R/L. GERARDO IVÁN MÁRQUEZ RINCÓN

INFORME DE CANTIDADES REALES EJECUTADAS

Acta		No. 6	PERIODO DESDE:	18 de febrero de 2024	HASTA:	7 de marzo de 2024	
CAPITULO		ITEM	UNIDAD			DESCRIPCIÓN	
FACHADA		21	M2			PINTURA FACHADA EN VINILO PARA EXTERIORES	
VENTANA	2	1	2,00	1,00	-1,00	-2,00	
VENTANA	2.9	1	2,90	1,00	-1,00	-2,90	
VENTANA	2.92	1	2,92	1,00	-1,00	-2,92	
VENTANA	1.56	1	1,56	1,00	-1,00	-1,56	
PUERTA ENTRADA CONSULTA EXTERNA	4.2	2.58	10,84	1,00	1,00	10,84	
MUROS ENTRADAS CONSULTA EXTERNA	1	2.56	2,56	1,00	2,00	6,12	
TECHO EN PLACA SOBRE PUERTA	4.2	0.8	3,36	1,00	2,00	6,72	
DESCANSO PRETAPON VOLADO ENTRADA PRINCIPAL COSTADO DESECHO SUPERIOR	2.3	1.08	2,48	1,00	-1,00	-2,48	
PATIO INTERNO DIVINO NIÑO							
COSTADO PASILLO ENTRADA PRINCIPAL	12.9	6.9	89,01	1,00	2,00	178,02	
VENTANA	2.7	2.02	5,45	1,00	-1,00	-5,45	
VENTANA	5.77	2.02	11,66	1,00	-1,00	-11,66	
VENTANA	1.72	2.02	3,47	1,00	-1,00	-3,47	
COSTADO PASILLO DE A a B	10	6.9	69,00	1,00	1,00	69,00	
VENTANA	3.9	1.5	5,85	1,00	-1,00	-5,85	
VENTANA	4.8	1.5	7,20	1,00	-1,00	-7,20	
MUROS BAJO PLACA ZONA PASILLO DE A a B	1.3	2.57	3,34	1,00	3,00	10,02	
TECHO EN PLACA SOBRE PUERTA Y VENTANAS PASILLO DE A a B	10	1.3	13,00	1,00	1,00	13,00	
VENTANAS PASILLO DE A a B	9.7	1.5	14,55	1,00	-1,00	-14,55	
PUERTA	0.95	2.3	2,19	1,00	-1,00	-2,19	
MURO CONTRA LABORATORIO	12.9	4.2	54,18	1,00	1,00	54,18	
MURO CONTRA ZONA RAMPA PISO 2	4.6	2.7	12,42	1,00	1,00	12,42	
PUERTA	0.95	2.3	2,19	1,00	-1,00	-2,19	
VENTANA	4.03	1	4,03	1,00	-1,00	-4,03	
VENTANA	1	1	1,00	1,00	-1,00	-1,00	
VENTANA	1	1	1,00	1,00	-1,00	-1,00	
PATIO INTERNO DESCENSO RAMPA (FRIJOL)							
COSTADO PASILLO INTERCOMUNICACION BLOQUES B y C	10	10.3	103,00	1,00	1,00	103,00	
VENTANA PISO 1 y 2	2.74	1.5	4,11	1,00	-2,00	-8,22	
VENTANA PISO 1 y 2	6.1	1.5	9,15	1,00	-2,00	-18,30	
VENTANA PISO 3	2.74	1.5	4,11	1,00	-1,00	-4,11	
VENTANA PISO 3	5.7	1.5	8,55	1,00	-1,00	-8,55	
COSTADO RAMPA	6.6	6.6	43,56	1,00	1,00	43,56	
VENTANA	5.7	1.5	8,55	1,00	-1,00	-8,55	
PUERTA	0.6	2.3	1,38	1,00	-1,00	-1,38	
VENTANA PISO 2	1.9	1.5	2,85	1,00	-1,00	-2,85	
TECHO BAJO PLACA	6.6	0.65	4,29	1,00	1,00	4,29	
COSTADO ZONA RAYOS X	10.1	4.15	41,92	1,00	1,00	41,92	
VENTANAS	3	1	3,00	1,00	-1,00	-3,00	
VENTANAS	3	1	3,00	1,00	-1,00	-3,00	
COSTADO SALAS DE CIRUGIA	6.6	4.15	27,39	1,00	1,00	27,39	
VENTANA	6.2	1.5	9,30	1,00	-1,00	-9,30	
BLOQUE C							
MURO FACHADA BLOQUE C CONTIGUO A BLOQUE B	6.65	3.5	23,28	1,00	1,00	23,28	
VENTANA	4.35	1.3	5,66	1,00	-1,00	-5,66	
VENTANA	6.1	1.3	7,93	1,00	-1,00	-7,93	
BLOQUE C FACHADA HACIA RI	6.1	3.5	21,35	1,00	1,00	21,35	
PARQUEO AMBULANCIAS							
MURO PARQUEO AMBULANCIAS CONTIGUO MANTENIMIENTO	16.50	4.10	67,65	1,00	1,00	67,65	

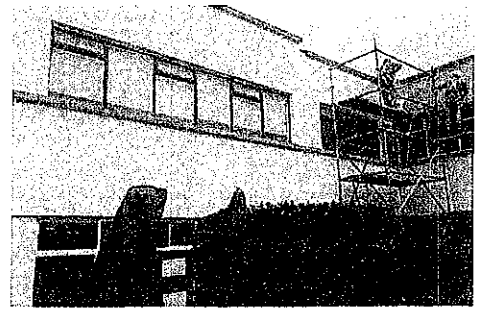

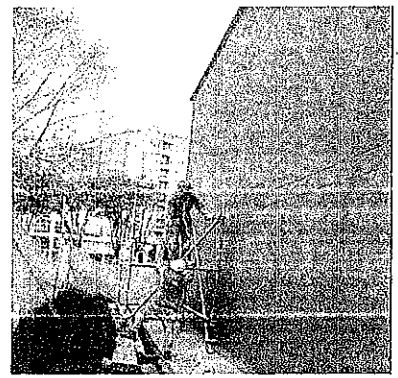





MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

CONTRATO DE OBRA 004 de 2023	REFORZAMIENTO DE ESTRUCTURA DE CUBIERTA, CAMBIO DE CUBIERTA, MANTENIMIENTO A LA PINTURA DE FACHADAS Y MEJORAS PARA LA CARPINTERÍA METÁLICA DE LA E.S.E HOSPITAL REGIONAL DE DUITAMA
	CONSORCIO MEJORAMIENTO HOSPITALARIO 2023 R/L. GERARDO IVÁN MÁRQUEZ RINCÓN

INFORME DE CANTIDADES REALES EJECUTADAS

Acta		No. 6	PERIODO DESDE:	18 de febrero de 2024	HASTA:	7 de marzo de 2024	
CAPITULO		ITEM	UNIDAD	DESCRIPCIÓN			
FACHADA		21	M2	PINTURA FACHADA EN VINILO PARA EXTERIORES			
VENTANA	1.1	1.50	1.65	1.00	-6.00	-9.90	
COSTADO BASE AMBULANCIAS	12.3	1.05	13.13	1.00	1.00	13.13	
COSTADO DESCARGUE AMBULANCIAS	12.3	1.05	13.13	1.00	1.00	13.13	
ZONA CONSULTA EXTERNA							
COSTADO VENTANA BAÑO	2.59	3.90	9.99	1.00	1.00	9.98	
VENTANA	0.9	0.90	0.81	1.00	-1.00	-0.81	
COSTADO FACHADA PARALELO A VIA URGENCIAS	22.7	4.1	93.07	1.00	1.00	93.07	
VENTANA 139	3	1.00	3.00	1.00	-1.00	-3.00	
VENTANA 140	3	1.00	3.00	1.00	-1.00	-3.00	
VENTANA 141	3	1.00	3.00	1.00	-1.00	-3.00	
VENTANA 142	3	1.00	3.00	1.00	-1.00	-3.00	
VENTANA 143	3	1.00	3.00	1.00	1.00	3.00	
VENTANA 144	2.85	1.00	2.85	1.00	1.00	2.85	
VENTANA 145	3	1.00	3.00	1.00	-1.00	-3.00	
ZONA TERRAZA C2							
MURO CONTRA PATIO	6.4	0.8	5.12	1.00	1.00	5.12	
MURO COSTADO URGENCIAS	6.4	1.65	10.56	1.00	1.00	10.56	
MURO COSTADO RX	2.17	0.8	1.74	1.00	1.00	1.74	
MURO COSTADO BLOQUE C	2.1	4.38	9.18	1.00	1.00	9.18	
VENTANA	0.93	1.3	1.24	1.00	-1.00	-1.24	
PUERTA	0.7	2.2	1.54	1.00	-1.00	-1.54	
ZONA TERRAZA C3							
MURO CONTRA SALAS CIRUGIA	6.5	1	6.50	1.00	1.00	6.50	
MURO COSTADO BLOQUE C	6.6	3.6	23.76	1.00	1.00	23.76	
MURO COSTADO RX	1.8	1	1.80	1.00	1.00	1.80	
MURO COSTADO BLOQUE C	2	3.6	7.20	1.00	1.00	7.20	
VENTANA	2.97	1.3	3.86	1.00	-1.00	-3.86	
VENTANA	1.2	1.3	1.56	1.00	-1.00	-1.56	
PUERTA	0.8	2.33	1.86	1.00	-1.00	-1.86	
BLOQUE C (CAMBIO COLOR BLANCO A GRIS)							
MURO FACHADA BLOQUE C CONTIGUO A BLOQUE B RETOQUE	6.65	3.5	23.28	1.00	1.00	23.28	
VENTANA	4.35	1.3	5.66	1.00	-1.00	-5.66	
VENTANA	6.1	1.3	7.93	1.00	-1.00	-7.93	
BLOQUE C FACHADA HACIA RX	6.1	3.5	21.35	1.00	1.00	21.35	
COSTADO PASILLO INTERCONEXION BLOQUES B y C	10	10.3	103.00	1.00	1.00	103.00	
VENTANA PISO 1 y 2	2.74	1.5	4.11	1.00	-2.00	-8.22	
VENTANA PISO 1 y 2	6.1	1.5	9.15	1.00	-2.00	-18.30	
VENTANA PISO 3	2.74	1.5	4.11	1.00	-1.00	-4.11	
VENTANA PISO 3	5.7	1.5	8.55	1.00	-1.00	-8.55	
CASETA DE LADURIA POR CRA 35							
MURO COSTADO RESIDUOS	1.9	2.6	4.94	1.00	1.00	4.94	
MURO COSTADO LVMS	2.7	2.5	6.75	1.00	1.00	6.75	
MURO COSTADO PUERTA REJA	1.7	1.1	1.87	1.00	1.00	1.87	
MURO COSTADO CRA 35	3.3	2.44	7.81	1.00	1.00	7.81	
MURO COSTADO CRA 36	1.3	2.44	2.89	1.00	1.00	2.89	
ZONA HOSPITALIZACIÓN BLOQUE C							
COSTADO DERECHO BLOQUE C	35.10	7.58	265.53	1.00	1.00	265.53	
VENTANAS	1.1	1.50	1.65	1.00	-30.00	-33.00	
ZONA EXTERNA FOSO ASCENSOR I	1.5	14.10	21.15	1.00	1.00	21.15	
ZONA EXTERNA FOSO ASCENSOR SOBRE C3	5.3	2.40	12.72	1.00	1.00	12.72	
ZONA INTERNA FOSO ASCENSOR ACCESO A CUBIERTA C3	1.6	0.60	0.96	1.00	1.00	0.96	
ZONA INTERNA FOSO ASCENSOR ACCESO A CUBIERTA C3	1.5	1.60	2.40	1.00	1.00	2.40	

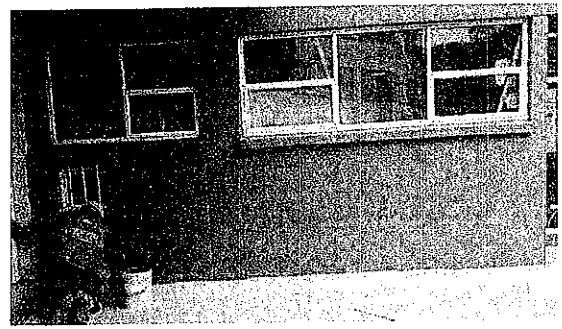

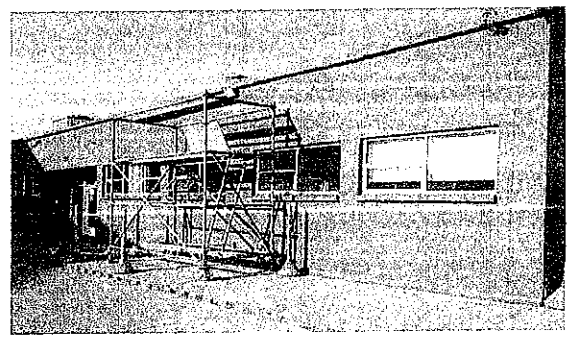

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

CONTRATO DE OBRA 004 de 2023

REFORZAMIENTO DE ESTRUCTURA DE CUBIERTA, CAMBIO DE CUBIERTA, MANTENIMIENTO A LA PINTURA DE FACHADAS Y MEJORAS PARA LA CARPINTERÍA METÁLICA DE LA E.S.E HOSPITAL REGIONAL DE DUITAMA


CONSORCIO MEJORAMIENTO HOSPITALARIO 2023 R/L. GERARDO IVÁN MÁRQUEZ RINCÓN

INFORME DE CANTIDADES REALES EJECUTADAS

Acta: No. 6 | PERIODO DESDE: 16 de febrero de 2024 | HASTA: 7 de marzo de 2024

CAPÍTULO: FACHADA | ITEM: 21 | UNIDAD: M2 | DESCRIPCIÓN: PINTURA FACHADA EN VINILO PARA EXTERIORES

ZONA INTERNA FOSO ASCENSOR, ACCESO A CUBIERTA C9	0.7		4,00	2,80	1,00	1,00	2,80
ZONA INTERNA FOSO ASCENSOR, ACCESO A CUBIERTA C9	0.55		4,00	2,20	1,00	1,00	2,20
ZONA INTERNA FOSO ASCENSOR, ACCESO A CUBIERTA C9	0.8		1,90	1,52	1,00	1,00	1,52
FACHADA POSTERIOR BLOQUE C ENTRADA UCI DOMO DERECHO	1.65		7,28	13,47	1,00	1,00	13,47
VENTANAS	1.1		1,58	1,74	1,00	-2,00	-3,48
FACHADA POSTERIOR BLOQUE C ANTERIOR A ENTRADA UCI DOMO DERECHO	3.2		7,28	23,30	1,00	1,00	23,30
MURO ANTEPECHO DOMO FACHADA POSTERIOR	4.9		1,00	4,90	1,00	1,00	4,90
MURO ANTEPECHO DOMO COSTADO DERECHO	33.8		1,30	43,88	1,00	1,00	42,68
FACHADA POSTERIOR BLOQUE C REPINTADO	10.4		11,30	117,52	1,00	0,00	0,00
FACHADA POSTERIOR BLOQUE C AREA NO RESANADA POR HUMEDAD	6.51		0,30	1,95	1,00	-1,00	-1,95
INTERCONEXION BLOQUE C a B REPINTADO POR ARREGLO E INSTALACION LINEAS DE VIDA	4.6		1,23	5,66	1,00	0,00	0,00
HALL DE ACCESO							
MURO COSTADO DERECHO CONTIGUO A ADMINISTRACIÓN	11,30		7,60	85,88	1,00	1,00	85,88
ZONA VENTANA PATIO DIVINO NIÑO	10.1		3,72	37,57	1,00	1,00	37,57
VENTANA PATIO DIVINO NIÑO	9.5		2,7	25,65	1,00	-1,00	-25,65
TECHO PLACA ENTRADA PRINCIPAL	10.5		2,4	25,20	1,00	1,00	25,20
TECHO ANTEPECHO ENTRADA PRINCIPAL	10.5		1,1	11,55	1,00	1,00	11,55
TECHO ANTEPECHO ENTRADA PRINCIPAL	2.4		1,1	2,64	1,00	1,00	2,64
ZONA CONSULTA EXTERNA							
MURO CONSULTA EXTERNA VIA URGENCIAS	10.4		4	41,60	1,00	1,00	41,60
ZONA HOSPITALIZACIÓN BLOQUE B							
FACHADA POSTERIOR BLOQUE B REPINTADO	14,50		3,75	54,38	1,00	0,00	0,00
INTERCONEXION DE BLOQUE A a B REPINTADO	9.80		1,23	12,05	1,00	0,00	0,00
ZONA HOSPITALIZACIÓN BLOQUE A							
FACHADA POSTERIOR BLOQUE A REPINTADO	14,30		1,00	14,30	1,00	0,00	0,00

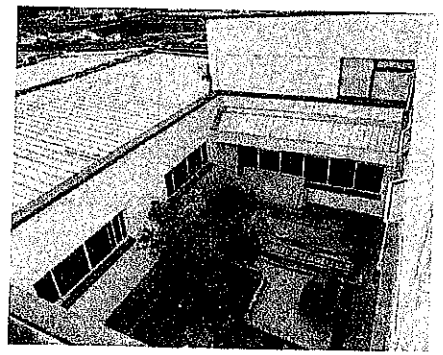



CANTIDAD TOTAL ACTA NO. 1	
CANTIDAD TOTAL ACTA NO. 2	1127,24
CANTIDAD TOTAL ACTA NO. 3	268,50
CANTIDAD TOTAL ACTA NO. 4	1313,16
CANTIDAD TOTAL ACTA NO. 5	0,00
CANTIDAD TOTAL ACTA NO. 6	0,00
	3293,36

Observaciones:

Elaboró:

RESIDENTE ADMINISTRATIVA DE OBRA
Ing. Víctor Raimundo Pinto

RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
Ing. Diana Carolina Delfos

Vo.Bo.:

R/L CONTRATISTA DE OBRA
Ing. Gerardo Iván Márquez

R/L CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA
Ing. Lina Maria Sánchez

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA


CONTRATO DE OBRA 004 de 2023	REFORZAMIENTO DE ESTRUCTURA DE CUBIERTA, CAMBIO DE CUBIERTA, MANTENIMIENTO A LA PINTURA DE FACHADAS Y MEJORAS PARA LA CARPINTERÍA METÁLICA DE LA E.S.E HOSPITAL REGIONAL DE DUITAMA
	CONSORCIO MEJORAMIENTO HOSPITALARIO 2023 R/L. GERARDO IVÁN MÁRQUEZ RINCÓN


INFORME DE CANTIDADES REALES EJECUTADAS


Acta	No. 5	PERIODO DESDE:	18 de febrero de 2024	HASTA:	7 de marzo de 2024
CAPITULO	ITEM	UNIDAD	DESCRIPCIÓN		
VENTANERIA	28	M2	VENTANA EN ALUMINIO PROYECTANTE CON VIDRIO TRASLUCIDO		

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			AREA	CANTIDAD UNITARIA	CANTIDAD ELEMENTO	TOTAL
	LONGITUD	ANCHO	ALTURA				
ZONA GENERAL HOSPITAL							
V 144	2.65		1	2.65		1,00	2,65
V 174 (RAMPA)	5.33		1.3	6,93		1,00	5,93
V 174 (RAMPA)	4.51		1.3	5,86		1,00	5,86
V 174 (RAMPA)	5		1.3	6,50		1,00	6,50
V162 (PATIO UCI PISO 2)	6.33		1.3	8,23		1,00	8,23

ESQUEMA







CANTIDAD TOTAL ACTA No. 1	0,00
CANTIDAD TOTAL ACTA No. 2	35,99
CANTIDAD TOTAL ACTA No. 3	20,34
CANTIDAD TOTAL ACTA No. 4	
CANTIDAD TOTAL ACTA No. 5	
CANTIDAD TOTAL ACTA No. 6	30,35

Observaciones:

Elaboró:

RESIDENTE CONTRATISTA DE OBRA
Ing. Victor Hernando Pinto

RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
Ing. Dilson Carolina Dallos

Vo.Bo.:

R/L CONTRATISTA DE OBRA
Ing. Gerardo Iván Márquez

R/L CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA
Ing. Lina Mercedez Naudiz

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA


CONTRATO DE OBRA 004 de 2023	REFORZAMIENTO DE ESTRUCTURA DE CUBIERTA, CAMBIO DE CUBIERTA, MANTENIMIENTO A LA PINTURA DE FACHADAS Y MEJORAS PARA LA CARPINTERÍA METÁLICA DE LA E.S.E HOSPITAL REGIONAL DE DUITAMA
	CONSORCIO MEJORAMIENTO HOSPITALARIO 2023 R/L. GERARDO IVÁN MÁRQUEZ RINCÓN


INFORME DE CANTIDADES REALES EJECUTADAS

Acta	No. 6	PERIODO DESDE:	18 de febrero de 2024	HASTA:	7 de marzo de 2024
CAPÍTULO	ITEM	UNIDAD	DESCRIPCIÓN		
VENTANERIA	NP7	M2	VENTANA EN ALUMINIO CORREDIZA		


LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			AREA	CANTIDAD UNITARIA	CANTIDAD ELEMENTO	TOTAL
	LONGITUD	ANCHO	ALTURA				
ZONA GENERAL HOSPITAL							
V 165 (Patio UCI - Piso 3)	5.9	1.28		7.55		1.00	7.55
V 166 (Patio UCI - Piso 3)	3.44	1.28		4.40		1.00	4.40
BLOQUE C - Piso 3.	5.02	1.28		6.43		1.00	6.43
BLOQUE C - Piso 3.	4.38	1.28		5.58		1.00	5.58
V 166	6.16	1.50		9.24		1.00	9.24
V 161	5.66	1.50		8.49		1.00	8.49
V 47 (TORRE CONTROL)	3.00		1.5	4.50		1.00	4.50
V 131	1.55		1	1.55		1.00	1.55
V 132	2.9		1	2.90		1.00	2.90
V 134	2		1	2.00		1.00	2.00
V 135	2		1	2.00		1.00	2.00
V 138	2		1	2.00		1.00	2.00
V 137	2		1	2.00		1.00	2.00
V 139	3		1	3.00		1.00	3.00
V 140	3		1	3.00		1.00	3.00
V 141 y 145	3		1	3.00		2.00	6.00
V 142	3		1	3.00		1.00	3.00
V 143	2.85		1	2.85		1.00	2.85
V163 (PATIO UCI PISO 2)	2.85		1.3	3.65		1.00	3.65
ZONA BLOQUE B HACIA RX LABORATORIO (COORDINACION URGENCIAS) 1	3.6		1.28	4.61		1.00	4.61
ZONA BLOQUE B HACIA RX LABORATORIO (COORDINACION URGENCIAS) 2	2.34		1.28	3.00		1.00	3.00


ESQUEMA



















CANTIDAD TOTAL ACTA No. 1				0,00
CANTIDAD TOTAL ACTA No. 2				0,00
CANTIDAD TOTAL ACTA No. 3				0,00
CANTIDAD TOTAL ACTA No. 4				0,00
CANTIDAD TOTAL ACTA No. 5				0,00
CANTIDAD TOTAL ACTA No. #				87,75



Observaciones:

Elaboró:

RESIDENTE - CONTRATISTA DE OBRA
Ing. Victor Raimundo Puerto

RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
Ing. Diana Carolina Dallos

Vo.Bo.:

RL: CONTRATISTA DE OBRA
Ing. Gerardo Iván Márquez

RL: CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA
Ing. Luz Mercedes Sanchez

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA


CONTRATO DE OBRA 004 de 2023	REFORZAMIENTO DE ESTRUCTURA DE CUBIERTA, CAMBIO DE CUBIERTA, MANTENIMIENTO A LA PINTURA DE FACHADAS Y MEJORAS PARA LA CARPINTERÍA METÁLICA DE LA E.S.E HOSPITAL REGIONAL DE DUITAMA
	CONSORCIO MEJORAMIENTO HOSPITALARIO 2023 R/L. GERARDO IVÁN MÁRQUEZ RINCÓN

INFORME DE CANTIDADES REALES EJECUTADAS

Acta	No. 6	PERIODO DESDE:	19 de febrero de 2024	HASTA:	7 de marzo de 2024
CAPÍTULO	ITEM	UNIDAD	DESCRIPCIÓN		
FACHADA	NP 18	ML	FACHADA EN GRANIPLAST. ANCHO MENOR A 0.50 m		

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			LONGITUD	CANTIDAD UNITARIA	CANTIDAD ELEMENTO	TOTAL
	LONGITUD	ANCHO	ALTURA				
COSTADO INTERNO CERRAMIENTO							
68 A34	6,27			6,27	1,00	2,00	12,54
69 M35	1,00	NA		1,00	1,00	0,00	0,00
70 A35	6,26			6,26	1,00	2,00	12,52
71 M36	1,30			1,30	1,00	1,00	1,30
72 A36	6,25			6,25	1,00	2,00	12,50
74 M37	1,30	NA		1,30	1,00	0,00	0,00
75 A37	6,26			6,26	1,00	2,00	12,52
76 M38	1,30			1,30	1,00	1,00	1,30
77 A38	5,80			5,80	1,00	2,00	11,60
78 M39	1,30			1,30	1,00	1,00	1,30
79 A39	5,75			5,75	1,00	2,00	11,50
80 M40	1,30	NA		1,30	1,00	0,00	0,00
81 A40	5,73			5,73	1,00	2,00	11,46
COSTADO EXTERNO CERRAMIENTO							
51 M26	1,30			1,30	1,00	1,00	1,30
58 A23	6,24			6,24	1,00	1,00	6,24
60 A30	6,26			6,26	1,00	1,00	6,26
62 A31	6,25			6,25	1,00	1,00	6,25
63 M32	1,30	NA		1,30	1,00	0,00	0,00
64 A32	6,27			6,27	1,00	1,00	6,27
65 M33	1,30			1,30	1,00	1,00	1,30
66 A33	6,23			6,23	1,00	1,00	6,23
68 A34	6,27			6,27	1,00	1,00	6,27
70 A35	6,26			6,26	1,00	1,00	6,26
72 A36	6,25			6,25	1,00	1,00	6,25
75 A37	6,26			6,26	1,00	1,00	6,26
77 A38	5,80			5,80	1,00	1,00	5,80
79 A39	5,75			5,75	1,00	1,00	5,75
81 A40	5,73			5,73	1,00	1,00	5,73
CANTIDAD TOTAL ACTA NO. 1							0,00
CANTIDAD TOTAL ACTA NO. 2							0,00
CANTIDAD TOTAL ACTA NO. 3							0,00
CANTIDAD TOTAL ACTA NO. 4							0,00
CANTIDAD TOTAL ACTA NO. 5							0,00
CANTIDAD TOTAL ACTA NO. 6							164,71

ESQUEMA

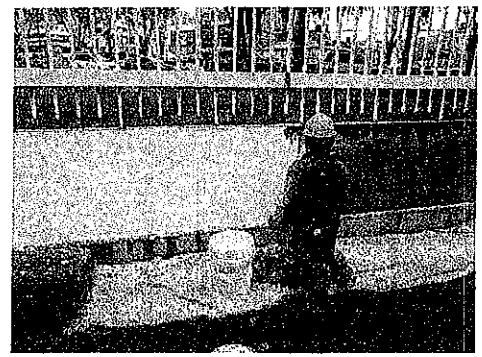



Observaciones:

Elaboró:

RESIDENTE - CONTRATISTA DE OBRA
Ing. Víctor Humberto Duarte

RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
Ing. Diana Carolina Dellos

Vo.Bo.:

R/L CONTRATISTA DE OBRA
Ing. Gerardo Iván Márquez

R/L CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA
Ing. Luis Mercedes Sánchez


MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA ACTA PARCIAL N° 6


CONTRATO DE OBRA 004 de 2023	REFORZAMIENTO DE ESTRUCTURA DE CUBIERTA, CAMBIO DE CUBIERTA, MANTENIMIENTO A LA PINTURA DE FACHADAS Y MEJORAS PARA LA CARPINTERÍA METÁLICA DE LA E.S.E HOSPITAL REGIONAL DE DUITAMA
	CONSORCIO MEJORAMIENTO HOSPITALARIO 2023 R/L. GERARDO IVÁN MÁRQUEZ RINCÓN

ACTA	No. 6	PERIODO DESDE:	16 de febrero de 2024	HASTA:	7 de marzo de 2024
CAPÍTULO	ÍTEM	UNIDAD	DESCRIPCIÓN		
ITEMS ADICIONALES NO PREVISTOS	NP 17	M2	DESMONTE DE CIELO RASO EN LAMINA DE PVC (NO INCLUYE ESTRUCTURA)		

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			AREA m2	CANTIDAD UNITARIA	CANTIDAD ELEMENTO	TOTAL
	LONGITUD	ANCHO	ALTURA				
ZONA MANTENIMIENTO, TALLERES, MEDICINA LEGAL							
DESMONTAJE CIELO RASO PVC							
PLANEACION 2 CARTERA 2 (SEGÚN PLANO HRD)	7,09	4,69		37,43	1,00	1,00	37,43
BODEGA FARMACIA	6,37	10,65		67,19	1,00	1,00	67,19
PASILLO DESCARGUE AMBULANCIAS	2,10	17,57		36,90	1,00	1,00	36,90
PASILLO BAÑO MANTENIMIENTO TALLER	2,12	16,50		34,98	1,00	1,00	34,98
DESMONTAJE CIELO RASO PVC							
BODEGA ALMACEN 1 (CIELO RASO EN FIBRA)	10,70	5,30		56,71	1,00	1,00	56,71
BLOQUE A2 HOSPITALIZACION							
HABITACIÓN 201	6,41	3,24		20,77	1,00	1,00	20,77
HABITACIÓN 202	6,41	3,24		20,77	1,00	1,00	20,77
HABITACIÓN 203	6,41	3,24		20,77	1,00	1,00	20,77
HABITACIÓN 204	6,41	3,24		20,77	1,00	1,00	20,77
HABITACIÓN 205	6,41	3,24		20,77	1,00	1,00	20,77
HABITACIÓN 208	6,41	3,24		20,77	1,00	1,00	20,77
HABITACIÓN 207	6,41	3,24		20,77	1,00	1,00	20,77
HABITACIÓN 208	6,41	3,24		20,77	1,00	1,00	20,77
HABITACIÓN 209	6,41	3,24		20,77	1,00	1,00	20,77
HABITACIÓN 210	6,41	3,24		20,77	1,00	1,00	20,77
AREA ASEO	1,80	2,30		4,14	1,00	1,00	4,14
CUARTO ASEO	2,04	1,80		3,67	1,00	1,00	3,67
TRABAJO SUCIO	1,80	4,10		7,50	1,00	1,00	7,50
TRABAJO LIMPIO	3,10	4,13		12,80	1,00	1,00	12,80
TRABAJO SUCIO	2,04	2,00		4,08	1,00	1,00	4,08
CENTRAL ENFERMERIA	2,17	3,19		6,86	1,00	1,00	6,86
CONSULTORIO	3,15	4,15		13,07	1,00	1,00	13,07
BAÑO MUJERES	3,10	4,15		12,87	1,00	1,00	12,87
BAÑO hombres	4,15	3,10		12,87	1,00	1,00	12,87
HABITACION 214	3,15	4,15		13,07	1,00	1,00	13,07
HABITACION 213	3,12	4,15		12,95	1,00	1,00	12,95
HABITACION 212	3,15	4,15		13,07	1,00	1,00	13,07
HABITACION 212 AREA ANEXA	3,15	2,51		7,91	1,00	1,00	7,91
HABITACION 215 AREA ANEXA	4,15	3,16		13,11	1,00	1,00	13,11
PASILLO A2	35,00	2,05		71,75	1,00	1,00	71,75
AREA DESCANSO	4,05	3,11		12,60	1,00	1,00	12,60
BLOQUE A4 HOSPITALIZACION							
ZONA CAMAS	12,00	6,50		78,00	1,00	1,00	78,00
ZONA ENTRADA BAÑOS A4	4,38	2,54		11,13	1,00	1,00	11,13
BAÑOS A4	2,50	1,05		2,73	1,00	1,00	2,73
BAÑOS A4	2,66	2,00		5,38	1,00	1,00	5,38

ESQUEMA

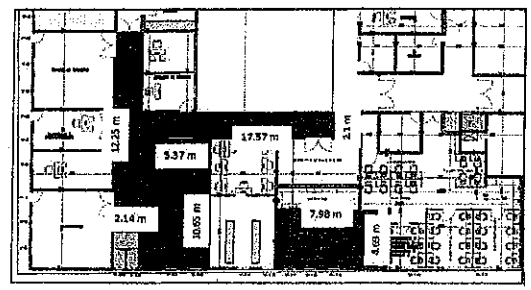


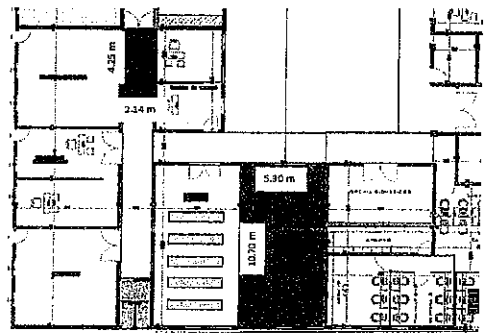


MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA ACTA PARCIAL N° 8

CONTRATO DE OBRA 004 de 2023	REFORZAMIENTO DE ESTRUCTURA DE CUBIERTA, CAMBIO DE CUBIERTA, MANTENIMIENTO A LA PINTURA DE FACHADAS Y MEJORAS PARA LA CARPINTERÍA METÁLICA DE LA E.S.E HOSPITAL REGIONAL DE DUITAMA
	CONSORCIO MEJORAMIENTO HOSPITALARIO 2023 R/L. GERARDO IVÁN MÁRQUEZ RINCÓN

ACTA		No. 8		PERIODO DESDE:			18 de febrero de 2024	HASTA:	7 de marzo de 2024
CAPÍTULO		ITEM		UNIDAD			DESCRIPCIÓN		
ITEMS ADICIONALES NO PREVISTOS		NP 17		M2			DESMONTE DE CIELO RASO EN LAMINA DE PVC (NO INCLUYE ESTRUCTURA)		
PASILLO ENTRADA A4	5,60	1,89		10,40	1,00	1,00	10,40		
ZONA HABITACIONES 201 A - 201 B	4,23	5,35		22,63	1,00	1,00	22,63		
PASILLO INTERCONEXION A2 y A4 HOSPITALIZACION (DESMONTAJE)									
ZONA SOBRE ESCALERA ENTRADAS A2 y A4	7,60	12,00		91,20	1,00	1,00	91,20		
AREA COLUMNA	1,38	0,57		0,79	1,00	-1,00	-0,79		
ZONA PASILLO ADMINISTRACIÓN a A2	4,40	4,20		18,48	1,00	1,00	18,48		
ZONA PASILLO (SERCOLEGIO) BLOQUES A y B	11,60	8,80		101,20	1,00	1,00	101,20		
AREA CUARTO DESCANSO A2	4,40	3,20		14,08	1,00	1,00	14,08		
ZONA DE REFERENSIACION A ASCENSOR	3,50	6,50		25,74	1,00	1,00	25,74		
ZONA LIDER HOSPITALIZACIÓN I	5,60	2,70		15,66	1,00	1,00	15,66		
ZONA LIDER HOSPITALIZACIÓN I	1,38	1,60		2,16	1,00	1,00	2,16		
ZONA LIDER HOSPITALIZACIÓN	2,36	1,00		2,36	1,00	1,00	2,36		
COORDINACION DE URGENCIAS	9,50	2,80		10,08	1,00	1,00	10,08		
CUARTO ASEO	4,55	1,72		7,83	1,00	1,00	7,83		
BLOQUE B2 HOSPITALIZACIÓN (DESMONTAJE)									
HABITACIÓN 201	3,56	3,23		11,50	1,00	1,00	11,50		
HABITACIÓN 201	2,82	1,27		3,58	1,00	1,00	3,58		
HABITACIÓN 202	3,57	3,17		11,32	1,00	1,00	11,32		
HABITACIÓN 202	2,80	1,30		3,64	1,00	1,00	3,64		
HABITACIÓN 203	3,54	3,15		11,15	1,00	1,00	11,15		
HABITACIÓN 203	2,89	1,30		3,68	1,00	1,00	3,68		
HABITACIÓN 204	3,56	3,17		11,29	1,00	1,00	11,29		
HABITACIÓN 204	2,81	1,30		3,65	1,00	1,00	3,65		
HABITACIÓN 205	3,50	3,37		11,81	1,00	1,00	11,81		
HABITACIÓN 205	2,82	1,30		3,67	1,00	1,00	3,67		
HABITACIÓN 206	3,56	3,16		11,25	1,00	1,00	11,25		
HABITACIÓN 206	2,82	1,30		3,67	1,00	1,00	3,67		
HABITACIÓN 207	3,65	3,20		11,68	1,00	1,00	11,68		
HABITACIÓN 207	2,82	1,30		3,67	1,00	1,00	3,67		
HABITACIÓN 208	3,56	3,15		11,21	1,00	1,00	11,21		
HABITACIÓN 208	2,82	1,30		3,67	1,00	1,00	3,67		
HABITACIÓN 209	3,57	3,18		11,35	1,00	1,00	11,35		

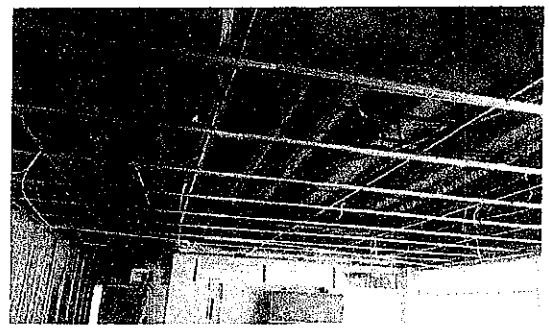

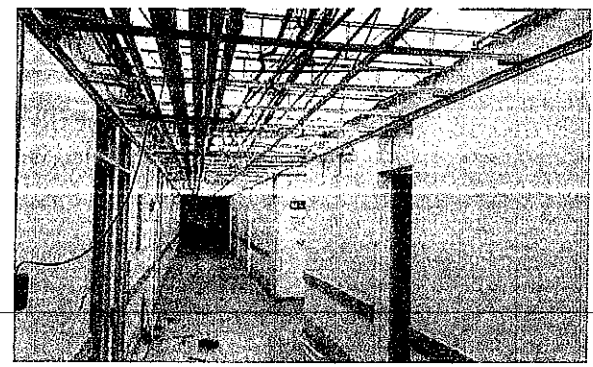


MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA ACTA PARCIAL N° 8

CONTRATO DE OBRA 004 de 2023	REFORZAMIENTO DE ESTRUCTURA DE CUBIERTA, CAMBIO DE CUBIERTA, MANTENIMIENTO A LA PINTURA DE FACHADAS Y MEJORAS PARA LA CARPINTERÍA METÁLICA DE LA E.S.E HOSPITAL REGIONAL DE DUITAMA
	CONSORCIO MEJORAMIENTO HOSPITALARIO 2023 R/L. GERARDO IVÁN MÁRQUEZ RINCÓN

ACTA		No. 8		PERIODO DESDE:			18 de febrero de 2024	HASTA:	7 de marzo de 2024
CAPÍTULO		ITEM		UNIDAD			DESCRIPCIÓN		
ITEMS ADICIONALES NO PREVISTOS		N° 17		M2			DESMONTE DE CIELO RASO EN LAMINA DE PVC (NO INCLUYE ESTRUCTURA)		
HABITACIÓN 209	2,80	1,30		3,64	1,00	1,00	3,64		
HABITACIÓN 210	3,57	3,23		11,53	1,00	1,00	11,53		
HABITACIÓN 210	2,80	1,30		3,64	1,00	1,00	3,64		
HABITACIÓN 211	4,16	3,11		12,90	1,00	1,00	12,90		
HABITACIÓN 211	1,66	1,40		2,31	1,00	1,00	2,31		
HABITACIÓN 212	4,16	3,14		13,06	1,00	1,00	13,06		
HABITACIÓN 212	1,66	1,40		2,32	1,00	1,00	2,32		
HABITACIÓN 213	4,14	3,15		13,04	1,00	1,00	13,04		
HABITACIÓN 213	1,62	1,40		2,27	1,00	1,00	2,27		
HABITACIÓN 214	4,14	3,16		13,08	1,00	1,00	13,08		
HABITACIÓN 214	1,70	1,40		2,38	1,00	1,00	2,38		
HABITACIÓN 215	4,15	3,14		13,03	1,00	1,00	13,03		
ZONA TRABAJO LIMPIO	1,99	2,05		4,02	1,00	1,00	4,02		
ZONA TRABAJO LIMPIO	3,15	4,14		13,04	1,00	1,00	13,04		
ZONA CENTRAL ENFERMERÍA	3,15	2,17		6,84	1,00	1,00	6,84		
ZONA MESON SANITARIO PEDESTAL	4,15	2,05		8,53	1,00	1,00	8,53		
ZONA MESON SANITARIO PEDESTAL	4,15	2,98		12,28	1,00	1,00	12,28		
ZONA PASILLO B2	35,10	2,07		72,66	1,00	1,00	72,66		
PASILLO INTERCONEXIÓN BLOQUE ,B y C HOSPITALIZACIÓN (DESMONTAJE)									
ZONA ESCALERA Y CONEXIÓN DE BLOUES B a C	7,60	18,10		137,56	1,00	2,00	275,12		
ZONA RAMPA (DESMONTE Y MONTAJE)	6,84	2,60		17,78	1,00	2,00	35,57		
ZONA RAMPA (SOLO MONTAJE)	5,95	2,30		13,69	1,00	1,00	13,69		
ZONA RAMPA (SOLO MONTAJE)	5,95	6,84		40,70	1,00	1,00	40,70		
ZONA RAMPA (SOLO MONTAJE)	3,35	4,70		15,75	1,00	1,00	15,75		
BLOQUE C3 HOSPITALIZACIÓN (DESMONTAJE)									
PASILLO BLOQUE C3	10,00	6,30		100,80	1,00	1,00	100,80		
PASILLO BLOQUE C3 COLUMNAS	0,49	0,33		0,17	1,00	-2,00	-0,35		
PASILLO BLOQUE C3 COLUMNAS	0,70	0,50		0,35	1,00	-1,00	-0,35		
PASILLO BLOQUE C3 COLUMNAS	0,60	0,50		0,30	1,00	-1,00	-0,30		
AREA ASEO	1,70	1,90		3,23	1,00	1,00	3,23		
AREA ASEO	1,70	2,43		4,13	1,00	1,00	4,13		
HABITACIÓN 301	4,20	3,30		13,86	1,00	1,00	13,86		
HABITACIÓN 301	2,16	1,33		2,88	1,00	1,00	2,88		
HABITACIÓN 302	4,22	3,20		13,50	1,00	1,00	13,50		
HABITACIÓN 302	2,16	1,33		2,88	1,00	1,00	2,88		
HABITACIÓN 303	4,22	3,16		13,34	1,00	1,00	13,34		
HABITACIÓN 303	2,16	1,33		2,88	1,00	1,00	2,88		
HABITACIÓN 304	4,30	3,15		13,55	1,00	1,00	13,55		



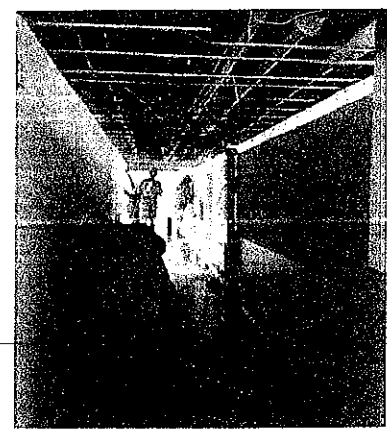


MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA ACTA PARCIAL N° 6

CONTRATO DE OBRA 004 de 2023	REFORZAMIENTO DE ESTRUCTURA DE CUBIERTA, CAMBIO DE CUBIERTA, MANTENIMIENTO A LA PINTURA DE FACHADAS Y MEJORAS PARA LA CARPINTERÍA METÁLICA DE LA E.S.E HOSPITAL REGIONAL DE DUITAMA

CONSORCIO MEJORAMIENTO HOSPITALARIO 2023 R/L. GERARDO IVÁN MÁRQUEZ RINCÓN

ACTA		No. 6		PERIODO DESDE:	18 de febrero de 2024	HASTA:	7 de marzo de 2024
CAPÍTULO		ITEM		UNIDAD			DESCRIPCIÓN
ITEMS ADICIONALES NO PREVISTOS		NP 17		M2			DESMONTE DE CIELO RASO EN LAMINA DE PVC (NO INCLUYE ESTRUCTURA)
HABITACIÓN 304	2,16	1,33		2,86	1,00	1,00	2,86
HABITACIÓN 305	4,20	3,20		13,44	1,00	1,00	13,44
HABITACIÓN 305	2,16	1,33		2,86	1,00	1,00	2,86
HABITACIÓN 306	4,20	3,20		13,44	1,00	1,00	13,44
HABITACIÓN 306	2,16	1,33		2,86	1,00	1,00	2,86
HABITACIÓN 307	4,20	3,20		13,44	1,00	1,00	13,44
HABITACIÓN 307	2,16	1,33		2,86	1,00	1,00	2,86
HABITACIÓN 308	4,20	3,20		13,44	1,00	1,00	13,44
HABITACIÓN 308	2,16	1,33		2,86	1,00	1,00	2,86
HABITACIÓN 309	4,20	3,26		13,69	1,00	1,00	13,69
HABITACIÓN 309	2,16	1,33		2,86	1,00	1,00	2,86
HABITACIÓN 310	4,20	3,20		13,44	1,00	1,00	13,44
HABITACIÓN 310	2,16	1,33		2,86	1,00	1,00	2,86
HABITACIÓN 311	4,13	3,35		13,84	1,00	1,00	13,84
HABITACIÓN 311	2,45	1,46		3,58	1,00	1,00	3,58
HABITACIÓN 312	4,13	3,20		13,22	1,00	1,00	13,22
HABITACIÓN 312	1,53	2,45		3,75	1,00	1,00	3,75
HABITACIÓN 313	4,16	3,20		13,28	1,00	1,00	13,28
HABITACIÓN 313	1,50	2,45		3,68	1,00	1,00	3,68
HABITACIÓN 314	4,16	3,16		13,07	1,00	1,00	13,07
HABITACIÓN 314	1,50	2,45		3,68	1,00	1,00	3,68
CONSULTORIO	4,16	3,16		13,07	1,00	1,00	13,07
ESTACIÓN ENFERMERÍA BAÑO	2,10	2,00		4,20	1,00	1,00	4,20
TRABAJO LIMPIO	3,26	4,16		13,53	1,00	1,00	13,53
TRABAJO LIMPIO	3,20	2,16		7,01	1,00	1,00	7,01
TRABAJO SUCIO	4,12	1,90		7,83	1,00	1,00	7,83
AREA DESCANSO	4,15	3,05		12,66	1,00	1,00	12,66
PASILLO BLOQUE 03	35,00	2,14		74,90	1,00	1,00	74,90
ZONA RAYOS X y LABORATORIO (DESMONTE)							
PASILLO LABORATORIO - RX	22,40	1,95		43,68	1,00	1,00	43,68
PASILLO ENTRADA A LABORATORIO	4,90	1,95		9,56	1,00	1,00	9,56
PASILLO ENTRADA A LABORATORIO	4,46	2,15		9,57	1,00	1,00	9,57
CUARTO ASEO	2,60	2,00		5,20	1,00	1,00	5,20
CUARTO CONTIGUO	2,60	2,00		5,20	1,00	1,00	5,20
CUARTO CONTIGUO	2,62	2,00		5,25	1,00	1,00	5,25
CUARTO CONTIGUO	1,10	2,10		2,31	1,00	1,00	2,31
PASILLO INTERCONEXIÓN AREAS	6,80	3,20		13,95	1,00	1,00	13,95
AREA CONTIGUA	2,12	1,20		2,54	1,00	1,00	2,54
CONSULTORIO 8	3,10	5,20		16,12	1,00	1,00	16,12

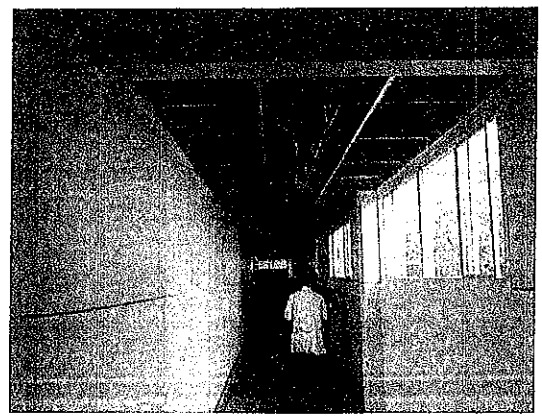

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA ACTA PARCIAL N° 6

CONTRATO DE OBRA 064 de 2023	REFORZAMIENTO DE ESTRUCTURA DE CUBIERTA, CAMBIO DE CUBIERTA, MANTENIMIENTO A LA PINTURA DE FACHADAS Y MEJORAS PARA LA CARPINTERÍA METÁLICA DE LA E.S.E HOSPITAL REGIONAL DE DUITAMA
CONSORCIO MEJORAMIENTO HOSPITALARIO 2023 R/L. GERARDO IVÁN MÁRQUEZ RINCÓN	

ACTA	No. 6	PERIODO DESDE:	18 de febrero de 2024	HASTA:	7 de marzo de 2024
CAPÍTULO	ITEM	UNIDAD	DESCRIPCIÓN		
ITEMS ADICIONALES NO PREVISTOS	NP 17	M2	DESMONTE DE CIELO RASO EN LAMINA DE PVC (NO INCLUYE ESTRUCTURA)		

CUARTO LECTURA RX	4.30	3.50		14.70	1.00	1.00	14.70
CUARTO ELECTRICO RX	2.50	2.30		5.75	1.00	1.00	5.75
HALL DE ACCESO (DESMONTE)							
HALL DE ACCESO (DESMONTE)	16.50	10.00		165.00	1.00	1.00	165.00
CANTIDAD TOTAL ACTA NO. 1							-
CANTIDAD TOTAL ACTA NO. 2							-
CANTIDAD TOTAL ACTA NO. 3							-
CANTIDAD TOTAL ACTA NO. 4							-
CANTIDAD TOTAL ACTA NO. 5							-
CANTIDAD TOTAL ACTA NO. 6							2.581,03



Elaboró:

RESIDENTE CONTRATISTA DE OBRA
Ing. Víctor Hernando Prieto

RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
Ing. Diana Carolina Ballos

Vo.Bo.:

R/L CONTRATISTA DE OBRA
Ing. Gerardo Iván Márquez

R/L CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA
Arq. Sebastián Alonso Camargo Castillo


MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA ACTA PARCIAL N° 6


CONTRATO DE OBRA 004 de 2023	REFORZAMIENTO DE ESTRUCTURA DE CUBIERTA, CAMBIO DE CUBIERTA, MANTENIMIENTO A LA PINTURA DE FACHADAS Y MEJORAS PARA LA CARPINTERÍA METÁLICA DE LA E.S.E HOSPITAL REGIONAL DE DUITAMA
	CONSORCIO MEJORAMIENTO HOSPITALARIO 2023 R/L. GERARDO IVÁN MÁRQUEZ RINCÓN

ACTA	No. 6	PERÍODO DESDE:	18 de febrero de 2024	HASTA:	7 de marzo de 2024	
CAPÍTULO	ITEM	UNIDAD	DESCRIPCIÓN			
ITEMS ADICIONALES NO PREVISTOS	NP 18	M2	REINSTALACIÓN DE LAMINA DE CIELO RASO PVC			

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			LONGITUD	CANTIDAD UNITARIA	CANTIDAD ELEMENTO	TOTAL
	LONGITUD	ANCHO	ALTURA				
ZONA MANTENIMIENTO, TALLERES, MEDICINA LEGAL							
MONTAJE CIELO RASO PVC							
PLANEACION 2 CARTERA 2 (SEGT I PLANO HRD)	7,98	4,69		37,43	1,00	1,00	37,43
BODEGA FARMACIA	5,37	10,65		57,19	1,00	1,00	57,19
PASILLO DESCARGUE AMBULANCIAS	2,10	17,57		36,90	1,00	1,00	36,90
PASILLO BAÑO MANTENIMIENTO TALLER	2,14	12,25		26,22	1,00	1,00	26,22
MONTAJE CIELO RASO PVC							
PASILLO BAÑO MANTENIMIENTO TALLER	2,14	4,25		9,10	1,00	1,00	9,10
BLOQUE A2 HOSPITALIZACION (MONTAJE)							
HABITACIÓN 201	6,41	3,24		20,77	1,00	1,00	20,77
HABITACIÓN 202	6,41	3,24		20,77	1,00	1,00	20,77
HABITACIÓN 203	6,41	3,24		20,77	1,00	1,00	20,77
HABITACIÓN 204	6,41	3,24		20,77	1,00	1,00	20,77
HABITACIÓN 205	6,41	3,24		20,77	1,00	1,00	20,77
HABITACIÓN 206	6,41	3,24		20,77	1,00	1,00	20,77
HABITACIÓN 207	6,41	3,24		20,77	1,00	1,00	20,77
HABITACIÓN 209	6,41	3,24		20,77	1,00	1,00	20,77
HABITACIÓN 208	6,41	3,24		20,77	1,00	1,00	20,77
HABITACIÓN 210	6,41	3,24		20,77	1,00	1,00	20,77
AREA ASEO	1,60	2,30		4,14	1,00	1,00	4,14
CUARTO ASEO	2,04	1,60		3,87	1,00	1,00	3,87
TRABAJO SUCIO	1,60	4,10		7,60	1,00	1,00	7,60
TRABAJO LIMPIO	3,10	4,19		12,80	1,00	1,00	12,80
TRABAJO SUCIO	2,04	2,00		4,08	1,00	1,00	4,08
CENTRAL ENFERMERIA	2,17	3,16		6,88	1,00	1,00	6,88
COCINA TORO	3,16	4,16		13,07	1,00	1,00	13,07
BAÑO MUJERES	3,10	4,15		12,87	1,00	1,00	12,87
BAÑO hombres	4,15	3,10		12,87	1,00	1,00	12,87
HABITACION 214	3,15	4,15		13,07	1,00	1,00	13,07
HABITACION 213	3,12	4,15		12,95	1,00	1,00	12,95
HABITACION 212	3,15	4,15		13,07	1,00	1,00	13,07
HABITACION 212 AREA ANEXA	3,16	2,51		7,91	1,00	1,00	7,91
HABITACION 212 AREA ANEXA	4,15	3,18		13,11	1,00	1,00	13,11
PASILLO A2	35,00	2,05		71,75	1,00	1,00	71,75
AREA DESCANSO	4,05	3,11		12,60	1,00	1,00	12,60
BLOQUE A4 HOSPITALIZACION (MONTAJE)							

ESQUEMA

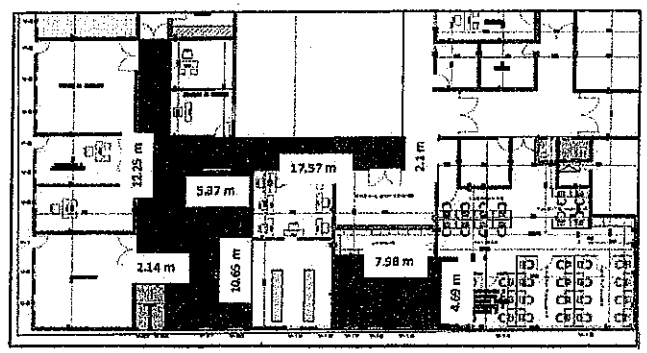

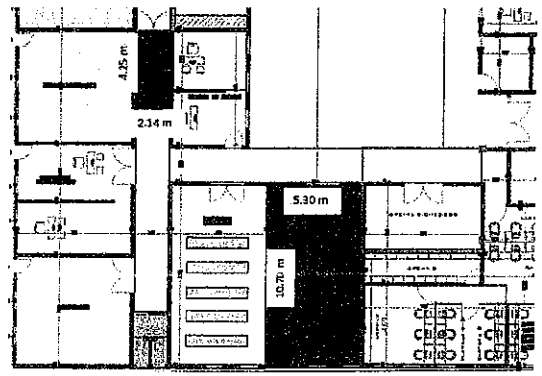


MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA ACTA PARCIAL N° 6

CONTRATO DE OBRA 004 de 2023	REFORZAMIENTO DE ESTRUCTURA DE CUBIERTA, CAMBIO DE CUBIERTA, MANTENIMIENTO A LA PINTURA DE FACHADAS Y MEJORAS PARA LA CARPINTERÍA METÁLICA DE LA E.S.E HOSPITAL REGIONAL DE DUITAMA
	CONSORCIO MEJORAMIENTO HOSPITALARIO 2023 R/L. GERARDO IVÁN MÁRQUEZ RINCÓN

ACTA	No. 6	PERIODO DESDE:	16 de febrero de 2024	HASTA:	7 de marzo de 2024
CAPÍTULO	ITEM	UNIDAD	DESCRIPCIÓN		
ITEMS ADICIONALES NO PREVISTOS	NP 18	M2	REINSTALACIÓN DE LAMINA DE CIELO RASO PVC		

ZONA CAMAS	12,00	6,50		78,00	1,00	1,00	78,00
ZONA ENTRADA BAÑOS A4	4,38	2,54		11,13	1,00	1,00	11,13
BAÑOS A4	2,60	1,05		2,73	1,00	1,00	2,73
BAÑOS A4	2,55	3,03		5,38	1,00	1,00	5,38
PASILLO ENTRADA A4	5,50	1,89		10,40	1,00	1,00	10,40
ZONA HABITACIONES 201 A - 201 B	4,29	5,35		22,83	1,00	1,00	22,83
PASILLO INTERCONEXION A2 y A4 .HOSPITALIZACION (MONTAJE)							
ZONA SOBRE ESCALERA ENTRADAS A2 y A4	7,60	12,00		91,20	1,00	1,00	91,20
AREA COLUMNA	1,39	0,57		0,79	1,00	-1,00	-0,79
ZONA PASILLO ADMINISTRACIÓN a A2	4,40	4,20		18,48	1,00	1,00	18,48
ZONA PASILLO INTERCONEXIÓN BLOQUES A y B	11,50	8,80		101,20	1,00	1,00	101,20
AREA CUARTO DESCANSO A2	4,40	3,20		14,08	1,00	-1,00	-14,08
ZONA DE REFERENCIACION A ASCENSOR	3,90	6,60		25,74	1,00	1,00	25,74
ZONA LIDER HOSPITALIZACIÓN	5,80	2,70		15,66	1,00	1,00	15,66
ZONA LIDER HOSPITALIZACIÓN	1,26	1,60		2,16	1,00	1,00	2,16
ZONA LIDER HOSPITALIZACIÓN	2,36	1,00		2,36	1,00	1,00	2,32
COORDINACION DE URGENCIAS	3,60	2,80		10,08	1,00	1,00	10,08
CUARTO ASEO	4,55	1,72		7,83	1,00	1,00	7,83
BLOQUE B2 HOSPITALIZACION (MONTAJE)							
HABITACIÓN 201	3,56	3,23		11,50	1,00	1,00	11,50
HABITACIÓN 201	2,82	1,27		3,58	1,00	1,00	3,58
HABITACIÓN 202	3,57	3,17		11,32	1,00	1,00	11,32
HABITACIÓN 202	2,80	1,30		3,64	1,00	1,00	3,64
HABITACIÓN 203	3,54	3,15		11,15	1,00	1,00	11,15
HABITACIÓN 203	2,83	1,30		3,68	1,00	1,00	3,68
HABITACIÓN 204	3,58	3,17		11,29	1,00	1,00	11,29
HABITACIÓN 204	2,81	1,30		3,65	1,00	1,00	3,65
HABITACIÓN 205	3,65	3,27		11,61	1,00	1,00	11,61
HABITACIÓN 205	2,82	1,20		3,87	1,00	1,00	3,87
HABITACIÓN 206	3,56	3,16		11,25	1,00	1,00	11,25
HABITACIÓN 206	2,82	1,30		3,67	1,00	1,00	3,67
HABITACIÓN 207	3,55	3,20		11,39	1,00	1,00	11,39




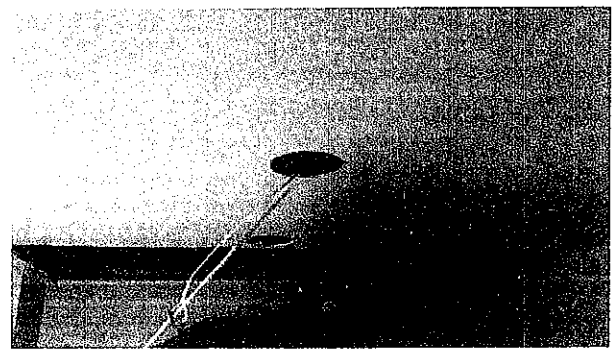

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA ACTA PARCIAL N° 6

CONTRATO DE OBRA 004 de 2023	REFORZAMIENTO DE ESTRUCTURA DE CUBIERTA, CAMBIO DE CUBIERTA, MANTENIMIENTO A LA PINTURA DE FACHADAS Y MEJORAS PARA LA CARPINTERÍA METÁLICA DE LA E.S.E HOSPITAL REGIONAL DE DUITAMA
	CONSORCIO MEJORAMIENTO HOSPITALARIO 2023 R/L. GERARDO IVÁN MÁRQUEZ RINCÓN

ACTA		No. 6		PERIODO DESDE:	18 de febrero de 2024	HASTA:	7 de marzo de 2024
CAPÍTULO		ITEM		UNIDAD		DESCRIPCIÓN	
ITEMS ADICIONALES NO PREVISTOS		NP 18		M2		REINSTALACIÓN DE LAMINA DE CIELO RASO PVC	
HABITACIÓN 207	2,62	1,30		3,67	1,00	1,00	3,67
HABITACIÓN 208	3,56	3,15		11,21	1,00	1,00	11,21
HABITACIÓN 209	2,62	1,30		3,67	1,00	1,00	3,67
HABITACIÓN 209	3,67	3,18		11,35	1,00	1,00	11,35
HABITACIÓN 209	2,80	1,30		3,64	1,00	1,00	3,64
HABITACIÓN 210	3,67	3,23		11,53	1,00	1,00	11,53
HABITACIÓN 210	2,80	1,30		3,64	1,00	1,00	3,64
HABITACIÓN 211	4,18	3,11		13,00	1,00	1,00	13,00
HABITACIÓN 211	1,65	1,40		2,31	1,00	1,00	2,31
HABITACIÓN 212	4,16	3,14		13,06	1,00	1,00	13,06
HABITACIÓN 212	1,66	1,40		2,32	1,00	1,00	2,32
HABITACIÓN 213	4,14	3,15		13,04	1,00	1,00	13,04
HABITACIÓN 213	1,62	1,40		2,27	1,00	1,00	2,27
HABITACIÓN 214	4,14	3,16		13,08	1,00	1,00	13,08
HABITACIÓN 214	1,70	1,40		2,38	1,00	1,00	2,38
HABITACIÓN 215	4,16	3,14		13,03	1,00	1,00	13,03
ZONA TRABAJO LIMPIO	1,96	2,05		4,02	1,00	1,00	4,02
ZONA TRABAJO LIMPIO	3,15	4,14		13,04	1,00	1,00	13,04
ZONA CAMPAL ENFERMERIA	3,15	2,17		6,84	1,00	1,00	6,84
ZONA MESON SANITARIO PEDESTAL	4,16	2,05		8,53	1,00	1,00	8,53
ZONA MESON SANITARIO PEDESTAL	4,15	2,96		12,29	1,00	1,00	12,29
ZONA PASILLO B2	35,10	2,07		72,66	1,00	1,00	72,66
PASILLO INTERCONEXIÓN BLOQUE B a C HOSPITALIZACION (MONTAJE)							
ZONA ESCALERA Y CONEXIÓN DE BLOQUES B a C	7,99	18,10		137,56	1,00	2,00	275,12
ZONA RAMPA (DESMONTE Y MONTAJE	6,84	2,60		17,76	1,00	2,00	35,57
ZONA RAMPA (SOLO MONTAJE)	5,95	2,30		13,69	1,00	1,00	13,69
ZONA RAMPA (SOLO MONTAJE)	5,95	6,84		40,70	1,00	1,00	40,70
ZONA RAMPA (SOLO MONTAJE)	3,36	4,70		15,75	1,00	1,00	15,75
BLOQUE C3 HOSPITALIZACION (MONTAJE)							
PASILLO BLOQUE C3	18,90	5,30		100,50	1,00	1,00	100,50
PASILLO BLOQUE C3 COLUMNAS	0,48	0,36		0,17	1,00	-2,00	-0,35
PASILLO BLOQUE C3 COLUMNAS	0,70	0,50		0,35	1,00	-1,00	-0,35
PASILLO BLOQUE C3 COLUMNAS	0,60	0,50		0,30	1,00	-1,00	-0,30
AREA ASEO	1,70	1,90		3,23	1,00	1,00	3,23
AREA ASEO	1,70	2,43		4,13	1,00	1,00	4,13
HABITACIÓN 301	4,20	3,30		13,86	1,00	1,00	13,86
HABITACIÓN 301	2,15	1,33		2,86	1,00	1,00	2,86
HABITACIÓN 302	4,22	3,20		13,50	1,00	1,00	13,50

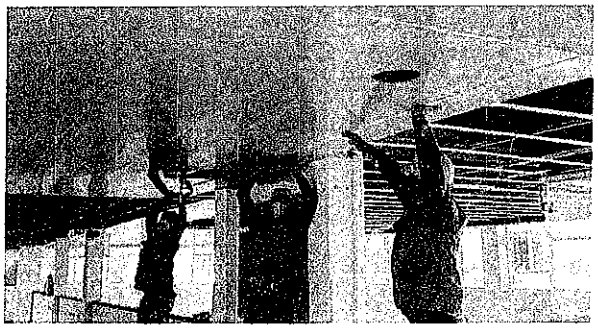




MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA ACTA PARCIAL N° 6

CONTRATO DE OBRA 004 de 2023	REFORZAMIENTO DE ESTRUCTURA DE CUBIERTA, CAMBIO DE CUBIERTA, MANTENIMIENTO A LA PINTURA DE FACHADAS Y MEJORAS PARA LA CARPINTERÍA METÁLICA DE LA E.S.E HOSPITAL REGIONAL DE DUITAMA
	CONSORCIO MEJORAMIENTO HOSPITALARIO 2023 R/L. GERARDO IVÁN MÁRQUEZ RINCÓN

ACTA		No. 6		PERIODO DESDE:	16 de febrero de 2024		HASTA:	7 de marzo de 2024
CAPÍTULO		ITEM		UNIDAD			DESCRIPCIÓN	
ITEMS ADICIONALES NO PREVISTOS		NP 16		M2			REINSTLACIÓN DE LAMINA DE CIELO RASO PVC	
HABITACIÓN 302	2,15	1,33		2,86	1,00	1,00	2,86	
HABITACIÓN 303	4,22	3,16		13,34	1,00	1,00	13,34	
HABITACIÓN 303	2,15	1,33		2,86	1,00	1,00	2,86	
HABITACIÓN 304	4,30	3,16		13,55	1,00	1,00	13,55	
HABITACIÓN 304	2,15	1,33		2,86	1,00	1,00	2,86	
HABITACIÓN 305	4,20	3,20		13,44	1,00	1,00	13,44	
HABITACIÓN 306	2,15	1,33		2,86	1,00	1,00	2,86	
HABITACIÓN 309	4,20	3,20		13,44	1,00	1,00	13,44	
HABITACIÓN 309	2,15	1,33		2,86	1,00	1,00	2,86	
HABITACIÓN 307	4,20	3,20		13,44	1,00	1,00	13,44	
HABITACIÓN 307	2,15	1,33		2,86	1,00	1,00	2,86	
HABITACIÓN 308	4,20	3,20		13,44	1,00	1,00	13,44	
HABITACIÓN 308	2,15	1,33		2,86	1,00	1,00	2,86	
HABITACIÓN 309	4,20	3,23		13,69	1,00	1,00	13,69	
HABITACIÓN 308	2,15	1,33		2,86	1,00	1,00	2,86	
HABITACIÓN 310	4,20	3,20		13,44	1,00	1,00	13,44	
HABITACIÓN 310	2,15	1,33		2,86	1,00	1,00	2,86	
HABITACIÓN 311	4,13	3,35		13,84	1,00	1,00	13,84	
HABITACIÓN 311	2,45	1,48		3,68	1,00	1,00	3,68	
HABITACIÓN 312	4,13	3,20		13,22	1,00	1,00	13,22	
HABITACIÓN 312	1,59	2,45		3,75	1,00	1,00	3,75	
HABITACIÓN 313	4,16	3,20		13,28	1,00	1,00	13,28	
HABITACIÓN 313	1,50	2,45		3,68	1,00	1,00	3,68	
HABITACIÓN 314	4,16	3,15		13,07	1,00	1,00	13,07	
HABITACIÓN 314	1,50	2,45		3,68	1,00	1,00	3,68	
CONSULTORIO	4,15	3,15		13,07	1,00	1,00	13,07	
ESTACIÓN ENFERMERÍA BAÑO	2,10	2,00		4,20	1,00	1,00	4,20	
TRABAJO LIMPIO	3,23	4,15		13,53	1,00	1,00	13,53	
TRABAJO LIMPIO	3,20	3,19		7,01	1,00	1,00	7,01	
TRABAJO SUCIO	3,12	1,60		7,02	1,00	1,00	7,02	
AREA DESCANSO	4,15	3,05		12,66	1,00	1,00	12,66	
PASILLO BLOQUE 03	35,00	2,14		74,90	1,00	1,00	74,90	
ZONA RAYOS X y LABORATORIO (MONTAJE)								
PASILLO LABORATORIO - RX	22,40	1,95		43,68	1,00	1,00	43,68	
PASILLO ENTRADA A LABORATORIO	4,90	1,95		9,56	1,00	1,00	9,56	
PASILLO ENTRADA A LABORATORIO	4,45	2,15		9,57	1,00	1,00	9,57	
CUARTO ASEO	2,60	2,00		5,20	1,00	1,00	5,20	
CUARTO CONTIGUO	2,50	2,00		5,00	1,00	1,00	5,00	
CUARTO CONTIGUO	2,63	2,50		6,25	1,00	1,00	5,26	

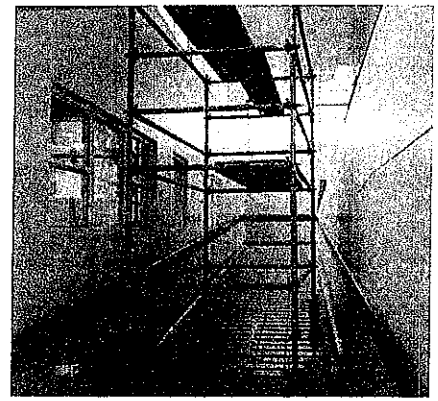



MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA ACTA PARCIAL N° 6

CONTRATO DE OBRA 004 de 2023	REFORZAMIENTO DE ESTRUCTURA DE CUBIERTA, CAMBIO DE CUBIERTA, MANTENIMIENTO A LA PINTURA DE FACHADAS Y MEJORAS PARA LA CARPINTERÍA METÁLICA DE LA E.S.E HOSPITAL REGIONAL DE DUITAMA
CONSORCIO MEJORAMIENTO HOSPITALARIO 2023 R/L. GERARDO IVÁN MÁRQUEZ RINCÓN	

ACTA		No. 6		PERIODO DESDE:			16 de febrero de 2024	HASTA:	7 de marzo de 2024
CAPÍTULO		ÍTEM		UNIDAD			DESCRIPCIÓN		
ITEMS ADICIONALES NO PREVISTOS		NP 16		M2			REINSTALACIÓN DE LAMINA DE CIELO RASO PVC		
CUARTO CONTIGUO	1.10	2.10		2.31	1.00	1.00	2.31		
PASILLO INTERCONEXIÓN AREAS	5.30	3.20		16.96	1.00	1.00	16.96		
AREA CONTIGUA	2.12	1.20		2.54	1.00	1.00	2.54		
CICLISULTORIO 8	3.10	5.20		16.12	1.00	1.00	16.12		
CUARTO LECTURA RX	4.20	3.50		14.70	1.00	1.00	14.70		
CUARTO ELECTRICO RX	2.50	2.30		5.75	1.00	1.00	5.75		
HALL DE ACCESO (MONTAJE)									
HALL DE ACCESO (LIONTAJE)	19.50	10.00		195.00	1.00	1.00	195.00		
HALL DE ACCESO (AREA ZONA DRYWALL MONTAJE)	4.50	6.90		27.14	1.00	-1.00	-27.14		
CANTIDAD TOTAL ACTA NO. 1							-		
CANTIDAD TOTAL ACTA NO. 2							-		
CANTIDAD TOTAL ACTA NO. 3							-		
CANTIDAD TOTAL ACTA NO. 4							-		
CANTIDAD TOTAL ACTA NO. 5							-		
CANTIDAD TOTAL ACTA NO. 6							2,458.35		



Elaboró:

RESIDENTE - CONTRATISTA DE OBRA
Ing. Victor Hernando Duarte

RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
Ing. Diana Carolina Dallos

Vo.Bo.:

R/L CONTRATISTA DE OBRA
Ing. Gerardo Iván Márquez

R/L CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA
Arq. Sebastian Alonso Consuegra Castillo


MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA ACTA PARCIAL N° 6


CONTRATO DE OBRA 004 de 2023	REFORZAMIENTO DE ESTRUCTURA DE CUBIERTA, CAMBIO DE CUBIERTA, MANTENIMIENTO A LA PINTURA DE FACHADAS Y MEJORAS PARA LA CARPINTERÍA METÁLICA DE LA E.S.E HOSPITAL REGIONAL DE DUITAMA
CONSORCIO MEJORAMIENTO HOSPITALARIO 2023 R/L, GERARDO IVÁN MÁRQUEZ RINCÓN	


ACTA	No. 6	PERIODO DESDE:	16 de febrero de 2024	HASTA:	7 de marzo de 2024
CAPÍTULO	TEJA	UNIDAD	DESCRIPCIÓN		
ITEMS ADICIONALES NO PREVISTOS	NP 19	M2	SUMINISTRO E INSTALACION DE CIELO RASO EN LAMINA DE PVC (INCLUYE ESTRUCTURA)		

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			TOTAL Kg	CANTIDAD UNITARIA	CANTIDAD ELEMENTO	TOTAL
	LONGITUD (m)	ANCHO (m)	AREA m2				
ZONA MANTENIMIENTO, TALLERES, MEDICINA LEGAL							
Medicina legal 1	3,39	5,34	18,05		1,00	1,00	18,05
Medicina legal 2	1,35	5,73	7,74		1,00	1,00	7,74
Medicina legal 3	3,99	4,24	16,60		1,00	1,00	16,60
Medicina legal 4	3,76	3,45	12,97		1,00	1,00	12,97
Medicina legal 5	1,21	1,79	2,17		1,00	1,00	2,17
Medicina legal 6	1,71	1,21	2,07		1,00	1,00	2,07
Medicina legal 7	2,80	3,83	9,88		1,00	1,00	9,91
Medicina legal 9	2,92	3,67	10,91		1,00	1,00	10,91
Base Ambulancias	2,08	1,44	2,92		1,00	1,00	2,92
Base Ambulancias	1,50	0,93	1,40		1,00	1,00	1,40
Base Ambulancias	1,50	0,93	1,40		1,00	1,00	1,40
Base Ambulancias	4,28	2,06	8,77		1,00	1,00	8,77
Base Ambulancias	1,85	3,61	6,68		1,00	1,00	6,68
Base Ambulancias	1,67	1,87	2,98		1,00	1,00	2,99
Base Ambulancias	3,69	4,00	14,52		1,00	1,00	14,52
Base Ambulancias	2,56	3,10	6,39		1,00	1,00	6,39
ZONA MANTENIMIENTO, TALLERES, MEDICINA LEGAL							
BODEGA ALMACEN (REEMPLAZO CIELO RASO EN FIBRA)	10,70	6,30	66,71		1,00	1,00	69,71
ZONA PRENATAL SECTOR URGENCIAS							
ZONA PRENATAL SECTOR URGENCIAS (ADECUACION)	9,30	3,24	30,46		1,00	1,00	30,46
ZONA PRENATAL SECTOR URGENCIAS (ADECUACION)	2,00	0,70	1,40		1,00	1,00	1,40
ZONA PRENATAL SECTOR URGENCIAS (ADECUACION)	1,00	1,45	1,45		1,00	1,00	1,45
ZONA PRENATAL SECTOR URGENCIAS (ADECUACION)	1,17	1,70	1,99		1,00	-1,00	(1,99)
HALL ACCESO							
AREA DE PUESTOS DE TRABAJO CON DRYWALL	4,60	5,90	27,14		1,00	1,00	27,14
RAYOS X							
CABINA DE MANDO TOMÓGRAFO TOSHIBA	2,80	1,80	5,04		1,00	1,00	5,04
ZONA RX NUEVO	4,30	4,90	21,07		1,00	1,00	21,07
ZONA RX NUEVO	1,20	1,45	1,74		1,00	1,00	1,74
ZONA RX NUEVO ZONA BAÑO	2,60	1,20	3,48		1,00	1,00	3,48
ZONA RX NUEVO ENTRADA	1,30	1,40	1,82		1,00	1,00	1,82


ESQUEMA

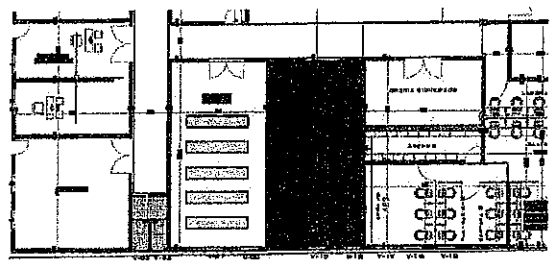

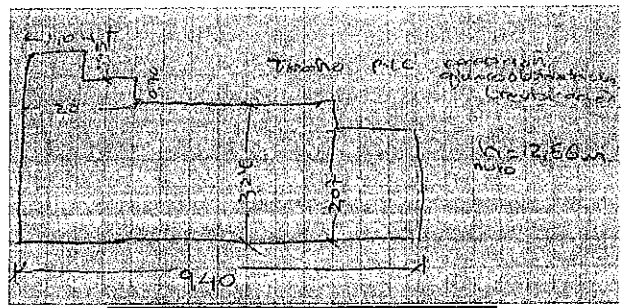



CANTIDAD TOTAL ACTA NO. 1				-
CANTIDAD TOTAL ACTA NO. 2				-
CANTIDAD TOTAL ACTA NO. 3				-
CANTIDAD TOTAL ACTA NO. 4				-
CANTIDAD TOTAL ACTA NO. 5				-
CANTIDAD TOTAL ACTA NO. 6				272.85

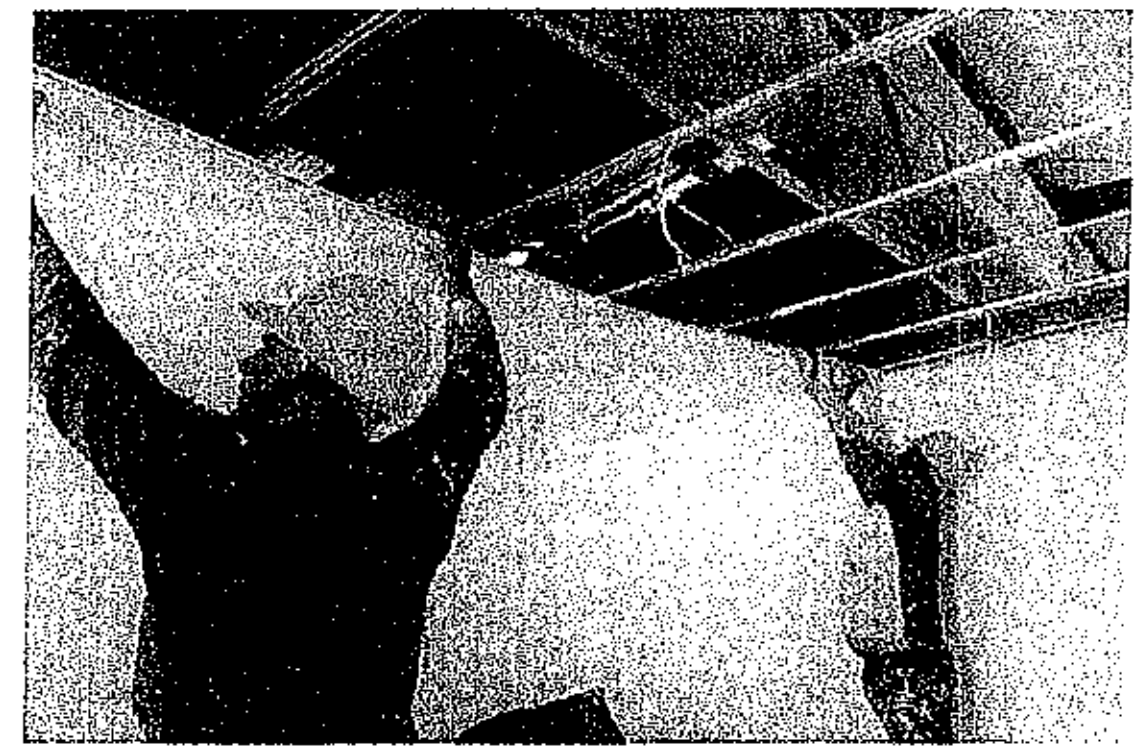



Elaboró:

RESIDENTE - CONTRATISTA DE OBRA
Ing. Víctor Bernardo Prieto

RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
Ing. Diana Carolina Dallos

Vo.Bo.:

RL: CONTRATISTA DE OBRA
Ing. Gerardo Iván Márquez

RL: CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA
Arq. Sebastián Alonso Cazarga Castillo

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA ACTA PARCIAL N° 6

CONTRATO DE OBRA 006 de 2023	REFORZAMIENTO DE ESTRUCTURA DE CUBIERTA, CAMBIO DE CUBIERTA, MANTENIMIENTO A LA PINTURA DE FACHADAS Y MEJORAS PARA LA CARPINTERÍA METÁLICA DE LA E.S.E HOSPITAL REGIONAL DE DUITAMA


CONSORCIO MEJORAMIENTO HOSPITALARIO 2023 R/L. GERARDO IVÁN MÁRQUEZ RINCÓN


INFORME DE CANTIDADES REALES EJECUTADAS

Acta	No. 6	PERIODO DESDE:	19 de febrero de 2024	HASTA:	7 de marzo de 2024
CAPÍTULO	**ÍTEM**	**UNIDAD**	**DESCRIPCIÓN**		
ITEMS ADICIONALES NO PREVISTOS	N° 21	UND	REUBICACIÓN PUNTO REVENTILACIÓN EXISTENTE 3" (INCLUYE SALIDA POR ENCIMA DE CUBIERTA)		

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES CANTIDAD			UND		CANTIDAD ELEMENTO	TOTAL
EDIFICIO ADMINISTRACIÓN							
PUNTO REVENTILACIÓN 3" A FACHADAS	1,00			1,00		8,00	8,00
ZONA ADMINISTRACIÓN							
BLOQUE A PUNTO REVENTILACIÓN 3" A CUBIERTA	1,00			1,00		14,00	14,00
BLOQUE B PUNTO REVENTILACIÓN 3" A CUBIERTA	1,00			1,00		24,00	24,00
BLOQUE C PUNTO REVENTILACIÓN 3" A CUBIERTA	1,00			1,00		15,00	15,00
CANTIDAD TOTAL ACTA No. 1							0,00
CANTIDAD TOTAL ACTA No. 2							0,00
CANTIDAD TOTAL ACTA No. 3							0,00
CANTIDAD TOTAL ACTA No. 4							0,00
CANTIDAD TOTAL ACTA No. 5							0,00
CANTIDAD TOTAL ACTA No. 6							61,00

ESQUEMA

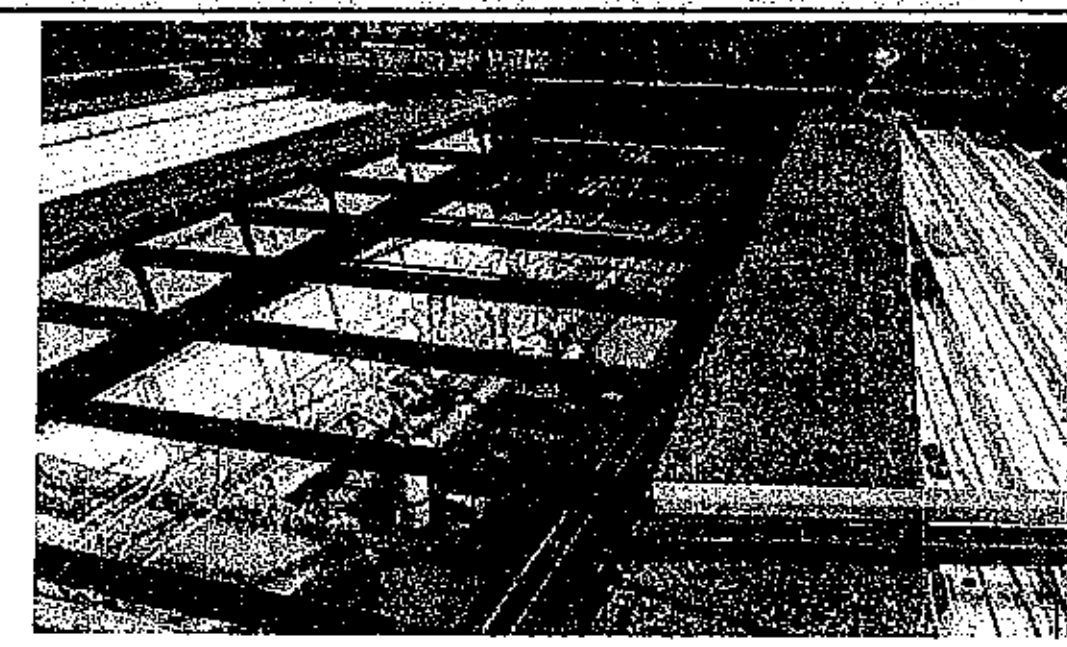

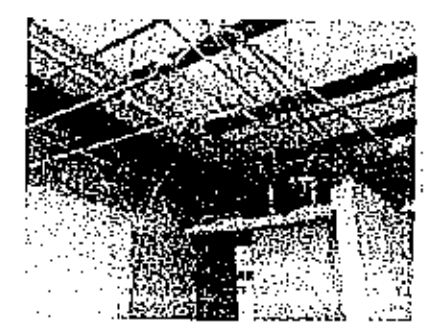



Observaciones:

Elaboró:

RESIDENTE - CONTRATISTA DE OBRA
Ing. Víctor Hernando Puentes

RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
Ing. Diana Carolina Dallos

Vo.Bo.:

RL: CONTRATISTA DE OBRA
Ing. Gerardo Iván Márquez

RL: CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA
Ing. Luis Mercedes Sanchez

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA


CONTRATO DE OBRA 004 de 2023	REFORZAMIENTO DE ESTRUCTURA DE CUBIERTA, CAMBIO DE CUBIERTA, MANTENIMIENTO A LA PINTURA DE FACHADAS Y MEJORAS PARA LA CARPINTERÍA METÁLICA DE LA E.S.E HOSPITAL REGIONAL DE DUITAMA
CONSORCIO MEJORAMIENTO HOSPITALARIO 2023 RA. GERARDO IVÁN MÁRQUEZ RINCÓN	

INFORME DE CANTIDADES REALES EJECUTADAS

Acta	No. 6	PERIODO DESDE:	18 de febrero de 2024	HASTA:	7 de marzo de 2024
CAPITULO	ITEM	UNIDAD	DESCRIPCIÓN		
VENTANERÍA	Nº 24	M2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN VENTANA EN ALUMINIO, INCLUYE VIDRIO LAMINADO 3+3		


LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			AREA	CANTIDAD UNITARIA	CANTIDAD ELEMENTO	TOTAL
	LONGITUD	ANCHO	ALTURA				
ZONA MANTENIMIENTO, TALLERES, MEDICINA LEGAL							
V150	9.3		2.7	25,11		1,00	25,11
V UCI NEONATAL 1	1.48		0.48	0,69		1,00	0,69
V UCI NEONATAL 2	1.42		0.46	0,65		1,00	0,65
V UCI NEONATAL 3	6.08		2.04	12,40		1,00	12,40
V UCI NEONATAL 4	3.45		0.47	1,62		1,00	1,62
V UCI NEONATAL 5	2.4		0.47	1,13		1,00	1,13
V167 (VCE1)	3		2.04	6,12		1,00	6,12
V167 (VCE2)	3		2.03	6,09		1,00	6,09
V167 (VCE3)	3.07		2.03	6,23		1,00	6,23
V167 (VCE4)	3.07		2.03	6,23		1,00	6,23
V167 (VCE5)	3.01		2.03	6,11		1,00	6,11
V167 (VCE6)	3.06		2.03	6,21		1,00	6,21
V167 (VCE7)	3.01		2.03	6,11		1,00	6,11
V 169	0.6		1.3	12,49		1,00	12,49
V 167	4.82		1.3	6,26		1,00	6,26
V 170	2.93		1.3	3,81		1,00	3,81
V 171	5.76		1.3	7,49		1,00	7,49
V 172	5.99		1.3	7,77		1,00	7,77
V 173	5.9		1.3	7,67		1,00	7,67

ESQUEMA
























CANTIDAD TOTAL ACTA No. 1				0,00
CANTIDAD TOTAL ACTA No. 2				0,00
CANTIDAD TOTAL ACTA No. 3				0,00
CANTIDAD TOTAL ACTA No. 4				0,00
CANTIDAD TOTAL ACTA No. 5				0,00
CANTIDAD TOTAL ACTA No. 6				130,16

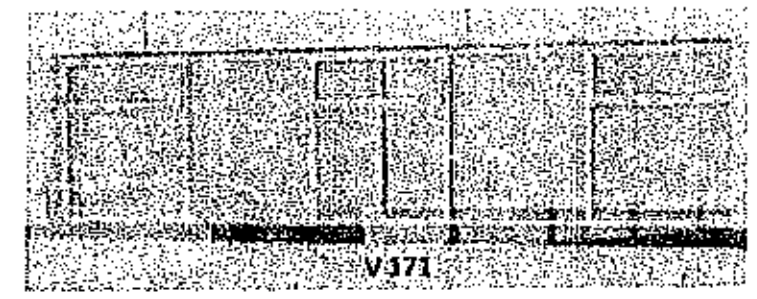

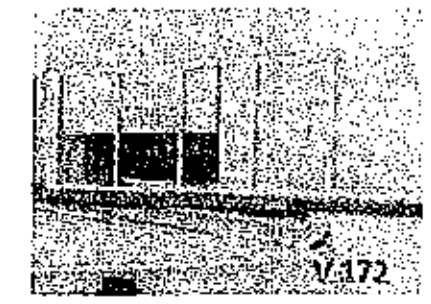



Observaciones:

Elaboró:

RESIDENTE - CONTRATISTA DE OBRA
Ing. Victor Hernando Puerta

RESIDENTE DE INTERVENTORIA
Ing. Diana Carolina Dellos

Vo.Bo.:

RL: CONTRATISTA DE OBRA
Ing. Gerardo Iván Márquez

RL: CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA
Ing. Lina Mercedes Sanchez

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA ACTA PARCIAL N° 6

CONTRATO DE OBRA 004 de 2023	REFORZAMIENTO DE ESTRUCTURA DE CUBIERTA, CAMBIO DE CUBIERTA, MANTENIMIENTO A LA PINTURA DE FACHADAS Y MEJORAS PARA LA CARPINTERÍA METÁLICA DE LA E.S.E HOSPITAL REGIONAL DE DUITAMA
CONSORCIO MEJORAMIENTO HOSPITALARIO 2023 R/L. GERARDO IVÁN MÁRQUEZ RINCÓN	

INFORME DE CANTIDADES REALES EJECUTADAS

Acta	No. 6	PERIODO DESDE:	18 de febrero de 2024	HASTA:	7 de marzo de 2024
CAPITULO	ITEM	UNIDAD	DESCRIPCIÓN		
ITEMS ADICIONALES NO PREVISTOS	NP 28	UND	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA DE ACCESO EN VIDRIO TEMPLADO 10mm PARA AUDITORIO (3,00*2,60)m. INCLUYE HERRAJES, CERRADURA Y ACCESORIOS. SEGÚN DISEÑO		

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES: CANTIDAD			UND		CANTIDAD ELEMENTO	TOTAL	ESQUEMA
ACCESO AUDITRIO								
PUERTA VIDRIO TEMPLADO DE 3.00 X2,60 m	1			1,00			1,00	
CANTIDAD TOTAL ACTA No. 1							0,00	Observaciones:
CANTIDAD TOTAL ACTA No. 2							0,00	
CANTIDAD TOTAL ACTA No. 3							0,00	
CANTIDAD TOTAL ACTA No. 4							0,00	
CANTIDAD TOTAL ACTA No. 5							0,00	
CANTIDAD TOTAL ACTA No. 6							1,00	



Elaboró:

RESIDENTE - CONTRATISTA DE OBRA
Ing. Víctor Hernando Forero

RESIDENTE INTERVENTORÍA
Ing. Diana Carolina Bellos

Vo.Bo.:

R/L CONTRATISTA DE OBRA
Ing. Gerardo Iván Márquez

R/L CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA
Ing. Lina Mercedes Sánchez

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA ACTA PARCIAL N° 6


CONTRATO DE OBRA 004 de 2023	REFORZAMIENTO DE ESTRUCTURA DE CUBIERTA, CAMBIO DE CUBIERTA, MANTENIMIENTO A LA PINTURA DE FACHADAS Y MEJORAS PARA LA CARPINTERÍA METÁLICA DE LA E.S.E HOSPITAL REGIONAL DE DUITAMA
	CONSORCIO MEJORAMIENTO HOSPITALARIO 2023 R/L. GERARDO IVÁN MÁRQUEZ RINCÓN

INFORME DE CANTIDADES REALES EJECUTADAS

Acta	No. 6	PERIODO DESDE:	10 de febrero de 2024	HASTA:	7 de marzo de 2024
CAPÍTULO	ITEM	UNIDAD	DESCRIPCIÓN		
ITEMS ADICIONALES NO PREVISTOS	NP 29	UND	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA DE ACCESO EN VIDRIO TEMPLADO 10mm PARA ACCESO PRINCIPAL (0,96*3,03)m. INCLUYE HERRAJES, CERRADURA Y ACCESORIOS. SEGÚN DISEÑO		

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			UND		CANTIDAD ELEMENTO	TOTAL
	CANTIDAD						
ACCESO PRINCIPAL							
PUERTA VIDRIO TEMPLADO DE 0,96 x 3,03	1			1,00			1,00
CANTIDAD TOTAL ACTA No. 1							0,00
CANTIDAD TOTAL ACTA No. 2							0,00
CANTIDAD TOTAL ACTA No. 3							0,00
CANTIDAD TOTAL ACTA No. 4							0,00
CANTIDAD TOTAL ACTA No. 5							0,00
CANTIDAD TOTAL ACTA No. 6							1,00

ESQUEMA

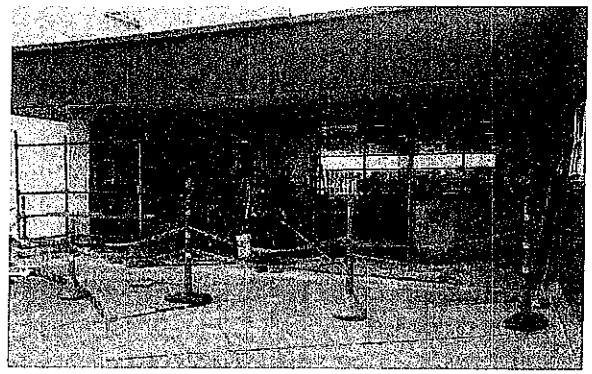

Observaciones:

Elaboró:

RESIDENTE - CONTRATISTA DE OBRA
Ing. Víctor Hernando Pineda

RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
Ing. Diana Carolina Bello

Vo.Bo.:

R/L CONTRATISTA DE OBRA
Ing. Gerardo Iván Márquez

R/L CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA
Ing. Lina Mercedes Sánchez

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA ACTA PARCIAL N° 6


CONTRATO DE OBRA 004 de 2023	REFORZAMIENTO DE ESTRUCTURA DE CUBIERTA, CAMBIO DE CUBIERTA, MANTENIMIENTO A LA PINTURA DE FACHADAS Y MEJORAS PARA LA CARPINTERÍA METÁLICA DE LA E.S.E HOSPITAL REGIONAL DE DUITAMA
	CONSORCIO MEJORAMIENTO HOSPITALARIO 2023 R/L. GERARDO IVÁN MÁRQUEZ RINCÓN

ACTA	No. 6	PERIODO DESDE:	18 de febrero de 2024	HASTA:	7 de marzo de 2024
CAPÍTULO	ÍTEM	UNIDAD	DESCRIPCIÓN		
ITEMS ADICIONALES NO PREVISTOS	NP 32	M2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CUBIERTA LAMINA POLICARBONATO Cal. 6 mm		

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			TOTAL Kg	CANTIDAD UNITARIA	CANTIDAD ELEMENTO	TOTAL
	LONGITUD (m)	ANCHO (m)	AREA m2				
BLOQUE G HOSPITALIZACIÓN							
COSTADO DERECHO	33,80	2,00	67,60		1,00	1,00	67,60
COSTADO POR FACHADA POSTERIOR	4,90	2,00	9,80		1,00	1,00	9,80
COSTADO IZQUIERDO	31,60	2,00	63,80		1,00	1,00	63,80
CANTIDAD TOTAL ACTA NO. 1							-
CANTIDAD TOTAL ACTA NO. 2							-
CANTIDAD TOTAL ACTA NO. 3							-
CANTIDAD TOTAL ACTA NO. 4							-
CANTIDAD TOTAL ACTA NO. 5							-
CANTIDAD TOTAL ACTA NO. 6							141,20

ESQUEMA







Elaboró:

RESIDENTE - CONTRATISTA DE OBRA
Ing. Victor Hernando Parada

RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
Ing. Diana Carolina Dallos

Vo.Bo:

R/L CONTRATISTA DE OBRA
Ing. Gerardo Iván Márquez

R/L CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA
Arq. Sebastián Alonso Cuenca Castillo


MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA ACTA PARCIAL N° 6


CONTRATO DE OBRA 004 de 2023	REFORZAMIENTO DE ESTRUCTURA DE CUBIERTA, CAMBIO DE CUBIERTA, MANTENIMIENTO A LA PINTURA DE FACHADAS Y MEJORAS PARA LA CARPINTERÍA METÁLICA DE LA E.S.E HOSPITAL REGIONAL DE DUITAMA
	CONSORCIO MEJORAMIENTO HOSPITALARIO 2023 R/L. GERARDO IVÁN MÁRQUEZ RINCÓN

ACTA	No. 6	PERÍODO DESDE:	16 de febrero de 2024	HASTA:	7 de marzo de 2024
CAPÍTULO	ÍTEM	UNIDAD	DESCRIPCIÓN		
ITEMS ADICIONALES NO PREVISTOS	NP 33	M2	DESMONTE CUBIERTA LAMINA POLICARBONATO EXISTENTE		

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			TOTAL Kg	CANTIDAD UNITARIA	CANTIDAD ELEMENTO	TOTAL
	LONGITUD (m)	ANCHO (m)	AREA m2				
BLOQUE D HOSPITALIZACIÓN							
COSTADO DESPECHO	39,00	2,00	87,60		1,00	1,00	97,50
COSTADO POR FACHADA POSTERIOR	4,50	2,00	9,00		1,00	1,00	9,00
COSTADO IZQUIERDO	31,50	2,00	63,00		1,00	1,00	63,00
CANTIDAD TOTAL ACTA NO. 1							-
CANTIDAD TOTAL ACTA NO. 2							-
CANTIDAD TOTAL ACTA NO. 3							-
CANTIDAD TOTAL ACTA NO. 4							-
CANTIDAD TOTAL ACTA NO. 5							-
CANTIDAD TOTAL ACTA NO. 6							141,20

ESQUEMA

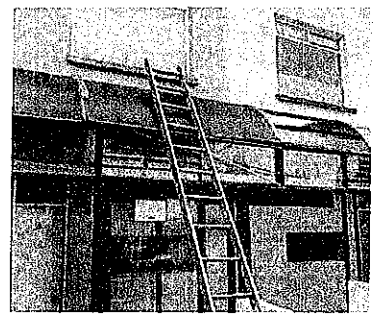

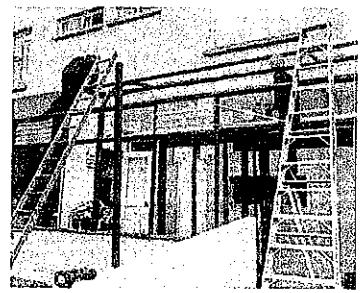

Elaboró:

RESIDENTE – CONTRATISTA DE OBRA
Ing. Víctor Hernando Parada

RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
Ing. Diana Carolina Daños

Vo.Bo.:

R/L CONTRATISTA DE OBRA
Ing. Gerardo Iván Márquez

R/L CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA
Arq. Sebastián Alonso Camargo Castillo

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA ACTA PARCIAL N° 8


CONTRATO DE OBRA 004 de 2023	REFORZAMIENTO DE ESTRUCTURA DE CUBIERTA, CAMBIO DE CUBIERTA, MANTENIMIENTO A LA PINTURA DE FACHADAS Y MEJORAS PARA LA CARPINTERÍA METÁLICA DE LA E.S.E HOSPITAL REGIONAL DE DUITAMA
CONSORCIO MEJORAMIENTO HOSPITALARIO 2023 R/L. GERARDO IVÁN MÁRQUEZ RINCÓN	

ACTA	No. 8	PERIODO DESDE:	16 de febrero de 2024	HASTA:	7 de marzo de 2024
CAPÍTULO	ITEM	UNIDAD	DESCRIPCIÓN		
ITEMS ADICIONALES NO PREVISTOS	NP 35	M2	PROTECCIONES PROVISIONALES EN MADERA PARA PARA EQUIPOS		

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			TOTAL Kg	CANTIDAD UNITARIA	CANTIDAD ELEMENTO	TOTAL
	LONGITUD (m)	ANCHO (m)	ÁREA m2				
IMAGENES DIAGNOSTICAS							
RX FIJO	4,40	2,44	10,74		1,00	0,00	-
CUARTO MANDO RX FIJO	3,00	2,16	6,48		1,00	1,00	6,48
TOMOGRAFO TOSHIBA	6,10	4,20	25,62		1,00	1,00	25,62
TOMOGRAFO TOSHIBA COMANDO	2,84	1,84	5,23		1,00	1,00	5,23
TOMOGRAFO PHILPS	9,10	5,00	39,50		1,00	1,00	39,50
ENTRADA TOMOGRAFO TOSHIBA	2,00	1,22	2,44		1,00	1,00	2,44
IMAGENES DIAGNOSTICAS							
CUARTO COMANDO TOMOGRAFO PHILPS	3,05	1,70	5,19		1,00	1,00	5,19
CUARTO FRIO	2,50	2,10	5,25		1,00	1,00	5,25
ENTRADA TOMOGRAFO PHILPS PASILLO	4,30	1,80	7,74		1,00	0,00	-
PASILLO ZONA ESPERA TOMOGRAFO PHILPS PASILLO	3,20	2,42	7,74		1,00	1,00	7,74
PASILLO PREVIO A ZONA ESPERA TOMOGRAFO PHILPS PASILLO	3,00	1,35	4,05		1,00	1,00	4,05
PASILLO Y SALA ESPERA RX	9,10	1,85	16,84		1,00	1,00	16,84
ENTRADA ECOGRAFIAS	3,20	2,70	8,64		1,00	1,00	8,64
PASILLO DE RX A ENTRADA SALAS CIRUGIA	6,50	1,90	10,45		1,00	1,00	10,45
PASILLO DE ENTREGA DE RAMPA A ENTRADA SALAS CIRUGIA	15,50	1,95	30,23		1,00	1,00	30,23
UNIDAD ODONTOLOGIA	3,00	1,50	4,50		1,00	2,00	9,00
UNIDAD ODONTOLOGIA	3,00	1,00	3,00		1,00	1,00	3,00

ESQUEMA



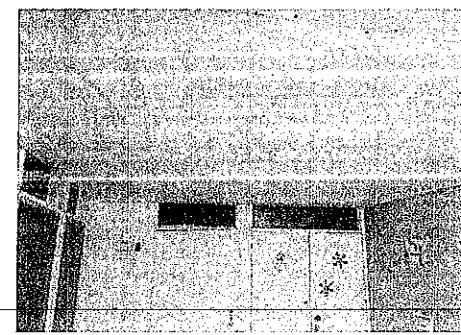

CANTIDAD TOTAL ACTA NO. 1				-
CANTIDAD TOTAL ACTA NO. 2				-
CANTIDAD TOTAL ACTA NO. 3				-
CANTIDAD TOTAL ACTA NO. 4				-
CANTIDAD TOTAL ACTA NO. 5				-
CANTIDAD TOTAL ACTA NO. 6				170,64



Elaboró:

RESIDENTE - CONTRATISTA DE OBRA
Ing. Victor Hernando Prieto

RESIDENTE DE INTERVENTORIA
Ing. Diana Carolina Dallos

Vo.Bo.:

RL: CONTRATISTA DE OBRA
Ing. Gerardo Iriarte Márquez

RL: CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA
Arq. Sebastian Alonso Camargo Cardillo

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA ACTA PARCIAL N° 6

CONTRATO DE OBRA 094 de 2023	REFORZAMIENTO DE ESTRUCTURA DE CUBIERTA, CAMBIO DE CUBIERTA, MANTENIMIENTO A LA PINTURA DE FACHADAS Y MEJORAS PARA LA CARPINTERÍA METÁLICA DE LA E.S.E HOSPITAL REGIONAL DE DUITAMA

CONSORCIO MEJORAMIENTO HOSPITALARIO 2023 R/L. GERARDO IVÁN MÁRQUEZ RINCÓN

INFORME DE CANTIDADES REALES EJECUTADAS

Acta	No. 6	PERIODO DESDE:	19 de febrero de 2024	HASTA:	7 de marzo de 2024
CAPÍTULO	ÍTEM	UNIDAD	DESCRIPCIÓN		
ÍTEMS ADICIONALES NO PREVISTOS	NP 38	UND	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA DE ACCESO EN VIDRIO TEMPLADO 10mm PARA CONSULTA EXTERNA (4,24*2,70)m. INCLUYE HERRAJES, CERRADURA Y ACCESORIOS, SEGÚN DISEÑO		

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			UND		CANTIDAD ELEMENTO	TOTAL
	CANTIDAD						
ACCESO AUDITRIO:							
PUERTA VIDRIO TEMPLADO DE 3,00 X 2,98 m	1			1,00			1,00
CANTIDAD TOTAL ACTA No. 1							0,00
CANTIDAD TOTAL ACTA No. 2							0,00
CANTIDAD TOTAL ACTA No. 3							0,00
CANTIDAD TOTAL ACTA No. 4							0,00
CANTIDAD TOTAL ACTA No. 5							0,00
CANTIDAD TOTAL ACTA No. 6							1,00

ESQUEMA



Observaciones:

Elaboró:

RESIDENTE - CONTRATISTA DE OBRA
Ing. Victor Hernando Puerto

RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
Ing. Diana Carolina Dallos

Vo.Bo.:

RL: CONTRATISTA DE OBRA
Ing. Gerardo Iván Márquez

RL: CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA
Ing. Lina Mercedes Sanchez
