ACTA No. 4182.010.26.1.11	**FECHA:**	15/Nov/2024
	HORA INICIAL:	6:18
OBJETIVO: Comité N°9 para el seguimiento a la interventoría del contrato N° 4182.010.26.1.566-2024, correspondiente a "REALIZAR INTERVENTORÍA A LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO EN LA PTAP VEREDA LA REFORMA CORREGIMIENTO LOS ANDES, PTAP LA PAZ CABECERA Y EN EL SISTEMA DE ACUEDUCTO DE LA VORÁGINE - CORREGIMIENTO DE PANCE"	**HORA FINAL:**	6:36
	LUGAR: UAESP Taller 2 Calle 7# 4-105a	

ASISTENTES:

Juan Carlos Jurado R. – UAESP
Angie Natalia Murillo – UAESP - Apoyo a supervisión
Andrea Debías – UAESP – Apoyo administrativo
Camilo Murcia – UAESP – Director

AUSENTES: N/A

INVITADO:

Fernando Obregon – Interventor
Jairo Benavides – Residente Interventoría
Diego Sánchez – Residente Constructor
Jainne Marcela Córdoba – UAESP – Contratista.
Consuelo Giraldo – UAESP – Contratista
Luis Fernando García – UAESP – Contratista.

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su copia, alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.

ORDEN DEL DÍA:

El ingeniero Juan Carlos Jurado contratista de la UAESP hace apertura de la reunión, presentando a los contratistas de la UAESP presentes, que darán apoyo al seguimiento a la interventoría, apoyo administrativo y técnico a las necesidades del contrato. Igualmente se presentan los residentes del contratista proponente de la obra y de la interventoría.

El orden del día de la reunión fue el siguiente:

1. Presentación de requerimientos por parte del líder.
2. Revisar compromisos del comité N°8 por parte de interventoría y constructor del contrato "Realizar Obras De Mejoramiento En La Ptap Vereda La Reforma Corregimiento Los Andes, Ptap La Paz Cabecera Y En El Sistema De Acueducto De La Vorágine – Corregimiento De Pance"
3. Identificación de compromisos para los participantes
4. Cierre de la reunión

DESARROLLO:


Se inicia la reunión, con la presentación de las empresas contratistas a cargo de la interventoría y de la ejecución de la obra.

El Ing. Jurado le recuerda al director camilo que es un contrato que tiene tres (3) frentes, el cual se inicio en primera instancia con el sistema de acueducto vorágine, continuando con la PTAP la reforma y finalmente con la PTAP la paz.

El Ing. Jurado pregunta cuál es el avance del contrato en los tres (3) frentes vs el programado y cuáles fueron los compromisos pendientes del comité anterior.


El Ing. Obregón informa que el avance de la obra ejecutada alcanza el 54,33%. En el frente de vorágine, ya se ha instalado toda la tubería y actualmente se están realizando las pruebas hidráulicas necesarias para instalar las válvulas y completar las conexiones de manera adecuada.

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su copia, alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.

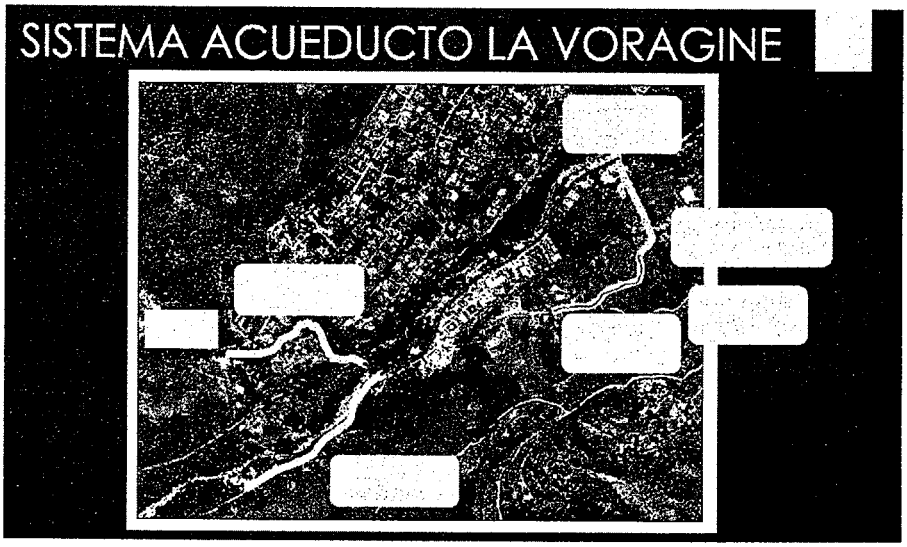

Fotografia 1. Distribucion de los 3 tramos del sistema de acueducto voragine.

El avance del frente es del 61,48%. En el tramo 1 se han instalado 488 metros lineales (ml), donde actualmente se está colocando la válvula ventosa. En el tramo 2, correspondiente a una tubería de 2", se han instalado 520 ml. Por otro lado, el tramo 3 está en proceso de finalización. Según el balance de obra, aún faltan por instalar 358 ml.

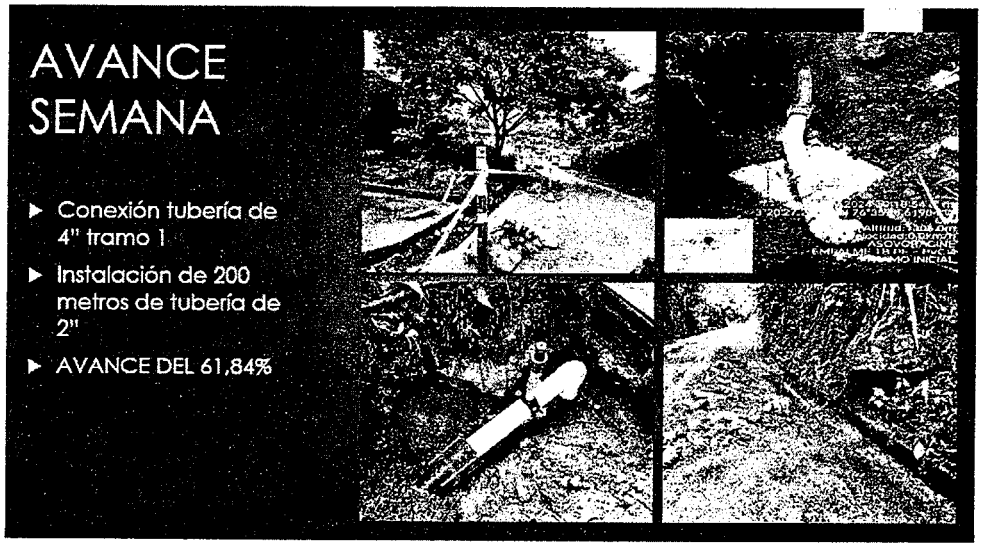


Fotografía 2. Avance sistema de acueducto

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su copia, alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.

El Ing. Diego informa que ya se ha completado toda la instalación. Solo resta realizar el empalme a la red existente y llevar a cabo la fundición de las cunetas en las zonas comerciales.

Por su parte, como apoyo social de la unidad, Rosario sugiere que, al iniciar la intervención en la zona comercial, se tomen evidencias de las condiciones previas a la intervención, con el fin de evitar posibles inconvenientes en el futuro.

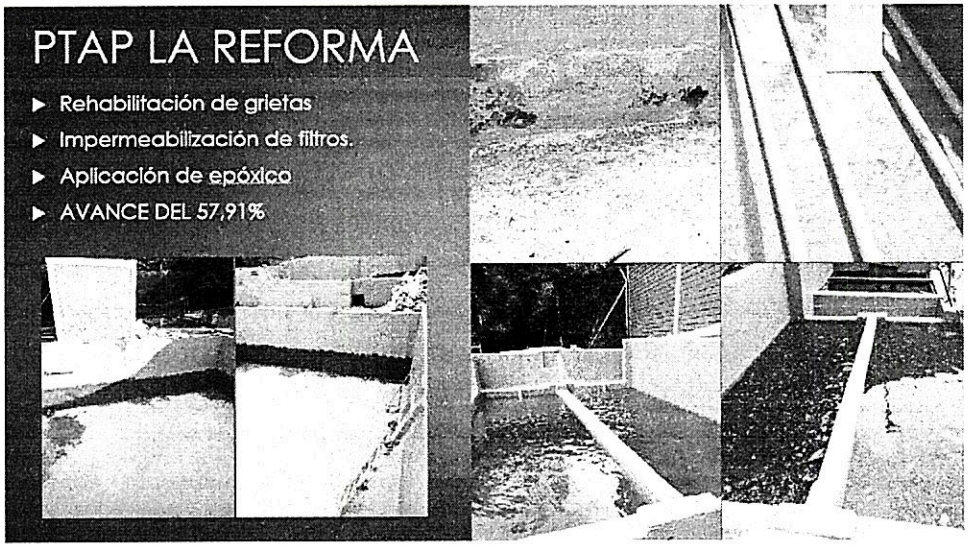

Fotografía 3. Avance PTAP La Reforma

En la reforma, el avance es del 57,91%. Sin embargo, se presentó una complicación durante la prueba de estanqueidad, ya que el nivel del agua descendió 3 cm. Al vaciar el tanque, se evidenció una filtración en dos de sus caras, lo cual es preocupante dado que se trata de concreto.


El Ing. Diego aclara que, al realizar la revisión, al golpear el concreto este sonaba hueco. En algunas áreas, al retirar parte del concreto, se observó la salida de agua.

El Ing. Jurado solicita realizar la revisión correspondiente y ejecutar los trabajos necesarios para asegurar que el tanque quede en buen estado. Además, recomienda esperar a que se seque la humedad antes de que él y la Ing. Angie realicen una

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su copia, alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.

inspección técnica. No obstante, destaca que es importante que usted, como contratista, Ing. Obregón, contemple y deje previsto esta solución para el tanque.

El Ing. Obregón informa que se ha vuelto a aplicar cemento hidráulico, seguido de una capa de Sika 101, y se dejará secar antes de realizar nuevamente la prueba de estanqueidad.

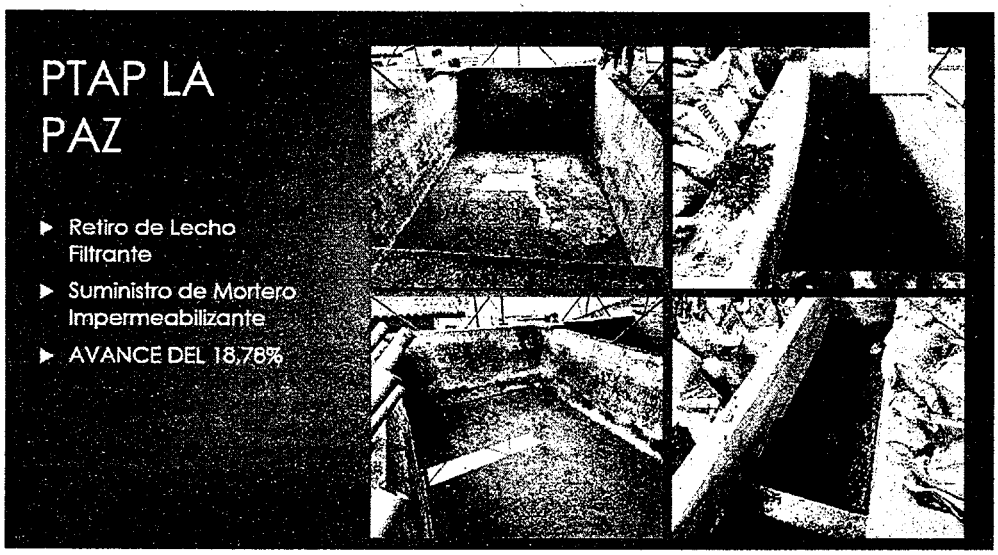

Fotografía 4. Avance PTAP La Paz

En la PTAP La Paz, el avance es del 18,78%. Durante este corte, se llevaron a cabo actividades como el vaciado de los tanques y los filtros. Se ha observado que la planta no recibe el mantenimiento adecuado, ya que se encuentra acumulado lodo en su interior.

El Ing. Diego informa que es necesario realizar un bypass para evitar dejar a la comunidad sin agua, aunque señala que está trabajando sin complicaciones.

Por su parte, la Ing. Angie señala que, según el cronograma, el contratista tiene previsto entregar los tres frentes el 20 de diciembre de este año.

El Doc. Camilo pregunta al contratista y al interventor cuándo tienen previsto solicitar el cobro del avance que están presentando.

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su copia, alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.

La Ing. Angie informa que el contratista de obra ha presentado la cuenta, la cual será revisada por la supervisión antes de ser entregada al área administrativa para su respectiva radicación.

La Doc. Andrea aclara que la fecha límite para presentar el acta final y formalizar el contrato es el 5 de diciembre. No obstante, se enviará un correo informativo con las fechas correspondientes. Las cuentas serán recibidas entre el 7 y el 13 de diciembre para ser pagadas el próximo año, como cuenta extraordinaria. Es importante enviar la cuenta con suficiente antelación para su revisión y evitar complicaciones.

Por su parte, el Ing. Jurado aclara que la revisión y aprobación de la cuenta del contratista de obra corresponde al interventor. En cuanto a nuestra labor, como entidad, nos encargamos de verificar que se esté cobrando únicamente lo ejecutado.

Se cierra la reunión.


OBSERVACIONES GENERALES (Propuestas, Cambios y/o Adiciones):

TAREAS Y COMPROMISOS ESTABLECIDOS EN ESTA REUNIÓN


QUÉ HACER	RESPONSABLE	FECHA COMPROMISO
El interventor debe presentar informes semanales y un informe mensual con el consolidado de las actividades ejecutadas	Interventoría	18/Nov/2024
Obra debe presentar cuenta parcial 01 del contrato con el avance ejecutado.	Contratista Obra	9/Nov/2024
Revisión del tanque la PTAP la Reforma	UAESP	21/Nov/2024

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su copia, alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.

Firmas (responsables)



Líder Agua Potable UAESP
Ing. Juan Carlos Jurado



Apoyo a supervisión UAESP
Ing. Angie Natalia Murillo

NOTA: Se anexa listado de asistencia compuesto por Un (1) folio(s).

Elaboró: Angie Natalia Murillo – UAESP – Equipo AP – SB

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su copia, alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN TECNOLÓGICA Y DE LA INFORMACIÓN GESTIÓN DOCUMENTAL	MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG) LISTADO DE ASISTENCIA	MAGT04.03.P003.F007	
		VERSIÓN	002

ACTA DE REUNIÓN N° 4182.010.26.1.11

FECHA:	15 NOV / 2024
HORA INICIAL:	6:18
HORA FINAL:	6:36

OBJETIVO: COMITÉ Nº 9 PARA EL SEGUIMIENTO A LA INTERVENTORIA DEL CONTRATO N°4182.010.26.1.566-2024 CORRESPONDE A " REALIZAR INTERVENTORIA A LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO PTAP LA REFORMA, LA PAZ Y UORAGINE

LUGAR: UAESP TALLER #2.

ASISTENTES

N°	Nombre	Organismo/Entidad	Teléfono	Correo Electrónico	Firma
1	Camilo Murcia Lozano	UAESP	3023896659	walter.murcia@cali.gov.co	
2	Luis Eduardo García	UAESP	3557664168	[illegible]	
3	Jairo Bernal	Interventoría	3112058776	[illegible]	
4	ANGIE NATALIA MURILLO	UAESP	3132554138	angiemurillo_28@hotmail.com	
5	Luis Fdo Obregon P	Interventoría	3147775831[illegible]	fernandoobregonp@hotmail	
6	Stephany Montoya Cardona	Uaesp	3173247201	mstephany2910@gmail.com	
7	Consuelo Geraldo J	UAESP	3164910514	congi79@gmail.com	
8	Diego Sandoval J	Interventoría	3007742761	sandiego713@gmail.com	
9	JUAN C. JIMENEZ	UAESP	3104116116	juan.vivas@[illegible]	
10	Andrea Vivas	UAESP	3148973738	andreavivas4@[illegible]	
11	Marcela Cordoba	Invitada	3083931879	marcecoav@gmail.com	

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.
