CONVENIO SOLIDARIO NO. 3415 DE 2023, CUYO OBJETO ES “AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL PROGRESO DEL MUNICIPIO DE LA ARGENTINA EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL”.

CONVENIO INTERADMINISTRATIVO NO. 4036 DE 2023, CUYO OBJETO ES “AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA DE BETANIA DEL MUNICIPIO DE LA ARGENTINA EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINO COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL”.

CONVENIO INTERADMINISTRATIVO NO. 4778 DE 2023, CUYO OBJETO ES “AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE SAN JUDAS TADEO DE LA VEREDA DE LAS AGUILAS DEL MUNICIPIO DE LA ARGENTINA EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL”.

CONVENIO INTERADMINISTRATIVO NO. 4047 DE 2023, CUYO OBJETO ES “AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA SANTA ROSA DEL MUNICIPIO DEL PITAL EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL”.

CONTRATISTA DE OBRA:
JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA EL PROGRESO
JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA BETANIA
JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA LAS AGUILAS
JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA SANTA ROSA

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVIAS

INFORME MENSUAL No. 01

20 AL 31 DE ENERO DEL 2024

Tabla de contenido

1. INTRODUCCION 3

2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 5

2.1 LOCALIZACIÓN 5

3. INFORMACIÓN CONVENIOS 6

3.1 INFORMACIÓN GENERAL DE LOS CONVENIOS 6

3.1.1 EL PROGRESO 6

3.1.2 BETANIA 7

3.1.3 LAS AGUILAS 8

3.1.4 SANTA ROSA 8

3.2 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL MES 9

4. REPORTE EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE OBRA 14

4.1 AVANCE DE OBRA 14

5. INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA 14

5.1 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO 14

5.2.1 CRONOGRAMA DE OBRA VER (ANEXO 01). 15

5.2.2 MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA VER (ANEXO 02). 15

5.2.3 ESTADO GENERAL DEL TIEMPO VER (ANEXO 03). 15

5.2.4 RESUMEN ENSAYO DE LABORATORIO VER (ANEXO 04). 15

5.2.5 SEGUIMIENTO GARANTIAS Y SEGURO CONTRATOS DE OBRA VER (ANEXO 05). 15

5.2.6 INFORME DE DIRECTOR, RESIDENTE DE INTERVENTORIA VER (ANEXO 06) 15

6 REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA 15

6.2.1 ANEXO 07: REGISTRO FOTOGRÁFICO 15

6.2.2 ANEXO 08: HOJAS DE VIDA, PROROGA DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA 4637 DE 2023. 15

7 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 16

8.1 RELACIÓN DE LA CORRESPONDENCIA GENERADA ENTRE INTERVENTORIA, CONTRATISTA DE OBRA Y INVIAS. 16

1. INTRODUCCION

El Instituto Nacional de Vías – INVIAS, mediante oficio con radicado 2023S-VHUI-027841, entrega orden de inicio a partir del 12 de diciembre de 2023 al CONSORCIO R & C, para la ejecución de la OFERTA No.4761 DE 2023 el cual fue firmado el día 30 de noviembre de 2023, y cuenta con un plazo de ejecución inicial hasta el 31 de diciembre de 2023, se realiza una suspensión y reinicio No.01 del 29 de diciembre del 2023 al 20 de enero del 2024 y se realiza la prórroga No.01 hasta el 30 de abril de 2024.

La vía objeto de las obras son muy necesarios para el Municipio de La Argentina y El Pital - Huila, ya que son corredores rurales productivos de vital importancia. El Instituto Nacional de Vías – INVIAS – ha puesto su interés en las intervenciones necesarias con la finalidad de apoyar el desarrollo rural, garantizando la calidad y estabilidad de las obras diseñadas, aumentar la capacidad y nivel de servicio y brindarles comodidad y seguridad a los usuarios.

El objeto de dicho OFERTA No. 4761 DE 2023, cuyo objeto es “INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMO DE ACCION COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL MUNICIPIO DE LA ARGENTINA Y EL PITAL EN EL DEPARTAMENTO DEL”.

El Consorcio R & C en calidad de Interventor, los convenios: - CONVENIO SOLIDARIO NO. 3415 DE 2023, CUYO OBJETO ES “AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL PROGRESO DEL MUNICIPIO DE LA ARGENTINA EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL”. - CONVENIO INTERADMINISTRATIVO NO. 4036 DE 2023, CUYO OBJETO ES “AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA DE BETANIA DEL MUNICIPIO DE LA ARGENTINA EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINO COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL”. - CONVENIO INTERADMINISTRATIVO NO. 4778 DE 2023, CUYO OBJETO ES “AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE SAN JUDAS TADEO DE LA VEREDA DE LAS AGUILAS DEL MUNICIPIO DE LA ARGENTINA EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS

COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL". - CONVENIO INTERADMINISTRATIVO NO. 4047 DE 2023, CUYO OBJETO ES "AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA SANTA ROSA DEL MUNICIPIO DEL PITAL EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL"., los cuales ejecutaran las juntas de acción comunal de las mencionadas veredas y que tiene como supervisor del proyecto al ingeniero JOSE MIGUEL ORTEGA ORTIZ del Instituto Nacional de Vías – INVIAS, dando así a conocer el presente informe No 01 correspondiente al periodo del 20 al 31 de enero de 2024, en el cual relacionamos el desarrollo y avance de las actividades programadas, a efecto de constatar el cumplimiento por parte de la juntas de Acción Comunal.

2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

2.1 LOCALIZACIÓN

El proyecto se desarrollará en el municipio de la Argentina y el Pital del departamento del Huila, con la finalidad de mejorar las condiciones de transitabilidad de los caminos vecinales y vías regionales, en donde una de las líneas de acción es la implementación de un esquema de ejecución en el que las obras menores sean construidas por los Organismos de Acción Comunal, a través de la celebración de convenios solidarios en el programa "*Caminos Comunitarios de la Paz Total".*

MUNICIPIO LA ARGENTINA

La Argentina es un municipio colombiano ubicado en el sur - occidente del departamento del Huila, sobre las estribaciones de la serranía de las Minas, que se desprenden de la cordillera central, a la margen derecha del río La Plata. Hace parte de la región Suboccidente del departamento. Su extensión territorial es de 390 km², su altura es de 1560 m s. n. m. y su temperatura promedio es de 20 °C.

Cuenta con una población de 13.884 habitantes de acuerdo con proyección del DANE para año 2023.6 Es un territorio de vocación agrícola, ya que su economía se basa en cultivos como el café, granadilla, lulo, durazno, cacao, frijol en mayor proporción y el ecoturismo por la cantidad de fincas existentes. Es conocida como «Antigua Capital Minera de Colombia».



Ilustración 1: Google

MUNICIPIO EL PITAL

El Pital es un municipio colombiano ubicado al sur occidente del departamento de Huila, sobre la planicie del valle superior del río Magdalena en las estribaciones de la cordillera Occidental. Su cabecera municipal está localizada sobre el piedemonte oriental de la serranía de las Minas. Su extensión territorial es de 210 km², su altura es de 921 m s. n. m. y su temperatura promedio es de 20 °C.

Cuenta con una población de 16.264 habitantes de acuerdo con proyección del DANE para año 2019.[4] Hace parte de la Región Subcentro del departamento. El sector agrícola es la principal actividad económica del municipio, especialmente la producción de frutas para el mercado nacional. Es conocida como «*"Cuna de Patriotas por Excelencia"*».



Ilustración 2: Google

3. INFORMACIÓN CONVENIOS

3.1 INFORMACIÓN GENERAL DE LOS CONVENIOS

3.1.1 EL PROGRESO

Contratista:	JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA EL PROGRESO
Representante legal:	FABIO OVIEDO SALAZAR
Nit.	813.004.445 - 1
Convenio No.	3415 de 2023

Objeto:	"AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL PROGRESO DEL MUNICIPIO DE LA ARGENTINA EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL."
Vía:	Vía que comunica la vereda El Progreso con el municipio de la Argentina.
Valor convenio:	$ 189.383.701
Valor Adiciones	N/A
Valor Acumulado del Contrato	$ 189.603.960
Plazo inicial:	Hasta el 31 de diciembre de 2023
Fecha de inicio:	04 de diciembre de 2023
Suspensión No.1:	29 de diciembre de 2023
Fecha de Reanudación:	20 de enero de 2024
Fecha de Final:	30 de abril de 2024

3.1.2 BETANIA

Contratista:	JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA BETANIA
Representante legal:	SANDRA PATRICIA CASTILLO
Nit.	900.018.993 – 2
Convenio No.	4036 de 2023
Objeto:	"AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA DE BETANIA DEL MUNICIPIO DE LA ARGENTINA EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL".
Vía:	Vía que comunica la vereda Betania con el municipio de la Argentina.
Valor convenio:	$ 189.496.279
Valor Adiciones	N/A
Valor Acumulado del Contrato	$ 189.496.279
Plazo inicial:	Hasta el 31 de diciembre de 2023
Fecha de inicio:	04 de diciembre de 2023
Suspensión No.1:	29 de diciembre de 2023
Fecha de Reanudación:	20 de enero de 2024
Fecha Final:	30 de abril de 2024

3.1.3 LAS AGUILAS

Contratista:	JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA LAS AGUILAS
Representante legal:	ANDRES MEDINA JARA
Nit.	891.104.035 - 8
Convenio No.	4778 de 2023
Objeto:	"AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE SAN JUDAS TADEO DE LA VEREDA DE LAS AGUILAS DEL MUNICIPIO DE LA ARGENTINA EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL."
Vía:	Vía que comunica la vereda las Águilas con el municipio de la Argentina.
Valor convenio:	$ 189.511.210
Valor Adiciones	N/A
Valor Acumulado del Contrato	$ 189.511.210
Plazo Inicial:	Hasta el 31 de diciembre de 2024
Fecha de inicio:	NO TIENE
Suspensión No.1:	29 de diciembre de 2023
Fecha de Reanudación:	20 de enero de 2024
Suspensión No.2:	20 de enero de 2024
Fecha de Reanudación:	29 de febrero de 2024
Fecha Final:	30 de abril de 2024

3.1.4 SANTA ROSA

Contratista:	JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA SANTA ROSA
Representante legal:	LIBARDO CUELLAR CHAUX
Nit.	900.017.634 - 9
Convenio No.	4047 de 2023
Objeto:	"AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA SANTA ROSA DEL MUNICIPIO DEL PITAL EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL."
Vía:	Vía que comunica la vereda Santa Rosa con el municipio del Pital.

Valor convenio:	$ 189.600.814
Valor Adiciones	N/A
Valor Acumulado del Contrato	$ 189.600.814
Plazo Inicial:	Hasta el 31 de diciembre de 2024
Fecha de inicio:	14 de diciembre de 2023
Suspensión No.1:	29 de diciembre de 2023
Fecha de Reanudación:	20 de enero de 2024
Fecha Final:	30 de abril de 2024

3.2 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL MES

Las actividades realizadas durante el presente periodo por la interventoría consistieron en comités presencial y virtual, visita a las veredas de el Progreso, Betania, las Águilas y Santa Rosa del Municipio de la Argentina y el Pital.

➢ En el periodo comprendido desde el 20 al 31 de enero de 2023 se llevó a cabo las siguientes actividades:

EL PROGRESO:

- Se realizan varios comités operativos con los entes encargados del proyecto que son: INVIAS, Interventoría, JAC Vereda el Progreso, con la finalidad de avanzar en las cotizaciones de materiales y búsqueda del personal para la ejecución de la obra tanto profesional como mano de obra no calificada.

- Se realiza prórroga No.01(Adición de tiempo) del contrato de interventoría 4637 de 2023 y del convenio solidario 3415 de 2023 hasta el 30 de abril del 2024.

- Se le solicita a la JAC de la vereda el Progreso agilizar la contratación del ingeniero residente de obra, contador público, maestro y ayudante de obra, además de hacer las cotizaciones de los materiales de construcción y maquinaria a utilizar en las actividades de mejoramiento, para dar inicio con la ejecución del proyecto.

- Por parte de la interventoría se hace revisión de las hojas de vida del personal requerido según anexo técnico del convenio solidario enviada por la JAC de la vereda el progreso para el perfil de ingeniero residente de obra, contador público y maestro de obra para la ejecución del proyecto celebrado entre el Invias y la JAC.

BETANIA:

- Se realizan diferentes comités operativos con los entes encargados de la ejecución del proyecto lo cuales son el INVIAS, Interventoría, JAC Vereda Betania, con la finalidad y dar prioridad en avanzar en las cotizaciones de materiales, maquinaria y búsqueda del personal para la ejecución de la obra tanto profesional como mano de obra no calificada.

- Se realiza prórroga No.01 del contrato de interventoría 4761 de 2023 y del convenio solidario 4036 de 2023 hasta el 30 de abril del 2024.

- Se le solicita a la JAC de la vereda Betania priorizar en la contratación del ingeniero residente de obra, contador público, maestro y ayudante de obra, a su vez se debe hacer las cotizaciones de los materiales de construcción y maquinaria a utilizar en las actividades de mejoramiento, para dar inicio con la ejecución del proyecto, ya el que plazo de la interventoría es reducido.

- Por parte de la interventoría se hace revisión de las hojas de vida del personal requerido según anexo técnico del convenio solidario enviada por la JAC de la vereda Betania para el perfil de ingeniero residente de obra, contador público y maestro de obra para la ejecución del proyecto celebrado entre el Invias y la JAC.

LAS AGUILAS:

- Este convenio solidario a la fecha comprendida de este periodo no se ha realizado la socialización del convenio, la constitución de veeduría, ni se han iniciado con la ejecución de las actividades de mejoramiento. Debido a que por parte del instituto Nacional de Vías INVIAS no se le ha realizado el desembolso del dinero del presupuesto del convenio solidario 4778 de 2023.

- Se realiza la suspensión No.02 al convenio solidario 4778 de 2023 el día 20 de enero de 2024 con fecha de reinicio 29 de febrero de 2024, debido a que por parte del instituto Nacional de Vías INVIAS no se le ha realizado el desembolso del dinero del presupuesto de dicho convenio anteriormente mencionado.

SANTA ROSA:

- Se realizan comités operativos con los entes encargados de la ejecución del proyecto lo cuales en ellos participan el INVIAS, Interventoría, JAC Vereda Betania, con la finalidad y dar prioridad en avanzar en las cotizaciones de materiales, maquinaria y búsqueda del personal para la ejecución de la obra tanto profesional como mano de obra no calificada.


- Se realiza prórroga No.01 en adición de tiempo al contrato de interventoría 4761 de 2023 y del convenio solidario 4047 de 2023 hasta el 30 de abril del 2024.

- Se le solicita a la JAC de la vereda Santa rosa priorizar en la contratación del ingeniero residente de obra, contador público, maestro y ayudante de obra, a su vez se debe hacer las cotizaciones de los materiales de construcción y maquinaria a utilizar en las actividades de mejoramiento, para dar inicio con la ejecución del proyecto, ya el que plazo de la interventoría es reducido.


- Por parte de la interventoría se hace revisión de las hojas de vida del personal requerido según anexo técnico del convenio solidario enviada por la JAC de la vereda Santa Rosa para el perfil de ingeniero residente de obra, contador público y maestro de obra para la ejecución del proyecto celebrado entre el Invias y la JAC.


Registro fotográfico:


VEREDA EL PROGRESO:

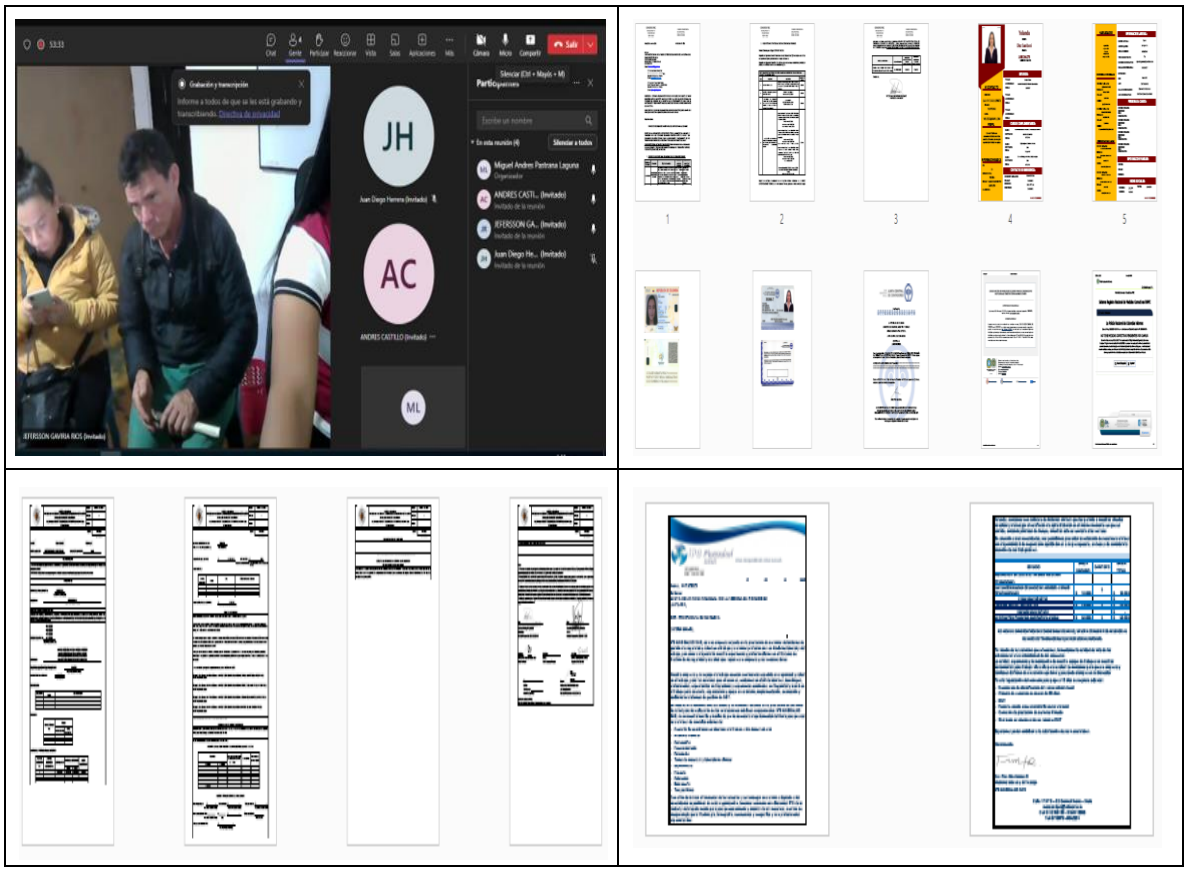


VEREDA BETANIA:

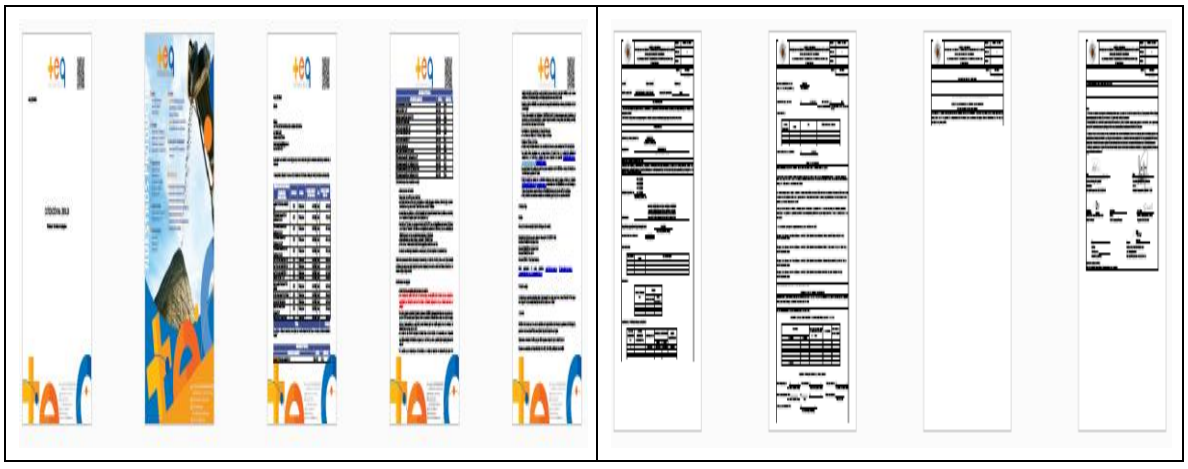


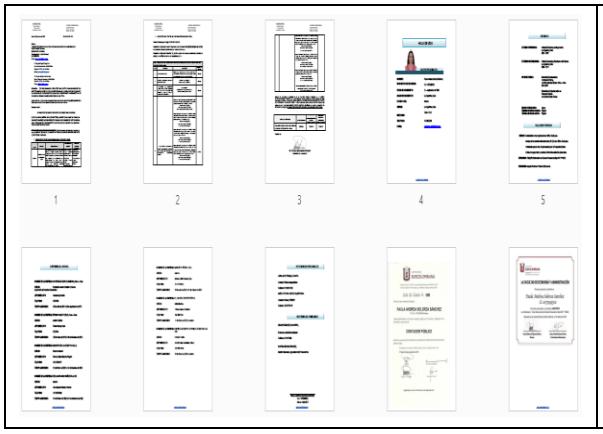

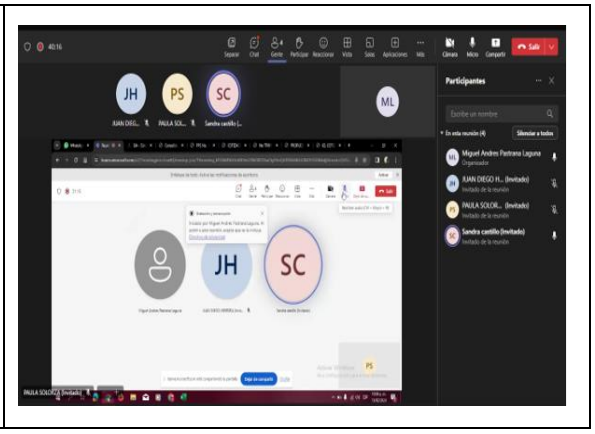


VEREDA LA AGUILAS:

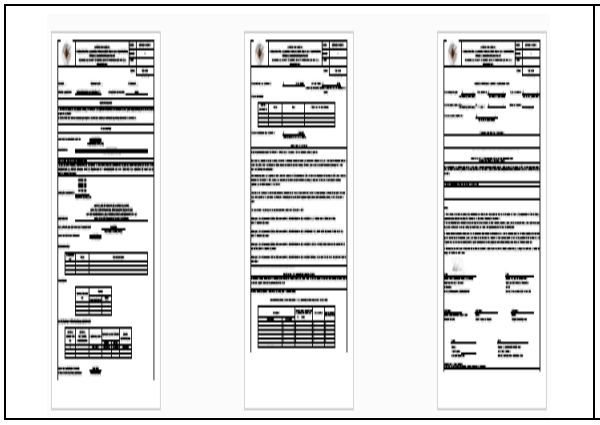


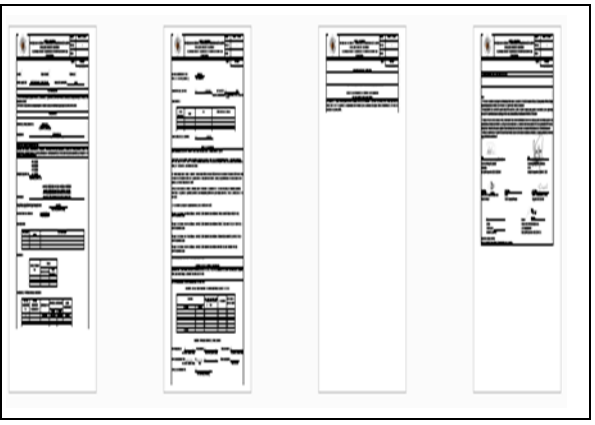

SANTA ROSA:

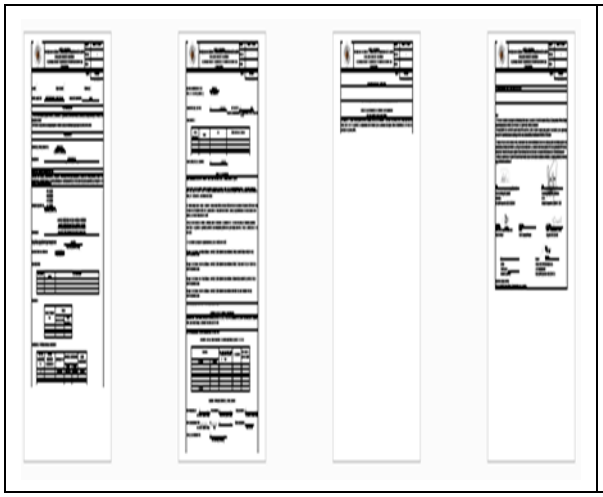



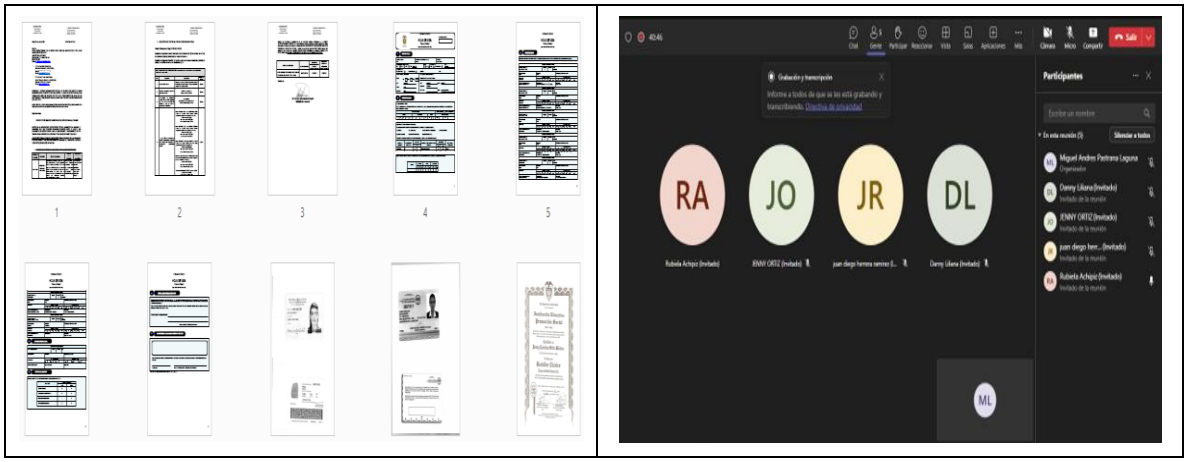

4. REPORTE EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE OBRA

4.1 AVANCE DE OBRA

Durante el periodo comprendido entre el 20 al 31 de enero de 2023 las Juntas de acción comunal no han presentado su cronograma de obra, balance de obra, y presentan demora en las cotizaciones y demás procesos para iniciar con el desarrollo de las obras.

5. INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA

5.1 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

INTERVENTOR	**CONSORCIO R & C**
Nit	901.776.480 - 0
Dirección	Cr 7 No. 16ª- 29 piso 2
Teléfono	(8) 874 4488 – 3208360025
Contrato de Interventoría N.º	4761 de 2023
Objeto:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMO DE ACCION COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL MUNICIPIO DE LA

	ARGENTINA Y EL PITAL EN EL DEPARTAMENTO DEL".
Valor del contrato:	$ 82.526.323
Valor Adición	$0,00
Valor Acumulado del Contrato	$ 82.526.323
Plazo inicial:	Hasta el 31 de diciembre de 2023
Suspensión No.01:	29 de diciembre de 2023
Reinicio No.01:	20 de enero de 2024
Prorroga No.1:	Hasta el 30 de abril de 2024

5.2. INFORMES ESPECIALISTA Y PROFESIONALES.

5.2.1 CRONOGRAMA DE OBRA VER (ANEXO 01).

5.2.2 MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA VER (ANEXO 02).

5.2.3 ESTADO GENERAL DEL TIEMPO VER (ANEXO 03).

5.2.4 RESUMEN ENSAYO DE LABORATORIO VER (ANEXO 04).

5.2.5 SEGUIMIENTO GARANTIAS Y SEGURO CONTRATOS DE OBRA VER (ANEXO 05).

5.2.6 INFORME DE DIRECTOR, RESIDENTE DE INTERVENTORIA VER (ANEXO 06)

6 REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

6.2.1 ANEXO 07: REGISTRO FOTOGRÁFICO

6.2.2 ANEXO 08: HOJAS DE VIDA, PROROGA DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA 4637 DE 2023.

7 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

- Adelantar y agilizar los procesos de cotización de materiales a utilizar para la construcción de las obras objeto a los convenios solidarios.
- Solicitar como mínimo 2 cotizaciones de los materiales de construcción a utilizar en la ejecución del proyecto, además de los laboratorios de suelo, levantamiento topográfico y diseño geométrico.
- Entregar con anticipación las hojas de vida del personal que se dispondrá a ejecutar labores de ayudante, maestro, contador público e ingeniero residente obra en los convenios.
- Coordinar con el contador público para las afiliaciones de los trabajadores al (Salud, Pensión y ARL) y de tener en cuenta las retenciones que sea pertinentes de ley.
- Se hace recomendación respetuosamente a la JAC de la vereda Santa Rosa que al maestro de obra le cancela por ml de construcción de placa huella y se le cancela un valor por Und de la construcción de alcantarilla reforzada de diámetro 36”.

8 OTROS ANEXOS

8.1 RELACIÓN DE LA CORRESPONDENCIA GENERADA ENTRE INTERVENTORIA, CONTRATISTA DE OBRA Y INVIAS.

CORRESPONDENCIA ENVIADA POR LA INTERVENTORIA				
FECHA DEL OFICIO	**NOMBRE ENTIDAD REMITENTE**	**CONSECUTIVO**	**NOMBRE DEL DESTINATARIO**	ASUNTO
18-01-2024	INVIAS	INVIAS.HUI.INT - 005	jmortega@invias.gov.co, dpabon@invias.gov.co, atencionciudadano@invias.gov.co	Prorroga No.01 contrato de Interventoría 4761 de 2023
18-01-2024	INVIAS	CORREO ELECTRONICO SE ADJUNTA PDF, WORD Y EXCEL.	jmortega@invias.gov.co	PRORROGA CONVENIO 4047 Santa Rosa Pital
26-01-2024	JAC VEREDA EL PROGRESO	INVIAS.HUI.INT - 008	fabiooviedo363@gmail.com, jmortega@invias.gov.co, dpabon@invias.gov.co	Revisión de hoja de vida del personal mínimo requerido (Ingeniero Residente de obra) para la ejecución de la obra exigidos contractualmente para dar cumplimiento al convenio 3415 de 2023

30-01-2024	JAC VEREDA EL PROGRESO	INVIAS.HUI.INT - 009	fabiooviedo363@gmail.com, jmortega@invias.gov.co, dpabon@invias.gov.co	Revisión de hoja de vida del personal mínimo requerido (Contador Público) para la ejecución de la obra exigida contractualmente para dar cumplimiento al convenio 3415 de 2023
31-01-2024	JAC VEREDA SANTA ROSA	INVIAS.HUI.INT - 010	jac.santarosapital23@gmail.com jmortega@invias.gov.co, dpabon@invias.gov.co	Revisión de hoja de vida del personal mínimo requerido (Ingeniero Residente de obra) para la ejecución de la obra exigidos contractualmente para dar cumplimiento al convenio 4047 de 2023
31-01-2024	JAC VEREDA SANTA ROSA	INVIAS.HUI.INT - 011	jac.santarosapital23@gmail.com jmortega@invias.gov.co, dpabon@invias.gov.co	Revisión de hoja de vida del personal mínimo requerido (Contador Público) para la ejecución de la obra exigida contractualmente para dar cumplimiento al convenio 4047 de 2023

CORRESPONDENCIA RECIBIDA POR LA INTERVENTORIA				
NOMBRE ENTIDAD REMITENTE	**RADICADO**	**FECHA (dd-mm-aa)**	**NOMBRE DEL DESTINATARIO**	**ASUNTO (Tema principal del oficio)**
CONSORCIO R & C	NO TIENE NUMERO DE RADICADO, ADJUNTA ARCHIVO WINRAR	18-01-2024	PRESIDENTA JAC VEREDA BETANIA	HOJAS DE VIDA PLACA HUELLA VEREDA BETANIA
CONSORCIO R & C	NO TIENE NUMERO DE RADICADO, ADJUNTA ARCHIVO PDF	18-01-2024	PRESIDENTA JAC VEREDA BETANIA	COTIZACION MATERIALES FERRETERIA
CONSORCIO R & C	NO TIENE NUMERO DE RADICADO, ADJUNTA ARCHIVO PDF	18-01-2024	PRESIDENTA JAC VEREDA BETANIA	COTIZACION DOTACION
CONSORCIO R & C	NO TIENE NUMERO DE RADICADO, ADJUNTA ARCHIVO PDF	18-01-2024	jmortega@invias.gov.co	PRORROGA CONVENIO 4047 Santa Rosa Pital

CONSORCIO R & C	NO TIENE NUMERO DE RADICADO, ADJUNTA ARCHIVO PDF	19-01-2024	PRESIDENTA JAC VEREDA BETANIA	COTIZACIONES ESTUDIOS DE SUELO Y TOPOGRAFIA
CONSORCIO R & C	NO TIENE NUMERO DE RADICADO, ADJUNTA ARCHIVO PDF	19-01-2024	PRESIDENTA JAC VEREDA BETANIA	COTIZACIONES EXAMENES DE INGRESO
CONSORCIO R & C	NO TIENE NUMERO DE RADICADO, ADJUNTA ARCHIVO WINRAR Y EXCEL	23-01-2024	PRESIDENTA JAC VEREDA EL PROGRESO	HOJAS DE VIDA
CONSORCIO R & C	NO TIENE NUMERO DE RADICADO, ADJUNTA ARCHIVO WINRAR Y EXCEL	23-01-2024	PRESIDENTA JAC VEREDA EL PROGRESO	Hoja de vida Contador
CONSORCIO R & C	NO TIENE NUMERO DE RADICADO, ADJUNTA ARCHIVO WINRAR	23-01-2024	PRESIDENTA JAC VEREDA EL PROGRESO	Hoja de vida Maestro
CONSORCIO R & C	NO TIENE NUMERO DE RADICADO, ADJUNTA ARCHIVO WINRAR	24-01-2024	PRESIDENTA JAC VEREDA EL PROGRESO	Cotizaciones
CONSORCIO R & C	NO TIENE NUMERO DE RADICADO, ADJUNTA ARCHIVO WINRAR	25-01-2024	PRESIDENTA JAC VEREDA EL PROGRESO	Hoja de vida Residente de obra

Cordialmente,

VICTOR GUILLERMO RODRIGUEZ RAMIREZ
DIRECTOR DE INTERVENTORIA

ANEXO 01:

CRONOGRAMA DE OBRA

LAS JUNTAS DE ACCION COMUNAL NO SE HAN PRESENTADO A LA INTERVENTORIA

ANEXO 02:

MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA (MEPI-MN-IN-15-FR-4)

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-4
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 31/01/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** HUILA

CONTROL DIARIO DE MAQUIINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA

PERIODO / MES INFORME MENSUAL: DEL 20 AL 31 DE ENERO DE 2024

PROYECTO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA EL PROGRESO DEL MUNICIPIO DE LA ARGENTINA EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

CONTRATO No. Convenio Solidario 3415 de 2023 **CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA EL PROGRESO

CONTRATO INTERVENTORÍA No. 4761 DE 2023 **INTERVENTORÍA:** CONSORCIO R & C

MAQUINARIA Y EQUIPO				DÍAS DEL MES																												
DESCRIPCIÓN	MARCA / MODELO	CAPACIDAD	LOCALIZACIÓN	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Compactador manual (SALTARÍN)																							I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Mezcladora de concreto 1 bulto																							I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Cizalla manual de 90 cm																							I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Carrotanque de agua (1000 gl)																							I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Vibrocompatador, potencia 153 HP, peso 10 Ton.																							I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Motoniveladora																							I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Ruteadora																							I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Compresor (barrido y soplado)																							I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Camioneta D – 300																							I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Retroexcavadora sobre llanta																							I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Compresor 120 HP con artillo																							I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Vibrador de concreto																							I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
			TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO																				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			TOTAL ACTIVO																				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			TOTAL EN REPARACIÓN																				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			TOTAL INACTIVO																				12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12

RESUMEN PERIODO / MES	No.	%
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO	12	0
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO ACTIVO = A	0	0
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO EN REPARACIÓN = R	0	0
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO INACTIVO = I	12	0

CONVENCIONES: **ACTIVO= A, EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.**

REPORTE DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO (Cuando se encuentre "Inactiva" o "En reparación" indicar las razones de su estado):

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA: EN EL PERIODO DEL PRESENTE INFORME NO SE PRESENTA NINGUN TIPO DE MAQUINARIA EN OBRA DE ACUERDO AI ANEXO TECNICO YA QUE EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN PROCESO DE CONTRATACION DE PERSONAL PROFESIONAL Y MANO DE OBRA NO CALIFICADA ADEMAS DE LAS COTIZACIONES DE MATERIALES Y MAQUINARIA.

LA INTERVENTORÍA CERTIFICA QUE EL CONTRATISTA CUMPLIÓ CON LA DISPONIBILIDAD DE MAQUINARIA Y EQUIPO MÍNIMOS EXIGIDOS PARA EL PROYECTO.

NOTAS:
1. El Interventor debe indicar de manera breve las razones por las cuales la maquinaria y equipo relacionada se encuentran EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.
2. Se entiende por "Activo" el estado de la maquinaria disponible y en uso, por "Inactivo" el estado de la maquinaria que estando disponible no se encuentra en uso y "en reparación" el estado de la maquinaria no disponible por estar en mantenimiento y/o en reparación.
3. Es responsabilidad de la Interventoría realizar el seguimiento y control diario de la maquinaria y equipo utilizado por el Contratista de obra para la ejecución del proyecto.
4. En el evento en que el Contratista de obra no cumpla con la maquinaria y equipo mínimo requeridos, la Interventoría debe indicar en la casilla "Observaciones de la Interventoría" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
5. Así mismo en la casilla "Observaciones de la interventoría" el interventor debe consignar las observaciones que considere pertinentes relacionadas con la maquinaria y equipos.

Firma
Nombre:
Residente de Obra
Matrícula Profesional No.:

Firma
Nombre:DANIEL FERNANDO PERDOMO CRUZ
Residente de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 091037-0594401 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-4
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 31/01/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** HUILA

CONTROL DIARIO DE MAQUIINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA

PERIODO / MES INFORME MENSUAL: DEL 20 AL 31 DE ENERO 2024

PROYECTO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA SANTA ROSA DEL MUNICIPIO DEL PITAL EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

CONTRATO No. Convenio Solidario 4047 de 2023

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA SANTA ROSA

CONTRATO INTERVENTORÍA No. 4761 DE 2023

INTERVENTORÍA: CONSORCIO R & C

MAQUINARIA Y EQUIPO				DÍAS DEL MES																												
DESCRIPCIÓN	MARCA / MODELO	CAPACIDAD	LOCALIZACIÓN	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Compactador manual (SALTARÍN)																							I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Mezcladora de concreto 1 bulto																							I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Cizalla manual de 90 cm																							I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Carrotanque de agua (1000 gl)																							I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Vibrocompatador, potencia 153 HP, peso 10 Ton.																							I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Motoniveladora																							I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Ruteadora																							I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Compresor (barrido y soplado)																							I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Camioneta D – 300																							I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Retroexcavadora sobre llanta																							I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Compresor 120 HP con artillo																							I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Vibrador de concreto																							I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
			TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO																				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			TOTAL ACTIVO																				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			TOTAL EN REPARACIÓN																				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			TOTAL INACTIVO																				12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12

RESUMEN PERIODO / MES	No.	%
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO	12	0
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO ACTIVO = A	0	0
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO EN REPARACIÓN = R	0	0
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO INACTIVO = I	12	0

CONVENCIONES: **ACTIVO= A, EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.**

REPORTE DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO (Cuando se encuentre "Inactiva" o "En reparación" indicar las razones de su estado):

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA: EN EL PERIODO DEL PRESENTE INFORME NO SE PRESENTA NINGUN TIPO DE MAQUINARIA EN OBRA DE ACUERDO AI ANEXO TECNICO YA QUE EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN PROCESO DE CONTRATACION DE PERSONAL PROFESIONAL Y MANO DE OBRA NO CALIFICADA ADEMAS DE LAS COTIZACIONES DE MATERIALES Y MAQUINARIA.

LA INTERVENTORÍA CERTIFICA QUE EL CONTRATISTA CUMPLIÓ CON LA DISPONIBILIDAD DE MAQUINARIA Y EQUIPO MÍNIMOS EXIGIDOS PARA EL PROYECTO.

NOTAS:
1. El Interventor debe indicar de manera breve las razones por las cuales la maquinaria y equipo relacionada se encuentran EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.
2. Se entiende por "Activo" el estado de la maquinaria disponible y en uso, por "Inactivo" el estado de la maquinaria que estando disponible no se encuentra en uso y "en reparación" el estado de la maquinaria no disponible por estar en mantenimiento y/o en reparación.
3. Es responsabilidad de la Interventoría realizar el seguimiento y control diario de la maquinaria y equipo utilizado por el Contratista de obra para la ejecución del proyecto.
4. En el evento en que el Contratista de obra no cumpla con la maquinaria y equipo mínimo requeridos, la Interventoría debe indicar en la casilla "Observaciones de la Interventoría" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
5. Así mismo en la casilla "Observaciones de la interventoría" el interventor debe consignar las observaciones que considere pertinentes relacionadas con la maquinaria y equipos.

Firma
Nombre:
Residente de Obra
Matrícula Profesional No.:

Firma
Nombre:DANIEL FERNANDO PERDOMO CRUZ
Residente de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 091037-0594401 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-4
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 31/01/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** HUILA

CONTROL DIARIO DE MAQUIINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA

PERIODO / MES INFORME MENSUAL: DEL 20 AL 31 DE ENERO DE 2024

PROYECTO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA DE BETANIA DEL MUNICIPIO DE LA ARGENTINA EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINO COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

CONTRATO No. Convenio Solidario 4036 de 2023

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA BETANIA

CONTRATO INTERVENTORÍA No. 4761 DE 2023

INTERVENTORÍA: CONSORCIO R & C

MAQUINARIA Y EQUIPO				DÍAS DEL MES																												
DESCRIPCIÓN	MARCA / MODELO	CAPACIDAD	LOCALIZACIÓN	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Compactador manual (SALTARÍN)																							I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Mezcladora de concreto 1 bulto																							I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Cizalla manual de 90 cm																							I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Carrotanque de agua (1000 gl)																							I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Vibrocompatador, potencia 153 HP, peso 10 Ton.																							I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Motoniveladora																							I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Ruteadora																							I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Compresor (barrido y soplado)																							I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Camioneta D – 300																							I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Retroexcavadora sobre llanta																							I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Compresor 120 HP con artillo																							I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Vibrador de concreto																							I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
			TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO																				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			TOTAL ACTIVO																				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			TOTAL EN REPARACIÓN																				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			TOTAL INACTIVO																				12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12

RESUMEN PERIODO / MES	No.	%
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO	12	0
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO ACTIVO = A	0	0
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO EN REPARACIÓN = R	0	0
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO INACTIVO = I	12	0

CONVENCIONES: **ACTIVO= A, EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.**

REPORTE DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO (Cuando se encuentre "Inactiva" o "En reparación" indicar las razones de su estado):

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA: EN EL PERIODO DEL PRESENTE INFORME NO SE PRESENTA NINGUN TIPO DE MAQUINARIA EN OBRA DE ACUERDO AI ANEXO TECNICO YA QUE EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN PROCESO DE CONTRATACION DE PERSONAL PROFESIONAL Y MANO DE OBRA NO CALIFICADA ADEMAS DE LAS COTIZACIONES DE MATERIALES Y MAQUINARIA.

LA INTERVENTORÍA CERTIFICA QUE EL CONTRATISTA CUMPLIÓ CON LA DISPONIBILIDAD DE MAQUINARIA Y EQUIPO MÍNIMOS EXIGIDOS PARA EL PROYECTO.

NOTAS:
1. El Interventor debe indicar de manera breve las razones por las cuales la maquinaria y equipo relacionada se encuentran EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.
2. Se entiende por "Activo" el estado de la maquinaria disponible y en uso, por "Inactivo" el estado de la maquinaria que estando disponible no se encuentra en uso y "en reparación" el estado de la maquinaria no disponible por estar en mantenimiento y/o en reparación.
3. Es responsabilidad de la Interventoría realizar el seguimiento y control diario de la maquinaria y equipo utilizado por el Contratista de obra para la ejecución del proyecto.
4. En el evento en que el Contratista de obra no cumpla con la maquinaria y equipo mínimo requeridos, la Interventoría debe indicar en la casilla "Observaciones de la Interventoría" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
5. Así mismo en la casilla "Observaciones de la interventoría" el interventor debe consignar las observaciones que considere pertinentes relacionadas con la maquinaria y equipos.

Firma
Nombre:
Residente de Obra
Matrícula Profesional No.:

Firma
Nombre:DANIEL FERNANDO PERDOMO CRUZ
Residente de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 091037-0594401 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

ANEXO 03:

ESTADO GENERAL DEL TIEMPO (MEPI-MN-IN-15-FR-10)

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA** **ESTADO GENERAL DEL TIEMPO**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-10
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 31/01/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** HUILA

CONTRATO DE OBRA No: Convenio Solidario 4036 de 2023 **CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA BETANIA

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: DEL 20 AL 31 DE ENERO DE 2024

PROYECTO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA DE BETANIA DEL MUNICIPIO DE LA ARGENTINA EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINO COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 4761 DE 2023 **INTERVENTOR:** CONSORCIO R & C

ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

Clase de tiempo	**DÍAS DEL MES**																													
	1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**24**	**25**	**26**	**27**	**28**	**29**	**30**	**31**	**Total**
Seco																				21	24	24	24	24	23	24	24	24	24	24	22	
Lluvias moderadas																				2					1						2	
Lluvias intensas																				1												
Total horas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	

EN CADA CASILLA SE DEBE INDICAR EL NÚMERO DE HORAS POR DÍA QUE PERMANECE LA CLASE DE TIEMPO LAS 24 HORAS DEL DÍA.

NOTA:
Anexar Registro pluviométrico del IDEAM correspondiente a la Estación más cercana al Proyecto.

OBSERVACIONES:

Firma
Nombre:
Residente de Obra
Matrícula Profesional No.:

Firma
Nombre:DANIEL FERNANDO PERDOMO CRUZ
Residente de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 091037-0594401 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA** **ESTADO GENERAL DEL TIEMPO**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-10
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 31/01/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** HUILA

CONTRATO DE OBRA No: Convenio Solidario 3415 de 2023 **CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA EL PROGRESO

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: DEL 20 AL 31 DE ENERO DE 2024 **PROYECTO:** AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL PROGRESO DEL MUNICIPIO DE LA ARGENTINA EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 4761 DE 2023 **INTERVENTOR:** CONSORCIO R & C

ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

Clase de tiempo	**DÍAS DEL MES**																														
	1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**24**	**25**	**26**	**27**	**28**	**29**	**30**	**31**	**Total**
Seco																				24	22	24	24	23	24	24	23	24	24	24	24	
Lluvias moderadas																					2			1								
Lluvias intensas																											1					
Total horas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	

EN CADA CASILLA SE DEBE INDICAR EL NÚMERO DE HORAS POR DÍA QUE PERMANECE LA CLASE DE TIEMPO LAS 24 HORAS DEL DÍA.

NOTA:
Anexar Registro pluviométrico del IDEAM correspondiente a la Estación más cercana al Proyecto.

OBSERVACIONES:

Firma
Nombre:
Residente de Obra
Matrícula Profesional No.:

Firma
Nombre:DANIEL FERNANDO PERDOMO CRUZ
Residente de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 091037-0594401 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA** **ESTADO GENERAL DEL TIEMPO**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-10
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 31/01/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** HUILA

CONTRATO DE OBRA No: Convenio Solidario 4047 de 2023 **CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA SANTA ROSA

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: DEL 20 AL 31 DE ENERO DE 2024

PROYECTO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA SANTA ROSA DEL MUNICIPIO DEL PITAL EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 4761 DE 2023 **INTERVENTOR:** CONSORCIO R & C

ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

Clase de tiempo	**DÍAS DEL MES**																														
	1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**24**	**25**	**26**	**27**	**28**	**29**	**30**	**31**	**Total**
Seco																				24	24	24	24	23	24	24	24	23	24	24	24	
Lluvias moderadas																								1								
Lluvias intensas																												1				
Total horas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	

EN CADA CASILLA SE DEBE INDICAR EL NÚMERO DE HORAS POR DÍA QUE PERMANECE LA CLASE DE TIEMPO LAS 24 HORAS DEL DÍA.

NOTA:
Anexar Registro pluviométrico del IDEAM correspondiente a la Estación más cercana al Proyecto.

OBSERVACIONES:

Firma
Nombre:
Residente de Obra
Matrícula Profesional No.:

Firma
Nombre:DANIEL FERNANDO PERDOMO CRUZ
Residente de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 091037-0594401 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

ANEXO 04:

Resumen Ensayos de Laboratorio (MEPI-MN-IN-15-FR-11)

NO SE HAN REALIZADO ENSAYOS DE LA BORATORIOS YA QUE LAS OBRAS NO HAN INICIADO

ANEXO 05:

SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA (MEPI-MN-IN-15-FR-12).

SE SOLICITARON A LAS JAC PARA DILEGENCIAR EL PRESENTE FORMATO Y NO LO HAN HECHO ALLEGAR A LA INTERVENTORIA

ANEXO 06:



INFORME DE PROFESIONALES

INFORME DEL DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

VICTOR GUILLERMO RODRIGUEZ RAMIREZ

Las actividades que realizó el ingeniero VICTOR GUILLERMO RODRIGUEZ RAMIREZ director de interventoría durante el periodo del 20 al 31 de enero de 2024 fueron:

- Comités operativos con la junta de acción comunal de las veredas el Progreso, Betania y Sanata Rosa del municipio de la Argentina y el Pital.
- Se realiza prórroga No.01 del contrato de interventoría 4761 de 2023 y del convenio solidario 4036 de 2023 hasta el 30 de abril del 2024.
- Revisión de las hojas de vida del personal requerido según anexo técnico del convenio solidario enviada por la JAC de la vereda Betania para el perfil de ingeniero residente de obra, contador público y maestro de obra para la ejecución del proyecto celebrado entre el Invias y la JAC.


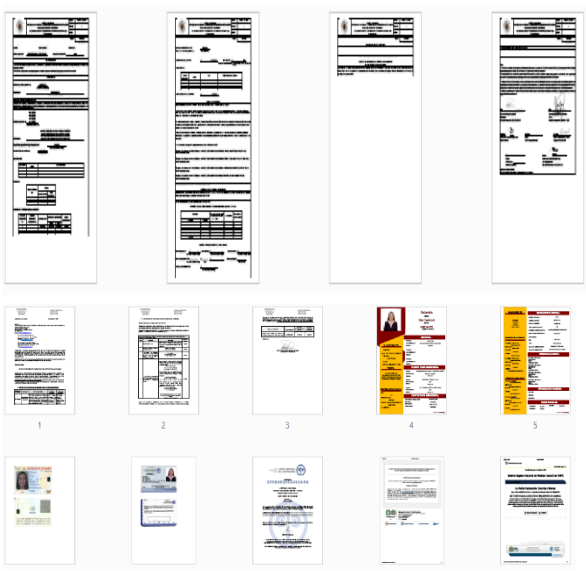
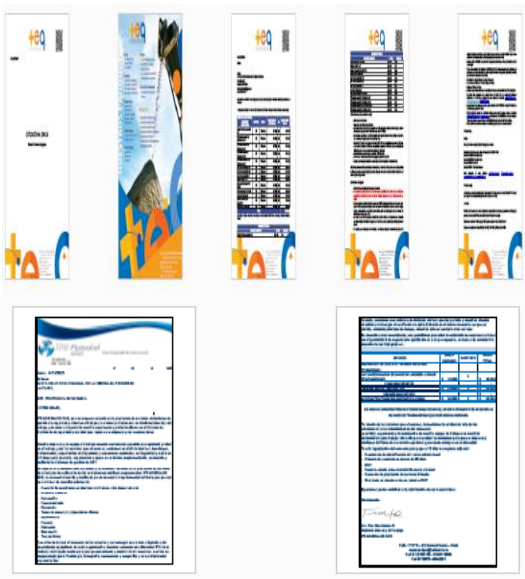
	
REVISION, VISTO BUENO HOJAS DE VIDA Y PRORROGA No.01	COMITES OPERATIVOS “COTIZACIONES”

VICTOR GUILLERMO RODRIGUEZ RAMIREZ
DIRECTOR DE INTERVENTORIA

INFORME DE RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
DANIEL FERNANDO PERDOMO CRUZ

Las actividades que realizó ingeniero DANIEL FERNANDO PERDOMO CRUZ residente de interventoría durante el periodo del 20 al 31 de enero de 2024 fueron:

- Elaboración de informes.
- Seguimiento y control de las actividades a ejecutar.
- Comités operativos con la junta de acción comunal de las veredas el Progreso, Betania y Sanata Rosa del municipio de la Argentina y el Pital.
- Se realiza prórroga No.01 del contrato de interventoría 4761 de 2023 y del convenio solidario 4036 de 2023 hasta el 30 de abril del 2024.
- Revisión de las hojas de vida del personal requerido según anexo técnico del convenio solidario enviada por la JAC de la vereda Betania para el perfil de ingeniero residente de obra, contador público y maestro de obra para la ejecución del proyecto celebrado entre el Invias y la JAC.
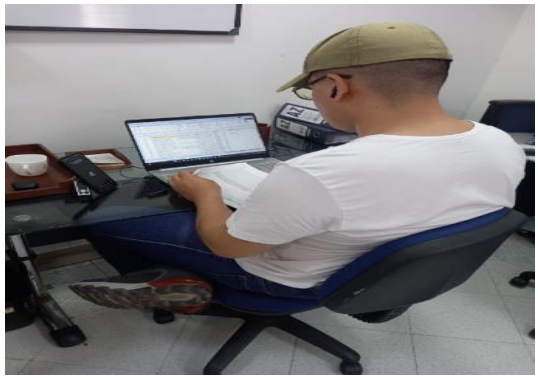
<table>
<tr><td></td><td></td></tr>
<tr><td>REVISIÓN DE HOJAS DE VIDA PERSONAL REQUERIDO.</td><td>COMITES OPERATIVOS</td></tr>
<tr><td></td><td></td></tr>
<tr><td>ELABORACION DE INFORMES</td><td>PRORROGA NO.01 CONTRATO INTERVENTORÍA Y CONVENIOS.</td></tr>
</table>

DANIEL FERNANDO PERDOMO CRUZ
RESIDENTE DE INTERVENTORIA

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **LISTA DE CHEQUEO INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

Contrato de Obra No. 3415 -2023,4036-2023, 4047-2023, 4778-2023 **Contratista:** Progreso,Betania,Santa Rosa,Aguilas

Contrato de Interventoría No. 4761 de 2023 **Interventoría:** Consorcio R&C

Objeto Contrato de Obra:

CONVENIO SOLIDARIO NO. 3415 DE 2023, CUYO OBJETO ES "AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL PROGRESO DEL MUNICIPIO DE LA ARGENTINA EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL".
CONVENIO INTERADMINISTRATIVO NO. 4036 DE 2023, CUYO OBJETO ES "AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA DE BETANIA DEL MUNICIPIO DE LA ARGENTINA EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINO COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL".
CONVENIO INTERADMINISTRATIVO NO. 4778 DE 2023, CUYO OBJETO ES "AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE SAN JUDAS TADEO DE LA VEREDA DE LAS AGUILAS DEL MUNICIPIO DE LA ARGENTINA EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL".
CONVENIO INTERADMINISTRATIVO NO. 4047 DE 2023, CUYO OBJETO ES "AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA SANTA ROSA DEL MUNICIPIO DEL PITAL EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL".

INFORME MENSUAL No. 1 **MES O PERIODO:** 01 al 29 de febrero 2024

No.	CONTENIDO	FORMATO	PÁGINA
	Lista de Chequeo Informe Mensual de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-1	1
	Resumen Mensual Estado General del Proyecto	MEPI-MN1-IN-15-FR-2	
1	**INTRODUCCIÓN**		3
2	**DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO**		5
2.1	Localización		5
2.2	Municipios en la zona de influencia y beneficios de la ejecución del proyecto		
2.3	Inventario y estado inicial de la vía		
2.4	Características técnicas del proyecto		
3	**INFORMACIÓN CONTRATO DE OBRA**		6
3.1	Información general del contrato		6
3.2	Descripción de las actividades ejecutadas en el mes		8
3.3	Seguimiento Ítems no previstos		
3.4	Estado de avance y acciones a seguir por parte de la Interventoría		
4	**REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE OBRA**		
4.1	Informe Semanal	MEPI-MN1-IN-15-FR-3	
4.2	Maquinaria y Equipo Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-4	21
4.3	Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-6	22
4.4	Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-8	
4.5	Estado General del Tiempo	MEPI-MN1-IN-15-FR-10	
4.6	Resumen Ensayos de Laboratorio	MEPI-MN1-IN-15-FR-11	23
4.7	Seguimiento Garantías y Seguros Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-12	
4.8	Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Obra	MEPI-MN-1IN-15-FR-14	
4.9	Otros documentos seguimiento mensual		
	• Seguimiento a la inversión del Anticipo	MEPI-MN-IN-2-FR-1	
		MEPI-MN-IN-2-FR-2	
	• Seguimiento Programa de Obra		
	• Seguimiento Programa de Inversiones	MEPI-MN-IN-6-FR-1	
		MEPI-MN-IN-6-FR-2	
	• Actas de Comité de Obra	MEPI-MN-IN-14-FR-1	
	• Actas de Reunión	MEPI-MN-IN-14-FR-2	
5	**INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA**		15
5.1	Información general del contrato		16
5.2	Descripción de las actividades realizadas por el Interventor		
5.3	Informes especialistas y profesionales		
5.4	Informe del Programa Anual de Caja - PAC		
5.5	Informe matriz de riesgos.		
5.6	Información otros programas y aplicativos según pliegos de condiciones Contratos de Obra e Interventoría		
	• Seguimiento estado del trámite Certificación de compatibilidad de los planos con el sistema de información geográfico (SIG) de la Entidad.		
6	**REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA**		
6.1	Equipo y vehículos Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-5	15
6.2	Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-7	
6.3	Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-9	
6.4	Seguimiento Garantías Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-13	
6.5	Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-15	
6.6	Otros documentos seguimiento mensual		
	• Seguimiento a la inversión del Anticipo	MEPI-MN-IN-3-FR-1	
		MEPI-MN-IN-3-FR-2	
	• Plan de Cargas o reprogramación al Plan de Cargas aprobado	MEPI-MN-IN-9-FR-2	
	• Seguimiento al Plan de Cargas	MEPI-MN-IN-9-FR-3	
7	**Conclusiones y recomendaciones**		
8	**Anexos**		
8.1	Relación de la correspondencia generada entre contratista e interventor incluyendo asunto, referencia, fecha de recibo		6,17
8.2	Registro fotográfico y video del avance de las obras		12,13 Y 14
8.3	Registro fotográfico y video de las actividades ambientales, sociales, prediales y de sostenibilidad adelantadas		12,13 Y 14
8.4	Copia de la Bitácora del mes correspondiente		

Nota: El Interventor debe diligenciar los folios, conforme al contenido del informe mensual.



Firma: _____

Nombre:
SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA
Resolución de designación No. _____ de fecha _____

Copias: Interventor, Dirección Territorial

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901776480	0	CONSORCIO R&C	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	Principal	CR 7 16 A 29 PISO 2	BOGOTA-BOGOTA D.E.	8744488	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-01	2024-02		9466893193	E	2024/02/19			79	

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	1075294687	PERDOMO DANIEL	X	X																231001	30	$2,600,000	$416,000	EPS037	30	$2,600,000	$104,000	CCF24	30	$2,600,000	$104,000	14-23	30	$2,600,000	$181,000	30	$0	$0	Si	$805,000
2	CC	19266128	RODRIGUEZ VICTOR	X																	25-14	30	$2,500,000	$400,000	EPS005	30	$2,500,000	$100,000	CCF24	30	$2,500,000	$100,000	14-23	30	$2,500,000	$174,000	30	$0	$0	Si	$774,000
Total	**Afiliados(2)**																						$5,100,000	$816,000			$5,100,000	$204,000			$5,100,000	$204,000			$5,100,000	$355,000		$0	$0		$1,579,000

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901776480	0	CONSORCIO R&C	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	Principal	CR 7 16 A 29 PISO 2	BOGOTA-BOGOTA D.E.	8744488	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-01	2024-02		9466893193	E	2024/02/19			79	

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)				2	$816,000	$55,100	$0	$871,100
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	$416,000	$28,100	$0	$444,100
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$400,000	$27,000	$0	$427,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$355,000	$24,000	$0	$379,000
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	2	$355,000	$24,000	$0	$379,000
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$204,000	$13,800	$0	$217,800
COMPENSAR	CCF24	860,066,942	7	2	$204,000	$13,800	$0	$217,800
EPS (ADMINISTRADORAS: 2)				2	$204,000	$13,900	$0	$217,900
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$104,000	$7,100	$0	$111,100
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$100,000	$6,800	$0	$106,800
TOTAL				**2**	**$1,579,000**	**$106,800**	**$0**	**$1,685,800**
