Dia Lluvioso
Personal Residente de obra, Profesional Social, cuadrilla civil
Equipo
Actividad Se inicia excavacion para campamento de obra, Se inicio construcción de campamento de obra, Se inicia levantamiento de medidas en terreno y se inicia toma de niveles acotacion en terreno tomando paramentos del parque estableciendo cota +0,00 Se toman medidas de colindancia y paramentos con vias ~~corrida~~ calle 31 y calle 34.

EQUISAR SA.

RESIDENTE DE OBRA


Dia Nublado
Personal Residente de Obra, Profesional Social, cuadrilla civil
Actividad Se continua construcción de campamento en terreno, se inicia construcción de cerramiento de obra, Se realiza la instalación de Banner informativo para reunión de primera piedra, Se inicia excavacion mecanica en terreno, Se inicia perforacion para anclajes epoxicos en lindero con calzada calle 34 para fundicion de Bordillo, Se realiza socializacion de diseño final de parque el cual es el definitivo para construcción. Se realiza demolicion y desinstalacion de Biosaludables, arcos de cancha y parques de niños dentro del parque.

EQUISAR SA

RESIDENTE DE OBRA

Powered by CamScanner

Plano.

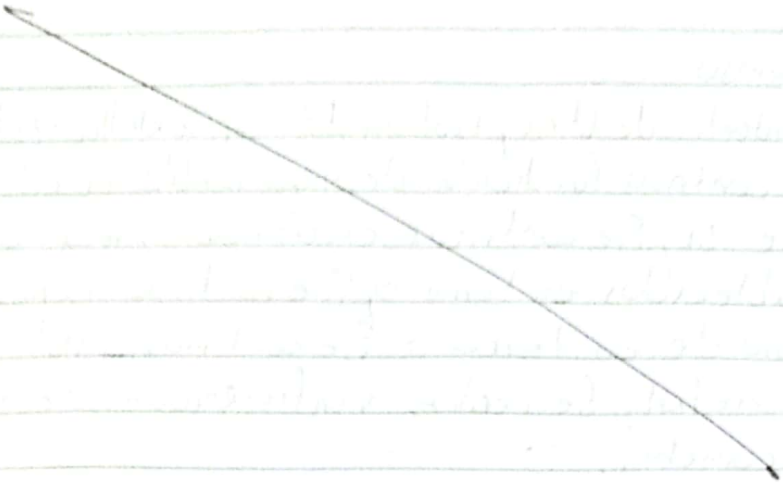

Dia Nublado

Personal Residente de Obra, Profesional Social, cuadrilla civil

Actividad Se finaliza construccion de campamento, Se inicia fundicion de viga variable con lindero en calle 34, Se continua instalacion de cerramiento en parque, Se inica descapote y replanteo en terreno y se inicia toma de niveles para establecer cota en parque.

RESIDENTE DE OBRA

Dia Lluvioso

Personal Residente de Obra, Profesional SISSO, cuadrilla civil

Actividad Se continua fundicion de viga variable en sendero lindero con calle 34 Se inicia demolicion de placa en cancha incluyendo retiro de escombros Se realiza descapote y remplanteo estableciendo niveles de anchos para terraceado de terreno, Se realiza estudio de terreno para iniciar diseño de muros de contencion del terraceado de placas, Se continua construccion de cerramiento de obra, Se realiza suspension de actividades por fuertes lluvias.

RESIDENTE DE OBRA

Dia Lluvioso
Personal Residente de Obra, Profesional SISSO, cuadrilla civil
Actividad Se continua fundición de viga variable en colindancia con calle 31, Se continua excavación mecánica segun niveles establecidos en terreno, Se continua extracción de material Sobrante en terreno Se continua instalacion de cerramiento perimetral, Se realiza verificación de niveles en placas de canchas.

Fa. EDIFICAR SA.

RESIDENTE DE OBRA

Dia Lluvioso
Personal Residente de Obra, Profesional Social, cuadrilla civil
Actividad Se continúa excavación mecánica en terreno terraceo de canchas y extracción de material de excavación, Se continua fundición de viga variable en vía calle 31 Se continua construcción de cerramiento perimetral, Se establece diseños de muro de contención para las canchas y diferentes placas y senderos en terreno.

Fa. EDIFICAR SA.

RESIDENTE DE OBRA

Powered by CamScanner

Dia Nublado

Personal Residente de obra, profesional Social cuadrilla civil

Actividad Se continua excavacion mecánico en terraceo teniendo en cuenta niveles establecidos, Se realiza fundicion de viga riostra en perimetro para Orden perimetral Se continua extraccion de material sobrante de excavación, Se realiza construcción de cerramiento perimetral de obra.

EQUIBAR SA

RESIDENTE DE OBRA

Dia Nublado

Personal Residente de Obra, Profesional SSSO, cuadrilla civil

Actividad Se continua fundicion de viga perimetral incluyendo corte fugurado y armado de acero, Se continua excavacion mecanica y extraccion de material sobrante de obra, Se continua construccion de cerramiento perimetral

EQUIBAR SA

RESIDENTE DE OBRA

Powered by CamScanner

Miercoles 09 Octubre/24
Dia Nublado
Personal Residente de Obra, Profesional Social, cuadrilla Social
Actividad Se continua fundición de viga variable en anden perimetral, Se continua instalación de cerramiento de obra y se realiza placa para baño de obra

Jueves 10 Octubre/24
Dia Nublado
Personal Residente de obra, Profesional Social, cuadrilla civil
Actividad Se continua excavacion manual para muro de contensión en zona canchas Se realiza corte figurado y armado de acero de muros Se realiza toma de niveles y se realiza medicion y replanteo

RESIDENTE DE OBRA


Viernes 11 Octubre/24
Dia Nublado
Personal Residente de Obra Profesional Social cuadrilla civil
Actividad Se continua excavaciones para muro de contensión en cancha, se continua figurado corte y armado de Acero de refuerzo para muro de contensión, Se realiza fundicion de zorpa en muro de contension

RESIDENTE DE OBRA

Powered by CamScanner

Sábado 12 de Octubre /2024 - Viernes
Se realiza armada de Acero Zapata y Muro Canchas Multiple y Sintetica. lado Oriental. y Solado e-0.05
Se realiza Vaciado Concreto 1: 1,5 : 2:5 _ 27,70ML x 1.00 x 0,25
. Hora inicio 1:00 pm finaliza 6:00 p.m. .
Se solicita al Contratista las toma de muestra del Concreto en Obra.

Dia Nublado
Personal Residente de obra, Profesional SISSO, cuadrilla civil
Sábado 12 de Octubre /2024. .
Se realiza Excavación de zapata para muro de Concreto (muro lineal) .25ML x 0.70 x 0.60 :

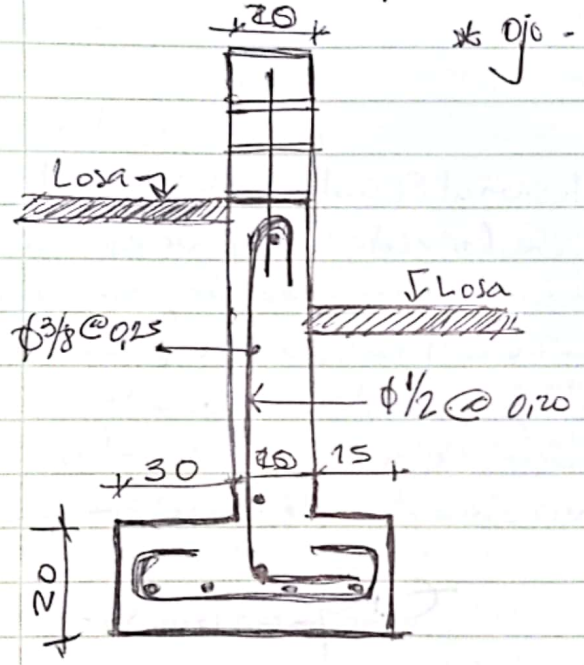

* Ojo - Respetar el Diseño del Muro.

Se Realiza armado corte y fogurado de acero para muro de contensión, se inicio armado de formaleta para fundicion de muro,

RESIDENTE DE OBRA

Lunes 14 Octubre/24
Dia Lluvioso
Personal Residente de Obra, Profesional Social, cuadrilla civil
Actividad Se continua instalación de formaleta para fundicion de muro de contensión, Se continua corte figurado y armado de acero para parrillo de muro, se realza verificación de aplome y niveles.

RESIDENTE DE OBRA

Martes 15 Octubre/24
Dia Lluvioso
Personal Residente de Obra, Profesional Social, cuadrilla civil
Actividad Se continúa armado de formaleta y preparacion para fundición de muro de contesión, se verifica aplome de muro, Se inicia fundicion de primer tramo de muro de contensión, se realza vibrado de concreto y se realza la colocación de varillas dovelas para muro perimetral de cerramiento de concha

RESIDENTE DE OBRA

Miercoles 16 Octubre/24
Dia Nublado
Personal Residente de Obra, Profesional Social, cuadrilla Civil
Actividad Se continua Corte figurado y armado
Se

Powered by CamScanner

Jueves 17/Octubre/24
Dia Nublado
Personal Residente de Obra Profesional Social cuadrilla civil
Actividad Se continua armado corte y figurado de acero y se inicia fundición de segundo tramo de muro de contension en cancha, Se revisan aplome y niveles, se realiza excavacion manual para muro entre canchas

RESIDENTE DE OBRA

Viernes 18/Octubre/24
Dia Soleado
Personal Residente de obra, Profesional Social, cuadrilla civil
Actividad Se continua excavación manual para muro contencion entre canchas, se realza corte figurado y armado de acero para zarpa de muro de contención, Se realiza fundacion de concreto solado para posterior fundicion de zarpa

RESIDENTE DE OBRA

Sabado 19/Octubre/24
Dia Nublado
Personal Residente obra Profesional Social cuadrilla civil
Actividad Se realiza corte figurado y armado de acero de refuerzo Se realiza excavacion manual para muro de contención, Se realiza fundicion de zarpa de muro de contencion

RESIDENTE OBRA

Lunes 21 Octubre/24
Dia Lluvioso
Personal Residente de obra Profesional Social, cuadrilla civil
Actividad Se realiza excavación para muro de contencion en muro de concreto sintético se realiza corte, figurado y armado de acero para muro de contencion divisorio en concreto, se realiza encofrado de muro para fundicion de muro de contencion

Residente de Obra.

Martes 22 Octubre 2024.
Dia Lluvioso
Personal Residente de obra Profesional Social cuadrilla civil
Actividad Se realiza encofrado para fundicion de muro de contencion divisorio entre canchas, Se realizo fundicion de muro divisorio verificando el correcto fraguado, Se continua excavacion para muro contención en esquina Norte de cancha Sinteticas.

EDUBAR SA.

RESIDENTE OBRA

Miercoles- 23 octubre 2024
Dia Lluvioso
Personal Residente de obra Profesional Social cuadrilla civil
Actividad Se continua excavacion en muro de contencion, debido alas constantes lluvias es necesario el uso de bomba para extraccion en zonas inundadas, Se realiza encofrado y fundición de muro de contención entre canchas, se inicia excavaciones para viga de cimentacion.

Residente Obra

EDUBAR SA.

Powered by CamScanner

De solicito notificar parado de orden y ose, visita realización de obra y entrega dotación al personal según lo establecido Contrato Almeda.

Sandra Martínez.
SST EDUBANESA.

Powered by CamScanner
