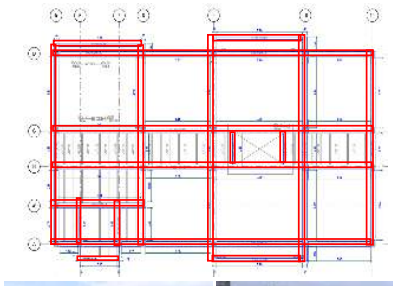



	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código	GA-JELOG-FR-098
		Versión	4
	FORMATO MEMORIAS CORTE DE OBRA	Vigencia	5/10/2023

CONTRATO No.	Contrato de Obra 138-00-A-COFAC-DIFRA-2023		
OBJETO DEL CONTRATO	"OBRA PÚBLICA PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL ALOJAMIENTO DE CADETES EN LA ESCUELA MILITAR DE AVIACIÓN "MARCO FIDEL SUAREZ"		
CONTRATISTA	LAM CONSTRUCCIONES S.A.S		
INTERVENTOR Ó SUPERVISOR	INTERVENTOR: MARIO GIL CARDONA. SUPERVISOR: Teniente YEIMY RIOS		
ÍTEM Nº	4.1.1	UND:	m³
DESCRIPCIÓN ÍTEM	VIGAS AEREAS EN CONCRETO DE 4.000 PSI SEGÚN PLANOS. INCLUYE MANO DE OBRA, FORMALETAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS NECESARIAS, NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO		
CORTE Nº:	5	FECHA :	15/7/2024

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA	UBICACIÓN	DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL	Nº DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
		Ancho	Altura	Longitud			
	**Nivel N+6.30**						
	V_201	0.25	0.45	3.15		1	0.35
	V_202	0.25	0.45	7.70		1	0.87
	V_203	0.40	0.45	25.63		1	4.61
	V_204	0.40	0.45	7.38		1	1.33
	V_205	0.40	0.45	26.43		1	4.76
	V_206	0.40	0.45	26.43		1	4.76
	V_207	0.40	0.45	26.43		1	4.76
	V_208	0.25	0.45	7.38		1	0.83
	V_209	0.25	0.45	7.70		1	0.87
	V_210	0.40	0.45	13.65		1	2.46
	V_211	0.25	0.45	3.55		1	0.40
	V_212	0.25	0.45	3.55		1	0.40
	V_213	0.40	0.45	13.55		1	2.44
	V_214	0.40	0.45	16.56		1	2.98
	V_215	0.40	0.45	16.56		1	2.98
	V_216	0.40	0.45	13.95		1	2.51
	V_217	0.25	0.45	2.55		1	0.29
	V_218	0.25	0.45	2.55		1	0.29
   						**TOTAL ACTA No 5**	**37.89**
						TOTAL PRESENTE ACTA	**37.89**


Elaboró::  Residente de Obra Firma y Posfirma	VoBo:  Residente de Interventoría Firma y Posfirma
Revisó:  Director de Obra	Autorizó:  Director de Interventoría

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código	GA-JELOG-FR-098
	FORMATO MEMORIAS CORTE DE OBRA	Versión	4
		Vigencia	5/10/2023

CONTRATO No.	Contrato de Obra 138-00-A-COFAC-DIFRA-2023
OBJETO DEL CONTRATO	"OBRA PÚBLICA PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL ALOJAMIENTO DE CADETES EN LA ESCUELA MILITAR DE AVIACIÓN “MARCO FIDEL SUAREZ"
CONTRATISTA	LAM CONSTRUCCIONES S.A.S
INTERVENTOR Ó SUPERVISOR	INTERVENTOR: MARIO GIL CARDONA. SUPERVISOR: Teniente LUIS CHAMORRO

ÍTEM Nº	**4.1.1**	UND:	**M³**
DESCRIPCIÓN ÍTEM	**COLUMNA EN CONCRETO DE 4.000 PSI SEGÚN PLANOS. INCLUYE MANO DE OBRA, FORMALETAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS NECESARIAS, NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO**		
CORTE Nº:	5	FECHA :	15/7/2024

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

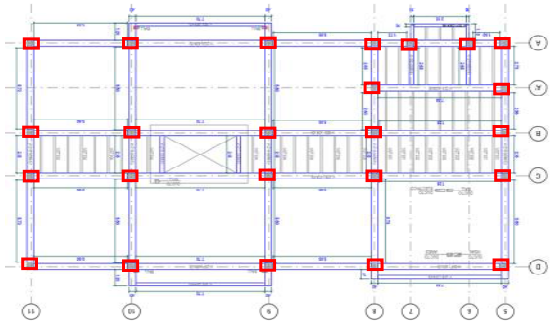



UBICACIÓN	DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL	N° DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
	Ancho	Longitud	Altura			
Columna A5 -P2	0.4	0.5	0.45	0.09	1	0.09
Columna A´5 -P2	0.4	0.5	0.45	0.09	1	0.09
Columna B5 -P2	0.4	0.5	0.45	0.09	1	0.09
Columna C5 -P2	0.4	0.5	0.45	0.09	1	0.09
Columna D5 -P2	0.4	0.5	0.45	0.09	1	0.09
Columna A6 -P2	0.4	0.5	0.45	0.09	1	0.09
Columna A7 -P2	0.4	0.5	0.45	0.09	1	0.09
Columna A8 -P2	0.4	0.5	0.45	0.09	1	0.09
Columna A´8 -P2	0.4	0.5	0.45	0.09	1	0.09
Columna B8 -P2	0.45	0.5	0.45	0.10	1	0.10
Columna C8 -P2	0.45	0.5	0.45	0.10	1	0.10
Columna D8 -P2	0.4	0.5	0.45	0.09	1	0.09
Columna A9 -P2	0.45	0.5	0.45	0.10	1	0.10
Columna B9 -P2	0.45	0.5	0.45	0.10	1	0.10
Columna C9 -P2	0.45	0.5	0.45	0.10	1	0.10
Columna D9 -P2	0.45	0.5	0.45	0.10	1	0.10
Columna A10 - P2	0.45	0.5	0.45	0.10	1	0.10
Columna B10 -P2	0.45	0.5	0.45	0.10	1	0.10
Columna C10 -P2	0.45	0.5	0.45	0.10	1	0.10
Columna D10 -P2	0.45	0.5	0.45	0.10	1	0.10
Columna A11 -P2	0.4	0.5	0.45	0.09	1	0.09
Columna B11 -P2	0.4	0.5	0.45	0.09	1	0.09
Columna C11 -P2	0.4	0.5	0.45	0.09	1	0.09
Columna D11 -P2	0.4	0.5	0.45	0.09	1	0.09
					TOTAL ACTA No 5	**2.17**
					TOTAL PRESENTE ACTA	**2.17**

Elaboró::

Miguel Rios

VoBo:

José Alejandro Collazos Rojas

Revisó:

Arq. Jairo Villamizar
Director de Obra


Autorizó:

Director de Interventoría

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código	GA-JELOG-FR-098
	FORMATO MEMORIAS CORTE DE OBRA	Versión	4
		Vigencia	5/10/2023

CONTI	Contrato de Obra 138-00-A-COFAC-DIFRA-2023
OBJET	"OBRA PÚBLICA PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL ALOJAMIENTO DE CADETES EN LA ESCUELA MILITAR DE AVIACIÓN "MARCO FIDEL
CONTI	LAM CONSTRUCCIONES S.A.S
INTER SOR	INTERVENTOR: MARIO GIL CARDONA. SUPERVISOR: Teniente LUIS CHAMORRO
ITEM Nº	4.2.1 — UND: kg
DESCRIPCIÓN ÍTEM	ACERO DE REFUERZO ESTRUCTURAL FY: 420 MPA GR 60 -NTC 2289 INCLUYE ALAMBRE NEGRO . TRASIEGO, MANEJO
CORTE Nº:	5 — FECHA : 15/7/2024

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

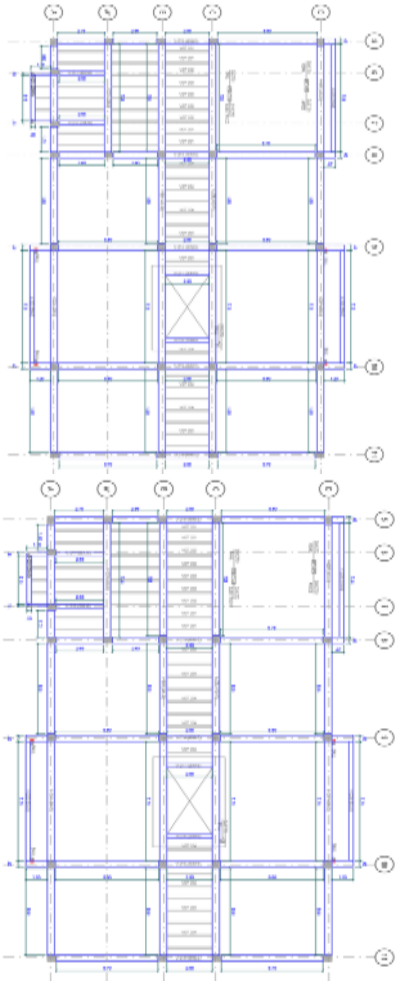













UBICACIÓN	DIMENSIONES Ancho	Longitud	Diametro	PESO ML	Nº DE ELEMENTOS	PESO TOTAL
Columna A5 (40x50cm)						
		1.68	#3	0.56	8	7.53
		0.62	#3	0.56	8	2.78
		0.52	#3	0.56	8	2.33
Columna A´5 (40x50cm)						
		1.68	#3	0.56	8	7.53
		0.62	#3	0.56	8	2.78
		0.52	#3	0.56	8	2.33
Columna B5 (40x50cm)						
		1.68	#3	0.56	8	7.53
		0.62	#3	0.56	8	2.78
		0.52	#3	0.56	8	2.33
Columna C5 (40x50cm)						
		1.68	#3	0.56	8	7.53
		0.62	#3	0.56	8	2.78
		0.52	#3	0.56	8	2.33
Columna D5 (40x50cm)						
		1.68	#3	0.56	8	7.53
		0.62	#3	0.56	8	2.78
		0.52	#3	0.56	8	2.33
Columna A6 (40x50cm)						
		1.68	#3	0.56	8	7.53
		0.62	#3	0.56	8	2.78
		0.52	#3	0.56	8	2.33
Columna A7 (40x50cm)						
		1.68	#3	0.56	8	7.53
		0.62	#3	0.56	8	2.78
		0.52	#3	0.56	8	2.33
Columna A8 (40x50cm)						
		1.68	#3	0.56	8	7.53
		0.62	#3	0.56	8	2.78
		0.52	#3	0.56	8	2.33
Columna A´8 (40x50cm)						
		1.68	#3	0.56	8	7.53
		0.62	#3	0.56	8	2.78
		0.52	#3	0.56	8	2.33
Columna B8 (45x50cm)						
		1.78	#3	0.56	8	7.97
		0.62	#3	0.56	8	2.78
		0.57	#3	0.56	8	2.55
Columna C8 (45x50cm)						
		1.78	#3	0.56	8	7.97
		0.62	#3	0.56	8	2.78
		0.57	#3	0.56	8	2.55
Columna D8 (40x50cm)						
		1.68	#3	0.56	8	7.53
		0.62	#3	0.56	8	2.78
		0.52	#3	0.56	8	2.33
Columna A9 (45x50cm)						
		1.78	#3	0.56	8	7.97
		0.62	#3	0.56	8	2.78
		0.57	#3	0.56	8	2.55
Columna B9 (45x50cm)						
		1.78	#3	0.56	8	7.97
		0.62	#3	0.56	8	2.78
		0.57	#3	0.56	8	2.55
Columna C9 (45x50cm)						
		1.78	#3	0.56	8	7.97
		0.62	#3	0.56	8	2.78
		0.57	#3	0.56	8	2.55
Columna D9 (45x50cm)						
		1.78	#3	0.56	8	7.97
		0.62	#3	0.56	8	2.78
		0.57	#3	0.56	8	2.55
Columna A10 (45x50cm)						
		1.78	#3	0.56	8	7.98
		0.62	#3	0.56	8	2.78
		0.57	#3	0.56	8	2.56
Columna B10 (45x50cm)						
		1.78	#3	0.56	8	7.98
		0.62	#3	0.56	8	2.78
		0.57	#3	0.56	8	2.56
Columna C10 (45x50cm)						
		1.78	#3	0.56	8	7.97
		0.62	#3	0.56	8	2.78
		0.57	#3	0.56	8	2.55
Columna D10 (45x50cm)						
		1.78	#3	0.56	8	7.97
		0.62	#3	0.56	8	2.78
		0.57	#3	0.56	8	2.55
Columna A11 (40x50cm)						
		1.68	#3	0.56	8	7.53
		0.62	#3	0.56	8	2.78
		0.52	#3	0.56	8	2.33
Columna B11 (40x50cm)						
		1.68	#3	0.56	8	7.53
		0.62	#3	0.56	8	2.78
		0.52	#3	0.56	8	2.33
Columna C11 (40x50cm)						
		1.68	#3	0.56	8	7.53
		0.62	#3	0.56	8	2.78
		0.52	#3	0.56	8	2.33
Columna D11 (40x50cm)						
		1.68	#3	0.56	8	7.53
		0.62	#3	0.56	8	2.78
		0.52	#3	0.56	8	2.33
N+6.30						
V_201						
SUPERIOR		4.05	#4	0.994	3	12.08
INFERIOR		4.05	#4	0.994	3	12.08
FLEJES		1.28	#3	0.56	16	11.47
						0
V_202						0
SUPERIOR		8.9	#4	0.994	3	26.54
INFERIOR		8.9	#4	0.994	3	26.54
FLEJES		1.28	#3	0.56	40	28.67
						0
V_203						0
SUPERIOR		10.5	#5	1.552	2	32.59
		10.5	#4	0.994	2	20.87
		7.5	#5	1.552	2	23.28
		7.5	#4	0.994	2	14.91
		9	#5	1.552	2	27.94
		9	#4	0.994	2	17.89
		5	#5	1.552	2	15.52
		5	#4	0.994	2	9.94
INFERIOR		10.5	#5	1.552	2	32.59
		10.5	#4	0.994	2	20.87
		7.5	#5	1.552	2	23.28
		7.5	#4	0.994	2	14.91
		9	#5	1.552	2	27.94

		9	#4	0.994	2	17.89
		5	#5	1.552	2	15.52
		5	#4	0.994	2	9.94
FLEJES		1.58	#3	0.56	205	181.38
GANCHOS		0.58	#3	0.56	353	114.65
						0
V204						0
SUPERIOR		8.6	#5	1.552	2	26.69
		8.7	#6	2.235	2	38.89
INFERIOR		8.6	#5	1.552	4	53.39
FLEJES		1.58	#3	0.56	48	42.47
GANCHOS		0.58	#3	0.56	68	22.09
						0
V205						0
SUPERIOR		6.7	#5	1.552	3	31.2
		7.3	#5	1.552	3	33.99
		9	#5	1.552	3	41.9
		9	#5	1.552	3	41.9
		10	#4	0.994	2	19.88
INFERIOR		6.7	#5	1.552	4	41.59
		7.3	#5	1.552	3	33.99
		9	#5	1.552	3	41.9
		9	#5	1.552	3	41.9
FLEJES		1.58	#3	0.56	190	168.11
GANCHOS		0.58	#3	0.56	283	91.92
						0
V206						0
SUPPERIOR		6.7	#5	1.552	2	20.8
		6.7	#4	0.994	2	13.32
		7.3	#5	1.552	2	22.66
		7.3	#4	0.994	2	14.51
		9	#5	1.552	2	27.94
		9	#4	0.994	2	17.89
		9	#5	1.552	2	27.94
		9	#4	0.994	2	17.89
inferior		6.7	#5	1.552	4	41.59
		7.3	#5	1.552	4	45.32
		9	#5	1.552	4	55.87
		9	#5	1.552	4	55.87
FLEJES		1.58	#3	0.56	190	168.11
GANCHOS		0.58	#3	0.56	303	98.41
						0
V207						0
SUPERIOR		6.7	#5	1.552	2	20.8
		6.7	#4	0.994	2	13.32
		7.3	#5	1.552	2	22.66
		7.3	#4	0.994	2	14.51
		9	#5	1.552	2	27.94
		9	#4	0.994	2	17.89
		9	#5	1.552	2	27.94
		9	#4	0.994	2	17.89
INFERIOR		6.7	#5	1.552	2	20.8
		6.7	#4	0.994	2	13.32
		7.3	#5	1.552	2	22.66
		7.3	#4	0.994	2	14.51
		9	#5	1.552	2	27.94
		9	#4	0.994	2	17.89
		9	#5	1.552	2	27.94
		9	#4	0.994	2	17.89
FLEJES		1.58	#3	0.56	184	162.8
GANCHOS		0.58	#3	0.56	305	99.06
						0
V_208						0
SUPERIOR		8.5	#4	0.994	3	25.35
INFERIOR		8.5	#4	0.994	3	25.35
FLEJES		1.28	#3	0.56	38	27.24
						0
						0
V_209						0
SUPERIOR		8.9	#4	0.994	3	26.54
INFERIOR		8.9	#4	0.994	3	26.54
FLEJES		1.28	#3	0.56	40	28.67
						0
						0
V_210						0
SUPERIOR		12	#5	1.552	2	37.25
		12	#4	0.994	2	23.86
		6.1	#5	1.552	2	18.93
		6.1	#4	0.994	2	12.13
		4	#4	0.994	1	3.98
INFERIOR		12	#5	1.552	2	37.25
		12	#4	0.994	2	23.86
		6.1	#5	1.552	2	18.93
		6.1	#4	0.994	2	12.13
FLEJES		1.58	#3	0.56	119	105.29
GANCHOS		0.58	#3	0.56	214	69.51
						0
V211						0
SUPERIOR		5.4	#5	1.552	2	16.76
		5.3	#4	0.994	1	5.27
INFERIOR		5.3	#4	0.994	3	15.8
FLEJES		1.28	#3	0.56	27	19.35
GANCHOS		0.58	#3	0.56	17	5.52
						0
V212						0
SUPERIOR		5.3	#4	0.994	1	5.27
		5.4	#5	1.552	2	16.76
INFERIOR		5.3	#4	0.994	3	15.8
FLEJES		1.28	#3	0.56	27	19.35
GANCHOS		0.58	#3	0.56	17	5.52
						0
V213						0
SUPERIOR		12	#5	1.552	2	37.25
		12	#4	0.994	2	23.86
		6.1	#5	1.552	2	18.93
		6.1	#4	0.994	2	12.13
		3	#4	0.994	2	5.96
INFERIOR		12	#5	1.552	2	37.25
		12	#4	0.994	2	23.86
		6.1	#5	1.552	2	18.93
		6.1	#4	0.994	2	12.13
FLEJES		1.58	#3	0.56	118	104.41
GANCHOS		0.58	#3	0.56	212	68.86
						0
V214						0
SUPERIOR		6.7	#5	1.552	2	20.8
		6.7	#4	0.994	2	13.32
		7.4	#5	1.552	2	22.97
		7.4	#4	0.994	2	14.71
		6.7	#5	1.552	2	20.8
		6.7	#4	0.994	2	13.32
		4	#4	0.994	2	7.95
		4	#4	0.994	2	7.95
INFERIOR		6.7	#5	1.552	2	20.8
		6.7	#4	0.994	2	13.32
		7.4	#5	1.552	2	22.97
		7.4	#4	0.994	2	14.71
		6.7	#5	1.552	2	20.8
		6.7	#4	0.994	2	13.32
FLEJES		1.58	#3	0.56	131	115.91
GANCHOS		0.58	#3	0.56	224	72.76
						0
V215						0
SUPERIOR		6.7	#5	1.552	2	20.8
		6.7	#4	0.994	2	13.32
		7.4	#5	1.552	2	22.97
		7.4	#4	0.994	2	14.71

			6.7	#5	1.552	2	20.8
			6.7	#4	0.994	2	13.32
			4	#4	0.994	2	7.95
			4	#4	0.994	2	7.95
		INFERIOR	6.7	#5	1.552	2	20.8
			6.7	#4	0.994	2	13.32
			7.4	#5	1.552	2	22.97
			7.4	#4	0.994	2	14.71
			6.7	#5	1.552	2	20.8
			6.7	#4	0.994	2	13.32
		FLEJES	1.58	#3	0.56	130	115.02
		GANCHOS	0.58	#3	0.56	222	72.11
							0
		V216					0
		SUPERIOR	5.5	#5	1.552	2	17.07
			5.5	#4	0.994	2	10.93
			7.4	#5	1.552	2	22.97
			7.4	#4	0.994	2	14.71
			5.5	#5	1.552	2	17.07
			5.5	#4	0.994	2	10.93
			5.5	#5	1.552	2	17.07
			5.5	#4	0.994	2	10.93
			7.4	#5	1.552	2	22.97
			7.4	#4	0.994	2	14.71
			5.5	#5	1.552	2	17.07
			5.5	#4	0.994	2	10.93
		FLEJES	1.58	#3	0.56	110	97.33
		GANCHOS	0.58	#3	0.56	188	61.06
							0
		V_217					0
		SUPERIOR	3.6	#4	0.994	3	10.74
		INFERIOR	3.6	#4	0.994	3	10.74
		FLEJES	1.28	#3	0.56	13	9.32
							0
		V_218					0
		SUPERIOR	3.6	#4	0.994	3	10.74
		INFERIOR	3.6	#4	0.994	3	10.74
		FLEJES	1.28	#3	0.56	13	9.32
							0
							0
		VGTA 201					0
		SUPERIOR	5.3	#5	1.552	4	32.9
			5.35	#5	1.552	4	33.21
		INFERIOR	5.5	#6	2.235	4	49.17
			5.55	#6	2.235	4	49.62
		ESTRIBOS	0.57	#3	0.56	320	102.14
							0
		VGTA 202					0
		SUPERIOR	6.8	#5	1.552	2	21.11
		INFERIOR	6.8	#6	2.235	2	30.4
		ESTRIBOS	0.57	#3	0.56	106	33.84
							0
		VGTA 203					0
		SUPERIOR	6.45	#5	1.552	3	30.03
			5.55	#5	1.552	3	25.84
		INFERIOR	6.65	#6	2.235	3	44.59
			5.55	#6	2.235	3	37.21
		ESTRIBOS	0.57	#3	0.56	267	85.23
							0
		VGTA 204					0
		SUPERIOR	3.7	#5	1.552	16	91.88
		INFERIOR	3.8	#6	2.235	16	135.89
		ESTRIBOS	0.57	#3	0.56	416	132.79
						TOTAL ACTA No 5	**6223.24**
						TOTAL PRESENTE ACTA	**12765.57**

Elaboró::

Residente de Obra
Firma y Posfirma

VoBo:

Residente de Interventoría
Firma y Posfirma
José Alejandro Gallazos Rojas

Revisó:

Director de Obra
Firma y Posfirma

Autorizó:

Director de Interventoría
Firma y Posfirma

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código	GA-JELOG-FR-098
	FORMATO MEMORIAS CORTE DE OBRA	Versión	4
		Vigencia	5/10/2023

CONTRATO No.	Contrato de Obra 138-00-A-COFAC-DIFRA-2023		
OBJETO DEL CONTRATO	"OBRA PÚBLICA PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL ALOJAMIENTO DE CADETES EN LA ESCUELA MILITAR DE AVIACIÓN "MARCO FIDEL		
CONTRATISTA	LAM CONSTRUCCIONES S.A.S		
INTERVENTOR Ó SUPERVISOR	INTERVENTOR: MARIO GIL CARDONA. SUPERVISOR: Teniente LUIS CHAMORRO		
ÍTEM Nº	4.2.2	UND:	kg
DESCRIPCIÓN ÍTEM	MALLA ELECTROSOLDADA FY 485 MPA -NTC 5806, INCLUYE ALAMBRE NEGRO TRASIEGO, MANEJO		
CORTE Nº:	5	FECHA :	15/7/2024

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA	UBICACIÓN	Ancho	Longitud	Peso	PESO ML	Nº DE ELEMENTOS	PESO TOTAL
							
						TOTAL ACTA No 4	1952.53
	PLACA NIVEL +6.30	area					
		140.81		6	2.99	1	421.02
	TRASLAPOS LONGITUDINALES	6	0.3	6	2.99	4	21.53
		3.52	0.3	6	2.99	1	3.16
		2.35	0.3	6	2.99	1	2.11
		8.34	0.3	6	2.99	1	7.48
		8.19	0.3	6	2.99	1	7.35
	TRASLAPOS TRANSVERALES	9.72	0.3	6	2.99	1	8.72
		3.48	0.3	6	2.99	3	9.36
	DESCUENTO COLUMNAS	0.4	0.4	6	2.99	-3	-1.44
		0.4	0.5	6	2.99	-10	-5.98
		0.5	0.45	6	2.99	-3	-2.02
						TOTAL ACTA No 5	471.29
   							
						TOTAL PRESENTE ACTA	1952.53

Elaboró::
Residente de Obra
Firma y Posfirma

VoBo:
Residente de Interventoría
Firma y Posfirma
José Alejandro Collazos Rojas

Revisó:
Director de Obra
Firma y Posfirma


Autorizó:
Director de Interventoría
Firma y Posfirma

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código	GA-JELOG-FR-098
		Versión	4
	FORMATO MEMORIAS CORTE DE OBRA	Vigencia	5/10/2023

CONTRATO No.	Contrato de Obra 138-00-A-COFAC-DIFRA-2023
OBJETO DEL CONTRATO	"OBRA PÚBLICA PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL ALOJAMIENTO DE CADETES EN LA ESCUELA MILITAR DE AVIACIÓN
CONTRATISTA	LAM CONSTRUCCIONES S.A.S
INTERVENTOR Ó SUPERVISOR	INTERVENTOR: MARIO GIL CARDONA. SUPERVISOR: Teniente LUIS CHAMORRO

ÍTEM Nº	NP 01	UND:	M2
DESCRIPCIÓN ÍTEM	MURO EN BLOQUE N°5 PV, liso; e=12 cm, largo= 29 cm, alto 21 cm, INCLUYE, MORTERO RELLENO DE DOVELAS CON SEPARACIÓN ENTRE 1m y 2m, PEGA ANCLAJES Y ACERO DE REFUERZO.		
CORTE Nº:	5	FECHA :	15/7/2024

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

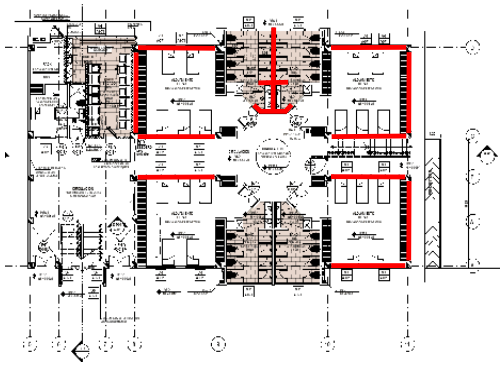









UBICACIÓN	DIMENSIONES Ancho	DIMENSIONES Longitud	DIMENSIONES Altura	MEDIDA PARCIAL	N° DE ELEMENTOS	TOTAL
PRIMER PISO						
Eje 11 A-B		5.7	2.7	15.39	1	15.39
Eje 11 C-D		5.7	2.7	15.39	1	15.39
Eje D 10-11		5.6	2.27	12.712	1	12.71
Buitrón eje D11		0.65	2.27	1.4755	1	1.48
Descuento ventana V1		2.2	1	2.2	-2	-4.4
Eje C 10-11		5.6	2.27	12.712	1	12.71
Eje B 10-11		5.6	2.27	12.712	1	12.71
Descuento ventana V1		2.2	1	2.2	-2	-4.4
Eje A 10-11						
Descuento ventana V1		2.2	1	2.2	-2	-4.4
Eje D 8-9		5.85	2.27	13.2795	1	13.28
Buitrón eje D8		0.75	2.27	1.7025	1	1.7
Descuento ventana V1		2.2	1	2.2	-2	-4.4
Eje C 8-9		5.85	2.27	13.2795	1	13.28
Buitrón eje C8		0.75	2.7	2.025	1	2.03
Descuento ventana V1		2.2	1	2.2	-2	-4.4
Eje B 8-9		5.85	2.27	13.2795	1	13.28
Buitrón eje C8		0.75	2.7	2.025	1	2.03
Descuento ventana V1		2.2	1	2.2	-2	-4.4
Eje 8 C-D		5.75	2.7	15.525	1	15.53
Baño 9-10 C-D						
Divisor principal		4.91	2.45	12.0295	1	12.03
Divisor duchas lavamanos		1.06	2.45	2.597	2	5.19
Tabique de puertas		1.66	2.45	4.067	2	8.13
				TOTAL ACTA No 5		**130.47**
				TOTAL		

Elaboró::
Residente de Obra
Firma y Posfirma

VoBo:
José Alejandro Collazos Rojas
Residente de Interventoría
Firma y Posfirma

Revisó:
Director de Obra
Firma y Posfirma


Autorizó:
Director de Interventoría
Firma y Posfirma

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código	GA-JELOG-FR-098
		Versión	4
	FORMATO MEMORIAS CORTE DE OBRA	Vigencia	5/10/2023

CONTRATO No.	Contrato de Obra 138-00-A-COFAC-DIFRA-2023
OBJETO DEL CONTRATO	"OBRA PÚBLICA PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL ALOJAMIENTO DE CADETES EN LA ESCUELA MILITAR DE AVIACIÓN
CONTRATISTA	LAM CONSTRUCCIONES S.A.S
INTERVENTOR Ó SUPERVISOR	INTERVENTOR: MARIO GIL CARDONA. SUPERVISOR: Teniente LUIS CHAMORRO

ÍTEM Nº	NP-02	UND:	M2
DESCRIPCIÓN ÍTEM	PLACA DE ENTREPISO ALIGERADO EN CONCRETO DE 4.000 PSI E=0.45 M SEGÚN PLANOS. INCLUYE MANO DE OBRA, FORMALETAS, MAQUINARIA, EQUIPO NECESARIO, RIOSTRAS, VIGUETAS, CASETONES DE ICOPOR, LOSETA SUPERIOR, NO INCLUYE REFUERZO		
CORTE Nº:	5	FECHA :	15/7/2024

PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA

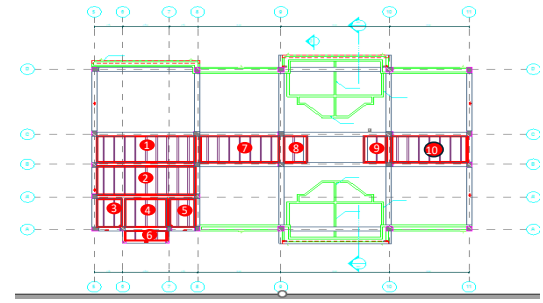









UBICACIÓN	DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL	N° DE ELEMENTOS	TOTAL
	Ancho	Longitud	Altura			
NIVEL +6.30						
5 - 8						
1 -C - B	7.38	2.55	-	18.819	1	18.82
2 - B - A'	7.38	2.75	-	20.295	1	20.30
5 - 6						
3 - A - A'	1.855	2.75	-	5.10125	1	5.10
6 - 7						
4 - A - A'	3.15	2.75		8.6625	1	8.66
5 - A - VOL	1.87	2.75	-	5.1425	1	5.14
7 - 8						
6 - A' - A	3.15	0.9	-	2.835	1	2.84
8 - 9						
7 - C - B	5.95	2.55	-	15.1725	1	15.17
9 - VACIO						
8. 'C - B	1.444	2.55	-	3.6822	1	3.68
VACIO - 10						
9. C - B	1.444	2.55	-	3.6822	1	3.68
10 - 11						
9. C - B	5.703	2.55	-	14.54265	1	14.54
DESCUENTO ESCOTILLA	1	1		1	-1	-1.00
				TOTAL ACTA No 5		**96.93**
				TOTAL PRESENTE ACTA		**96.93**

Elaboró::
Residente de Obra
Firma y Posfirma

VoBo:
José Alejandro Collazos Rojas
Residente de Interventoría
Firma y Posfirma

Revisó:
Director de Obra
Firma y Posfirma

Autorizó:
Director de Interventoría
Firma y Posfirma
