Bitacora.

Contratista

Prag C y G Construcciones S.A.S.

Contrato N°
2409191072

Objeto

Mantenimiento y Adecuacion de las canchas de futbol sinteticas del area urbana del mun. Manizales.

OCT- NOV 2024

(2)

Octubre 21 de 2024

Despues de realizar un inventario de las obras a Ejecutar se Coordina Con el Ing. Juan Jairo Zuluaga y el Ing. Juan Manuel Torres R. las obras a realizar en las Canchas Priorizadas.

1) Cancha Luis Fernando Montoya Auxiliar.
2) Cancha Home center - 3 de Sur.
3) Cancha Enea.
4) Cancha Aranjuez.
5) Cancha Arrayanes.
6) Cancha. Bomberos del 3. Cambio.
7) Cancha Liberia.
8) Cancha Solferino.


Se Evaluo para Traer los Materiales TIPO FIFA Como es la Grama Sintetica y el Caucho.

Ing. Residente
Carlos Andres Lopez Osorio

(3)

Octubre 26 de 2024

El dia de hoy llegan Procedentes de Tocancipa y Facatativa los Materiales para Trabajar en la Mejora de los puntos daniados de las Canchas, se Coordina Con la interventoria de la alcaldia de Manizales las obras prioritarias. Iniciando x la Cancha Auxiliar.

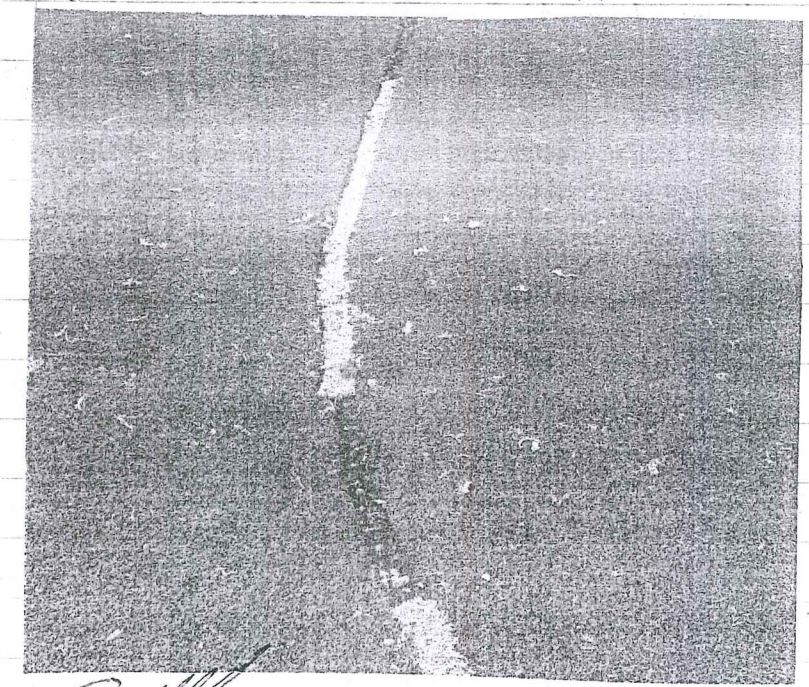


Ing Residente

octubre 28 de 2024

Ya Teniendo los Materiales para los Canchas Como es el Concreto y la grama Sintetica se procede a obras en la Cancha Auxiliar los Fraguado Mientras que se Cura el Cemento, la Grama en unos puntos por detenerse la Etiqueta y por eso se fijara con Cada de estas partes dadas.

Se hace Cruces de Sitas a intervenir

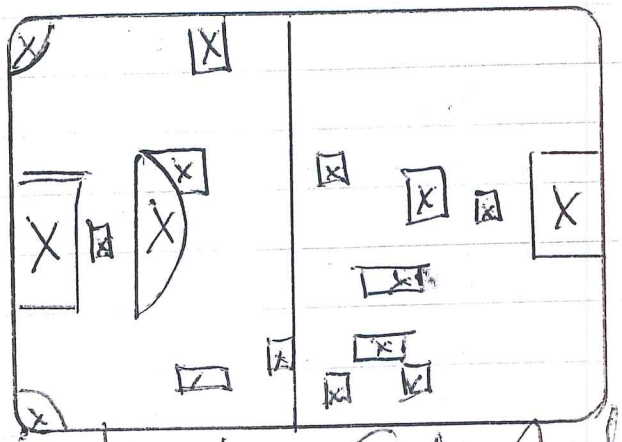


Sitas intervenir en Cancha Auxiliar

octubre 29 de 2024

Se instala Grama en Puntos Precisos y se Cose y se pega con pegante.

Ass Especial para Lona y Sintetica se Aplica Arena y Caucho dependiendo a los Especificaciones de los fabricantes

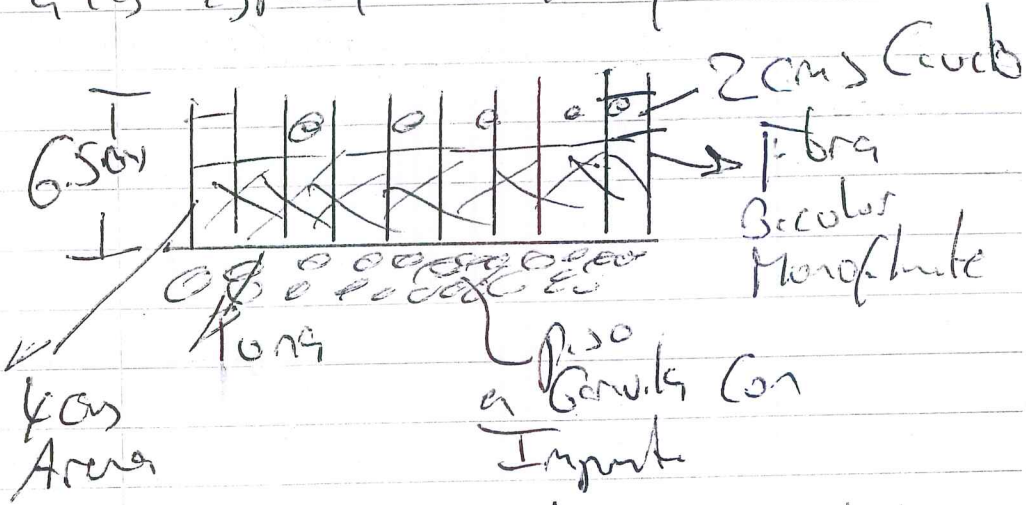


La Grama presupuestada para esta Cancha Auxiliar es de 7400 Mt²
y 4400 Mts de Cancha en Zona de Juego mas Utilizada

Y Resto

Noviembre 01 de 2024

Se trabaja en la Cancha Anexa los FDO Montaje, se instala Grama sintetica la Zona Norte y se Termina de instalar Area y Cuadro en estos Sitios.
Se inicia Trabajo en el lado Sur En la porteria y se pega con Solución Adss

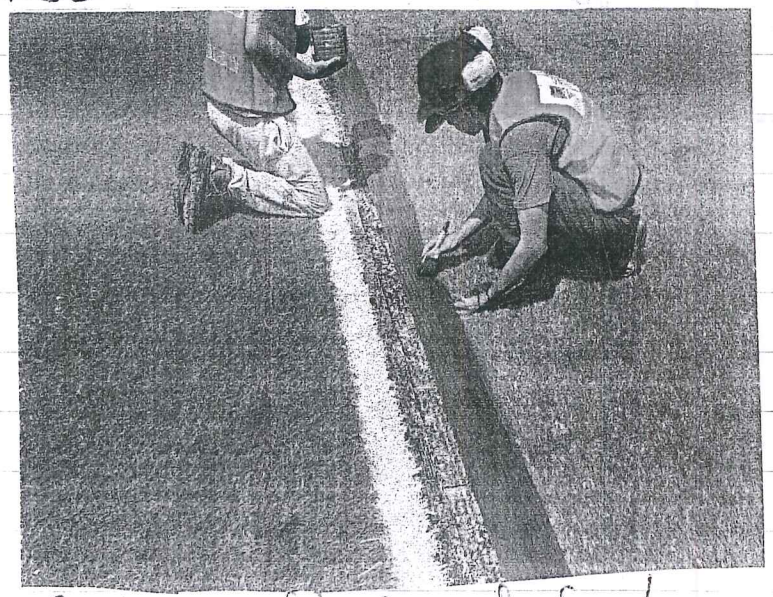

proceso de pegado de la Grama

Noviembre 2 de 2024


Se realiza Cambio de Cinta de demarcación Blanca y se Tira S.t. de rayas Amarillas en este Cancha los Curb son levantados para que se sequen y posteriormente ser pegado. se Sigue instalando Grama y Area en la Cancha y Posteriormente se instala en Cuadro Pegado por este Cancha 4400 kg


Noviembre 4 de 2024
despues de Trabajar instalar la Grama Sintetica, la Area se procede a instalar el Cuadro en distinta Sepa Foto de 110 Sacos de 40 kilos. distribuidos la Cancha y se Cepilla para que entre entre los fibras de la grama

Fin

Noviembre 5 de 2024
Se realiza Trabajo de Charla de Seguridad en el Trabajo y SST
Se Trabaja en pendiente

1 Ingeniero Residente
1 Maestro.
3 Ayudante Hombre
2 Ayudante Mujeres

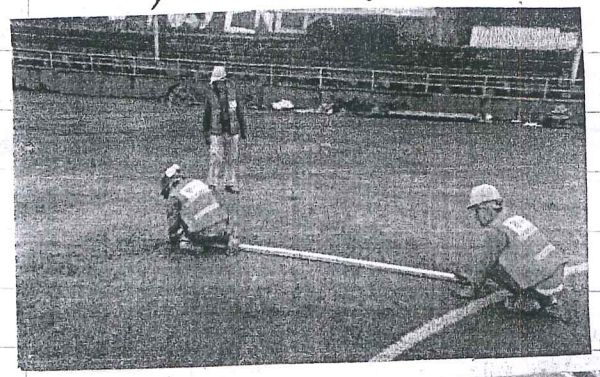

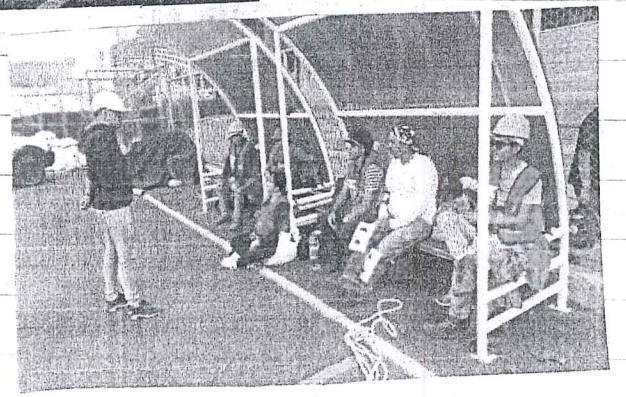

Trabajos y Charlas.

Ayudante

Noviembre 6 de 2024

Se inicia trabajo en la Cancha de la Eneg Con Cant. de grava y se coce Con nylon la Señal Blanca y la grava y se Aplica Arena en S.t.s que presentaba Cepa de esta




Suministro de Arena y Cinco.

Se presentan lluvias fuertes los Cuales perjudican el proceso Constructivo ya que se moja la Cepa Existente y no pega x humedad x eso se pega y Coce Con nylon.
Lluvia de 12 AM. a 4 pm

Ayudante

Nov 7 de 2024

Se Coloca el Conchon a bultos de 40 kg Sepulveda en la Cancha de la Auxiliar fueron 110 sacos. y Se restriben en la Gran por esparcir.

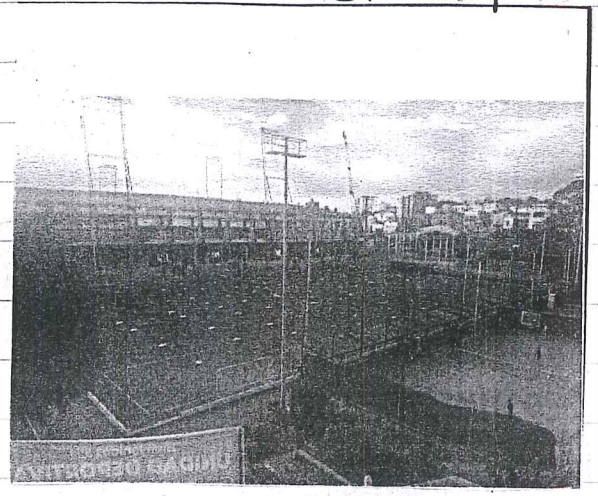

110 sacos




x fabiola


10/21/24

Nov 8 de 2024

Procedimiento de instalación Grama Con uso de lona y pegante A-55 para lograr adherencia de los rollos y se Cose luego Con Nylon.

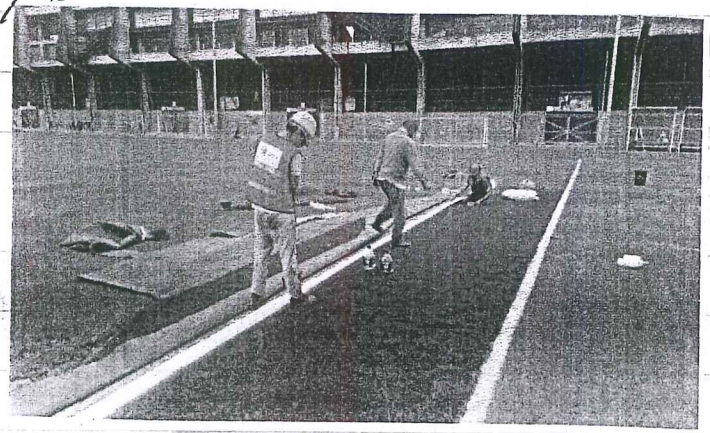


Cancha Auxiliar

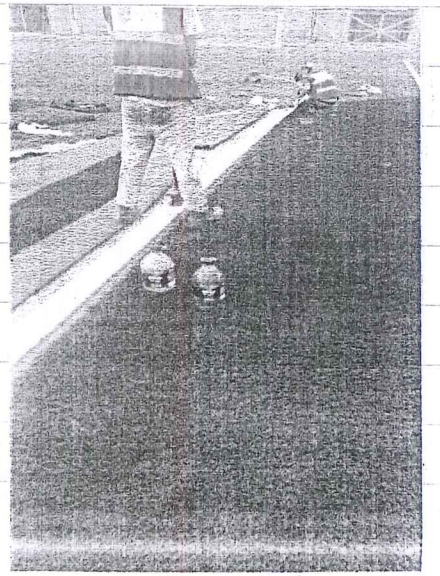

Uso pegante

Jy obra

Noviembre 10 de 2024 (12)

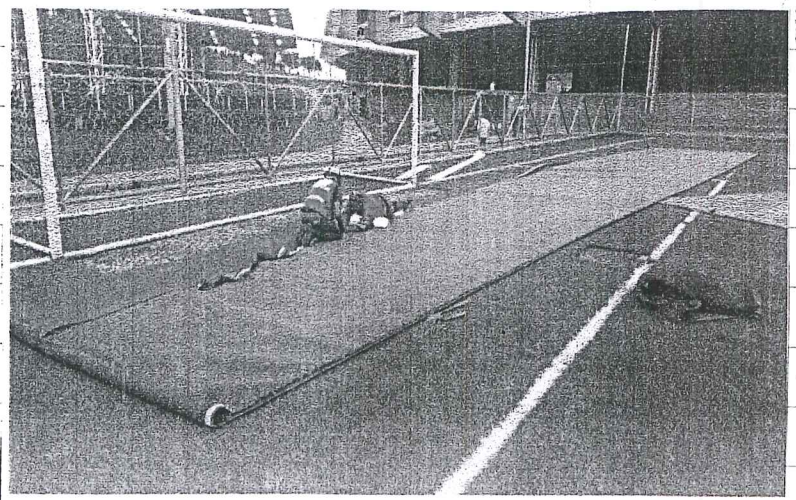

INSTALACION GRAMA SINTETICA

Trabajo en
de Sur de
Cancha
Luxlan Luis
Ramiro Monto
a



COLOCACION CAMA DE ARENA

↑ Pegado

← Arena sobre el Tapete grama Sint.

Noviembre 12 de 2024 (13)

Noviembre 12 de 2024
Se Trabaja en Cancha Home Cerka
a 3ra Sesión con Franjas Blancas
Las Cuales Son Cosidas Con Nylon.
Son 186 ML de Franja, se
Coordina con los Entrenadores para
Trabajo en Torneos.
dos Ilusos se Trabaja Sobre la
Mañana.

Ing Abr.

Noviembre 14 de 2024
Se Trabaja Tarde en la Cancha
de Aranjuez donde es necesario
el Cambio de aproximadamente 330
ML de Franjas, entre Blanca y
Amarilla, se Coordina por No Tener
inconvenientes Con los Torneos q
programan en la Cancha
Luxus Fuerte Todo la Tarde.

Ing Abr.

Noviembre 15 de 2024

Se Termino de Trabajar en la Cancha de la Auxiliar y de Homecenter y se Armo a un 60% en Cancha de Arquero, y se pego y Cocio la Cinta Blanca y se reemplazo Antilla Se instalo Cancha en Cancha de la Exer Con 2000 kilos en Zonas de mas Trabajo.
Dios Ilumosos.

Ing obr.
