	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **LISTA DE CHEQUEO INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

Contrato de Obra No. 3225-2023 **Contratista:** JAC VEREDA BUENOS AIRES

Contrato de Interventoría No. 4498-2023 **Interventoría:** ZAIDA DAYANA ORJUELA DIAZ

Objeto Contrato de Obra:
AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL CORREGIMIENTO BUENOS AIRES DEL MUNICIPIO DE ARBOLETES, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

INFORME MENSUAL No. 5 **MES O PERIODO:** OCTUBRE

No.	CONTENIDO	FORMATO	PÁGINA
	Lista de Chequeo Informe Mensual de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-1	0
	Resumen Mensual Estado General del Proyecto	MEPI-MN1-IN-15-FR-2	2
1	**INTRODUCCIÓN**		5
2	**DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO**		
2.1	Localización		6
2.2	Municipios en la zona de influencia y beneficios de la ejecución del proyecto		7
2.3	Inventario y estado inicial de la vía		8
2.4	Características técnicas del proyecto		9
3	**INFORMACIÓN CONTRATO DE OBRA**		
3.1	Información general del contrato		11
3.2	Descripción de las actividades ejecutadas en el mes		12
3.3	Seguimiento Ítems no previstos		12
3.4	Estado de avance y acciones a seguir por parte de la Interventoría		12
4	**REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE OBRA**		
4.1	Informe Semanal		13
4.2	Maquinaria y Equipo Contrato de Obra		13
4.3	Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Obra		13
4.4	Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Obra		14
4.5	Estado General del Tiempo		14
4.6	Resumen Ensayos de Laboratorio		14
4.7	Seguimiento Garantías y Seguros Contrato de Obra		14
4.8	Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Obra		14
4.9	Otros documentos seguimiento mensual		
	• Seguimiento a la inversión del Anticipo	MEPI-MN-IN-2-FR-1	N/A
		MEPI-MN-IN-2-FR-2	N/A
	• Seguimiento Programa de Obra		15
	• Seguimiento Programa de Inversiones	MEPI-MN-IN-6-FR-1	N/A
		MEPI-MN-IN-6-FR-2	N/A
	• Actas de Comité Operativo de Obra		15
5	**Conclusiones y recomendaciones**		16
6	**Anexos**		
6,1	Relación de la correspondencia generada entre contratista e interventor incluyendo asunto, referencia, fecha de recibo		17
6,2	Registro fotográfico y video del avance de las obras		18
6,3	Copia de la Bitácora del mes correspondiente		29
6,4	Informe Semanal	MEPI-MN1-IN-15-FR-3	58
6,5	Maquinaria y Equipo Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-4	74
6,6	Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-6	76
6,7	Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-8	82
6,8	Estado General del Tiempo	MEPI-MN1-IN-15-FR-10	84
6,9	Resumen Ensayos de Laboratorio	MEPI-MN1-IN-15-FR-11	86
6,10	Seguimiento Garantías y Seguros Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-12	88
6,11	Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Obra	MEPI-MN-1IN-15-FR-14	N/A
6,12	• Actas de Comité Operativo de Obra	MEPI-MN-IN-14-FR-1	94

Nota: El Interventor debe diligenciar los folios, conforme al contenido del informe mensual.

Firma: Firmado digitalmente por HOYOS SIERRA MAURICIO

Nombre: MAURICIO HOYOS SIERRA
SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA
Resolución de designación No. de fecha 27/11/2023

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial

INVIAS
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

SUBDIRECCIÓN VÍAS REGIONALES

DIRECCIÓN TERRITORIAL ANTIOQUIA

INFORME MENSUAL No. 3



CONVENIO SOLIDARIO NÚMERO 3225 DE 2023

MUNICIPIO DE ARBOLETES

PERIODO DEL 1 AL 30 DE OCTUBRE DEL 2024

ZAIDA DAYANA ORJUELA DIAZ

CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

Carrera 9 No 20-64 Of. 03
Teléfonos: 317-6404558
zaidaorjuela@gmail.com
Cartagena de Indias

MEPI-MN-IN-15-FR-2 RESUMEN MENSUAL ESTADO GRAL PROYECTO

Carrera 9 No 20-64 Of. 03
Teléfonos: 317-6404558
zaidaorjuela@gmail.com
Cartagena de Indias

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE **RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO**	CÓDIGO VERSION PÁGINA

FECHA: 1/11/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** ANTIOQUIA **PERIODO MES:** OCTUBRE

CONVENIO No.: 3225-2023

OBJETO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL CORREGIMIENTO BUENOS AIRES DEL MUNICIPIO DE ARBOLETES, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL CORREGIMIENTO BUENOS AIRES

PLAZO INICIAL: HASTA 31 DE DICIEMBRE 2023
FECHA DE INICIO: 21/12/2023
FECHA DE SUSPENSIÓN: 29/08/2024
FECHA DE REANUDACIÓN: 13/09/2024
FECHA DE VENCIMIENTO: 30/10/2024
PLAZO ACUMULADO: 10,46 MESES

VALOR INICIAL : $ 201.628.388,00
VALOR ADICIONALES: $ -
VALOR ACUMULADO: $ 201.628.388,00
DESEMBOLSO CONCEDIDO: $ -
DESEMBOLSO AMORTIZADO: $ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA: 4498-2023 **INTERVENTOR:** ZAIDA DAYANA ORJUELA DIAZ **SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:** ING. MAURICIO HOYOS SIERRA

ALCANCE FÍSICO CONTRATADO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD
Pavimentación	Mejoramiento	ML	120
Estructuras	Alcantarillas	UND	1
	Muro de Contención		
Mantenimiento	Limpieza de alcantarilla		
Otros (Especificar cuales)			

AVANCE FÍSICO EJECUTADO DEL CONVENIO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD MES	CANTIDAD ACUMULADA
Pavimentación	Mejoramiento	ML	92	112
Estructuras	Alcantarillas	UND	0	0
	Muro de Contención			
Mantenimiento	Limpieza de alcantarilla			
Otros (Especificar cuales)				

AVANCE FINANCIERO

VALOR TOTAL CONTRATADO INCLUIDOS LOS ADICIONALES

	VALOR
OBRAS	$ 150.631.082,00
GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL	$ 4.394.742,00
GASTOS ADMINISTRATIVOS	$ 45.602.564,00
APORTES JAC	$ 1.000.000,00
VALOR TOTAL DEL CONVENIO	$ 201.628.388,00

VALOR TOTAL EJECUTADO EN EL MES

	VALOR	ACUMULADO
OBRAS	$ 111.748.949	$ 150.420.723,00
GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL	$ 4.494.327,00	$ 4.494.327,00
GASTOS ADMINISTRATIVOS	$ 29.856.324,00	$ 42.356.324,00
APORTES JAC	$ 1.000.000,00	$ 1.000.000,00
VALOR EJECUTADO	$ 147.099.600,00	$ 198.271.374,00

Estos conceptos deben corresponder a los balances que debe realizar periodicamente la interventoría al presupuesto del convenio

INVERSIÓN EN OBRA

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA (A): $ 201.628.388,00
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): $ 198.271.374,00
AVANCE DE OBRA EN % (B/A): 98,34%

EMPLEOS GENERADOS EN EL MES

MANO DE OBRA CALIFICADA: 1
MANO DE OBRA NO CALIFICADA: 3
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:
TOTAL EMPLEOS GENERADOS: **4**

REGISTRO FOTOGRÁFICO



tramo 1



tramo 1

	
tramo 1	tramo 1
	
tramo 1	tramo 1

PROCEDIMIENTOS DE MULTA O SANCIÓN (Indicar el estado en que se encuentre el proceso administrativo de multa o sanción si aplica)



Firma

Nombre ZAIDA DAYANA ORJUELA DIAZ
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No. 68202-112219 STD

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial

1. INTRODUCCIÓN

El presente informe comprende las actividades realizadas en el periodo del 1 al 30 de octubre de 2024, por la Junta de Acción Comunal ejecutor del Convenio solidario 3225-2023 cuyo objeto es: **"AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL CORREGIMIENTO BUENOS AIRES DEL MUNICIPIO DE ARBOLETES DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL"**, para el mejoramiento de la vía priorizada por la JAC del corregimiento de BUENOS AIRES.

El objetivo principal de este informe, es presentar el avance técnico, administrativo y financiero ejecutado hasta la fecha en desarrollo del Convenio solidario e Interventoría, proyecto que hace parte del programa "Caminos comunitarios de la Paz Total" que busca ejecutar actividades de mantenimiento y mejoramiento en los corredores viales estratégicos de acuerdo a la problemática que se presenta frente al abandono de las vías rurales, las cuales se encuentran en mal estado, intransitables y sin mantenimiento.

Carrera 9 No 20-64 Of. 03
Teléfonos: 317-6404558
zaidaorjuela@gmail.com
Cartagena de Indias

2. DESCRIPCION DEL PROYECTO

2.1 Localización.

El municipio de Arboletes se encuentra localizado en la subregión de Urabá del Departamento de Antioquia, dista 472 kilómetros de la Ciudad capital del departamento. Arboletes, desde hace decenios, ha sido un lugar de turismo por excelencia. Ofrece platos muy variados y autóctonos además de la cocina tradicional paisa: plátano sancochado, arroz con coco, sancocho bien sea de carne, de res o de pescado, entre estos el más tradicional es el famoso "Cabeza de Huevo", y el crustáceo conocido en esta zona como cangrejo. Un plato muy peculiar de la región es la Cabeza de Gato, que consiste en plátano cocido y guisado con tomate, ajo, pimienta y cebolla, acompañado con suero o con queso.

El tramo vial a intervenir se encuentra en el corregimiento de Buenos Aires perteneciente del Municipio de Arboletes en el Departamento de Antioquia, teniendo como punto de referencia las coordenadas inicial y final respectivamente N 14°44.6´ 27.038" O 75°75´ 35.226" N 14° 44.6´ 69.918" O 75° 72´ 49.766" las cuales corresponden al tramo postulado por la JAC para intervenir y que hace parte de la vía terciaria que comunica el corregimiento con el municipio de Arboletes**,** conforme a la información levantada en campo por parte del equipo técnico de la Dirección Territorial Antioquia del INVIAS

Carrera 9 No 20-64 Of. 03
Teléfonos: 317-6404558
zaidaorjuela@gmail.com
Cartagena de Indias



Figura No 1. Ubicación General - Fuente Google Maps



Figura No 2. Ubicación – Fuente Google Maps

2.2 Municipios de la zona de influencia y beneficios de la ejecución del proyecto.

Con el proyecto se pretende beneficiar la vereda Buenos Aires y el municipio de Arboletes, la ejecución traerá los siguientes beneficios al corregimiento:

Carrera 9 No 20-64 Of. 03
Teléfonos: 317-6404558
zaidaorjuela@gmail.com
Cartagena de Indias

- ✓ Mejorar la competitividad y transitabilidad de los corredores productivos.
- ✓ Mayor integración y comunicación entre las localidades del ámbito de influencia.
- ✓ Brindar alternativas estables de ingresos, empleo y valorización patrimonial a las familias y comunidades campesinas del área de influencia del proyecto.
- ✓ Disminución de costos del producción, transporte y comercialización agrícola.
- ✓ Oportuno acceso a los servicio médicos y educativos.
- ✓ Mayor flujo de bienes y servicios que reduzcan la brecha entre la ciudad y el campo y dignificar a los habitantes de las zonas rurales.
- ✓ Fortalecer la acción comunal y general organización en el campo colombiano.

2.3 Inventario y estado inicial de la vía.

La vía actualmente se encuentra en afirmado en mal estado y con pocas obras de drenaje y subdrenaje que garantice su adecuada operatividad en todas las épocas del año. La importancia de esta vía es su comunicación con el municipio de Arboletes, logrando así mejorar la superficie de rodadura para beneficiar la mejor operación de vehículos para movilizar los productos agrícolas que esta importante zona genera.

Por lo tanto, es básico y necesario disponer de una estructura de pavimento que facilite el acceso al corregimiento y centros poblados.

Carrera 9 No 20-64 Of. 03
Teléfonos: 317-6404558
zaidaorjuela@gmail.com
Cartagena de Indias



Figura No 3: Estado inicial de la vía.



Figura No 4. Estado inicial de la Vía.

2.4 Características técnicas del proyecto.

El alcance de proyecto consiste en realizar la revisión e implementación del contenido de la cartilla de obras menores de drenaje y estructuras viales del

Carrera 9 No 20-64 Of. 03
Teléfonos: 317-6404558
zaidaorjuela@gmail.com
Cartagena de Indias

Instituto Nacional de Vías, mejoramiento con la construcción de obras de drenaje y/o placa huella y/o construcción de obras de contención de baja complejidad en los sectores priorizados.

El OAC deberá gestionar y tramitar los aspectos prediales, sociales y ambientales que apliquen y que den cumplimiento a la normatividad vigente.

Las obras que se van a ejecutar deben cumplir las Normas de Ensayo de Materiales para Carreteras y Especificaciones Generales de Construcción para Carreteras del Instituto Nacional de Vías - Versión 2022, o la normatividad que se encuentre vigente.

Que dentro de las funciones del INVIAS se encuentra la de brindar una infraestructura vial que satisfaga requerimientos mínimos de seguridad, comodidad y transitabilidad para los usuarios de las vías, contribuyendo así, al desarrollo sostenible y a la integración del país a través de una red vial eficiente, cómoda y segura; por lo tanto, con la ejecución de este proyecto, el Instituto busca el cumplimiento de uno de los fines constitucionales del estado, como es el de darle continuidad al servicio de transporte terrestre y apoyar al desarrollo de la política de intermodalidad del transporte para de esta manera apoyar y contribuir con el Desarrollo Económico de la región.

Carrera 9 No 20-64 Of. 03
Teléfonos: 317-6404558
zaidaorjuela@gmail.com
Cartagena de Indias

3. INFORMACION DEL CONVENIO SOLIDARIO.

3.1 INFORMACION GENERAL DEL CONVENIO

CONVENIO No.	3225 DE 2023
PARTES	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS (INVIAS)
	JUNTA DE ACCION COMUNAL CORREGIMIENTO BUENOS AIRES
OBJETO DEL CONVENIO	**"AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL CORREGIMIENTO BUENOS AIRES DEL MUNICIPIO DE ARBOLETES DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL"**
VALOR INICIAL DEL CONVENIO	$ 201.628.388,00
APORTE INVIAS	$ 200.628.388,00
APORTE JAC	$ 1.000.000,00
ORDEN DE INICIO	21 DE DICEIMBRE DE 2023
PLAZO INICIAL DE EJECUCCIÓN HASTA	31 DE DICIEMBRE 2023
PRORROGA N°1	DESDE 31/12/2023 HASTA EL 30/04/ 2024
PRORROGA N°2	DESDE 30/04/2024 HASTA EL 30/06/2024
ACTA DE SUSPENSION No 1	DESDE 12/06/2024 HASTA 02/07/2024
ACTA DE SUSPENSION No 2	DESDE 11/07/2024 HASTA 25/07/2024
PRORROGA N°3	DESDE 30/07/2024 HASTA EL 31/08/2024
ACTA DE SUSPENSION No 3	DESDE 29/08/2024 HASTA 12/09/2024

Carrera 9 No 20-64 Of. 03
Teléfonos: 317-6404558
zaidaorjuela@gmail.com
Cartagena de Indias

PRORROGA N°4	DESDE 14/09/2024 HASTA EL 30/10/2024

3.2 Descripción de las actividades presentadas en el mes:

- Se continúan con actividades de obra.
- Se continua con excavación para vigas riostras.
- Se continúa con figurado y amarre de acero para vigas, cunetas y bordillos.
- Se continua con concreto para huellas y ciclópeo para contrahuella y sobreancho.

3.3 Seguimiento de ítems no previstos:

Por el momento se presentan ítems no previsto para el contrato de obra debido a la modificación de las actividades del convenio.

3.4 Estado de avance y acciones a seguir por parte de la interventoría.

Durante el periodo transcurrido de este informe, se inician con las actividades de obra

A la fecha se han iniciado con las actividades de obra, las actividades a la fecha de cierre de este informe se tiene un avance de obra programado de 100% y un avance ejecutado de 98.34% se tendría atraso de obra hasta la fecha de cierre de este informe de 1.66%, teniendo en cuenta que a cierre de este informe no se ejecuta el 100% debido a que los recursos faltantes son salarios de los administrativos para la parte de liquidación del convenio por ende se reporta una ejecución de 98.34%.

Carrera 9 No 20-64 Of. 03
Teléfonos: 317-6404558
zaidaorjuela@gmail.com
Cartagena de Indias

4. REPORTES DE EJECUCION MENSUAL DEL CONTRATO DE OBRA

4.1 Informes semanales

A continuación, presentamos la relación de informes semanales presentados hasta el corte del presente informe, los cuales se adjuntan en el Anexo 6.4. Informes semanales.

	# SEMANAL	FECHAS SEMANAL
SEMANA	1	27/09/24 AL 4/10/24
SEMANA	2	4/10/24 AL 10/10/24
SEMANA	3	11/10/24 AL 17/10/24
SEMANA	4	18/10/24 AL 24/10/24
SEMANA	5	25/10/24 AL 30/10/24

Tabla 1: Reporte informes semanales

4.2 Maquinaria y equipo

La información relacionada con maquinaria y equipo de contrato de obra se adjunta ver Anexo 6.5 Maquinaria y equipo contrato de obra.

4.3 Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Obra

La información relacionada con el personal contratado de obra se relaciona y adjunta en el anexo 6.6 personal, control aportes legales y seguridad social contrato de obra.

Carrera 9 No 20-64 Of. 03
Teléfonos: 317-6404558
zaidaorjuela@gmail.com
Cartagena de Indias

4.4 Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Obra

La información financiera y presupuestal del contrato de obra se presenta a la fecha de cierre de este informe y se ve relacionada en el formato del anexo 6.7 informe financiero de obra.

4.5 Estado General del Tiempo

La información del estado general del tiempo se adjunta en el anexo 6.8 Estado general del tiempo.

4.6 Resumen Ensayos de Laboratorio

La información referente a ensayos de laboratorio ver anexo 6.9 Resumen de ensayos de laboratorio.

4.7 Seguimiento Garantías y Seguros Contrato de Obra

La información sobre las garantías y seguros del contrato de obra se adjunta en el anexo 6.10. Seguimiento garantías y seguros contrato de obra.

4.8 Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Obra. NO APLICA

La JAC no cuenta con personal aprobado para esa función.

Carrera 9 No 20-64 Of. 03
Teléfonos: 317-6404558
zaidaorjuela@gmail.com
Cartagena de Indias

4.9 Otros documentos seguimiento mensual

Seguimiento a la inversión del anticipo: NO APLICA

El contrato de obra no presenta anticipo.

Seguimiento al programa de inversiones:

Se adjunta el seguimiento del programa de inversiones entregado por el contratista al corte de este informe ver anexo 6.11 Seguimiento programa de inversiones

Actas de comité operativo de obra:

En el periodo del presente informe se realizaron actas de comité operativo obra ver anexo 6.12 Actas de comité operativo de obra.

Actas de reunión de obra:

En el periodo del presente informe no se realizan actas de reunión de obra ver anexo 6.13 actas de reunión de obra.

Informe matriz de riesgo:

N/A

Carrera 9 No 20-64 Of. 03
Teléfonos: 317-6404558
zaidaorjuela@gmail.com
Cartagena de Indias

5. CONCLUCIONES Y RECOMENDACIONES

- Se culmina con actividades de obra.
- Se realiza recorrido final de obra para revisión en compañía de la JAC e interventoría.
- Se realiza aseo general en todo el tramo de obra.
- Se recibe a satisfacción por parte de la comunidad y la JAC la obra.

Carrera 9 No 20-64 Of. 03
Teléfonos: 317-6404558
zaidaorjuela@gmail.com
Cartagena de Indias

6. ANEXOS

6.1 Relación de correspondencia

Se adjunta relación de correspondencia entre el contratista e interventor Relación de correspondencia al mes culminado.

Carrera 9 No 20-64 Of. 03
Teléfonos: 317-6404558
zaidaorjuela@gmail.com
Cartagena de Indias

6.2 Registro fotográfico

Se adjunta registro fotográfico del avance del contrato de obra.

Carrera 9 No 20-64 Of. 03
Teléfonos: 317-6404558
zaidaorjuela@gmail.com
Cartagena de Indias

CONTRATO No. 4498 DE 2023
"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS RURALES EN LOS MUNICIPIOS DE ARBOLETES Y SAN JUAN DE URABÁ, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA DEL PROGRAMA "CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL"

REGISTRO FOTOGRÁFICO

CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 4498 DE 2023





Fotos 1 – 2. Concreto para huellas





Fotos 3 – 4. Concreto contrahuellas





Fotos 5 – 6. Concreto contrahuellas

CONTRATO No. 4498 DE 2023
"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS RURALES EN LOS MUNICIPIOS DE ARBOLETES Y SAN JUAN DE URABÁ, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA DEL PROGRAMA "CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL"





Fotos 7 – 8. . Construcción de cuneta

CONTRATO No. 4498 DE 2023
"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS RURALES EN LOS MUNICIPIOS DE ARBOLETES Y SAN JUAN DE URABÁ, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA DEL PROGRAMA "CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL"





Fotos 9 – 10. construcción cuneta





Fotos 11 – 12. concreto cunetas





Fotos 13 – 14 . Construcción bordillo





Fotos 15 – 16. tramo final placa huella





Fotos 17 – 18. Tramo final

6.3 Copia de bitácora del contrato de obra

Se adjunta bitácora del contrato de obra correspondiente al presente mes.

Carrera 9 No 20-64 Of. 03
Teléfonos: 317-6404558
zaidaorjuela@gmail.com
Cartagena de Indias

BITACORA DE OBRA

FECHA: 1 (DIA) 10 (MES) 2024 (AÑO)

TRAMO Y/O SECTOR: **CORREGIMIENTO BUENOS AIRES**

DEPARTAMENTO: **ANTIOQUIA**

CONTRATO DE INTERVENORIA No. : **4498-2023**

NOMBRE DE LA VIA: **CORREGIMIENTO BUENOS AIRES**

INTERVENTORIA: **ZAIDA DAYANA ORJUELA DIAZ**

CONTRATO DE OBRA No. 3225-2023

SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORIA: **MAURICIO HOYOS SIERRA**

OBJETO CONTRATO DE OBRA: **AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL CORREGIMIENTO BUENOS AIRES DEL MUNICIPIO DE ARBOLETES, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL**

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL CORREGIMIENTO BUENOS AIRES

VALOR CONTRATO OBRA: **$ 201.628.388,00**

ACTIVIDADES DE ESTABILIZACION DE LADERAS

ACTIVIDAD	UBICACIÓN

2. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA VIA

ACTIVIDAD	UBICACIÓN
Se procedió a enrrielar y cereo para nivelación del terreno	

3. OTRAS ACTIVIDADES

ACTIVIDAD	UBICACIÓN

4. ANOTACIONES

5. CANTIDADES DE OBRA APROXIMADAS

Descripcion	Unid.	Cant.

6. INFORME DE PERSONAL

Personal	Cant.
Director de obra	0
Ing. Residente de obra	1
Ing. Auxiliar de obra	0
Inspector de obra	0
Topografo	1
Aux. de Topografia	0
Laboratorista	0
Maestro de obra	1
Oficiales	1
Ayudantes	1
Auxiliar de Trafico	0
Conductores	0
Operadores de Equipos	0

7. INFORME DE EQUIPO

Equipo	Cant.
Retroexcavadora de oruga	0
Retroexcavadora de Llantas	0
Motoniveladora	0
Vibrocampactador	0
Mezcladora	0
Carrotanque	0
Volqueta (Dobletroque)	0
Volqueta (Sencilla)	0
Rana	1
texturizador y flota	1
Tronzadora	1
Rieles para placa huella	40
Planta electrica	1
Mezcladora	1

8. CONDICION CLIMATICA

Desde	Hasta	Lluvia	Seco
0:00	0:00		

Residente de obra	Residente de Interventoria
Nombre. SEBASTIAN RUIZ MESTRA	Nombre. CRISTIAN ANDRES COGOLLO PORRAS
Firma Sebastian Ruiz M	Firma

BITACORA DE OBRA

FECHA:	2	10	2024
	DIA	MES	AÑO

TRAMO Y/O SECTOR **CORREGIMIENTO BUENOS AIRES**

DEPARTAMENTO: **ANTIOQUIA**

CONTRATO DE INTERVENORIA No. : **4498-2023**

NOMBRE DE LA VIA: **CORREGIMIENTO BUENOS AIRES**

INTERVENTORIA: **ZAIDA DAYANA ORJUELA DIAZ**

CONTRATO DE OBRA No. 3225-2023

SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORIA: **MAURICIO HOYOS SIERRA**

OBJETO CONTRATO DE OBRA: **AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL CORREGIMIENTO BUENOS AIRES DEL MUNICIPIO DE ARBOLETES, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL**

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL CORREGIMIENTO BUENOS AIRES

VALOR CONTRATO OBRA: **$ 201.628.388,00**

ACTIVIDADES DE ESTABILIZACION DE LADERAS

ACTIVIDAD	UBICACIÓN

2. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA VIA

ACTIVIDAD	UBICACIÓN
Fundición losas de concreto para las losas tipo huellas.	

3. OTRAS ACTIVIDADES

ACTIVIDAD	UBICACIÓN

4. ANOTACIONES

5. CANTIDADES DE OBRA APROXIMADAS

Descripcion	Unid.	Cant.
Huellas carril derecho	5	**15m**
Huellas carril izquierdo	5	**15m**

6. INFORME DE PERSONAL

Personal	Cant.
Director de obra	0
Ing. Residente de obra	1
Ing. Auxiliar de obra	0
Inspector de obra	0
Topografo	1
Aux. de Topografia	0
Laboratorista	0
Maestro de obra	1
Oficiales	1
Ayudantes	1
Auxiliar de Trafico	0
Conductores	0
Operadores de Equipos	0

7. INFORME DE EQUIPO

Equipo	Cant.
Retroexcavadora de oruga	0
Retroexcavadora de Llantas	0
Motoniveladora	0
Vibrocampactador	0
Mezcladora	0
Carrotanque	0
Volqueta (Dobletroque)	0
Volqueta (Sencilla)	0
Rana	1
texturizador y flota	1
Tronzadora	1
Rieles para placa huella	40
Planta electrica	1
Mezcladora	1

8. CONDICION CLIMATICA

Desde	Hasta	Lluvia	Seco
0:00	0:00		

Residente de obra	Residente de Interventoria
Nombre. SEBASTIAN RUIZ MESTRA	Nombre. CRISTIAN ANDRES COGOLLO PORRAS
Firma Sebastian Ruiz M	Firma

Hoja 1 de 1

BITACORA DE OBRA

FECHA:	3	10	2024
	DIA	MES	AÑO

TRAMO Y/O SECTOR **CORREGIMIENTO BUENOS AIRES**

DEPARTAMENTO: **ANTIOQUIA**

CONTRATO DE INTERVENORIA No. : **4498-2023**

NOMBRE DE LA VIA: **CORREGIMIENTO BUENOS AIRES**

INTERVENTORIA: **ZAIDA DAYANA ORJUELA DIAZ**

CONTRATO DE OBRA No. 3225-2023

SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORIA: **MAURICIO HOYOS SIERRA**

OBJETO CONTRATO DE OBRA: **AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL CORREGIMIENTO BUENOS AIRES DEL MUNICIPIO DE ARBOLETES, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL**

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL CORREGIMIENTO BUENOS AIRES

VALOR CONTRATO OBRA: **$ 201.628.388,00**

ACTIVIDADES DE ESTABILIZACION DE LADERAS

ACTIVIDAD	UBICACIÓN

2. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA VIA

ACTIVIDAD	UBICACIÓN
Se presentarón lluvias todo el día lo cual imposibilitó las labores	

3. OTRAS ACTIVIDADES

ACTIVIDAD	UBICACIÓN

4. ANOTACIONES

5. CANTIDADES DE OBRA APROXIMADAS

Descripcion	Unid.	Cant.

6. INFORME DE PERSONAL

Personal	Cant.
Director de obra	0
Ing. Residente de obra	1
Ing. Auxiliar de obra	0
Inspector de obra	0
Topografo	1
Aux. de Topografia	0
Laboratorista	0
Maestro de obra	1
Oficiales	1
Ayudantes	1
Auxiliar de Trafico	0
Conductores	0
Operadores de Equipos	0

7. INFORME DE EQUIPO

Equipo	Cant.
Retroexcavadora de oruga	0
Retroexcavadora de Llantas	0
Motoniveladora	0
Vibrocampactador	0
Mezcladora	0
Carrotanque	0
Volqueta (Dobletroque)	0
Volqueta (Sencilla)	0
Rana	1
texturizador y flota	1
Tronzadora	1
Rieles para placa huella	40
Planta electrica	1
Mezcladora	1

8. CONDICION CLIMATICA

Desde	Hasta	Lluvia	Seco
0:00	0:00		

Residente de obra	Residente de Interventoria
Nombre. SEBASTIAN RUIZ MESTRA	Nombre. CRISTIAN ANDRES COGOLLO PORRAS
Firma Sebastian Ruiz M	Firma

Hoja 1 de 1

BITACORA DE OBRA

FECHA:	4	10	2024
	DIA	MES	AÑO

TRAMO Y/O SECTOR **CORREGIMIENTO BUENOS AIRES**

DEPARTAMENTO: **ANTIOQUIA**

CONTRATO DE INTERVENORIA No. : **4498-2023**

NOMBRE DE LA VIA: **CORREGIMIENTO BUENOS AIRES**

INTERVENTORIA: **ZAIDA DAYANA ORJUELA DIAZ**

CONTRATO DE OBRA No. 3225-2023

SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORIA: **MAURICIO HOYOS SIERRA**

OBJETO CONTRATO DE OBRA: **AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL CORREGIMIENTO BUENOS AIRES DEL MUNICIPIO DE ARBOLETES, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL**

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL CORREGIMIENTO BUENOS AIRES

VALOR CONTRATO OBRA: **$ 201.628.388,00**

ACTIVIDADES DE ESTABILIZACION DE LADERAS

ACTIVIDAD	UBICACIÓN

2. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA VIA

ACTIVIDAD	UBICACIÓN
Fundición losas de concreto para las losas tipo huellas.	

3. OTRAS ACTIVIDADES

ACTIVIDAD	UBICACIÓN

4. ANOTACIONES

5. CANTIDADES DE OBRA APROXIMADAS

Descripcion	Unid.	Cant.
Huellas carril derecho	4	**12m**
Huellas carril izquierdo	4	**12m**

6. INFORME DE PERSONAL

Personal	Cant.
Director de obra	0
Ing. Residente de obra	1
Ing. Auxiliar de obra	0
Inspector de obra	0
Topografo	1
Aux. de Topografia	0
Laboratorista	0
Maestro de obra	1
Oficiales	1
Ayudantes	1
Auxiliar de Trafico	0
Conductores	0
Operadores de Equipos	0

7. INFORME DE EQUIPO

Equipo	Cant.
Retroexcavadora de oruga	0
Retroexcavadora de Llantas	0
Motoniveladora	0
Vibrocampactador	0
Mezcladora	0
Carrotanque	0
Volqueta (Dobletroque)	0
Volqueta (Sencilla)	0
Rana	1
texturizador y flota	1
Tronzadora	1
Rieles para placa huella	40
Planta electrica	1
Mezcladora	1

8. CONDICION CLIMATICA

Desde	Hasta	Lluvia	Seco
0:00	0:00		

Residente de obra	Residente de Interventoria
Nombre. SEBASTIAN RUIZ MESTRA	Nombre. CRISTIAN ANDRES COGOLLO PORRAS
Firma Sebastian Ruiz M	Firma

Hoja 1 de 1

BITACORA DE OBRA

FECHA:	5	10	2024
	DIA	MES	AÑO

TRAMO Y/O SECTOR **CORREGIMIENTO BUENOS AIRES**

DEPARTAMENTO: **ANTIOQUIA**

CONTRATO DE INTERVENORIA No. : **4498-2023**

NOMBRE DE LA VIA: **CORREGIMIENTO BUENOS AIRES**

INTERVENTORIA: **ZAIDA DAYANA ORJUELA DIAZ**

CONTRATO DE OBRA No. 3225-2023

SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORIA: **MAURICIO HOYOS SIERRA**

OBJETO CONTRATO DE OBRA: **AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL CORREGIMIENTO BUENOS AIRES DEL MUNICIPIO DE ARBOLETES, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL**

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL CORREGIMIENTO BUENOS AIRES

VALOR CONTRATO OBRA: **$ 201.628.388,00**

ACTIVIDADES DE ESTABILIZACION DE LADERAS

ACTIVIDAD	UBICACIÓN

2. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA VIA

ACTIVIDAD	UBICACIÓN
Se procedió a enrrielar y cereo para nivelación del terreno	

3. OTRAS ACTIVIDADES

ACTIVIDAD	UBICACIÓN

4. ANOTACIONES

5. CANTIDADES DE OBRA APROXIMADAS

Descripcion	Unid.	Cant.

6. INFORME DE PERSONAL

Personal	Cant.
Director de obra	0
Ing. Residente de obra	1
Ing. Auxiliar de obra	0
Inspector de obra	0
Topografo	1
Aux. de Topografia	0
Laboratorista	0
Maestro de obra	1
Oficiales	1
Ayudantes	1
Auxiliar de Trafico	0
Conductores	0
Operadores de Equipos	0

7. INFORME DE EQUIPO

Equipo	Cant.
Retroexcavadora de oruga	0
Retroexcavadora de Llantas	0
Motoniveladora	0
Vibrocampactador	0
Mezcladora	0
Carrotanque	0
Volqueta (Dobletroque)	0
Volqueta (Sencilla)	0
Rana	1
texturizador y flota	1
Tronzadora	1
Rieles para placa huella	40
Planta electrica	1
Mezcladora	1

8. CONDICION CLIMATICA

Desde	Hasta	Lluvia	Seco
0:00	0:00		

Residente de obra	Residente de Interventoria
Nombre. SEBASTIAN RUIZ MESTRA	Nombre. CRISTIAN ANDRES COGOLLO PORRAS
Firma Sebastian Ruiz M	Firma

BITACORA DE OBRA

FECHA:	6	10	2024
	DIA	MES	AÑO

TRAMO Y/O SECTOR **CORREGIMIENTO BUENOS AIRES**

DEPARTAMENTO: **ANTIOQUIA**

CONTRATO DE INTERVENORIA No. : **4498-2023**

NOMBRE DE LA VIA: **CORREGIMIENTO BUENOS AIRES**

INTERVENTORIA: **ZAIDA DAYANA ORJUELA DIAZ**

CONTRATO DE OBRA No. 3225-2023

SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORIA: **MAURICIO HOYOS SIERRA**

OBJETO CONTRATO DE OBRA: **AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL CORREGIMIENTO BUENOS AIRES DEL MUNICIPIO DE ARBOLETES, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL**

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL CORREGIMIENTO BUENOS AIRES

VALOR CONTRATO OBRA: **$ 201.628.388,00**

ACTIVIDADES DE ESTABILIZACION DE LADERAS

ACTIVIDAD	UBICACIÓN

2. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA VIA

ACTIVIDAD	UBICACIÓN
DOMINGO DIA NO LABORAL	

3. OTRAS ACTIVIDADES

ACTIVIDAD	UBICACIÓN

4. ANOTACIONES

5. CANTIDADES DE OBRA APROXIMADAS

Descripcion	Unid.	Cant.

6. INFORME DE PERSONAL

Personal	Cant.
Director de obra	0
Ing. Residente de obra	1
Ing. Auxiliar de obra	0
Inspector de obra	0
Topografo	1
Aux. de Topografia	0
Laboratorista	0
Maestro de obra	1
Oficiales	1
Ayudantes	1
Auxiliar de Trafico	0
Conductores	0
Operadores de Equipos	0

7. INFORME DE EQUIPO

Equipo	Cant.
Retroexcavadora de oruga	0
Retroexcavadora de Llantas	0
Motoniveladora	0
Vibrocampactador	0
Mezcladora	0
Carrotanque	0
Volqueta (Dobletroque)	0
Volqueta (Sencilla)	0
Rana	1
texturizador y flota	1
Tronzadora	1
Rieles para placa huella	40
Planta electrica	1
Mezcladora	1

8. CONDICION CLIMATICA

Desde	Hasta	Lluvia	Seco
0:00	0:00		

Residente de obra	Residente de Interventoria
Nombre. SEBASTIAN RUIZ MESTRA	Nombre. CRISTIAN ANDRES COGOLLO PORRAS
Firma Sebastian Ruiz M	Firma

Hoja 1 de 1

BITACORA DE OBRA

FECHA:	7	10	2024
	DIA	MES	AÑO

TRAMO Y/O SECTOR **CORREGIMIENTO BUENOS AIRES**

DEPARTAMENTO: **ANTIOQUIA**

CONTRATO DE INTERVENORIA No. : **4498-2023**

NOMBRE DE LA VIA: **CORREGIMIENTO BUENOS AIRES**

INTERVENTORIA: **ZAIDA DAYANA ORJUELA DIAZ**

CONTRATO DE OBRA No. 3225-2023

SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORIA: **MAURICIO HOYOS SIERRA**

OBJETO CONTRATO DE OBRA: **AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL CORREGIMIENTO BUENOS AIRES DEL MUNICIPIO DE ARBOLETES, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL**

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL CORREGIMIENTO BUENOS AIRES

VALOR CONTRATO OBRA: **$ 201.628.388,00**

ACTIVIDADES DE ESTABILIZACION DE LADERAS

ACTIVIDAD	UBICACIÓN

2. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA VIA

ACTIVIDAD	UBICACIÓN
Fundición de concreto reforzado de huellas	

3. OTRAS ACTIVIDADES

ACTIVIDAD	UBICACIÓN

4. ANOTACIONES

5. CANTIDADES DE OBRA APROXIMADAS

Descripcion	Unid.	Cant.
Huellas carril derecho	8	**24m**
Huellas carril izquierdo	8	**24m**

6. INFORME DE PERSONAL

Personal	Cant.
Director de obra	0
Ing. Residente de obra	1
Ing. Auxiliar de obra	0
Inspector de obra	0
Topografo	1
Aux. de Topografia	0
Laboratorista	0
Maestro de obra	1
Oficiales	1
Ayudantes	1
Auxiliar de Trafico	0
Conductores	0
Operadores de Equipos	0

7. INFORME DE EQUIPO

Equipo	Cant.
Retroexcavadora de oruga	0
Retroexcavadora de Llantas	0
Motoniveladora	0
Vibrocampactador	0
Mezcladora	0
Carrotanque	0
Volqueta (Dobletroque)	0
Volqueta (Sencilla)	0
Rana	1
texturizador y flota	1
Tronzadora	1
Rieles para placa huella	40
Planta electrica	1
Mezcladora	1

8. CONDICION CLIMATICA

Desde	Hasta	Lluvia	Seco
0:00	0:00		

Residente de obra	Residente de Interventoria
Nombre. SEBASTIAN RUIZ MESTRA	Nombre. CRISTIAN ANDRES COGOLLO PORRAS
Firma Sebastian Ruiz M	Firma

Hoja 1 de 1

BITACORA DE OBRA

			FECHA:	8	10	2024
				DIA	MES	AÑO
TRAMO Y/O SECTOR	**CORREGIMIENTO BUENOS AIRES**				
DEPARTAMENTO:	**ANTIOQUIA**	CONTRATO DE INTERVENORIA No. :	**4498-2023**		
NOMBRE DE LA VIA:	**CORREGIMIENTO BUENOS AIRES**	INTERVENTORIA:	**ZAIDA DAYANA ORJUELA DIAZ**		
CONTRATO DE OBRA No.	3225-2023	SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORIA:	**MAURICIO HOYOS SIERRA**		
OBJETO CONTRATO DE OBRA	**AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL CORREGIMIENTO BUENOS AIRES DEL MUNICIPIO DE ARBOLETES, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL**				
CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL CORREGIMIENTO BUENOS AIRES				
VALOR CONTRATO OBRA:	**$ 201.628.388,00**				

ACTIVIDADES DE ESTABILIZACION DE LADERAS

ACTIVIDAD	UBICACIÓN

2. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA VIA

ACTIVIDAD	UBICACIÓN
Fundición de concreto ciclopeo central y sobre anchos	

3. OTRAS ACTIVIDADES

ACTIVIDAD	UBICACIÓN

4. ANOTACIONES

5. CANTIDADES DE OBRA APROXIMADAS

Descripcion	Unid.	Cant.
Ciclopeo central 0.9m	8	**24m**
Ciclopeo sobreancho derecho 0.45m	8	**24m**
Ciclopeo sobreancho izquierdo 0.45m	8	**24m**

6. INFORME DE PERSONAL

Personal	Cant.
Director de obra	0
Ing. Residente de obra	1
Ing. Auxiliar de obra	0
Inspector de obra	0
Topografo	1
Aux. de Topografia	0
Laboratorista	0
Maestro de obra	1
Oficiales	1
Ayudantes	1
Auxiliar de Trafico	0
Conductores	0
Operadores de Equipos	0

7. INFORME DE EQUIPO

Equipo	Cant.
Retroexcavadora de oruga	0
Retroexcavadora de Llantas	0
Motoniveladora	0
Vibrocampactador	0
Mezcladora	0
Carrotanque	0
Volqueta (Dobletroque)	0
Volqueta (Sencilla)	0
Rana	1
texturizador y flota	1
Tronzadora	1
Rieles para placa huella	40
Planta electrica	1
Mezcladora	1

8. CONDICION CLIMATICA

Desde	Hasta	Lluvia	Seco
0:00	0:00		

Residente de obra	Residente de Interventoria
Nombre. SEBASTIAN RUIZ MESTRA	Nombre. CRISTIAN ANDRES COGOLLO PORRAS
Firma Sebastian Ruiz M	Firma

Hoja 1 de 1

BITACORA DE OBRA

FECHA:	9	10	2024
	DIA	MES	AÑO

TRAMO Y/O SECTOR **CORREGIMIENTO BUENOS AIRES**

DEPARTAMENTO: **ANTIOQUIA**

CONTRATO DE INTERVENORIA No. : **4498-2023**

NOMBRE DE LA VIA: **CORREGIMIENTO BUENOS AIRES**

INTERVENTORIA: **ZAIDA DAYANA ORJUELA DIAZ**

CONTRATO DE OBRA No. 3225-2023

SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORIA: **MAURICIO HOYOS SIERRA**

OBJETO CONTRATO DE OBRA: **AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL CORREGIMIENTO BUENOS AIRES DEL MUNICIPIO DE ARBOLETES, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL**

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL CORREGIMIENTO BUENOS AIRES

VALOR CONTRATO OBRA: **$ 201.628.388,00**

ACTIVIDADES DE ESTABILIZACION DE LADERAS

ACTIVIDAD	UBICACIÓN

2. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA VIA

ACTIVIDAD	UBICACIÓN
Fundición de concreto ciclopeo central y sobre anchos	

3. OTRAS ACTIVIDADES

ACTIVIDAD	UBICACIÓN

4. ANOTACIONES

5. CANTIDADES DE OBRA APROXIMADAS

Descripcion	Unid.	Cant.
Ciclopeo central 0.9m	9	**27m**
Ciclopeo sobreancho derecho 0.45m	9	**27m**
Ciclopeo sobreancho izquierdo 0.45m	9	**27m**

6. INFORME DE PERSONAL

Personal	Cant.
Director de obra	0
Ing. Residente de obra	1
Ing. Auxiliar de obra	0
Inspector de obra	0
Topografo	1
Aux. de Topografia	0
Laboratorista	0
Maestro de obra	1
Oficiales	1
Ayudantes	1
Auxiliar de Trafico	0
Conductores	0
Operadores de Equipos	0

7. INFORME DE EQUIPO

Equipo	Cant.
Retroexcavadora de oruga	0
Retroexcavadora de Llantas	0
Motoniveladora	0
Vibrocampactador	0
Mezcladora	0
Carrotanque	0
Volqueta (Dobletroque)	0
Volqueta (Sencilla)	0
Rana	1
texturizador y flota	1
Tronzadora	1
Rieles para placa huella	40
Planta electrica	1
Mezcladora	1

8. CONDICION CLIMATICA

Desde	Hasta	Lluvia	Seco
0:00	0:00		

Residente de obra	Residente de Interventoria
Nombre. SEBASTIAN RUIZ MESTRA	Nombre. CRISTIAN ANDRES COGOLLO PORRAS
Firma Sebastian Ruiz M	Firma

Hoja 1 de 1

BITACORA DE OBRA

			FECHA:	10	10	2024
				DIA	MES	AÑO
TRAMO Y/O SECTOR	**CORREGIMIENTO BUENOS AIRES**				
DEPARTAMENTO:	**ANTIOQUIA**	CONTRATO DE INTERVENORIA No. :	**4498-2023**		
NOMBRE DE LA VIA:	**CORREGIMIENTO BUENOS AIRES**	INTERVENTORIA:	**ZAIDA DAYANA ORJUELA DIAZ**		
CONTRATO DE OBRA No.	3225-2023	SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORIA:	**MAURICIO HOYOS SIERRA**		
OBJETO CONTRATO DE OBRA	**AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL CORREGIMIENTO BUENOS AIRES DEL MUNICIPIO DE ARBOLETES, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL**				
CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL CORREGIMIENTO BUENOS AIRES				
VALOR CONTRATO OBRA:	**$ 201.628.388,00**				

ACTIVIDADES DE ESTABILIZACION DE LADERAS

ACTIVIDAD	UBICACIÓN

2. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA VIA

ACTIVIDAD	UBICACIÓN
Fundición de cunetas y vigas riostras	

3. OTRAS ACTIVIDADES

ACTIVIDAD	UBICACIÓN

4. ANOTACIONES

5. CANTIDADES DE OBRA APROXIMADAS

Descripcion	Unid.	Cant.
Viga riostra	15	**45m**
Cuenta derecha	15	**45m**
Cuenta izquierda	15	**45m**

6. INFORME DE PERSONAL

Personal	Cant.
Director de obra	0
Ing. Residente de obra	1
Ing. Auxiliar de obra	0
Inspector de obra	0
Topografo	1
Aux. de Topografia	0
Laboratorista	0
Maestro de obra	1
Oficiales	1
Ayudantes	1
Auxiliar de Trafico	0
Conductores	0
Operadores de Equipos	0

7. INFORME DE EQUIPO

Equipo	Cant.
Retroexcavadora de oruga	0
Retroexcavadora de Llantas	0
Motoniveladora	0
Vibrocampactador	0
Mezcladora	0
Carrotanque	0
Volqueta (Dobletroque)	0
Volqueta (Sencilla)	0
Rana	1
texturizador y flota	1
Tronzadora	1
Rieles para placa huella	40
Planta electrica	1
Mezcladora	1

8. CONDICION CLIMATICA

Desde	Hasta	Lluvia	Seco
0:00	0:00		

Residente de obra	Residente de Interventoria
Nombre. SEBASTIAN RUIZ MESTRA	Nombre. CRISTIAN ANDRES COGOLLO PORRAS
Firma Sebastian Ruiz M	Firma

Hoja 1 de 1

BITACORA DE OBRA

FECHA:	11	10	2024
	DIA	MES	AÑO

TRAMO Y/O SECTOR **CORREGIMIENTO BUENOS AIRES**

DEPARTAMENTO: **ANTIOQUIA**

CONTRATO DE INTERVENORIA No. : **4498-2023**

NOMBRE DE LA VIA: **CORREGIMIENTO BUENOS AIRES**

INTERVENTORIA: **ZAIDA DAYANA ORJUELA DIAZ**

CONTRATO DE OBRA No. 3225-2023

SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORIA: **MAURICIO HOYOS SIERRA**

OBJETO CONTRATO DE OBRA: **AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL CORREGIMIENTO BUENOS AIRES DEL MUNICIPIO DE ARBOLETES, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL**

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL CORREGIMIENTO BUENOS AIRES

VALOR CONTRATO OBRA: **$ 201.628.388,00**

ACTIVIDADES DE ESTABILIZACION DE LADERAS

ACTIVIDAD	UBICACIÓN

2. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA VIA

ACTIVIDAD	UBICACIÓN
Nivelación y enrrielado	

3. OTRAS ACTIVIDADES

ACTIVIDAD	UBICACIÓN

4. ANOTACIONES

5. CANTIDADES DE OBRA APROXIMADAS

Descripcion	Unid.	Cant.

6. INFORME DE PERSONAL

Personal	Cant.
Director de obra	0
Ing. Residente de obra	1
Ing. Auxiliar de obra	0
Inspector de obra	0
Topografo	1
Aux. de Topografia	0
Laboratorista	0
Maestro de obra	1
Oficiales	1
Ayudantes	1
Auxiliar de Trafico	0
Conductores	0
Operadores de Equipos	0

7. INFORME DE EQUIPO

Equipo	Cant.
Retroexcavadora de oruga	0
Retroexcavadora de Llantas	0
Motoniveladora	0
Vibrocampactador	0
Mezcladora	0
Carrotanque	0
Volqueta (Dobletroque)	0
Volqueta (Sencilla)	0
Rana	1
texturizador y flota	1
Tronzadora	1
Rieles para placa huella	40
Planta electrica	1
Mezcladora	1

8. CONDICION CLIMATICA

Desde	Hasta	Lluvia	Seco
0:00	0:00		

Residente de obra	Residente de Interventoria
Nombre. SEBASTIAN RUIZ MESTRA	Nombre. CRISTIAN ANDRES COGOLLO PORRAS
Firma Sebastian Ruiz M	Firma

Hoja 1 de 1

BITACORA DE OBRA

FECHA:	12	10	2024
	DIA	MES	AÑO

TRAMO Y/O SECTOR **CORREGIMIENTO BUENOS AIRES**

DEPARTAMENTO: **ANTIOQUIA**

CONTRATO DE INTERVENORIA No. : **4498-2023**

NOMBRE DE LA VIA: **CORREGIMIENTO BUENOS AIRES**

INTERVENTORIA: **ZAIDA DAYANA ORJUELA DIAZ**

CONTRATO DE OBRA No. 3225-2023

SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORIA: **MAURICIO HOYOS SIERRA**

OBJETO CONTRATO DE OBRA: **AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL CORREGIMIENTO BUENOS AIRES DEL MUNICIPIO DE ARBOLETES, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL**

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL CORREGIMIENTO BUENOS AIRES

VALOR CONTRATO OBRA: **$ 201.628.388,00**

ACTIVIDADES DE ESTABILIZACION DE LADERAS

ACTIVIDAD	UBICACIÓN

2. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA VIA

ACTIVIDAD	UBICACIÓN
SE PRESENTARON LLUVIAS LO CUAL NO DEJO REALIZAR LAS ACTIVIDADES	

3. OTRAS ACTIVIDADES

ACTIVIDAD	UBICACIÓN

4. ANOTACIONES

5. CANTIDADES DE OBRA APROXIMADAS

Descripcion	Unid.	Cant.

BITACORA DE OBRA

			FECHA:	13	10	2024
				DIA	MES	AÑO
TRAMO Y/O SECTOR	**CORREGIMIENTO BUENOS AIRES**				
DEPARTAMENTO:	**ANTIOQUIA**	CONTRATO DE INTERVENORIA No. :	**4498-2023**		
NOMBRE DE LA VIA:	**CORREGIMIENTO BUENOS AIRES**	INTERVENTORIA:	**ZAIDA DAYANA ORJUELA DIAZ**		
CONTRATO DE OBRA No.	3225-2023	SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORIA:	**MAURICIO HOYOS SIERRA**		
OBJETO CONTRATO DE OBRA	**AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL CORREGIMIENTO BUENOS AIRES DEL MUNICIPIO DE ARBOLETES, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL**				
CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL CORREGIMIENTO BUENOS AIRES				
VALOR CONTRATO OBRA:	**$ 201.628.388,00**				

ACTIVIDADES DE ESTABILIZACION DE LADERAS

ACTIVIDAD	UBICACIÓN

2. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA VIA

ACTIVIDAD	UBICACIÓN
DOMINGO DIA NO LABORAL	

3. OTRAS ACTIVIDADES

ACTIVIDAD	UBICACIÓN

4. ANOTACIONES

5. CANTIDADES DE OBRA APROXIMADAS

Descripcion	Unid.	Cant.

6. INFORME DE PERSONAL

Personal	Cant.
Director de obra	0
Ing. Residente de obra	1
Ing. Auxiliar de obra	0
Inspector de obra	0
Topografo	1
Aux. de Topografia	0
Laboratorista	0
Maestro de obra	1
Oficiales	1
Ayudantes	1
Auxiliar de Trafico	0
Conductores	0
Operadores de Equipos	0

7. INFORME DE EQUIPO

Equipo	Cant.
Retroexcavadora de oruga	0
Retroexcavadora de Llantas	0
Motoniveladora	0
Vibrocampactador	0
Mezcladora	0
Carrotanque	0
Volqueta (Dobletroque)	0
Volqueta (Sencilla)	0
Rana	1
texturizador y flota	1
Tronzadora	1
Rieles para placa huella	40
Planta electrica	1
Mezcladora	1

8. CONDICION CLIMATICA

Desde	Hasta	Lluvia	Seco
13/09/2024 6:00	13/09/2024 8:00	x	

Residente de obra	Residente de Interventoria
Nombre. SEBASTIAN RUIZ MESTRA	Nombre. CRISTIAN ANDRES COGOLLO PORRAS
Firma Sebastian Ruiz M	Firma

BITACORA DE OBRA

		FECHA:	14 / 10 / 2024 (DIA / MES / AÑO)
TRAMO Y/O SECTOR	**CORREGIMIENTO BUENOS AIRES**		
DEPARTAMENTO:	**ANTIOQUIA**	CONTRATO DE INTERVENORIA No. :	**4498-2023**
NOMBRE DE LA VIA:	**CORREGIMIENTO BUENOS AIRES**	INTERVENTORIA:	**ZAIDA DAYANA ORJUELA DIAZ**
CONTRATO DE OBRA No.	3225-2023	SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORIA:	**MAURICIO HOYOS SIERRA**
OBJETO CONTRATO DE OBRA	**AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL CORREGIMIENTO BUENOS AIRES DEL MUNICIPIO DE ARBOLETES, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL**		
CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL CORREGIMIENTO BUENOS AIRES		
VALOR CONTRATO OBRA:	**$ 201.628.388,00**		

ACTIVIDADES DE ESTABILIZACION DE LADERAS

ACTIVIDAD	UBICACIÓN

2. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA VIA

ACTIVIDAD	UBICACIÓN
Se realizó la excavación, fue necesario realizar una excavacion a mano debido a que por motivos de la lluvia se contamino parte del terreno y no se contaba con el ancho efectivo	

3. OTRAS ACTIVIDADES

ACTIVIDAD	UBICACIÓN

4. ANOTACIONES

5. CANTIDADES DE OBRA APROXIMADAS

Descripcion	Unid.	Cant.

6. INFORME DE PERSONAL

Personal	Cant.
Director de obra	0
Ing. Residente de obra	1
Ing. Auxiliar de obra	0
Inspector de obra	0
Topografo	1
Aux. de Topografia	0
Laboratorista	0
Maestro de obra	1
Oficiales	1
Ayudantes	1
Auxiliar de Trafico	0
Conductores	0
Operadores de Equipos	0

7. INFORME DE EQUIPO

Equipo	Cant.
Retroexcavadora de oruga	0
Retroexcavadora de Llantas	0
Motoniveladora	0
Vibrocampactador	0
Mezcladora	0
Carrotanque	0
Volqueta (Dobletroque)	0
Volqueta (Sencilla)	0
Rana	1
texturizador y flota	1
Tronzadora	1
Rieles para placa huella	40
Planta electrica	1
Mezcladora	1

8. CONDICION CLIMATICA

Desde	Hasta	Lluvia	Seco
14/09/2024 6:00	14/09/2024 8:00	x	

Residente de obra	Residente de Interventoria
Nombre. SEBASTIAN RUIZ MESTRA	Nombre. CRISTIAN ANDRES COGOLLO PORRAS
Firma Sebastian Ruiz M	Firma

BITACORA DE OBRA

FECHA:	15	10	2024
	DIA	MES	AÑO

TRAMO Y/O SECTOR **CORREGIMIENTO BUENOS AIRES**

DEPARTAMENTO: **ANTIOQUIA**

CONTRATO DE INTERVENORIA No. : **4498-2023**

NOMBRE DE LA VIA: **CORREGIMIENTO BUENOS AIRES**

INTERVENTORIA: **ZAIDA DAYANA ORJUELA DIAZ**

CONTRATO DE OBRA No. 3225-2023

SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORIA: **MAURICIO HOYOS SIERRA**

OBJETO CONTRATO DE OBRA: **AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL CORREGIMIENTO BUENOS AIRES DEL MUNICIPIO DE ARBOLETES, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL**

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL CORREGIMIENTO BUENOS AIRES

VALOR CONTRATO OBRA: **$ 201.628.388,00**

ACTIVIDADES DE ESTABILIZACION DE LADERAS

ACTIVIDAD	UBICACIÓN

2. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA VIA

ACTIVIDAD	UBICACIÓN
Fundición de cunetas y vigas riostras	

3. OTRAS ACTIVIDADES

ACTIVIDAD	UBICACIÓN

4. ANOTACIONES

5. CANTIDADES DE OBRA APROXIMADAS

Descripcion	Unid.	Cant.
Viga riostra	12	
Cuenta derecha	12	**36m**
Cuenta izquierda	12	**36m**

6. INFORME DE PERSONAL

Personal	Cant.
Director de obra	0
Ing. Residente de obra	1
Ing. Auxiliar de obra	0
Inspector de obra	0
Topografo	1
Aux. de Topografia	0
Laboratorista	0
Maestro de obra	1
Oficiales	1
Ayudantes	1
Auxiliar de Trafico	0
Conductores	0
Operadores de Equipos	0

7. INFORME DE EQUIPO

Equipo	Cant.
Retroexcavadora de oruga	0
Retroexcavadora de Llantas	0
Motoniveladora	0
Vibrocampactador	0
Mezcladora	0
Carrotanque	0
Volqueta (Dobletroque)	0
Volqueta (Sencilla)	0
Rana	1
texturizador y flota	1
Tronzadora	1
Rieles para placa huella	40
Planta electrica	1
Mezcladora	1

8. CONDICION CLIMATICA

Desde	Hasta	Lluvia	Seco
0:00	0:00		

Residente de obra	Residente de Interventoria
Nombre. SEBASTIAN RUIZ MESTRA	Nombre. CRISTIAN ANDRES COGOLLO PORRAS
Firma Sebastian Ruiz M	Firma

Hoja 1 de 1

BITACORA DE OBRA

FECHA:	16	10	2024
	DIA	MES	AÑO

TRAMO Y/O SECTOR **CORREGIMIENTO BUENOS AIRES**

DEPARTAMENTO: **ANTIOQUIA**

CONTRATO DE INTERVENORIA No. : **4498-2023**

NOMBRE DE LA VIA: **CORREGIMIENTO BUENOS AIRES**

INTERVENTORIA: **ZAIDA DAYANA ORJUELA DIAZ**

CONTRATO DE OBRA No. 3225-2023

SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORIA: **MAURICIO HOYOS SIERRA**

OBJETO CONTRATO DE OBRA: **AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL CORREGIMIENTO BUENOS AIRES DEL MUNICIPIO DE ARBOLETES, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL**

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL CORREGIMIENTO BUENOS AIRES

VALOR CONTRATO OBRA: **$ 201.628.388,00**

ACTIVIDADES DE ESTABILIZACION DE LADERAS

ACTIVIDAD	UBICACIÓN

2. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA VIA

ACTIVIDAD	UBICACIÓN
Se procedio a enrrielar otro tramo y nivelar el terreno por medio de vibrocompactador tipo rana	

3. OTRAS ACTIVIDADES

ACTIVIDAD	UBICACIÓN

4. ANOTACIONES

5. CANTIDADES DE OBRA APROXIMADAS

Descripcion	Unid.	Cant.

6. INFORME DE PERSONAL

Personal	Cant.
Director de obra	0
Ing. Residente de obra	1
Ing. Auxiliar de obra	0
Inspector de obra	0
Topografo	1
Aux. de Topografia	0
Laboratorista	0
Maestro de obra	1
Oficiales	1
Ayudantes	1
Auxiliar de Trafico	0
Conductores	0
Operadores de Equipos	0

7. INFORME DE EQUIPO

Equipo	Cant.
Retroexcavadora de oruga	0
Retroexcavadora de Llantas	0
Motoniveladora	0
Vibrocampactador	0
Mezcladora	0
Carrotanque	0
Volqueta (Dobletroque)	0
Volqueta (Sencilla)	0
Rana	1
texturizador y flota	1
Tronzadora	1
Rieles para placa huella	40
Planta electrica	1
Mezcladora	1

8. CONDICION CLIMATICA

Desde	Hasta	Lluvia	Seco
0:00	0:00		

Residente de obra	Residente de Interventoria
Nombre. SEBASTIAN RUIZ MESTRA	Nombre. CRISTIAN ANDRES COGOLLO PORRAS
Firma Sebastian Ruiz M	Firma

BITACORA DE OBRA

			FECHA:	17	10	2024
				DIA	MES	AÑO
TRAMO Y/O SECTOR	**CORREGIMIENTO BUENOS AIRES**				
DEPARTAMENTO:	**ANTIOQUIA**	CONTRATO DE INTERVENORIA No. :	**4498-2023**		
NOMBRE DE LA VIA:	**CORREGIMIENTO BUENOS AIRES**	INTERVENTORIA:	**ZAIDA DAYANA ORJUELA DIAZ**		
CONTRATO DE OBRA No.	3225-2023	SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORIA:	**MAURICIO HOYOS SIERRA**		
OBJETO CONTRATO DE OBRA	**AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL CORREGIMIENTO BUENOS AIRES DEL MUNICIPIO DE ARBOLETES, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL**				
CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL CORREGIMIENTO BUENOS AIRES				
VALOR CONTRATO OBRA:	**$ 201.628.388,00**				

ACTIVIDADES DE ESTABILIZACION DE LADERAS

ACTIVIDAD	UBICACIÓN

2. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA VIA

ACTIVIDAD	UBICACIÓN
Fundición de cunetas y vigas riostras	

3. OTRAS ACTIVIDADES

ACTIVIDAD	UBICACIÓN

4. ANOTACIONES

5. CANTIDADES DE OBRA APROXIMADAS

Descripcion	Unid.	Cant.
Viga riostra	10	
Cuenta derecha	10	**30m**
Cuenta izquierda	10	**30m**

6. INFORME DE PERSONAL

Personal	Cant.
Director de obra	0
Ing. Residente de obra	1
Ing. Auxiliar de obra	0
Inspector de obra	0
Topografo	1
Aux. de Topografia	0
Laboratorista	0
Maestro de obra	1
Oficiales	1
Ayudantes	1
Auxiliar de Trafico	0
Conductores	0
Operadores de Equipos	0

7. INFORME DE EQUIPO

Equipo	Cant.
Retroexcavadora de oruga	0
Retroexcavadora de Llantas	0
Motoniveladora	0
Vibrocampactador	0
Mezcladora	0
Carrotanque	0
Volqueta (Dobletroque)	0
Volqueta (Sencilla)	0
Rana	1
texturizador y flota	1
Tronzadora	1
Rieles para placa huella	40
Planta electrica	1
Mezcladora	1

8. CONDICION CLIMATICA

Desde	Hasta	Lluvia	Seco
0:00	0:00		

Residente de obra	Residente de Interventoria
Nombre. SEBASTIAN RUIZ MESTRA	Nombre. CRISTIAN ANDRES COGOLLO PORRAS
Firma Sebastian Ruiz M	Firma

Hoja 1 de 1

BITACORA DE OBRA

			FECHA:	18	10	2024
				DIA	MES	AÑO
TRAMO Y/O SECTOR	**CORREGIMIENTO BUENOS AIRES**				
DEPARTAMENTO:	**ANTIOQUIA**	CONTRATO DE INTERVENORIA No. :	**4498-2023**		
NOMBRE DE LA VIA:	**CORREGIMIENTO BUENOS AIRES**	INTERVENTORIA:	**ZAIDA DAYANA ORJUELA DIAZ**		
CONTRATO DE OBRA No.	3225-2023	SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORIA:	**MAURICIO HOYOS SIERRA**		
OBJETO CONTRATO DE OBRA	**AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL CORREGIMIENTO BUENOS AIRES DEL MUNICIPIO DE ARBOLETES, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL**				
CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL CORREGIMIENTO BUENOS AIRES				
VALOR CONTRATO OBRA:	**$ 201.628.388,00**				

ACTIVIDADES DE ESTABILIZACION DE LADERAS

ACTIVIDAD	UBICACIÓN

2. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA VIA

ACTIVIDAD	UBICACIÓN
Instalación de formaletas y fundición de bordillo	

3. OTRAS ACTIVIDADES

ACTIVIDAD	UBICACIÓN

4. ANOTACIONES

5. CANTIDADES DE OBRA APROXIMADAS

Descripcion	Unid.	Cant.
Bordillo lado derecho		111m

BITACORA DE OBRA

			FECHA:	19	10	2024
				DIA	MES	AÑO
TRAMO Y/O SECTOR	**CORREGIMIENTO BUENOS AIRES**				
DEPARTAMENTO:	**ANTIOQUIA**	CONTRATO DE INTERVENORIA No. :	**4498-2023**		
NOMBRE DE LA VIA:	**CORREGIMIENTO BUENOS AIRES**	INTERVENTORIA:	**ZAIDA DAYANA ORJUELA DIAZ**		
CONTRATO DE OBRA No.	3225-2023	SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORIA:	**MAURICIO HOYOS SIERRA**		
OBJETO CONTRATO DE OBRA	**AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL CORREGIMIENTO BUENOS AIRES DEL MUNICIPIO DE ARBOLETES, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL**				
CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL CORREGIMIENTO BUENOS AIRES				
VALOR CONTRATO OBRA:	**$ 201.628.388,00**				

ACTIVIDADES DE ESTABILIZACION DE LADERAS

ACTIVIDAD	UBICACIÓN

2. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA VIA

ACTIVIDAD	UBICACIÓN
Instalación de formaletas y fundición de bordillo	

3. OTRAS ACTIVIDADES

ACTIVIDAD	UBICACIÓN

4. ANOTACIONES

5. CANTIDADES DE OBRA APROXIMADAS

Descripcion	Unid.	Cant.
Bordillo lado izquierdo		**111m**

BITACORA DE OBRA

FECHA:	20	10	2024
	DIA	MES	AÑO

TRAMO Y/O SECTOR **CORREGIMIENTO BUENOS AIRES**

DEPARTAMENTO: **ANTIOQUIA**

CONTRATO DE INTERVENORIA No. : **4498-2023**

NOMBRE DE LA VIA: **CORREGIMIENTO BUENOS AIRES**

INTERVENTORIA: **ZAIDA DAYANA ORJUELA DIAZ**

CONTRATO DE OBRA No. 3225-2023

SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORIA: **MAURICIO HOYOS SIERRA**

OBJETO CONTRATO DE OBRA: **AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL CORREGIMIENTO BUENOS AIRES DEL MUNICIPIO DE ARBOLETES, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL**

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL CORREGIMIENTO BUENOS AIRES

VALOR CONTRATO OBRA: **$ 201.628.388,00**

ACTIVIDADES DE ESTABILIZACION DE LADERAS

ACTIVIDAD	UBICACIÓN

2. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA VIA

ACTIVIDAD	UBICACIÓN
SE FINALIZARON TODAS LAS ACTIVIDADES DE OBRA, FINALIZANDO 111M DE PLACA HUELLA	

3. OTRAS ACTIVIDADES

ACTIVIDAD	UBICACIÓN

4. ANOTACIONES

5. CANTIDADES DE OBRA APROXIMADAS

Descripcion	Unid.	Cant.

BITACORA DE OBRA

FECHA:	22	10	2024
	DIA	MES	AÑO

TRAMO Y/O SECTOR **CORREGIMIENTO BUENOS AIRES**

DEPARTAMENTO: **ANTIOQUIA**

CONTRATO DE INTERVENORIA No. : **4498-2023**

NOMBRE DE LA VIA: **CORREGIMIENTO BUENOS AIRES**

INTERVENTORIA: **ZAIDA DAYANA ORJUELA DIAZ**

CONTRATO DE OBRA No. 3225-2023

SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORIA: **MAURICIO HOYOS SIERRA**

OBJETO CONTRATO DE OBRA: **AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL CORREGIMIENTO BUENOS AIRES DEL MUNICIPIO DE ARBOLETES, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL**

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL CORREGIMIENTO BUENOS AIRES

VALOR CONTRATO OBRA: **$ 201.628.388,00**

ACTIVIDADES DE ESTABILIZACION DE LADERAS

ACTIVIDAD	UBICACIÓN

2. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA VIA

ACTIVIDAD	UBICACIÓN
SE FINALIZARON TODAS LAS ACTIVIDADES DE OBRA, FINALIZANDO 111M DE PLACA HUELLA	

3. OTRAS ACTIVIDADES

ACTIVIDAD	UBICACIÓN

4. ANOTACIONES

5. CANTIDADES DE OBRA APROXIMADAS

Descripcion	Unid.	Cant.

BITACORA DE OBRA

FECHA:	23	10	2024
	DIA	MES	AÑO

TRAMO Y/O SECTOR **CORREGIMIENTO BUENOS AIRES**

DEPARTAMENTO: **ANTIOQUIA**

CONTRATO DE INTERVENORIA No. : **4498-2023**

NOMBRE DE LA VIA: **CORREGIMIENTO BUENOS AIRES**

INTERVENTORIA: **ZAIDA DAYANA ORJUELA DIAZ**

CONTRATO DE OBRA No. 3225-2023

SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORIA: **MAURICIO HOYOS SIERRA**

OBJETO CONTRATO DE OBRA: **AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL CORREGIMIENTO BUENOS AIRES DEL MUNICIPIO DE ARBOLETES, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL**

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL CORREGIMIENTO BUENOS AIRES

VALOR CONTRATO OBRA: **$ 201.628.388,00**

ACTIVIDADES DE ESTABILIZACION DE LADERAS

ACTIVIDAD	UBICACIÓN

2. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA VIA

ACTIVIDAD	UBICACIÓN
SE FINALIZARON TODAS LAS ACTIVIDADES DE OBRA, FINALIZANDO 111M DE PLACA HUELLA	

3. OTRAS ACTIVIDADES

ACTIVIDAD	UBICACIÓN

4. ANOTACIONES

5. CANTIDADES DE OBRA APROXIMADAS

Descripcion	Unid.	Cant.

BITACORA DE OBRA

FECHA:	24	10	2024
	DIA	MES	AÑO

TRAMO Y/O SECTOR **CORREGIMIENTO BUENOS AIRES**

DEPARTAMENTO: **ANTIOQUIA**

CONTRATO DE INTERVENORIA No. : **4498-2023**

NOMBRE DE LA VIA: **CORREGIMIENTO BUENOS AIRES**

INTERVENTORIA: **ZAIDA DAYANA ORJUELA DIAZ**

CONTRATO DE OBRA No. 3225-2023

SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORIA: **MAURICIO HOYOS SIERRA**

OBJETO CONTRATO DE OBRA: **AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL CORREGIMIENTO BUENOS AIRES DEL MUNICIPIO DE ARBOLETES, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL**

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL CORREGIMIENTO BUENOS AIRES

VALOR CONTRATO OBRA: **$ 201.628.388,00**

ACTIVIDADES DE ESTABILIZACION DE LADERAS

ACTIVIDAD	UBICACIÓN

2. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA VIA

ACTIVIDAD	UBICACIÓN
SE FINALIZARON TODAS LAS ACTIVIDADES DE OBRA, FINALIZANDO 111M DE PLACA HUELLA	

3. OTRAS ACTIVIDADES

ACTIVIDAD	UBICACIÓN

4. ANOTACIONES

5. CANTIDADES DE OBRA APROXIMADAS

Descripcion	Unid.	Cant.

6. INFORME DE PERSONAL

Personal	Cant.
Director de obra	0
Ing. Residente de obra	1
Ing. Auxiliar de obra	0
Inspector de obra	0
Topografo	0
Aux. de Topografia	0
Laboratorista	0
Maestro de obra	0
Oficiales	0
Ayudantes	0
Auxiliar de Trafico	0
Conductores	0
Operadores de Equipos	0

7. INFORME DE EQUIPO

Equipo	Cant.
Retroexcavadora de oruga	0
Retroexcavadora de Llantas	0
Motoniveladora	0
Vibrocampactador	0
Mezcladora	0
Carrotanque	0
Volqueta (Dobletroque)	0
Volqueta (Sencilla)	0
Rana	0
texturizador y flota	0
Tronzadora	0
Rieles para placa huella	0
Planta electrica	0
Mezcladora	0

8. CONDICION CLIMATICA

Desde	Hasta	Lluvia	Seco
0:00	0:00		

Residente de obra	Residente de Interventoria
Nombre. SEBASTIAN RUIZ MESTRA	Nombre. CRISTIAN ANDRES COGOLLO PORRAS
Firma Sebastian Ruiz M	Firma

Hoja 1 de 1

BITACORA DE OBRA

FECHA:	25	10	2024
	DIA	MES	AÑO

TRAMO Y/O SECTOR **CORREGIMIENTO BUENOS AIRES**

DEPARTAMENTO: **ANTIOQUIA**

CONTRATO DE INTERVENORIA No. : **4498-2023**

NOMBRE DE LA VIA: **CORREGIMIENTO BUENOS AIRES**

INTERVENTORIA: **ZAIDA DAYANA ORJUELA DIAZ**

CONTRATO DE OBRA No. 3225-2023

SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORIA: **MAURICIO HOYOS SIERRA**

OBJETO CONTRATO DE OBRA: **AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL CORREGIMIENTO BUENOS AIRES DEL MUNICIPIO DE ARBOLETES, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL**

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL CORREGIMIENTO BUENOS AIRES

VALOR CONTRATO OBRA: **$ 201.628.388,00**

ACTIVIDADES DE ESTABILIZACION DE LADERAS

ACTIVIDAD	UBICACIÓN

2. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA VIA

ACTIVIDAD	UBICACIÓN
SE FINALIZARON TODAS LAS ACTIVIDADES DE OBRA, FINALIZANDO 111M DE PLACA HUELLA	

3. OTRAS ACTIVIDADES

ACTIVIDAD	UBICACIÓN

4. ANOTACIONES

5. CANTIDADES DE OBRA APROXIMADAS

Descripcion	Unid.	Cant.

6. INFORME DE PERSONAL

Personal	Cant.
Director de obra	0
Ing. Residente de obra	1
Ing. Auxiliar de obra	0
Inspector de obra	0
Topografo	0
Aux. de Topografia	0
Laboratorista	0
Maestro de obra	0
Oficiales	0
Ayudantes	0
Auxiliar de Trafico	0
Conductores	0
Operadores de Equipos	0

7. INFORME DE EQUIPO

Equipo	Cant.
Retroexcavadora de oruga	0
Retroexcavadora de Llantas	0
Motoniveladora	0
Vibrocampactador	0
Mezcladora	0
Carrotanque	0
Volqueta (Dobletroque)	0
Volqueta (Sencilla)	0
Rana	0
texturizador y flota	0
Tronzadora	0
Rieles para placa huella	0
Planta electrica	0
Mezcladora	0

8. CONDICION CLIMATICA

Desde	Hasta	Lluvia	Seco
0:00	0:00		

Residente de obra	Residente de Interventoria
Nombre. SEBASTIAN RUIZ MESTRA	Nombre. CRISTIAN ANDRES COGOLLO PORRAS
Firma Sebastian Ruiz M	Firma

Hoja 1 de 1

BITACORA DE OBRA

FECHA:	26	10	2024
	DIA	MES	AÑO

TRAMO Y/O SECTOR **CORREGIMIENTO BUENOS AIRES**

DEPARTAMENTO: **ANTIOQUIA**

CONTRATO DE INTERVENORIA No. : **4498-2023**

NOMBRE DE LA VIA: **CORREGIMIENTO BUENOS AIRES**

INTERVENTORIA: **ZAIDA DAYANA ORJUELA DIAZ**

CONTRATO DE OBRA No. 3225-2023

SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORIA: **MAURICIO HOYOS SIERRA**

OBJETO CONTRATO DE OBRA: **AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL CORREGIMIENTO BUENOS AIRES DEL MUNICIPIO DE ARBOLETES, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL**

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL CORREGIMIENTO BUENOS AIRES

VALOR CONTRATO OBRA: **$ 201.628.388,00**

ACTIVIDADES DE ESTABILIZACION DE LADERAS

ACTIVIDAD	UBICACIÓN

2. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA VIA

ACTIVIDAD	UBICACIÓN
SE FINALIZARON TODAS LAS ACTIVIDADES DE OBRA, FINALIZANDO 111M DE PLACA HUELLA	

3. OTRAS ACTIVIDADES

ACTIVIDAD	UBICACIÓN

4. ANOTACIONES

5. CANTIDADES DE OBRA APROXIMADAS

Descripcion	Unid.	Cant.

BITACORA DE OBRA

FECHA:	28	10	2024
	DIA	MES	AÑO

TRAMO Y/O SECTOR **CORREGIMIENTO BUENOS AIRES**

DEPARTAMENTO: **ANTIOQUIA**

CONTRATO DE INTERVENORIA No. : **4498-2023**

NOMBRE DE LA VIA: **CORREGIMIENTO BUENOS AIRES**

INTERVENTORIA: **ZAIDA DAYANA ORJUELA DIAZ**

CONTRATO DE OBRA No. 3225-2023

SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORIA: **MAURICIO HOYOS SIERRA**

OBJETO CONTRATO DE OBRA: **AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL CORREGIMIENTO BUENOS AIRES DEL MUNICIPIO DE ARBOLETES, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL**

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL CORREGIMIENTO BUENOS AIRES

VALOR CONTRATO OBRA: **$ 201.628.388,00**

ACTIVIDADES DE ESTABILIZACION DE LADERAS

ACTIVIDAD	UBICACIÓN

2. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA VIA

ACTIVIDAD	UBICACIÓN
SE FINALIZARON TODAS LAS ACTIVIDADES DE OBRA, FINALIZANDO 111M DE PLACA HUELLA	

3. OTRAS ACTIVIDADES

ACTIVIDAD	UBICACIÓN

4. ANOTACIONES

5. CANTIDADES DE OBRA APROXIMADAS

Descripcion	Unid.	Cant.

6. INFORME DE PERSONAL

Personal	Cant.
Director de obra	0
Ing. Residente de obra	1
Ing. Auxiliar de obra	0
Inspector de obra	0
Topografo	0
Aux. de Topografia	0
Laboratorista	0
Maestro de obra	0
Oficiales	0
Ayudantes	0
Auxiliar de Trafico	0
Conductores	0
Operadores de Equipos	0

7. INFORME DE EQUIPO

Equipo	Cant.
Retroexcavadora de oruga	0
Retroexcavadora de Llantas	0
Motoniveladora	0
Vibrocampactador	0
Mezcladora	0
Carrotanque	0
Volqueta (Dobletroque)	0
Volqueta (Sencilla)	0
Rana	0
texturizador y flota	0
Tronzadora	0
Rieles para placa huella	0
Planta electrica	0
Mezcladora	0

8. CONDICION CLIMATICA

Desde	Hasta	Lluvia	Seco
0:00	0:00		

Residente de obra	Residente de Interventoria
Nombre. SEBASTIAN RUIZ MESTRA	Nombre. CRISTIAN ANDRES COGOLLO PORRAS
Firma Sebastian Ruiz M	Firma

BITACORA DE OBRA

FECHA:	29	10	2024
	DIA	MES	AÑO

TRAMO Y/O SECTOR **CORREGIMIENTO BUENOS AIRES**

DEPARTAMENTO: **ANTIOQUIA**

CONTRATO DE INTERVENORIA No. : **4498-2023**

NOMBRE DE LA VIA: **CORREGIMIENTO BUENOS AIRES**

INTERVENTORIA: **ZAIDA DAYANA ORJUELA DIAZ**

CONTRATO DE OBRA No. 3225-2023

SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORIA: **MAURICIO HOYOS SIERRA**

OBJETO CONTRATO DE OBRA: **AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL CORREGIMIENTO BUENOS AIRES DEL MUNICIPIO DE ARBOLETES, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL**

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL CORREGIMIENTO BUENOS AIRES

VALOR CONTRATO OBRA: **$ 201.628.388,00**

ACTIVIDADES DE ESTABILIZACION DE LADERAS

ACTIVIDAD	UBICACIÓN

2. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA VIA

ACTIVIDAD	UBICACIÓN
SE FINALIZARON TODAS LAS ACTIVIDADES DE OBRA, FINALIZANDO 111M DE PLACA HUELLA	

3. OTRAS ACTIVIDADES

ACTIVIDAD	UBICACIÓN

4. ANOTACIONES

5. CANTIDADES DE OBRA APROXIMADAS

Descripcion	Unid.	Cant.

6. INFORME DE PERSONAL

Personal	Cant.
Director de obra	0
Ing. Residente de obra	1
Ing. Auxiliar de obra	0
Inspector de obra	0
Topografo	0
Aux. de Topografia	0
Laboratorista	0
Maestro de obra	0
Oficiales	0
Ayudantes	0
Auxiliar de Trafico	0
Conductores	0
Operadores de Equipos	0

7. INFORME DE EQUIPO

Equipo	Cant.
Retroexcavadora de oruga	0
Retroexcavadora de Llantas	0
Motoniveladora	0
Vibrocampactador	0
Mezcladora	0
Carrotanque	0
Volqueta (Dobletroque)	0
Volqueta (Sencilla)	0
Rana	0
texturizador y flota	0
Tronzadora	0
Rieles para placa huella	0
Planta electrica	0
Mezcladora	0

8. CONDICION CLIMATICA

Desde	Hasta	Lluvia	Seco
0:00	0:00		

Residente de obra	Residente de Interventoria
Nombre. SEBASTIAN RUIZ MESTRA	Nombre. CRISTIAN ANDRES COGOLLO PORRAS
Firma Sebastian Ruiz M	Firma

BITACORA DE OBRA

FECHA:	30	10	2024
	DIA	MES	AÑO

TRAMO Y/O SECTOR **CORREGIMIENTO BUENOS AIRES**

DEPARTAMENTO: **ANTIOQUIA**

CONTRATO DE INTERVENORIA No. : **4498-2023**

NOMBRE DE LA VIA: **CORREGIMIENTO BUENOS AIRES**

INTERVENTORIA: **ZAIDA DAYANA ORJUELA DIAZ**

CONTRATO DE OBRA No. 3225-2023

SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORIA: **MAURICIO HOYOS SIERRA**

OBJETO CONTRATO DE OBRA: **AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL CORREGIMIENTO BUENOS AIRES DEL MUNICIPIO DE ARBOLETES, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL**

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL CORREGIMIENTO BUENOS AIRES

VALOR CONTRATO OBRA: **$ 201.628.388,00**

ACTIVIDADES DE ESTABILIZACION DE LADERAS

ACTIVIDAD	UBICACIÓN

2. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA VIA

ACTIVIDAD	UBICACIÓN
SE FINALIZARON TODAS LAS ACTIVIDADES DE OBRA, FINALIZANDO 111M DE PLACA HUELLA	

3. OTRAS ACTIVIDADES

ACTIVIDAD	UBICACIÓN

4. ANOTACIONES

5. CANTIDADES DE OBRA APROXIMADAS

Descripcion	Unid.	Cant.

6.4 Informes semanales

Carrera 9 No 20-64 Of. 03
Teléfonos: 317-6404558
zaidaorjuela@gmail.com
Cartagena de Indias

SEMANA 5

Carrera 9 No 20-64 Of. 03
Teléfonos: 317-6404558
zaidaorjuela@gmail.com
Cartagena de Indias

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME SEMANAL	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

FECHA: 3/10/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: PLACA HUELLA VREDA LAS CRUCES

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: ANTIOQUIA — SEMANA No.: 5 del 27/09/2024 al 3/10/2024 (Numeración consecutiva) — Último Informe Semanal SI ☐

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: ING. MAURICIO HOYOS SIERRA — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO:

OBJETO CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL CORREGIMIENTO BUENOS AIRES DEL MUNICIPIO DE ARBOLETES, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

TRAMO 1: PR 0+000 AL PR 0+120 120ml de placa huella de un ancho de 4.5 m, Y UNA ALCANTARILLA DE 36"

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

se realizara mediante la ejecución de las siguientes actividades: Excavaciones varias sin clasificar, o, subbase granular, concreto clase D para huellas y cunetas para la construccion de placas huellas en puntos criticos a lo largo del corredor priorizado en el proyecto,

CONVENIO SOLIDARIO:

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL CORREGIMIENTO BUENOS AIRES

CONVENIO No. CONVENIO 3225-2023
FECHA DE INICIO: 21/12/2023
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2023
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 30/10/2024

VALOR INICIAL: $ 201.628.388,00
VALOR ADICIONES: $ -
VALOR ACUMULADO: $ 201.628.388,00

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR: ING. ZAIDA DAYANA ORJUELA DIAZ
INTEGRANTES:

CONTRATO No. 4495-2023
FECHA DE INICIO: 27/11/2023
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2023
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 30/10/2024

VALOR INICIAL: $ 57.730.002,00
VALOR ADICIONES:
VALOR ACUMULADO: $ 57.730.002,00
VALOR ANTICIPO: N.A
VALOR AMORTIZADO: N.A
SALDO POR AMORTIZAR: N.A

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONVENIO/ CONTRATO	VIGENCIA	2023	20XX	20XX	20XX
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 201.628.388			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 94.990.914			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 106.637.474			
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 57.730.002			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 44.417.694			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 13.312.308			

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

CONVENIO

VALOR BÁSICO CONVENIO (A):	$ 201.628.388,00	100%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 92.712.053,55	45,98%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 90.990.914,45	45,13%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ (1.721.139,11)	-0,85%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:	$ 4.000.000,00	1,98%
(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)		
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 96.712.053,55	47,97%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 94.990.914,45	47,11%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ (1.721.139,11)	-0,85%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 38.324.813,02	19,01%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 33.258.227,24	16,49%

Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 44.407.694	76,92%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 44.417.694	76,94%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 4.440.769,38	7,69%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 4.340.769,38	7,52%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %: 47,97% — Avance o Atraso Físico %: -0,85%
Meta Física Ejecutada %: 47,11%

Meta Física (Programa de Obra)		
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad
CONSTRUCCION PLACA HUELLA EN CONCRETO		
Excavaciones varias sin Clasificar	M3	4,90
Subbase Granular Clase C	M3	127,60
Concreto reforzado resistencia 21 MPA (D) - mezcla in situ	M3	81,90
Concreto Ciclópeo Resistencia 14MPa (G)	M3	45,40
Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI).	KG	3839,00
CONSTRUCCION ALCANTARILLA		
Excavaciones varias sin Clasificar	M3	46,50
Excavaciones en roca en seco	M3	8,20
Concreto reforzado resistencia 14 Mpa (F) - mezcla in situ	M3	0,50
Concreto reforzado resistencia 21 MPa (D) - mezcla in situ	M3	9,60
Acero de Refuerzo Fy 4200 Mpa	KG	579,00
Relleno para Estructuras con Suelo	M3	25,40
Tubería de Concreto Reforzado 21 Mpa de 900 mm de diámetro interior	M	6,00
Relleno para Estructuras con material producto de la excavación	M3	32,00
*		

Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Prog	1,50			1,50	30,6%
Ejec	1,00			1,00	20,4%
Prog	127,60			127,60	100,0%
Ejec	111,00			111,00	87,0%
Prog	14,96			29,92	36,5%
Ejec	13,98			27,90	34,1%
Prog	6,48			12,96	28,5%
Ejec	6,25			12,50	27,5%
Prog	494,14			2364,80	61,6%
Ejec	493,20			2001,12	52,1%
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
MOTONIVELADORA		
COMPACTADOR		
MINICARGADOR		
VOLQUETA 1		
VOLQUETA 2		
VIBRO DE CONCRET	1	
MEZCLADORA	1	
PULIDORA	1	
RETRO DE LLANTA		
Total	3	

Se debe relacionar la maquinaria y equipo presente en campo para la ejecución de las actividades según el anexo técnico

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra incluido la revisión de los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1: PR 0+000 AL PR 0+139
TRAMO Y/O SECTOR 2:
TRAMO Y/O SECTOR (n):

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

			DISPONIBLE		
UBICACIÓN:	CORREGIMIENTO AGUAS CLARAS	PERMISO MINERO: SI	X	NO	
	MUNICIPIO DE MONTRIA	LICENCIA AMBIENTAL: SI	X	NO	
UBICACIÓN:		PERMISO MINERO: SI		NO	
		LICENCIA AMBIENTAL: SI		NO	

OBSERVACIONES: LA JAC SE ENCUENTRA RECOPILANDO LA INFORMACION DE LA FUENTE DE MATERIALES

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI	NO	N/A	
LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	N/A	
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI	NO	N/A	
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI	NO	N/A	
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI	NO	N/A	
VERTIMIENTOS:	SI	NO	N/A	
EMISIONES:	SI	NO	N/A	
OTROS (Especificar cual)	SI	NO	N/A	

OBSERVACIONES: SE LE INFORMA A LA JAC QUE SI EL MUNICIPIO NO CUENTA CON UNA ZONA DE DISPOSICIÓN DE MATERIALES SE PUEDE DISPONER DE ALGUN PREDIO EN LA ZONA EL CUAL CUENTE CON UN PERMISO DEL PROPIETARIO.

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: LA JAC SE ENCUENTRA EN ELABORACION DEL DOCUMENTO

OBSERVACIONES: :

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	7	2
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	2	2
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	5	

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 9

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 1

No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:

ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS:

DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES:


VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

1, CONTINUAR CON CONCRETO PARA HUELLAS
2, CONTINUAR CON CONCRETO CICLOPEO PARA CONTRAHUELLAS Y SOBREANCHOS
3 CONTINUAR FIGURADO Y AMARRE DE ACERO PARA HUELLAS Y CUNETAS

VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

1, CONTINUAR CON CONCRETO PARA HUELLAS
2, CONTINUAR CON CONCRETO CICLOPEO PARA CONTRAHUELLAS Y SOBREANCHOS
3 CONTINUAR FIGURADO Y AMARRE DE ACERO PARA HUELLAS Y CUNETAS

VIII. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

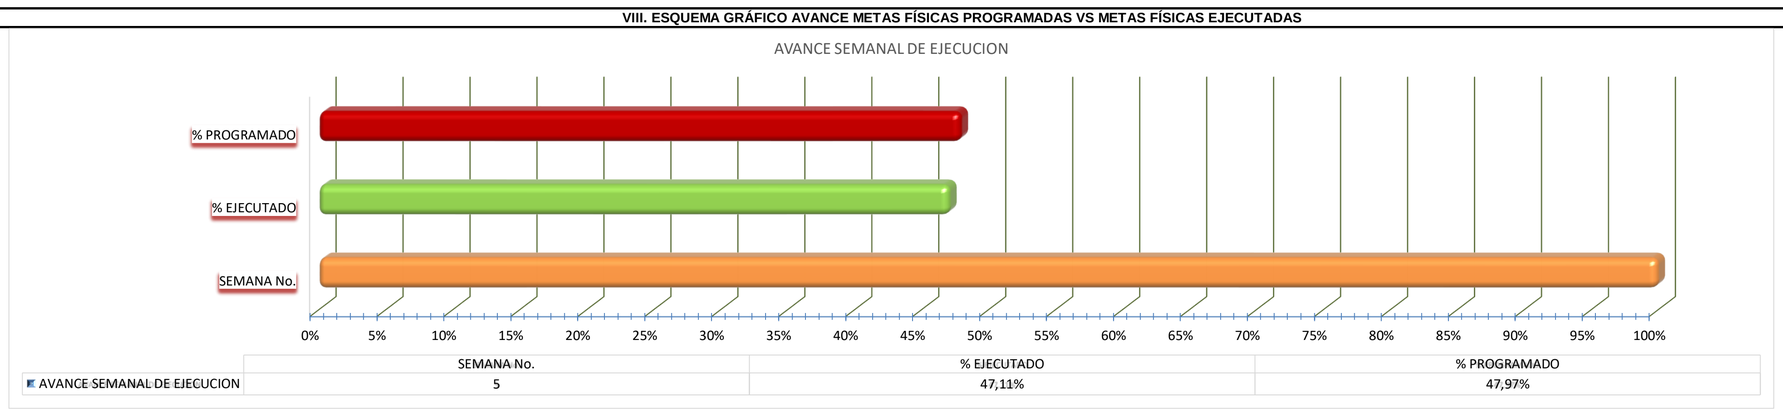

	SEMANA No.	% EJECUTADO	% PROGRAMADO
AVANCE SEMANAL DE EJECUCION	5	47,11%	47,97%

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del convenio

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



Formaleteo



vaceado de las huellas



Tramo 1

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA

1. ACOMPAÑAMIENTO A LAS JAC SOBRE METODOLOGIA Y DOCUMENTACION PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO
2, SE REVIZA DOCUMENTACION ENTREGADA POR LA JAC
3, SE REALIZA ACOMPAÑAMIENTO PARA ESTUDIOS Y DISEÑOS

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA

NOMBRE: ZAIDA DAYANA ORJUELA DIAZ

Matrícula Profesional No.: 68202-112219 STD

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

SEMANA 6

Carrera 9 No 20-64 Of. 03
Teléfonos: 317-6404558
zaidaorjuela@gmail.com
Cartagena de Indias

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE **INFORME SEMANAL**	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

FECHA: 10/10/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: PLACA HUELLA VREDA LAS CRUCES

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: ANTIOQUIA — SEMANA No.: 6 del 4/10/2024 al 10/10/2024 (Numeración consecutiva) — Último Informe Semanal SI ☐

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: ING. MAURICIO HOYOS SIERRA — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO:

OBJETO CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL CORREGIMIENTO BUENOS AIRES DEL MUNICIPIO DE ARBOLETES, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

TRAMO 1: PR 0+000 AL PR 0+120 120ml de placa huella de un ancho de 4.5 m, Y UNA ALCANTARILLA DE 36"

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

se realizara mediante la ejecución de las siguientes actividades: Excavaciones varias sin clasificar, o, subbase granular, concreto clase D para huellas y cunetas para la construccion de placas huellas en puntos criticos a lo largo del corredor priorizado en el proyecto,

CONVENIO SOLIDARIO:

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL CORREGIMIENTO BUENOS AIRES

CONVENIO No. CONVENIO 3225-2023
FECHA DE INICIO: 21/12/2023
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2023
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 30/10/2024

VALOR INICIAL: $ 201.628.388,00
VALOR ADICIONES: $ -
VALOR ACUMULADO: $ 201.628.388,00

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR: ING. ZAIDA DAYANA ORJUELA DIAZ
INTEGRANTES:

CONTRATO No. 4495-2023
FECHA DE INICIO: 27/11/2023
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2023
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 30/10/2024

VALOR INICIAL: $ 57.730.002,00
VALOR ADICIONES:
VALOR ACUMULADO: $ 57.730.002,00
VALOR ANTICIPO: N.A
VALOR AMORTIZADO: N.A
SALDO POR AMORTIZAR: N.A

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONVENIO/ CONTRATO	VIGENCIA	2023	20XX	20XX	20XX
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 201.628.388			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 128.249.142			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 73.379.246			
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 57.730.002			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 48.978.463			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 8.751.539			

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

CONVENIO

VALOR BÁSICO CONVENIO (A):	$ 201.628.388,00	100%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 125.970.280,79	62,48%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 124.249.141,69	61,62%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ (1.721.139,11)	-0,85%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:	$ 4.000.000,00	1,98%
(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)		
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 129.970.280,79	64,46%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 128.249.141,69	63,61%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ (1.721.139,11)	-0,85%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 38.324.813,02	19,01%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 35.652.367,00	17,68%

Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 48.848.463	84,62%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 48.978.463	84,84%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 4.440.769,38	7,69%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 4.340.769,38	7,52%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %: 64,46% — Avance o Atraso Físico %: -0,85%
Meta Física Ejecutada %: 63,61%

Meta Física (Programa de Obra)		
Descripción de la Meta Física Contractual	**Unidad**	**Cantidad**
CONSTRUCCION PLACA HUELLA EN CONCRETO		
Excavaciones varias sin Clasificar	M3	4,90
Subbase Granular Clase C	M3	127,60
Concreto reforzado resistencia 21 MPA (D) - mezcla in situ	M3	81,90
Concreto Ciclópeo Resistencia 14MPa (G)	M3	45,40
Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI).	KG	3839,00
CONSTRUCCION ALCANTARILLA		
Excavaciones varias sin Clasificar	M3	46,50
Excavaciones en roca en seco	M3	8,20
Concreto reforzado resistencia 14 Mpa (F) - mezcla in situ	M3	0,50
Concreto reforzado resistencia 21 MPa (D) - mezcla in situ	M3	9,60
Acero de Refuerzo Fy 4200 Mpa	KG	579,00
Relleno para Estructuras con Suelo	M3	25,40
Tubería de Concreto Reforzado 21 Mpa de 900 mm de diámetro interior	M	6,00
Relleno para Estructuras con material producto de la excavación	M3	32,00
*		

Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Avance Físico	**Tramo y/o sector 1**	**Tramo y/o sector 2**	**Tramo y/o sector (n)**	**Total**	**%**
Prog	1,50			1,50	30,6%
Ejec	1,00			1,00	20,4%
Prog	127,60			127,60	100,0%
Ejec	111,00			111,00	87,0%
Prog	14,96			59,84	73,1%
Ejec	13,98			55,80	68,1%
Prog	6,48			25,92	57,1%
Ejec	6,25			25,00	55,1%
Prog	494,14			4729,60	123,2%
Ejec	493,20			4002,24	104,3%
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
MOTONIVELADORA		
COMPACTADOR		
MINICARGADOR		
VOLQUETA 1		
VOLQUETA 2		
VIBRO DE CONCRET	1	
MEZCLADORA	1	
PULIDORA	1	
RETRO DE LLANTA		
Total	3	

Se debe relacionar la maquinaria y equipo presente en campo para la ejecución de las actividades según el anexo técnico

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra incluido la revisión de los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1: PR 0+000 AL PR 0+139
TRAMO Y/O SECTOR 2:
TRAMO Y/O SECTOR (n):

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

			DISPONIBLE		
UBICACIÓN:	CORREGIMIENTO AGUAS CLARAS	PERMISO MINERO: SI	X	NO	
	MUNICIPIO DE MONTRIA	LICENCIA AMBIENTAL: SI	X	NO	
UBICACIÓN:		PERMISO MINERO: SI		NO	
		LICENCIA AMBIENTAL: SI		NO	

OBSERVACIONES: LA JAC SE ENCUENTRA RECOPILANDO LA INFORMACION DE LA FUENTE DE MATERIALES

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI	NO	N/A	
LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	N/A	
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI	NO	N/A	
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI	NO	N/A	
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI	NO	N/A	
VERTIMIENTOS:	SI	NO	N/A	
EMISIONES:	SI	NO	N/A	
OTROS (Especificar cual)	SI	NO	N/A	

OBSERVACIONES: SE LE INFORMA A LA JAC QUE SI EL MUNICIPIO NO CUENTA CON UNA ZONA DE DISPOSICIÓN DE MATERIALES SE PUEDE DISPONER DE ALGUN PREDIO EN LA ZONA EL CUAL CUENTE CON UN PERMISO DEL PROPIETARIO.

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: LA JAC ENTREGA PARA REVISION DEL DOCUMENTO POR PARTE DE INTERVENTORIA

OBSERVACIONES: :

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	6	2
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	2	2
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	4	

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 8

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 1

No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:

ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS:

DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES:


VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

1, CONTINUAR CON CONCRETO PARA HUELLAS
2, CONTINUAR CON CONCRETO CICLOPEO PARA CONTRAHUELLAS Y SOBREANCHOS
3 CONTINUAR FIGURADO Y AMARRE DE ACERO PARA HUELLAS Y CUNETAS

VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

1, CONTINUAR CON CONCRETO PARA HUELLAS
2, CONTINUAR CON CONCRETO CICLOPEO PARA CONTRAHUELLAS Y SOBREANCHOS
3 CONTINUAR FIGURADO Y AMARRE DE ACERO PARA HUELLAS Y CUNETAS

VIII. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

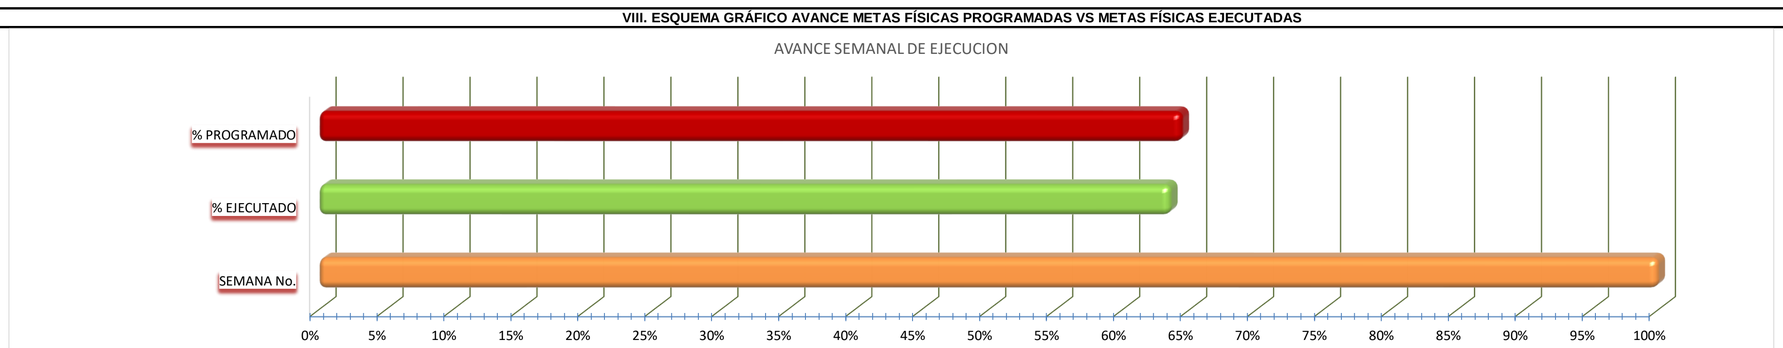

	SEMANA No.	% EJECUTADO	% PROGRAMADO
AVANCE SEMANAL DE EJECUCION	6	63,61%	64,46%

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del convenio

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



Colocacion de pieda sobre ancho



vaceado de piedra sobre ancho



Tramo 1

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA

1. ACOMPAÑAMIENTO A LAS JAC SOBRE METODOLOGIA Y DOCUMENTACION PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO
2, SE REVIZA DOCUMENTACION ENTREGADA POR LA JAC
3, SE REALIZA ACOMPAÑAMIENTO PARA ESTUDIOS Y DISEÑOS

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA

NOMBRE: ZAIDA DAYANA ORJUELA DIAZ

Matrícula Profesional No.: 68202-112219 STD

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

SEMANA 7

Carrera 9 No 20-64 Of. 03
Teléfonos: 317-6404558
zaidaorjuela@gmail.com
Cartagena de Indias

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE **INFORME SEMANAL**	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

FECHA: 17/10/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: PLACA HUELLA VREDA LAS CRUCES

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: ANTIOQUIA — SEMANA No.: 7 del 11/10/2024 al 17/10/2024 (Numeración consecutiva) — Último Informe Semanal SI ☐

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: ING. MAURICIO HOYOS SIERRA — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO:

OBJETO CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL CORREGIMIENTO BUENOS AIRES DEL MUNICIPIO DE ARBOLETES, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

TRAMO 1: PR 0+000 AL PR 0+120 120ml de placa huella de un ancho de 4.5 m, Y UNA ALCANTARILLA DE 36"

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

se realizara mediante la ejecución de las siguientes actividades: Excavaciones varias sin clasificar, o, subbase granular, concreto clase D para huellas y cunetas para la construccion de placas huellas en puntos criticos a lo largo del corredor priorizado en el proyecto,

CONVENIO SOLIDARIO:

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL CORREGIMIENTO BUENOS AIRES

CONVENIO No. CONVENIO 3225-2023
FECHA DE INICIO: 21/12/2023
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2023
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 30/10/2024

VALOR INICIAL: $ 201.628.388,00
VALOR ADICIONES: $ -
VALOR ACUMULADO: $ 201.628.388,00

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR: ING. ZAIDA DAYANA ORJUELA DIAZ
INTEGRANTES:

CONTRATO No. 4495-2023
FECHA DE INICIO: 27/11/2023
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2023
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 30/10/2024

VALOR INICIAL: $ 57.730.002,00
VALOR ADICIONES:
VALOR ACUMULADO: $ 57.730.002,00
VALOR ANTICIPO: N.A
VALOR AMORTIZADO: N.A
SALDO POR AMORTIZAR: N.A

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONVENIO/ CONTRATO	VIGENCIA		2023	20XX	20XX	20XX
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA		$ 201.628.388			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA		$ 161.507.369			
	SALDO DE VIGENCIA		$ 40.121.019			
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA		$ 57.730.002			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA		$ 53.304.232			
	SALDO DE VIGENCIA		$ 4.425.770			

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

CONVENIO

VALOR BÁSICO CONVENIO (A):	$ 201.628.388,00	100%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 159.228.508,04	78,97%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 157.507.368,93	78,12%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ (1.721.139,11)	-0,85%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:	$ 4.000.000,00	1,98%
(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)		
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 163.228.508,04	80,96%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 161.507.368,93	80,10%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ (1.721.139,11)	-0,85%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 38.324.813,02	19,01%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 33.258.227,24	16,49%

Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 53.289.232	92,31%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 53.304.232	92,33%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 4.440.769,38	7,69%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 4.340.769,38	7,52%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %: 80,96% — Avance o Atraso Físico %: -0,85%
Meta Física Ejecutada %: 80,10%

Meta Física (Programa de Obra)		
Descripción de la Meta Física Contractual	**Unidad**	**Cantidad**
CONSTRUCCION PLACA HUELLA EN CONCRETO		
Excavaciones varias sin Clasificar	M3	4,90
Subbase Granular Clase C	M3	127,60
Concreto reforzado resistencia 21 MPA (D) - mezcla in situ	M3	81,90
Concreto Ciclópeo Resistencia 14MPa (G)	M3	45,40
Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI).	KG	3839,00
CONSTRUCCION ALCANTARILLA		
Excavaciones varias sin Clasificar	M3	46,50
Excavaciones en roca en seco	M3	8,20
Concreto reforzado resistencia 14 Mpa (F) - mezcla in situ	M3	0,50
Concreto reforzado resistencia 21 MPa (D) - mezcla in situ	M3	9,60
Acero de Refuerzo Fy 4200 Mpa	KG	579,00
Relleno para Estructuras con Suelo	M3	25,40
Tubería de Concreto Reforzado 21 Mpa de 900 mm de diámetro interior	M	6,00
Relleno para Estructuras con material producto de la excavación	M3	32,00
*		

Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Avance Físico	**Tramo y/o sector 1**	**Tramo y/o sector 2**	**Tramo y/o sector (n)**	**Total**	**%**
Prog	1,50			1,50	30,6%
Ejec	1,00			1,00	20,4%
Prog	127,60			127,60	100,0%
Ejec	111,00			111,00	87,0%
Prog	14,96			59,84	73,1%
Ejec	13,98			55,80	68,1%
Prog	6,48			25,92	57,1%
Ejec	6,25			25,00	55,1%
Prog	494,14			4729,60	123,2%
Ejec	493,20			4002,24	104,3%
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
MOTONIVELADORA		
COMPACTADOR		
MINICARGADOR		
VOLQUETA 1		
VOLQUETA 2		
VIBRO DE CONCRET	1	
MEZCLADORA	1	
PULIDORA	1	
RETRO DE LLANTA		
Total	3	

Se debe relacionar la maquinaria y equipo presente en campo para la ejecución de las actividades según el anexo técnico

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra incluido la revisión de los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1: PR 0+000 AL PR 0+139
TRAMO Y/O SECTOR 2:
TRAMO Y/O SECTOR (n):

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

			DISPONIBLE		
UBICACIÓN:	CORREGIMIENTO AGUAS CLARAS	PERMISO MINERO: SI	X	NO	
	MUNICIPIO DE MONTRIA	LICENCIA AMBIENTAL: SI	X	NO	
UBICACIÓN:		PERMISO MINERO: SI		NO	
		LICENCIA AMBIENTAL: SI		NO	

OBSERVACIONES: LA JAC SE ENCUENTRA RECOPILANDO LA INFORMACION DE LA FUENTE DE MATERIALES

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI	NO	N/A	
LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	N/A	
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI	NO	N/A	
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI	NO	N/A	
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI	NO	N/A	
VERTIMIENTOS:	SI	NO	N/A	
EMISIONES:	SI	NO	N/A	
OTROS (Especificar cual)	SI	NO	N/A	

OBSERVACIONES: SE LE INFORMA A LA JAC QUE SI EL MUNICIPIO NO CUENTA CON UNA ZONA DE DISPOSICIÓN DE MATERIALES SE PUEDE DISPONER DE ALGUN PREDIO EN LA ZONA EL CUAL CUENTE CON UN PERMISO DEL PROPIETARIO.

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: LA JAC ENTREGA PARA REVISION DEL DOCUMENTO POR PARTE DE INTERVENTORIA

OBSERVACIONES: :

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	6	2
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	2	2
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	4	

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 8

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 1

No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:

ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS:

DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES:


VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

1, CONTINUAR CON CONCRETO PARA HUELLAS
2, CONTINUAR CON CONCRETO CICLOPEO PARA CONTRAHUELLAS Y SOBREANCHOS
3 CONTINUAR FIGURADO Y AMARRE DE ACERO PARA HUELLAS Y CUNETAS

VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

1, CONTINUAR CON CONCRETO PARA HUELLAS
2, CONTINUAR CON CONCRETO CICLOPEO PARA CONTRAHUELLAS Y SOBREANCHOS
3 CONTINUAR FIGURADO Y AMARRE DE ACERO PARA HUELLAS Y CUNETAS

VIII. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

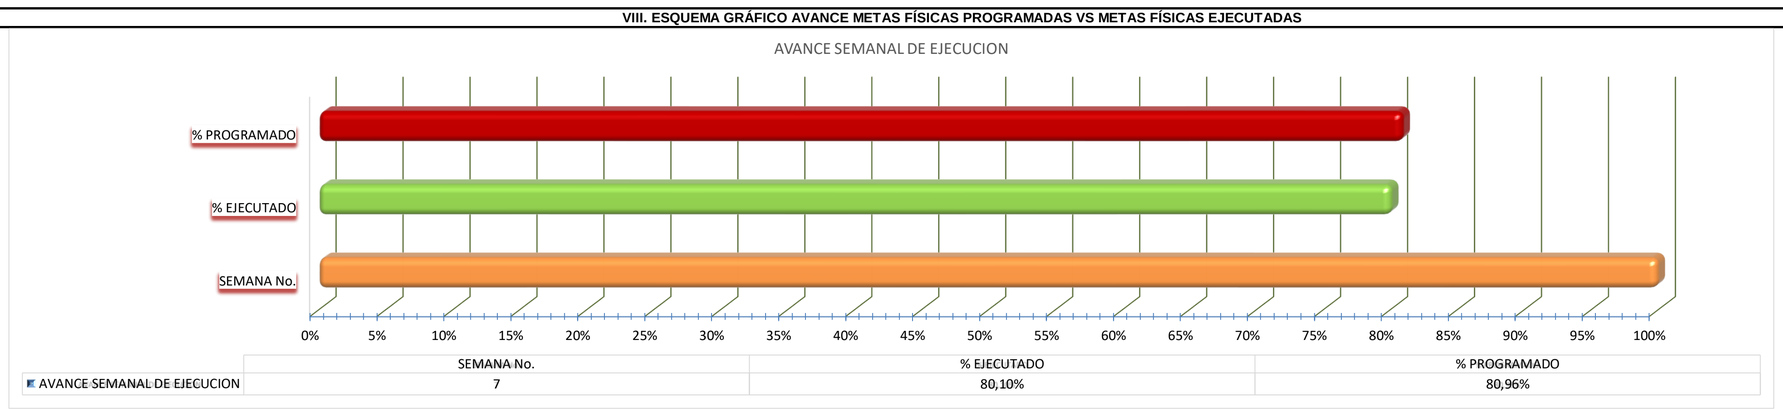

	SEMANA No.	% EJECUTADO	% PROGRAMADO
AVANCE SEMANAL DE EJECUCION	7	80,10%	80,96%

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del convenio

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



Armado de acero para cunetas



Se presentan lluvias en la obra



Cunetas terminadas

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA

1. ACOMPAÑAMIENTO A LAS JAC SOBRE METODOLOGIA Y DOCUMENTACION PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO
2, SE REVIZA DOCUMENTACION ENTREGADA POR LA JAC
3, SE REALIZA ACOMPAÑAMIENTO PARA ESTUDIOS Y DISEÑOS

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA

NOMBRE: ZAIDA DAYANA ORJUELA DIAZ

Matrícula Profesional No.: 68202-112219 STD

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

SEMANA 8

Carrera 9 No 20-64 Of. 03
Teléfonos: 317-6404558
zaidaorjuela@gmail.com
Cartagena de Indias

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME SEMANAL	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

FECHA: 24/10/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: PLACA HUELLA VREDA LAS CRUCES

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: ANTIOQUIA — SEMANA No.: 8 del 18/10/2024 al 24/10/2024 (Numeración consecutiva) — Último Informe Semanal SI ☐

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: ING. MAURICIO HOYOS SIERRA — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO:

OBJETO CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL CORREGIMIENTO BUENOS AIRES DEL MUNICIPIO DE ARBOLETES, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

TRAMO 1: PR 0+000 AL PR 0+120 120ml de placa huella de un ancho de 4.5 m, Y UNA ALCANTARILLA DE 36"

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

se realizara mediante la ejecución de las siguientes actividades: Excavaciones varias sin clasificar, o, subbase granular, concreto clase D para huellas y cunetas para la construccion de placas huellas en puntos criticos a lo largo del corredor priorizado en el proyecto,

CONVENIO SOLIDARIO:

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL CORREGIMIENTO BUENOS AIRES

CONVENIO No. CONVENIO 3225-2023
FECHA DE INICIO: 21/12/2023
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2023
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 30/10/2024

VALOR INICIAL: $ 201.628.388,00
VALOR ADICIONES: $ -
VALOR ACUMULADO: $ 201.628.388,00

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR: ING. ZAIDA DAYANA ORJUELA DIAZ
INTEGRANTES:

CONTRATO No. 4495-2023
FECHA DE INICIO: 27/11/2023
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2023
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 30/10/2024

VALOR INICIAL: $ 57.730.002,00
VALOR ADICIONES:
VALOR ACUMULADO: $ 57.730.002,00
VALOR ANTICIPO: N.A
VALOR AMORTIZADO: N.A
SALDO POR AMORTIZAR: N.A

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONVENIO/ CONTRATO	VIGENCIA		2023	20XX	20XX	20XX
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA		$ 201.628.388			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA		$ 198.271.374			
	SALDO DE VIGENCIA		$ 3.357.014			
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA		$ 57.730.002			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA		$ 55.424.617			
	SALDO DE VIGENCIA		$ 2.305.385			

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

CONVENIO

VALOR BÁSICO CONVENIO (A):	$ 201.628.388,00	100%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 195.992.513,32	97,20%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 194.271.374,21	96,35%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ (1.721.139,11)	-0,85%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:	$ 4.000.000,00	1,98%
(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)		
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 199.992.513,32	99,19%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 198.271.374,21	98,34%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ (1.721.139,11)	-0,85%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 8.572.363,82	4,25%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 8.572.363,82	4,25%

Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 55.509.617	96,15%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 55.424.617	96,01%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 4.440.769,38	7,69%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 4.340.769,38	7,52%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %: 99,19% — Avance o Atraso Físico %: -0,85%
Meta Física Ejecutada %: 98,34%

Meta Física (Programa de Obra)		
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad
CONSTRUCCION PLACA HUELLA EN CONCRETO		
Excavaciones varias sin Clasificar	M3	4,90
Subbase Granular Clase C	M3	127,60
Concreto reforzado resistencia 21 MPA (D) - mezcla in situ	M3	81,90
Concreto Ciclópeo Resistencia 14MPa (G)	M3	45,40
Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI).	KG	3839,00
CONSTRUCCION ALCANTARILLA		
Excavaciones varias sin Clasificar	M3	46,50
Excavaciones en roca en seco	M3	8,20
Concreto reforzado resistencia 14 Mpa (F) - mezcla in situ	M3	0,50
Concreto reforzado resistencia 21 MPa (D) - mezcla in situ	M3	9,60
Acero de Refuerzo Fy 4200 Mpa	KG	579,00
Relleno para Estructuras con Suelo	M3	25,40
Tubería de Concreto Reforzado 21 Mpa de 900 mm de diámetro interior	M	6,00
Relleno para Estructuras con material producto de la excavación	M3	32,00
*		

Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Prog	1,50			1,50	30,6%
Ejec	1,00			1,00	20,4%
Prog	127,60			127,60	100,0%
Ejec	111,00			111,00	87,0%
Prog	14,96			59,84	73,1%
Ejec	13,98			55,80	68,1%
Prog	6,48			40,20	88,5%
Ejec	6,25			43,20	95,2%
Prog	494,14			4729,60	123,2%
Ejec	493,20			4002,24	104,3%
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
MOTONIVELADORA		
COMPACTADOR		
MINICARGADOR		
VOLQUETA 1		
VOLQUETA 2		
VIBRO DE CONCRET	1	
MEZCLADORA	1	
PULIDORA	1	
RETRO DE LLANTA		
Total	3	

Se debe relacionar la maquinaria y equipo presente en campo para la ejecución de las actividades según el anexo técnico

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra incluido la revisión de los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1: PR 0+000 AL PR 0+139 — TRAMO Y/O SECTOR 2:

TRAMO Y/O SECTOR (n):

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

			DISPONIBLE		
UBICACIÓN:	CORREGIMIENTO AGUAS CLARAS	PERMISO MINERO:	SI X	NO	
	MUNICIPIO DE MONTRIA	LICENCIA AMBIENTAL:	SI X	NO	
UBICACIÓN:		PERMISO MINERO:	SI	NO	
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	

OBSERVACIONES: LA JAC SE ENCUENTRA RECOPILANDO LA INFORMACION DE LA FUENTE DE MATERIALES

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI		NO		N/A
LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO		N/A
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO		N/A
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO		N/A
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO		N/A
VERTIMIENTOS:	SI		NO		N/A
EMISIONES:	SI		NO		N/A
OTROS (Especificar cual)	SI		NO		N/A

OBSERVACIONES: SE LE INFORMA A LA JAC QUE SI EL MUNICIPIO NO CUENTA CON UNA ZONA DE DISPOSICIÓN DE MATERIALES SE PUEDE DISPONER DE ALGUN PREDIO EN LA ZONA EL CUAL CUENTE CON UN PERMISO DEL PROPIETARIO.

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: LA JAC ENTREGA PARA REVISION DEL DOCUMENTO POR PARTE DE INTERVENTORIA

OBSERVACIONES: :

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	6	2
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	2	2
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	4	

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 8

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 1

No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:

ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS:

DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:


OBSERVACIONES:

VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

1, CONTINUAR CON CONCRETO PARA BORDILLOS
2, CONTINUAR CON CONCRETO PARA RAMPA ACCESO

VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

VIII. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

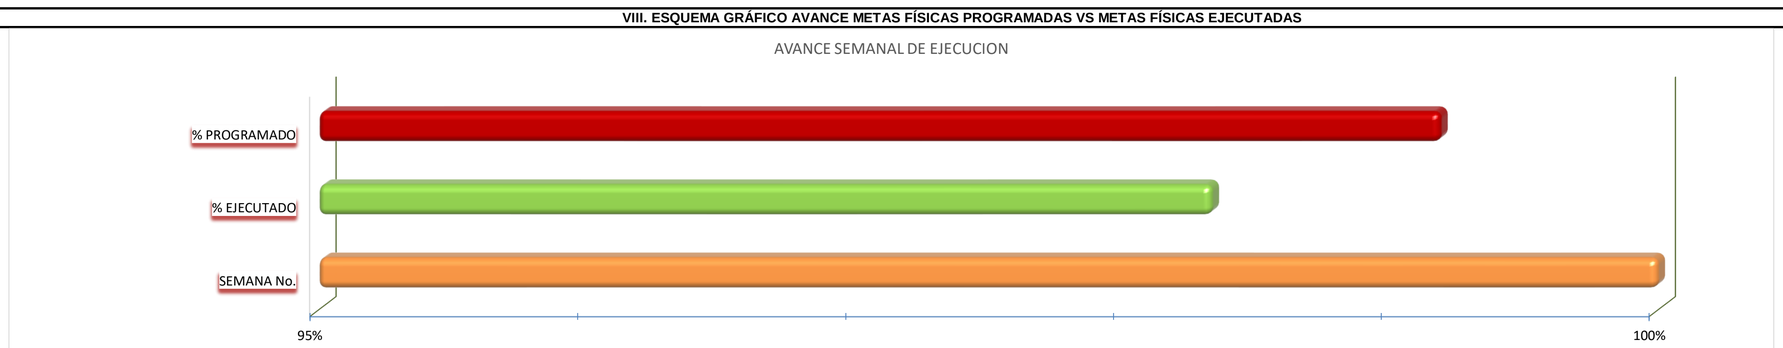

	SEMANA No.	% EJECUTADO	% PROGRAMADO
AVANCE SEMANAL DE EJECUCION	8	98,34%	99,19%

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del convenio

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



Vaceado de bordillo



Tramo 1



Tramo 1 terminado

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA

1. ACOMPAÑAMIENTO A LAS JAC SOBRE METODOLOGIA Y DOCUMENTACION PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO
2, SE REVIZA DOCUMENTACION ENTREGADA POR LA JAC
3, SE REALIZA ACOMPAÑAMIENTO PARA ESTUDIOS Y DISEÑOS

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA

NOMBRE: ZAIDA DAYANA ORJUELA DIAZ

Matrícula Profesional No.: 68202-112219 STD

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

SEMANA 9

Carrera 9 No 20-64 Of. 03
Teléfonos: 317-6404558
zaidaorjuela@gmail.com
Cartagena de Indias

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE **INFORME SEMANAL**	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

FECHA: 30/10/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: PLACA HUELLA VREDA LAS CRUCES

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: ANTIOQUIA — SEMANA No.: 9 del 24/10/2024 al 30/10/2024 (Numeración consecutiva) — Último Informe Semanal SI ☐

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: ING. MAURICIO HOYOS SIERRA — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO:

OBJETO CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL CORREGIMIENTO BUENOS AIRES DEL MUNICIPIO DE ARBOLETES, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

TRAMO 1: PR 0+000 AL PR 0+120 120ml de placa huella de un ancho de 4.5 m, Y UNA ALCANTARILLA DE 36"

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

se realizara mediante la ejecución de las siguientes actividades: Excavaciones varias sin clasificar, o, subbase granular, concreto clase D para huellas y cunetas para la construccion de placas huellas en puntos criticos a lo largo del corredor priorizado en el proyecto,

CONVENIO SOLIDARIO:

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL CORREGIMIENTO BUENOS AIRES

CONVENIO No. CONVENIO 3225-2023
FECHA DE INICIO: 21/12/2023
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2023
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 30/10/2024

VALOR INICIAL: $ 201.628.388,00
VALOR ADICIONES: $ -
VALOR ACUMULADO: $ 201.628.388,00

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR: ING. ZAIDA DAYANA ORJUELA DIAZ
INTEGRANTES:

CONTRATO No. 4495-2023
FECHA DE INICIO: 27/11/2023
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2023
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 30/10/2024

VALOR INICIAL: $ 57.730.002,00
VALOR ADICIONES:
VALOR ACUMULADO: $ 57.730.002,00
VALOR ANTICIPO: N.A
VALOR AMORTIZADO: N.A
SALDO POR AMORTIZAR: N.A

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONVENIO/ CONTRATO	VIGENCIA	2023	20XX	20XX	20XX
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 201.628.388			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 198.271.374			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 3.357.014			
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 57.730.002			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 57.545.002			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 185.000			

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

CONVENIO

VALOR BÁSICO CONVENIO (A):	$ 201.628.388,00	100%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 201.628.388,00	100,00%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 194.271.374,21	96,35%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ (7.357.013,79)	-3,65%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:	$ 4.000.000,00	1,98%
(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)		
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 201.628.388,00	100,00%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 198.271.374,21	98,34%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ (3.357.013,79)	-1,66%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 8.572.363,82	4,25%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 8.572.363,82	4,25%

Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 57.730.002	100,00%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 57.545.002	99,68%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 4.440.769,38	7,69%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 4.340.769,38	7,52%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %: 100,00% — Avance o Atraso Físico %: -1,66%
Meta Física Ejecutada %: 98,34%

Meta Física (Programa de Obra)		
Descripción de la Meta Física Contractual	**Unidad**	**Cantidad**
CONSTRUCCION PLACA HUELLA EN CONCRETO		
Excavaciones varias sin Clasificar	M3	4,90
Subbase Granular Clase C	M3	127,60
Concreto reforzado resistencia 21 MPA (D) - mezcla in situ	M3	81,90
Concreto Ciclópeo Resistencia 14MPa (G)	M3	45,40
Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI).	KG	3839,00
CONSTRUCCION ALCANTARILLA		
Excavaciones varias sin Clasificar	M3	46,50
Excavaciones en roca en seco	M3	8,20
Concreto reforzado resistencia 14 Mpa (F) - mezcla in situ	M3	0,50
Concreto reforzado resistencia 21 MPa (D) - mezcla in situ	M3	9,60
Acero de Refuerzo Fy 4200 Mpa	KG	579,00
Relleno para Estructuras con Suelo	M3	25,40
Tubería de Concreto Reforzado 21 Mpa de 900 mm de diámetro interior	M	6,00
Relleno para Estructuras con material producto de la excavación	M3	32,00
*		

Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Avance Físico	**Tramo y/o sector 1**	**Tramo y/o sector 2**	**Tramo y/o sector (n)**	**Total**	**%**
Prog	1,50			4,90	100,0%
Ejec	1,00			4,50	91,8%
Prog	127,60			127,60	100,0%
Ejec	111,00			111,00	87,0%
Prog	14,96			81,90	100,0%
Ejec	13,98			80,50	98,3%
Prog	6,48			45,40	100,0%
Ejec	6,25			43,20	95,2%
Prog	494,14			3839,00	100,0%
Ejec	493,20			3789,00	98,7%
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
MOTONIVELADORA		
COMPACTADOR		
MINICARGADOR		
VOLQUETA 1		
VOLQUETA 2		
VIBRO DE CONCRET	1	
MEZCLADORA	1	
PULIDORA	1	
RETRO DE LLANTA		
Total	3	

Se debe relacionar la maquinaria y equipo presente en campo para la ejecución de las actividades según el anexo técnico

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra incluido la revisión de los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1: PR 0+000 AL PR 0+139 — TRAMO Y/O SECTOR 2:

TRAMO Y/O SECTOR (n):

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

			DISPONIBLE		
UBICACIÓN:	CORREGIMIENTO AGUAS CLARAS	PERMISO MINERO:	SI X	NO	
	MUNICIPIO DE MONTRIA	LICENCIA AMBIENTAL:	SI X	NO	
UBICACIÓN:		PERMISO MINERO:	SI	NO	
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	

OBSERVACIONES: LA JAC SE ENCUENTRA RECOPILANDO LA INFORMACION DE LA FUENTE DE MATERIALES

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI		NO		N/A	
LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO		N/A	
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO		N/A	
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO		N/A	
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO		N/A	
VERTIMIENTOS:	SI		NO		N/A	
EMISIONES:	SI		NO		N/A	
OTROS (Especificar cual)	SI		NO		N/A	

OBSERVACIONES: SE LE INFORMA A LA JAC QUE SI EL MUNICIPIO NO CUENTA CON UNA ZONA DE DISPOSICIÓN DE MATERIALES SE PUEDE DISPONER DE ALGUN PREDIO EN LA ZONA EL CUAL CUENTE CON UN PERMISO DEL PROPIETARIO.

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: LA JAC ENTREGA Y APRUEBA LA INTERVENTORIA PARA RADICAR

OBSERVACIONES: :

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	1	2
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	1	2
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 3

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 1

No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:

ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS:

DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:


OBSERVACIONES:

VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

1, SE REALIZA RECORRIDO PARA REVISION DE FINAL DE OBRA
2 SE REALIZA ASEO GENERAL DE OBRA

VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

VIII. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

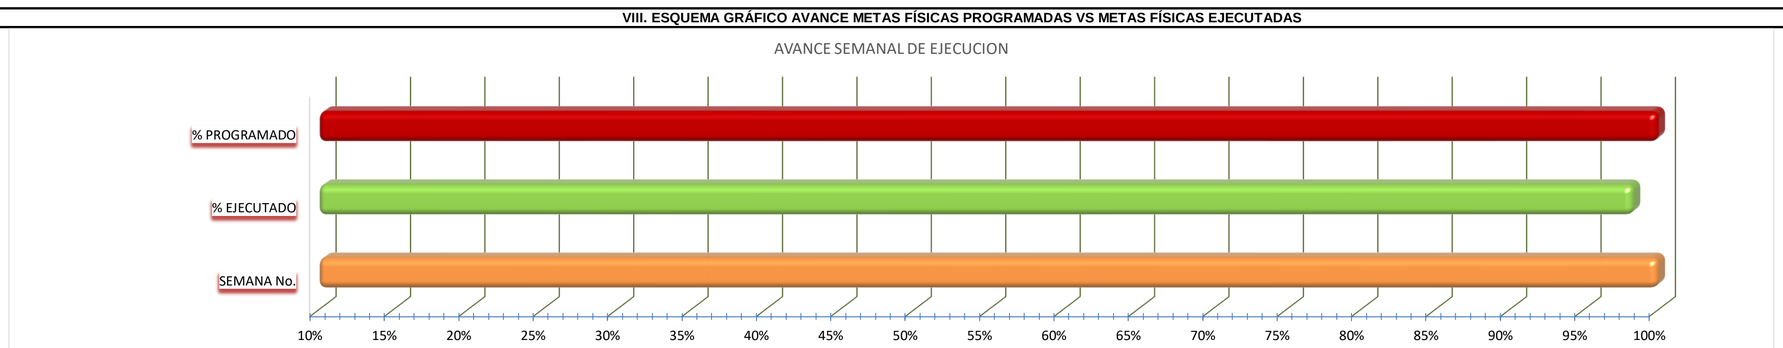

	SEMANA No.	% EJECUTADO	% PROGRAMADO
AVANCE SEMANAL DE EJECUCION	9	98,34%	100,00%

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del convenio

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



TRamo acabado



Tramo acabado



Tramo acabado

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA

1. ACOMPAÑAMIENTO A LAS JAC SOBRE METODOLOGIA Y DOCUMENTACION PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO
2, SE REVIZA DOCUMENTACION ENTREGADA POR LA JAC
3, SE REALIZA ACOMPAÑAMIENTO PARA RECIBO DEFINITIVO

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA

NOMBRE: ZAIDA DAYANA ORJUELA DIAZ

Matrícula Profesional No.: 68202-112219 STD

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

6.5 Maquinaria y equipo

Carrera 9 No 20-64 Of. 03
Teléfonos: 317-6404558
zaidaorjuela@gmail.com
Cartagena de Indias

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

FECHA 1/11/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** ANTIOQUIA

CONTROL DIARIO DE MAQUIINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA

PERIODO / MES INFORME MENSUAL: OCTUBRE

PROYECTO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL CORREGIMIENTO BUENOS AIRES DEL MUNICIPIO DE ARBOLETES, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

CONVENIO No. 3225-2023

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL CORREGIMIENTO BUENOS AIRES

CONTRATO INTERVENTORÍA No. 4498-2023

INTERVENTORÍA: ZAIDA DAYANA ORJUELA DIAZ

MAQUINARIA Y EQUIPO				DÍAS DEL MES																														
DESCRIPCIÓN	**MARCA / MODELO**	**CAPACIDAD**	**LOCALIZACIÓN**	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**24**	**25**	**26**	**27**	**28**	**29**	**30**	**31**
Rieles para placa huella		40 UND	FRENTE DE TRABAJO	A	A	I	A	A	I	A	A	A	A	A	I	I	A	A	A	A	A	A	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	
Planta electrica		7.5 HP 110 V/220	FRENTE DE TRABAJO	A	A	I	A	A	I	A	A	A	A	A	I	I	A	A	A	A	A	A	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	
mezcladora		2 BULTOS	FRENTE DE TRABAJO	I	A	I	A	I	I	A	A	A	A	I	I	I	A	A	I	A	A	A	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	
Vibrocompactador tipo rana		6,5 HP	FRENTE DE TRABAJO	A	A	I	A	A	I	A	A	A	A	A	I	I	A	A	A	A	A	A	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	
texturizador y flota				I	A	I	A	I	I	A	A	A	A	I	I	I	A	A	I	A	A	A	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	
TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO				5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
TOTAL ACTIVO				3	5	0	5	3	0	5	5	5	5	3	0	0	5	5	3	5	5	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
TOTAL EN REPARACIÓN				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
TOTAL INACTIVO				2	0	5	0	2	5	0	0	0	0	2	5	5	0	0	2	0	0	0	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	

RESUMEN PERIODO / MES	No.	%
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO	5	17%
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO ACTIVO = A	15	50%
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO EN REPARACIÓN = R	0	0%
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO INACTIVO = I	15	50%

CONVENCIONES: **ACTIVO= A, EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.**

REPORTE DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO (Cuando se encuentre "Inactiva" o "En reparación" indicar las razones de su estado):

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA:

LA INTERVENTORÍA CERTIFICA QUE EL CONTRATISTA CUMPLIÓ CON LA DISPONIBILIDAD DE MAQUINARIA Y EQUIPO MÍNIMOS EXIGIDOS PARA EL PROYECTO.

NOTAS:

1. El Interventor debe indicar de manera breve las razones por las cuales la maquinaria y equipo relacionada se encuentran EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.
2. Se entiende por "Activo" el estado de la maquinaria disponible y en uso, por "Inactivo" el estado de la maquinaria que estando disponible no se encuentra en uso y "en reparación" el estado de la maquinaria no disponible por estar en mantenimiento y/o en reparación.
3. Es responsabilidad de la Interventoría realizar el seguimiento y control diario de la maquinaria y equipo utilizado por el Contratista de obra para la ejecución del proyecto.
4. En el evento en que el Contratista de obra no cumpla con la maquinaria y equipo mínimo requeridos, la Interventoría debe indicar en la casilla "Observaciones de la Interventoría" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligac
5. Así mismo en la casilla "Observaciones de la interventoría" el interventor debe consignar las observaciones que considere pertinentes relacionadas con la maquinaria y equipos.

Firma

Nombre: JUAN CARLOS SALAS SEGURA
Presidenta JAC
Cedula: 10.999.521 de Canalete Cordoba

Firma

Nombre: CRISTIAN ANDRES COGOLLO PORRAS
Auxiliar de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 081037-0702761 COR

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

6.6 Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Obra

Carrera 9 No 20-64 Of. 03
Teléfonos: 317-6404558
zaidaorjuela@gmail.com
Cartagena de Indias

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** ANTIOQUIA

CONVENIO DE OBRA No: 3225-2023 **CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL CORREGIMIENTO BUENOS AIRES

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: OCTUBRE **PROYECTO:** AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL CORREGIMIENTO BUENOS AIRES DEL MUNICIPIO DE ARBOLETES, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 4498-2023 **INTERVENTOR:** ZAIDA DAYANA ORJUELA DIAZ

NOMBRE ARL: **NOMBRE CAJA DE COMPENSACIÓN:**

VERIFICACIÓN PERSONAL, DOCUMENTACIÓN APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL

No.	Nombres y Apellidos	C.C.	Cargo	Salarios	Días del Mes 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Razón Social del Responsable del Pago (Ver nota 5)	Índice Base de Cotización (IBC)	1. SEGURIDAD SOCIAL: Valor Cotizado ARL	Clase de Riesgo (De I a V)	Nombre EPS	No. Planilla	Valor Cotizado EPS	Nombre Administradora de Fondos de Pensiones	No. Planilla	Valor Cotizado Pensión	PARAFISCALES: Valor Caja de Compensación	Valor SENA	Valor ICBF	Observaciones (Indicar novedades de vacaciones, incapacidad, retiros, licencias, entre otros)
1	Jose Manuel Arrieta	70.528.233	Maestro de obra	$ 1.300.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X												JAC	$ 866.667	$ 60.320	V	SAVIA SALUD		$ 108.333	COLPENSIONES	0	$ 138.667	$ 34.667			
2	Fredy Mercado	1.033.372.180	Oficial	$ 1.300.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X													$ 866.667	$ 60.320	V	NUEVA EPS		$ 108.333	PORVENIR	0	$ 138.667	$ 34.667			
3	Luis Enrique mestra	78.747.274	Ayudante	$ 1.300.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X													$ 866.667	$ 60.320	V	EPS SURA		$ 108.333	COLFONDOS	0	$ 138.667	$ 34.667			
4	Augusto nova	1.003.730.342	Ayudante	$ 1.300.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X													$ 866.667	$ 60.320	V	SAVIA SALUD		$ 108.333	COLFONDOS	0	$ 138.667	$ 34.667			
5	GARAVITO FIGUEROA ROBERT DAVID	1138074133	Ayudante	$ 1.300.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X													$ 866.667	$ 60.320	V	SAVIA SALUD		$ 108.333	PROTECCION	0	$ 138.667	$ 34.667			
6	GOMEZ MARTINEZ LUIS ALBERTO	1068583084	Ayudante	$ 1.300.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X													$ 866.667	$ 60.320	V	MUTIAL SER		$ 108.333	PORVENIR	0	$ 138.667	$ 34.667			
7	MADERA HERNANDEZ FERNEY ALONSO	1068590394	Ayudante	$ 1.300.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X													$ 866.667	$ 60.320	V	SAVIA SALUD		$ 108.333	PROTECCION	0	$ 138.667	$ 34.667			
8	SEBASTIAN RUIZ MESTRE	1007629732	ING RESIDENTE	$ 3.000.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X													sebastian ruiz	$ 1.370.670,00	$ 95.399	V	NUEVA EPS	7946278623	$ 171.334	PROTECCION	7946278623	$ 219.307	$ -			

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA Numeral 4, disponibilidad del personal requerido:
SE INICIAN ACTIVIDADES Y SE AFILIA EL PERSONAL QUE VA A TRABAJAR POR ENDE SE ADJUNTAN LAS AFILIACIONES DEL PERSONAL

El contratista adjunta la certificación de fecha _____ a la que se refiere la nota 8 del presente formato.

NOTAS:
1. Es responsabilidad de la Interventoría verificar que el personal profesional este debidamente aprobado y se cumpla con la dedicación contractual.
2. Es responsabilidad de la Interventoría relacionar todo el personal utilizado durante el mes para la ejecución del contrato incluida mano de obra calificada y no calificada y diligenciar la casilla "Observaciones".
3. En el evento en que el Contratista no cumpla con la dedicación del personal profesional establecido contractualmente, el Interventor debe indicar en la casilla "Observaciones" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
4. El contratista es el responsable de la afiliación y pago de los aportes al sistema de la seguridad social y contribuciones parafiscales de los empleados a su cargo vinculados por contrato laboral y asociados a la ejecución del contrato. Cuando se trate de Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el integrante que realiza los pagos. Los pagos pueden ser realizados por el Contratista o por uno de los integrantes del Contratista en el caso de Consorcio o Unión Temporal; los cuales deben corresponder con la información consignada en la nómina electrónica cuando aplique.
5. En el evento en que el pago de los aportes se efectue por uno de los integrantes del Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el nombre del integrante que efectua los pagos.
6. El Interventor es el responsable de la verificación del pago de los Aportes Legales y Seguridad Social del personal vinculado al Contrato de Obra, así como el cumplimiento por parte del contratista de la normatividad vigente en relación con la nómina electrónica cuando aplique.
7. El Contratista es el responsable de verificar que sus contratistas de prestación de servicios asociados a la ejecución de la obra, cumplan con sus obligaciones con el sistema de la seguridad social, para lo cual debe presentar a la Interventoría la certificación suscrita por el Representante Legal o Revisor Fiscal según el caso en la cual se relacionen los nombres de los contratistas de prestación de servicios, el monto correspondiente a los pagos de seguridad social de cada uno de conformidad con la normatividad vigente y la entidad prestadora del servicio.
8. El Interventor debe señalar con un (*) a continuación del nombre, el personal vinculado por contrato de prestación de servicios. Así mismo debe diligenciar la dedicación en los días que prestó el servicio.

Firma
Nombre: JUAN CARLOS SALAS SEGURA
Presidenta JAC
Cedula: 10.999.521 de Canalete Cordoba

Firma
Nombre: ZAIDA DAYANA ORJUELA DIAZ
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 68202-112219 STD

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900377896	5	JAC CORREGIMIENTO BUENOS AIRES	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	Principal	CORREGIMIENTO BUENOS AIRES	ARBOLETES-ANTIOQUIA	8200000	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-10	2024-11			A	2024/11/29			0	

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	70528233	ARRIETA JOSE MANUEL	X	X																25-14	20	$866,667	$138,700	EPS040	20	$866,667	$108,400	CCF04	20	$866,667	$34,700	14-11	20	$866,667	$60,400	20	$866,667	$43,500	No	$385,700
2	CC	1138074133	GARAVITO FIGUEROA ROBERT DAVID	X	X																230201	20	$866,667	$138,700	EPS040	20	$866,667	$108,400	CCF04	20	$866,667	$34,700	14-11	20	$866,667	$60,400	20	$866,667	$43,500	No	$385,700
3	CC	1068583084	GOMEZ MARTINEZ LUIS ALBERTO	X	X																230301	20	$866,667	$138,700	ESSC07	20	$866,667	$108,400	CCF04	20	$866,667	$34,700	14-11	20	$866,667	$60,400	20	$866,667	$43,500	No	$385,700
4	CC	1068590394	MADERA HERNANDEZ FERNEY ALONSO	X	X																230201	20	$866,667	$138,700	EPS040	20	$866,667	$108,400	CCF04	20	$866,667	$34,700	14-11	20	$866,667	$60,400	20	$866,667	$43,500	No	$385,700
5	CC	1033372180	MERCADO MERCADO FREDY ANTONIO	X	X																230301	20	$866,667	$138,700	EPS037	20	$866,667	$108,400	CCF04	20	$866,667	$34,700	14-11	20	$866,667	$60,400	20	$866,667	$43,500	No	$385,700
6	CC	78747274	MESTRA PATERNINA LUIS ENRIQUE	X	X																231001	20	$866,667	$138,700	EPS010	20	$866,667	$108,400	CCF04	20	$866,667	$34,700	14-11	20	$866,667	$60,400	20	$866,667	$43,500	No	$385,700
7	CC	1033370342	NOVA LAZARO AUGUSTO MANUEL	X	X																231001	20	$866,667	$138,700	EPS040	20	$866,667	$108,400	CCF04	20	$866,667	$34,700	14-11	20	$866,667	$60,400	20	$866,667	$43,500	No	$385,700
Total	**Afiliados(7)**																						$6,066,669	$970,900			$6,066,669	$758,800			$6,066,669	$242,900			$6,066,669	$422,800		$6,066,669	$304,500		$2,699,900

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900377896	5	JAC CORREGIMIENTO BUENOS AIRES	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	Principal	CORREGIMIENTO BUENOS AIRES	ARBOLETES-ANTIOQUIA	8200000	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-10	2024-11			A	2024/11/29			0	

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				7	$970,900	$0	$0	$970,900
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	2	$277,400	$0	$0	$277,400
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$138,700	$0	$0	$138,700
PORVENIR	230301	800,224,808	8	2	$277,400	$0	$0	$277,400
PROTECCION	230201	800,229,739	0	2	$277,400	$0	$0	$277,400
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				7	$422,800	$0	$0	$422,800
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	7	$422,800	$0	$0	$422,800
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				7	$242,900	$0	$0	$242,900
COMFAMA	CCF04	890,900,841	9	7	$242,900	$0	$0	$242,900
EPS (ADMINISTRADORAS: 4)				7	$758,800	$0	$0	$758,800
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	$108,400	$0	$0	$108,400
MUTUAL SER	ESSC07	806,008,394	7	1	$108,400	$0	$0	$108,400
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$108,400	$0	$0	$108,400
SAVIA SALUD	EPS040	900,604,350	0	4	$433,600	$0	$0	$433,600
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				7	$182,700	$0	$0	$182,700
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	7	$182,700	$0	$0	$182,700
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				7	$121,800	$0	$0	$121,800
SENA	PASENA	899,999,034	1	7	$121,800	$0	$0	$121,800
TOTAL				7	$2,699,900	$0	$0	$2,699,900

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	1007629732
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			SEBASTIAN RUIZ MESTRA
CIUDAD/MUNICIPIO:	ARBOLETES	DEPARTAMENTO:	ANTIOQUIA
DIRECCIÓN:	BARRIO VILLA LUZ	TELÉFONO:	3333333
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Comercio al por mayor de computadores, equipo per
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:		**7946278623**	TIPO DE PLANILLA:		I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES octubre	AÑO 2024	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES octubre	AÑO 2024
DÍAS DE MORA:		0			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2024/11/06	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		1032665001

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
230201	230201- PROTECCION	1	$ 219.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 219.400	$ 0	$ 219.400
SUBTOTALES:										**$ 219.400**	**$ 0**	**$ 219.400**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS037	EPS037-NUEVA EPS	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 171.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 171.400	$ 0	$ 0	$ 171.400
SUBTOTALES:													**$ 171.400**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 171.400**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES																				SEGURIDAD SOCIAL																				PARAFISCALES						
																														PENSIÓN									SALUD							ARP										
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DIAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	SENA	ICBF	ESAP	MINEDU
1	CC 1007629732	RUIZ MESTRA SEBASTIAN	INDEPEND		$ 1.370.670				NO																	230201-PROTECCION	30	$ 1.370.670	$ 219.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 219.400	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 1.370.670	$ 171.400	$ 0	$ 171.400			$ 0		$ 0		$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL	**$ 390.800**

Planilla Pagada

PAGOSIMPLE | Prefactura

Fecha creación reporte: 2024-10-17, 04:01:41 PM **Tipo Planilla:** Y: PLANILLA INDEPENDIENTES EMPRESAS **Número Planilla:** 1067212803

Periodo Cotización: septiembre de 2024 **Periodo Servicio:** septiembre de 2024

Fecha limite de pago: 2024-10-23

GUARDADA 09/10/2024

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	JAC BUENOS AIRES				
Documento	NI900377896	**Dirección**	CL 24 #13 - 13 CORNTO BUENOS AIRES		
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	8200000		
Tipo Persona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	ÚNICO	**Total Afiliados**	1
Ciudad	ARBOLETES	**Departamento**	ANTIOQUIA		
Representante Legal	SALAS SEGURA JUAN CARLOS	**Identificación**	CC10999521		

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																	Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Administradora	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 1007629732	RUIZ MESTRA SEBASTIAN	59	00	R	R														0	0	0	21	0	NINGUNA AFP	$ 0	$ 0	NINGUNA EPS	$ 0	$ 0	ARL SURA	$ 910.000	$ 63.400	NINGUNA CCF	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 63.400

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes FSP	Aportes FSS	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE	TOTAL INTERESES	TOTAL FINAL
$ 0	$ 0	$ 910.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 63.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 63.400	$ 0	$ 63.400

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

¡El Poder de lo SIMPLE!

6.7 Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Obra

Carrera 9 No 20-64 Of. 03
Teléfonos: 317-6404558
zaidaorjuela@gmail.com
Cartagena de Indias

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA**	CÓDIGO VERSIÓN 1 PÁGINA

FECHA 1/11/2024
(Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** ANTIOQUIA

CONVENIO DE OBRA No: 3225-2023 **CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL CORREGIMIENTO BUENOS AIRES

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL CORREGIMIENTO BUENOS AIRES DEL MUNICIPIO DE ARBOLETES, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

MES INFORME MENSUAL: OCTUBRE **PROYECTO:**

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 4498-2023 **INTERVENTOR:** ZAIDA DAYANA ORJUELA DIAZ

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO DE OBRA

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Contrato Principal / Adicional No.	Valor	Saldo del Acta Anterior
2023	1231923	C-2402-0600-14-0-2402041-02	10	Nacion	Contrato No 3225-2023	$ 200.628.388	
		APORTE DE JUTA DE ACCION COMUNAL		OAC VEREDA LAS CRUCES DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE URABA	Contrato No 3225-2023	$ 1.000.000	
TOTAL						$ 201.628.388	

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: **$ 201.628.388,00**

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONVENIO DE OBRA

Acta No.	Tipo de Acta	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total Ejecutado Acumulado Acta	Anticipo Amortizado Acta	Valor Total Pagado Descontando Anticipo	Saldo Anticipo por Amortizar	No. de Registro y fecha	Saldo Registro Presupuestal	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Indicar pago según reporte SIIF		Observaciones
													SI	NO	
1		SEPTIEMBRE	$ 56.666.101		$ 56.666.101				157523 DE 31/08/2023	$ 144.962.287	$ 144.962.287				
2		OCTUBRE	$ 141.605.273		$ 141.605.273				157523 DE 31/08/2023	$ 3.357.014	$ 3.357.014				
3															
4															
5															
6															
TOTALES			**$ 198.271.374**	**$ -**	**$ 198.271.374**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ 3.357.014**	**$ 3.357.014**				

Todas las Actas aprobadas por la Interventoría deben relacionarse esten o no facturadas.

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO

	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL
SUBTOTAL OBRAS	$ 111.748.949,00	$ -	**$ 150.420.723**
PAGA (GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL)	$ 4.494.327	$ -	**$ 4.494.327**
APORTE ORGANISMO DE ACCION COMUNAL	$ 1.000.000	$ -	**$ 1.000.000**
GASTOS ADMINISTRATIVOS	$ 29.856.324,00	$ -	**$ 42.356.324**
		$ -	**$ -**
VALOR TOTAL	$ 147.099.600	$ -	**$ 198.271.374**

***Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.**

NOTA:
Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.

Firma
Nombre: JUAN CARLOS SALAS SEGURA
Presidenta JAC
Cedula: 10.999.521 de Canalete Cordoba

Firma
Nombre: ZAIDA DAYANA ORJUELA DIAZ
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 68202-112219STD

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

6.8 Estado General del Tiempo

Carrera 9 No 20-64 Of. 03
Teléfonos: 317-6404558
zaidaorjuela@gmail.com
Cartagena de Indias

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA **ESTADO GENERAL DEL TIEMPO**	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

FECHA 1/11/2024
(Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** ANTIOQUIA

CONVENIO DE OBRA No: 3225-2023 **CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL CORREGIMIENTO BUENOS AIRES

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: OCTUBRE **PROYECTO:** AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL CORREGIMIENTO BUENOS AIRES DEL MUNICIPIO DE ARBOLETES, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 4498-2023 **INTERVENTOR:** ZAIDA DAYANA ORJUELA DIAZ

ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

Clase de tiempo	DÍAS DEL MES																															
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Total
Seco	24	24	5	24	24	24	24	24	24	24	24	8	19	20	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	700
Lluvias moderadas	0	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19
Lluvias intensas	0	0	9	0	0	0	0	0	0	0	0	7	5	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25
Total horas	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	744

EN CADA CASILLA SE DEBE INDICAR EL NÚMERO DE HORAS POR DÍA QUE PERMANECE LA CLASE DE TIEMPO LAS 24 HORAS DEL DÍA.

NOTA:
Anexar Registro pluviométrico del IDEAM correspondiente a la Estación más cercana al Proyecto.

OBSERVACIONES:

Firma Sebastian Ruiz M
Nombre: SEBASTIAN RUIZ MESTRA
Residente de obra
Matrícula Profesional No.: 081037-0612357 COR

Firma
Nombre: CRISTIAN ANDRES COGOLLO PORRAS
Auxiliar de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 081037-0702761 COR

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

Radicado N°. 20249050117954 - PIN: 2999
Fecha: 2024-10-21 23:16 Anexos: 1
Destino: 905 RADICACION Remite: Zaida Orjuela
Consulte su trámite en:
https://www.ideam.gov.co

CARTAGENA, - BOLIVAR 21 de octubre de 2024

Señores
Instituto de Hidrología Meteorología y Estudios Ambientales
Ciudad

Asunto : INFORME PLUVIOMETRICO

Por medio de la presente, me dirijo a ustedes con el fin de solicitar el registro pluviométrico correspondiente a la estación meteorológica más cercana a la vereda Las Cruces, ubicadas en el municipio de San Juan de Urabá, departamento de Antioquia, para los meses de mayo, junio, julio, septiembre y octubre de 2024.

Se adjuntan los siguientes archivos:
1. carta ideam-signed.pdf

Por favor responder a través de mi correo electrónico: zaidaorjuela@gmail.com

Atentamente,

Zaida Orjuela
Documento: 52709618
Cra 9 # 20 - 64 CARTAGENA, BOLIVAR.
COLOMBIA
Tel. 3176404558
zaidaorjuela@gmail.com

6.9 Resumen Ensayos de Laboratorio

Carrera 9 No 20-64 Of. 03
Teléfonos: 317-6404558
zaidaorjuela@gmail.com
Cartagena de Indias

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA** **RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO**	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PAGINA	

FECHA 1/11/2024
(Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** ANTIOQUIA

CONVENIO DE OBRA No.: 3225-2023 **CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL CORREGIMIENTO BUENOS AIRES

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: OCTUBRE **PROYECTO:** AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL CORREGIMIENTO BUENOS AIRES DEL MUNICIPIO DE ARBOLETES, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 4498-2023 **INTERVENTOR:** ZAIDA DAYANA ORJUELA DIAZ

RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO EJECUTADOS EN EL PRESENTE MES

No. Consecutivo del Ensayo	Fecha del Ensayo (Día/Mes/Año)	Descripción/Ensayo	Norma	Procedencia (Sitio donde se tomo la muestra)	No. De Muestras	Rango Cumplimiento del Ensayo	Resultado del Ensayo	Cumple SI o NO	Observación / Acciones
A. ENSAYOS CONTRATO DE OBRA									
B. ENSAYOS CONTRATO DE INTERVENTORÍA									

OBSERVACIONES:

Se realizan toma de muestras las cuales se esta a la espera de los resultados los cuales se obtendran en el mes de noviembre

NOTAS:

1. La columna "No. Consecutivo del Ensayo" corresponde a un número consecutivo único que identifica cada resultado obtenido de laboratorio o prueba de campo.
2. Es responsabilidad del Interventor verificar el cumplimiento en la realización del número de ensayos requeridos en el periodo y el cumplimiento de las especificaciones generales y particulares de contrucción y normas de ensayo.
3. Cuando el resultado del ensayo de laboratorio no cumple, el Interventor debe diligenciar en la columna "Observaciones" el procedimiento utilizado para subsanar la no conformidad y generar los reportes con los resultados de laboratorio que evidencien la corrección de la no conformidad.
4. Ningún reporte de laboratorio se puede presentar con enmendaduras.
5. Los laboratorios que se usen para los ensayos deben estar certificados según las normas ISO (International Organization for Standardization) vigentes que apliquen y los equipos de laboratorio que se utilicen deben estar debidamente calibrados. Certificaciones y calibraciones que deben adjuntar al informe mensual.
6. El interventor debe presentar este formato diligenciando los resultados de laboratorio de los ensayos realizados durante el periodo del informe tanto por el contratista como por la interventoría de forma separada, anexando en medio digital los resultados de laboratorio que los soportan.

Firma

Nombre: JUAN CARLOS SALAS SEGURA
Presidenta JAC
Cedula: 10.999.521 de Canalete Cordoba

Firma

Nombre: ZAIDA DAYANA ORJUELA
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 68202-112219 STD

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

6.10 Seguimiento Garantías y Seguros Contrato de Obra

Carrera 9 No 20-64 Of. 03
Teléfonos: 317-6404558
zaidaorjuela@gmail.com
Cartagena de Indias

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONVENIO**	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

FECHA	30	10	2024
	(Día)	(Mes)	(Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** ANTIOQUIA

CONVENIO No. 3225 de 2023 **CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL CORREGIMIENTO BUENOS AIRES

OBJETO DEL CONTRATO: "AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL CORREGIMIENTO BUENOS AIRES DEL MUNICIPIO DE ARBOLETES,DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL."

FECHA DE INICIO: 21/12/2023

PLAZO INICIAL: 31/12/2023

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/08/2024
(Incluye prórrogas y suspensiones)

VALOR INICIAL: $ 201.628.388,00

VALOR ACUMULADO: $ -
(Incluye adiciones)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 4498-2023 **INTERVENTOR:** ZAIDA DAYANA ORJUELA DIAZ

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONVENIO SOLIDARIO

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento	20	$ 40.325.677,60	14	8	2023	31/10/2024		
Buen manejo y correcta inversión del anticipo			Día	Mes	Año			
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	5	$ 10.081.419,40	14	8	2023	31	12	2026
Estabilidad y/o Calidad de Obra	30	$ 60.488.516,40	31	12	2023	31	12	2028

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. CMT-100008497

Certificado de modificación o anexo No.: 0
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS MUNDIAL

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: 18/12/2023

SEGUROS EXIGIDOS SEGÚN CONVENIO

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	200 SMLMV	$ 232.000.000,00	14	8	2023	31	12	2023
Otros			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. CMT-100001977 **OTRAS PÓLIZAS No.**

Certificado de modificación o anexo No.: 0
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: Compañía Mundial de Seguros S.A.

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: 18/12/2023

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONVENIO	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: ..... **PRÓRROGA No.:** 1 **MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** .....

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			Hasta		
Cumplimiento	20	$ 40.325.677,60	30	12	2023	30/10/2024		
Buen manejo y correcta inversión del anticipo		$ -	Día	Mes	Año			
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	5	$ 10.081.419,40	30	12	2023	30	4	2027
Estabilidad y/o Calidad de Obra	30	$ 60.488.516,40	30	4	2024	30	4	2029

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. CMT-100008497

Certificado de modificación o anexo No.: 4
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: 12/03/2024

SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: ..... **PRÓRROGA No.:** 1 **MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** .....

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	200 SMLMV	$ 260.000.000,00	30	12	2023	30	4	2024
Otros			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. CMT-100001977 **OTRAS PÓLIZAS No.** .....

Certificado de modificación o anexo No. 4
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: Compañía Mundial de Seguros S.A.

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: 12/03/2024

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: ..... **PRÓRROGA No.:** 2 **MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** .....

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			Hasta		
Cumplimiento	20	$ 40.325.677,60	30	12	2023	30/12/2024		
Buen manejo y correcta inversión del anticipo								
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	5	$ 10.081.419,40	30	12	2023	30	6	2027
Estabilidad y/o Calidad de Obra	30	$ 60.488.516,40	30	4	2024	30	6	2029

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. CMT-100008497

Certificado de modificación o anexo No.: 5
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: 12/06/2024

SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: ..... **PRÓRROGA No.:** 2 **MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** .....

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	200 SMLMV	$ 260.000.000,00	21	12	2023	30	6	2024
Otros			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. CMT-100001977 **OTRAS PÓLIZAS No.** .....

Certificado de modificación o anexo No. 6
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: Compañía Mundial de Seguros S.A.

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: 12/06/2024

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: ..... **PRÓRROGA No.:** 3 **MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** .....

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento	20	$ 40.325.677,60	30	12	2023	30/12/2024		
Buen manejo y correcta inversión del anticipo								
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	5	$ 10.081.419,40	30	12	2023	2	7	2027
Estabilidad y/o Calidad de Obra	30	$ 60.488.516,40	30	4	2024	2	7	2029

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. CMT-100008497

Certificado de modificación o anexo No.: 7
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: .....

SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: ..... **PRÓRROGA No.:** 3 **MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** .....

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	200 SMLMV	$ 260.000.000,00	21	12	2023	2	7	2024
Otros			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. CMT-100001977 **OTRAS PÓLIZAS No.** .....

Certificado de modificación o anexo No. 7
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: Compañía Mundial de Seguros S.A.

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: .....

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONVENIO	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: ..... **PRÓRROGA No.:** 3 ..... **MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** .....

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	200 SMLMV	$ 260.000.000,00	21	12	2023	2	7	2024
Otros			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. CMT-100001977 **OTRAS PÓLIZAS No.** .....

Certificado de modificación o anexo No. 7
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: Compañía Mundial de Seguros S.A.

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: .....

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: ..... **PRÓRROGA No.:** 3 ..... **MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** .....

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			Hasta		
Cumplimiento	20	$ 40.325.677,60	30	12	2023	28/02/2025		
Buen manejo y correcta inversión del anticipo								
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	5	$ 10.081.419,40	30	12	2023	31	8	2027
Estabilidad y/o Calidad de Obra	30	$ 60.488.516,40	30	4	2024	31	8	2029

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. CMT-100008497

Certificado de modificación o anexo No.: 8
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: .....

SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: ..... **PRÓRROGA No.:** 3 ..... **MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** .....

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	200 SMLMV	$ 260.000.000,00	21	12	2023	31	8	2024
Otros			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. CMT-100001977 **OTRAS PÓLIZAS No.** .....

Certificado de modificación o anexo No. 8
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: Compañía Mundial de Seguros S.A.

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: .....

SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: ..... **PRÓRROGA No.:** 3 **MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** .....

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	200 SMLMV	$ 260.000.000,00	21	12	2023	31	8	2024
Otros			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. CMT-100001977 **OTRAS PÓLIZAS No.** .....

Certificado de modificación o anexo No. 8
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: Compañía Mundial de Seguros S.A.

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: .....

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: ..... **PRÓRROGA No.:** 4 **MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** .....

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			Hasta		
Cumplimiento	20	$ 40.325.677,60	30	12	2023	30/08/2025		
Buen manejo y correcta inversión del anticipo								
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	5	$ 10.081.419,40	30	12	2023	30	10	2027
Estabilidad y/o Calidad de Obra	30	$ 60.488.516,40	30	4	2024	30	10	2029

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. CMT-100008497

Certificado de modificación o anexo No.: 10
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: .....

SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: ..... **PRÓRROGA No.:** 3 **MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** .....

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	200 SMLMV	$ 260.000.000,00	21	12	2023	30	10	2024
Otros			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. CMT-100001977 **OTRAS PÓLIZAS No.** .....

Certificado de modificación o anexo No. 10
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: Compañía Mundial de Seguros S.A.

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: .....

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONVENIO**	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

OBSERVACIONES:

Las polizas se encuentran a la espera de aprobacion en SECOP

NOTAS:

1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y seguros aprobados por el Instituto.

2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y/o seguros aprobados por el Instituto (Insertar las casillas que se requieran).

Firma

Director de interventoria

Nombre: ZAIDA DAYANA ORJUELA DIAZ

Matrícula Profesional No.: 068202-112219STD

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

seguros mundial®
tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA REGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

Código de Seguridad: PXxmss6Pbxw9eE8Y6rRwRA==

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1,2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851220 - **WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO**

ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO

ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082

VERSIÓN CLAUSULADO 06-04-2021-1317-P-05-PPSUS2R000000059-D00I

No. PÓLIZA	CMT-100008497	No. ANEXO	8	No. CERTIFICADO	489025479	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	03/09/2024	SUC. EXPEDIDORA	CEN MONTERIA

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	21/12/2023	24:00 Horas Del	31/08/2029		N/A	N/A	N/A	N/A

TOMADOR	JUNTA DE ACCION COMUNAL DEL CORREGIMIENTO DE BUENOS AIRES	**No. DOC. IDENTIDAD**	900.377.896-5
DIRECCIÓN	CORR BUENOS AIRES	**TELÉFONO**	3104481218
ASEGURADO	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	**No. DOC. IDENTIDAD**	800.215.807-2
DIRECCIÓN	CALLE 25 G # 73 B - 90	**TELÉFONO**	7056000
BENEFICIARIO	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	**No. DOC. IDENTIDAD**	800.215.807-2
DIRECCIÓN	CALLE 25 G # 73 B - 90	**TELÉFONO**	7056000

OBJETO DE CONTRATO

MEDIANTE EL PRESENTE ANEXO SE DEJA EXPRESA CONSTANCIA QUE DE ACUERDO AL ACTA DE SUSPENSION N° 2 DE FECHA 11 DE JULIO DE 2024, ACTA DE REINICIO N° 2 DE FECHA 26 DE JULIO DE 2024 Y PRORROGA N° 3 DE FECHA 26 DE JULIO E 2024 SE ACTUALIZA LA VIGENCIA DE LA PRESENTE POLIZA. LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES NO MODIFICADOS PERMANECEN IGUAL.
GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO GENERAL DEL CONVENIO Y EL PAGO DE LAS MULTAS Y LA CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA QUE SE LE IMPONGAN, PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES DEL PERSONAL QUE EL OAC HAYA DE UTILIZAR EN EL TERRITORIO NACIONAL PARA LA EJECUCIÓN DEL CONVENIO Y LA ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LAS OBRAS EJECUTADAS ENTREGADAS A SATISFACCIÓN REFERENTE AL CONVENIO SOLIDARIO SOLIDARIO No.3225 DE 2023 , CUYO OBJETO ES AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL CORREGIMIENTO BUENOS AIRES DEL MUNICIPIO DE ARBOLETES, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

NOMBRE DEL AMPARO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADA$	VALOR PRIMA$
CUMPLIMIENTO	00:00 Horas Del 30/12/2023	24:00 Horas Del 28/02/2025	40.325.677,60	53.031,03
PRESTACIONES SOCIALES	00:00 Horas Del 30/12/2023	24:00 Horas Del 31/08/2027	10.081.419,40	13.699,68
ESTABILIDAD DE LA OBRA	00:00 Horas Del 30/04/2024	24:00 Horas Del 30/04/2029	60.488.516,40	0,00
		TOTAL ASEGURADO	$ 110.895.613,40	

INTERMEDIARIOS	TIPO	% PARTICIPACIÓN
MIGUEL ANTONIO VASQUEZ FLOREZ	AGENTES	100,00

DISTRIBUCIÓN COASEGURO

COMPAÑÍA	TIPO COASEGURO	PÓLIZA LÍDER	CERTIF. LÍDER	% PARTICIPACIÓN

PRIMA BRUTA	$	66.730,71
DESCUENTOS	$	
EXTRA PRIMA		
PRIMA NETA	$	66.730,71
GASTOS EXP.	$	0,00
IVA	$	12.678,83
TOTAL A PAGAR	$	79.409,54

CONVENIO DE PAGO	DIRECTO EFECTIVO, Fecha de Pago: 03/09/2024

CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA

ES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO DILIGENCIAR EL FORMULARIO DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE, SUMINISTRAR INFORMACIÓN VERAZ Y VERIFICABLE Y REALIZAR ACTUALIZACIÓN DE DATOS POR LO MENOS ANUALMENTE (CIRCULAR EXTERNA 026 DE 2008 SUPERFINANCIERA).

CONSULTA LA AUTENTICIDAD DE ESTA POLIZA INGRESANDO A PRODUCTOS.MUNDIALSEGUROS.COM.CO, DIGITA EL NÚMERO DEL CERTIFICADO QUE ENCUENTRAS EN LA PARTE SUPERIOR DE ESTE DOCUMENTO Y VIVE LA EXPERIENCIA DE ESTAR ASEGURADO CON EL RESPALDO DE SEGUROS MUNDIAL. TAMBIEN PUEDES LLAMAR A LA LINEA NACIONAL 01 8000 111 935 O LÍNEA EN BOGOTÁ 327 47 12 / 13.

EL TOMADOR Y/O ASEGURADO SEGÚN CORRESPONDA, SE COMPROMETE A PAGAR LA PRIMA DENTRO DE LOS 30 DÍAS CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DE VIGENCIA DE LA PÓLIZA.
DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 1068 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 82 DE LA LEY 45 DE 1990, **LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PRESENTE PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO A LA COMPAÑÍA DE SEGUROS PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS POR LA EXPEDICIÓN DE LA PÓLIZA.**
EN MI CALIDAD COMO TOMADOR DE LA PÓLIZA INDICADA EN ESTA CARATULA, MANIFIESTO EXPRESAMENTE QUE HE TENIDO A MI DISPOSICIÓN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA MANIFIESTO ADEMÁS, QUE DURANTE EL PROCESO DE NEGOCIACIÓN, ANTICIPADAMENTE ME HAN SIDO EXPLICADAS POR LA COMPAÑÍA Y/O POR EL INTERMEDIARIOS DE SEGUROS AQUÍ INDICADO, SOBRE LAS EXCLUSIONES Y ALCANCES Y CONTENIDOS DE LA COBERTURA, ASI COMO LAS GARANTÍAS, EN VIRTUD DE TAL ENTENDIMIENTO, LAS ACEPTO Y DECIDO TOMARLA PÓLIZA DE SEGUROS CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO.

Firma Autorizada - Compañía Mundial de Seguros S.A.
ANGELA MUNAR - VICEPRESIDENTE DE PRODUCTO
C.C. 52.646.070

TOMADOR

Lineas de Atención al Cliente:
- Nacional: **01 8000 111 935**
- Bogotá: **327 4712 - 327 4713**

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando reponsablemente.
Protege el medio ambiente evitando la impresión de este documento.

HOJA No.

AFILIADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PASA - APF

seguros mundial®

tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA RÉGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1, 2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851220 - **WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO**

ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO

ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082

VERSION CLAUSULADO 06-04-2021-1317-P-05-PPSUS2R000000059-D00I

No. PÓLIZA	CMT-100008497	No. ANEXO	8	No. CERTIFICADO	489025479	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	03/09/2024	SUC. EXPEDIDORA	CEN MONTERIA

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	21/12/2023	24:00 Horas Del	31/08/2029		N/A	N/A	N/A	N/A

CONDICIONES PARTICULARES

NOTA 1: EL CUMPLIMIENTO GENERAL DEL CONVENIO Y EL PAGO DE LAS MULTAS Y LA CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA QUE SE LE IMPONGAN SU VIGENCIA SE EXTENDERÁ HASTA LA LIQUIDACIÓN DEL CONVENIO.

LA VIGENCIA DEL AMPARO DE ESTABILIDAD SERA DE CINCO (5) AÑOS CONTADO A PARTIR DE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE RECIBO DEFINITIVO DE LA OBRA.

"Con la emisión de la póliza se entiende que se autoriza a Seguros Mundial para que realice gestión de cobranza en caso de que aplique, a través de los siguientes canales: correo electrónico, llamada, SMS y WhatsApp. No obstante, en cualquier momento podrá solicitar la exclusión de alguno estos canales por medio de:
Página web: www.segurosmundial.com.co
Correo electrónico: mundial@segurosmundial.com.co
Líneas de atención: Bogotá (+601) 3274712 - (+601) 3274713 Nacional 018000111935"

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el Medio Ambiente evitando la impresión de este documento.

AFILIADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PASA - APF

LA COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A

CERTIFICA:

Que la garantía de Cumplimiento contenida en la póliza **CMT-100008497** y endoso, **8** cuyo afianzado es: **JUNTA DE ACCION COMUNAL DEL CORREGIMIENTO DE BUENOS AIRES** Asegurado o Beneficiario: **INSTITUTO NACIONAL DE VIAS / INSTITUTO NACIONAL DE VIAS ,** expedida por la Compañía en **03/09/2024,** no expirará por falta de pago de la prima de la póliza o de los certificados o anexos que se expidan con fundamento en ella o por revocación unilateral por parte del Tomador o de la Compañía.

CEN MONTERIA a los **03** días del mes **SEPTIEMBRE** del año **2024.**

Firma Autorizada - Compañia Mundial de Seguros S.A.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el Medio Ambiente evitando la impresión de este documento.

AFILIADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PASA - APF

seguros mundial®
tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA REGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

Digitally signed by COMPANIA MUNDIAL DE SEGUROS SA
Date: 2024.11.12 14:26:29 -05:00

Código de Seguridad: E4fbY1jVHJAtte+m0MtHcQ==

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1,2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851220 - **WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO**

ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO

ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082

VERSIÓN CLAUSULADO 06-04-2021-1317-P-05-PPSUS2R000000059-D00I

No. PÓLIZA	CMT-100008497	No. ANEXO	10	No. CERTIFICADO	489027335	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	06/11/2024	SUC. EXPEDIDORA	CEN MONTERIA

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	21/12/2023	24:00 Horas Del	31/10/2029		N/A	N/A	N/A	N/A

TOMADOR	JUNTA DE ACCION COMUNAL DEL CORREGIMIENTO DE BUENOS AIRES	**No. DOC. IDENTIDAD**	900.377.896-5
DIRECCIÓN	CORR BUENOS AIRES	**TELÉFONO**	3104481218
ASEGURADO	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	**No. DOC. IDENTIDAD**	800.215.807-2
DIRECCIÓN	CALLE 25 G # 73 B - 90	**TELÉFONO**	7056000
BENEFICIARIO	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	**No. DOC. IDENTIDAD**	800.215.807-2
DIRECCIÓN	CALLE 25 G # 73 B - 90	**TELÉFONO**	7056000

OBJETO DE CONTRATO

MEDIANTE EL PRESENTE ANEXO SE AJUSTA LA VIGENCIA DEL AMPARO DE CUMPLIMIENTO DE ACUERDO A LO INDICADO EN EL CONTRATO. LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES NO MODIFICADOS PERMANECEN IGUAL.
GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO GENERAL DEL CONVENIO Y EL PAGO DE LAS MULTAS Y LA CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA QUE SE LE IMPONGAN, PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES DEL PERSONAL QUE EL OAC HAYA DE UTILIZAR EN EL TERRITORIO NACIONAL PARA LA EJECUCIÓN DEL CONVENIO Y LA ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LAS OBRAS EJECUTADAS ENTREGADAS A SATISFACCIÓN REFERENTE AL CONVENIO SOLIDARIO SOLIDARIO No.3225 DE 2023 , CUYO OBJETO ES AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL CORREGIMIENTO BUENOS AIRES DEL MUNICIPIO DE ARBOLETES, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

NOTA 1: EL CUMPLIMIENTO GENERAL DEL CONVENIO Y EL PAGO DE LAS MULTAS Y LA CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA QUE SE LE IMPONGAN SU VIGENCIA SE

NOMBRE DEL AMPARO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADA$	VALOR PRIMA$
CUMPLIMIENTO	00:00 Horas Del 30/12/2023	24:00 Horas Del 30/08/2025	40.325.677,60	107.829,76
PRESTACIONES SOCIALES	00:00 Horas Del 30/12/2023	24:00 Horas Del 30/10/2027	10.081.419,40	0,00
ESTABILIDAD DE LA OBRA	00:00 Horas Del 30/10/2024	24:00 Horas Del 30/10/2029	60.488.516,40	0,00
		TOTAL ASEGURADO	$ 110.895.613,40	

INTERMEDIARIOS	TIPO	% PARTICIPACIÓN
MIGUEL ANTONIO VASQUEZ FLOREZ	AGENTES	100,00

DISTRIBUCIÓN COASEGURO				
COMPAÑÍA	TIPO COASEGURO	PÓLIZA LÍDER	CERTIF. LÍDER	% PARTICIPACIÓN

PRIMA BRUTA	$	107.829,76
DESCUENTOS	$	
EXTRA PRIMA		
PRIMA NETA	$	107.829,76
GASTOS EXP.	$	0,00
IVA	$	20.487,65
TOTAL A PAGAR	$	128.317,41

CONVENIO DE PAGO	DIRECTO EFECTIVO, Fecha de Pago: 06/11/2024

CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA

ES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO DILIGENCIAR EL FORMULARIO DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE, SUMINISTRAR INFORMACIÓN VERAZ Y VERIFICABLE Y REALIZAR ACTUALIZACIÓN DE DATOS POR LO MENOS ANUALMENTE (CIRCULAR EXTERNA 026 DE 2008 SUPERFINANCIERA).

CONSULTA LA AUTENTICIDAD DE ESTA POLIZA INGRESANDO A PRODUCTOS.MUNDIALSEGUROS.COM.CO, DIGITA EL NÚMERO DEL CERTIFICADO QUE ENCUENTRAS EN LA PARTE SUPERIOR DE ESTE DOCUMENTO Y VIVE LA EXPERIENCIA DE ESTAR ASEGURADO CON EL RESPALDO DE SEGUROS MUNDIAL. TAMBIEN PUEDES LLAMAR A LA LINEA NACIONAL **01 8000 111 935** O LÍNEA EN BOGOTÁ **327 47 12 / 13.**

EL TOMADOR Y/O ASEGURADO SEGÚN CORRESPONDA, SE COMPROMETE A PAGAR LA PRIMA DENTRO DE LOS 30 DÍAS CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DE VIGENCIA DE LA PÓLIZA.
DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 1068 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 82 DE LA LEY 45 DE 1990, **LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PRESENTE PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO A LA COMPAÑÍA DE SEGUROS PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS POR LA EXPEDICIÓN DE LA PÓLIZA.**
EN MI CALIDAD COMO TOMADOR DE LA PÓLIZA INDICADA EN ESTA CARATULA, MANIFIESTO EXPRESAMENTE QUE HE TENIDO A MI DISPOSICIÓN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA MANIFIESTO ADEMÁS, QUE DURANTE EL PROCESO DE NEGOCIACIÓN, ANTICIPADAMENTE ME HAN SIDO EXPLICADAS POR LA COMPAÑÍA Y/O POR EL INTERMEDIARIOS DE SEGUROS AQUÍ INDICADO, SOBRE LAS EXCLUSIONES Y ALCANCES Y CONTENIDOS DE LA COBERTURA, ASI COMO LAS GARANTÍAS, EN VIRTUD DE TAL ENTENDIMIENTO, LAS ACEPTO Y DECIDO TOMARLA PÓLIZA DE SEGUROS CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO.

Firma Autorizada - Compañía Mundial de Seguros S.A.
ANGELA MUNAR - VICEPRESIDENTE DE PRODUCTO
C.C. 52.646.070

TOMADOR

Lineas de Atención al Cliente:
- Nacional: **01 8000 111 935**
- Bogotá: **327 4712 - 327 4713**

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando reponsablemente.
Protege el medio ambiente evitando la impresión de este documento.

AFILIADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PASA - APF

seguros mundial®

tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA RÉGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1, 2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851220 - **WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO**

ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO

ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082

VERSION CLAUSULADO 06-04-2021-1317-P-05-PPSUS2R000000059-D00I

No. PÓLIZA	CMT-100008497	No. ANEXO	10	No. CERTIFICADO	489027335	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	06/11/2024	SUC. EXPEDIDORA	CEN MONTERIA

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	21/12/2023	24:00 Horas Del	31/10/2029		N/A	N/A	N/A	N/A

CONDICIONES PARTICULARES

EXTENDERÁ HASTA LA LIQUIDACIÓN DEL CONVENIO.

LA VIGENCIA DEL AMPARO DE ESTABILIDAD SERA DE CINCO (5) AÑOS CONTADO A PARTIR DE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE RECIBO DEFINITIVO DE LA OBRA.

"Con la emisión de la póliza se entiende que se autoriza a Seguros Mundial para que realice gestión de cobranza en caso de que aplique, a través de los siguientes canales: correo electrónico, llamada, SMS y WhatsApp. No obstante, en cualquier momento podrá solicitar la exclusión de alguno estos canales por medio de:
Página web: www.segurosmundial.com.co
Correo electrónico: mundial@segurosmundial.com.co
Líneas de atención: Bogotá (+601) 3274712 - (+601) 3274713 Nacional 018000111935"

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el Medio Ambiente evitando la impresión de este documento.

AFILIADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PASA - APF

seguros mundial®
tu compañía siempre
NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA RÉGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.

Afiliados
CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA
PASA APF
Asociación Panamericana de Fianzas
Panamerican Surety Association

LA COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A

CERTIFICA:

Que la garantía de Cumplimiento contenida en la póliza **CMT-100008497** y endoso, **10** cuyo afianzado es: **JUNTA DE ACCION COMUNAL DEL CORREGIMIENTO DE BUENOS AIRES** Asegurado o Beneficiario: **INSTITUTO NACIONAL DE VIAS / INSTITUTO NACIONAL DE VIAS ,** expedida por la Compañía en **06/11/2024,** no expirará por falta de pago de la prima de la póliza o de los certificados o anexos que se expidan con fundamento en ella o por revocación unilateral por parte del Tomador o de la Compañía.

CEN MONTERIA a los **12** días del mes **NOVIEMBRE** del año **2024.**

Firma Autorizada - Compañia Mundial de Seguros S.A.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el Medio Ambiente evitando la impresión de este documento.

AFILIADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PASA - APF

seguros mundial®

Mundial de Seguros S.A.
860.037.013-6

Recibo de Pago

- CLIENTE-

Referencia de Pago No.	489027335

Fecha de Facturación	06/11/2024
ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082	
Póliza No.	CMT–100008497
Periodo Facturado	21/12/2023 — 31/10/2029

Fecha Límite de Pago	06/12/2024
Prima (incluye gastos de expedición)	107.829,76
IVA	20.487,65
VALOR TOTAL A PAGAR $	128.317,41

EFECTIVO $

Datos del Cliente

Nombre / Razón Social	JUNTA DE ACCION COMUNAL DEL CORREGIMIENTO DE BUENOS AIR
CORR BUENOS AIRES	900377896
Intermediario	MIGUEL ANTONIO VASQUEZ FLOREZ

Cheque

Banco	No Cuenta	No Cheque	Valor Cheque
TOTAL			

Apreciado Cliente:

1. No se aceptan pagos parciales.
2. Al realizar su pago de forma presencial (ante el cajero del banco) **UNICAMENTE** presente esta boleta de recaudo para garantizar la correcta referenciación del pago.
3. Si esta boleta no ha sido recaudada efectivamente el **06/12/2024** se aplicará la clausula de terminación automática especifiada en el condicionado de la póliza y en la carátula de esta (artículo1068 código de comercio)
4. Si realiza su pago en cheque o de forma mixta (efectivo y cheque), solamente gire cheque local a nombre de **PATRIMONIOS AUTÓNOMOS CREDICORP CAPITAL FIDUCIARIA Nit 900531292-7,** al respaldo endóselo correctame y diligencie los datos del girador (nombre, NIT, teléfono) y el número de referencia de esta boleta. En caso de devolución del cheque se cobrará sanción del 20% de acuerdo con lo establecido en el artículo 731 del código de comercio. **NO SE ACEPTAN CHEQUES DE OTRAS PLAZAS.**
5. Para realizar el pago a través del botón PSE, ingrese a nuestra página web **www.segurosmundial.com.co** en la imagen de PSE haga clic y continúe el proceso de pago.

ESPACIO PARA EL TIMBRE

VÁLIDO COMO RECIBO DE PAGO

- BANCO -

Referencia de Pago No.	489027335

Fecha de Facturación	06/11/2024
ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082	
Póliza No.	CMT–100008497
Periodo Facturado	21/12/2023 — 31/10/2029

Fecha Límite de Pago	06/12/2024
Prima (incluye gastos de expedición)	107.829,76
IVA	20.487,65
VALOR TOTAL A PAGAR $	128.317,41

EFECTIVO $

Datos del Cliente

Nombre / Razón Social	JUNTA DE ACCION COMUNAL DEL CORREGIMIENTO DE BUENOS AIR
CORR BUENOS AIRES	900377896
Intermediario	MIGUEL ANTONIO VASQUEZ FLOREZ

Cheque

Banco	No Cuenta	No Cheque	Valor Cheque
TOTAL			

Corresponsales
OPCIÓN1

(415)7709998434219(8020)00000489027335(3900)000000128317(96)20241206

Bancos Corresponsales
OPCIÓN 2

(415)7709998039933(8020)031594(8020)22990489027335(3900)000000128317(96)20241206

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

seguros mundial®

Recibo de Pago

Mundial de Seguros S.A.
860.037.013-6

INFORMACIÓN DE PAGO

A continuación te brindamos información de los distintos medios de pago que tendrás a disposición:

OPCIÓN 1

CORRESPONSALES

Carulla · grupo éxito · efecty · edeq · Bancolombia Corresponsal Bancario · Punto de pago Multibanco · Supermercado Mercar · 4-72

OPCIÓN 2

BANCOS

Scotiabank · DAVIVIENDA · Banco de Bogotá · Bancolombia · Banco de Occidente

CORRESPONSALES

puntored Te damos más

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Tu compañía siempre

seguros mundial

RECIBO ELECTRONICO No. 222982347

NIT: 860.037.013-6 **CIUDAD Y FECHA:** MONTERIA 12/11/2024 2:25:13 p.m.

VALOR TOTAL: $128.317,41

RECIBO DE: JUNTA DE ACCION COMUNAL DEL CORREGIMIENTO DE BUENOS AIRES

NUMERO DE IDENTIFICACION: 900377896

POR CONCEPTO DE: PAGO ELECTRONICO DE PRIMAS

FORMA DE PAGO:

Medio De Pago	No. De Documento	No. Autorización	Entidad	Valor
P.S.E.	20249901383132	1044974828	BANCOLOMBIA	128.317,41

OBSERVACIONES: Ramo: CUMPLIMIENTO Póliza(s): 100008497 Certificado(s): 489027335;

FIRMA AUTORIZADA



CAJA COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS

DIRECCIÓN IP: 10.158.85.50 **CORREO:**

TES-08N-05/2019

6.12 Actas de comité de obra:

Carrera 9 No 20-64 Of. 03
Teléfonos: 317-6404558
zaidaorjuela@gmail.com
Cartagena de Indias

ACTA DE COMITÉ OPERATIVO		
Acta No: 7	Dirección Territorial INVIAS: ANTIOQUIA	Fecha: 11/10/2024

Vereda – Municipio - Departamento: BUENOS AIRES – ARBOLETES - ANTIOQUIA
No. Convenio(s) Solidario(s): 3225 DE 2023
Ejecutor(es): **JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL CORREGIMIENTO BUENOS AIRES**

PARTICIPANTES			
Nombres y Apellidos	Institución u Organización	Cargo	FIRMA
ZAIDA DAYANA ORJUELA DIAZ	INTERVENTORIA	REP LEGAL INTERVENTORIA	
JUAN CARLOS SALAS SEGURA	JUNTA BUENOS AIRES	REP LEGAL JAC	
ESTEBAN OVIEDO	COMITÉ PARTICIPACION	REPRESENTANTE CP	
SEBASTIAN RUIZ	JAC	RESIDENTE DE OBRA	
ANDRES SOTO	INTERVENTORIA	ING AUXILIAR INTERVENTORIA	

OBJETIVOS DEL COMITÉ OPERATIVO: *(Incluir solo los objetivos que se quieren lograr en la reunión)*

1. presentación de los asistentes al comité.
2. Presentación a comité de los pagos a aprobar
3. Presentar oportunidades de mejora para la ejecución del convenio.

AGENDA DEL COMITE: *(Incluir la lectura del acta del comité operativo anterior y verificar los compromisos)*

1- Presentación de los Integrantes del Comité Operativo y Veeduría Ciudadana.
2- Presentación de órdenes de pago a verificar y aprobar
3- Proposiciones y Varios
4-

RESUMEN TEMAS TRATADOS: *(escribir la idea completa de lo tratado en cada tema indicando si es del caso: modo, unidad, cantidad, precio, tiempo, lugar)*

Tema	Resumen
1.	**Presentación de los Integrantes:** En este comité operativo asistieron cinco (5) miembros principales conectados de manera telefónica.
2.	**La JAC presenta la relación de pagos a revisar y aprobar en este comité.** Se inicia informando que los trabajos iniciaron y ya se encuentran adelantados aproximadamente 60 ml de huella y contrahuella sin cuneta ni bordillo, se espera que el rendimiento mejore y se termine la meta física en los tiempos estipulados.

3.	El residente informa que fue necesario comprar combustible adicional para la obra y se requiere pagar a la EDS.
4.	Haciendo un balance de acuerdo con la ejecución y a los materiales que se tienen en stock se requiere hacer un pedido adicional de algunos materiales a la ferretería ABO con el fin de cumplir la metafísica propuesta.
5.	La JAC presento el plan de gestión social para la ejecución mediante obras de participación comunitaria el cual fue remitido a la DT y sus profesionales sociales, se requiere la implementación y ya se tiene la cotización de los materiales requeridos para su ejecución
6.	
7.	

DECISIONES TOMADAS POR EL COMITE: *(escribir la decisión tomada indicando si es del caso: modo, unidad, cantidad, precio, tiempo, lugar)*

Tema	Decisión
1.	Se aprueba pago a la EDS Distracom
2.	Se aprueba la compra de los materiales para la ejecución de las obras con participación comunitaria.
3.	
4.	

INFORME PRESENTADOS: *(entregados al ejecutor de manera impresa por el equipo técnico y veeduría)*

No.	Anexos
1.	Informe Técnico de Avance: SI ____ NO __X__ No. Folios: _____
2.	Informe Ejecución Financiera: SI __X__ NO ____ No. Folios: _____
3.	Informe de Veeduría Ciudadana: SI ____ NO __X__ No. Folios: _____
4.	Informe Medidas Ambientales: SI ____ NO __X__ No. Folios: _____

COMPROMISOS ADQUIRIDOS. *(se hará seguimiento al cumplimiento en cada comité técnico)*

Actividad	Responsable de la ejecución	Fecha de Ejecución
Ejecucion de obra	JAC	Inmediato

PROPOSICIONES Y VARIOS.

Actividad	Responsable de la actividad	Medio de verificación
