

Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Costo
1		**105-ARC-DISAN-DMBOG-2024**	**97.63 días**	**sáb 24/08/24**	**vie 20/12/24**	**$ 775,833,735.00**
2		**INICIO PROYECTO**	**14 días**	**sáb 24/08/24**	**mar 10/09/24**	**$ 0.00**
3		GESTION ADMINISTRATIVA (REVISIÓN DE DISEÑOS, PLANOS, PRESUPUESTOS Y COMPRA DE MATERIALES)	14 días	sáb 24/08/24	mar 10/09/24	$ 0.00
4		INGRESO DE PERSONAL	14 días	sáb 24/08/24	mar 10/09/24	$ 0.00
5		**CONSULTA EXTERNA (Bloque 2)**	**22 días**	**jue 10/10/24**	**mar 5/11/24**	**$ 101,468,305.00**
6		**CUBIERTA**	0 días	jue 10/10/24	jue 10/10/24	$ 0.00
7		DESMONTE DE CUBIERTA EXISTENTE EN LAMINA TERMOACUSTICA INCLUYE DISPOCISION FINAL DE ESCOMBRO EN SITIO AUTORIZADO	10 días	jue 10/10/24	mar 22/10/24	$ 8,522,076.00
8		MANTENIMIENTO DE ESTRUCTURA METALICA DE SOPORTE DE CUBIERTA INCLUYE GRATEADO, LIMPIEZA PREVIA, APLICACIÓN DE PINTURA ANTICORROSIVA Y ACABADO EN PINTURA ESMALTE	8 días	lun 14/10/24	mié 23/10/24	$ 15,450,742.00
9		SUMINISTRO E INSTALACION DE PERFIL TUBULAR METALICO CUADRADO NORMA ASTM 500 GRADO C DE 80X 40 MM DE 2 MM INCLUYE SOLDADURA, APLICACIÓN DE ESQUEMA DE PINTURA PINTURA (ANTICORROSIVO Y ACABADO EN PINTURA ESMALTE Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN (SOPORTE METÁLICO PARA	5 días	sáb 19/10/24	vie 25/10/24	$ 27,458,891.00
10		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA ARQUITECTONICA TRAPEZOIDAL EN ACERO GALVANIZADO NORMA ASTM A 792 COLOR VERDE CAL 26 INCLUYE ELEMENTOS DE FIJACIÓN	10 días	mié 23/10/24	lun 4/11/24	$ 46,844,277.00
11		SUMINISTRO E INSTALACION DE CABALLETE METALICO COLOR VERDE CAL 26 INCLUYE ELEMENTOS DE FIJACIÓN.INCLUYE TODO LO REQUERIDO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LA ACTIVIDAD	8 días	sáb 26/10/24	mar 5/11/24	$ 3,192,319.00
12		fin consulta externa	0 días	mar 5/11/24	mar 5/11/24	$ 0.00
13		**URGENCIAS-ADMINISTRACION-HOSPITALIZACION-FARMACIA-LABORATORIOS (Bloque 3)**	**45 días**	**lun 21/10/24**	**vie 13/12/24**	**$ 247,945,366.00**
14		**CUBIERTA**	**45 días**	**lun 21/10/24**	**vie 13/12/24**	**$ 247,945,366.00**
15		DESMONTE DE CUBIERTA EXISTENTE TERMOACUSTICA INCLUYE DISPOCISION FINAL DE ESCOMBRO EN SITIO AUTORIZADO	40 días	lun 21/10/24	sáb 7/12/24	$ 27,190,845.00
16		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA ARQUITECTONICA TRAPEZOIDAL EN ACERO GALVANIZADO NORMA ASTM A 792 COLOR VERDE CAL 26 INCLUYE ELEMENTOS DE FIJACIÓN	25 días	lun 11/11/24	mar 10/12/24	$ 149,373,598.00
17		MANTENIMIENTO DE ESTRUCTURA DE CUBIERTA METALICA, ESCARIFICACION, APLICACIÓN PINTURA ANTICORROSIVO Y ACABADO FINAL,REEMPLAZO DE PARTES EN MAL ESTADO.INCLUYE TODO LO REQUERIDO PARA SU CORRECTA EJECUCION	25 días	lun 11/11/24	mar 10/12/24	$ 33,917,129.00
18		SUMINISTRO E INSTALACION DE CABALLETE METALICO COLOR VERDE CAL 26 INCLUYE ELEMENTOS DE FIJACIÓN.INCLUYE TODO LO REQUERIDO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LA ACTIVIDAD.	25 días	mié 13/11/24	vie 13/12/24	$ 5,090,693.00
19		SUMINISTRO E INSTALACION DE PERFIL TUBULAR METALICO CUADRADO NORMA ASTM 500 GRADO C DE 80X 40 MM DE 2 MM INCLUYE SOLDADURA, APLICACIÓN DE ESQUEMA DE PINTURA PINTURA (ANTICORROSIVO Y ACABADO EN PINTURA ESMALTE Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN (SOPORTE METÁLICO PARA	20 días	lun 21/10/24	mié 13/11/24	$ 32,373,101.00
20		FIN TRABAJOS URGENCIA	0 días	vie 13/12/24	vie 13/12/24	$ 0.00
21		**LAVANDERIA. MORGUE, CUARTO DE RESIDUOS Y ALOJAMIENTOS (Bloque 7)**	**56 días**	**mié 2/10/24**	**mar 10/12/24**	**$ 263,368,461.00**

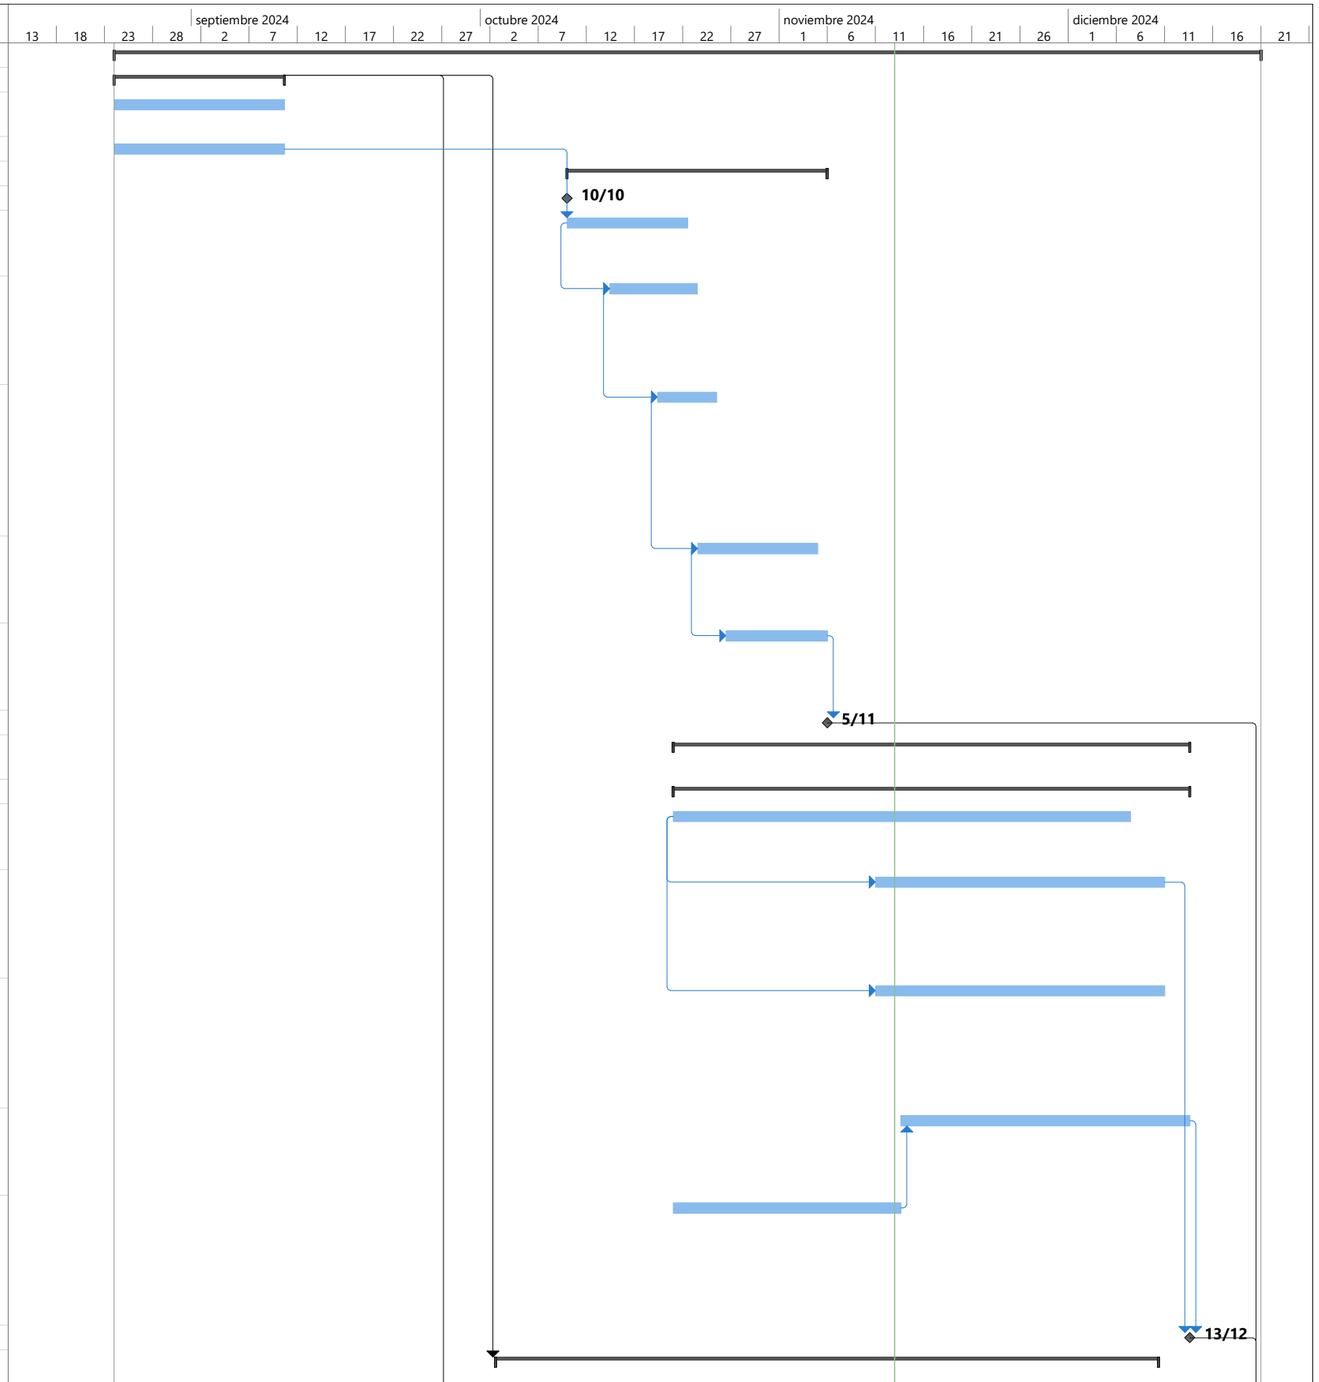

Proyecto: 1. PROGRAMACION P
Fecha: mié 13/11/24

Tarea · Resumen · Hito inactivo · solo duración · solo el comienzo · Hito externo · Progreso manual
División · Resumen del proyecto · Resumen inactivo · Informe de resumen manual · solo fin · Fecha límite
Hito · Tarea inactiva · Tarea manual · Resumen manual · Tareas externas · Progreso


Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Costo
22		**PRELIMINARES**	**10 días**	**mié 2/10/24**	**mar 15/10/24**	**$ 15,681,821.00**
23		DESMONTE DE CUBIERTA EN LAMINA TERMOACUSTICA EXISTENTE INCLUYE DISPOCISION FINAL DE ESCOMBRO EN SITIO AUTORIZADO	5 días	mié 2/10/24	mar 8/10/24	$ 5,145,949.00
24		DEMOLICION DE PISOS EXISTENTE INCLUYE RETIRO, LIMPIEZA Y DISPOCISIÓN FINAL DE ESCOMBRO EN SITIIO AUTORIZADO	6 días	lun 7/10/24	mar 15/10/24	$ 3,777,672.00
25		DEMOLICION DE ENCHAPE EN PARED EXISTENTE INCLUYE RETIRO, LIMPIEZA Y DISPOCISIÓN FINAL DE ESCOMBRO EN SITIO AUTORIZADO	2 días	lun 7/10/24	mié 9/10/24	$ 3,629,939.00
26		DESMONTE DE APARATOS ELECTRICOS (EXTRACTORES AIRE - VENTILADORES TECHO	3 días	mié 2/10/24	sáb 5/10/24	$ 780,480.00
27		DESMONTE DE CALDERA INCLUYE TUBERIA EMPOTRADA EN PARED Y DISPOSICION FINAL EN	3 días	mié 2/10/24	sáb 5/10/24	$ 1,828,518.00
28		DESMONTE TORRE SECADORA INDUSTRIAL INCLUYE DISPOSICION FINAL EN SITIO	2 días	mié 2/10/24	vie 4/10/24	$ 519,263.00
29		**CUBIERTA**	**16 días**	**mié 2/10/24**	**mar 22/10/24**	**$ 34,214,219.00**
30		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA ARQUITECTONICA TRAPEZOIDAL EN ACERO GALVANIZADO NORMA ASTM A 792 COLOR VERDE CAL 26 INCLUYE ELEMENTOS DE FIJACIÓN	4 días	mié 2/10/24	lun 7/10/24	$ 25,150,529.00
31		MANTENIMIENTO DE ESTRUCTURA METALICA DE SOPORTE DE CUBIERTA CERCHAS Y CORREAS INCLUYE: LIMPIEZA PREVIA, GRATEADO, APLICACIÓN DE PINTURA ANTICORROSIVA, ACABADO EN PINTURA ESMALTE ALQUIDICO	7 días	lun 14/10/24	mar 22/10/24	$ 7,352,122.00
32		SUMINISTRO E INSTALACION DE CABALLETE METALICO COLOR VERDE CAL 26 INCLUYE ELEMENTOS DE FIJACIÓN.INCLUYE TODO LO REQUERIDO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE	5 días	lun 7/10/24	lun 14/10/24	$ 1,711,568.00
33		**PISOS Y ENCHAPES**	**21 días**	**lun 7/10/24**	**vie 1/11/24**	$ 22,703,842.00
34		SUMINISTRO E INSTALACIÓN MORTERO DE NIVELACIÓN 1:3 SOBRE PISO. ESPESOR DE 0.05 METROS	4 días	lun 7/10/24	vie 11/10/24	$ 5,372,862.00
35		SUMINISTRO E INSTALACIONDE REVOQUE SOBRE MURO, MORTERO 1:3 ACABADO LISO . INCLUYE FILOS Y DILATACIONES	6 días	mar 22/10/24	mar 29/10/24	$ 7,094,929.00
36		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERAMICA ANTIDESLIZANTE DE PISO FORMATO A 0.40X0.40 COLOR A ESCOGER TIPO TRAFICO PESADO INCLUYE BOQUILLA.	15 días	vie 11/10/24	mié 30/10/24	$ 9,248,061.00
37		SUMINISTRO E INSTALACIUON DE CHARQUERA (POLLO) EN CONCRETO DE 3000 PSI ESPESOR 0.08 CM, H= 0.07 CM INCLUYE FILOS	2 días	mié 30/10/24	vie 1/11/24	$ 987,990.00
38		**PINTURA**	**34 días**	**mar 29/10/24**	**mar 10/12/24**	$ 111,217,152.00
39		SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE ESTUCO PLASTICO ACRILICO SOBRE MUROS EXTERIORES INCLUYE FILOS Y DILATACIONES INCLUYE TODO LO REQUERIDO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LA ACTIVIDAD.	7 días	lun 11/11/24	mar 19/11/24	$ 30,315,530.00
40		SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE SOBRE MURO CON SELLAMUR SIMILAR O DSE MEJORES CARACTERISTICAS INCLUYE ESCARIFICACION	10 días	mar 29/10/24	lun 11/11/24	$ 49,494,236.00
41		SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTIRA EPOXICA ACRILICA A BASE DE AGUA DE PINTUCO SIMILAR O DE MEJORES CARACTERISTICAS INCLUYE FILOS Y DILATACIONES	3 días	jue 5/12/24	mar 10/12/24	$ 13,964,075.00

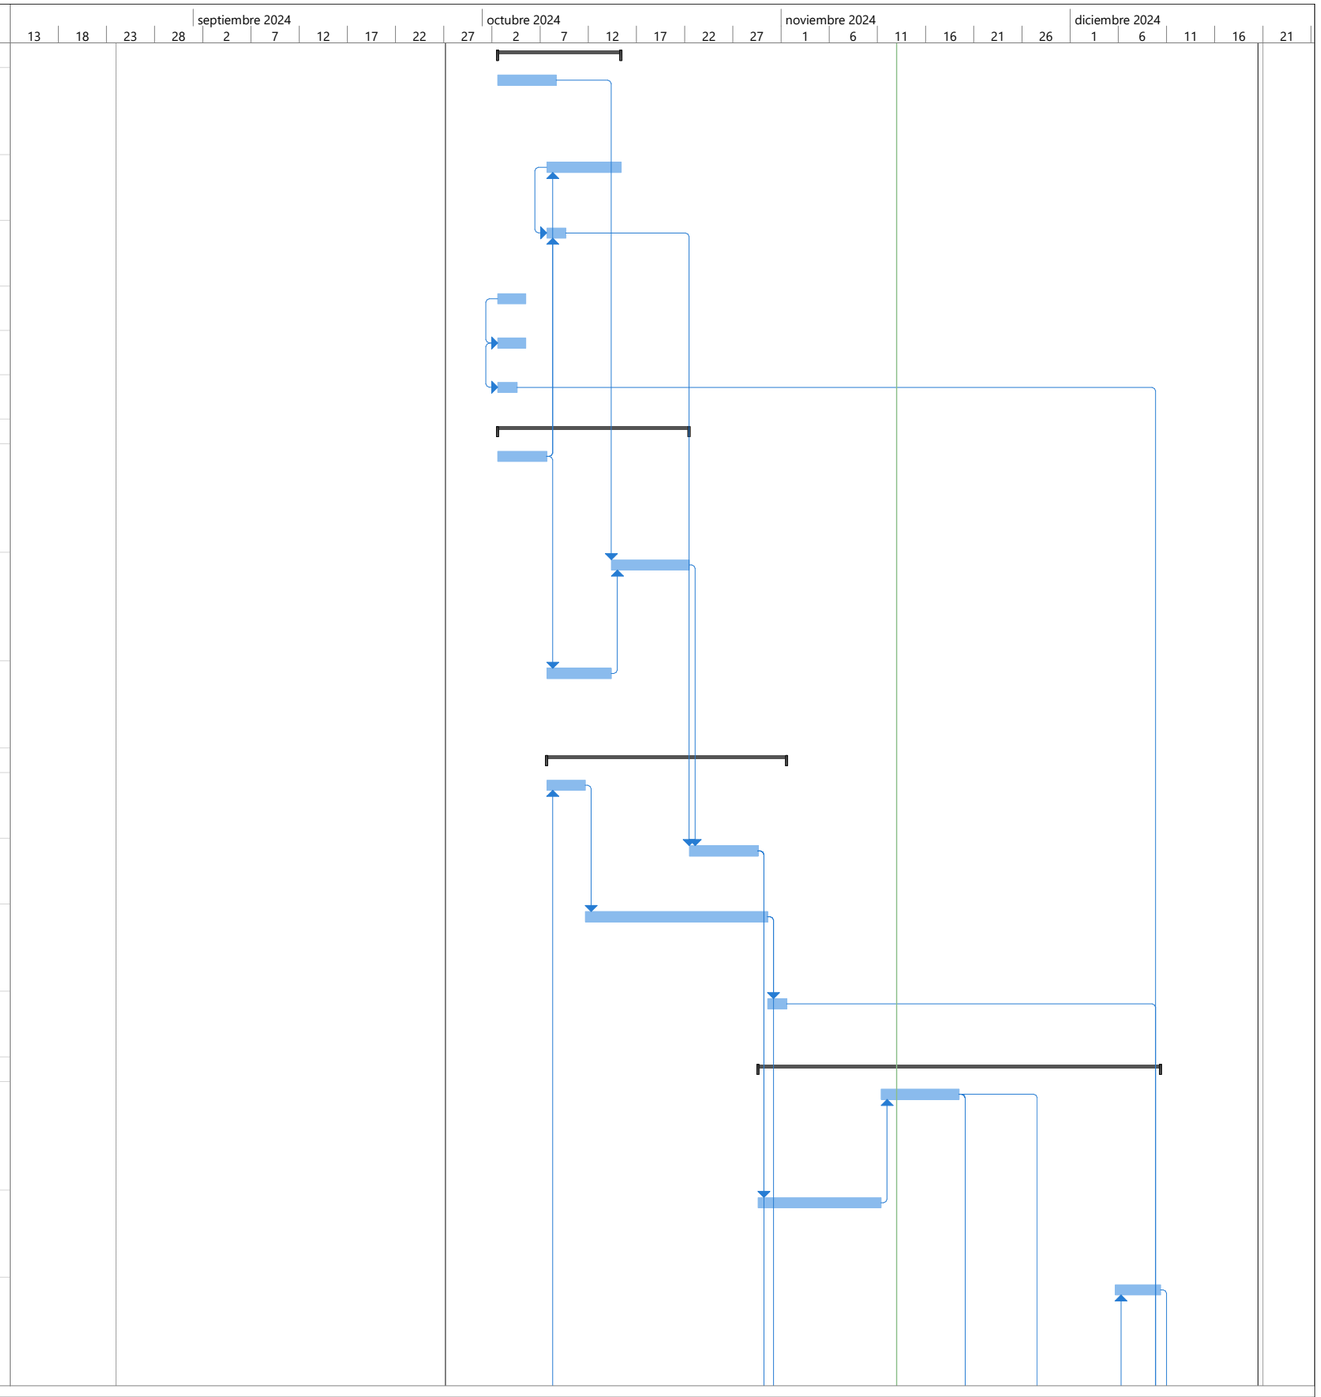

Proyecto: 1. PROGRAMACION P
Fecha: mié 13/11/24

Tarea · Resumen · Hito inactivo · solo duración · solo el comienzo · Hito externo · Progreso manual
División · Resumen del proyecto · Resumen inactivo · Informe de resumen manual · solo fin · Fecha límite
Hito · Tarea inactiva · Tarea manual · Resumen manual · Tareas externas · Progreso


Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Costo
42		SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA ESMALTE PARA EXTERIORES DE PINTUCO O SIMILAR COLOR A ESCOGER, APLICACIÓN SOBRE SUPERFICIE METALICA INCLUYE LIMPIEZA. (PUERTA PRINCIPAL)	4 días	mar 19/11/24	sáb 23/11/24	$ 2,612,169.00
43		SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINILO TIPO I PARA INTERIORES Y EXTERIORES DE PINTUCO O SIMILAR ANTIHONGOS O SIMILAR SOBRE MUROS Y COLUMNAS INCLUYE LIMPIEZA Y RESANE DE PARED.INCLUYE TODO LO REQUERIDO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LA ACTIVIDAD.	7 días	mié 27/11/24	jue 5/12/24	$ 14,831,142.00
44		**CIELORASO**	**8 días**	**mié 30/10/24**	**vie 8/11/24**	$ 29,882,302.00
45		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CIELO RASO EN PVC COLOR BLANCO 9 MM INCLUYE ESTRUCTURA METALICA DE SOPORTE DISTANCIADA A 50 CM, RINCONERAS,MEDIACAÑAS, UNIONES Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN.	8 días	mié 30/10/24	vie 8/11/24	$ 29,882,302.00
46		**SISTEMA ELECTRICO**	**24 días**	**mar 29/10/24**	**mié 27/11/24**	$ 17,645,311.00
47		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA TIPO LED DE 18 W D=10" A 110 V INCLUYE PUNTO ELECTRICO Y APERTURA PARA LUMINARIA	15 días	vie 8/11/24	mié 27/11/24	$ 6,989,686.00
48		SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR DOBLE 110 V, 20 AMP LUMINEX O SIMILAR. INCLUYE PUNTO ELECTRICO.	10 días	mar 29/10/24	lun 11/11/24	$ 1,883,152.00
49		SUMINISTRO E INSTALACION DE TOMAS DOBLES ATERRIZADAS A 220 V PARA AA LUMINEX O SIMILAR INCLUYE PUNTO ELECTRICO, REGATAS, RESANES, TUBERIA Y CAJAS.	10 días	mar 29/10/24	lun 11/11/24	$ 1,989,614.00
50		SUMINISTRO E INSTALACION DE TOMAS DOBLES ATERRIZADAS A 110 V LUMINEX O SIMILAR INCLUYE PUNTO ELECTRICO, REGATAS, RESANES, TUBERIA Y CAJAS.	10 días	mar 29/10/24	lun 11/11/24	$ 6,782,859.00
51		**INSTALACIONES HIDRAULICA**	**5 días**	**mié 2/10/24**	**mar 8/10/24**	$ 1,287,182.00
52		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA 1/2" INCLUYE ACCESORIOS	5 días	mié 2/10/24	mar 8/10/24	$ 548,775.00
53		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUNTO HIDRAULICO D=1/2" INCLUYE ACCESORIOS	4 días	mié 2/10/24	lun 7/10/24	$ 738,407.00
54		**INSTALACIONES SANITARIAS**	**12 días**	**mié 2/10/24**	**jue 17/10/24**	$ 2,567,657.00
55		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA D= 2"	12 días	mié 2/10/24	jue 17/10/24	$ 1,512,180.00
56		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUNTO SANITARIO DE 2" INCLUYE ACCESORIOS	7 días	mié 2/10/24	jue 10/10/24	$ 1,055,477.00
57		**MAMPOSTERIA**	**37.88 días**	**mié 2/10/24**	**lun 18/11/24**	$ 12,053,892.00
58		SUMINISTRO E INSTALACION DE MURO EN LADRILLO FAROL RAYADO DIVISORIO INCLUYE MORTERO DE PEGA Y ANCLAJES	2 días	mié 2/10/24	vie 4/10/24	$ 430,240.00
59		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REVOQUE IMPERMEABILIZADO MORTERO 1:3	1 día	vie 4/10/24	sáb 5/10/24	$ 4,077,032.00
60		CONSTRUCCIÓN DE ENTREPAÑOS EN L CONCRETO REFORZADO DE 3000 PSI DE 4 ML X 0.55M X 0.07 M INCLUYE ACERO DE REFUERZO.	2 días	vie 4/10/24	lun 7/10/24	$ 6,261,157.00
61		SUMINISTRO E INSTALACION DE PORCELANATO DE 0.80 MT SOBRE MESON INCLUYE RETALES WIN METALICO Y ESTANPILLADA	4 días	mié 13/11/24	lun 18/11/24	$ 1,285,463.00
62		**CARPINTERIA METALALICA**	**7 días**	**mar 19/11/24**	**mié 27/11/24**	$ 15,816,915.00
63		SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTAS CORREDIZAS METALICAS EN ALUMINIO COLOR ANOLOC / BLANCO O NATURAL INCLUYE MARCO, CHAPA TIPO CLOSET Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN (CLOSET)	7 días	mar 19/11/24	mié 27/11/24	$ 13,192,063.00

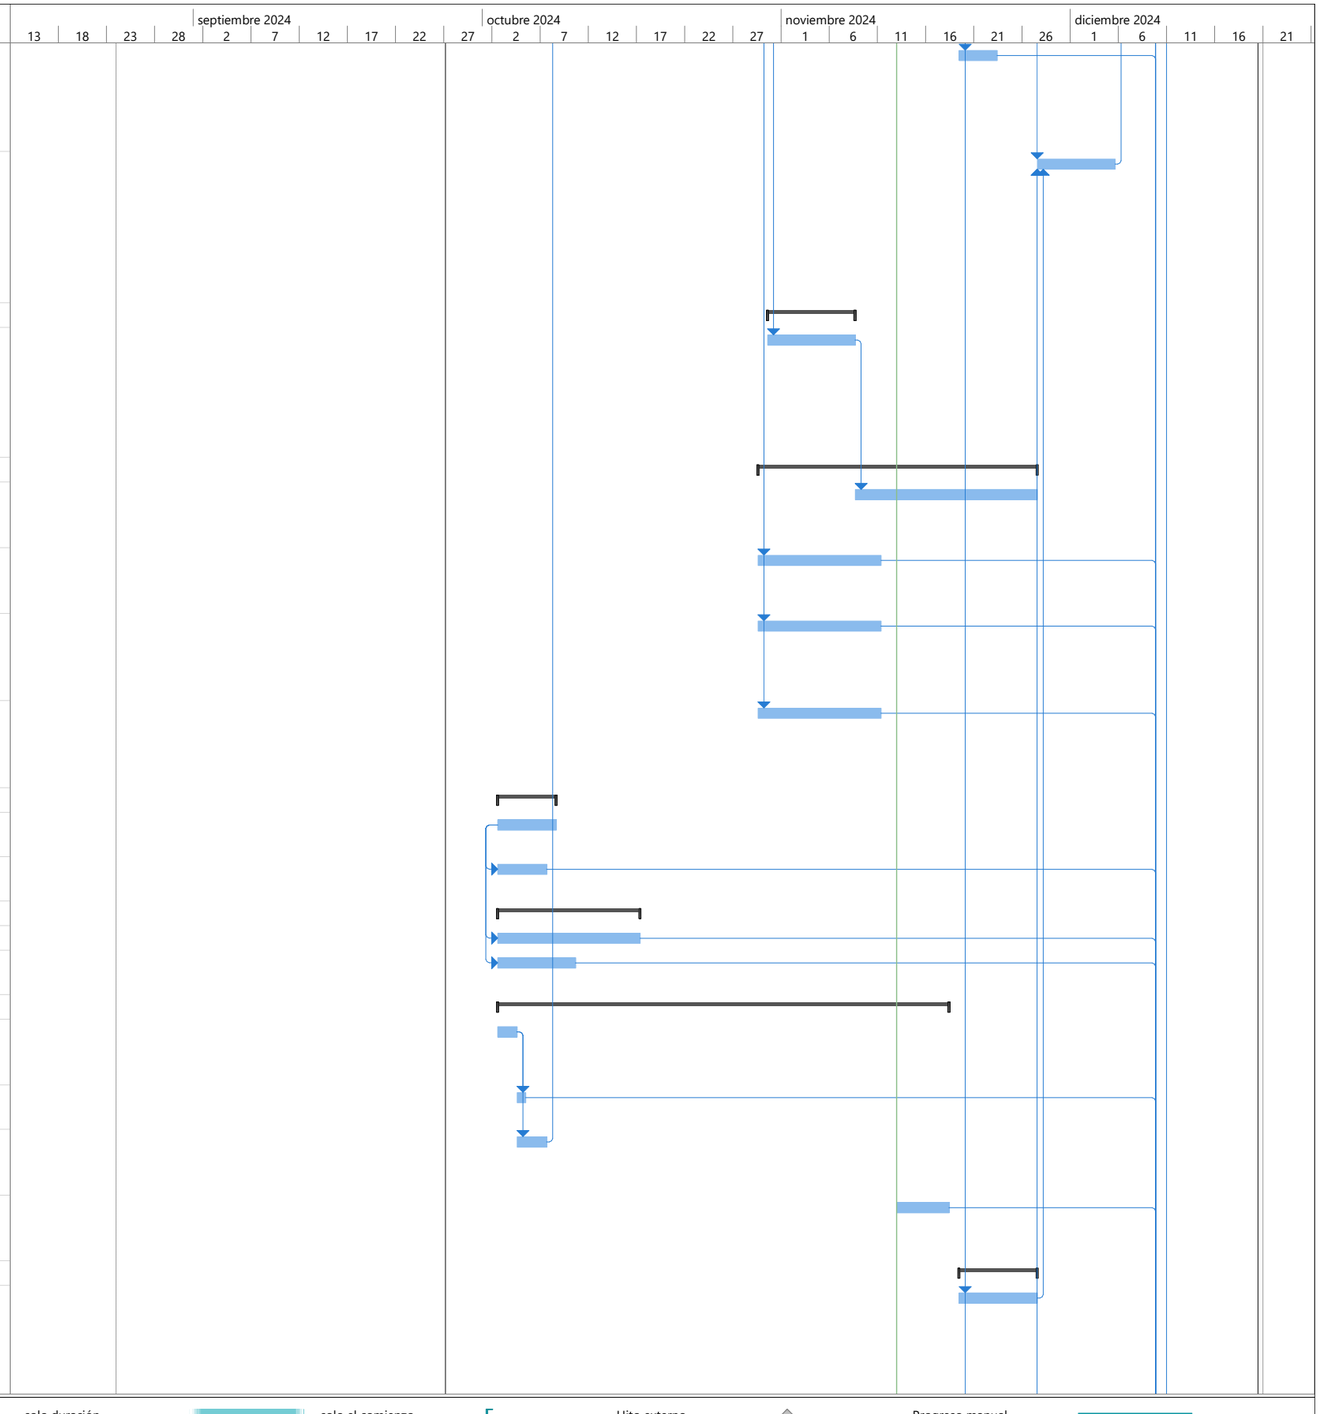

Proyecto: 1. PROGRAMACION P
Fecha: mié 13/11/24

Tarea · Resumen · Hito inactivo · solo duración · solo el comienzo · Hito externo · Progreso manual
División · Resumen del proyecto · Resumen inactivo · Informe de resumen manual · solo fin · Fecha límite
Hito · Tarea inactiva · Tarea manual · Resumen manual · Tareas externas · Progreso


Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Costo
64		MANTENIMIENTO DE PORTON DE CORTINA INCLUYE GRATEADO, CAMBIO DE PIEZAS EN MAL ESTADO, TENSION DE RESORTES, APLICACIÓN DE PINTURA ANTICORROSIVO, ACABADO EN PINTURA ESMALTE ALQUIDICO Y DEMAS ELEMENTOS PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO	2 días	mar 19/11/24	jue 21/11/24	$ 2,624,852.00
65		**APARATOS Y ACCESORIOS**	**2 días**	**mar 19/11/24**	**jue 21/11/24**	$ 298,168.00
66		SUMINISTRO E INSTALACION DE POCETA DE LAVADO DE 0.60 X 0.60 X 0.50 INCLUYE PUNTO HIDRAULICO DE 1/2" , PUNTO SANITATRIO DE 2", ENCHAPE SOBRE MUROS, LLAVE TERMINAL DE 1/2", REJILLA DE ANTICUCARACHA DE 2"	2 días	mar 19/11/24	jue 21/11/24	$ 298,168.00
67		FIN - LAVANDERIA MORGUE	0 días	mar 10/12/24	mar 10/12/24	$ 0.00
68		**DMLEG INSTALACIONES HIDRAULICAS**	**65.63 días**	**vie 27/09/24**	**lun 16/12/24**	**$ 163,051,603.00**
69		**PRELIMINARES**	**58.63 días**	**vie 27/09/24**	**sáb 7/12/24**	**$ 10,456,601.00**
70		LOCALIZACION Y REPLANTEO	7 días	vie 27/09/24	sáb 5/10/24	$ 2,176,806.00
71		REVISIÓN Y VALIDACIÓN DE DISEÑOS POR INGENIERO HIDRAULICO ACUERDO	3 días	vie 27/09/24	mar 1/10/24	$ 545,970.00
72		MANTENIMIENTO DE TANQUE EN FIBRA DE VIDRIO DE 3M DE ALTURA X 3,05 DIAMETRO. INCLUYE RESANES EN FIBRA DE VIDRIO, LIMPIEZA PREVIA Y APLICACIÓN DE PINTURA PÓXICA.	15 días	mié 20/11/24	sáb 7/12/24	$ 1,733,885.00
73		MANTENIMIENTO DE ESTRUCTURA DE SOPORTE METÁLICA PARA TANQUE ELEVADO. INCLUYE LIMPIEZA PREVIA, GRATEADO, APLICACIÓN DE ANTICORROSIVO Y ACABADO EN PINTURA ALQUIDICA	15 días	mar 1/10/24	sáb 19/10/24	$ 5,999,940.00
74		**EXCAVACIÓN Y RELLENOS**	**11 días**	**lun 7/10/24**	**sáb 19/10/24**	$ 13,782,609.00
75		EXCAVACIÓN MANUAL EN TERRENO COMUN	10 días	lun 7/10/24	vie 18/10/24	$ 2,858,328.00
76		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RELLENO CON RECEBO COMPACTADO AL 95% DEL PROCTOR	3 días	mié 16/10/24	sáb 19/10/24	$ 10,924,281.00
77		**RED DE ACUEDUCTO**	**5 días**	**mar 15/10/24**	**lun 21/10/24**	$ 55,943,100.00
78		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA PVC PRESIÓN RDE 21 DIAMETRO 3" INCLUYE PRUEBAS	2 días	vie 18/10/24	lun 21/10/24	$ 19,579,073.00
79		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA PVC PRESIÓN RDE 21 DIAMETRO 2" INCLUYE PRUEBAS	4 días	mar 15/10/24	sáb 19/10/24	$ 21,511,980.00
80		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA PVC PRESIÓN RDE 21 DIAMETRO 1/2" INCLUYE ACCESORIOS Y PRUEBAS HIDROSTAICAS	4 días	mar 15/10/24	sáb 19/10/24	$ 14,852,047.00
81		**ACCESORIOS**	**6 días**	**mar 15/10/24**	**mar 22/10/24**	$ 3,478,745.00
82		SUMINISTRO E INSTALACION DE COLLARIN DE TOMA AGUA POTABLE DE 2"	6 días	mar 15/10/24	mar 22/10/24	$ 1,134,867.00
83		SUMINISTRO E INSTALACION DE BUGE REDUCCION DE 3" A 2"	6 días	mar 15/10/24	mar 22/10/24	$ 378,289.00
84		SUMINISTRO E INSTALACION DE CAJA PLASTICA PARA MEDIDOR DE AGUA POTABLE. INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CORRECTO	6 días	mar 15/10/24	mar 22/10/24	$ 1,011,209.00
85		SUMINISTRO E INSTALACION DE TEE PVC DIAMETRO 3" INCLUYE SOLDADURA	6 días	mar 15/10/24	mar 22/10/24	$ 204,510.00
86		SUMINISTRO E INSTALACION DE TEE PVC DIAMETRO 2" INCLUYE SOLDADURA	6 días	mar 15/10/24	mar 22/10/24	$ 68,170.00
87		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO 90 PVC DIAMETRO 3" INCLUYE SOLDADURA	6 días	mar 15/10/24	mar 22/10/24	$ 68,170.00
88		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO 90 PVC DIAMETRO 2" INCLUYE SOLDADURA	6 días	mar 15/10/24	mar 22/10/24	$ 204,510.00
89		SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA DE CORTE DIAMETRO 1/2" EN PVC. INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CORRECTO	6 días	mar 15/10/24	mar 22/10/24	$ 272,680.00

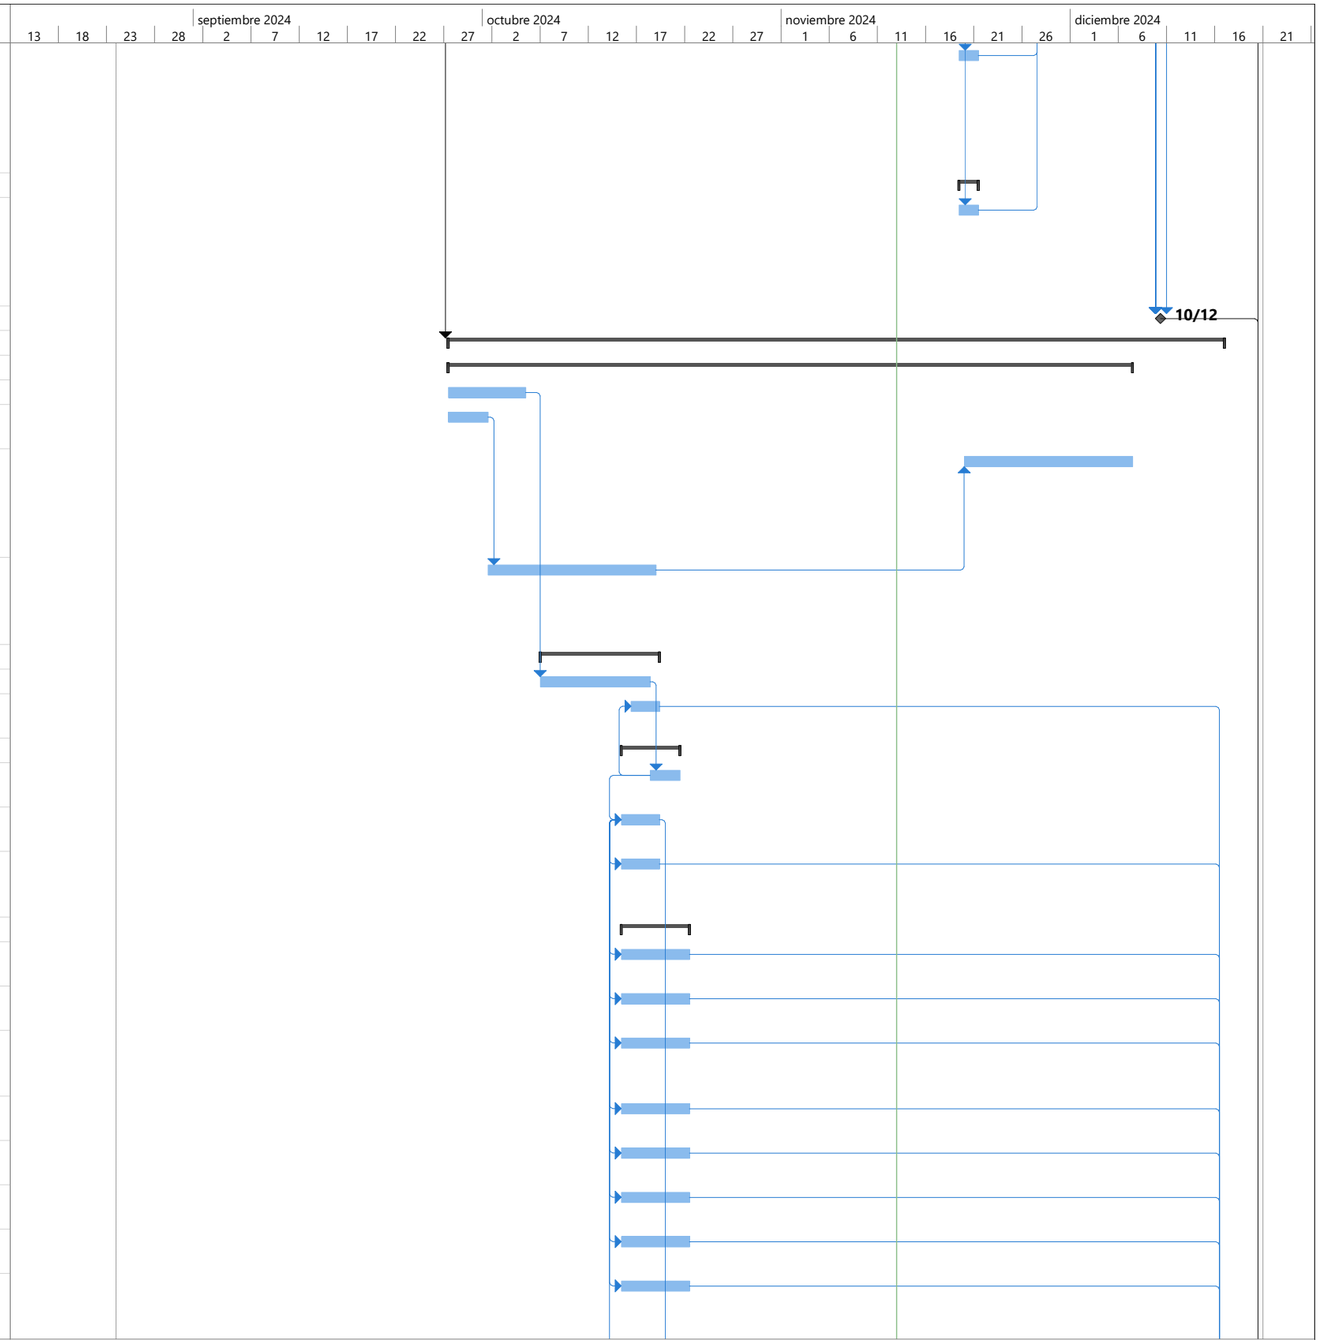

Proyecto: 1. PROGRAMACION P
Fecha: mié 13/11/24

Tarea · Resumen · Hito inactivo · solo duración · solo el comienzo · Hito externo · Progreso manual
División · Resumen del proyecto · Resumen inactivo · Informe de resumen manual · solo fin · Fecha límite
Hito · Tarea inactiva · Tarea manual · Resumen manual · Tareas externas · Progreso

Id		Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Costo
90			SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA DE CORTE DE CORTINA DIAMETRO 2" EN BRONCE METÁLICO. INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO	6 días	mar 15/10/24	mar 22/10/24	$ 136,340.00
91			**ELÉCTRICO**	**32.5 días**	**sáb 19/10/24**	**jue 28/11/24**	$ 51,413,022.00
92			DISEÑOS INGENIERO ELECTRICISTA ACUERDO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS RETIE	4 días	sáb 19/10/24	jue 24/10/24	$ 3,507,160.00
93			SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ELECTROBOMBA TRIFILAR DE 12HP, CON SUCCIÓN DE 2" Y ESCAPE DE 2" VOLTAJE 220V CAUDAL 900L/MIN DE PEDROLLO SIMILAR O DE MEJORES CARACTERISTICAS. INCLUYE FLOTADORES ELÉCTRICOS, ACCESORIOS PVC 2" (CODOS, UNIVERSAL. ADACTADOR MACHO.	7 días	mié 20/11/24	jue 28/11/24	$ 13,640,839.00
94			SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO DE CONTROL PARA 02 ELECTROBOMBAS DE 12HP, INCLUYE TOTALIZADORTRIFILAR 60 AMP PARA RIEL OMEGA SIEMENS, ABB O SIMILAR , 2 BREKER TRIFILAR PARA RIEL OMEGA DE 30 AMP SIEMENS, ABB, SCHNEIDER O SIMILIAR ,01 VIGILANTE DETENSIO	4 días	mié 20/11/24	lun 25/11/24	$ 1,884,249.00
95			SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLEADO 2X14 AWG ENCAUCHETADO PARA SEÑAL DE FLOTADOR ELÉCTRICO. INCLUYE TUBERÍA Y CANALIZACIÓN	4 días	mié 20/11/24	lun 25/11/24	$ 32,380,774.00
96			**TANQUE SUBTERRANEO**	**18 días**	**lun 25/11/24**	**lun 16/12/24**	$ 27,977,526.00
97			MANTENIMIENTO DE TANQUE SUBTERRANEO EN CONCRETO REFORZADO, INCLUYE LIMPIEZA PREVIA, RESANE DE FISURA CON SIKAFLEX, APLICACIÓN DE MEMBRANAS DE SIKAPROOF EN LAS JUNTAS, APLICACIÓN DE PINTURA PÓXICA COLOR A ESCOGER	10 días	lun 25/11/24	vie 6/12/24	$ 19,448,586.00
98			SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA METALICA EN ALUMINIO COLOR ANOLOC INCLUYE PERFILERIA PB 6038 MARCO, VISAGRAS, CERRAJERIA Y DEMÁS ELEMENTOS PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO EN CUARTO DE BOMBAS	4 días	vie 6/12/24	mié 11/12/24	$ 4,088,984.00
99			SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE TRANSFERENCIA ELÉCTRICA AUTOMÁTICA CON ENCLAVAMIENTO MECÁNICO Y ELÉCTRICO, CAPACIDAD DE 150 KVA A 220 V. LA TRANSFERENCIA COMPRENDE ACOMETIDA DE CONEXIÓN DE TABLERO GENERAL, TABLERO DE ACOMETIDAS Y GENERADOR CON CABLE	8 días	vie 6/12/24	lun 16/12/24	$ 4,439,956.00
100			FIN CAPITULO	0 días	lun 16/12/24	lun 16/12/24	$ 0.00
101			**FIN PROYECTO**	0 días	vie 20/12/24	vie 20/12/24	$ 0.00

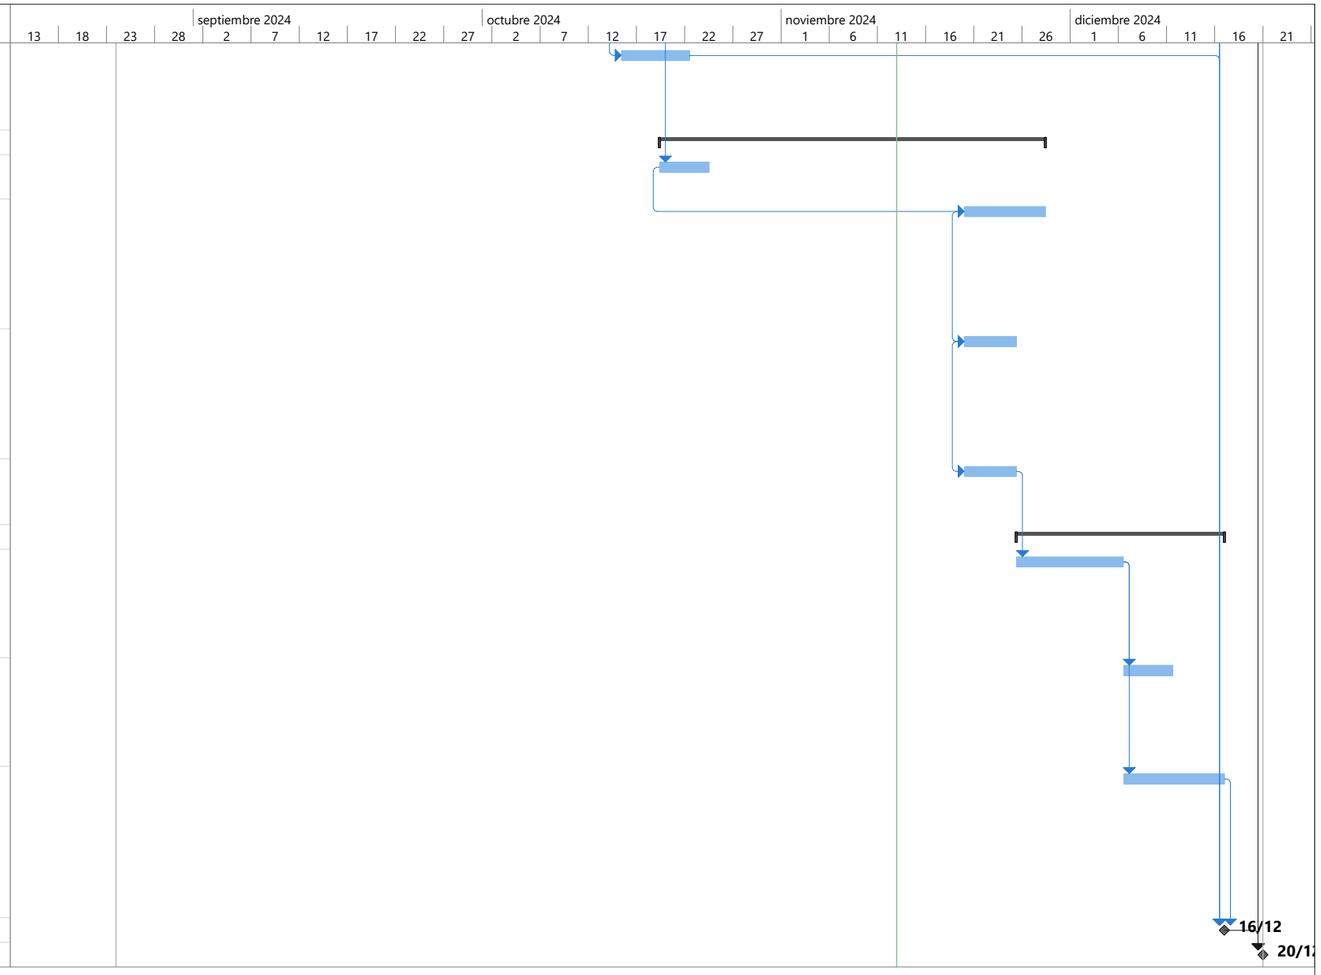

Cordialmente,

CRISTIAN BARON TORRES
C.C 7.938.406
REP LEGAL DE REINGENIERIA INTEGRAL S.A.S

Proyecto: 1. PROGRAMACION P
Fecha: mié 13/11/24

Tarea · Resumen · Hito inactivo · solo duración · solo el comienzo · Hito externo · Progreso manual
División · Resumen del proyecto · Resumen inactivo · Informe de resumen manual · solo fin · Fecha límite
Hito · Tarea inactiva · Tarea manual · Resumen manual · Tareas externas · Progreso
