

Id	Modo de tar	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Costo
1		**OBJETO: REALIZAR OBRAS DE MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS DEL DISTRITO ESPECIAL, DEPORTIVO, CULTURAL, TURÍSTICO, EMPRESARIAL Y**	**101,75 días**	**mié 21/08/24**	**sáb 30/11/24**	**$ 3.816.036.518,00**
2		**FRENTE 7 - Calle 9 entre cra 66 y cra 39**	**39 días**	**un 21/10/24**	**ue 28/11/24**	**$ 960.199.868,00**
3		**ACTIVIDADES PRELIMINARES**	**1 día**	**un 21/10/24**	**un 21/10/24**	$ 1.724.848,00
4		LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO (VÍAS UI	1 día	un 21/10/24	un 21/10/24	**$ 1.724.848,00**
5		**DEMOLICIONES**	**4 días**	**ar 22/10/24**	**ie 25/10/24**	$ 118.571.508,00
6		DEMOLICIÓN DE LOSA EN CONCRETO SIMPLE A MÁQUINA HASTA 20 CMS DE ESPESOR INCLUYE RETIRO DE	4 días	mar 22/10/24	vie 25/10/24	**$ 118.571.508,00**
7		**MOVIMIENTOS DE TIERRA Y TRANSPOR**	**10 días**	**áb 26/10/24**	**un 4/11/24**	**$ 26.485.207,00**
8		EXCAVACIÓN EN TIERRA EN SECO A MANO ENTRE 0 - 2 m DE PROFUNDIDAD (INCLUYE MANO DE	0 días	jue 31/10/24	jue 31/10/24	$ 0,00
9		EXCAVACIÓN A MÁQUINA EN SECO EN MATERIAL COMÚN HASTA 3.0m DE PROFUNDIDAD.	10 días	sáb 26/10/24	lun 4/11/24	$ 5.150.585,00
10		RETIRO DE MATERIAL DE EXCAVACIÓN CON CARGUE EN VOLQUETA A MAQUINA EN BANCO DE 0 A 10 Km. SIN ACARREO INTERNO EN OBRA. INCLUYE DISPOSICIÓN EN	4 días	vie 1/11/24	lun 4/11/24	$ 21.334.622,00
11		**RELLENOS Y BASES**	**6 días**	**lom 3/11/24**	**vie 8/11/24**	**$ 103.705.387,00**
12		ESCARIFICACIÓN, CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE LA SUBRASANTE OBRAS DE MANTENIMIENTO.	3 días	dom 3/11/24	mar 5/11/24	$ 0,00
13		SUMINISTRO E INSTALACIÓN MATERIAL GRANULAR TIPO INVIAS PARA BASE, COMPACTADA AL 100% DEL P.M. OBRAS DE	3 días	mié 6/11/24	vie 8/11/24	$ 103.705.387,00
14		**DEMARCACIÓN Y SEÑALIZACIÓN**	**3 días**	**áb 16/11/24**	**un 18/11/24**	**$ 10.793.216,00**
15		DEMARCACIÓN DE VÍAS URBANAS CON MARCAS LONGITUDINALES 0.12M DE ANCHO EN PINTURAS ACRÍLICAS EN FRIO PARA TRÁFICO CON SUMINISTRO DE MICROESFERAS REFLECTIVAS. DEBERÁ CUMPLIR CON LAS	3 días	sáb 16/11/24	lun 18/11/24	$ 5.321.876,00
16		DEMARCACIÓN DE VÍAS URBANAS CON MARCAS TRANSVERSALES EN PINTURAS ACRÍLICAS EN FRIO PARA TRÁFICO CON SUMINISTRO DE MICROESFERAS REFLECTIVAS. DEBERÁ CUMPLIR CON LAS ESPECIFICACIONES CONTEMPLADAS EN EL MANUAL DE SEÑALIZACIÓN	2 días	dom 17/11/24	lun 18/11/24	$ 5.471.340,00
17		**PAVIMENTO ASFALTICO**	**2 días**	**ue 21/11/24**	**ie 22/11/24**	**$ 10.445.760,00**
18		SELLADO DE FISURAS MENORES A 10 mm EN ASFALTO MODIFICADO CON POLÍMEROS. INCLUYE LIMPIEZA.	2 días	jue 21/11/24	vie 22/11/24	$ 0,00
19		SELLADO DE FISURAS CON POLIFLEX O SIMILAR INCLUYE EQUIPO DE RUTEADO Y LIMPIEZA.	2 días	jue 21/11/24	vie 22/11/24	$ 10.445.760,00
20		**CONCRETOS**	**20 días**	**sáb 9/11/24**	**ue 28/11/24**	**$ 665.541.820,00**
21		CONSTRUCCIÓN DE LOSA DE CONCRETO MR-45 (PREMEZCLADO). INCLUYE ANTISOL Y JUNTAS, CON SU	0 días	mié 13/11/24	mié 13/11/24	$ 0,00
22		CONSTRUCCIÓN DE LOSA DE CONCRETO MR-42 (PREMEZCLADO) CON ACELERANTE A 7 DÍAS. INCLUYE ANTISOL Y JUNTAS, CON SU	20 días	sáb 9/11/24	jue 28/11/24	$ 640.369.116,00

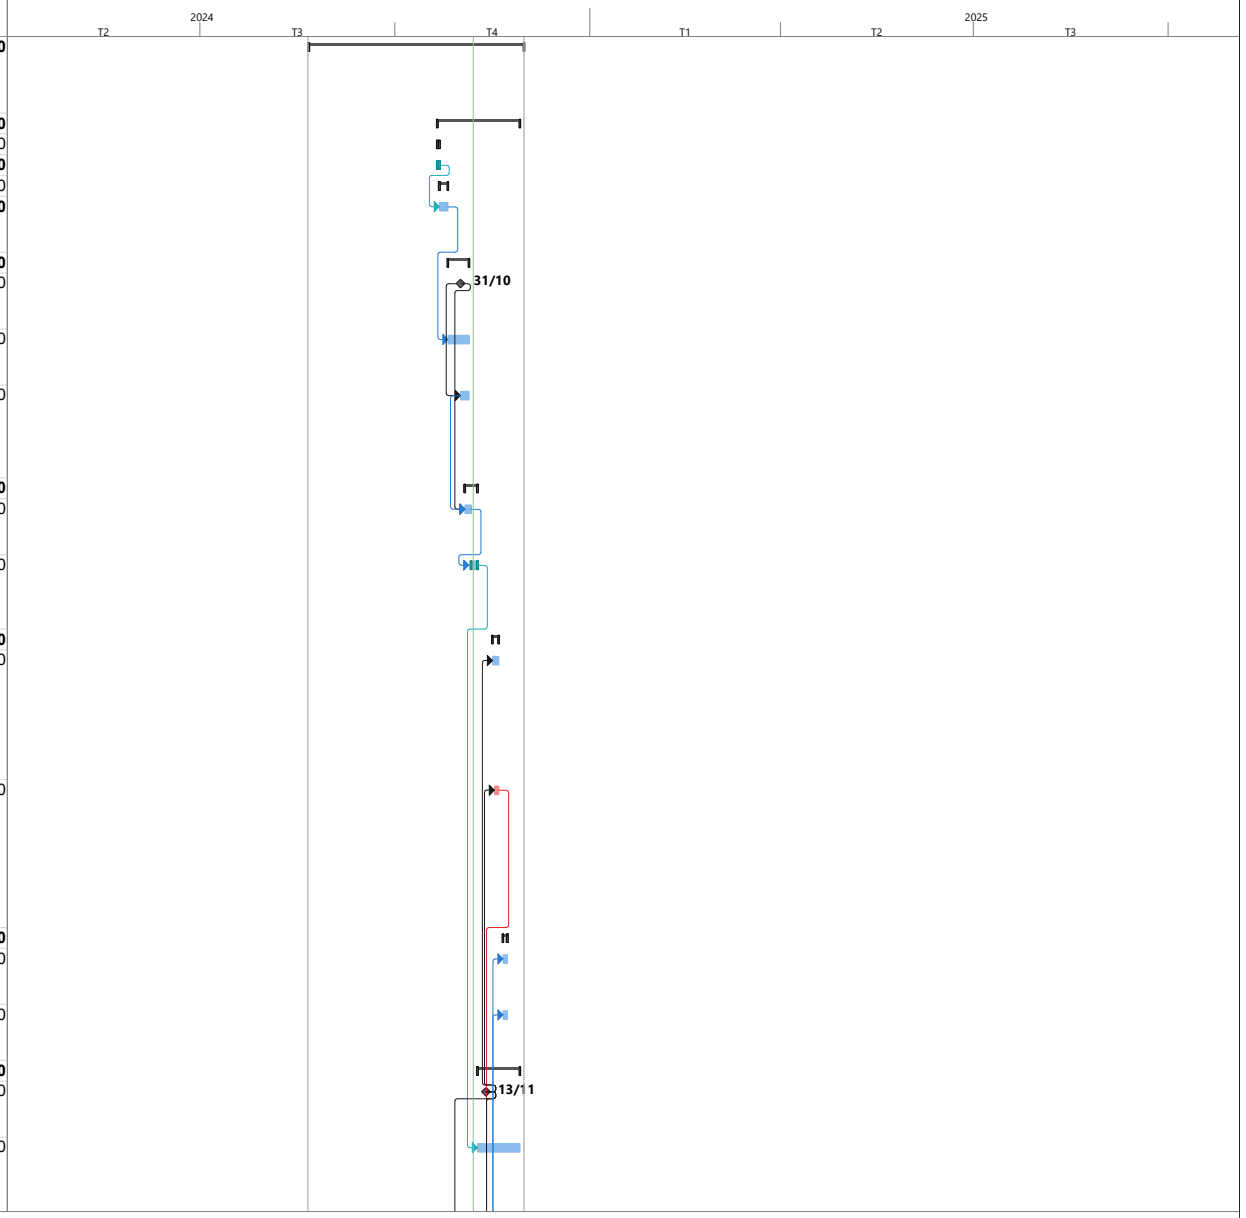

Proyecto: CRONOGRAMA VÍAS
Fecha: jue 7/11/24

Tarea · Resumen · Hito inactivo · solo duración · solo el comienzo · Hito externo · División crítica
División · Resumen del proyecto · Resumen inactivo · Informe de resumen manual · solo fin · Fecha límite · Progreso
Hito · Tarea inactiva · Tarea manual · Resumen manual · Tareas externas · Tareas críticas · Progreso manual


Id	Modo de tar	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Costo
23		CONSTRUCCIÓN SARDINEL TRAPEZOIDAL EN CONCRETO SIMPLE (h=40CMS) F'C=3000 PSI INCLUYE	3 días	lun 18/11/24	mié 20/11/24	$ 25.172.704,00
24		**ACEROS**	**6 días**	**lom 3/11/2**	**vie 8/11/24**	**$ 22.932.122,00**
25		REFUERZO EN ACERO DE 60000 PSI.	6 días	dom 3/11/2	vie 8/11/24	$ 22.932.122,00
26		**FRENTE 7 - INTERCAMBIADORES**	**13 días?**	**lun 18/11/24**	**sáb 30/11/2**	**$ 404.828.721,00**
50						
51		**FRENTE 15 - Cra 34 entre cll 9 y Av Roosev**	**28 días**	**un 30/09/2**	**un 28/10/2**	**$ 8.731.965,00**
87						
88		**FRENTE 16 - Cra 34 entre Av Roosevelt y cl**	**28 días**	**nar 8/10/2**	**nar 5/11/2**	**$ 695.836.505,00**
89		**ACTIVIDADES PRELIMINARES**	**2 días**	**nar 8/10/24**	**ue 10/10/2**	**$ 3.868.036,00**
90		LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO (VÍAS UI	2 días	nar 8/10/24	ue 10/10/2	$ 3.868.036,00
91		**DEMOLICIONES**	**3 días**	**nié 9/10/24**	**áb 12/10/2**	**$ 9.588.270,00**
92		DEMOLICIÓN DE CARPETA DE PAVIMENTO ASFÁLTICO A MÁQUINA HASTA 12.5 CM DE ESPESOR	1 día	mié 9/10/24	jue 10/10/24	$ 0,00
93		CORTE DE CARPETA DE PAVIMENTO ASFÁLTICO CON DISCO HASTA 12.5	1 día	mié 9/10/24	jue 10/10/24	$ 0,00
94		FRESADO DE CARPETA DE PAVIMENTO ASFÁLTICO. NO INCLUYE	2 días	mié 9/10/24	vie 11/10/24	$ 0,00
95		DEMOLICIÓN DE LOSA EN CONCRETO SIMPLE A MÁQUINA HASTA 20 CMS DE ESPESOR INCLUYE RETIRO DE	1 día	vie 11/10/24	sáb 12/10/24	$ 8.711.811,00
96		CORTE DE LOSA EN CONCRETO SIMPLE CON DISCO HASTA 20 CMS.	1 día	jue 10/10/24	vie 11/10/24	$ 876.459,00
97		**MOVIMIENTOS DE TIERRA Y TRANSPOR**	**6 días**	**nié 9/10/24**	**ar 15/10/2**	**$ 1.269.357,00**
98		EXCAVACIÓN A MÁQUINA EN SECO EN MATERIAL COMÚN HASTA 3.0m DE PROFUNDIDAD.	1 día	vie 11/10/24	sáb 12/10/24	$ 246.852,00
99		RETIRO DE MATERIAL DE EXCAVACIÓN CON CARGUE EN VOLQUETA A MAQUINA EN BANCO DE 0 A 10 Km. SIN ACARREO INTERNO EN OBRA. INCLUYE DISPOSICIÓN EN	3 días	sáb 12/10/24	mar 15/10/24	$ 1.022.505,00
100		TRANSPORTE DE EQUIPO DE PAVIMENTACIÓN PARA CANTIDADES MENORES A 100 M3 DE CONCRETO	1 día	mié 9/10/24	jue 10/10/24	$ 0,00
101		**RELLENOS Y BASES**	**4 días**	**áb 12/10/2**	**nié 16/10/2**	**$ 121.434.961,00**
102		ESCARIFICACIÓN, CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE LA SUBRASANTE OBRAS DE MANTENIMIENTO.	1 día	sáb 12/10/24	dom 13/10/24	$ 583.653,00
103		SUMINISTRO E INSTALACIÓN MATERIAL GRANULAR TIPO INVIAS PARA BASE, COMPACTADA AL 100% DEL P.M. OBRAS DE	1 día	dom 13/10/24	lun 14/10/24	$ 4.970.291,00
104		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOTEXTIL PARA REPAVIMENTACIÓN TIPO GEOMALLA BX-50 O SIMILAR.	2 días	lun 14/10/24	mié 16/10/24	$ 115.881.017,00
105		**DEMARCACIÓN Y SEÑALIZACIÓN**	**4 días**	**vie 1/11/24**	**lun 4/11/24**	**$ 8.992.508,00**
106		DEMARCACIÓN DE VÍAS URBANAS CON MARCAS LONGITUDINALES 0.12M DE ANCHO EN PINTURAS ACRÍLICAS EN FRIO PARA TRAFICO CON SUMINISTRO DE MICROESFERAS REFLECTIVAS. DEBERÁ CUMPLIR CON LAS	4 días	vie 1/11/24	lun 4/11/24	$ 7.168.728,00

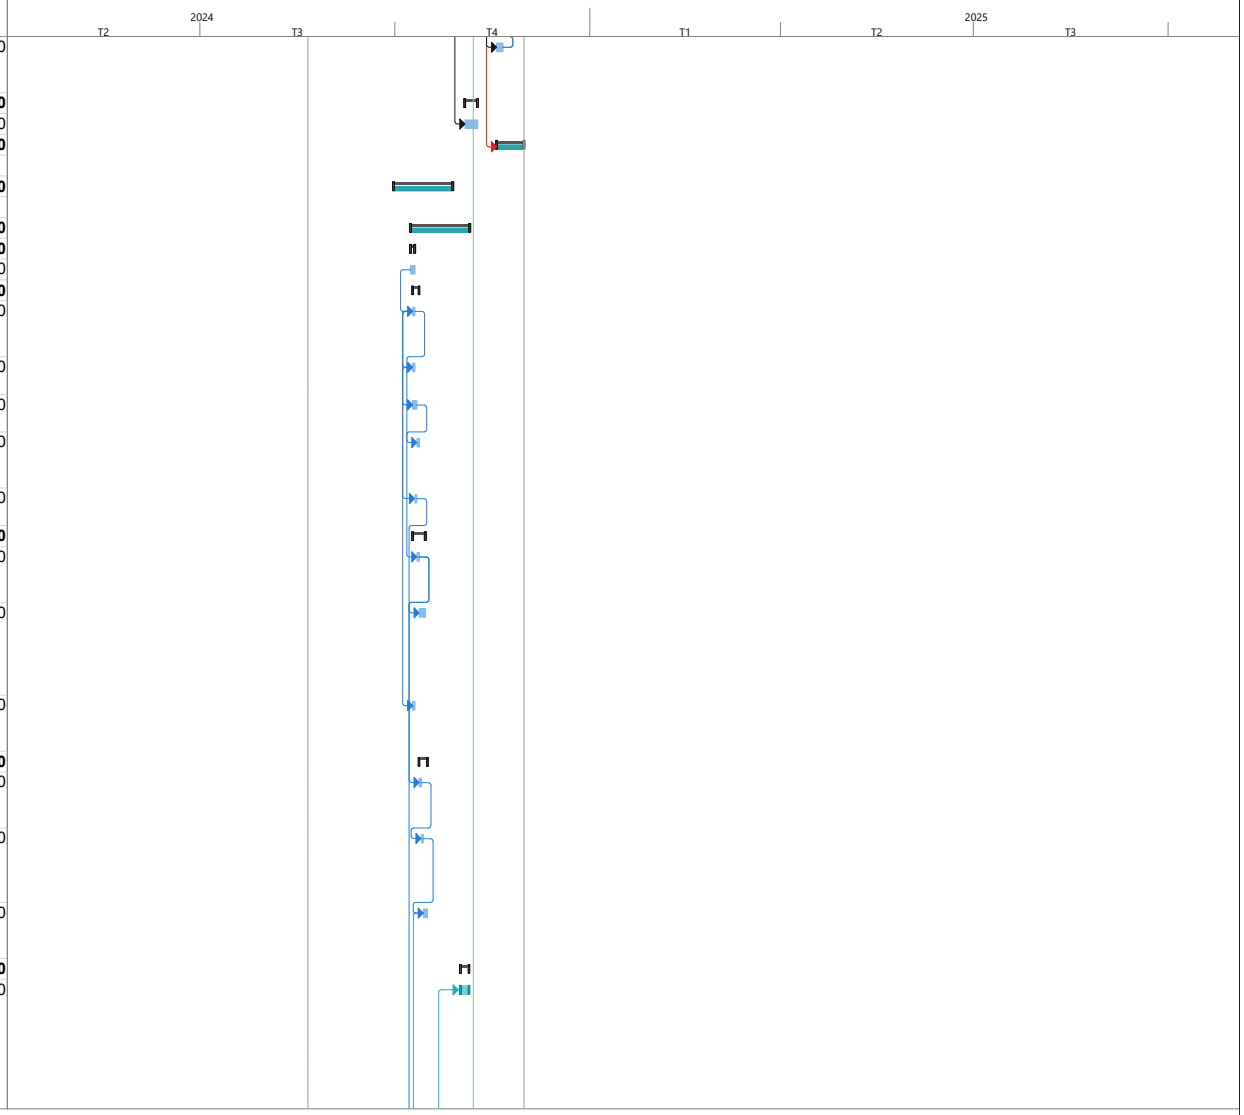

Proyecto: CRONOGRAMA VÍAS
Fecha: jue 7/11/24

Tarea
División
Hito
Resumen
Resumen del proyecto
Tarea inactiva
Hito inactivo
Resumen inactivo
Tarea manual
solo duración
Informe de resumen manual
Resumen manual
solo el comienzo
solo fin
Tareas externas
Hito externo
Fecha límite
Tareas críticas
División crítica
Progreso
Progreso manual


Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Costo
107		DEMARCACIÓN DE VÍAS URBANAS CON MARCAS TRANSVERSALES EN PINTURAS ACRÍLICAS EN FRIO PARA TRAFICO CON SUMINISTRO DE MICROESFERAS REFLECTIVAS. DEBERÁ CUMPLIR CON LAS ESPECIFICACIONES CONTEMPLADAS EN EL MANUAL DE SEÑALIZACIÓN	1 día	vie 1/11/24	vie 1/11/24	$ 1.823.780,00
108		**PAVIMENTO ASFALTICO**	**3,75 días**	**un 14/10/24**	**ue 17/10/24**	**$ 493.210.402,00**
109		SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE EMULSIÓN ASFÁLTICA PARA IMPRIMACIÓN A MÁQUINA. OBRAS DE	2 días	lun 14/10/24	mié 16/10/24	$ 36.692.596,00
110		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ASFALTO MODIFICADO CON POLÍMEROS O PRODUCTO SIMILAR	1 día	jue 17/10/24	jue 17/10/24	$ 0,00
111		SELLADO DE FISURAS CON POLIFLEX O SIMILAR INCLUYE EQUIPO DE RUTEADO Y LIMPIEZA.	1 día	jue 17/10/24	jue 17/10/24	$ 51.155.208,00
112		RIEGO DE LIGA PARA BORDES.	1 día	un 14/10/24	mar 15/10/24	$ 45.495,00
113		CONSTRUCCIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA A MÁQUINA, MENOR O IGUAL A 3". INCLUYE SUMINISTRO MATERIAL TIPO CAPA DE RODADURA.	2,75 días	lun 14/10/24	mié 16/10/24	$ 405.317.103,00
114		**CONCRETOS**	**1 día**	**ue 17/10/24**	**ue 17/10/24**	**$ 47.049.873,00**
115		CONSTRUCCIÓN DE LOSA DE CONCRETO MR-42 (PREMEZCLADO) CON ACELERANTE A 7 DÍAS. INCLUYE ANTISOL Y JUNTAS, CON SU	1 día	jue 17/10/24	jue 17/10/24	$ 47.049.873,00
116		CONSTRUCCIÓN SARDINEL RECTANGULAR EN CONCRETO SIMPLE (15X15CMS) F'C=3000 PSI	1 día	jue 17/10/24	jue 17/10/24	$ 0,00
117		**ACEROS**	**2 días**	**áb 12/10/24**	**un 14/10/24**	**$ 0,00**
118		REFUERZO EN ACERO DE 60000 PSI.	1 día	áb 12/10/24	om 13/10/24	$ 0,00
119		ANCLAJE EN HIERRO DE 1/2"PERFORACIÓN DE 5/8" Y LONGITUD ENTRE 20-30 CMS	1 día	dom 13/10/24	lun 14/10/24	$ 0,00
120		**DRENAJES**	**3 días**	**un 14/10/24**	**ue 17/10/24**	**$ 10.423.098,00**
121		NIVELACIÓN SUMIDERO SENCILLO F'C =3500 PSI INCLUYE MATERIAL PREPARADO IN SITU, ADITIVO PARA CURADO Y RETIRO DE ESCOMBROS.	1 día	lun 14/10/24	mar 15/10/24	$ 2.621.443,00
122		NIVELACIÓN CÁMARA DE INSPECCIÓN F'C =3500 PSI INCLUYE MATERIAL PREPARADO IN SITU, ADITIVO PARA CURADO Y RETIRO DE	1 día	mar 15/10/24	mié 16/10/24	$ 4.279.370,00
123		REALCE Y REPARACIÓN DE SUMIDERO DOBLE (INCLUYE CONCRETO DE F´c = 3000psi ELABORADO EN OBRA, REJILLA Y	1 día	mié 16/10/24	jue 17/10/24	$ 3.522.285,00
124						
125		**FRENTE 17 - Cra 36 entre cll 5 y Av Roosev**	**29 días**	**nié 21/08/24**	**ue 19/09/24**	**$ 634.012.636,00**
126		**ACTIVIDADES PRELIMINARES**	**1 día**	**nié 21/08/24**	**ue 22/08/24**	**$ 4.070.577,00**
128		**DEMOLICIONES**	**5 días**	**ue 22/08/24**	**ar 27/08/24**	**$ 30.854.710,00**
134		**MOVIMIENTOS DE TIERRA Y TRANSPOR**	**6 días**	**áb 24/08/24**	**ie 30/08/24**	**$ 0,00**
138		**RELLENOS Y BASES**	**3 días**	**un 26/08/24**	**ue 29/08/24**	**$ 113.939.094,00**
142		**DEMARCACIÓN Y SEÑALIZACIÓN**	**3 días**	**un 16/09/24**	**ue 19/09/24**	**$ 32.885.525,00**
145		**PAVIMENTO ASFALTICO**	**12 días**	**ar 27/08/24**	**om 8/09/24**	**$ 452.262.730,00**
151		**CONCRETOS**	**4 días**	**om 8/09/24**	**ue 12/09/24**	**$ 0,00**
154		**ACEROS**	**2 días**	**áb 31/08/24**	**un 2/09/24**	**$ 0,00**
157		**DRENAJES**	**2 días**	**ue 12/09/24**	**áb 14/09/24**	**$ 0,00**
161						
162		**FRENTE 18 - Cra 36 entre Av Roosevelt y cl**	**80 días**	**vie 6/09/24**	**un 25/11/24**	**$ 927.631.693,00**

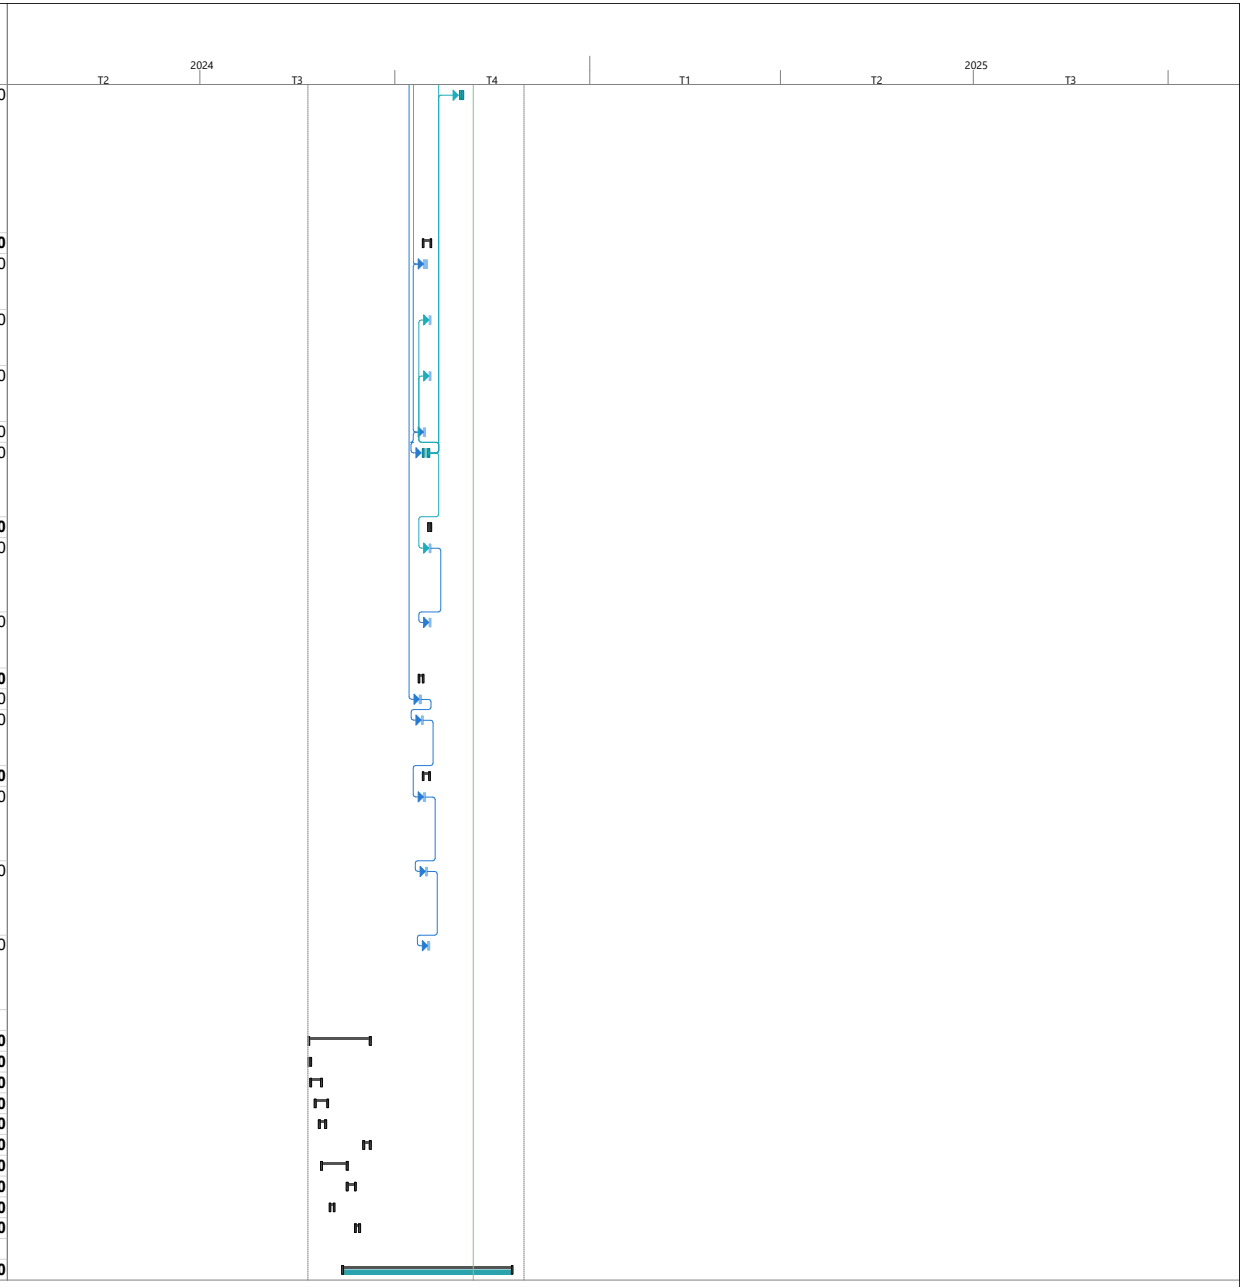

Proyecto: CRONOGRAMA VÍAS
Fecha: jue 7/11/24

Tarea
División
Hito
Resumen
Resumen del proyecto
Tarea inactiva
Hito inactivo
Resumen inactivo
Tarea manual
solo duración
Informe de resumen manual
Resumen manual
solo el comienzo
solo fin
Tareas externas
Hito externo
Fecha límite
Tareas críticas
División crítica
Progreso
Progreso manual


Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Costo
163		**ACTIVIDADES PRELIMINARES**	**10 días**	**vie 6/09/24**	**un 16/09/2**	**$ 2.499.935,00**
164		LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO (VÍAS UI	10 días	vie 6/09/24	un 16/09/2	$ 2.499.935,00
165		**DEMOLICIONES**	**64 días**	**vie 6/09/24**	**sáb 9/11/24**	**$ 119.352.050,00**
166		DEMOLICIÓN DE CARPETA DE PAVIMENTO ASFÁLTICO A MÁQUINA HASTA 12.5 CM DE ESPESOR	2 días	vie 6/09/24	dom 8/09/24	$ 10.897.834,00
167		CORTE DE CARPETA DE PAVIMENTO ASFÁLTICO CON DISCO HASTA 12.5	2 días	vie 6/09/24	dom 8/09/24	$ 252.155,00
168		FRESADO DE CARPETA DE PAVIMENTO ASFÁLTICO. NO INCLUYE	1 día	vie 6/09/24	sáb 7/09/24	$ 0,00
169		DEMOLICIÓN DE LOSA EN CONCRETO SIMPLE A MÁQUINA HASTA 20 CMS DE ESPESOR INCLUYE RETIRO DE	64 días	vie 6/09/24	sáb 9/11/24	$ 106.802.352,00
170		CORTE DE LOSA EN CONCRETO SIMPLE CON DISCO HASTA 20 CMS.	64 días	vie 6/09/24	sáb 9/11/24	$ 1.399.709,00
171		**MOVIMIENTOS DE TIERRA Y TRANSPOR**	**60 días**	**om 15/09/2**	**ue 14/11/2**	**$ 28.563.285,00**
172		EXCAVACIÓN A MÁQUINA EN SECO EN MATERIAL COMÚN HASTA 3.0m DE PROFUNDIDAD.	5 días	sáb 9/11/24	jue 14/11/24	$ 5.044.968,00
173		RETIRO DE MATERIAL DE EXCAVACIÓN CON CARGUE EN VOLQUETA A MAQUINA EN BANCO DE 0 A 10 Km. SIN ACARREO INTERNO EN OBRA. INCLUYE DISPOSICIÓN EN	2 días	mar 12/11/24	jue 14/11/24	$ 20.897.139,00
174		TRANSPORTE DE EQUIPO DE PAVIMENTACIÓN PARA CANTIDADES MENORES A 100 M3 DE CONCRETO	2 días	dom 15/09/24	mar 17/09/24	$ 2.621.178,00
175		**RELLENOS Y BASES**	**2 días**	**nié 13/11/2**	**ie 15/11/2**	**$ 182.694.646,00**
176		ESCARIFICACIÓN, CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE LA SUBRASANTE OBRAS DE MANTENIMIENTO.	1 día	mié 13/11/24	jue 14/11/24	$ 18.219.340,00
177		SUMINISTRO E INSTALACIÓN MATERIAL GRANULAR TIPO INVIAS PARA BASE, COMPACTADA AL 100% DEL P.M. OBRAS DE	1 día	jue 14/11/24	vie 15/11/24	$ 101.578.825,00
178		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOTEXTIL PARA REPAVIMENTACIÓN TIPO GEOMALLA BX-50 O SIMILAR.	1 día	jue 14/11/24	vie 15/11/24	$ 62.896.481,00
179		**DEMARCACIÓN Y SEÑALIZACIÓN**	**2 días**	**ie 22/11/2**	**om 24/11/2**	**$ 10.391.058,00**
180		DEMARCACIÓN DE VÍAS URBANAS CON MARCAS LONGITUDINALES 0.12M DE ANCHO EN PINTURAS ACRÍLICAS EN FRIO PARA TRAFICO CON SUMINISTRO DE MICROESFERAS REFLECTIVAS. DEBERÁ CUMPLIR CON LAS	2 días	vie 22/11/24	dom 24/11/24	$ 2.909.001,00
181		DEMARCACIÓN DE VÍAS URBANAS CON MARCAS TRANSVERSALES EN PINTURAS ACRÍLICAS EN FRIO PARA TRAFICO CON SUMINISTRO DE MICROESFERAS REFLECTIVAS. DEBERÁ CUMPLIR CON LAS ESPECIFICACIONES CONTEMPLADAS EN EL MANUAL DE SEÑALIZACIÓN	1 día	vie 22/11/24	sáb 23/11/24	$ 7.482.057,00
182		**PAVIMENTO ASFALTICO**	**3 días**	**ue 14/11/2**	**om 17/11/2**	**$ 0,00**
183		SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE EMULSIÓN ASFÁLTICA PARA IMPRIMACIÓN A MÁQUINA. OBRAS DE	1 día	jue 14/11/24	vie 15/11/24	$ 0,00
184		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ASFALTO MODIFICADO CON POLÍMEROS O PRODUCTO SIMILAR	1 día	vie 15/11/24	sáb 16/11/24	$ 0,00
185		SELLADO DE FISURAS CON POLIFLEX O SIMILAR INCLUYE EQUIPO DE RUTEADO Y LIMPIEZA.	1 día	sáb 16/11/24	dom 17/11/24	$ 0,00

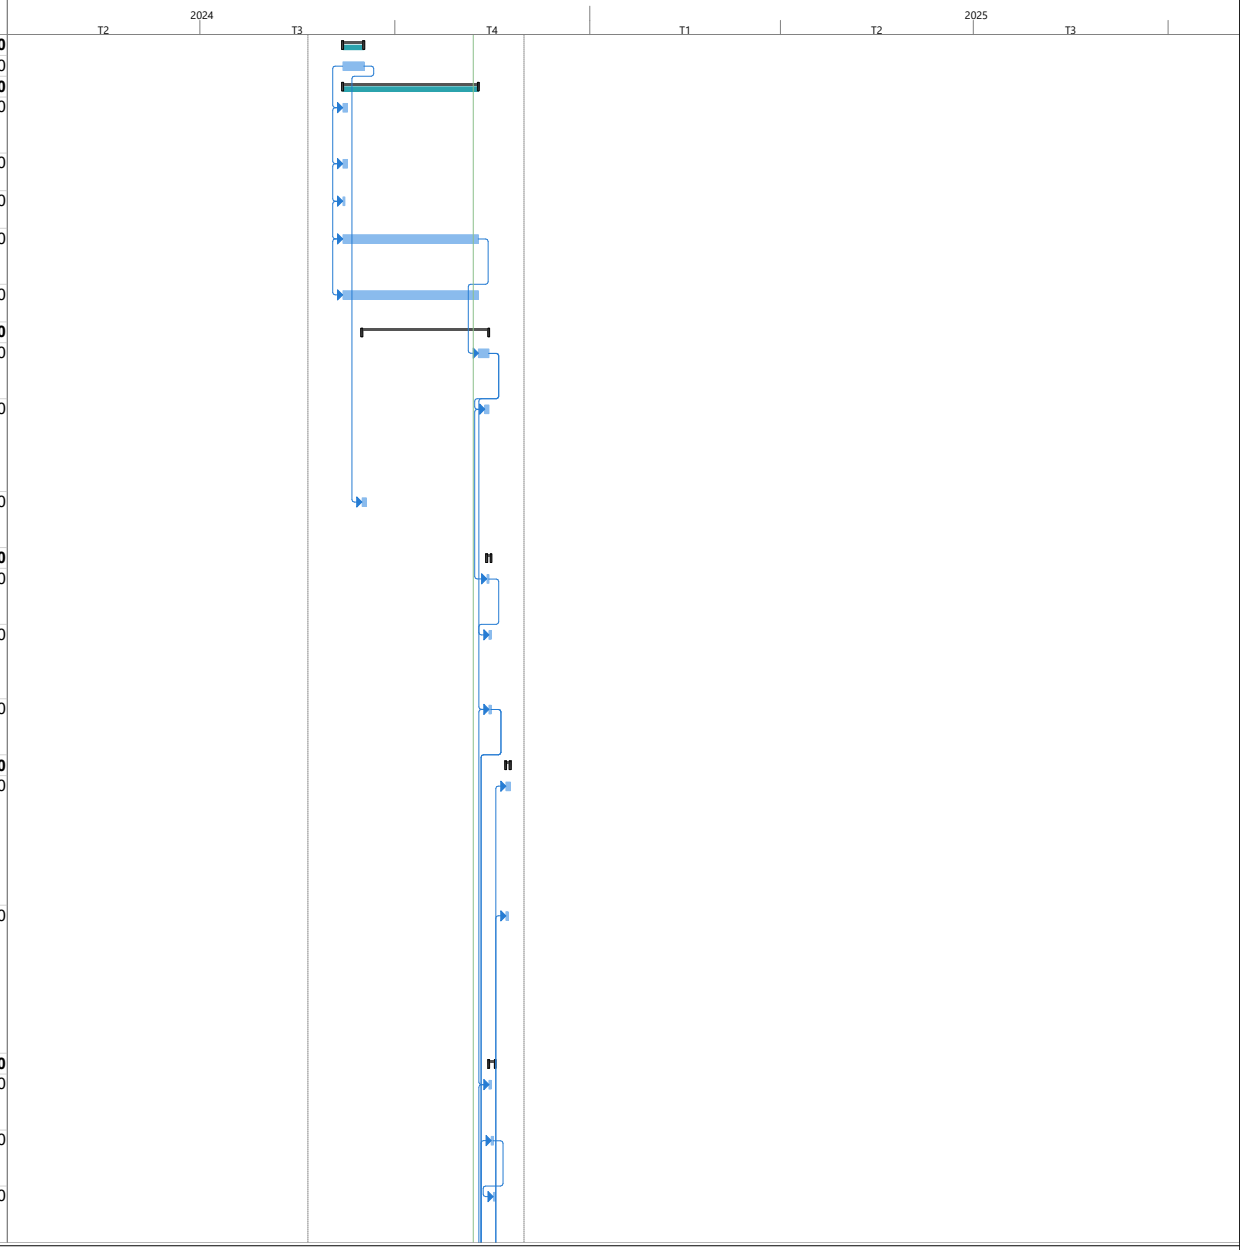

Proyecto: CRONOGRAMA VÍAS
Fecha: jue 7/11/24

Tarea
División
Hito
Resumen
Resumen del proyecto
Tarea inactiva
Hito inactivo
Resumen inactivo
Tarea manual
solo duración
Informe de resumen manual
Resumen manual
solo el comienzo
solo fin
Tareas externas
Hito externo
Fecha límite
Tareas críticas
División crítica
Progreso
Progreso manual

Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Costo
186		RIEGO DE LIGA PARA BORDES.	1 día	ue 14/11/24	ie 15/11/24	$ 0,00
187		CONSTRUCCIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA A MÁQUINA, MENOR O IGUAL A 3". INCLUYE SUMINISTRO MATERIAL TIPO CAPA DE RODADURA.	1 día	jue 14/11/24	vie 15/11/24	$ 0,00
188		**CONCRETOS**	**7 días**	**ie 15/11/24**	**ie 22/11/24**	**$ 579.614.462,00**
189		CONSTRUCCIÓN DE LOSA DE CONCRETO MR-42 (PREMEZCLADO) CON ACELERANTE A 7 DÍAS. INCLUYE ANTISOL Y JUNTAS, CON SU	4 días	vie 15/11/24	mar 19/11/24	$ 576.807.437,00
190		CONSTRUCCIÓN SARDINEL RECTANGULAR EN CONCRETO SIMPLE (15X15CMS) F'C=3000 PSI	3 días	mar 19/11/24	vie 22/11/24	$ 2.807.025,00
191		**ACEROS**	**3 días**	**ie 15/11/24**	**om 17/11/2**	**$ 4.516.257,00**
192		REFUERZO EN ACERO DE 60000 PSI.	1 día	ie 15/11/24	áb 16/11/24	$ 4.516.257,00
193		ANCLAJE EN HIERRO DE 1/2"PERFORACIÓN DE 5/8" Y LONGITUD ENTRE 20-30 CMS	1 día	vie 15/11/24	vie 15/11/24	$ 0,00
194		**DRENAJES**	**1 día**	**áb 16/11/24**	**áb 16/11/24**	**$ 0,00**
195		NIVELACIÓN SUMIDERO SENCILLO F'C =3500 PSI INCLUYE MATERIAL PREPARADO IN SITU, ADITIVO PARA CURADO Y RETIRO DE ESCOMBROS.	1 día	sáb 16/11/24	sáb 16/11/24	$ 0,00
196		NIVELACIÓN CÁMARA DE INSPECCIÓN F'C =3500 PSI INCLUYE MATERIAL PREPARADO IN SITU, ADITIVO PARA CURADO Y RETIRO DE	1 día	sáb 16/11/24	sáb 16/11/24	$ 0,00
197		REALCE Y REPARACIÓN DE SUMIDERO DOBLE (INCLUYE CONCRETO DE F´c = 3000psi ELABORADO EN OBRA, REJILLA Y	1 día	sáb 16/11/24	sáb 16/11/24	$ 0,00
198						
199		**ITEMS NO PREVISTOS**	**14 días**	**vie 1/11/24**	**ue 14/11/24**	**$ 184.795.130,00**
200		ACARREO DE CARPETA ASFÁLTICA PROVENIENTE DE LA DEMOLICIÓN DE VÍAS A BOTADEROS OFICIALES	2 días	vie 1/11/24	sáb 2/11/24	$ 10.160.767,00
201		INSTALACIÓN DE JUNTA DE DILATACIÓN EN ICOPOR 10 MM DE	7 días	vie 8/11/24	jue 14/11/24	$ 4.376.500,00
202		**INDIRECTOS**	**2 días**	**sáb 2/11/24**	**lun 4/11/24**	**$ 170.257.863,00**
203		Plan de Adaptación de la Guía Ambiental - PAGA	2 días	sáb 2/11/24	lun 4/11/24	$ 73.644.729,00
204		PMT	2 días	sáb 2/11/24	lun 4/11/24	$ 96.613.134,00

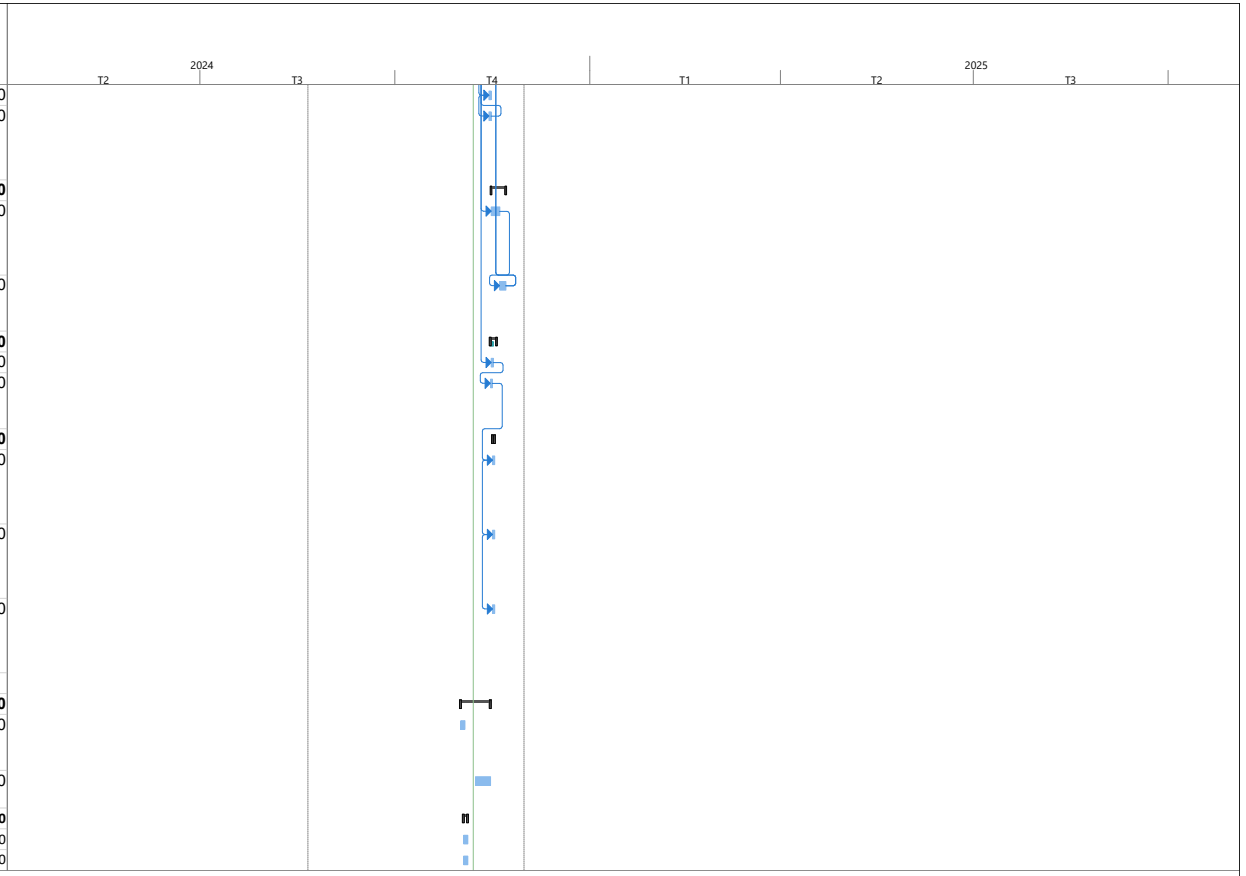

Proyecto: CRONOGRAMA VÍAS
Fecha: jue 7/11/24

Tarea
Resumen
Hito inactivo
solo duración
solo el comienzo
Hito externo
División crítica
División
Resumen del proyecto
Resumen inactivo
Informe de resumen manual
solo fin
Fecha límite
Progreso
Hito
Tarea inactiva
Tarea manual
Resumen manual
Tareas externas
Tareas críticas
Progreso manual
