Deporte	**PROCESO** APOYO A LA INFRAESTRUCTURA TÉCNICA Y CIENTÍFICA	**Versión: 1** **CÓDIGO:**
	FORMATO INFORME DE AVANCE MENSUAL CONVENIOS DE INFRAESTRUCTURA	ATC-FR-003 Página _ de _

INFORME DE AVANCE DE (1 septiembre - al 30 septiembre) DE (2024)

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONVENIO

CONVENIO Nº 502 DE 2024 SUSCRITO ENTRE COLDEPORTES Y EL MUNICIPIO DE CALDONO CAUCA

Objeto del Convenio:								
Valor del Convenio:	$ 1.193.550.411,00		Aporte de Coldeportes:		$ 1.193.550.411,00		Aporte del Municipio:	$ 0,00
Valor Adición:	$ 0,00							
Valor Total:	$ 1.193.550.411,00							
Plazo de Ejecución:	hasta el 31 de diciembre de 2024		Suspensión 1	XXX días	Reinicio:	D/M/AÑO	Prórroga Nº 1	Indicar nuevo plazo
Fecha de Inicio:	29/05/2024		Suspensión 2	XXX días	Reinicio:	D/M/AÑO	Prórroga Nº 2	Indicar nuevo plazo
Vencimiento:	31/12/2024						Plazo Actualizado	D/M/AÑO
Póliza de garantía única:	Vigencia póliza (Fechas)				Valor		Modificación fecha	Modificación Valor
Aseguradora Solidaria de Colombia	Desde	30/05/2024	Hasta	30/06/2025	$ 238.710.082,20		Hasta D/M/AÑO	$ 0,00

2. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO

Informe Nº	1	Período comprendido entre el	9 de septiembre de 2024	y el	30 de septiembre de 2024
Proyecto	CONSTRUCCIÓN DE PLACA DEPORTIVA Y CUBIERTA EN ESTRUCTURA METÁLICA PARA EL ESCENARIO DEPORTIVO UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CALDONO, DEPARTAMENTO DEL CAUCA				
Localización	Municipio de Caldono - Cauca				

CONTRATO DE INTERVENTORÍA		CONTRATO DE OBRA	
Objeto:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, FINANCIERA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL PARA EL PROYECTO QUE TIENE POR OBJETO CONSTRUCCIÓN DE PLACA DEPORTIVA Y CUBIERTA EN ESTRUCTURA METÁLICA PARA ESCENARIO DEPORTIVO UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CALDONO DEPARTAMENTO DEL CAUCA	Objeto:	CONSTRUCCIÓN DE PLACA DEPORTIVA Y CUBIERTA EN ESTRUCTURA METÁLICA PARA ESCENARIO DEPORTIVO UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CALDONO DEPARTAMENTO DEL CAUCA
Contrato Nº:	2.28.10-01 del 2024	Contrato Nº:	2.28.03-01 del 2024
Contratista:	CONSORCIO ESCENARIO DEPORTIVO CALDONO 2024	Contratista:	CONSORCIO ESCENARIO DEPORTIVO 2024
Plazo Inicial:	Cinco (05) meses	Plazo Inicial:	Cuatro (04) meses
Fecha de Inicio:	9 de septiembre de 2024	Fecha de Inicio:	9 de septiembre de 2024
*Fecha de Suspensión:	N/A	*Fecha de Suspensión:	N/A
*Fecha de Reinicio:	N/A	*Fecha de Reinicio:	N/A
Fecha de Terminación:	9 de febrero de 2025	Fecha de Terminación:	9 de enero de 2025
Prórrogas:	N/A	Prórrogas:	N/A
Plazo Actualizado:	N/A	Plazo Actualizado:	N/A
Valor Inicial:	$ 60.547.551,00	Valor Inicial:	
Valor Adiciones:	N/A	Valor Adiciones:	
Valor Actualizado:	N/A	Valor Actualizado:	
Valor pagado:	$ 0,00	Valor pagado:	$ 0,00
Valor por pagar:	$ 60.547.551,00	Valor por pagar:	$ 1.130.892.697,00
Nombre Supervisor:	RODRIGO ARMANDO ASTUDILLO GIL	Nombre Interventor:	MARIA ALEJANDRA LEGARDA LEMOS

ESTADO DE LAS GARANTÍAS

CONTRATO DE INTERVENTORÍA Nº 2.28.10-01 DE 2024

CONCEPTO	VIGENTE (Fechas) DESDE	VIGENTE (Fechas) HASTA	VALOR
Cumplimiento	9/09/2024	9/06/2025	$ 6.054.755,00
Prestaciones Sociales	9/09/2024	9/02/2028	$ 3.027.377,55
Calidad del Servicio	9/02/2025	9/02/2028	$ 6.054.755,10
Seguros Mundial	Póliza N°		C-100081820

CONTRATO DE OBRA Nº 2.28.03-01 DE 2024

CONCEPTO	VIGENTE (Fechas) DESDE	VIGENTE (Fechas) HASTA	VALOR
Cumplimiento	15/08/2024	15/02/2025	$ 113.089.269,70
Pagos de salarios, Prestacion sociales	15/08/2024	15/12/2027	$ 226.178.539,40
Estabilidad y Calidad de la obra	15/08/2024		$ 339.267.809,10
Responsabilidad civil extracontractual	15/08/2024	15/12/2024	$ 390.000.000,00
	Póliza N°		430-47-994000067228
Aseguradora Solidaria de Colombia	Póliza N°		430-74-994000025173

Deporte	**PROCESO** APOYO A LA INFRAESTRUCTURA TÉCNICA Y CIENTÍFICA	**Versión: 1**
	FORMATO INFORME DE AVANCE MENSUAL CONVENIOS DE INFRAESTRUCTURA	**CÓDIGO:** ATC-FR-003 Página __ de __

A N E X O N º 2: REGISTRO FOTOGRÁFICO

CONVENIO 502 DE 2024 SUSCRITO ENTRE COLDEPORTES Y MUNICIPIO DE CALDONO

REGISTRO FOTOGRÁFICO - PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE PLACA DEPORTIVA Y CUBIERTA EN ESTRUCTURA METÁLICA PARA ESCENARIO DEPORTIVO UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CALDONO DEPARTAMENTO DEL CAUCA

Proyecto	CONSTRUCCIÓN DE PLACA DEPORTIVA Y CUBIERTA EN ESTRUCTURA METÁLICA PARA ESCENARIO DEPORTIVO UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CALDONO DEPARTAMENTO DEL CAUCA	Localización	MUNICIPIO DE CALDONO
Contratista:	CONSORCIO ESCENARIO DEPORTIVO 2024	Director de obra:	CRISTIAN CAMILO MORENO
Interventor:	CONSORCIO ESCENARIO DEPORTIVO CALDONO 2024	Director Interventoría:	MARIA ALEJANDRA LEGARDA LEMOS
Fecha del registro fotográfico:	9/09/2024		

FOTOGRAFÍA Nº 7



Acero, cumple el item de figurado de acero para ciemntacion.

FOTOGRAFÍA Nº 8



Obras preliminares, se cumple el item de desmonte de la estructura existente.

FOTOGRAFÍA Nº 9



Obras preliminares, se cumple el item de desmonte de la estructura existente.

FOTOGRAFÍA Nº 10



Obras preliminares, se cumple el item de excavacion material comun.

FOTOGRAFÍA Nº 11



Acero, cumple el item de figurado de acero para ciemntacion.

FOTOGRAFÍA Nº 12



Obras estructura en conreto, se cumple el item de solado de lmoieza para ciemntacion.

Deporte	**PROCESO** APOYO A LA INFRAESTRUCTURA TÉCNICA Y CIENTÍFICA	**Versión: 1**
	FORMATO INFORME DE AVANCE MENSUAL CONVENIOS DE INFRAESTRUCTURA	**CÓDIGO:** ATC-FR-003 Página __ de __

A N E X O N º 2: REGISTRO FOTOGRÁFICO

CONVENIO 502 DE 2024 SUSCRITO ENTRE COLDEPORTES Y MUNICIPIO DE CALDONO

REGISTRO FOTOGRÁFICO - PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE PLACA DEPORTIVA Y CUBIERTA EN ESTRUCTURA METÁLICA PARA ESCENARIO DEPORTIVO UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CALDONO DEPARTAMENTO DEL CAUCA

Proyecto	CONSTRUCCIÓN DE PLACA DEPORTIVA Y CUBIERTA EN ESTRUCTURA METÁLICA PARA ESCENARIO DEPORTIVO UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CALDONO DEPARTAMENTO DEL CAUCA	Localización	MUNICIPIO DE CALDONO
Contratista:	CONSORCIO ESCENARIO DEPORTIVO 2024	Director de obra:	CRISTIAN CAMILO MORENO
Interventor:	CONSORCIO ESCENARIO DEPORTIVO CALDONO 2024	Director Interventoría:	MARIA ALEJANDRA LEGARDA LEMOS
Fecha del registro fotográfico:	9/09/2024		

FOTOGRAFÍA Nº 1	**FOTOGRAFÍA Nº 2**	**FOTOGRAFÍA Nº 3**
		
Obras preliminares, se cumple el item de desmonte de la cubierta existente.	Obras preliminares, se cumple el item de desmonte de la cubierta existente.	Obras preliminares, se cumple el item de excavacion material comun.
FOTOGRAFÍA Nº 4	**FOTOGRAFÍA Nº 5**	**FOTOGRAFÍA Nº 6**
		
Obras preliminares, se cumple el item de excavacion material comun.	Obras preliminares, se cumple el item de excavacion material comun.	Obras preliminares, se cumple el item de excavacion material comun.

Deporte	**PROCESO** APOYO A LA INFRAESTRUCTURA TÉCNICA Y CIENTÍFICA	**Versión: 1** **CÓDIGO:** ATC-FR-003
	FORMATO INFORME DE AVANCE MENSUAL CONVENIOS DE INFRAESTRUCTURA	Página _ de _

RESUMEN DE PAGOS

CONTRATO DE INTERVENTORIA Nº 2.28.10-01 DE 2024			CONTRATO DE OBRA Nº 2.28.03-01 DE 2024		
CONCEPTO	FECHA DE PAGO	VALOR	CONCEPTO	FECHA DE PAGO	VALOR


SEGUIMIENTO AL AVANCE

AVANCE FISICO (%)				AVANCE FINANCIERO (Miles de pesos)				
CONCEPTO	ACUM. ANTERIOR	AVANCE MENSUAL	TOTAL ACUMULADO	CONCEPTO	ACUM. ANTERIOR	AVANCE MENSUAL	TOTAL ACUMULADO	%
% Programado	0,00%	17,40%	17,40%	% Programado	0,00%	0,00%	0,00%	
% Ejecutado	0,00%	4,11%	4,11%	% Ejecutado	0,00%	0,00%	0,00%	
Diferencia	0,00%	0,00%	0,00%	Diferencia	0,00%	0,00%	0,00%	

DESCRIPCIÓN ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL PERÍODO

Durante el periodo del informe del 09 de septiembre al 30 de semptiembre se ejecutan actividades preliminares tales como; localizacion y Replanteo con equipo topografico 590 m2, Desmonte de estructura metalica 300 m2, Demolicion de estructura existente 119,77 m2, Excavacion Manual en material comun 22 m3, Acero de refuerzo 3000 kg

3. BALANCE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL CONVENIO - CURVA "S"

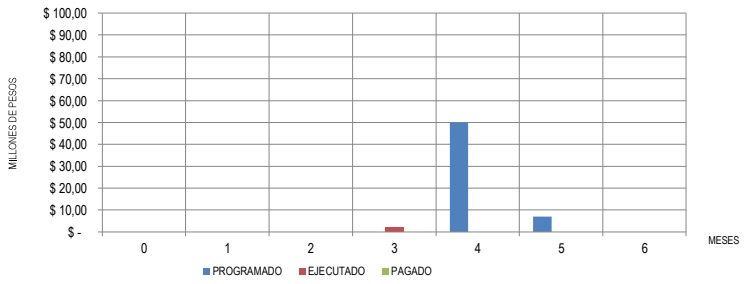

PROGRAMADO: Valor acumulado conforme a la programación vigente.

EJECUTADO: Valor acumulado de las actividades ejecutadas y aprobadas por la Interventoría.

PAGADO: Valor acumulado efectivamente pagado al contratista (Recuerde que el anticipo no es un pago).

LA GRÁFICA CORRESPONDE A LOS RECURSOS INVERTIDOS DEL CONVENIO

4. COMENTARIOS Y RECOMENDACIONES DE LA INTERVENTORÍA

El contratista de obra presenta atrasos en la ejecución de las obras respecto del cronograma, esto debido a que se han presentado situaciones imprevistas en la cimentación de la estructura, específicamente en el eje C. Para dar una solución oportuna a este tema se realizó un comité técnico donde se contó con la presencia de la supervisión, contratista de la consultoría, contratista de obra e interventoría, en dicho comité se planteó una solución en la cual se encuentran trabajando en conjunto las partes que intervienen.

5. RELACIÓN DE ANEXOS

	DESCRIPCIÓN DOCUMENTO ANEXO	S/N/N.A.	Nº Folios		DESCRIPCIÓN DOCUMENTO ANEXO	S/N/N.A.	Nº Folios
1.	Balance Presupuestal de la obra		2	8.	Copia certificado de pago a contratistas		0
2.	Registro Fotográfico		2	9.	Seguimiento plan de manejo ambiental		0
3.	Mayores y menores cantidades de obra e ítems no previstos		0	10.	Control pagos seguridad social y parafiscales contratistas		0
4.	Seguimiento ejecución/cronograma/control ruta critica		0	11.	Control programa de seguridad industrial		0
5.	Copia último informe de interventoría		0	12.	Control maquinaria y equipo		0
6.	Copia actas de comité de obra		0	13.	Control de calidad / inspecciones / ensayos		0
7.	Copia libro de obra/bitácora		0	14.	Extracto bancario de la cuenta de uso exclusivo del convenio		0

Elaborado por:	Revisado por:	Aprobado por:	
ING NICOLAS SANDOVAL APOYO PROFESIONAL	ING OMAR JAVIER VIDAL SUBSECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA	ING RODRIGO ARMANDO ASTUDILLO SECRETARIO DE PLANEACION INFRAESTRUCTURA Y DS	Elaborado: 30/09/2024 Total de Páginas: 4

Deporte	**PROCESO** APOYO A LA INFRAESTRUCTURA TÉCNICA Y CIENTÍFICA	**Versión: 1**
	FORMATO INFORME DE AVANCE MENSUAL CONVENIOS DE INFRAESTRUCTURA	**CÓDIGO:** ATC-FR-003 Página __ de __

A N E X O N º 1: BALANCE PRESUPUESTAL

CONVENIO N° 502 DE 2024 SUSCRITO ENTRE COLDEPORTES Y MUNICIPIO DE CALDONO

BALANCE PRESUPUESTAL DE LA OBRA

Proyecto	Indicar nombre del proyecto	Localización	Municipio de Caldono - Cabecera Municipal
Contrato Nº:	2.28.03-01	Contratista:	CONSORCIO ESCENARIO DEPORTIVO 2024
Período:	Del día 09 de Septiembre al día 30 de septiembre de 2024	Interventor:	CONSORCIO ESCENARIO DEPORTIVO CALDONO 2024
Director de obra:	CRISTIAN CAMILO MORENO	Director Interventoría:	MARIA ALEJANDRA LEGARDA LEMOS

1. CONTRATO DE OBRA Nº 2.28.03-01 de 2024 - CONTROL AL PRESUPUESTO

ÍTEM	DESCRIPCIÓN SEGÚN CONTRATO	UNIDAD	CONTRATO			CANTIDADES			VALORES			SALDOS	
			Cantidad contrato	Valor unitario	Valor Total	Acumulado Anterior	Acumulado este mes	Acumulado total	Acumulado Anterior	Acumulado este mes	Acumulado total	Cantidad	Valor
	PRELIMINARES							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	LOCALIZACION Y REPLANTEO CON EQUIPO TOPOGRAFICO	M2	947,91	$ 2.544,00	$ 2.411.483,00								
	DESMONTE DE ESTRUCTURA METALICA	M2	608,05	$ 31.393,00	$ 19.088.514,00								
	DEMOLICION DE ESTRUTURA EXISTENTE	M2	730,88	$ 23.468,00	$ 17.152.292,00								
	EXCAVACION MECANICA EN MATERIAL COMUN	M3	122,51	$ 22.595,00	$ 2.768.113,00								
	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN	M3	80,08	$ 41.766,00	$ 3.344.621,00								
	RELLENO Y COMPACTACION CON MATERIAL DE SITIO	M3	47,36	$ 16.307,00	$ 772.300,00								
	SUMINISTRO E INSTALACION DE MATERIAL GRANULAR PARA RELLENO	M3	117,13	$ 88.814,00	$ 10.402.784,00								
	NIVELACION Y COMPACTACION DE TERRENO A MANO	M2	780,89	$ 11.885,00	$ 9.280.878,00								
					$ 65.220.985								
	ESTRUCTURAS EN CONCRETO												
	SOLDADO DE LIMPIEZA e=0,05M 2000 PSI	M2	59,82	$ 35.182,00	$ 2.104.587,00								
	CONCRETO ESTRUCTURAL PARA ZAPATAS 3000 PSI	M3	9,19	$ 847.205,00	$ 7.785.814,00								
	CONCRETO ESTRUCTURAL PARA PEDESTALES GRADERIA Y MALLA C.I. 3000PSI	M3	23,18	$ 1.026.790,00	$ 23.800.992,00								
	CONCRETO ESTRUCTURAL VIGA DE CIMENTACION 3000PSI	M3	13,84	$ 963.171,00	$ 13.330.287,00								
	CONCRETO ESTRUCTURAL PARA PLACA 3000 PSI	M2	778,79	$ 88.500,00	$ 68.922.915,00								
					$ 115.944.595,00								
	ACERO DE REFUERZO												
	ACERO DE REFUERZO	KG	8.215,73	7.080,00	$ 58.167.368,00								
					$ 58.167.368,00								
	ESTRUCTURA METALICA Y CUBIERTA												
	ELEMENTOS Y PLATINAS DE ANCLAJE	UND	12,00	$ 264.072,00	$ 3.168.864,00								
	SUM. E INST. PORTICO EN CELOSIA ACERO A36 SEGÚN DISEÑO	KG	19.501,53	$ 18.047,00	$ 351.944.112,00								
	SUM. E INSTALACION DE CORREAS METALICAS SEGÚN DISEÑO	ML	706,20	$ 74.216,00	$ 52.411.339,00								
	TENSORES Y CONTRAVIENTOS D=5/8"	ML	769,68	$ 10.360,00	$ 7.973.885,00								
	CUBIERTA EN TEJA TRAPEZOIDAL	M2	995,74	$ 59.791,00	$ 59.536.290,00								
	CABALLETES PARA CUBIERTA	ML	32,10	$ 49.605,00	$ 1.592.321,00								
					$ 476.626.811,00								

RED PLUVIAL					
EXCAVACION A MANO EN MATERIAL COMUN PARA OBRAS PLUVIALES	M3	22,07	$ 26.938,00	$ 594.522,00	
CONCRETO ESTRUCTURAL PARA CANAL RECOLECTOR 3000PSI	M3	21,41	$ 981.539,00	$ 21.014.750,00	
CONCRETO ESTRUCTURAL PARA CAJAS INSPECCION 1.0*1.0M 3000PSI	M3	0,98	$ 981.539,00	$ 961.908,00	
ACERO DE REFUERZO ESTRUCTURAS PLUVIALES	KG	1.766,17	$ 7.476,00	$ 13.203.887,00	
SUM. E INST. CANAL LAMINA GALV. CAL. 20 INCLUYE ACCESORIOS	ML	64,20	$ 56.661,00	$ 3.637.636,00	
SUM. E INST. BAJANTE AGUAS LLUVIAS PVC D=4"	ML	64,80	$ 34.263,00	$ 2.220.242,00	
SUM. E INST. TUBERÍA PVC D = 6" ENTRE CAJAS	ML	35,64	$ 69.128,00	$ 2.463.722,00	
SUM. E INST. TUBERIA PVC D = 8" DESCOLE	ML	10,94	$ 129.232,00	$ 1.413.798,00	
				$ 45.510.465,00	
RED ELECTRICA					
SUM. E INST. SALIDA DE LUMINARIA CON TUBERIA EMT 1/2" CON	UND.	10,00	$ 136.000,00	$ 1.360.000,00	
SUM. E INST. DE ALIMENTADOR PARA LUMINARIAS CABLE THHN- CU 12 AWG 2F + 1T CON TUBERIA EMT 1/2"	ML	124,82	$ 67.431,00	$ 8.416.737,00	
SUM. E INST. DE LAMPARA 200 W LED CON PERNO PARA SOPORTE	UND.	8,00	$ 307.774,00	$ 2.462.192,00	
SUM. E INST. DE LAMPARA 50 W LED CON PERNO PARA SOPORTE	UND.	2,00	$ 98.423,00	$ 196.846,00	
SUM. E INST. SALIDAS DE TOMACORRIENTE INCLUYE TAPA INTEMPERIE 15 amp	UND.	4,00	$ 128.650,00	$ 514.600,00	
SUM. E INST. DE TABLERO DE 8 CIRCUITOS MONOFASICO TRIFILAR 240/120 V CON PUERTA	UND.	1,00	$ 168.638,00	$ 168.638,00	
SUM. E INST. DE TABLERO DE 24 CIRCUITOS MONOFASICO TRIFILAR 240/120 V CON PUERTA	UND.	1,00	$ 373.248,00	$ 373.248,00	
SUM. E INST. DE PROTECCION TERMO MAGNETICA 2*15 amp	UND.	2,00	$ 35.348,00	$ 70.696,00	
SUM. E INST. DE PROTECCION TERMO MAGNETICA 1*15 amp	UND.	1,00	$ 23.770,00	$ 23.770,00	
SUM. E INST. DE PROTECCION TERMO MAGNETICA 2*30 amp	UND.	1,00	$ 80.761,00	$ 80.761,00	
SUM. E INST. DE PROTECCION TERMO MAGNETICA 1*20 amp	UND.	4,00	$ 35.847,00	$ 143.388,00	
SUM. E INST. DE ALIMENTADOR TRIFILAR DE 2# 8 +1# 8 CU.	ML	10,50	$ 54.689,00	$ 574.235,00	
SUM. E INST. DE PUNTAS CAPTADORAS DE 0.6m CON CONECTOR	UND.	12,00	$ 181.470,00	$ 2.177.640,00	
SUM. E INST. DE ALAMBRON ALUMINIO 8mm SOBRE CERCHAS INCLUYE ACCESORIOS	ML	176,20	$ 17.696,00	$ 3.118.035,00	
SUM. E INST. DE BAJANTES CON TUBERIA IMC 3/4" PARA ALAMBRON INCLUYE ACCESORIOS	ML	22,20	$ 36.496,00	$ 810.211,00	
SUM. E INST. CAJA DE INSPECCION EN CONCRETO DE 0.30M * 0.30M * 0.30M	UND.	4,00	$ 250.985,00	$ 1.003.940,00	
SUM. E INST. DE VARILLA DE 2.40m CUCU 5/8" ELECTROSOLDADA	UND.	4,00	$ 266.091,00	$ 1.064.364,00	
SUM. E INST. DE CABLE #8 CUCU DESNUDO	ML	6,00	$ 21.732,00	$ 130.392,00	
SUM. E INST. DE CABLE #2/0 DESNUDO CUCU PARA MALLA TIERRA	ML	42,06	$ 59.460,00	$ 2.500.888,00	
SUM. E INST. DE CAJA RAWEL 4"X4" PARA DERIVACION	UND.	7,00	$ 32.305,00	$ 226.135,00	
SUM. E INST. DE CAJA METALICA 35X25X15 CM INCLUYE 2 TOMACORRIENTES Y 2 CONTACTORES CON TEMPORIZADOR	UND.	1,00	$ 428.080,00	$ 428.080,00	
				$ 25.844.796,00	

Deporte	PROCESO APOYO A LA INFRAESTRUCTURA TÉCNICA Y CIENTÍFICA	Versión: 1 CÓDIGO: ATC-FR-003
	FORMATO INFORME DE AVANCE MENSUAL CONVENIOS DE INFRAESTRUCTURA	Página __ de __

	ENLUCIMIENTO DE ESCENARIO DEPORTIVO																				
	SUMINISTRO E INSTALACION DE PINTURA EN ESMALTE TRAFICO PESADOPARA LA DEMARCACION DE LA PLACA DEPORTIVA, USANDO LAS	ML	373,10	$	6.609,00	$	2.465.818,00														
	PINTURA REGLAMENTARIA PARA ESCENARIO DEPORTIVO SOBRE PLACA DE CONCRETO	M2	678,51	$	60.618,00	$	41.129.919,00														
	SUMINISTRO E INSTALACION DE CANCHAS MULTIPLES PARA POLIDEPORTIVOS EN TUBERIA GALVANIZADA Y TABLEROS EN ACRILICO	UND.	2,00	$	8.672.020,00	$	17.344.040,00														
	SUMINISTRO E INSTALACION DE SEÑALETICA FOTOLUMINISCENTE	UND.	20,00	$	29.943,00	$	598.860,00														
	MALLA CONTRA IMPACTO SEGÚN DISEÑO ESTRUCTURAL, INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ANCLAJES, PLATINAS, TENSORES,	M2	85,00	$	108.585,00	$	9.229.725,00														
	ASEO GENERAL	UND.	1,00	$	212.846,00	$	212.846,00														
						$	**70.981.208,00**														
	VALOR TOTAL COSTOS DIRECTOS					**$**	**858.296.228,00**				**0,00**				**0,00**			**0,00**			
	VALOR TOTAL COSTOS INDIRECTOS					**$**	**272.596.468,00**								**0,00**			**0,00**			
	CERTIFICACION RETIE Y/Ó RETILAP					$	4.500.000,00														
	PGIO					$	4.912.600,00														
	PMA					$	5.695.000,00														
	Administración	23%				$	197.408.132,00								0,00			0,00			
	Imprevistos	2%				$	17.165.925,00								0,00			0,00			
	Utilidad	5%				$	42.914.811,00								0,00			0,00			
	IVA 16% Sobre Utilidad	16%													0,00			0,00			
	VALOR TOTAL COSTOS DIRECTOS + INDIRECTOS					**$**	**1.130.892.696,00**				**0,00**				**0,00**			**0,00**			

2. RELACIÓN DE PAGOS - CONTRATO DE OBRA Nº XXX

V/R INICIAL CONTRATO:	**$ 0,00**	**V/R ANTICIPO:**	**$ 0,00**
V/R ADICIONES:	**$ 0,00**	**% ANTICIPO:**	**0,00%**
V/R ACTUAL CONTRATO:	**$ 0,00**	**% RETEGARANTÍA:**	**0,00%**

Nº	DESCRIPCIÓN PAGO / ACTA NÚMERO	FACTURA Nº	FECHA DE PAGO	VALOR FACTURADO	RETENCIÓN EN GARANTÍA	AMORTIZACIÓN ANTICIPO	SALDO POR AMORTIZAR	VALOR NETO A PAGAR	SALDO POR PAGAR	% PAGADO ACUMULADO
	TOTAL			**$ 0,00**	**$ 0,00**	**$ 0,00**	**$ 0,00**	**$ 0,00**	**$ 0,00**	

Deporte	**PROCESO** APOYO A LA INFRAESTRUCTURA TÉCNICA Y CIENTÍFICA	**Versión: 1**
	FORMATO INFORME DE AVANCE MENSUAL CONVENIOS DE INFRAESTRUCTURA	**CÓDIGO:** ATC-FR-003 Página __ de __

3. RELACIÓN DE PAGOS - CONTRATO DE INTERVENTORÍA Nº XXX

V/R INICIAL CONTRATO:	**$ 0,00**	**V/R ANTICIPO:**	**$ 0,00**
V/R ADICIONES:	**$ 0,00**	**% ANTICIPO:**	**0,00%**
V/R ACTUAL CONTRATO:	**$ 0,00**	**% RETEGARANTIA:**	**0,00%**

Nº	DESCRIPCIÓN PAGO / ACTA NÚMERO	FACTURA Nº	FECHA DE PAGO	VALOR FACTURADO	RETENCIÓN EN GARANTÍA	AMORTIZACIÓN ANTICIPO	SALDO POR AMORTIZAR	VALOR NETO A PAGAR	SALDO POR PAGAR	% PAGADO ACUMULADO
	TOTAL			**$ 0,00**	**$ 0,00**	**$ 0,00**	**$ 0,00**	**$ 0,00**	**$ 0,00**	

Director de Obra - Contratista:	Director de Interventoría:	Revisado por:	
ING NICOLAS SANDOVAL APOYO PROFESIONAL	OMAR JAVIER VIDAL SUBSECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA	RODRIGO ARMANDO ASTUDILLO SECRETARIO DE PLANEACION INFRAESTRUCTURA Y DS	Elaborado: 30/09/2024 Total de Páginas: 4
