
MEMORIAS DE CALCULOS
26/10/2024


OBJETO:	**REALIZAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO AL ARCHIVO MUNICIPAL Y LA CASA FISCAL DEL MUNICIPIO DE TAURAMENA**
ENTIDAD O INSTITUCIÓN:	**ALCALDÍA MUNICIPAL DE TAURAMENA**
UBICACIÓN	**ARCHIVO MUNICIPAL**

CAPITULO:	**1**	**MUROS**	
N° ÍTEM	**DESCRIPCIÓN**		**UNIDAD**
1.1	Raspado y resane superficie muro fachada a grandes alturas		m2

DESCRIPCIÓN	**DIMENSIONES**				
	alto	**ancho**		**Cantidad**	**TOTAL**
Fachada posterior					
Muro posterior eje 1	19.40	23.10		1.00	448.14
menos ventanas	0.76	15.65		-4.00	-47.58
alfajias verticales de fajadas	5.66	0.90		2.00	10.19
Fachada lateral					
Muro lateral eje 1	19.40	10.15		1.00	196.91
Menos ventanas	0.76	5.06		-4.00	-15.38
Alfajias fachada	1.50	16.30		8.00	195.60
Fachada principal					
Muro principal	19.40	4.68		1.00	90.79
Menos ventanas	0.76	0.80		-4.00	-2.43
Fachada eje D					
Muro eje D entre 5-7	19.40	4.46		1.00	86.52
Bolados entre piso 2 y cubierta acceso principal	0.70	7.60		4.00	21.28
Fachada punto fijo por debajo de ventana	1.60	11.87		1.00	18.99
Fachada punto fijo sobre de ventaneria	1.60	11.87		1.00	18.99
Debajo de ventana	1.90	13.50		1.00	25.65
Contra placa por encima de ventana	2.70	13.50		1.00	36.45
Fachada superboard	17.30	1.84		1.00	31.83
Matera fachada principal	0.80	22.26		2.00	35.62
SUBTOTAL					**1151.58**
TOTAL					**1151.58**

REGISTRO FOTOGRAFICO DE OBRA

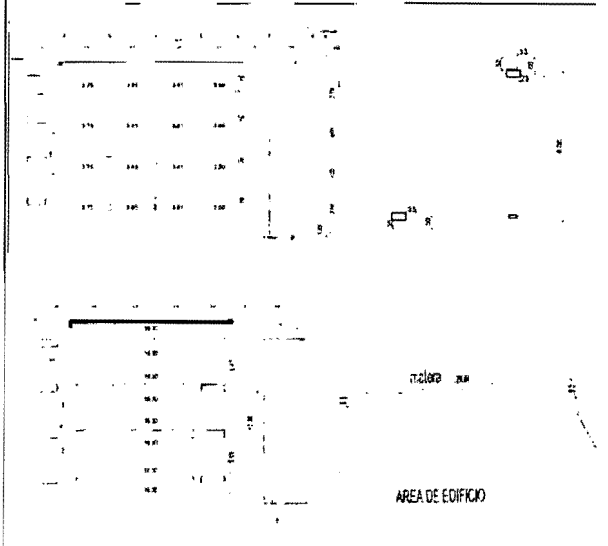

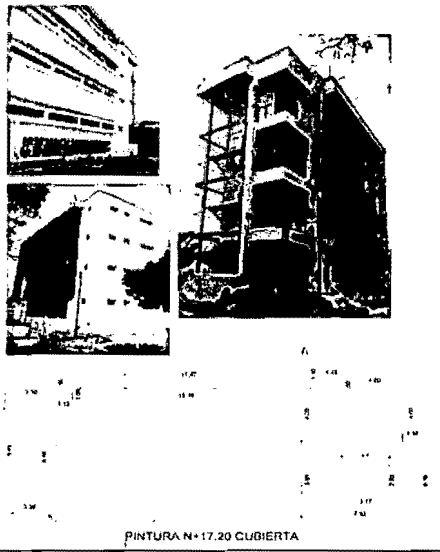

Elaboró:
Laura Cristina Carvajal Mora
Profesional de Apoyo SI


MEMORIAS DE CALCULOS
26/10/2024

OBJETO:	REALIZAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO AL ARCHIVO MUNICIPAL Y LA CASA FISCAL DEL MUNICIPIO DE TAURAMENA
ENTIDAD O INSTITUCIÓN:	ALCALDÍA MUNICIPAL DE TAURAMENA
UBICACIÓN	ARCHIVO MUNICIPAL

CAPITULO:	1	MUROS	
N° ÍTEM	DESCRIPCIÓN		UNIDAD
1.2	Pintura exterior acrilica tipo koraza o similar sobre muros 3 manos, a grandes alturas		m2

DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES				
	alto	ancho		Cantidad	TOTAL
Fachada posterior					
Muro posterior eje 1	19.40	23.10		1.00	448.14
menos ventanas	0.76	15.65		-4.00	-47.58
alfajias verticales de fajadas	5.66	0.90		2.00	10.19
Fachada lateral					
Muro lateral eje 1	19.40	10.15		1.00	196.91
Menos ventanas	0.76	5.06		-4.00	-15.38
Alfajias fachada	1.50	16.30		8.00	195.60
Fachada principal					
Muro principal	19.40	4.68		1.00	90.79
Menos ventanas	0.76	0.80		-4.00	-2.43
Fachada eje D					
Muro eje D entre 5-7	19.40	4.46		1.00	86.52
Bolados entre piso 2 y cubierta acceso principal	0.70	7.60		4.00	21.28
Fachada punto fijo por debajo de ventana	1.60	11.87		1.00	18.99
Fachada punto fijo sobre de ventaneria	1.60	11.87		1.00	18.99
Debajo de ventana	1.90	13.50		1.00	25.65
Contra placa por encima de ventana	2.70	13.50		1.00	36.45
Fachada superboard	17.30	1.84		1.00	31.83
Matera fachada principal	0.80	22.26		2.00	35.62
SUBTOTAL					1151.58
TOTAL					1151.58

REGISTRO FOTOGRAFICO DE OBRA

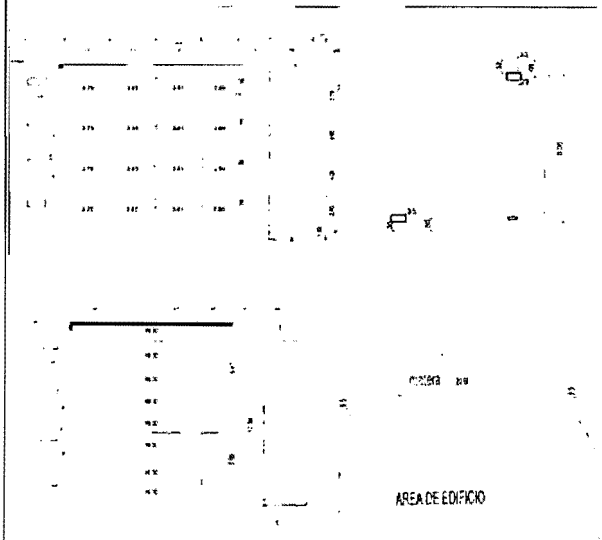



Elaboró:
Laura Cristina Carvajal Mora
Profesional de Apoyo SI


MEMORIAS DE CALCULOS

OBJETO:	REALIZAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO AL ARCHIVO MUNICIPAL Y LA CASA FISCAL DEL MUNICIPIO DE TAURAMENA
ENTIDAD O INSTITUCIÓN:	ALCALDÍA MUNICIPAL DE TAURAMENA
UBICACIÓN	CASA FISCAL

CAPITULO:	2	CUBIERTA	
N° ÍTEM	DESCRIPCIÓN		UNIDAD
2.1	Limpieza y lavado mecanico de cubiertas tipo metalicas, fibrocemento, pvc, policarbonato		m2

DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES				
	ancho	largo		Cantidad	TOTAL
CUBIERTA					
Teja tipo colonial	1.50	16.00		1.00	24.00
SUBTOTAL					24.00
TOTAL					24.00

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA

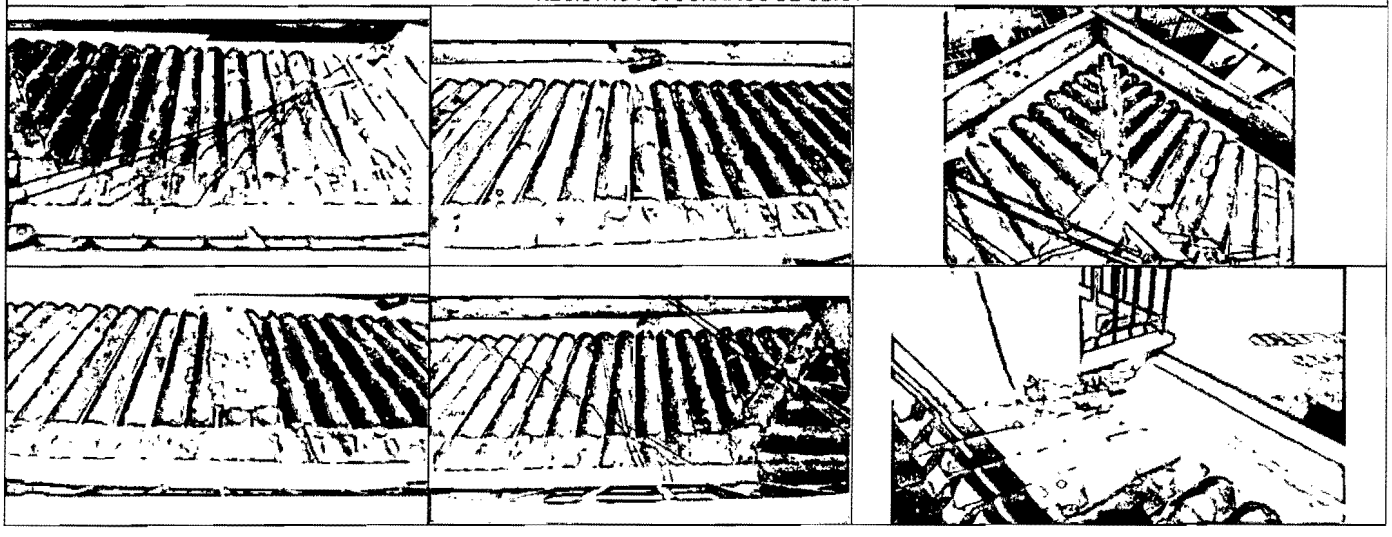

Elaboró:
Laura Cristina Carvajal Mora
Profesional de Apoyo SI


MEMORIAS DE CALCULOS

OBJETO:	REALIZAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO AL ARCHIVO MUNICIPAL Y LA CASA FISCAL DEL MUNICIPIO DE TAURAMENA
ENTIDAD O INSTITUCIÓN:	ALCALDÍA MUNICIPAL DE TAURAMENA
UBICACIÓN	CASA FISCAL

CAPITULO:	2	CUBIERTA
N° ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
2.2	Desmonte cubiertas en acrilico, fibra de vidrio, con retiro	m2

DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES				
	ancho	largo		Cantidad	TOTAL
CUBIERTA					
Zona lavado	6.00	3.00		1.00	18.00
Zona sala	5.50	4.50		1.00	24.75
Zona salida costado	1.03	4.60		1.00	4.74
	1.65	4.60		1.00	7.59
SUBTOTAL					55.08
TOTAL					55.08

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA

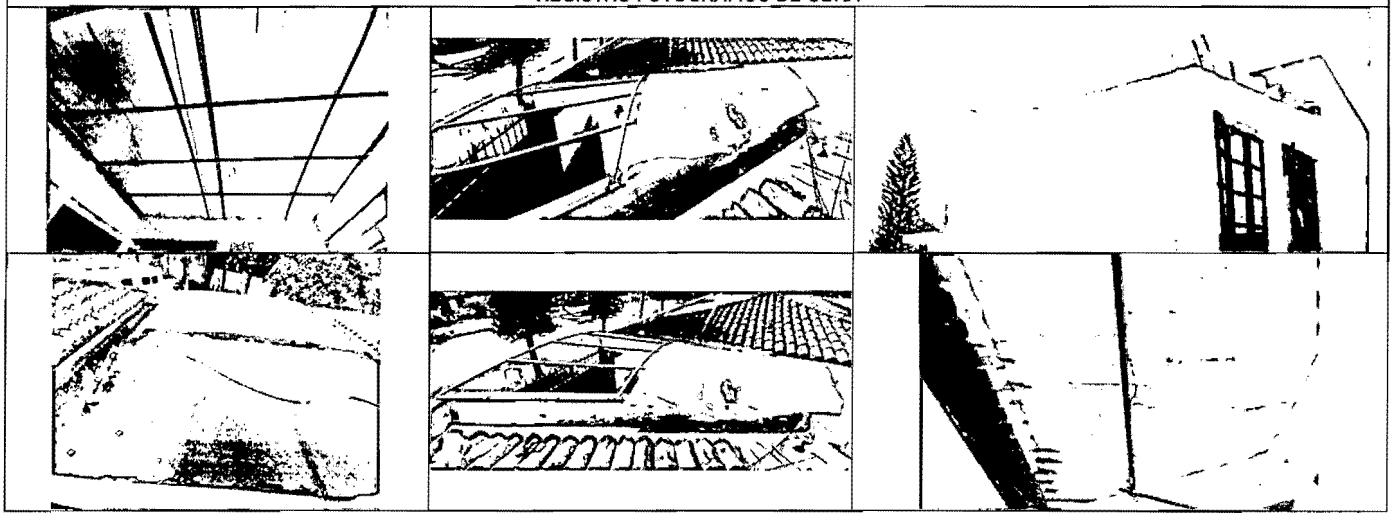

Elaboró:
Laura Cristina Carvajal Mora
Profesional de Apoyo SI


MEMORIAS DE CALCULOS

OBJETO:	REALIZAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO AL ARCHIVO MUNICIPAL Y LA CASA FISCAL DEL MUNICIPIO DE TAURAMENA
ENTIDAD O INSTITUCIÓN:	ALCALDÍA MUNICIPAL DE TAURAMENA
UBICACIÓN	CASA FISCAL

CAPITULO:	2	CUBIERTA	
N° ÍTEM	DESCRIPCIÓN		UNIDAD
2.3	Cubierta en policarbonato alveolar 6 mm sin estructura de soporte		m2

DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES				
	ancho	largo		Cantidad	TOTAL
CUBIERTA					
Zona sala	5.50	4.50		1.00	24.75
Zona salida costado	1.03	4.60		1.00	4.74
	1.65	4.60		1.00	7.59
SUBTOTAL					37.08
TOTAL					37.08

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA

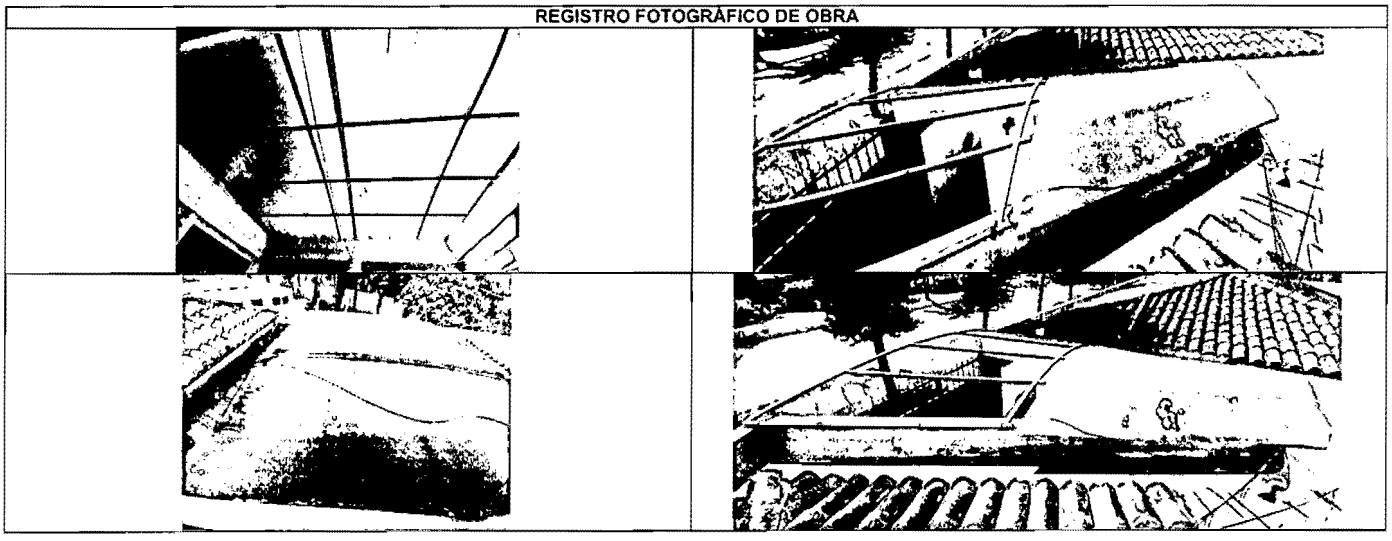

Elaboró:
Laura Cristina Carvajal Mora
Profesional de Apoyo SI

MEMORIAS DE CALCULOS

OBJETO:	REALIZAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO AL ARCHIVO MUNICIPAL Y LA CASA FISCAL DEL MUNICIPIO DE TAURAMENA
ENTIDAD O INSTITUCIÓN:	ALCALDÍA MUNICIPAL DE TAURAMENA
UBICACIÓN	CASA FISCAL

CAPITULO:	2	CUBIERTA
N° ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
2.4	Teja plastica traslucida No. 6 ajonit e=1.8mm	m2

DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES				
	ancho	largo		Cantidad	TOTAL
CUBIERTA					
Zona lavado	6.00	3.00		1.00	18.00
SUBTOTAL					18.00
TOTAL					18.00

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA



Elaboró:
Laura Cristina Carvajal Mora
Profesional de Apoyo SI

MEMORIAS DE CALCULOS


OBJETO:	REALIZAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO AL ARCHIVO MUNICIPAL Y LA CASA FISCAL DEL MUNICIPIO DE TAURAMENA
ENTIDAD O INSTITUCIÓN:	ALCALDÍA MUNICIPAL DE TAURAMENA
UBICACIÓN	CASA FISCAL

CAPITULO:	2	CUBIERTA

Nº ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
2.5	Impermeabilizante para cubiertas y terraza, con tecnologia DFX y fibras (sikefelt FPP-30 + SikaFill 12 power)	m2

DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES				
	ancho	largo		Cantidad	TOTAL
CUBIERTA					
área de impermeabilización	14.00	1.50		1.00	21.00
SUBTOTAL					21.00
TOTAL					21.00

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA

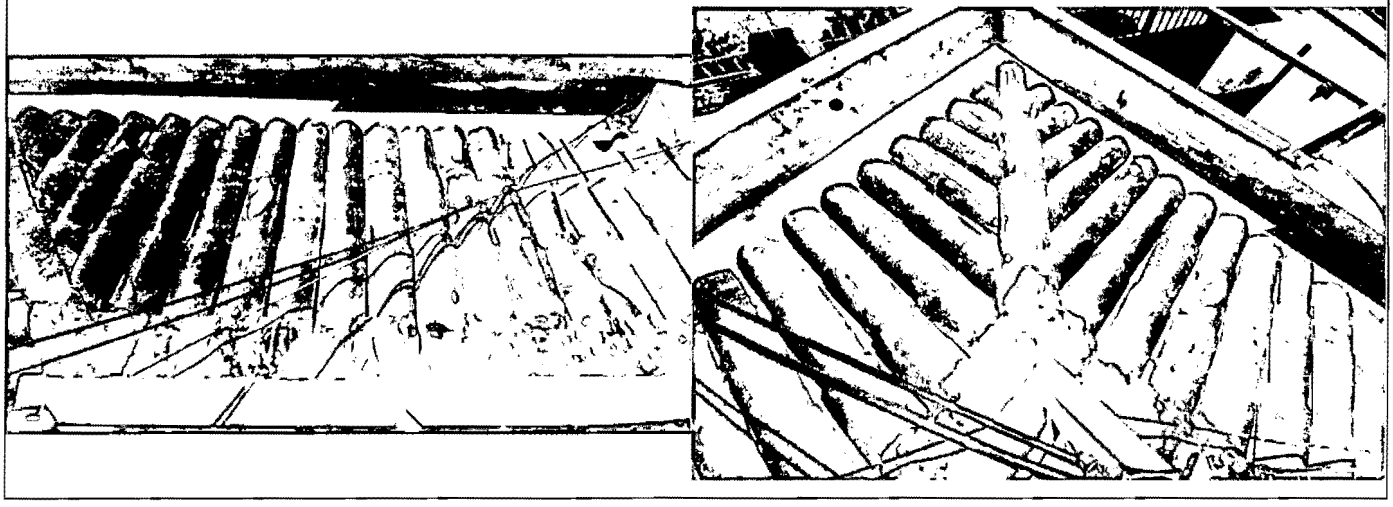

Elaboró:
Laura Cristina Carvajal Mora
Profesional de Apoyo SI


MEMORIAS DE CALCULOS

OBJETO:	REALIZAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO AL ARCHIVO MUNICIPAL Y LA CASA FISCAL DEL MUNICIPIO DE TAURAMENA
ENTIDAD O INSTITUCIÓN:	ALCALDÍA MUNICIPAL DE TAURAMENA
UBICACIÓN	CASA FISCAL


CAPITULO:	2.1	CUBIERTA	
N° ÍTEM	DESCRIPCIÓN		UNIDAD
2.6	Teja de barro sobre teja de asbesto cemento sistema doble		m2

DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES				
	ancho	largo		Cantidad	TOTAL
CUBIERTA					
Tejas barro	0.15 0.20	0.42 0.42		31.00	4.56
SUBTOTAL					4.56
TOTAL					4.56

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA

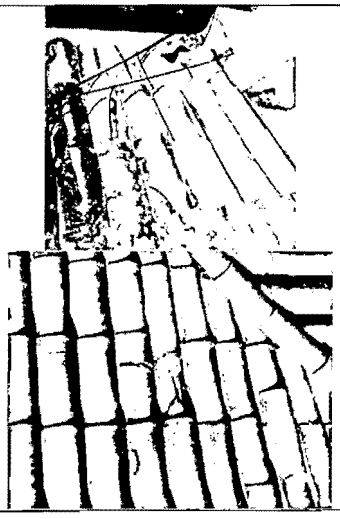



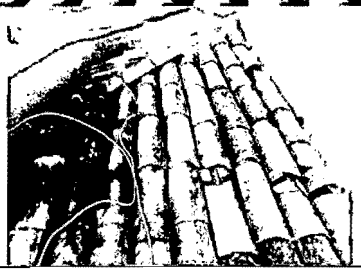

Elaboró:
Laura Cristina Carvajal Mora
Profesional de Apoyo SI

MEMORIAS DE CALCULOS


OBJETO:	REALIZAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO AL ARCHIVO MUNICIPAL Y LA CASA FISCAL DEL MUNICIPIO DE TAURAMENA
ENTIDAD O INSTITUCIÓN:	ALCALDÍA MUNICIPAL DE TAURAMENA
UBICACIÓN	CASA FISCAL

CAPITULO:	2	CUBIERTA

N° ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
2.7	Cielo raso dy-wall plano pintado 1/2"	m2

DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES				
	ancho	largo		Cantidad	TOTAL
CUBIERTA					
Área de reparación cielo raso	1.50	1.50		1.00	2.25
SUBTOTAL					2.25
TOTAL					2.25

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA





Elaboró
Laura Cristina Carvajal Mora
Profesional de Apoyo SI


MEMORIAS DE CALCULOS

OBJETO:	REALIZAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO AL ARCHIVO MUNICIPAL Y LA CASA FISCAL DEL MUNICIPIO DE TAURAMENA
ENTIDAD O INSTITUCIÓN:	ALCALDÍA MUNICIPAL DE TAURAMENA
UBICACIÓN	CASA FISCAL

CAPITULO:	3	MUROS	
N° ÍTEM	DESCRIPCIÓN		UNIDAD
3.1	Raspado y resane superficie muro pintado		m2

DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES				
	alto	largo		Cantidad	TOTAL
Muro exterior	4.00	20.00		1.00	80.00
	0.50	4.50		1.00	2.25
SUBTOTAL					82.25
TOTAL					82.25

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA

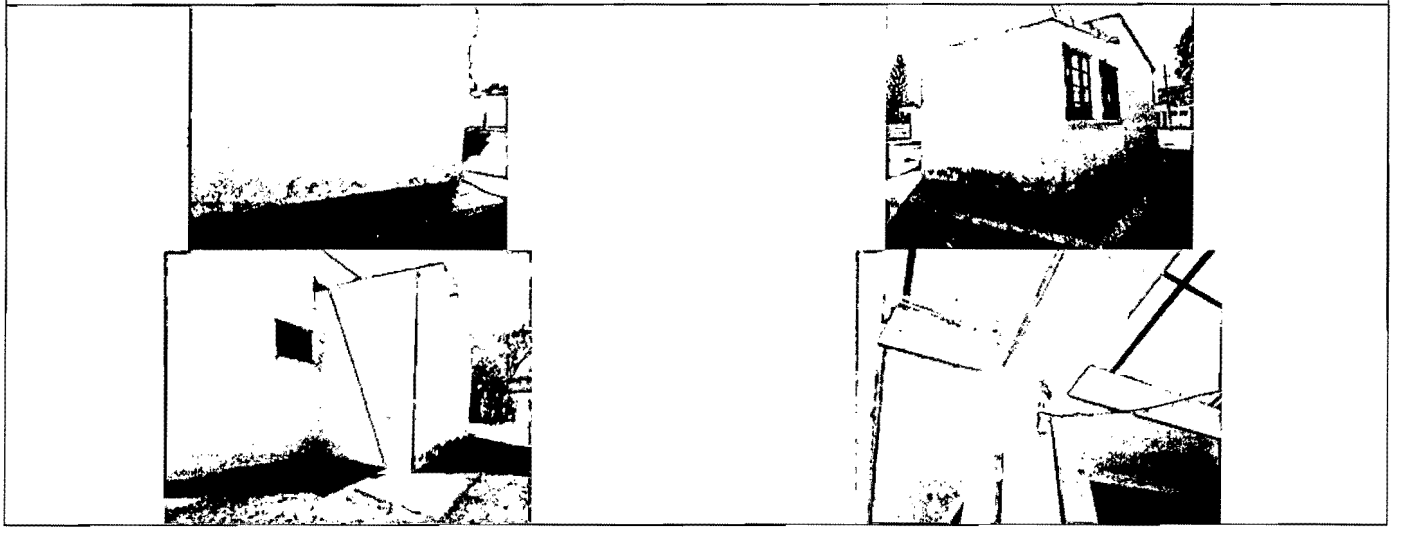

Elaboró:
Laura Cristina Carvajal Mora
Profesional de Apoyo SI

MEMORIAS DE CALCULOS

OBJETO:	REALIZAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO AL ARCHIVO MUNICIPAL Y LA CASA FISCAL DEL MUNICIPIO DE TAURAMENA
ENTIDAD O INSTITUCIÓN:	ALCALDÍA MUNICIPAL DE TAURAMENA
UBICACIÓN	CASA FISCAL

CAPITULO:	3	MUROS	
Nº ÍTEM	DESCRIPCIÓN		UNIDAD
3.2	Graniplast esgrafiado fachada		m2

DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES				
	alto	largo		Cantidad	TOTAL
Muro exterior	4.00	20.00		1.00	80.00
	0.50	4.50		1.00	2.25
SUBTOTAL					82.25
TOTAL					82.25

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA



Elaboró:
Laura Cristina Carvajal Mora
Profesional de Apoyo SI

MEMORIAS DE CALCULOS

OBJETO:	REALIZAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO AL ARCHIVO MUNICIPAL Y LA CASA FISCAL DEL MUNICIPIO DE TAURAMENA
ENTIDAD O INSTITUCIÓN:	ALCALDÍA MUNICIPAL DE TAURAMENA
UBICACIÓN	CASA FISCAL

CAPITULO:	3	MUROS
N° ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
3.3	Pintura exterior acrilica tipo koraza o similar sobre muros 3 manos	m2

DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES				
	alto	largo		Cantidad	TOTAL
Muro exterior	4.00	20.00		1.00	80.00
	0.50	4.50		1.00	2.25
SUBTOTAL					82.25
TOTAL					82.25

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA



Elaboró:
Laura Cristina Carvajal Mora
Profesional de Apoyo SI

MEMORIAS DE CALCULOS

OBJETO:	REALIZAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO AL ARCHIVO MUNICIPAL Y LA CASA FISCAL DEL MUNICIPIO DE TAURAMENA
ENTIDAD O INSTITUCIÓN:	ALCALDÍA MUNICIPAL DE TAURAMENA
UBICACIÓN	CASA FISCAL

CAPITULO:	4	INSTALACIONES
N° ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
4.1	Desmonte de griferia	und

DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES				
	alto	largo		Cantidad	TOTAL
Desmonte griferia (sanitario, lavamanos, lavaplatos)				4.00	4.00
SUBTOTAL					4.00
TOTAL					4.00

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA



Elaboró:
Laura Cristina Carvajal Mora
Profesional de Apoyo SI


MEMORIAS DE CALCULOS

OBJETO:	REALIZAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO AL ARCHIVO MUNICIPAL Y LA CASA FISCAL DEL MUNICIPIO DE TAURAMENA
ENTIDAD O INSTITUCIÓN:	ALCALDÍA MUNICIPAL DE TAURAMENA
UBICACIÓN	CASA FISCAL

CAPITULO:	4	INSTALACIONES
N° ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
4.2	Griferia para tanque de sanitario	und

DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES				
	alto	largo		Cantidad	TOTAL
Desmonte griferia (sanitario)				1.00	1.00
SUBTOTAL					1.00
TOTAL					1.00

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA

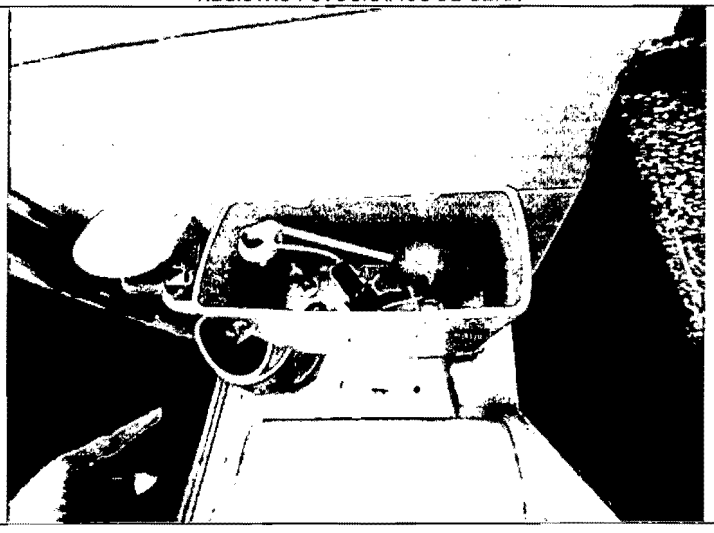

Elaboró:
Laura Cristina Carvajal Mora
Profesional de Apoyo SI

000000 Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1 - Piso 8 CC Primavera Urbana-Villavicencio contactenos@idm-meta.gov.co


MEMORIAS DE CALCULOS

OBJETO:	REALIZAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO AL ARCHIVO MUNICIPAL Y LA CASA FISCAL DEL MUNICIPIO DE TAURAMENA
ENTIDAD O INSTITUCIÓN:	ALCALDÍA MUNICIPAL DE TAURAMENA
UBICACIÓN	CASA FISCAL

CAPITULO:	4	INSTALACIONES
N° ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
4.3	Griferia para lavamanos sencilla Nogal de Corona o siminar (incluye kit desague sifón regulación y griflex), instalada	und

DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES				
	alto	largo		Cantidad	TOTAL
Desmonte griferia (lavamanos)				2.00	2.00
SUBTOTAL					2.00
TOTAL					2.00

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA

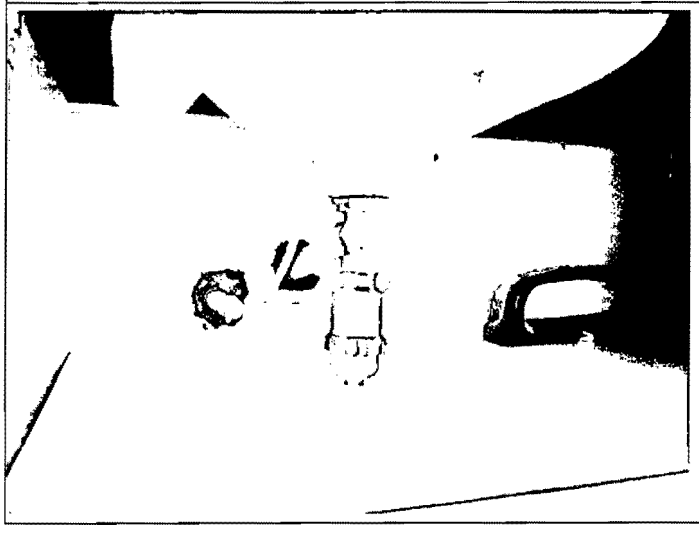



Elaboró:
Laura Cristina Carvajal Mora
Profesional de Apoyo SI

MEMORIAS DE CALCULOS


OBJETO:	REALIZAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO AL ARCHIVO MUNICIPAL Y LA CASA FISCAL DEL MUNICIPIO DE TAURAMENA
ENTIDAD O INSTITUCIÓN:	ALCALDÍA MUNICIPAL DE TAURAMENA
UBICACIÓN	CASA FISCAL

CAPITULO:	4	INSTALACIONES

Nº ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
4.4	griferia lavaplatos monocontrol tipo aluvia de corona incluye acoples y kit desagüe. Suministro e	und

DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES				
	alto	largo		Cantidad	TOTAL
Desmonte griferia (lavaplatos)				1.00	1.00
SUBTOTAL					1.00
TOTAL					1.00

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA

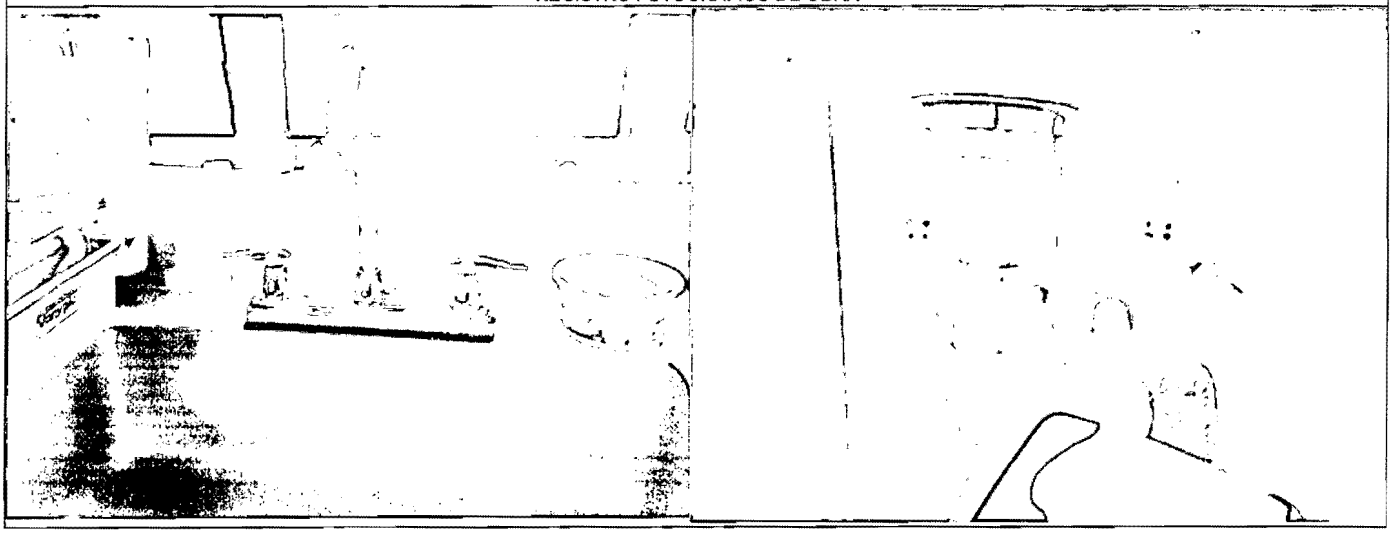

Elaboró:
Laura Cristina Carvajal Mora
Profesional de Apoyo SI


MEMORIAS DE CALCULOS

OBJETO:	REALIZAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO AL ARCHIVO MUNICIPAL Y LA CASA FISCAL DEL MUNICIPIO DE TAURAMENA
ENTIDAD O INSTITUCIÓN:	ALCALDÍA MUNICIPAL DE TAURAMENA
UBICACIÓN	CASA FISCAL

CAPITULO:	4	INSTALACIONES
N° ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
4.5	Salida para tomacorriente doble con polo a tierra, 20A-125v, salida dedicada. Incluye: tubo PVC tipo presado 3/4", cable de cobre 12 AWG (10 m promedio), caja plastica	und

DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES				
	alto	largo		Cantidad	TOTAL
Cambio de ubicación tomacorriente				1.00	1.00
SUBTOTAL					1.00
TOTAL					1.00

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA

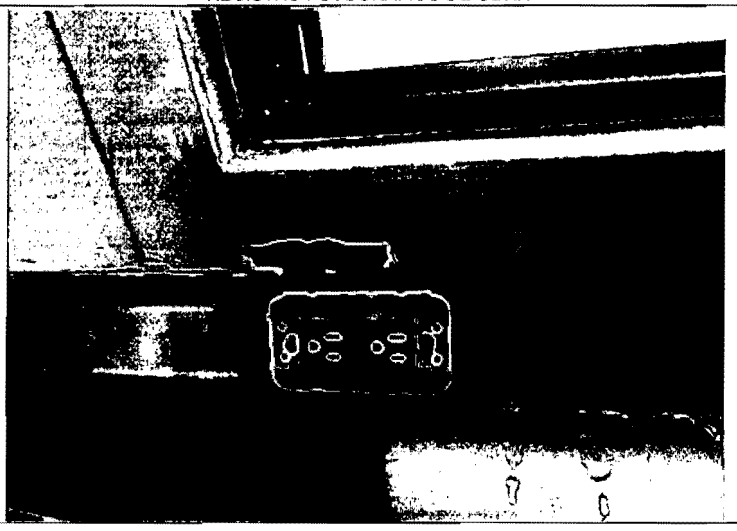

Elaboró:
Laura Cristina Carvajal Mora
Profesional de Apoyo SI

000000 Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1 - Piso 8 CC Primavera Urbana-Villavicencio contactenos@idm-meta.gov.co

MEMORIAS DE CALCULOS

OBJETO:	REALIZAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO AL ARCHIVO MUNICIPAL Y LA CASA FISCAL DEL MUNICIPIO DE TAURAMENA
ENTIDAD O INSTITUCIÓN:	ALCALDÍA MUNICIPAL DE TAURAMENA
UBICACIÓN	CASA FISCAL

CAPITULO:	5	OTROS	
N° ÍTEM	DESCRIPCIÓN		UNIDAD
5.1	Poda y limpieza h=8 8-12 m . Inc. Retiro de ramaje		und

DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES				
	alto	largo		Cantidad	TOTAL
Arbol				1.00	1.00
SUBTOTAL					1.00
TOTAL					1.00

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA



Elaboró:
Laura Cristina Carvajal Mora
Profesional de Apoyo SI


MEMORIAS DE CALCULOS

OBJETO:	REALIZAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO AL ARCHIVO MUNICIPAL Y LA CASA FISCAL DEL MUNICIPIO DE TAURAMENA
ENTIDAD O INSTITUCIÓN:	ALCALDÍA MUNICIPAL DE TAURAMENA
UBICACIÓN	CASA FISCAL

CAPITULO:	5	OTROS
N° ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
5.2	Sondeoredes sanitarias/aguas lluvia	glb

DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES				
	alto	largo		Cantidad	TOTAL
Desague A.LL.				1.00	1.00
SUBTOTAL					1.00
TOTAL					1.00

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA

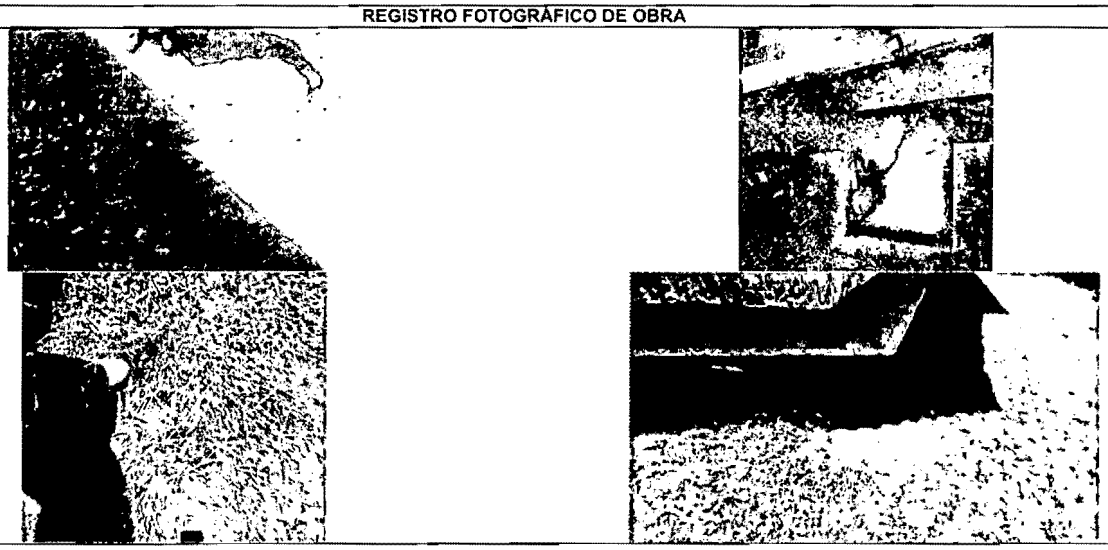

Elaboró:
Laura Cristina Carvajal Mora
Profesional de Apoyo SI

MEMORIAS DE CALCULOS


OBJETO:	REALIZAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO AL ARCHIVO MUNICIPAL Y LA CASA FISCAL DEL MUNICIPIO DE TAURAMENA
ENTIDAD O INSTITUCIÓN:	ALCALDÍA MUNICIPAL DE TAURAMENA
UBICACIÓN	CASA FISCAL

CAPITULO:	5	OTROS

N° ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
5.3	Desmonte y limpieza manual	m2

DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES				
	alto	largo		Cantidad	TOTAL
zona verde	2.00	10.00		1.00	20.00
SUBTOTAL					20.00
TOTAL					20.00

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA

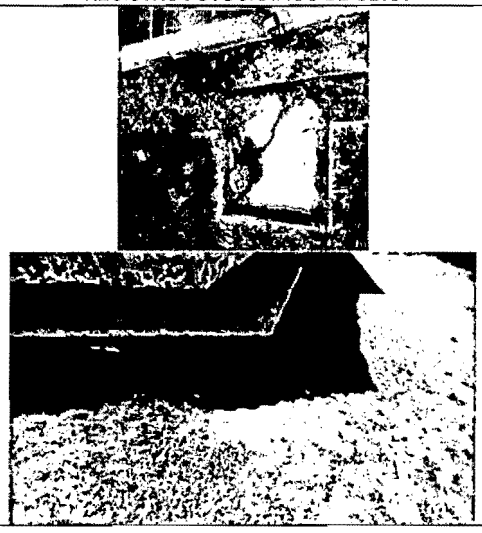

Elaboró:
Laura Cristina Carvajal Mora
Profesional de Apoyo SI
