GOBERNACIÓN DE BOYACÁ	FORMATO	VERSIÓN: 0
		CÓDIGO: A-AD-GC-F-045
INFORME AL CONVENIO POR PARTE DEL MUNICIPIO		FECHA: 08/Noviembre/2021

INFORME No:			4		FECHA:	29	de	SEPTIEMBRE	de	2023	
PERIODO:	DEL	10	de	AGOSTO	de	2023	AL	9	de	SEPTIEMBRE	de	2023
CONVENIO No:		2165		DE	2023						

OBJETO:

CONVENIO INTERADMINISTRATIVO N° 2165 DE 2023 ENTRE EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ Y EL MUNICIPIO DE LA UVITA PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS INSTALACIONES ELECTRICAS RURALES DE LA INSTITUCIÓN EDUCTIVA NUESTRA SEÑORA DE LAS MERCEDES DE LA UVITA

LOCALIZACIÓN:

INSTITUCIÓN EDUCTIVA NUESTRA SEÑORA DE LAS MERCEDES CASCO URBANO MUNICIPIO DE LA UVITA

INFORMACION DEL CONVENIO

ENTIDAD TERRITORIAL	
GOBERNACION DE BOYACA	MUNICIPIO DE LA UVITA
NOMBRE DEL SUPERVISOR	
SERGIO ALEJANDRO MOSCOSO MANRIQUE	JOSE LUIS CAMERO JAIME
Teléfono: Dirección	Teléfono: 3108821256 Dirección
ASIGNACIÓN DE SUPERVISIÓN: Acta de entrega de Supervision por parte de la Gobernacion de Boyaca del 08 de mayo de 2023	ASIGNACIÓN DE SUPERVISIÓN:

APORTES:

DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	OTRO ( )	TOTAL
$ 622.633.516,00	$ 40.000.000,00	$ 0,00	$ 662.633.516,00

OBSERVACIÓN

ETAPA PRECONTRACTUAL

ETAPA PRECONTRACTUAL DEL CONTRATO DE OBRA

ETAPA DEL PROCESO	FECHA	OBSERVACIONES
Proceso No	GC-LP-2023-01	
Aviso de Convocatoria o Invitación	25/05/2023	
Estudios Previos	25/05/2023	
Proyecto de pliego de condiciones	27/05/2023	
Anexos documentos tipo.	25/05/2023	
Publicacion acto administrativo de apertura Proceso	9/06/2023	
Pliego de condiciones definitivos	9/06/2023	
Acta de apertura	22/06/2023	
Informe final de evaluación	12/07/2023	
Acta audiencia	13/07/2023	
Resolución de adjudicación	13/07/2023	
Contrato	1/08/2023	
Acta de comité No 1	25/08/2023	
Acta de comité No 2	14/09/2023	

ETAPA PRECONTRACTUAL DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA

ETAPA DEL PROCESO	FECHA	OBSERVACIONES
Proceso No	N/A	
Aviso de Convocatoria o Invitación	14/06/2023	
Estudios Previos	14/06/2023	
Proyecto de pliego de condiciones	14/06/2023	
Publicacion acto administrativo de apertura Proceso	22/06/2023	
Pliego de condiciones definitivos	22/06/2023	
Acta de adjudicación	6/07/2023	
Informe final de evaluación	5/07/2023	
Resolución de adjudicacion	5/07/2023	
Contrato	1/08/2023	

INFORMACIÓN CONTRATO DE OBRA

ENTIDAD CONTRATANTE:	VALOR:
MUNICIPIO DE LA UVITA	$ 611.315.000,00

OBJETO:

"MEJORAMIENTO DE LAS INSTALACIONES ELECTRICAS RURALES DE LA INSTITUCIÓN EDUCTIVA NUESTRA SEÑORA DE LAS MERCEDES DE MUNICIPIO DE LA UVITA ENMARCADO EN EL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO N° 2165 DE 2023 CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE LA UVITA Y LA GOBERNACIÓN DE BOYACÁ"

NOMBRE DEL CONTRATISTA DE OBRA	REPRESENTANTE LEGAL:
CONSORCIO I.E MERCEDES	JOSE LEONARDO ALVARES FONSECA
Teléfono: 3124113265 Dirección:	Teléfono: 3124113265 Dirección: Calle 43 N° 8A - 06, en la ciudad de Tunja

INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORIA

ENTIDAD CONTRATANTE:	VALOR:
MUNICIPIO DE LA UVITA	$38.617.824.00 M/CTE.

GOBERNACIÓN DE Boyacá	FORMATO	VERSIÓN: 0
		CÓDIGO: A-AD-GC-F-045
INFORME AL CONVENIO POR PARTE DEL MUNICIPIO		FECHA: 08/Noviembre/2021

OBJETO:

"INTERVENTORÍA TECNICA, FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA PÚBLICA CUYO OBJETO ES "MEJORAMIENTO DE LAS INSTALACIONES ELECTRICAS RURALES DE LA INSTITUCIÓN EDUCTIVA NUESTRA SEÑORA DE LAS MERCEDES DE MUNICIPIO DE LA UVITA ENMARCADO EN EL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO N° 2165 DE 2023 CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE LA UVITA Y LA GOBERNACIÓN DE BOYACÁ" RESULTANTE DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN N° GC-LP-2023-01"

NOMBRE DEL CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA	REPRESENTANTE LEGAL:
PGL INGENIERIA Y CONSULTORIA S.A.S	LUIS EUCARIO PÉREZ GÓMEZ
Teléfono: 3103345630 Dirección: pglingenieria@yahoo.com	Teléfono: 3103345630 Dirección: CL 17 11 53 OF 606, en la ciudad de Tunja

FECHAS DE INICIO Y TERMINACIÓN	CONVENIO			CONTRATO DE OBRA			CTO INTERVENTORIA		
	dd	mm	aaaa	dd	mm	aaaa	dd	mm	aaaa
FECHA DE INICIACIÓN	10	5	2023	1	8	2023	1	8	2023
PLAZO INICIAL	9	9	2023	1	10	2023	1	11	2023
FECHA DE TERMINACIÓN SEGÚN CONTRATO INICIAL	9	9	2023	1	10	2023	1	11	2023
ADICIONES EN PLAZO	9	12	2023						
FECHA DE TERMINACIÓN REAL (Según prórrogas y suspensiones)	9	12	2023						

AVANCE DE EJECUCIÓN


CONVENIO

% DE AVANCE CONVENIO	18,4%	% TIEMPO TRANSCURRIDO CONVENIO	57,1%	% PAGOS AUTORIZADOS	0,0%




CONTRATO DE OBRA

% DE AVANCE CTO OBRA	20,0%	% TIEMPO TRANSCURRIDO OBRA	65,0%	% PAGOS AUTORIZADOS	0,0%



CONTRATO DE INTERVENTORÍA

% DE AVANCE CTO INTERV.	43,3%	% TIEMPO TRANSCURRIDO INTERV.	43,3%	% PAGOS AUTORIZADOS	0,0%



DESCRIPCION DETALLADA DE LA EJECUCION, AVANCE Y ESTADO DEL CONTRATO Y/O CONVENIO CON ESPECIFICACION EN CUANTO A LAS PARTICULARIDADES Y OBSERVACIONES PRESENTADAS EN EL DESARROLLO CONTRACTUAL

EJECUCION, AVANCE Y ESTADO

CONTRATACION (OBRA E INTERVENTORIA)
Se han realizado diferentes actividades eléctricas, incluyendo la instalación de tubería conduit de diferentes tamaños, suministro de acometida trifilar, instalación de diversas luminarias LED, interruptores sencillos y dobles, sensores de movimiento, y tomacorrientes dobles con polo a tierra. También se implementaron medidas de seguridad eléctrica, como la instalación de tomacorrientes GFCI. Estas acciones se llevaron a cabo con el objetivo de establecer una infraestructura eléctrica funcional y segura.

Gobernación de Boyacá	FORMATO	VERSIÓN: 0
		CÓDIGO: A-AD-GC-F-045
INFORME AL CONVENIO POR PARTE DEL MUNICIPIO		FECHA: 08/Noviembre/2021

RELACIÓN DE ACTAS GENERADAS (Inicio, Suspensión, reinicio, etc.)

CONVENIO

DESCRIPCIÓN	FECHA			OBSERVACIÓN
Acta de Inicio	10	5	2023	

CONTRATO DE OBRA

DESCRIPCIÓN	FECHA			OBSERVACIÓN
Acta de Inicio	1	8	2023	
Acta comité. mejoramiento de la instalación eléctricas rurales de la I.E.	25	8	2023	

CONTRATO DE INTERVENTORÍA

DESCRIPCIÓN	FECHA			OBSERVACIÓN
Acta de Inicio	1	8	2023	

PÓLIZAS VIGENTES

CONTRATO DE OBRA

No PÓLIZA	39-44-101153160 Cumplimiento. 39-40-101040140 RCE	ANEXO No.	0	ASEGURADORA	SEGUROS DEL ESTADO S.A	FECHA APROB.	dd	mm	aa
							26	7	2023

DESCRIPCIÓN DE AMPAROS	VIG. DESDE			VIG. HASTA			SUMA ASEGURADA
	dd	mm	aaaa	dd	mm	aaaa	
CUMPLIMIENTO	25	7	2023	1	2	2024	$ 61.131.500,00
PAGO DE SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES	25	7	2013	1	10	2026	$ 30.565.750,00
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE OBRA							$ 183.394.500,00
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	25	7	2023	1	10	2023	$ 232.000.000,00

No PÓLIZA	39-44-101153160 Cumplimiento. 39-40-101040140 RCE	ANEXO No.	1	ASEGURADORA	SEGUROS DEL ESTADO S.A	FECHA APROB.	dd	mm	aa
							1	8	2023

DESCRIPCIÓN DE AMPAROS	VIG. DESDE			VIG. HASTA			SUMA ASEGURADA
	dd	mm	aaaa	dd	mm	aaaa	
CUMPLIMIENTO	1	8	2023	1	2	2024	$ 61.131.500,00
PAGO DE SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES	1	8	2013	1	10	2026	$ 30.565.750,00
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE OBRA							$ 183.394.500,00
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	1	8	2023	10	10	2023	$ 232.000.000,00

CONTRATO DE INTERVENTORÍA

No PÓLIZA	39-44-101152744	ANEXO No.	0	ASEGURADORA	SEGUROS DEL ESTADO S.A	FECHA APROB.	dd	mm	aa
							13	7	2024

DESCRIPCIÓN DE AMPAROS	VIG. DESDE			VIG. HASTA			SUMA ASEGURADA
	dd	mm	aaaa	dd	mm	aaaa	
CUMPLIMIENTO	1	8	2023	8	3	2024	$ 3.861.782,40

No PÓLIZA	39-44-101152744	ANEXO No.	2	ASEGURADORA	SEGUROS DEL ESTADO S.A	FECHA APROB.	dd	mm	aa
							1	8	2023

DESCRIPCIÓN DE AMPAROS	VIG. DESDE			VIG. HASTA			SUMA ASEGURADA
	dd	mm	aaaa	dd	mm	aaaa	
CUMPLIMIENTO	1	8	2023	8	3	2024	$ 3.861.782,40

ADICIONALES Y PRÓRROGAS

CONVENIO

No.	DESCRIPCIÓN	VALOR	PLAZO
1	ADICIONAL 1		9/12/2023
VALOR ADICIONALES Y PLAZO TOTAL		$ 0,00	9/12/2023

CONTRATO DE OBRA

No.	DESCRIPCIÓN	VALOR	PLAZO

CONTRATO DE INTERVENTORÍA

No.	DESCRIPCIÓN	VALOR	PLAZO
VALOR ADICIONALES Y PLAZO TOTAL		$ 0,00	

Gobernación de Boyacá	FORMATO	VERSIÓN: 0
		CÓDIGO: A-AD-GC-F-045
INFORME AL CONVENIO POR PARTE DEL MUNICIPIO		FECHA: 08/Noviembre/2021

SEGUIMIENTO FINANCIERO

CONVENIO

CUENTA No.	4-154-43-00163-3	BANCO:	BANCO AGRARIO	SUCURSAL:	LA UVITA

NOMBRE CUENTA: CONVENIO INTERADMINISTRATIVO Nº 2165 DE 2023 ENTRE EL DEPARTAMENTO DE BOYACA Y EL MUNICIPIO DE LA UVITA PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS INSTALACIONES ELECTRICAS RURALES DE LA INSTITUCION EDUCATIVA NUESTRA SEÑORA DE LAS MERCEDES DE LA UVITA

DESCRIPCIÓN	PORCENTAJE	FECHA			VALOR
DESEMBOLSO	90%	6	9	2023	$ 560.613.435,00
TOTAL DESEMBOLSOS REALIZADOS					$ 560.613.435,00

CONTRATO DE OBRA

DESCRIPCIÓN	FECHA	VALOR
Anticipo		N.A.
Acta Parcial No.		N.A.
TOTAL DESEMBOLSOS REALIZADOS		$ 0,00

CONTRATO DE INTERVENTORÍA

DESCRIPCIÓN	FECHA	VALOR
Anticipo		N.A.
Acta Parcial No.		N.A.
TOTAL DESEMBOLSOS REALIZADOS		$ 0,00

ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL CONTRATO DE OBRA ORIGINADO DEL CONVENIO

DESCRIPCIÓN	LOCALIZACIÓN (ABSCISAS)
SUMINISTRO INSTALACIÓN DE TUBERIA CONDUIT EMT 1/2"	N.A.
SUMINISTRO INSTALACIÓN DE TUBERIA CONDUIT EMT 3/4"	N.A.
SUMINISTRO DE ACOMETIDA TRIFILAR	N.A.
SUMINISTRO E INSTALACIÓN LUMINARIA LED 18 W	N.A.
SUMINISTRO E INSTALACIÓN LUMINARIA LED 24 W	N.A.
SUMINISTRO E INSTALACIÓN LUMINARIA LED SQ 40W DL	N.A.
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LED EMERG AVISO DOBLE SPOT	N.A.
SUMINISTRO E INSTALACIÓN E INTERRUPTOR SENCILLO	N.A.
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR DOBLE	N.A.
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SENSOR DE MOVIMIENTO	N.A.
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOMACORRIENTE DOBLE CON POLO A TIERRA	N.A.
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOMACORRIENTE GFCI	N.A.

ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL CONTRATO DE INTERVENTORÍA (En caso de ser contratada por el Municipio)

DESCRIPCIÓN	LOCALIZACIÓN
ACOMPAÑAMIENTO DE LOS DÍAS 24,25, 26 DE AGOSTO 2023	N.A.
ACOMPAÑAMIENTO DEL 30, 31, DE AGOSTO 2023	N.A.

RELACIÓN DE COMITÉS REALIZADOS EN EL CONVENIO, CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORÍA

DESCRIPCIÓN	FECHA			OBSERVACIÓN
	dd	mm	aaaa	
Acta de inicio	1	8	2023	
Acta de comité de obra No1	25	8	2023	

RELACION DE INFORMES PRESENTADOS POR EL MUNICIPIO AL DEPARTAMENTO

DESCRIPCIÓN	PERIODO						OBSERVACIÓN
	DESDE			HASTA			
	dd	mm	aaaa	dd	mm	aaaa	
Informe de Supervisión No. 1	10	5	2023	9	6	2023	EN PROCESO DE CONTRATACION OBRA E INTERVENTORIA POR PARTE DEL MUNICIPIO
Informe de Supervisión No. 2	10	6	2023	9	7	2023	EN PROCESO DE CONTRATACION OBRA E INTERVENTORIA POR PARTE DEL MUNICIPIO
Informe de Supervisión No. 3	10	7	2023	9	8	2023	INICIO DE EJECUCION OBRA E INTERVENTORIA
Informe de Supervisión No. 4	10	8	2023	9	9	2023	EJECUCION OBRA E INTERVENTORIA, COMITÉ No 1, ADICION EN PLAZO AL CONVENIO

OBSERVACIONES

GOBERNACIÓN DE Boyacá	FORMATO	VERSIÓN: 0
		CÓDIGO: A-AD-GC-F-045
INFORME AL CONVENIO POR PARTE DEL MUNICIPIO		FECHA: 08/Noviembre/2021

INFORME DE SUPERVISION POR PARTE DE LOS MUNICIPIOS		
	VERIFICACION	FOLIOS
Etapa precontractual de los recursos del convenio		
Copia de certificación de apertura de cuenta para el manejo de los recursos del convenio	YA SE RADICO	
Actos administrativos proferidos en el proceso de contratación de las obras del convenio	YA SE RADICO	
Actos administrativos proferidos en el proceso de contratación de la interventoria para el contrato de obra	YA SE RADICO	
Copia del Acto administrativo ,mediante el cual el municipio incorporó los recursos del convenio al presupuesto del municipio	YA SE RADICO	
Copia del Contrato de obra e interventoria	YA SE RADICO	
Copia de pólizas y aprobación de las mismas del contrato de obra	YA SE RADICO	
Copia de pólizas y aprobación de las mismas del contrato de interventoria	YA SE RADICO	
Copia de acto administrativo mediante el cual se nombra supervisor al contrato de interventoria	N.A.	
SEGUIMIENTO AL CONTRATO DE OBRA		
Seguimiento Administrativo del Contrato de Obra		
Informe de Interventoria:	N.A.	
Acta de socialización del contrato de obra	YA SE RADICO	
Copia de Informes de Interventoria presentadas al Municipio de acuerdo al manual de interventoria de la Gobernación	SI	1 a 74
Control y verificación de pagos de seguridad social y parafiscales del personal de obra	N.A.	
Control de pólizas y garantías (Acta de aprobación Dir. De Contratación ó Municipio ó Entidad)	N.A.	
Actas Generadas (inicio, suspensión , reinicio, etc.)	YA SE RADICO	
El personal de obra cumple con los requisitos exigidos de los perfiles profesionales (para personal nuevo)	SI	95
Bitácora de obra	SI	13 a 18
Seguimiento Financiero del Contrato de Obra		
Soportes de seguimiento a la Inversión del Anticipo	N.A.	
Amortización del anticipo	N.A.	
Copia de actas de pago generadas en el periodo	N.A.	
Seguimiento Tecnico del Contrato de Obra		
Constancia de entrega de planos, diseños, licencias y autorizaciones, estudios, cálculos y especificaciones	YA SE RADICO	
Actas Generadas (Visitas ,comités de obra, vecindad, socialización, etc.)	SI	75 a 76
Cronograma de ejecución de actividades "Actualizado"	SI	19
Informes de laboratorio y pruebas y ensayos realizadas para verificar que se cumplan las normas, especificaciones técnicas	SI	20 a 52
Seguimiento Seguridad industrial, salud ocupacional y medio ambiente		
Registro de cumplimiento de todas las normas vigentes sobre seguridad industrial, salud ocupacional y medio ambiente. (señalización de obra, vertimientos, mantenimientos de maquinaria, etc.)	SI	56 a 65
Registro de uso correcto de los elementos de protección personal (entrega de dotaciones, planillas, fotos, etc.)	SI	66 a 70
Registro de cumplimiento de la normatividad ambiental y plan de manejo ambiental (Seguimiento de fichas ambientales)	N.A.	
Generales		
Registro fotográfico	SI	71 a 74
Correspondencia enviada y recibida	N.A.	
Registro de instalación Valla informativa	SI	64

Gobernación de Boyacá	FORMATO	VERSIÓN: 0
		CÓDIGO: A-AD-GC-F-045
INFORME AL CONVENIO POR PARTE DEL MUNICIPIO		FECHA: 08/Noviembre/2021

SEGUIMIENTO AL CONTRATO DE INTERVENTORÍA		
Seguimiento Administrativo del Contrato de Interventoria		
Copia de informes de Interventoria presentados al Municipio de acuerdo al manual de interventoria de la Gobernación	SI	1 a 74
Control y verificación de pagos de seguridad social y parafiscales del personal de Interventoría	SI	77
Control de pólizas y garantías (Acta de aprobación Sec. De Contratación ó Municipio ó Entidad)	YA SE RADICO	
Actas Generadas (inicio, suspensión , reinicio, etc.) contrato de Interventoria	YA SE RADICO	
El personal de interventoria cumple con los requisitos exigidos de los perfiles profesionales	N.A.	
Seguimiento Financiero del Contrato de Interventoria		
Soportes de seguimiento a la Inversión del Anticipo contrato de Interventoria	N.A.	
Amortización del anticipo contrato de Interventoria	N.A.	
Copia de actas de pago generadas en el período	N.A.	
Seguimiento Técnico del Contrato de Interventoria		
Certificación de cumplimiento de especificaciones técnicas de materiales y procesos constructivos de las obras ejecutadas	SI	20a52
Certificación de recibo y aprobación de Estudios y diseños: Control de planos, diseños, licencias y autorizaciones, estudios, cálculos y especificaciones	N.A.	
Informes de laboratorio y pruebas y ensayos realizados para verificar que se cumplan las normas, especificaciones técnicas	N.A.	
Seguimiento Seguridad Industrial, salud ocupacional y medio ambiente		
Certificación de cumplimiento de pagos a seguridad social y parafiscales del contratista de obra expedida por el director de la interventoría	SI	7 a 8
Registro de cumplimiento de todas las normas vigentes sobre seguridad industrial, salud ocupacional y medio ambiente. (señalización de obra, vertimientos, mantenimientos de maquinaria, etc.)	SI	78a82
Generales		
Registro fotográfico	SI	71 a 74
Correspondencia enviada y recibida	N.A.	

* Se refiere a requisitos mínimos del informe de interventoría al cual se le pueden incluir todos los demás documentos que el interventor considere necesarios.
Verificación: Indica si se entregan documentos soporte (Completar con SI, NO, N.A., YA SE RADICO) Folios No.: Indica en que folio del informe se encuentran los soportes indicados

FIRMA:

ALCALDE

NOMBRE: RONALD GERARDO CORDERO J

Gobernación de Boyacá | Contratación

TRAMITADO

MARILYN PACHECO BUENO

FECHA 19/11/2024

GOBERNACIÓN DE BOYACÁ	**FORMATO**	**VERSIÓN: 0**
		CÓDIGO: A-AD-GC-F-046
INFORME DE INTERVENTORÍA DE OBRA		**FECHA: 24/Julio/2023**

INFORME DE INTERVENTORÍA No:	**1**		FECHA:	1	de	SEPTIEMBRE	de	2023			
PERIODO: DEL	1	de	AGOSTO	de	2023	AL	30	de	AGOSTO	de	2023

CONTRATO No:	**GC-CT-2023-109**	DE		REGISTRO BP Y P No	

OBJETO:

"INTERNETORÍA TECNICA, FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA PÚBLICA CUYO OBJETO ES MEJORAMIENTO DE LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS RURALES DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA NUESTRA SEÑORA DE LAS MERCEDES DE MUNICIPIO DE LA UVITA ENMARCADO EN EL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO N° 2165 DE 2023 CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE LA UVITA Y LA GOBERNACIÓN DE BOYACÁ".

LOCALIZACIÓN:

Zona rural del municipio de La Uvita, Boyacá, en la Intitución Educativa Nuestra Señora De Las Mercedes De Municipio De La Uvita, por la vía Calle 3 del municipio salida alterna con dirección al municipio de chita, aproximadamente a 900 metros del centro del municipio.

PROGRAMA DE ACUERDO AL PLAN DE DESARROLLO:

NOMBRE DEL CONTRATISTA:	REPRESENTANTE LEGAL:
CONSORCIO IE MERCEDES	**RONALD GERARDO CORDERO JAIME**
NOMBRE DEL INTERVENTOR:	NOMBRE DEL SUPERVISOR:
PGL INGENIERA Y CONSULTORIA S.A.S R/L. LUIS EUCARIO PÉREZ GÓMEZ	**JOSE LUIS CAMERO JAIME**

ADICIONALES Y PRORROGAS


No.	DESCRIPCIÓN	VALOR	PLAZO
		N.A	
VALOR ADICIONALES Y PLAZO TOTAL		N.A	

VALOR INICIAL:	$ 611.315.000,00	VALOR ADICIONALES:	$ 0,00	VALOR TOTAL:	$ 611.315.000,00

FECHA DE TERMINACIÓN REAL (Según prorrogas y suspensiones)	30	de	SEPTIEMBRE	de	**2023**
FECHA DE TERMINACIÓN REAL (Según prorrogas y suspensiones)		de		de	

AVANCE DE EJECUCIÓN

% DE TIEMPO TRANSCURRIDO	**50,0%**	% DE AVANCE DE OBRA EJECUTADO	**20,0%**	% DE AVANCE DE OBRA PROGRAMADO	**44,0%**



PÓLIZAS VIGENTES CONTRATO DE OBRA

							dd	mm	aa
No PÓLIZA	39-40-101040140	ANEXO No.	1	ASEGURADORA	SEGUROS DEL ESTADO S.A	FECHA APROB. DIRECCIÓN CONTRATACIÓN			

DESCRIPCIÓN DE AMPAROS	VIG. DESDE			VIG. HASTA			SUMA ASEGURADA
	dd	mm	aaaa	dd	mm	aaaa	
predios labores y operaciones	25	7	2023	10	10	2023	$ 232.000,00

ESTADO DEL TIEMPO							
BUENO	X	REGULAR		MALO		PÉSIMO	
Descripción:							

RELACIÓN DE ACTAS GENERADAS (Inicio, suspensión, reinicio, etc.)			
DESCRIPCIÓN	FECHA		
	dd	mm	aaaa
ACTE DE INICIO	1	8	2023
ACTA COMITÉ. MEJORAMIENTO DE LA INSTALACIÓN ELÉCTRICAS RURALES DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA	25	8	2023

ACTIVIDADES DESARROLLADAS CONTRATISTA DE OBRA	
DESCRIPCIÓN	LOCALIZACIÓN (ABSCISAS)
SUMINISTRO INSTALACIÓN DE TUBERIA CONDUIT EMT 1/2"	N.A
SUMINISTRO INSTALACIÓN DE TUBERIA CONDUIT EMT 3/4"	N.A
SUMINISTRO DE ACOMETIDA TRIFILAR	N.A
SUMINISTRO E INSTALACIÓN LUMINARIA LED 18 W	N.A
SUMINISTRO E INSTALACIÓN LUMINARIA LED 24 W	N.A
SUMINISTRO E INSTALACIÓN LUMINARIA LED SQ 40W DL	N.A
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LED EMERG AVISO DOBLE SPOT	N.A
SUMINISTRO E INSTALACIÓN E INTERRUPTOR SENCILLO	N.A
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR DOBLE	N.A
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR DOBLE	N.A
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SENSOR DE MOVIMIENTO	N.A
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOMACORRIENTE DOBLE CON POLO A TIERRA	N.A
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOMACORRIENTE GFCI	N.A
ACTIVIDADES DESARROLLADAS CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA	
DESCRIPCIÓN	N.A
ACOMPAÑAMIENTO DE LOS DÍAS 24,25, 26 DE AGOSTO 2023	N.A
ACOMPAÑAMIENTO DEL 30, 31, DE AGOSTO 2023	N.A
	N.A
	N.A
	N.A
	N.A

EQUIPO UTILIZADO CONTRATISTA DE OBRA			
DESCRIPCIÓN	ACTIVIDAD EJECUTADA	% UTILIZACIÓN	OBSERVACIONES
N.A	N.A		N.A
N.A	N.A		N.A
N.A	N.A		N.A
MATERIALES UTILIZADOS CONTRATISTA DE OBRA			
DESCRIPCIÓN	SUMINISTRADO POR	OBSERVACIONES	
TOMACORRIENTES MARCA ENERLUX GFCI	CIDET	CLASE A, REFERENCIA DG20TR-L-W, DG20TR-L-I	
CAJAS PARA USOS ELÉCTRICOS	CILES S.A.S		
INTERRUPTORES AUTOMÁTICOS DE BAJA TENSIÓN	CILES S.A.S		
CONDUCTORES ELÉCTRICOS, CABLES SINTOX O SINTOFLEX	CIDET		
CAJAS Y CONDULETAS (ENCERRAMIENTOS)	SGS COLOMBIA S.A.S		
CONECTORES DE BAJA TENSIÓN	3 COLOMBIA S.A		
INTERRUPTORES MANUALES	CIDET	MARCA ENERLUX LÍNEA FOLT (LÍNEA ARMADA)	
LUMINARIAS (PANEL LED)	LENOR COLOMBIA S.A.S		
LUMINARIAS DE EMERGENCIA	LENOR COLOMBIA S.A.S		
PANELES LED	LENOR COLOMBIA S.A.S		
TABLERO DE BAJA TENSIÓN	CILES S.A.S		

TOMACORRIENTE	CIDET	MARCA ENERLUX LÍNEA FOLT
TUBO CONDUIT METÁLICO EMT	CIDET	DIAMETRO 2 1/2", 3", 3 1/2" Y 4" INCLUYE CURVAS.
TUBO CONDUIT METÁLICO IMC	CIDET	DIAMETRO 1/2",3/4", 1", 1 1/4, 1 1/2", 2", 2 1/2", 3", 3 1/2" Y 4" INCLUYE UNIONES, CODOS Y CURVAS.

EQUIPO UTILIZADO POR CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA

DESCRIPCIÓN	ACTIVIDAD EJECUTADA	% UTLIZACIÓN	OBSERVACIONES
N.A	N.A		N.A
N.A	N.A		N.A
N.A	N.A		N.A
N.A	N.A		N.A
N.A	N.A		N.A

SEGUIMIENTO FINANCIERO CONTRATO DE OBRA

DESCRIPCIÓN	FECHA	VALOR
ANTICIPO		N.A
ACTA PARCIAL No.		N.A
		N.A
NO A REALISADO		N.A
		N.A
TOTAL PAGOS AUTORIZADOS		**$ 0,00**

SEGUIMIENTO FINANCIERO CONTRATO DE INTERVENTORÍA

DESCRIPCIÓN	FECHA	VALOR
ANTICIPO		N.A
ACTA PARCIAL No.		N.A
		N.A
		N.A
		N.A
TOTAL PAGOS AUTORIZADOS		**$ 0,00**

CORRESPONDENCIA PRESENTADA

FECHA RADICADO	INTERESADO	ASUNTO	RESPUESTA O TRÁMITE
N.A	N.A	N.A	N.A
N.A	N.A	N.A	N.A
N.A	N.A	N.A	N.A

VERIFICACIÓN DEL PAGO A SEGURIDAD SOCIAL

NOBRES Y APELLIDOS	No DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN	SALUD	PENSIÓN	RIESGOS	PERIODO DESDE dd	DESDE mm	DESDE aaaa	HASTA dd	HASTA mm	HASTA aaaa
ACOSTA ALCIBER	7188534	X	X	X	1	8	2023	31	8	2023
ACOSTA EDILSON	1056710028	X	X	X	1	8	2023	31	8	2023
CUCHIBAGUE WILIAR	1032425752	X	X	X	1	8	2023	31	8	2023
RODRIGUEZ JULIO	7181295	X	X	X	1	8	2023	31	8	2023
SUAREZ JOHAN	1002397295	X	X	X	1	8	2023	31	8	2023
PINILLA BREYNER	1051954848	X	X	X	1	8	2023	31	8	2023
PANQUEVA EMILIO	7318490	X	X	X	1	8	2023	31	8	2023
Se verificó que todo el personal de obra cumple con la afiliación a seguridad social de los trabajadores?								SI	X	NO

PERSONAL MÍNIMO EXIGIDO EN EL CONTRATO DE OBRA

CARGO	NOMBRES Y APELLIDOS	DOC. IDENTIFICACIÓN
DIRECTOR	ERWIN MENDEZ BERMUDEZ	88188516
RESIDENTE DE OBRA	BREYNER HELY PINILLA HURTADO	1051954848
INSPECTOR SISO	EMILIO BLADIMIR PANQUEVA ALVAREZ	7318490

MAESTRO DE OBRAS CIVILES	LUIS MIGUEL SICHACA	6768594
TECNICO ELECTRICISTA	ALCIBER ACOSTA ACOSTA	7188534

Se verificó que el personal cumple con los requerimientos del contrato?	SI	X	NO	

* Si se incluyó personal nuevo en el periodo se debe radicar al supervisor la hoja de vida y la aprobación de interventoría

PERSONAL MÍNIMO EXIGIDO EN EL CONTRATO DE INTERVENTORÍA		
CARGO	NOMBRES Y APELLIDOS	DOC. IDENTIFICACIÓN
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	LUIS EUCARIO PÉREZ GÓMEZ	74374029
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	EDWIN LEONARDO VARGAS	7175028

* Si se incluyó personal nuevo en el periodo se debe radicar al supervisor la hoja de vida .

ACTIVIDADES DESARROLLADAS PARA EL CONTROL, MANEJO AMBIENTAL Y SEGURIDAD INDUSTRIAL	
CONTRATO DE OBRA	
DESCRIPCIÓN	LOCALIZACIÓN (ABSCISAS)
DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS DE EMBALAMIENTO (BOLSAS Y CARTONES MATERIAL NUEVO) A PERSONAL AUTORIZADO PARA RECICLAJE	N.A
	N.A
	N.A
	N.A
CONTRATO DE INTERVENTORÍA	
DESCRIPCIÓN	LOCALIZACIÓN
CONTROL Y VIGILANCIA A LA ADECUADA DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS	N.A
	N.A
	N.A
	N.A

RELACIÓN DE LABORATORIOS PRUEBAS Y ENSAYOS REALIZADAS				
POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA				
DESCRIPCIÓN	FECHA			OBSERVACIÓN
	dd	mm	aaaa	
N.A				N.A
N.A				N.A
N.A				N.A
N.A				N.A
POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA				
DESCRIPCIÓN	FECHA			OBSERVACIÓN
	dd	mm	aaaa	
N.A				N.A
N.A				N.A
N.A				N.A
N.A				N.A
N.A				N.A

RELACIÓN Y UBICACIÓN DE FUENTES DE MATERIALES			
DESCRIPCIÓN	FUENTE	DISTANCIA A LA OBRA (Km)	OBSERVACIÓN
N.A		N.A	N.A
N.A		N.A	N.A
N.A		N.A	N.A
N.A		N.A	N.A

N.A	N.A	N.A

RELACIÓN DE COMITÉS DE OBRA REALIZADOS				
DESCRIPCIÓN	FECHA			OBSERVACIÓN
	dd	mm	aaaa	
Acta de inicio	1	8	2023	
Acta de Comité de Obra No 1	25	8	2023	

RELACIÓN DE INFORMES DE INTERVENTORÍA							
DESCRIPCIÓN	PERIODO						OBSERVACIÓN
	DESDE			HASTA			
	dd	mm	aaaa	dd	mm	aaaa	
Informe de Interventoría No. 1	1	8	2023	30	8	2023	DEL DÍA 1 AL 24 EL CONTRATISTA REALIZO LA COMPRA Y SUMINISTRO DE MATERIAL AL COLEGIO


OBSERVACIONES:

CONTENIDO MÍNIMO DEL INFORME*		
	VERIFICACIÓN	FOLIOS No.
Seguimiento Administrativo del Contrato de Obra		
Control y verificación de pagos de seguridad social y parafiscales del personal de obra	SI	01
Control de pólizas y garantías (Acta de aprobación Sec. De Contratación)	SI	02
Actas Generadas (inicio, suspensión , reinicio, etc.)	SI	03
El personal de obra cumple con los requisitos exigidos de los perfiles profesionales (para personal nuevo)	N.A.	
Bitácora de obra diligenciada por los residentes con visto bueno de los directores de obra e interventoría	SI	04
Seguimiento Financiero del Contrato de Obra		
Soportes de seguimiento a la Inversión del Anticipo	N.A.	
Amortización del anticipo	N.A.	
Flujograma de actividades e inversión del contrato de obra	SI	05
Copia de actas de pago generadas en el periodo	N.A.	
Seguimiento Técnico del Contrato de Obra		
Certificación de cumplimiento de especificaciones técnicas de materiales y procesos constructivos de las obras ejecutadas	SI	06
Certificado de recibo de estudios y diseños: Control de planos, diseños, licencias y autorizaciones, estudios cálculos y especificaciones.	N.A.	
Memorias y planos de diseño aprobados	SI	07
Actas Generadas (Visitas ,comités de obra, vecindad, socialización, etc.)	SI	03
Cronograma de ejecución de actividades "Actualizado"	N.A.	
Informes de laboratorio y pruebas y ensayos realizadas para verificar que se cumplan las normas, especificaciones técnicas	N.A.	
Seguimiento Seguridad industrial, salud ocupacional y medio ambiente		
Certificación de cumplimiento de pagos a seguridad social y parafiscales del contratista de obra expedida por el director de la interventoría	SI	01
Registro de cumplimiento de todas las normas vigentes sobre seguridad industrial, salud ocupacional y medio ambiente. (señalización de obra, vertimientos, mantenimientos de maquinaria, etc.)	SI	08
Copia de licencias y permisos ambientales y de construcción	N.A.	

Registro de uso correcto de los elementos de protección personal (entrega de dotaciones,planillas, fotos, etc.)	SI	09
Registro de cumplimiento de la normatividad ambiental y plan de manejo ambiental (Seguimiento de fichas ambientales)	N.A.	
Análisis de riesgos de las actividades, identificando los peligros, y formulando los controles correspondientes	SI	08
Generales		
Registro fotográfico	SI	10
Soportes de Correspondencia enviada y recibida	N.A.	

* Se refiere a requisitos mínimos del informe de interventoría al cual se le pueden incluir todos los demás documentos que el interventor considere necesarios.
Verificación: Indica si se entregan documentos soporte (Completar con SI, NO, N.A., YA SE RADICÓ)
Folios No.: Indica en qué folio del informe se encuentran los soportes indicados

FIRMA:



Interventor / RL. Interventoría

NOMBRE:	LUIS EUCARIO PÉREZ GÓMEZ

FOLIO 1: CONTROL Y VERIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES DEL PERSONAL DE OBRA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901736175	8	CONSORCIO IE MERCEDES	A - 200 O MAS COTIZANTES	UVITA IE MERECEDES	CENTRO UVITA	LA UVITA-BOYACA	3124113265	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-08	2023-09	142551264	9455992839	E	2023/09/18	2023/09/05	BANCO DE BOGOTA	0	$479,500

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				5	$247,500	$0	$0	$247,500
PORVENIR	230301	800,224,808	8	5	$247,500	$0	$0	$247,500
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				5	$108,000	$0	$0	$108,000
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	5	$108,000	$0	$0	$108,000
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				5	$62,000	$0	$0	$62,000
COMFABOY	CCF10	891,800,213	8	5	$62,000	$0	$0	$62,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 4)				5	$62,000	$0	$0	$62,000
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	1	$12,400	$0	$0	$12,400
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	1	$12,400	$0	$0	$12,400
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	2	$24,800	$0	$0	$24,800
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$12,400	$0	$0	$12,400
TOTAL				5	$479,500	$0	$0	$479,500

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901736175	8	CONSORCIO IE MERCEDES	A - 200 O MAS COTIZANTES	UVITA IE MERECEDES	CENTRO UVITA	LA UVITA-BOYACA	3124113265	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-08	2023-09	142551264	9455992839	E	2023/09/18	2023/09/05	BANCO DE BOGOTA	0	$479,500

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	Ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	Irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	7188534	ACOSTA ALCIBER	X																	230301	8	$309,334	$49,500	ESSC24	8	$309,334	$12,400	CCF10	8	$309,334	$12,400	14-11	8	$309,334	$21,600	8	$0	$0	Si	$95,900
2	CC	1056710028	ACOSTA EDILSON	X																	230301	8	$309,334	$49,500	EPS041	8	$309,334	$12,400	CCF10	8	$309,334	$12,400	14-11	8	$309,334	$21,600	8	$0	$0	Si	$95,900
3	CC	1032425752	CUCHIBAGUE WILIAR	X																	230301	8	$309,334	$49,500	EPS041	8	$309,334	$12,400	CCF10	8	$309,334	$12,400	14-11	8	$309,334	$21,600	8	$0	$0	Si	$95,900
4	CC	7181295	RODRIGUEZ JULIO	X																	230301	8	$309,334	$49,500	EPS008	8	$309,334	$12,400	CCF10	8	$309,334	$12,400	14-11	8	$309,334	$21,600	8	$0	$0	Si	$95,900
5	CC	1002397295	SUAREZ JOHAN	X																	230301	8	$309,334	$49,500	EPS005	8	$309,334	$12,400	CCF10	8	$309,334	$12,400	14-11	8	$309,334	$21,600	8	$0	$0	Si	$95,900
Total	Afiliados(5)																						$1,546,670	$247,500			$1,546,670	$62,000			$1,546,670	$62,000			$1,546,670	$108,000		$0	$0		$479,500

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901736175	8	CONSORCIO IE MERCEDES	A - 200 O MAS COTIZANTES	UVITA IE MERECEDES	CENTRO UVITA	LA UVITA-BOYACA	3124113265	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-08	2023-09	161814535	9456296576	N	2023/09/18	2023/09/15	BANCO DE BOGOTA	0	$526,600

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	Ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	Irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	7188534	ACOSTA ALCIBER	X							A										230301	8	($309,334)	($49,500)	ESSC24	8	($309,334)	($12,400)	CCF10	8	($309,334)	($12,400)	14-11	8	($309,334)	($21,600)	8	$0	$0	Si	($95,900)
2	CC	7188534	ACOSTA ALCIBER	X							C										230301	30	$1,160,000	$185,600	ESSC24	30	$1,160,000	$46,400	CCF10	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	$80,800	30	$0	$0	Si	$359,200
3	CC	1032425752	CUCHIBAGUE WILIAR	X							A										230301	8	($309,334)	($49,500)	EPS041	8	($309,334)	($12,400)	CCF10	8	($309,334)	($12,400)	14-11	8	($309,334)	($21,600)	8	$0	$0	Si	($95,900)
4	CC	1032425752	CUCHIBAGUE WILIAR	X							C										230301	30	$1,160,000	$185,600	EPS041	30	$1,160,000	$46,400	CCF10	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	$80,800	30	$0	$0	Si	$359,200
Total	Afiliados(2)																						$1,701,332	$272,200			$1,701,332	$68,000			$1,701,332	$68,000			$1,701,332	$118,400		$0	$0		$526,600

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901736175	8	CONSORCIO IE MERCEDES	A - 200 O MAS COTIZANTES	UVITA IE MERECEDES	CENTRO UVITA	LA UVITA-BOYACA	3124113265	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-08	2023-09	161814535	9456296576	N	2023/09/18	2023/09/15	BANCO DE BOGOTA	0	$526,600

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$272,200	$0	$0	$272,200
PORVENIR	230301	800,224,808	8	2	$272,200	$0	$0	$272,200
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$118,400	$0	$0	$118,400
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	2	$118,400	$0	$0	$118,400
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$68,000	$0	$0	$68,000
COMFABOY	CCF10	891,800,213	8	2	$68,000	$0	$0	$68,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 2)				2	$68,000	$0	$0	$68,000
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	1	$34,000	$0	$0	$34,000
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	1	$34,000	$0	$0	$34,000
TOTAL				2	$526,600	$0	$0	$526,600

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900446925	7	APP CONTROL INGENIERIA S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	TUNJA PRINCIPAL	CLL 43 # 8A-06	TUNJA-BOYACA	3124113265	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-08	2023-09	142989040	9455964988	E	2023/09/07	2023/09/05	BANCOLOMBIA	0	$2,821,800

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																		PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	cde	tae	cdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: TUNJA PRINCIPAL (9 Afiliados)																						$10,422,667	$1,667,700			$10,422,667	$417,000			$10,422,667	$417,000			$10,422,667		$320,100		$0	$0		$2,821,800
Centro de Trabajo: PROFESIONALES (6 Afiliados)																						$6,302,667	$1,008,500			$6,302,667	$252,200			$6,302,667	$252,200			$6,302,667		$33,200		$0	$0		$1,546,100
Ciudad: TUNJA Depto: BOYACA (6 Afiliados)																						$6,302,667	$1,008,500			$6,302,667	$252,200			$6,302,667	$252,200			$6,302,667		$33,200		$0	$0		$1,546,100
1	CC	7182495	BUSTAMANTE JULIAN																	25-14	30	$1,160,000	$185,600	EPS008	30	$1,160,000	$46,400	CCF10	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	0.522%	$6,100	30	$0	$0	SI	$284,500
2	CC	1051211316	CALLEJAS JOSE	X																23030 1	13	$502,667	$80,500	EPS005	13	$502,667	$20,200	CCF10	13	$502,667	$20,200	14-11	13	$502,667	0.522%	$2,700	13	$0	$0	SI	$123,600
3	CC	1007306822	GAMBOA JUAN																	25-14	30	$1,160,000	$185,600	EPS041	30	$1,160,000	$46,400	CCF10	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	0.522%	$6,100	30	$0	$0	SI	$284,500
4	CC	1057516347	GAMBOA LAURA																	23030 1	30	$1,160,000	$185,600	EPS037	30	$1,160,000	$46,400	CCF10	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	0.522%	$6,100	30	$0	$0	SI	$284,500
5	CC	1003691194	LOPEZ DUVAN																	23030 1	30	$1,160,000	$185,600	EPS017	30	$1,160,000	$46,400	CCF10	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	0.522%	$6,100	30	$0	$0	SI	$284,500
6	CC	1051954848	PINILLA BREYNER																	23030 1	30	$1,160,000	$185,600	EPS010	30	$1,160,000	$46,400	CCF10	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	0.522%	$6,100	30	$0	$0	SI	$284,500
Centro de Trabajo: PROFESIONALES OBRAS (3 Afiliados)																						$4,120,000	$659,200			$4,120,000	$164,800			$4,120,000	$164,800			$4,120,000		$286,900		$0	$0		$1,275,700
Ciudad: TUNJA Depto: BOYACA (3 Afiliados)																						$4,120,000	$659,200			$4,120,000	$164,800			$4,120,000	$164,800			$4,120,000		$286,900		$0	$0		$1,275,700
7	CC	1055333260	CORREDOR CAROLA															X		23030 1	30	$1,800,000	$288,000	EPS010	30	$1,800,000	$72,000	CCF10	30	$1,800,000	$72,000	14-11	30	$1,800,000	6.960%	$125,300	30	$0	$0	SI	$557,300
8	CC	1054373745	CUITIVA JORGE																	23030 1	30	$1,160,000	$185,600	EPS017	30	$1,160,000	$46,400	CCF10	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	6.960%	$80,800	30	$0	$0	SI	$359,200
9	CC	1049638727	TOLEDO SEBASTIAN																	23030 1	30	$1,160,000	$185,600	EPS005	30	$1,160,000	$46,400	CCF10	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	6.960%	$80,800	30	$0	$0	SI	$359,200
Total	**Afiliados(9)**																					$10,422,667	$1,667,700			$10,422,667	$417,000			$10,422,667	$417,000			$10,422,667		$320,100		$0	$0		$2,821,800

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900446925	7	APP CONTROL INGENIERIA S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	TUNJA PRINCIPAL	CLL 43 # 8A-06	TUNJA-BOYACA	3124113265	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-08	2023-09	142989040	9455964988	E	2023/09/07	2023/09/05	BANCOLOMBIA	0	$2,821,800

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)				9	$1,667,700	$0	$0	$1,667,700
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	2	$371,200	$0	$0	$371,200
PORVENIR	230301	800,224,808	8	7	$1,296,500	$0	$0	$1,296,500
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				9	$320,100	$0	$0	$320,100
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	9	$320,100	$0	$0	$320,100
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				9	$417,000	$0	$0	$417,000
COMFABOY	CCF10	891,800,213	8	9	$417,000	$0	$0	$417,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 6)				9	$417,000	$0	$0	$417,000
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	1	$46,400	$0	$0	$46,400
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	2	$118,400	$0	$0	$118,400
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	2	$92,800	$0	$0	$92,800
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$46,400	$0	$0	$46,400
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	1	$46,400	$0	$0	$46,400
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	2	$66,600	$0	$0	$66,600
TOTAL				9	$2,821,800	$0	$0	$2,821,800

FOLIO 2: Control de pólizas y garantías (Acta de aprobación Sec. De Contratación)

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

RCE CONTRATOS

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
TUNJA	TUNJA	39	39-40-101040140	1

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
01	08	2023	25	07	2023	00:00	10	10	2023	23:59	ANEXO DE PRORROGA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN
CONSORCIO IE MERCEDES		NIT: 901.736.175-8
DIRECCIÓN: CL 43 NRO. 8 A - 06	CIUDAD: TUNJA, BOYACA	TELÉFONO: 3124113265

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO:		IDENTIFICACIÓN
MUNICIPIO DE LA UVITA		NIT: 891.856.257-2
DIRECCIÓN: CENTRO	CIUDAD: LA UVITA, BOYACA	TELÉFONO 7895355
BENEFICIARIO: 891856257 - MUNICIPIO DE LA UVITA	ADICIONAL:	

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN E-RCE-002A REDIS 04-09 / E-RCE-001A, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

GARANTIZAR LA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DEL CONTRATO-PROCESO GC-LP-2023-01, REFRENTE A EL MEJORAMIENTO DE LAS INSTALACIONES ELECTRICAS RURALES DE LA INSTITUCION EDUCATIVA NUESTRA SEÑORA DE LAS MERCEDES DE MUNICIPIO DE LA UVITA ENMARCADO EN EL CONVENIIO INTERADMINISTRATIVO No 2165 de 2023 CELEBRADO ENTRE DEL MUNICIPIO DE LA UVITA Y LA GOBERNACION DE BOYACA.

BENEFICIARIOS: TERCEROS AFECTADOS Y MUNICIPIO DE LA UVITA NIT 891856257-2

AMPAROS

RIESGO: CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES

AMPAROS	DEDUCIBLE	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG ACTUAL	SUMA ASEG ANTERIOR
PREDIOS LABORES Y OPERACIONES	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	25/07/2023	10/10/2023	$232,000,000.00	$232,000,000.00

ACLARACIONES

SEGUN ACTA DE INICIO DE FECHA 01 DE AGOSTO DE 2023, SE PRORROGA LA VIGENCIA DE LA GARANTIA.

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ **********0.00	$ **********0.00	$ **********0.00	$ **********0.00	$ ******232,000,000.00	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑÍA	% PART.	VALOR ASEGURADO
AVAL SEGUROS BOYACA LTDA	194842	100.00			

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO.

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CRA. 10 NO. 21-33 OFC. 108 -202 - TELEFONO: 7409487 - TUNJA

39-40-101040140

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante B. - Secretaria General

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

RCE CONTRATOS

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
TUNJA	TUNJA	39	39-40-101040140	1

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
01	08	2023	25	07	2023	00:00	10	10	2023	23:59	ANEXO DE PRORROGA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN
	CONSORCIO IE MERCEDES	NIT: 901.736.175-8

DIRECCIÓN:	CIUDAD:	TELÉFONO:
CL 43 NRO. 8 A - 06	TUNJA, BOYACA	3124113265

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO:		IDENTIFICACIÓN
	MUNICIPIO DE LA UVITA	NIT: 891.856.257-2

DIRECCIÓN:	CIUDAD:	TELÉFONO:
CENTRO	LA UVITA, BOYACA	7895355

BENEFICIARIO: 891856257 - MUNICIPIO DE LA UVITA

TEXTO ACLARATORIO

PARTICIPANTES CONSORCIO - UNION TEMPORAL :

NOMBRE	IDENTIFICACION	PARTICIPACION
A.P.P CONTROL INGENIERIA S.A.S	900446925-7	10.00
INGENIERIA RYD SAS	901499915-4	90.00

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO. QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CRA. 10 NO. 21-33 OFC. 108 -202 - TELEFONO: 7409487 - TUNJA

39-40-101040140

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante B. - Secretaria General

FIRMA TOMADOR

DLF194842A

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

FOLIO 3: Actas Generadas (inicio, suspensión, reinicio, etc.)

ALCALDIA DE LA UVITA	ALCALDIA MUNICIPAL LA UVITA NIT 891.856.257-2 MODELO ESTANDAR DE CONTROL INTERNO ACTA DE INICIO VERSION: 01 | CODIGO: PM-GC-FR | Página 1 de 1	Construyamos Futuro Para La Uvita 2020 - 2023

NOMBRE DOCUMENTO	ACTA DE INICIO
PROCESO / PROCEDIMIENTO / CONSECUTIVO PROCEDIMIENTO	GC-LP-2023-01
CÓDIGO DOCUMENTO	GC-AIN
VERSIÓN	1
FECHA SUSCRIPCIÓN	01-08-2023

En la Oficina del despacho del Señor alcalde del Municipio de La Uvita nos reunimos las partes identificadas en el cuadro siguiente, con el fin de suscribir de común acuerdo la presente Acta de Iniciación del contrato que se relaciona a continuación:

IDENTIFICACIÓN DE LAS PARTES	
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE LA UVITA
IDENTIFICACION	891.856.257-2
REPRESENTANTE LEGAL	RONALD GERARDO CORDERO JAIME
CONTRATISTA	CONSORCIO IE MERCEDES R.L./ JOSE LEONARDO ALVAREZ FONSECA
IDENTIFICACION	NIT: 901736175-8 C.C: 1.049.608.025 DE TUNJA
SUPERVISOR	JOSE LUIS CAMERO JAIME
IDENTIFICACION	C.C 1.055.315.533 EXPEDIDA EN TIBASOSA
CARGO	SECRETARIO DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO	
NO. CONTRATO	GC-CT-2023-114
OBJETO	**"MEJORAMIENTO DE LAS INSTALACIONES ELECTRICAS RURALES DE LA INSTITUCIÓN EDUCTIVA NUESTRA SEÑORA DE LAS MERCEDES DE MUNICIPIO DE LA UVITA ENMARCADO EN EL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO N° 2165 DE 2023 CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE LA UVITA Y LA GOBERNACIÓN DE BOYACÁ**
VALOR	SEISCIENTOS ONCE MILLONES TRESCIENTOS QUINCE MIL PESOS ($ 611.315.000,00) M/CTE
PLAZO EJECUCIÓN	DOS (02) MESES
FECHA DE INICIO	01/08/2023
FECHA DE TERMINACIÓN	30/09/2023

ORIGINAL FIRMADO
RONALD GERARDO CORDERO JAIME
Contratante

CONSORCIO I.E MERCEDES
R.L./ JOSE LEONARDO ALVAREZ FONSECA
Contratista

JOSE LUIS CAMERO JAIME
Supervisor

FECHA PRESENTE ACTA:	25 de agosto de 2023
CONTRATO / CONVENIO N°	Convenio Interadministrativo No. 2165 de 2023 Contrato de Obra No. GC-CT-2023-114
OBJETO	MEJORAMIENTO DE LAS INSTALACIONES ELECTRICAS RURALES DE LA INSTITUCIÓN EDUCTIVA NUESTRA SEÑORA DE LAS MERCEDES DE LA UVITA

LECTURA ACTA ANTERIOR

Aclaraciones al acta anterior:

No aplica.

VERIFICACIÓN DE COMPROMISOS PACTADOS

COMPROMISO	OBSERVACIÓN
No hay compromisos pactados por ser la primera acta a elaborar	No aplica

DESARROLLO DEL COMITÉ

Siendo las 10:40 a.m. en las instalaciones de la Institución Educativa Nuestra Señora de la Mercedes de la Uvita, Municipio de la Uvita, reunidos los abajo firmantes, procedieron a realizar visita a las instalaciones con el fin de corroborar las actividades que se viene ejecutando.

Se realiza desplazamiento por indicaciones del representante del contratista hacia el tercer nivel de la institución correspondiente al escenario y aula múltiple, en donde se constata la instalación de tubería EMT sobrepuesta sobre muros y techo, alambrado, instalación de lámparas de emergencia, tomacorrientes, iluminación de emergencia. Posteriormente se hace desplazamiento hacia la cancha de futbol y se corrobora los sitios de ubicación de postes y se aclaran inquietudes del contratista sobre los anclajes de los mismos.

El contratista de obra cuenta con 2 técnicos electricistas y 3 ayudantes. Por parte de la interventoría se encuentra un ingeniero electromecánico.

La fecha de inicio de la obra e interventoría se firmó desde el 1 de agosto de 2023, iniciando en primera instancia todo el tema de compra y transporte de suministros.

Se evidencia cambios en la ubicación de la iluminación en atención a la ubicación de algunas estructuras del techo que impiden su ubicación conforme al diseño entregado, para lo cual el supervisor por parte del

FOLIO 4: Bitácora de obra diligenciada por los residentes con visto bueno de los directores de obra e interventoría.

1

BITACORA DE OBRA

CONTRATO Nº GC-CT-2023-114

MEJORAMIENTO DE LAS INSTALACIONES ELECTRICAS RURALES DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA NUESTRA SEÑORA DE LAS MERCEDES DEL MUNICIPIO DE LA UVITA ENMARCADO EN EL CONVENIO Nº 216572023 CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE LA UVITA Y LA GOBERNACIÓN DE BOYACA

CONTRATANTE:

MUNICIPIO DE LA UVITA

CONTRATISTA:

CONSORCIO I.E MERCEDES

JOSE LEONARDO ALVAREZ FONSECA

001 1-02-2023

Se da inicio a la ejecucion del proyecto mediante visita de obra con asistencia de las partes interesadas: Interventoria, contratista y Supervision.

Se realiza el recorrido por las instalaciones del colegio y se muestra todo uno de los diseños en los espacios a ej intervenir

Clima: Soleado

Maquinaria y Equipo: No Aplica

002 3-02-2023

Actividades Realizadas:

Se procede con la solicitud del pedido de materiales (Tubos - cableado Aparatos eléctricos etc) para lo cual manifiesta al proveedor que debido al volumen, el pedido del material se demora de 8 a 15 dias

Clima: Soleado

Maquinaria y Equipo: No Aplica

003 Del 21 Agosto 2023

Actividades Realizadas

Se Adelantan Actividades Administrativas en oficina como la revision de planos diseños, pedidos de material, contratacion de personal, compra de suministros, gestion documental etc.

004 23-08-2023

Actividades Realizadas:

Llega la notificacion del proveedor sugiriendo que el material se encuentra disponible para despacho en la ciudad de Tunja, para lo cual procedemos con el cargue y transporte de material.

Clima: Soleado

Maquinaria y Equipos - No Aplica

005 23-08-2023

Actividades Realizadas

Se da inicio a la ejecucion de las actividades de contrato

mediante descarga de Material dentro de una de las Espacios
proporcionado por el rector del colegio, espacio que funcionara
como centro de acopio y como campamento de obra
9:am Se procede con la instalación de tubería EMT
y cajas radwell para los circuitos y tomas de iluminación en el
auditorio del piso 3 del Bloque principal.
Personal que visita a obra
Director, residente, inspector SISO, 2 técnicos electricistas y
dos Ayudantes.
Clima: Soleado
Maquinaria / Equipo : No Aplica

006 24-08-2023
Actividades realizadas:
007 7:00 am continuamos con la instalación de tuberías EMT para
circuitos de tomas, iluminación, de iluminación de emergencia
en el auditorio del paso 3 del bloque principal.
008 9:00 pm. Iniciamos la instalación de cableado electrico
en los circuitos a los cuales se les a instalado tuberia EMT
y cajas radwell previamente instaladas
009 5:00 pm Por parte del Tecnico electricista Alcides Acosta
se plantea la necesidad de realizar una modificación a la
disposición en planta de los luminarios del Auditorio puesto que
segun el diseño, los luminarios por instalar se cruzan con los elementos
estructurales de la edificación por lo tanto se plantea este cambio
y se realizara su verificación de los requerimientos fotometricos, con la
configuración modificada
Clima. Soleado
Maquinaria / Equipos + Herramienta Menor

010 25-08-2023
Actividades Realizadas:
011 Siendo las 9:00 am Realizamos la visita por parte del
Supervisor del contrato, el ingeniero de minas de departamental
Se realizo recorrido al proyecto, se realizo comite de obra
en el cual se presento el avance actual del proyecto,

Se plantea la modificación realizada el 24 Agosto Acerca de la localización de las lamparas de (plim) tercer Piso del bloque principal para la cual aprueban la modificación para ir Solicitar al contratista realizar la verificación Fotometrica de los espacios eliminados Modificados.

Aparte se plantea la posibilidad de recortar el tramo de acometida entre la caja de distribución para el bloque A y la caja de distribución Bloque B viendo que el mas facilmente alimenta el bloque B por el costado Superior de la conduit multiple

Actividades Realizadas:

Se realiza la instalación de los puntos led sylvania en el espacio del auditorio y laboratorio de física en el bloque A, tomar interruptores

Clima Soleado

Maquinaria Equipo: Herramienta menor.

012 26-08-2023

Actividades Realizadas

Personal que ingresa a obra:

Residente, 2 Tecnicos, electricista, 3 Ayudantes electricistas

Actividades Realizadas

Continuamos con la instalación de tuberia EMT de 1/2 pulgada, establecido, luminarias, tomas, interruptores, del espacio de Antiguedades en el 3 piso del Bloque A.

013 4:00pm Iniciamos con la excavación de Zanja para conduits en el costado Superior de la conduit multiple hasta una longitud de 10 metro

Clima: Soleado

Maquinaria Equipo: Herramienta menor

014 27-08-2023

Personal que ingresa a obra

Director, Residente, SSO, 2 Tecnicos, 3 Ayudantes electricos

Actividades Realizadas

015 7:00 am continuamos con la excavacion de Zanja para conduits Sobre

la concha multiple, hasta una longitud de 30 metros.
Procedemos con la instalación de luminarias de Emergencias y finalizamos la instalación de tomas, luminarias e interruptores de los espacios del piso 3 del Bloque A

016 1:00 pm. Se realiza la excavación del mantenimiento y elemento mecánicos en el espacio de música en el bloque B
Clima Soleado
Maquinarias y Equipos: Herramienta menor

017 28-03-2023
Personal que ingresa a la obra
Residente, 2 Técnicos, 3 Ayudantes electricos
Actividades Realizadas

018 7:00 am Continuamos con la excavación de Sonido para continuar sobre la concha multiple hasta una longitud de 50 metros.

019 8:30 am Iniciamos la instalación de tubos, cableado, luminarias en el cuarto de musica en el Bloque B

020 4:00 pm Se Solicita al rector del colegio exceder por el día de mañana el Salón continuo de salón de musica para realizar las instalaciones electricas en este espacio
Clima: Lluvioso
Maquinarias y Equipos: Herramienta Menor

021 29-03-2023
Personal que ingresa a la obra
Residente, 2 Técnicos, 3 Ayudantes electricos
Actividades Realizadas:
Realizamos la instalacion de tubería MT, luminarias, tomas, cableado e interruptores del Salon del grado 6B y se inicia la instalacion de tubería y cableado en el campamento de obra Bloque B
Paralelamente continuamos con la (instalación de) la excavacion de Sonido A el costado Superior de la concha multiple hasta los Bancos contiguos a la porteria
Clima Soleado
Maquinaria y Equipos: Herramienta Menor.

022 30-08-2023
Personal que ingresa a la obra
Residente 2 Técnicos 3 Ayudantes Electricos
Actividades Realizadas
continuamos con la excavacion de zanja por el costado posterior de la
galeria, hasta una longitud aproximada de 90 metros desde el punto de
inicio se evidencia la presencia de grandes rocas de hasta 3
metros de diametro las cuales dificultan la excavacion manual
de zanja

023 8:00am Procedemos con la instalación de tubería EMT luminarias
tomacorrientes, cableado de circuito de electricidad (de) e
Impermeables
Clima Soleado
Maquinarias y Equipos: Herramientas menores

024 31-08-2023
Personal que ingresa a la obra
Residente, 2 Técnicos 3 Ayudantes electricos
Actividades Realizadas

025 7:00 am Iniciamos la reubicacion de excavacion desde el cerco perimetrico
centro medicion hasta el cerco de la cancha multiple,
en todos los tramos donde se encontro roca dejamos pendiente
para la posterior demolicion con martillo.

026 8:00 am Realizo la evacuacion del mobiliario de la Biblioteca
en el Bloque B y procedemos con la instalación de la red de
iluminacion y fuerza de este ambiente.
Para cada una de las aulas se esta realizando la instalacion de la
red nueva electrica SIN eliminar la red existente; lo anterior con la
finalidad de garantizar en todo momento la continuidad en el
Suministro de energia electrica para cada uno de los ambientes de la
Institucion educativa.
El desmonte de la red existente y puesta en marcha de la
nueva red se realizara al final de la ejecucion del proyecto
Clima Soleado
Maquinarias y Equipos: Herramientas menores

FOLIO 5: Flujograma de actividades e inversión del contrato de obra

CRONOGRAMA Y FLUJO DE FONDOS DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES PROYECTOS SGR

NOMBRE DEL PROYECTO: **MEJORAMIENTO DE LAS INSTALACIONES ELECTRICAS RURALES DE LA INSTITUCION EDUCATIVA NUESTRA SEÑORA DE LAS MERCEDES DEL MUNICIPIO DE LA UVITA ENMARCADO EN EL CONVENIO INTERDAMINISTRATIVO N° 2165 DE 2023 CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE LAUVITA Y LA GOBERNACION DE BOYACA.**

ITEM	DESCRIPCION	MES 1				MES 2				
1		SEMANA 1	SEMANA 2	SEMANA 3	SEMANA 4	SEMANA 5	SEMANA 6	SEMANA 7	SEMANA 8	SEMANA 9
1.01	SUMINISTRO E INSTALACION DE TRANSFORMADOR DE 45 KVA CON PROTECCIONES, SEGÚN NORMA EBSA, INCLUYE POSTES Y RED DE MEDIA TENSION								17,998,868	17,998,868
1.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TABLERO DE MEDIDA SEMIDIRECTA TM-009 (TDP-A) (SEGÚN DISEÑO Y ESPECIFICACIONES)							6,135,940		
1.03	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA CONDUIT GALVANIZADA IMC DE 3" (INCLUYE CURVA, UNION Y CAPACETE)							518,967		
1.04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TABLERO DE DISTRIBUCION GENERAL PRINCIPAL (INCLUYE BRAKER, TOTALIZADOR)						897,544			
1.05	TIERRA TABLERO GENERAL (VARILLA COOPER WELL)						771,203			
1.06	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA TRIFÁSICA EN Cu (3X1/0+1X1/0+1/0), INCLUYE DUCTERIA						6,554,658			
1.07	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA TRIFÁSICA EN Al (3X2/0+1X2/0+2/0), INCLUYE DUCTERIA					65,602,400				
1.08	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA TRIFÁSICA EN Cu (3X8+1X8+8), INCLUYE DUCTERIA					6,296,940				
1.09	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA TRIFÁSICA EN Cu (3X4+1X4+4), INCLUYE DUCTERIA					1,660,170				
1.10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA TRIFÁSICA EN Cu (3X6+1X6+6), INCLUYE DUCTERIA					3,260,940				
1.11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA TRIFÁSICA EN Al (2X6+6), INCLUYE DUCTERIA					28,027,692				
1.12	SUMINISTRO E INSTALACION CAJAS DE INSPECCION DE 1.00 X 1.00 X 1.00 MTS LADRILLO (INCLUYE MARCO Y TAPA)				3,847,395	3,847,395				
1.13	SUMINISTRO E INSTALACION CAJAS DE INSPECCION DE 60 X 60 X 60 CM LADRILLO (INCLUYE MARCO Y TAPA)				726,384	726,384				
1.14	APERTURA DE ZANJA PARA B.T. DE 60 X 80 CM EN CUALQUIER MATERIAL. COMPACTACION SEGUN DISEÑO	4,674,333	4,674,333	4,674,333	4,674,333	4,674,333	4,674,333			
1.15	MATERIALES PARA ZANJA DE A.P. DE 40 X 40 CM, SEGUN DISEÑO	1,557,576	1,557,576	1,557,576	1,557,576	1,557,576	1,557,576			
1.16	SUMINISTRO E INSTALACION DE BARRAJES EN BAJA TENSION				6,890,747	6,890,747				
1.17	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TABLERO DE DISTRIBUCION PARCIAL (INCLUYE BRAKER, TOTALIZADOR)		1,451,831		1,451,831					
1.18	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO PARCIAL 12 CIRCUITOS.		916,016		916,016					
1.19	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO PARCIAL 18 CIRCUITOS.		899,542		899,542					
1.20	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO PARCIAL 6 CIRCUITOS.		218,222		218,222					
1.21	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BREAKER DE 1X20 A		953,127		953,127					
1.22	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BREAKER DE 1X40 A		30,497		30,497					
1.23	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BREAKER DE 2X20 A		424,620		424,620					
1.24	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BREAKER DE 3X20 A		153,060		153,060					
1.25	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA CONDUIT EMT 1/2"	5,833,314	5,833,314	5,833,314	5,833,314	5,833,314	5,833,314	5,833,314		
1.26	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA CONDUIT EMT 3/4"	1,194,561	1,194,561	1,194,561	1,194,561	1,194,561	1,194,561	1,194,561		
1.27	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA CONDUIT EMT 1"	1,164,959	1,164,959	1,164,959	1,164,959	1,164,959	1,164,959	1,164,959		
1.28	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA TRIFILAR (1X12+1X12+12)		5,801,767	5,801,767	5,801,767	5,801,767	5,801,767	5,801,767		
1.29	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA TRIFILAR (1X10+1X10+10)		2,386,883	2,386,883	2,386,883	2,386,883	2,386,883	2,386,883		
1.30	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA TRIFILAR (1X8+1x8+8)		226,925	226,925	226,925	226,925	226,925	226,925		
1.31	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LED PROYECTOR 400W, INCLUYE POSTE METALICO							37,391,914	37,391,914	
1.32	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LED PROYECTOR 200W						13,392,792		13,392,792	13,392,792
1.33	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA LED 18W			379,434	379,434	379,434	379,434	379,434		
1.34	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA LED 24W			2,279,295	2,279,295	2,279,295	2,279,295	2,279,295		
1.35	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL LED SQ 40W DL			9,610,164	9,610,164	9,610,164	9,610,164	9,610,164		
1.36	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LED DECORATIVA EXTERIOR LED 50 W							19,478,830	19,478,830	
1.37	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LED EMERG AVISO DOBLE SPOT				1,568,784	1,568,784	1,568,784	1,568,784	1,568,784	
1.38	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA TIPO APLIQUE TORTUGA				328,231	328,231	328,231	328,231	328,231	
1.39	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR SENCILLO				555,142	555,142	555,142	555,142	555,142	
1.40	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR DOBLE				384,149	384,149	384,149	384,149	384,149	
1.41	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SENSOR DE MOVIMIENTO					682,184	682,184	682,184	682,184	
1.42	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOMACORRIENTE DOBLE CON POLO A TIERRA					4,032,163	4,032,163	4,032,163	4,032,163	
1.43	SUMINISTRO E INSTALACION DE TOMACORRIENTE GFCI					157,271	157,271	157,271	157,271	
1.44	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOMACORRIENTE BIFÁSICA					48,295	48,295	48,295	48,295	
1.45	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOMACORRIENTE TRFÁSICA					53,625	53,625	53,625	53,625	
1.46	SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO DE CONTROL, BARRAJE TETRAPOLAR, CUATRO CONTACTORES DE 2X15A, PULSADORES DE ARRANQUE Y PARADA Y DEMÁS ACCESORIOS PARA CONTROL DE ILUMINACIÓN INDEPENDIENTE PARA								2,897,247	2,897,247
1.47	SUMINISTRO E INSTLACION DE POSTE DE FERROCONCRETO DE 8 m x 510 kgf							1,334,550		
1.48	DESMANTELAMIENTO DE CABLE Y APARATOS ESXISTENTES								3,969,106	
1.49	SUMINISTRO E INSTLACION DE UPS DE 3 KVA									8,884,876
	SUBTOTAL CAPITULO MES	**14,424,743.48**	**27,887,232.98**	**35,109,211.28**	**54,456,957.28**	**159,431,622.78**	**64,445,252.28**	**100,547,346.94**	**102,838,600.50**	**43,173,782.50**
2	**RETIE**	**SEMANA 1**	**SEMANA 2**	**SEMANA 3**	**SEMANA 4**	**SEMANA 5**	**SEMANA 6**	**SEMANA 7**	**SEMANA 8**	**SEMANA 9**
2.0	RETIE									
	SUBTOTAL CAPITULO MES	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**4,500,125.00**
3	**RETILAP**	**SEMANA 1**	**SEMANA 2**	**SEMANA 3**	**SEMANA 4**	**SEMANA 5**	**SEMANA 6**	**SEMANA 7**	**SEMANA 8**	**SEMANA 9**
3.0	RETILAP									
	SUBTOTAL CAPITULO MES	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**4,500,125.00**
	TOTAL POR MES	14,424,743.48	27,887,232.98	35,109,211.28	54,456,957.28	159,431,622.78	64,445,252.28	100,547,346.94	102,838,600.50	52,174,032.50
	TOTAL ACUMULADO	14,424,743.48	42,311,976.45	77,421,187.73	131,878,145.00	291,309,767.78	355,755,020.06	456,302,367.00	559,140,967.50	611,315,000.00

JOSE LEONARDO ALVAREZ FONSECA
ING. CIVIL
R.L. CONSORCIO IE MERCEDES

FOLIO 6: Certificación de cumplimiento de especificaciones técnicas de materiales y procesos constructivos de las obras ejecutadas

ISO/IEC 17065:2012
09-CPR-004

CERTIFICADO DE CONFORMIDAD DE PRODUCTO

PRODUCT CONFORMITY CERTIFICATE

Modelo de Certificación
Certification Modality
Marca con Reglamentos Técnicos Colombianos
Sistema 5

No. 04988

La Corporación Centro de Innovación y Desarrollo Tecnológico Del Sector Eléctrico - CIDET certifica que el producto:
CIDET certifies that the product:

DENOMINACIÓN	TIPO	REFERENCIA
INTERRUPTORES MANUALES MARCA ENERLUX LÍNEA LOFT	LÍNEA ARMADA: CIEGO, PULSADORES, SENCILLOS, SENCILLOS CONMUTABLES, DOBLES, DOBLES CONMUTABLES, TRIPLES, TRIPLES CONMUTABLES	VER ANEXO

CÓDIGO IAF:	19	CÓDIGO NACE:	27.33	CÓDIGO ICS:	29.120.40

Las características e identificación de este producto se describen en el documento anexo, que hace parte integral del presente CERTIFICADO. Este documento contiene 2 páginas.
The characteristics and identification of this product is described in the attached document, which is an integral part of this CERTIFICATE.

Fabricado por:
Manufactured by:

Comercializado por **GRUPO CRE ARIAS S EN C**

TC OCC km 19 vía Bogotá - Mosquera MZ P 8 BG 87 PI San Jorge, Mosquera, Cundinamarca, Colombia

Satisface los requerimientos de
Satisfies the requirements of

RESOLUCIÓN 90708 de 2013 del MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA - RETIE (Numeral 20.16)

Fecha de Certificación: 2013 / 07 / 15
Fecha de Renovación: 2021 / 05 / 23
Fecha de Vencimiento: 2024 / 05 / 23

Fecha máxima para la finalización de las próximas auditorías de seguimiento: 2022 / 05 / 23 y 2023 / 05 / 23

Diego Alejandro Valencia
Director CIDET Certificación
CIDET Certification Manager

Firmado digitalmente por DIEGO ALEJANDRO VALENCIA CALLEJAS
Fecha: 2021.05.24 16:47:06 -05'00'

ISO/IEC 17065:2012
09-CPR-004

CERTIFICADO DE CONFORMIDAD DE PRODUCTO No. 04988

FECHA DE CERTIFICACIÓN: 2013 / 07 / 15
FECHA DE RENOVACIÓN: 2021 / 05 / 23
FECHA DE VENCIMIENTO: 2024 / 05 / 23

ANEXO DE CARACTERÍSTICAS E IDENTIFICACIÓN DE INTERRUPTORES MANUALES MARCA ENERLUX LÍNEA LOFT

Tipo	Línea armada: ciego, pulsadores, sencillos, sencillos conmutables, dobles, dobles conmutables, triples, triples conmutables
Referencia	BV1111, BV1102, BV1102W, BV2102 SILVER, BV1101, BV1101W, BV2101 SILVER, BV1101 3 WAY, BV1101W 3 WAY, BV2101 SILVER 3 WAY, BV1201, BV1201W, BV2201 SILVER, BV1201 3 WAY, BV1201W 3 WAY, BV2201 SILVER 3 WAY, BV1301, BV1301W, BV2301 SILVER, BV1301 3 WAY, BV1301W 3 WAY, BV2301 SILVER 3 WAY
Corriente nominal	6 A
Tensión Nominal	120 - 250 Vac
Color	Blanco negro, blanco y Silver
Aplicación	Para uso residencial y comercial
Referencial	RESOLUCIÓN 90708 de 2013 del MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA - RETIE (Numeral 20.16)

Atentamente,

Diego Alejandro Valencia
Director CIDET Certificación
CIDET Certification Manager
VSUARE2

ISO/IEC 17065:2012
11-CPR-005

CERTIFICADO DE CONFORMIDAD

Nº. CS-LCO-5553-201751

LENOR COLOMBIA S.A.S

CERTIFICA

IDENTIFICACION DEL PRODUCTO

PRODUCTO(*)	Descripción
LUMINARIAS DE EMERGENCIA	(*) Referencias: Ver Anexo No. 1

Titular del Certificado

FEILO SYLVANIA COLOMBIA S.A.

IMPORTADOR
NIT: 800.127.132 - 2

El producto identificado ha sido evaluado por LENOR COLOMBIA S.A.S y se encontró Conforme con los requisitos del siguiente referente normativo:

República de Colombia. RESOLUCIÓN No. 90708 DE 2013 DEL MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA "REGLAMENTO TÉCNICO DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS (RETIE)" Sección 20.28
República de Colombia. RESOLUCIÓN No. 180540 DE 2010 DEL MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA "REGLAMENTO TÉCNICO DE ILUMINACIÓN Y ALUMBRADO PÚBLICO (RETILAP)" Sección 320
Los ensayos fueron realizados bajo Norma Internacional IEC 60598-2-22

Esquema de Certificación Nº 5 - ISO/IEC 17067: 2013

(*) Todas las Características e Identificación del Producto cubierto por el presente Certificado de Conformidad se encuentran detalladas en los documentos Anexos que hacen parte de este Certificado: ANEXO No. 1 que consta de una (1) página y ANEXO A que consta de seis (6) páginas.

Fecha de Emisión: 30 de Noviembre de 2017
Fecha de Reexpedición: 18 de Mayo de 2018
Fecha próximo Seguimiento: 29 de Noviembre de 2018**

Vigencia: Tres (3) años a partir de la fecha de Emisión del Certificado sujeto a Seguimientos Periódicos.

Directora Ejecutiva

**Los seguimientos deberán iniciarse mínimo con tres meses de anticipación a la fecha indicada

Carrera 15 No. 93A- 62 - Oficina 501 Tel +57 1 744 65 44 - Bogotá, D.C. Colombia
www.lenor.com.co

ISO/IEC 17065:2012
11-CPR-005

ANEXO No.1
Certificado de Conformidad Nº. CS-LCO-5553-201751
LUMINARIAS DE EMERGENCIA

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA
1	LED EMERG R1 2X1.6W	LED EMERG R1 2X1.6W
2	LED EMERG R2 2.4W	LED EMERG R2 2.4W
3	LED EMERG 3.2W DL 48 PCS	LED EMERG 3.2W DL 48 PCS
4	LED EMERG AVISO	LED EMERG AVISO
5	LED EMERG DOWNLIGHT 4.5W	LED EMERG DOWNLIGHT 4.5W
6	LED EMERG BALA 3W	LED EMERG BALA 3W
7	LED EMERG AVISO DOBLE SPOT	LED EMERG AVISO DOBLE SPOT
8	LED EMERG R3 2X1W	LED EMERG R3 2X1W
9	LED EMERG APLIQUE 3W	LED EMERG APLIQUE 3W
10	LED EMERG DOWNLIGHT 3W	LED EMERG DOWNLIGHT 3W
11	LED EMERG APLIQUE 4W	LED EMERG APLIQUE 4W
12	LED EMERG R1 MINI 2x1.2W	LED EMERG R1 MINI 2x1.2W
13	LED EMERG R2 3W	LED EMERG R2 3W

FIN DEL ANEXO No. 1

**Los seguimientos deberán iniciarse mínimo con tres meses de anticipación a la fecha indicada

Carrera 15 No. 93A- 62 - Oficina 501 Tel. +57 1 744 65 44 - Bogotá, D.C. Colombia
www.lenor.com.co

ISO/IEC 17065:2012
11-CPR-005

CERTIFICADO DE CONFORMIDAD

Nº. CS-LCO-5716-2017

LENOR COLOMBIA S.A.S

CERTIFICA

IDENTIFICACION DEL PRODUCTO

PRODUCTO (*)	Descripción
LUMINARIAS	(*) Referencias: Ver Anexo No. 1

Titular del Certificado

FEILO SYLVANIA COLOMBIA S.A

IMPORTADOR
NIT: 800.127.132-2

El producto identificado ha sido evaluado por LENOR COLOMBIA S.A.S y se encontró Conforme con los requisitos del siguiente referente normativo:

República de Colombia. RESOLUCIÓN No. 180540 DE 2010 DEL MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA "REGLAMENTO TÉCNICO DE ILUMINACIÓN Y ALUMBRADO PÚBLICO (RETILAP)" Sección 320

Esquema de Certificación Nº 5 - ISO/IEC 17068 17067

(*) Todas las Características e Identificación del Producto cubierto por el presente Certificado de Conformidad se encuentran detalladas en los documentos Anexos que hacen parte de este Certificado: ANEXO No. 1 que consta de una (1) página y ANEXO A que consta de seis (6) páginas.

Fecha de Emisión: 08 de Marzo de 2018
Fecha próximo seguimiento: 07 de Marzo de 2019 **

Vigencia: Tres (3) años a partir de la fecha de Emisión del Certificado sujeto a Seguimientos Periódicos.

Directora Ejecutiva

**Los seguimientos deberán iniciarse mínimo con tres meses de anticipación a la fecha indicada

Carrera 15 No. 93A - 62 - Oficina 501 Tel. +57 1 744 65 44 - Bogotá, D.C. Colombia
www.lenor.com.co

ISO/IEC 17065:2012
11-CPR-005

ANEXO No. 1 Certificado de Conformidad Nº. CS-LCO-5716-2017 LUMINARIAS		
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA
1	LED REFLECTOR JETA VATIAJES 10W, 15W, 20W, 25W, 30W, 35W, 40W, 45W, 50W, 55W, 60W, 65W, 70W, 75W, 80W, 85W, 90W, 95W, 100W, 105W, 110W, 115W, 120W, 125W, 130W, 135W, 140W, 145W, 150W, 155W, 160W, 165W, 170W, 175W, 180W, 185W, 190W, 195W, 200W TENSIONES 120V, 100-240V, 100-277V, 85-265V, 220-240V TEMPERATURA DE COLOR RGB 2700-3000K(WW), 4000-4100K(NW), 5000-5700K(CW), 6000-6500K(DL) IP 65	LED REFLECTOR JETA
2	LED REFLECTOR JETA SENSOR 10W, 15W, 20W, 25W, 30W, 35W, 40W, 45W, 50W, 55W, 60W, 65W, 70W, 75W, 80W, 85W, 90W, 95W, 100W, 105W, 110W, 115W, 120W, 125W, 130W, 135W, 140W, 145W, 150W, 155W, 160W, 165W, 170W, 175W, 180W, 185W, 190W, 195W, 200W TENSIONES 120V, 100-240V, 100-277V, 85-265V, 220-240V TEMPERATURA DE COLOR RGB 2700-3000K(WW), 4000-4100K(NW), 5000-5700K(CW), 6000-6500K(DL) IP 65	LED REFLECTOR JETA SENSOR

FIN DEL ANEXO No. 1

**Los seguimientos deberán iniciarse mínimo con tres meses de anticipación a la fecha indicada

Carrera 15 No. 93A - 62 - Oficina 501 Tel. +57 1 744 65 44 - Bogotá, D.C. Colombia
www.lenor.com.co

ISO/IEC 17065:2012
11-CPR-005

CERTIFICADO DE CONFORMIDAD

Nº. CS-LCO-11546-2019

LENOR COLOMBIA S.A.S

CERTIFICA

IDENTIFICACION DEL PRODUCTO

PRODUCTO (*)	Descripción
PANELES LED	(*) Referencias: Ver Anexo No. 1

Titular del Certificado

FEILO SYLVANIA COLOMBIA S.A

IMPORTADOR

NIT: 800.127.132-2

El producto identificado ha sido evaluado por LENOR COLOMBIA S.A.S y se encontró Conforme con los requisitos del siguiente referente normativo:

República de Colombia. Resolución 180540 de 2010, Marzo 30 de 2010. ANEXO GENERAL REGLAMENTO TÉCNICO DE ILUMINACIÓN Y ALUMBRADO PÚBLICO (RETILAP) y sus modificaciones con la Resolución 181568 del 1 de septiembre de 2010, Resolución 182544 del 29 de diciembre de 2010, Resolución 180173 del 14 de febrero de 2011, Resolución 91872 del 28 de diciembre de 2012, Resolución 90980 del 15 de noviembre de 2013. Resolución 40122 del 8 de febrero de 2016.
Sección 320

Esquema de Certificación Nº 5 - ISO/IEC 17067:2013

(*) Todas las Características e Identificación del Producto cubierto por el presente Certificado de Conformidad se encuentran detalladas en el documento Anexo que hace parte de este Certificado: ANEXO No. 1 que consta de una (1) página.

Fecha de Emisión: 27 de Septiembre de 2019
Fecha próximo seguimiento: 26 de Septiembre de 2020**

Vigencia: Tres (3) años a partir de la fecha de Emisión del Certificado sujeto a Seguimientos Periódicos.

Director de Certificación

**Los seguimientos deberán iniciarse mínimo con tres meses de anticipación a la fecha indicada

Carrera 15 No. 93A - 62 - Oficina 501 Tel. +57 1 744 65 44 - Bogotá, D.C. Colombia
www.lenor.com.co

ISO/IEC 17065:2012
11-CPR-005

CERTIFICADO DE CONFORMIDAD

Nº. CS-LCO-11546-2019

LENOR COLOMBIA S.A.S

CERTIFICA

IDENTIFICACION DEL PRODUCTO

PRODUCTO (*)	Descripción
PANELES LED	(*) Referencias: Ver Anexo No. 1

Titular del Certificado

FEILO SYLVANIA COLOMBIA S.A

IMPORTADOR

NIT: 800.127.132-2

El producto identificado ha sido evaluado por LENOR COLOMBIA S.A.S y se encontró Conforme con los requisitos del siguiente referente normativo:

República de Colombia. Resolución 180540 de 2010, Marzo 30 de 2010. ANEXO GENERAL REGLAMENTO TÉCNICO DE ILUMINACIÓN Y ALUMBRADO PÚBLICO (RETILAP) y sus modificaciones con la Resolución 181568 del 1 de septiembre de 2010, Resolución 182544 del 29 de diciembre de 2010, Resolución 180173 del 14 de febrero de 2011, Resolución 91872 del 28 de diciembre de 2012, Resolución 90980 del 15 de noviembre de 2013. Resolución 40122 del 8 de febrero de 2016.
Sección 320

Esquema de Certificación Nº 5 - ISO/IEC 17067:2013

(*) Todas las Características e Identificación del Producto cubierto por el presente Certificado de Conformidad se encuentran detalladas en el documento Anexo que hace parte de este Certificado: ANEXO No. 1 que consta de una (1) página.

Fecha de Emisión: 27 de Septiembre de 2019
Fecha próximo seguimiento: 26 de Septiembre de 2020**

Vigencia: Tres (3) años a partir de la fecha de Emisión del Certificado sujeto a Seguimientos Periódicos.

Director de Certificación

**Los seguimientos deberán iniciarse mínimo con tres meses de anticipación a la fecha indicada

Carrera 15 No. 93A - 62 - Oficina 501 Tel. +57 1 744 65 44 - Bogotá, D.C. Colombia
www.lenor.com.co

ISO/IEC 17065:2012
11-CPR-005

ANEXO No. 1 Certificado de Conformidad Nº. CS-LCO-11546-2019 PANELES LED		
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA
1	LED PANEL SQ POTENCIAS 24W, 30W, 31W, 32W, 33W, 34W, 35W, 36W, 37W, 38W, 39W, 40W, 41W, 42W, 43W, 44W, 45W, 46W, 47W, 48W, 49W, 50W, 55W, 60W TENSIONES 185-265V, 100-240V, 110-240V, 100-277V, 120-277V TEMPERATURA DE COLOR 2.700-3.000K(WW), 4.000-4.100K(NW), 5.000-5.700K(CW), 6.000-6.500K(DL)	LED PANEL SQ
2	LED PANEL RC POTENCIAS 24W, 30W, 31W, 32W, 33W, 34W, 35W, 36W, 37W, 38W, 39W, 40W, 41W, 42W, 43W, 44W, 45W, 46W, 47W, 48W, 49W, 50W, 55W, 60W TENSIONES 185-265V, 100-240V, 110-240V, 100-277V, 120-277V TEMPERATURA DE COLOR 2.700-3.000K(WW), 4.000-4.100K(NW), 5.000-5.700K(CW), 6.000-6.500K(DL)	LED PANEL RC
3	LED PANEL SQ DIM POTENCIAS 24W, 30W, 31W, 32W, 33W, 34W, 35W, 36W, 37W, 38W, 39W, 40W, 41W, 42W, 43W, 44W, 45W, 46W, 47W, 48W, 49W, 50W, 55W, 60W TENSIONES 85-265V, 100-240V, 110-240V, 100-277V, 120-277V TEMPERATURA DE COLOR 2.700-3.000K(WW), 4.000-4.100K(NW), 5.000-5.700K(CW), 6.000-6.500K(DL)	LED PANEL SQ DIM
4	LED PANEL RC DIM POTENCIAS 24W, 30W, 31W, 32W, 33W, 34W, 35W, 36W, 37W, 38W, 39W, 40W, 41W, 42W, 43W, 44W, 45W, 46W, 47W, 48W, 49W, 50W, 55W, 60W TENSIONES 85-265V, 100-240V, 110-240V, 100-277V, 120-277V TEMPERATURA DE COLOR 2.700-3.000K(WW), 4.000-4.100K(NW), 5.000-5.700K(CW), 6.000-6.500K(DL)	LED PANEL RC DIM
5	LED PANEL SQ IVY POTENCIAS 24W, 30W, 31W, 32W, 33W, 34W, 35W, 36W, 37W, 38W, 39W, 40W, 41W, 42W, 43W, 44W, 45W, 46W, 47W, 48W, 49W, 50W, 55W, 60W TENSIONES 85-265V, 100-240V, 110-240V, 100-277V, 120-277V TEMPERATURA DE COLOR 2.700-3.000K(WW), 4.000-4.100K(NW), 5.000-5.700K(CW), 6.000-6.500K(DL)	LED PANEL SQ IVY
6	LED PANEL RC IVY POTENCIAS 24W, 30W, 31W, 32W, 33W, 34W, 35W, 36W, 37W, 38W, 39W, 40W, 41W, 42W, 43W, 44W, 45W, 46W, 47W, 48W, 49W, 50W, 55W, 60W TENSIONES 85-265V, 100-240V, 110-240V, 100-277V, 120-277V TEMPERATURA DE COLOR 2.700-3.000K(WW), 4.000-4.100K(NW), 5.000-5.700K(CW), 6.000-6.500K(DL)	LED PANEL RC IVY

FIN DEL ANEXO No. 1

**Los seguimientos deberán iniciarse mínimo con tres meses de anticipación a la fecha indicada

Carrera 15 No. 93A - 62 - Oficina 501 Tel. +57 1 744 65 44 - Bogotá, D.C. Colombia
www.lenor.com.co

No. de Certificado
1769

QCERT
ORGANISMO DE CERTIFICACIÓN

ACREDITADO ONAC
ORGANISMO NACIONAL DE ACREDITACIÓN DE COLOMBIA

ISO/IEC 17065:2012
11-CPR-003

CILES S.A.S.
NIT. 800.212.240-3

CERTIFICACIÓN TIPO MARCA DE CONFORMIDAD (ESQUEMA 5)

El organismo de certificación **QCERT** otorga el presente certificado de conformidad de producto, de acuerdo con la siguiente información:

Producto: Tableros de baja tensión

Referencia: Ver referencias particulares en anexo técnico del certificado.

Documento normativo: Numeral 20.23.1 del Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas – RETIE. Resolución 90708 de 30 de agosto de 2013 y 90795 de 25 de julio de 2014 del Ministerio de Minas y energía.

La certificación otorgada está sujeta a los resultados de las evaluaciones de seguimiento anuales tal como se establece en el Reglamento RG-01.

Anexo a éste certificado se entrega un documento que contiene 2 hojas donde se describen las especificaciones técnicas de los productos certificados. Este certificado solo puede ser reproducido en su totalidad y la validez del mismo se puede consultar en www.qcert.com.co

Director de Certificación

Fecha Otorgamiento: 2016-11-30
Fecha 1ª Renovación: 2020-01-07
Fecha Vencimiento: 2023-01-06

Este documento es exclusivo del titular.

Dirección: km 17 Vía Las Palmas Parque Tecnológico Manantiales. Edificio Qubox. Envigado - Colombia Correo: qcert@qcert.com.co Tel.: + (574) 444 80 87

La Calidad es nuestro sello.
qcert.com.co

ANEXO DE CERTIFICADO NÚMERO 1769

FECHA DE OTORGAMIENTO: 2016-11-30
FECHA DE 1ª RENOVACIÓN: 2020- 01-07
FECHA DE VENCIMIENTO: 2023-01-06

CILES S.A.S.
CALLE 17 N° 43F – 165, Medellín - Colombia
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Aspecto	Descripción
Producto	**TABLEROS DE BAJA TENSIÓN**
Reglamento	Numeral 20.23.1 del Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas - RETIE. Resolución 90708 del 30 de agosto de 2013 y 90795 de 25 de julio de 2014 del Ministerio de Minas y Energía.
Marca	CILES
Familia	Tableros De distribución monofásicos, bifásicos y trifásicos hasta 24 circuitos
Referencias	Ver listado de referencias específicos
Tensiones	120/208V – 127V/220V – 120/240V – 230/400V- 240/415V
Tipo de montaje	Mediante conexión tipo peine en cobre
Capacidad de corriente	75 A
Material de borneras	Latón estañado para neutro y tierra
Material del tablero	Totalmente en material polimérico ABS y tapa transparente en policarbonato
Exclusiones (*)	Ninguna
Usos	Protección de acometidas eléctricas

LISTADO DE REFERENCIAS ESPECIFICOS

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
3SD5-4	Tableros 4 circuitos para Breaker de riel
3SD5-6	Tableros 6 circuitos para Breaker de riel
3SD5-8	Tableros 8 circuitos para Breaker de riel
3SD5-12	Tableros 12 circuitos para Breaker de riel
3SD5-18	Tableros 18 circuitos para Breaker de riel
3SD5-24	Tablero para breaker de riel 24C 75A.

Director de certificación

ISO/IEC 17065:2012
09-CPR-004

CERTIFICADO DE CONFORMIDAD DE PRODUCTO

PRODUCT CONFORMITY CERTIFICATE

Modelo de Certificación
Certification Modality
Marca con Reglamentos Técnicos Colombianos
Sistema 5

No. 04991

La Corporación Centro de Innovación y Desarrollo Tecnológico Del Sector Eléctrico - CIDET certifica que el producto:
CIDET certifies that the product:

DENOMINACIÓN	TIPO	REFERENCIA
TOMACORRIENTES MARCA ENERLUX LÍNEA LOFT	SENCILLO, DOBLE	BV103, BV1203, BV1203W, BV2203 SILVER, BV1206, BV1206W, BV2206 SILVER

CÓDIGO IAF:	19	CÓDIGO NACE:	27.33	CÓDIGO ICS:	29.120.30

Las características e identificación de este producto se describen en el documento anexo, que hace parte integral del presente CERTIFICADO. Este documento contiene 2 páginas.
The characteristics and identification of this product is described in the attached document, which is an integral part of this CERTIFICATE.

Fabricado por:
Manufactured by:

Comercializado por **GRUPO CRE ARIAS S EN C**

TC OCC km 19 vía Bogotá - Mosquera MZ P 8 BG 87 PI San Jorge, Mosquera, Cundinamarca, Colombia

Satisface los requerimientos de
Satisfies the requirements of

RESOLUCIÓN 90708 de 2013 del MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA - RETIE (Numeral 20.10)

Fecha de Certificación: 2013 / 07 / 15
Fecha de Renovación: 2021 / 05 / 23
Fecha de Vencimiento: 2024 / 05 / 23

Fecha máxima para la finalización de las próximas auditorías de seguimiento: 2022 / 05 / 23 y 2023 / 05 / 23

Diego Alejandro Valencia
Director CIDET Certificación
CIDET Certification Manager

Firmado digitalmente por DIEGO ALEJANDRO VALENCIA CALLEJAS
Fecha: 2021.05.24 11:30:18 -05'00'

ISO/IEC 17065:2012
09-CPR-004

CERTIFICADO DE CONFORMIDAD DE PRODUCTO No. 04991

FECHA DE CERTIFICACIÓN: 2013 / 07 / 15
FECHA DE RENOVACIÓN: 2021 / 05 / 23
FECHA DE VENCIMIENTO: 2024 / 05 / 23

ANEXO DE CARACTERÍSTICAS E IDENTIFICACIÓN DE TOMACORRIENTES MARCA ENERLUX LÍNEA LOFT

Tipo	Sencillo	Doble
Referencia	BV103	BV1203, BV1203W, BV2203 SILVER, BV1206, BV1206W, BV2206 SILVER
Corriente nominal	15 A	
Tensión nominal	120-250 V	
Numero de hilos / Configuración	3H / 2P + T	
Grado de protección	IP 2X	
Color	Blanco negro, blanco y Silver	
Aplicación	Para uso residencial y comercial	
Referencial	RESOLUCIÓN 90708 de 2013 del MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA – RETIE (Numeral 20.10)	

Atentamente,

Diego Alejandro Valencia
Director CIDET Certificación
CIDET Certification Manager
VSUAREZ

CORPORACIÓN CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO DEL SECTOR ELÉCTRICO

CERTIFICADO DE CONFORMIDAD DE PRODUCTO

PRODUCT CONFORMITY CERTIFICATE

Modelo de Certificación
Certification Modality

Marca de conformidad
Esquema 5

No. 04994

La Corporación Centro de Investigación y Desarrollo Tecnológico del Sector Eléctrico - CIDET certifica que el producto:

CIDET certifies that the product:

DENOMINACIÓN	TIPO	REFERENCIA
TOMACORRIENTES MARCA ENERLUX	GFCI, CLASE A	DG20TR-L-W, DG20TR-L-I

Las características e identificación de este producto se describen en el documento anexo, que hace parte integral del presente CERTIFICADO y contiene una página.

The characteristics and identification of this product are described in the attached document, which is an integral part of this CERTIFICATE

Fabricado por:
Manufactured by:

comercializado por **GRUPO CRE ARIAS S EN C.**

Carrera 12 15 81, Piso 6 Bogotá, Colombia

Satisface los requerimientos de
Satisfies the requirements of

RESOLUCIÓN 90708 de 2013 del MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA - RETIE (Numeral 20.10)

Fecha de Certificación: 15 / 07 / 2013
Última Actualización: 23 / 05 / 2018
Fecha de Vencimiento: 22 / 05 / 2021

Fecha máxima para la finalización de las próximas auditorías de seguimiento: 22 / 05 / 2019 y 22 / 05 / 2020

Juan Pablo Rojas Duque
Gerente CIDET Certificación
Certification CIDET Manager

CIDET realiza la verificación y el seguimiento a las características del producto que dieron origen a ésta certificación. Las novedades y vigencia de este certificado, pueden ser consultadas en la página www.cidet.org.co

CIDET makes the verification and follow up the characteristics of the product that gave rise to this certification. On page www.cidet.org.co, you can find news and validity of this certificate.

ACREDITADO ONAC
ORGANISMO NACIONAL DE ACREDITACIÓN DE COLOMBIA
ISO/IEC 17065:2012
09-CPR-004

Medellín: Carrera 46 No. 56-11 (Av. Oriental), Piso 13 **Tel:** (+574) 444 12 11 **Fax:** (+574) 444 0460

ISO/IEC 17065:2012
09-CPR-004

CERTIFICADO DE CONFORMIDAD DE PRODUCTO Nro. 04994

FECHA DE CERTIFICACIÓN: 15 / 07 / 2013
ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN: 23 / 05 / 2018
FECHA DE VENCIMIENTO: 22 / 05 / 2021

ANEXO DE CARACTERÍSTICAS E IDENTIFICACIÓN DE TOMACORRIENTES MARCA ENERLUX

COMERCIALIZADOS POR GRUPO CRE ARIAS S EN C UBICADA EN LA CARRERA 12 15 - 81, PISO 6 BOGOTÁ, COLOMBIA

Tipo	GFCI, clase A
Referencia	DG20TR-L-W, DG20TR-L-I
Corriente nominal	20 A
Tensión nominal	125 Vac
Numero de hilos / configuración	3H / 2P + T
Grado de protección	IP 2X
Color	Blanco y beige
Protección de falla a tierra	Con sistema de monitoreo visual
Aplicación	Para uso residencial y comercial
Referencial	RESOLUCIÓN 90708 de 2013 del MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA - RETIE (Numeral 20.10)

Atentamente,

Juan Pablo Rojas Duque
Gerente CIDET Certificación

jsorio

CORPORACIÓN CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO DEL SECTOR ELÉCTRICO

CERTIFICADO DE CONFORMIDAD DE PRODUCTO

PRODUCT CONFORMITY CERTIFICATE

Esquema de Certificación
Certification Scheme

No. 01643

Marca de Conformidad
Esquema 5

La Corporación Centro de Investigación y Desarrollo Tecnológico del Sector Eléctrico – CIDET certifica que el producto:

CIDET certifies that the product:

DENOMINACIÓN	TIPO	REFERENCIA
TUBOS CONDUIT METÁLICOS	EMT	DIÁMETRO 1/2", 3/4", 1", 1 1/4", 1 1/2" Y 2"

Las características e identificación de este producto se describen en el documento anexo, que hace parte integral del presente CERTIFICADO y contiene una página.

The characteristics and identification of this product are described in the attached document, which is an integral part of this CERTIFICATE

Fabricado por:
Manufactured by:

TENARIS TUBOCARIBE LTDA

Parque Industrial Carlos Vélez Pombo, km 1 Vía Turbaco, Turbaco, Bolívar, Colombia

Satisface los requerimientos de
Satisfies the requirements of

RESOLUCIÓN 90708 de 2013 del MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA – RETIE (Numeral 20.6)

Fecha de Certificación: 19 / 03 / 2005
Última Actualización: 28 / 11 / 2016
Fecha de Vencimiento: 27 / 11 / 2019

Fecha máxima para las proximas auditorías de seguimiento : 28 / 10 / 2017 y 28 / 10 / 2018

Carlos Ariel Naranjo Valencia
Director Ejecutivo
Executive director

CIDET realiza la verificación y el seguimiento a las características del producto que dieron origen a ésta certificación. Las novedades y vigencia de este certificado, pueden ser consultadas en la página www.cidet.org.co

CIDET makes the verification and follow up the characteristics of the product that gave rise to this certification. On page www.cidet.org.co, you can find news and validity of this certificate.

ACREDITADO ONAC
ORGANISMO NACIONAL DE ACREDITACIÓN DE COLOMBIA
ISO/IEC 17065:2012
09-CPR-004

Medellín: Carrera 46 No. 56-11 (Av. Oriental), Piso 13 **Tel:** (+574) 444 12 11 **Fax:** (+574) 444 0460

CORPORACIÓN CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y
DESARROLLO TECNOLÓGICO DEL SECTOR ELÉCTRICO

CERTIFICADO DE CONFORMIDAD DE PRODUCTO

PRODUCT CONFORMITY CERTIFICATE

Esquema de Certificación
Certification Scheme

No. 01318

Marca de Conformidad
Esquema 5

La Corporación Centro de Investigación y Desarrollo Tecnológico del Sector Eléctrico – CIDET certifica que el producto:

CIDET certifies that the product:

DENOMINACIÓN	TIPO	REFERENCIA
TUBOS CONDUIT METÁLICOS	EMT	DIÁMETRO 1/2", 3/4", 1", 1 1/4", 1 1/2" Y 2"

Las características e identificación de este producto se describen en el documento anexo, que hace parte integral del presente CERTIFICADO y contiene una página.

The characteristics and identification of this product are described in the attached document, which is an integral part of this CERTIFICATE

Fabricado por:
Manufactured by:

TENARIS TUBOCARIBE LTDA

Parque Industrial Carlos Vélez Pombo, km 1 Via Turbaco, Turbaco, Bolívar, Colombia.

Satisface los requerimientos de
Satisfies the requirements of

NTC 105 / 2008

Fecha de Certificación: 19 / 09 / 2003
Última Actualización: 28 / 11 / 2016
Fecha de Vencimiento: 27 / 11 / 2019

Fecha máxima para las proximas auditorías de seguimiento : 28 / 10 / 2017 y 28 / 10 / 2018

Carlos Ariel Naranjo Valencia
Director Ejecutivo
Executive director

CIDET realiza la verificación y el seguimiento a las características del producto que dieron origen a ésta certificación.
Las novedades y vigencia de este certificado, pueden ser consultadas en la página www.cidet.org.co

CIDET makes the verification and follow up the characteristics of the product that gave rise to this certification.
On page www.cidet.org.co, you can find news and validity of this certificate.

ACREDITADO ONAC
ORGANISMO NACIONAL DE ACREDITACIÓN DE COLOMBIA
ISO/IEC 17065:2012
09-CPR-004

Medellín: Carrera 46 No. 56-11 (Av. Oriental), Piso 13 **Tel:** (+574) 444 12 11 **Fax:** (+574) 444 0460

CERTIFICADO DE CONFORMIDAD DE PRODUCTO

PRODUCT CONFORMITY CERTIFICATE

Modelo de Certificación
Certification Modality
Marca de Conformidad
Esquema 5

No. 00210

La Corporación Centro de Innovación y Desarrollo Tecnológico Del Sector Eléctrico - CIDET certifica que el producto:
CIDET certifies that the product:

DENOMINACIÓN	TIPO	REFERENCIA
TUBOS CONDUIT METÁLICOS	EMT	DIÁMETRO 2 ½", 3", 3 1/2" Y 4" INCLUYE CURVAS

CÓDIGO IAF:	17	CÓDIGO NACE:	24.20	CÓDIGO ICS:	29.120.10

Las características e identificación de este producto se describen en el documento anexo, que hace parte integral del presente CERTIFICADO. Este documento contiene 2 páginas.
The characteristics and identification of this product is described in the attached document, which is an integral part of this CERTIFICATE

Fabricado por
Manufactured by:

CONSORCIO METALÚRGICO NACIONAL S.A.S – COLMENA S.A.S.

Calle 45A Sur # 60 – 57, Bogotá, Colombia

Satisface los requerimientos de
Satisfies the requirements of

NTC 105/2018

Fecha de Certificación: 1999 / 11 / 25
Fecha de Renovación: 2021 / 02 / 09
Fecha de Vencimiento: 2024 / 02 / 09

Fecha máxima para la finalización de las próximas auditorías de seguimiento: 2022 / 02 / 09 y 2023 / 02 / 09

Diego Alejandro Valencia
Director CIDET Certificación
CIDET Certification Manager

CERTIFICADO DE CONFORMIDAD DE PRODUCTO No. 00210

FECHA DE CERTIFICACIÓN: 1999 / 11 / 25
FECHA DE RENOVACIÓN: 2021 / 02 / 09
FECHA DE VENCIMIENTO: 2024 / 02 / 09

ANEXO DE CARACTERÍSTICAS E IDENTIFICACIÓN DE TUBOS CONDUIT METÁLICOS

Tipo	EMT
Referencia	Diámetro 2 ½", 3", 3 1/2" y 4" - Incluye curvas
Norma aplicable	NTC 105/2008
Características constructivas	Tubos galvanizados en zinc por inmersión en caliente, de extremos lisos, de longitud 3.05
Material	Lámina de acero calidad SAE 1008 - 1010 Zinc: ASTM B6
Uso	Industrial y doméstico Como conductor de alambres o cables de un sistema eléctrico
Referencial	NTC 105/2018

Atentamente,

Diego Alejandro Valencia
Director CIDET Certificación
CIDET Certification Manager
AVIVAS

No. de Certificado

1460

QCERT

ORGANISMO DE CERTIFICACIÓN

CILES SAS

NIT: 800.212.240-3

Certificación tipo marca de conformidad (Esquema 5)

El organismo de certificación QCERT otorga el presente certificado de conformidad de producto, de acuerdo con la siguiente información:

Producto:	Interruptores automáticos de baja tensión
Referencia:	Ver listado de referencias específicas en anexo.
Referente reglamentario:	Numeral 20.16.2 del Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas - RETIE. Resolución 90708 de 30 de agosto de 2013 del Ministerio de Minas y Energía.

La certificación otorgada está sujeta a los resultados de las evaluaciones de seguimiento anuales tal como se establece en el Reglamento RG-01.

Anexo a este certificado se entrega un documento que contiene 3 hojas donde se describen las especificaciones técnicas de los productos certificados. Este certificado solo puede ser reproducido en su totalidad y la validez del mismo se puede consultar en www.qcert.com.co. Este Certificado es para uso exclusivo del titular.

Fecha de otorgamiento	2011-11-22	Fechas límite de finalización de auditorías de seguimiento	
Fecha de renovación	2019-05-13	Seguimiento 1	2020-05-13
Fecha de vencimiento	2022-05-12	Seguimiento 2	2021-05-13
Fecha de última modificación	2021-09-15		

ISARIN PINZON GUEVARA

Firmado digitalmente por ISARIN PINZON GUEVARA
Fecha: 2021.09.15 16:35:41 -05'00'

Gerente

La Calidad es nuestro sello.
qcert.com.co

Dirección: Cra 17 via Las Palmas, Parque Tecnológico Maryland, Edificio QUBO, Envigado, Antioquia, Colombia. E-Mail: servicioalcliente@qcert.com.co Teléfonos: (57-4) 444 8647 - (57) 750 80 20

ANEXO CERTIFICADO

No de certificado 1460 **Fecha última modificación** 2021-09-15
Dirección Calle 17 Nº 43 F - 165, Medellín

Aspecto	Descripción
Producto	Interruptores automáticos de baja tensión
Referente reglamentario	Numeral 20.16.2 del Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas - RETIE. Resolución 90708 de 30 de agosto de 2013 del Ministerio de Minas y Energías.
Marca	CILES
Familias	ETM-L
	ETM2-M
Tensión nominal	120 / 240 / 415 V
Capacidad de corriente	16 - 20 - 32 - 40 - 50 - 63 A
Frecuencia	50 / 60 Hz
No. polos	1, 2 y 3
Capacidad de cortocircuito	4 - 5 - 6 - 10 kA
Clase de disparo	C
Límite de temperatura	-5 a 40 °C
Grado de protección IP	IP20
Clase de limitación de energía	3
Tipo de montaje	Enchufable
Indicador de estado de operación	Si
Exclusiones (*)	Ninguna
Usos	Dispositivo de protección de circuitos eléctricos en baja tensión

ANEXO CERTIFICADO

No de certificado 1460 **Fecha última modificación** 2021-09-15
Dirección Calle 17 Nº 43 F - 165, Medellín

REFERENCIAS PARTICULARES

Ítem	Referencia	Código Proveedor	Descripción
1	PT349306	ETM2-L	BREAKER ENCHUFABLE 1P 16A-6KA - ETM2-L
2	PT349307	ETM2-L	BREAKER ENCHUFABLE 1P 20A-6KA - ETM2-L
3	PT349308	ETM2-L	BREAKER ENCHUFABLE 1P 32A-6KA - ETM2-L
4	PT349309	ETM2-L	BREAKER ENCHUFABLE 1P 40A-6KA - ETM2-L
5	PT349310	ETM2-L	BREAKER ENCHUFABLE 1P 50A-6KA - ETM2-L
6	PT349311	ETM2-L	BREAKER ENCHUFABLE 1P 63A-6KA - ETM2-L
7	PT349312	ETM2-L	BREAKER ENCHUFABLE 2P 16A-6KA - ETM2-L
8	PT349313	ETM2-L	BREAKER ENCHUFABLE 2P 20A-6KA - ETM2-L
9	PT349314	ETM2-L	BREAKER ENCHUFABLE 2P 32A-6KA - ETM2-L
10	PT349315	ETM2-L	BREAKER ENCHUFABLE 2P 40A-6KA - ETM2-L
11	PT349316	ETM2-L	BREAKER ENCHUFABLE 2P 50A-6KA - ETM2-L
12	PT349317	ETM2-L	BREAKER ENCHUFABLE 2P 63A-6KA - ETM2-L
13	PT349320	ETM2-M	BREAKER ENCHUFABLE 1P 16A-10KA - ETM2-M
14	PT349321	ETM2-M	BREAKER ENCHUFABLE 1P 20A-10KA - ETM2-M
15	PT349322	ETM2-M	BREAKER ENCHUFABLE 1P 32A-10KA - ETM2-M
16	PT349323	ETM2-M	BREAKER ENCHUFABLE 1P 40A-10KA - ETM2-M
17	PT349324	ETM2-M	BREAKER ENCHUFABLE 1P 50A-10KA - ETM2-M
18	PT349325	ETM2-M	BREAKER ENCHUFABLE 1P 63A-10KA - ETM2-M
19	PT349326	ETM2-M	BREAKER ENCHUFABLE 2P 16A-10KA - ETM2-M
20	PT349327	ETM2-M	BREAKER ENCHUFABLE 2P 20A-10KA - ETM2-M
21	PT349328	ETM2-M	BREAKER ENCHUFABLE 2P 32A-10KA - ETM2-M
22	PT349329	ETM2-M	BREAKER ENCHUFABLE 2P 40A-10KA - ETM2-M
23	PT349330	ETM2-M	BREAKER ENCHUFABLE 2P 50A-10KA - ETM2-M
24	PT349331	ETM2-M	BREAKER ENCHUFABLE 2P 63A-10KA - ETM2-M
25	PT349333	ETM2-M	BREAKER ENCHUFABLE 3P 20A-10KA - ETM2-M
26	PT349334	ETM2-M	BREAKER ENCHUFABLE 3P 32A-10KA - ETM2-M
27	PT349335	ETM2-M	BREAKER ENCHUFABLE 3P 40A-10KA - ETM2-M
28	PT349336	ETM2-M	BREAKER ENCHUFABLE 3P 50A-10KA - ETM2-M
29	PT349337	ETM2-M	BREAKER ENCHUFABLE 3P 63A-10KA - ETM2-M

ISARIN PINZON GUEVARA
Firmado digitalmente por ISARIN PINZON GUEVARA
Fecha: 2021.09.15 16:36:04 -05'00'
Gerente

ISO/IEC 17065:2012
09-CPR-004

CERTIFICADO DE CONFORMIDAD DE PRODUCTO

PRODUCT CONFORMITY CERTIFICATE

Modelo de Certificación
Certification Modality
Marca con Reglamentos Técnicos Colombianos
Sistema 5

No. 05915

La Corporación Centro de Innovación y Desarrollo Tecnológico
Del Sector Eléctrico - CIDET certifica que el producto:
CIDET certifies that the product:

DENOMINACIÓN	TIPO	REFERENCIA
CONDUCTORES ELÉCTRICOS	CABLES SINTOX O SINTOXFLEX	VER ANEXO

Las características e identificación de este producto se describen en el documento anexo, que hace parte integral del presente CERTIFICADO. Este documento contiene 2 página(s).
The characteristics and identification of this product is described in the attached document, which is an integral part of this CERTIFICATE

Comercializado por
Commercialized by:

CABLES DE ENERGÍA Y DE TELECOMUNICACIONES S.A.

Calle 10 No. 38 - 43, Urbanización Industrial Acopi, Yumbo, Valle del Cauca, Colombia

Satisface los requerimientos de
Satisfies the requirements of

NTC 6182/2016 y la RESOLUCIÓN 90708 de 2013 del MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA - RETIE (Numeral 20.2)

Fecha de Certificación: 2015/04/16
Fecha de Actualización: 2022/10/06
Fecha de Vencimiento: 2024/04/16

Fecha máxima para la finalización de la próxima auditoría de seguimiento: 2023/04/16

Diego Alejandro Valencia
Director CIDET Certificación
CIDET Certification Manager

CIDET realiza la verificación y el seguimiento a las características del sistema que dieron origen a esta certificación.
Las novedades y vigencia de este certificado pueden ser consultadas en la página www.cidet.org.co/consulta-certificados
Este certificado solo debe reproducirse en su totalidad.

CIDET makes the verification and following up of the system characteristics that gave origin to this certification.
The news and validity of this certificate can be consulted on the www.cidet.org.co/consulta-certificados webpage.
This certificate only can be reproduced in its entirety.

CERTIFICADO DE CONFORMIDAD DE PRODUCTO No. 05915

FECHA DE CERTIFICACIÓN: 2015/04/16
FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 2022/10/06
FECHA DE VENCIMIENTO: 2024/04/16

ANEXO DE CARACTERÍSTICAS E IDENTIFICACIÓN DE CONDUCTORES ELÉCTRICOS

Tipo	Cables SINTOX o SINTOXFLEX
Referencia	Monoconductores: Calibres desde 14 AWG hasta 1000 kcmil (2.5 mm^2 a 500 mm^2) Multiconductores: Calibres desde 14 AWG hasta 1000 kcmil (2.5 mm^2 a 500 mm^2)
Marca	CENTELSA y CENTELSA by NEXANS
Tensión Nominal	600 V
Conductor	Cobre suave o Aluminio serie 8000
Cableado	Concéntrico, clase B, J o K
Aislamiento	Poliolefina termoplástica LHFR-LS
Temperatura De Operación	75°C o 90°C
Cubierta	PE o XLPE
Autorización	Apto para utilizar en bandejas portacables (CT)
Aplicación	Cables de construcción para instalaciones en edificaciones, interior de locales y tableros de control, ideales para lugares con alta concentración de personas y poca ventilación. Apto para uso en instalaciones hospitalarias.
Referencial	NTC 6182/2016 y la RESOLUCIÓN 90708 de 2013 del MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA - RETIE (Numeral 20.2)

Fábrica	Planta
CABLES DE ENERGÍA Y DE TELECOMUNICACIONES S.A.S	Yumbo, Colombia

Atentamente,

Diego Alejandro Valencia
Director CIDET Certificación
CIDET Certification Manager

CIDET realiza la verificación y el seguimiento a las características del sistema que dieron origen a esta certificación.
Las novedades y vigencia de este certificado pueden ser consultadas en la página www.cidet.org.co/consulta-certificados
Este certificado solo debe reproducirse en su totalidad.

CIDET makes the verification and following up of the system characteristics that gave origin to this certification.
The news and validity of this certificate can be consulted on the www.cidet.org.co/consulta-certificados webpage.
This certificate only can be reproduced in its entirety.

Medellín: Carrera 46 No.56-11 (Av. Oriental), piso 13. Tel: (+574) 444 1211 Fax: (+574) 444 0460

No. de Certificado

1744

ISO/IEC 17065:2012
11-CPR-003

CILES SAS

NIT 800.212.240-3

Certificación tipo marca de conformidad (Esquema 5)

El organismo de certificación QCERT otorga el presente certificado de conformidad de producto, de acuerdo con la siguiente información:

Producto:	Cajas para uso eléctrico
Referencia:	Ver listado de referencias especificas en anexo.
Referente reglamentario:	Numeral 20.5 del Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas - RETIE. Resolución 90708 de 30 de agosto de 2013 del Ministerio de Minas y Energías.

La certificación otorgada está sujeta a los resultados de las evaluaciones de seguimiento anuales tal como se establece en el Reglamento RG-01.

Anexo a este certificado se entrega un documento que contiene 2 hojas donde se describen las especificaciones técnicas de los productos certificados. Este certificado solo puede ser reproducido en su totalidad y la validez del mismo se puede consultar en www.qcert.com.co. Este Certificado es para uso exclusivo del titular.

Fecha de otorgamiento	2016-11-22	Fechas límite de finalización de auditorías de seguimiento	
Fecha de renovación	2020-02-26	Seguimiento 1	2021-02-26
Fecha de vencimiento	2023-02-25	Seguimiento 2	2022-02-26
Fecha de última modificación	2021-11-23		

Gerente

La Calidad es nuestro sello.
qcert.com.co

Dirección: km 17 vía Las Palmas, Parque Tecnológico Manantiales, Edificio QUBOX, Envigado, Antioquia, Colombia. **E-Mail:** servicioalcliente@qcert.com.co **Teléfonos:** (57 604) 444 80 87 - 301 790 90 20

ANEXO CERTIFICADO

No de certificado	1744	**Fecha última modificación**	2021-11-23
Dirección	Calle 17 Nº 43 F - 165, Medellín		

Aspecto	Descripción
Producto	Cajas para uso eléctrico
Referente reglamentario	Numeral 20.5 del Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas - RETIE. Resolución 90708 de 30 de agosto de 2013 del Ministerio de Minas y Energías.
Fabricante	CILES S.A.S.
Planta de Fabricación	Calle 17 Nº 43 F - 165, Medellín
Familias	Cajas de paso, cajas herméticas y cajas para canaletas
Referencias	Ver listado de referencias particulares
Exclusiones (*)	Ninguna
Usos	Comercial y residencial (protección de empalmes y conexiones eléctricas)

ANEXO CERTIFICADO

No de certificado 1744 **Fecha última modificación** 2021-11-23
Dirección Calle 17 Nº 43 F - 165, Medellín

REFERENCIAS PARTICULARES

Ítem	Referencia	Familia	Descripción	Material	IP
1	144014	Cajas de paso	Rectangular 2x4	Plásticas en PVC	IP20
2	144015	Calle 17 Nº 43 F - 165, Medellín	Cuadrada 4x4		
3	144016	Cajas de paso	Octogonal		
4	144017	Cajas de paso	Caja rectangular 2x4 con tapa		
5	130011	Caja de paso	Caja 2x4 reforzada sin tapa		
6	130012	Cajas de paso	Rectangular 2x4 reforzada con tapa		
7	130018	Cajas de paso	Cuadrada 4x4 reforzada sin tapa		
8	130019	Cajas de paso	caja 4x4 reforzada + tapa		
9	130021	Cajas de paso	Caja Octogonal reforzada sin tapa		
10	130022	Cajas de paso	Caja octogonal reforzada + tapa		
11	730311	Cajas de paso	Caja de protección riel 1 y 2 circuitos	ABS	IP20
12	730318	Cajas de paso	Caja de protección riel 3 y 4 circuitos		
13	630000	Caja hermetica	Caja hermética 10 x 10	ABS	IP65
14	630002	Caja hermetica	Caja hermética 14 x 18 cms		
15	630003	Caja hermetica	Caja hermética 17 x 22 cms		
16	630001	Caja para canaleta	Caja 2x4 para canaleta	ABS	IP20

Gerente

ISO/IEC 17065:2012
10-CPR-009

SGS COLOMBIA S.A.S.
CRS-F490101
NÚMERO DE ORDEN: 4200-30385
CERTIFICADO No. CRS13823
CERTIFICADO DE CONFORMIDAD DE PRODUCTO
ELÉCTRICOS DEL RUIZ S.A.S.
Calle 37 # 46 - 145
Barranquilla, Colombia

Certifica que el producto identificado como CAJA METALICA, importado y/o fabricado por HEFEI ELECMAN ELECTRICAL LTD y comercializado en Colombia por ELÉCTRICOS DEL RUIZ S.A.S., con referencias relacionadas en la siguiente página del presente documento, han sido evaluados de conformidad con:

RESOLUCIÓN 90708 DEL 30 DE AGOSTO DE 2013 (RETIE) Y ACTUALIZACIONES EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA

ARTÍCULO 20.5 CAJAS Y CONDULETAS (ENCERRAMIENTOS)

Estos productos han sido sometidos a toma de muestras, inspección, ejecución de pruebas de laboratorio y evaluación del sistema de gestión de calidad del fabricante de acuerdo con el esquema de certificación 5 de la norma ISO/IEC 17067:2013.

Resultados obtenidos: CONFORME

Autorizado por:

SGS COLOMBIA S.A.S.

Camilo Ramírez
SGS Colombia S.A.S.
Carrera 100 No. 25C-11, Bodega 3
Bogotá, Colombia

Fecha de Emisión: 2019 – Mayo – 17
Válido Hasta: 2022 – Mayo – 16
Versión 1

Any complaint, appeal or enquiry about the validity of this certificate/report may be sent to co.servicioalcliente@sgs.com, via phone No. 7422274 ext. 13602 and its validity can be checked at https://www.sgs.com/en/certified-clients-and-products

This document is issued, on the Client's behalf, by the Company under its General Conditions of Service printed overleaf. The Client's attention is drawn to the limitation of liability, indemnification and jurisdiction issues defined therein.

Any other holder of this document is advised that information contained hereon reflects the Company's findings at the time of its intervention only and within the limits of Client's instructions, if any. The Company's sole responsibility is to its Client and this document does not exonerate parties to a transaction from exercising all their rights and obligations under the transaction documents.

SGSPAPER
19619525

SGS COLOMBIA S.A.S.
CRS-F490101
NÚMERO DE ORDEN: 4200-30385
CERTIFICADO No. CRS13823
CERTIFICADO DE CONFORMIDAD DE PRODUCTO
ELÉCTRICOS DEL RUIZ S.A.S.
Calle 37 # 46 - 145
Barranquilla, Colombia

REFERENCIAS Y CANTIDAD

CAJA METÁLICA MARCA KARLUZ
FABRICADAS POR HEFEI ELECMAN ELECTRICAL LTD
No.1105, Blue Ocean International Building, Government District

MARCA	REFERENCIA	MATERIAL	DIMENSIONES (")	CALIBRE LAMINA	VOLUMEN (cm3)
KARLUZ	KL-1141	ALUMINIO	2X4	13	300
KARLUZ	KL-1142	ALUMINIO	2X4	13	300
KARLUZ	KL-1143	ALUMINIO	4X4	13	500
KARLUZ	KL-1144	ALUMINIO	4X4	13	500
KARLUZ	KL-1145	ALUMINIO	OCTOGONAL	13	259
KARLUZ	KL-1146	ALUMINIO	OCTOGONAL	13	259

FIN DEL DOCUMENTO

Fecha de Emisión: 2019 – Mayo – 17
Válido Hasta: 2022 – Mayo – 16
Versión 1

Any complaint, appeal or enquiry about the validity of this certificate/report may be sent to co.servicioalcliente@sgs.com, via phone No. 7422274 ext. 13602 and its validity can be checked at https://www.sgs.com/en/certified-clients-and-products

CRS-C-06-05 V.3 diciembre 2018

This document is issued, on the Client's behalf, by the Company under its General Conditions of Service printed overleaf. The Client's attention is drawn to the limitation of liability, indemnification and jurisdiction issues defined therein.

Any other holder of this document is advised that information contained hereon reflects the Company's findings at the time of its intervention only and within the limits of Clients instructions, if any. The Company's sole responsibility is to its Client and this document does not exonerate parties to a transaction from exercising all their rights and obligations under the transaction documents.

SGSPAPER
19619526

icontec

Sello con Reglamento Técnico

Esquema de certificación 5

Otorga el certificado de conformidad de producto ICONTEC (Esquema de certificación 5 según ISO/IEC 17067) para:
It grants the certificate of conformity product ICONTEC (Certification Scheme 5 according ISO/IEC 17067) for:

CONECTORES DE BAJA TENSIÓN

Comercializado por **3M COLOMBIA S.A.**, en la **Avenida el Dorado No. 75-93, Bogotá; Celta Trade Park- Autopista Medellín Km. 7 Costado Occidental, Funza, Cundinamarca, Colombia**

Trader by **3M COLOMBIA S.A.**, in the **Avenida el Dorado No. 75-93, Bogotá; Celta Trade Park- Autopista Medellín Km. 7 Costado Occidental, Funza, Cundinamarca, Colombia**

Fabricado por **3M COMPANY NEW ULM PLANT**, en la **1700 N. Minnesota Street New Ulm Minnesota 56073, Estados Unidos**

Manufactured by **3M COMPANY NEW ULM PLANT**, in the **1700 N. Minnesota Street New Ulm Minnesota 56073, Estados Unidos**

El derecho del uso del certificado de conformidad de producto se otorga con el referencial:
The right to use the certificate of conformity of product is granted with the Audit Criteria:

Resolución No. 90708 de 2013 del Ministerio de Minas y Energía

Reglamento Técnico de Instalaciones Electricas RETIE 2013 - Cap. 3, Art. 20.12.1
Technical Regulations of Electrical Installations RETIE 2013 - Cap. 3, Art. 20.12.1

SECTOR ICS 29.060.01

Este certificado de conformidad de producto está sujeto a que la empresa y el producto cumplan permanentemente con los requisitos establecidos en el referencial y en el documento "ES-R-PD-01 Reglamento para la certificación de producto con Marca de Conformidad otorgada por ICONTEC", lo cual será verificado por ICONTEC

This certificate of conformity of product is subject to the company's and product's permanent fulfillment of the requirements set forth in the audit criteria and the "ES-R-PD-01 Reglamento para la certificación de producto con Marca de Conformidad otorgada por ICONTEC" document, which will be verified by ICONTEC.

Las referencias autorizadas para ostentar el certificado de conformidad de producto se incluyen en documento anexo que es parte integral del presente certificado

The references authorized to hold the certificate of conformity of product are included in annexed document and it is integral part of this certificate

Certificado CSR-CER712692
Certificate

Fecha de Aprobación: Approval Date:	2019-09-13	**Fecha Última Modificación:** Last Modification Date:	
Fecha de Renovación: Renewal Date:		**Fecha de Vencimiento:** Expiration Date:	2022-09-12

La autenticidad del certificado y su alcance se puede consultar al correo electrónico: cliente@icontec.org

Roberto Enrique Montoya Villa
Director Ejecutivo

ICONTEC es un organismo de Certificación acreditado por:
ICONTEC is a certification body accreditated by:

ACREDITADO ONAC
ORGANISMO NACIONAL DE ACREDITACIÓN DE COLOMBIA
ISO/IEC 17065:2012
09-CPR-002

ANSI ACCREDITED
ID 4007
ISO/IEC 17065
Product Certification Body

Este certificado es propiedad de ICONTEC y debe ser devuelto cuando sea solicitado
ICONTEC carrera 37 nro. 52 - 95, Bogotá D.C., Colombia

3M COLOMBIA S.A.

Resolución No. 90708 de 2013 del Ministerio de Minas y Energía RETIE 2013 - Cap. 3, Art. 20.12.1

Anexo Certificado **CSR-CER712692**
Certificate

Fecha de Aprobación: **2019-09-13** **Fecha Última Modificación:**
Approval Date: *Last Modification Date:*

Fecha de Renovación: **Fecha de Vencimiento:** **2022-09-12**
Renewal Date: *Expiration Date:*

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO CUBIERTO POR EL ALCANCE DEL CERTIFICADO

Marca Comercial	Producto	NORMA APLICABLE CUMPLIMIENTO RETIE	Familia	Referencia	Caracteristicas	Planta de Fabricación
3M	Conectores	UL 486A-486B, UL 486C	Conectores	Scotchlok 30000 Series, Scotchlok 31000 Series, Scotchlok 40000 Series, Scotchlok 31100 Series, Scotchlok 40100 Series, SC Series, Scotchlok 10000 Series, Scotchlok 11000 Series, Scotchlok 20000 Series, CI Series, CI-A Series, CI-T Series, CIR Series, QCI Series, QL2 Series,	Voltaje Max 600VColor :Amarillo, Azul, Beige,Blanco, Café, Negro, Naranja,Rojo, Gris, VerdeCalibre: 22 – 8 AWGPara Conductores de CU	1700 N MinnesotaStreet 56073, NewUlm, Minnesota,USA

3M COLOMBIA S.A.

Resolución No. 90708 de 2013 del Ministerio de Minas y Energía RETIE 2013 - Cap. 3, Art. 20.12.1

Anexo Certificado **CSR-CER712692**
Certificate

Fecha de Aprobación: **2019-09-13** **Fecha Última Modificación:**
Approval Date: *Last Modification Date:*

Fecha de Renovación: **Fecha de Vencimiento:** **2022-09-12**
Renewal Date: *Expiration Date:*

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO CUBIERTO POR EL ALCANCE DEL CERTIFICADO

Marca Comercial	Producto	NORMA APLICABLE CUMPLIMIENTO RETIE	Familia	Referencia	Caracteristicas	Planta de Fabricación
3M	Conectores	UL 486A-486B, UL 486C	Conectores	O/B+, R/Y+, B/G+, T/R+, T/Y+, 412, 312, 512, 512G, H-29, H-30, H-31, H-33, H-35, S-11, S-31, 314, 314U, 316-IR, 557, 560, 560B, 560N, 562, 564, 905, 905N, 558, 567, 804, 901, 951, 952, 953, 972, UAL, UCC, UP3, UR2, UR-25, UY2, UY, UY-25, UPB, 211, UB2A, MGC, DBO/B-6, DBR/Y-6 MH18-#@1@2, MH14-#@1@2, MH10-#@1@2, MNG18-#@1@2, MNG14-#@1@2, MNG10-#@1@2, MN4-#@1@2, MN6-#@1@2, MN8-#@1@2,	Voltaje Max 600VColor :Amarillo, Azul, Beige,Blanco, Café, Negro, Naranja,Rojo, Gris, VerdeCalibre: 22 – 8 AWGPara Conductores de CU	1700 N MinnesotaStreet 56073, NewUlm, Minnesota,USA

3M COLOMBIA S.A.

Resolución No. 90708 de 2013 del Ministerio de Minas y Energía RETIE 2013 - Cap. 3, Art. 20.12.1

Anexo Certificado **CSR-CER712692**
Certificate

Fecha de Aprobación: **2019-09-13** **Fecha Última Modificación:**
Approval Date: *Last Modification Date:*

Fecha de Renovación: **Fecha de Vencimiento:** **2022-09-12**
Renewal Date: *Expiration Date:*

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO CUBIERTO POR EL ALCANCE DEL CERTIFICADO

Marca Comercial	Producto	NORMA APLICABLE CUMPLIMIENTO RETIE	Familia	Referencia	Caracteristicas	Planta de Fabricación
3M	Conectores	UL 486A-486B, UL 486C	Conectores	MN24-#@1@2, MV18-#@1@2, MV14-#@1@2, MV10-#@1@2, MVU18-#@1@2, MVU14-#@1@2, MVU10-#@1@2, M18-#@1@2, M14-#@1@2, M10-#@1@2, M8-#@1@2, M6-#@3@2, M4-#@1@2, MU20-#@3@2, MU18-#@1@2, MU14-#@1@2, MU10-#@1@2, MC-#@1@2, MI18-#@1@2, MI10-#@1@2, MNGI18-#@1@2, MNGI14-#@1@2, MNGI10-#@1@2, MNI18-#@1@2, MNI14-#@1@2, MNI10-#@1@2MVI18-#@1@2, MVI14-#@1@2, MVI10-#@1@2,	Voltaje Max 600VColor :Amarillo, Azul, Beige,Blanco, Café, Negro, Naranja,Rojo, Gris, VerdeCalibre: 22 – 8 AWGPara Conductores de CU	1700 N MinnesotaStreet 56073, NewUlm, Minnesota,USA

3M COLOMBIA S.A.

Resolución No. 90708 de 2013 del Ministerio de Minas y Energía RETIE 2013 - Cap. 3, Art. 20.12.1

Anexo Certificado **CSR-CER712692**
Certificate

Fecha de Aprobación: **2019-09-13** **Fecha Última Modificación:**
Approval Date: *Last Modification Date:*

Fecha de Renovación: **Fecha de Vencimiento:** **2022-09-12**
Renewal Date: *Expiration Date:*

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO CUBIERTO POR EL ALCANCE DEL CERTIFICADO

Marca Comercial	Producto	NORMA APLICABLE CUMPLIMIENTO RETIE	Familia	Referencia	Caracteristicas	Planta de Fabricación
3M	Conectores	UL 486A-486B, UL 486C	Conectores	MNHU18-#@1@2, MNHU14-#@1@2, MNHU10-#@1@2, MNU18-#@1@2, MNU14-#@1@2, MNU10-#@1@2, MVG24-#@1@2, S-11-A, S-31-A, RV18-#Q, RV14-#Q, RV10-#Q, FV14-#Q, FV10-#Q, BFV18-#Q, BFV14-#Q, BFV10-#Q, LFV18-#Q, LFV14-#Q, LFV10-#Q, BSV18Q, BSV14Q, BSV10Q, FDI18-#Q, FDI14-#Q,	Voltaje Max 600VColor :Amarillo, Azul, Beige,Blanco, Café, Negro, Naranja,Rojo, Gris, VerdeCalibre: 22 – 8 AWGPara Conductores de CU	1700 N MinnesotaStreet 56073, NewUlm, Minnesota,USA

3M COLOMBIA S.A.

Resolución No. 90708 de 2013 del Ministerio de Minas y Energía RETIE 2013 - Cap. 3, Art. 20.12.1

Anexo Certificado CSR-CER712692
Certificate


Fecha de Aprobación: 2019-09-13 **Fecha Última Modificación:**
Approval Date: *Last Modification Date:*


Fecha de Renovación: **Fecha de Vencimiento:** 2022-09-12
Renewal Date: *Expiration Date:*


INFORMACIÓN DEL PRODUCTO CUBIERTO POR EL ALCANCE DEL CERTIFICADO

Marca Comercial	Producto	NORMA APLICABLE CUMPLIMIENTO RETIE	Familia	Referencia	Caracteristicas	Planta de Fabricación
3M	Conectores	UL 486A-486B, UL 486C	Conectores	FDH10-#Q, FDV18-#Q, FDV14-#Q, FDV10-#Q, MTI18-#Q, MTI14-#Q, MTI10-#Q, MTV18-#Q, MTV14-#Q, MTV10-#Q; donde # puede ser: 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 38, 516, 610, 110, 110/32, 187, 250, 375, 156, 180, 47, 55; @1 puede ser: F, FB, FBHT, FFB, FHT, FL, R, RHD, RHT, /S, /L, R/Flag, BC, CEC, P, PC, BCM, CEC/ST, DF, DFHT, DFI, DM, DMF, DMHT, DMI, DF/Flag, D, F, FFI, M, MMI, MFM, RR, Fuse; @2 puede ser: X, Q, K	Voltaje Max 600VColor :Amarillo, Azul, Beige,Blanco, Café, Negro, Naranja,Rojo, Gris, VerdeCalibre: 22 - 8 AWGPara Conductores de CU	1700 N MinnesotaStreet 56073, NewUlm, Minnesota,USA


FOLIO 7: Memorias y planos de diseño aprobados

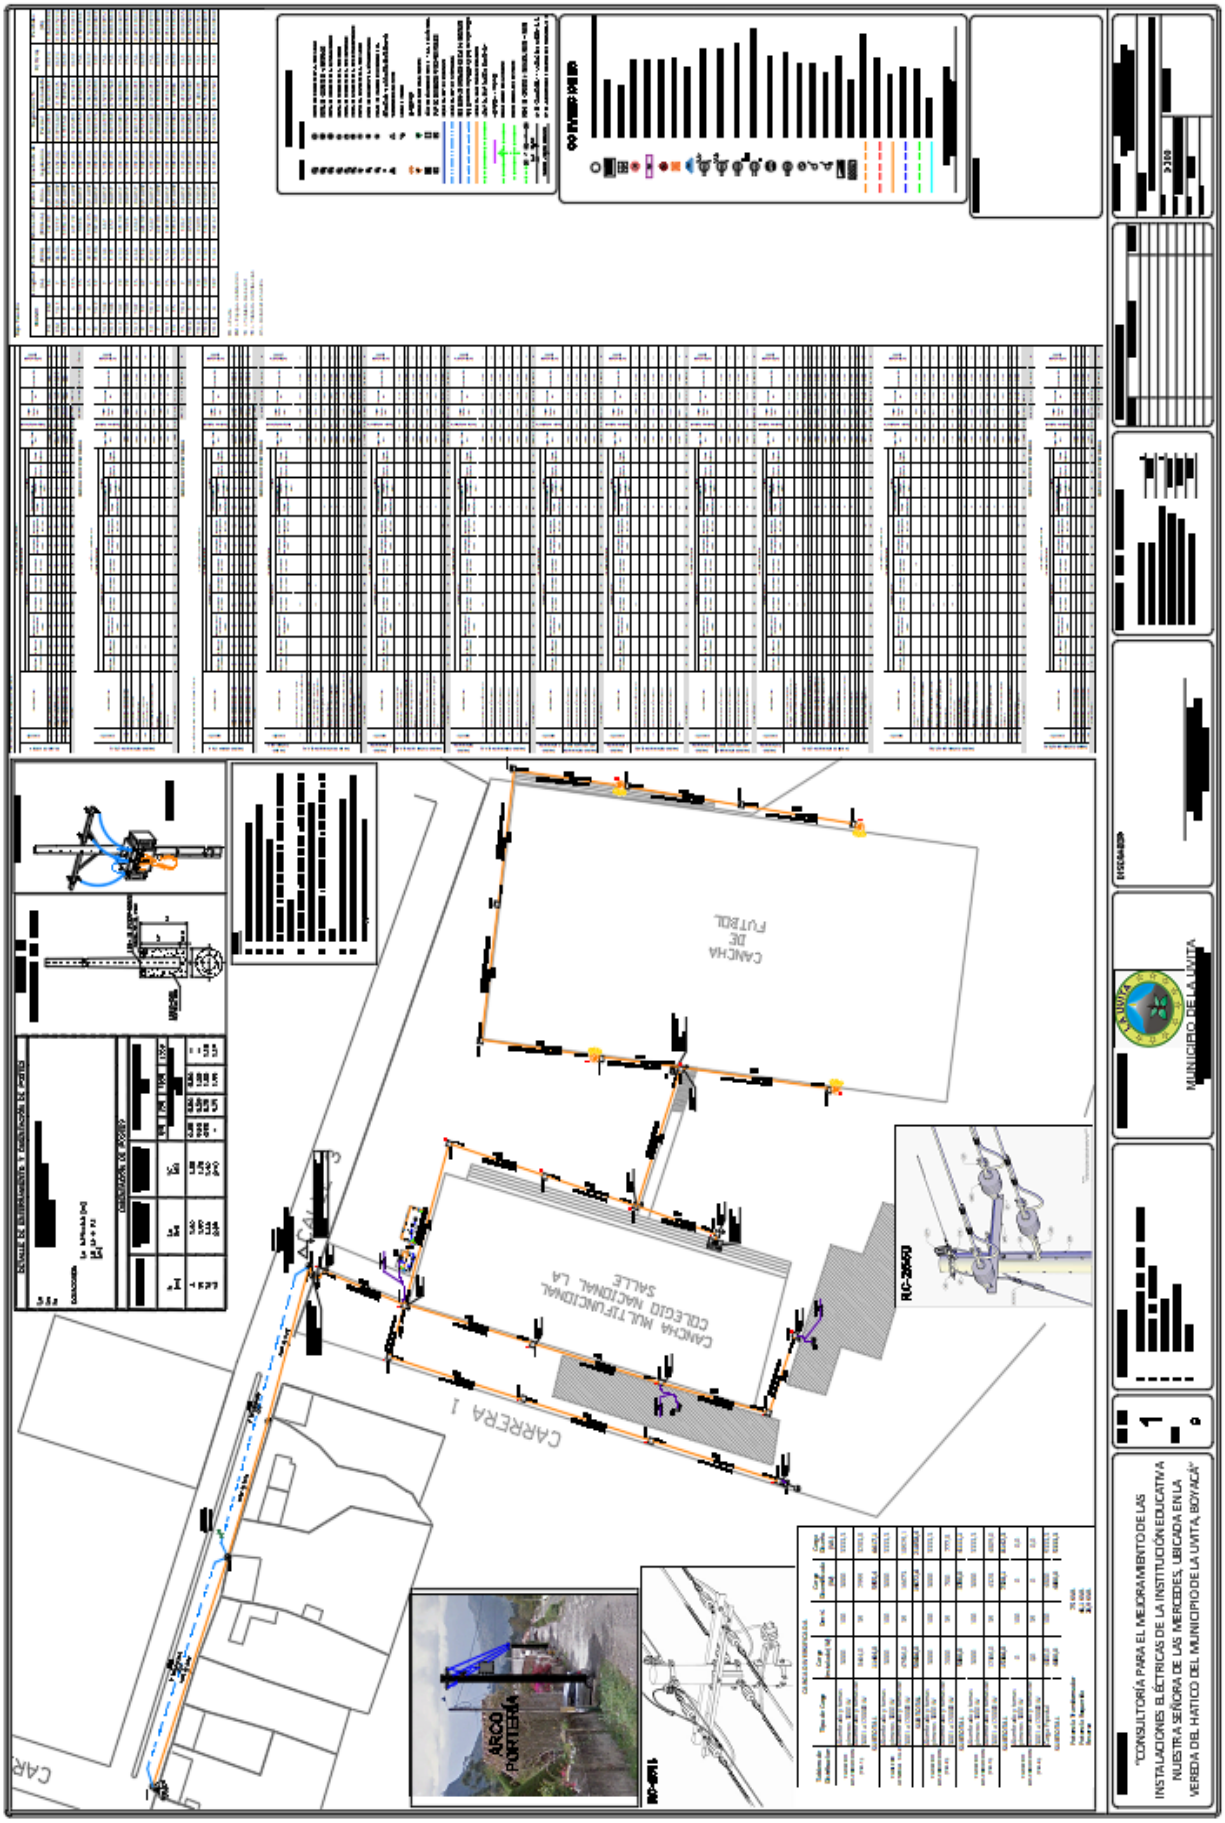


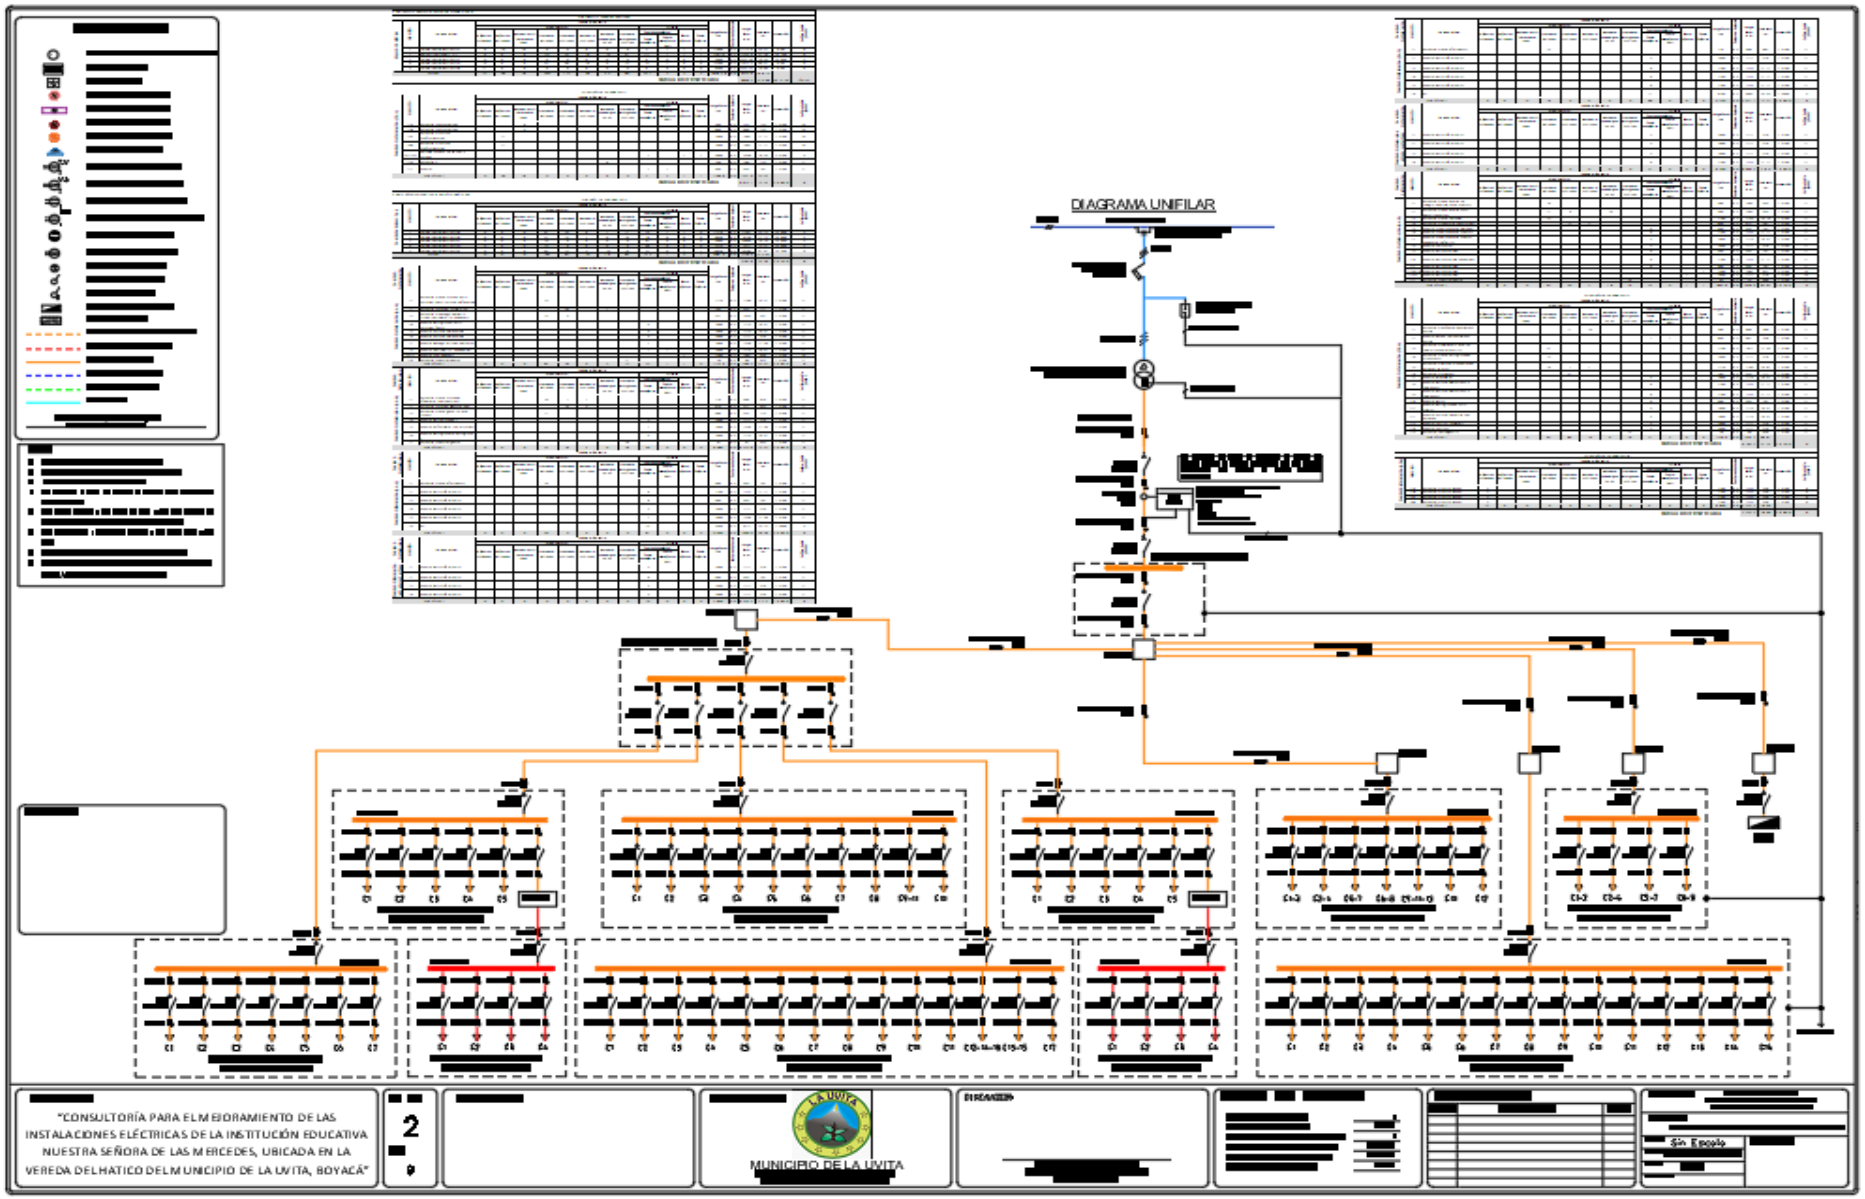
DIAGRAMA UNIFILAR
"CONSULTORÍA PARA ELMEJORAMIENTO DE LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA NUESTRA SEÑORA DE LAS MERCEDES, UBICADA EN LA VEREDA DELHATICO DELMUNICIPIO DE LA UVITA, BOYACÁ"
2
MUNICIPIO DE LA UVITA
Sin Escala

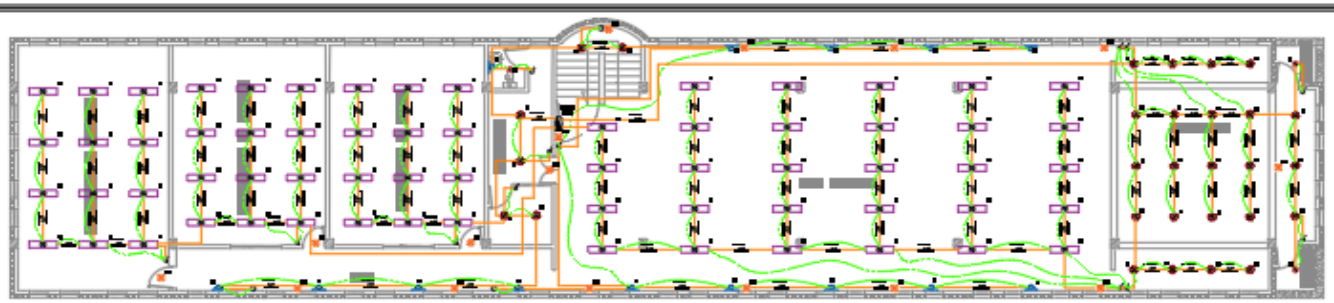

PLANTA ARQUITECTÓNICA ESTRUCTURA A TERCER PISO

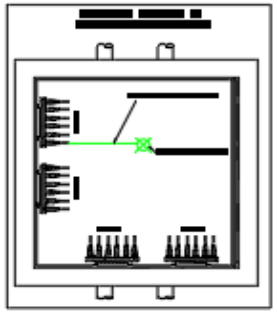


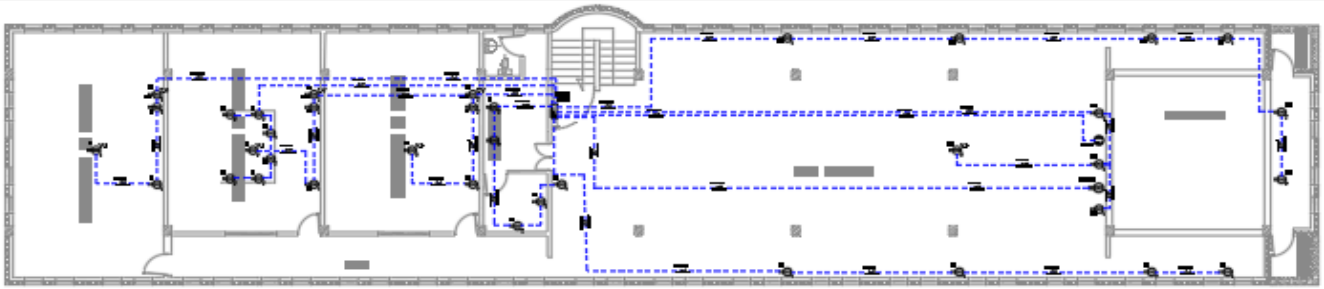


PLANTA ARQUITECTÓNICA ESTRUCTURA A TERCER PISO









DETALLES DE CAJAS TIPO 3 (NORMA EBSA CD 2007)





ZANJAS Y COMPACTACION
PARA INSTALACION DE DUCTERIAS







"CONSULTORÍA PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA NUESTRA SEÑORA DE LAS MERCEDES, UBICADA EN LA VEREDA DEL HATICO DEL MUNICIPIO DE LA UVITA, BOYACÁ"

6

MUNICIPIO DE LA UVITA

FOLIO 8: Registro de cumplimiento de todas las normas vigentes sobre seguridad industrial, salud ocupacional y medio ambiente. (señalización de obra, vertimientos, mantenimientos de maquinaria, etc.)

Consorcio Lo Mercados	Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo	Código: FR - GS - 005
		Versión No. 00
	FORMATO INSPECCIÓN HSE GENERAL	Fecha: 02/05/23
		Página: 1 de 1

Fecha de la Inspección:	4/03/2023	Dependencia a Inspeccionar:	La plana
Responsable de la Inspección:	Breyner Ishy Pinilla	Cargo:	Residente

Marque con una X según corresponda, SI / NO / N/A (No Aplica)

1. ORDEN, LIMPIEZA Y SANEAMIENTO BASICO	SI	NO	N/A	OBSERVACIONES
Superficies de trabajo Limpias y Ordenas	X			
Buen estado de limpieza de Ventanas, pisos y paredes	X			
Baños Limpios y con suministro de elementos básicos (Agua, Papel, Jabón Líquido para manos).	X			
Se dispone de agua potable para los trabajadores.	X			
Se evidencia la presencia de plagas (ratas, cucarachas, etc)		X		
Instalaciones Hidráulicas en buen estado.	X			
Organización en la Gestión documental	X			
Equipos y herramientas de trabajo debidamente almacenadas y organizadas.	X			
2. GESTION AMBIENTAL	**SI**	**NO**	**N/A**	**OBSERVACIONES**
Se dispone de puntos ecológicos	X			
Se clasifican adecuadamente los residuos	X			
Se dispone de un lugar de acopio para el almacenamiento temporal de residuos	X			
Se reutiliza el papel impreso por una cara	X			
Se conocen los programas de gestion ambiental	X			
3. EMERGENCIAS Y SEGURIDAD	**SI**	**NO**	**N/A**	**OBSERVACIONES**
Los Mapa y rutas de evacuación estan ubicados en un lugar visible	X			
Pisos libres de obstáculos (Ruta de Evacuación Libre)	X			
Extintores completamente recargados, instalados, señalizados y en buen estado	X			
Botiquin de primeros auxilios completo y en buen estado	X			
Camilla e Inmovilizadores corporales en buen estado	X			
Las sustancias químicas se encuentran debidamente almacenadas e identificadas con su respectiva hoja de seguridad			X	
Instalaciones electricas estan canalizadas, señalizadas y en buen estado	X			
Se percibe confort térmico	X			
La iluminacion natural o artificial es adecuada	X			
El ruido ambiental interfiere con el tono normal de conversacion de los trabajadores		X		
En las escaleras fijas se tienen instalado pasamanos y los escalones son antideslizantes	X			
Los pisos son uniformes y no presentan desniveles o irregularidades	X			
Los espacios de trabajo para cada persona son los adecuados	X			
Sistemas de almacenamiento organizados y anclados a paredes o pisos	X			
4. FACTOR HUMANO	**SI**	**NO**	**N/A**	**OBSERVACIONES**
Los trabajadores, contratistas y subcontratistas han recibido inducción en temas relacionados a Seguridad y Salud en el Trabajo y Ambiente.	X			
Los trabajadores, contratistas y subcontratistas utilizan correctamente los EPP necesarios para su labor y la dotación adecuada.	X			
El personal sabe como proceder en caso de una Emergencia	X			
Se mantiene un ambiente de cordialidad en el área de trabajo	X			

OBSERVACIONES

Firma y cargo de quien realiza la inspección	Firma representante de SST	Firma de quien atiende la inspección
Breyner Pinilla	Emilio Bladimir Parqueres	Breyner Pinilla

Consorcio La Mercedes	Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo	Código: FR - GS - 005
		Versión No. 00
	FORMATO INSPECCIÓN HSE GENERAL	Fecha: 02/05/23
		Página: 1 de 1

Fecha de la Inspección:	25/08/23	Dependencia a Inspeccionar:	
Responsable de la Inspección:		Cargo:	

Marque con una X según corresponda, SI / NO / N/A (No Aplica)

1. ORDEN, LIMPIEZA Y SANEAMIENTO BASICO	SI	NO	N/A	OBSERVACIONES
Superficies de trabajo Limpias y Ordenas	X			
Buen estado de limpieza de Ventanas, pisos y paredes	X			
Baños Limpios y con suministro de elementos básicos (Agua, Papel, Jabón Liquido para manos).	X			
Se dispone de agua potable para los trabajadores.	X			
Se evidencia la presencia de plagas (ratas, cucarachas, etc)		X		
Instalaciones Hidráulicas en buen estado.	X			
Organización en la Gestion documental	X			
Equipos y herramientas de trabajo debidamente almacenadas y organizadas.	X			
2. GESTION AMBIENTAL	**SI**	**NO**	**N/A**	**OBSERVACIONES**
Se dispone de puntos ecológicos	X			
Se clasifican adecuadamente los residuos	X			
Se dispone de un lugar de acopio para el almacenamiento temporal de residuos	X			
Se reutiliza el papel impreso por una cara	X			
Se conocen los programas de gestion ambiental	X			
3. EMERGENCIAS Y SEGURIDAD	**SI**	**NO**	**N/A**	**OBSERVACIONES**
Los Mapa y rutas de evacuación estan ubicados en un lugar visible	X			
Pisos libres de obstáculos (Ruta de Evacuación Libre)	X			
Extintores completamente recargados, instalados, señalizados y en buen estado	X			
Botiquín de primeros auxilios completo y en buen estado	X			
Camilla e Inmovilizadores corporales en buen estado	X			
Las sustancias químicas se encuentran debidamente almacenadas e identificadas con su respectiva hoja de seguridad		X		
Instalaciones electricas estan canalizadas, señalizadas y en buen estado	X			
Se percibe confort térmico	X			
La iluminacion natural o artificial es adecuada	X			
El ruido ambiental interfiere con el tono normal de conversacion de los trabajadores		X		
En las escaleras fijas se tienen instalado pasamanos y los escalones son antideslizantes			X	
Los pisos son uniformes y no presentan desniveles o irregularidades	X			
Los espacios de trabajo para cada persona son los adecuados	X			
Sistemas de almacenamiento organizados y anclados a paredes o pisos			X	
4. FACTOR HUMANO	**SI**	**NO**	**N/A**	**OBSERVACIONES**
Los trabajadores, contratistas y subcontratistas han recibido inducción en temas relacionados a Seguridad y Salud en el Trabajo y Ambiente.	V			
Los trabajadores, contratistas y subcontratistas utilizan correctamente los EPP necesarios para su labor y la dotación adecuada.	X			
El personal sabe como proceder en caso de una Emergencia	X			
Se mantiene un ambiente de cordialidad en el área de trabajo	X			

OBSERVACIONES

Firma y cargo de quien realiza la inspección	Firma representante de SST	Firma de quien atiende la inspección
Bryan Pinilla	Emilio Vladimir Pangoya	Bryan Pinilla

Consorcio Le Mercedes	Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo	Código: FR - GS - 005
		Versión No. 00
	FORMATO INSPECCIÓN HSE GENERAL	Fecha: 02/05/23
		Página: 1 de 1

Fecha de la Inspección:	31/03/23	Dependencia a Inspeccionar:	Sitio de Trabajo
Responsable de la Inspección:	Bryner Hely Pinilla	Cargo:	Residente

Marque con una X según corresponda, SI / NO / N/A (No Aplica)

1. ORDEN, LIMPIEZA Y SANEAMIENTO BASICO	SI	NO	N/A	OBSERVACIONES
Superficies de trabajo Limpias y Ordenas	X			
Buen estado de limpieza de Ventanas, pisos y paredes	X			
Baños Limpios y con suministro de elementos básicos (Agua, Papel, Jabón Liquido para manos).	X			
Se dispone de agua potable para los trabajadores.	X			
Se evidencia la presencia de plagas (ratas, cucarachas, etc)		X		
Instalaciones Hidráulicas en buen estado.	X			
Organización en la Gestion documental	X			
Equipos y herramientas de trabajo debidamente almacenadas y organizadas.	X			
2. GESTION AMBIENTAL	**SI**	**NO**	**N/A**	**OBSERVACIONES**
Se dispone de puntos ecológicos	X			
Se clasifican adecuadamente los residuos	X			
Se dispone de un lugar de acopio para el almacenamiento temporal de residuos	X			
Se reutiliza el papel impreso por una cara	X			
Se conocen los programas de gestion ambiental	X			
3. EMERGENCIAS Y SEGURIDAD	**SI**	**NO**	**N/A**	**OBSERVACIONES**
Los Mapa y rutas de evacuación estan ubicados en un lugar visible	X			
Pisos libres de obstáculos (Ruta de Evacuación Libre)	X			
Extintores completamente recargados, instalados, señalizados y en buen estado	X			
Botiquín de primeros auxilios completo y en buen estado	X			
Camilla e Inmovilizadores corporales en buen estado	X			
Las sustancias quimicas se encuentran debidamente almacenadas e identificadas con su respectiva hoja de seguridad		X		
Instalaciones electricas estan canalizadas, señalizadas y en buen estado	X			
Se percibe confort térmico	X			
La iluminacion natural o artificial es adecuada	X			
El ruido ambiental interfiere con el tono normal de conversacion de los trabajadores		X		
En las escaleras fijas se tienen instalado pasamanos y los escalones son antideslizantes			X	
Los pisos son uniformes y no presentan desniveles o irregularidades	X			
Los espacios de trabajo para cada persona son los adecuados	X			
Sistemas de almacenamiento organizados y anclados a paredes o pisos			X	
4. FACTOR HUMANO	**SI**	**NO**	**N/A**	**OBSERVACIONES**
Los trabajadores, contratistas y subcontratistas han recibido inducción en temas relacionados a Seguridad y Salud en el Trabajo y Ambiente.	X			
Los trabajadores, contratistas y subcontratistas utilizan correctamente los EPP necesarios para su labor y la dotación adecuada.	X			
El personal sabe como proceder en caso de una Emergencia	X			
Se mantiene un ambiente de cordialidad en el área de trabajo	X			

OBSERVACIONES

Firma y cargo de quien realiza la inspección	Firma representante de SST	Firma de quien atiende la inspección
Bryner Pinilla	Emilio Vladimir Vanegas	Bryner Pinilla

Consorcio Lo Mercados	LISTA DE CHEQUEO PARA HERRAMIENTAS Y EQUIPOS	Código: FR-GS-016
		Versión: 00
		Vigente desde: 02/05/2023

Semana del 01 de agosto Hasta 05 de agosto 2023

INSPECCION DE HERRAMIENTAS

TIPO DE HERRAMIENTA	ESTADO				OBSERVACIONES
	OPTIMO	REGULAR	DEFICIENTE	NO SE TIENE	
Herramientas Fijas					
Esmeril				X	
Taladro	X				
Prensa.				X	
Compresor				X	
Maquina de soldar				X	
Gato Hidràulico				X	
Equipo de oxicorte				X	
Herramientas Manuales					
Taladro percutor doble manija				X	
Guadaña				X	
Taladro sencillo (A)	X				
Lijadora				X	
Pulidora pequeña (A)				X	
Pulidora grande (B)				X	
Segueta pequeña				X	
Segueta grande				X	
Martillos grandes (Monas)				X	
Martillos	X				
Cuchillos				X	
Escalera de extensión	X				
Escalera fija.	X				
Machete				X	
Raches				X	
Brocas	X				
Llaves fijas	X				
Alicates de puntas	X				
Alicates eléctricos	X				

TIPO DE HERRAMIENTA	ESTADO				OBSERVACIONES
	OPTIMO	REGULAR	DEFICIENTE	NO SE TIENE	
Extensiones eléctricas	X				
Tijeras grandes	X				
Tijeras Pequeñas				X	
Motosierra				X	
Extensiones con lámparas				X	
Pelacable (A)	X				
Cortafrio (A)					
Cortafrio (B)				X	
Pinzas universales	X				
Destornillador de estría	X				
Destornillador perillero pala	X				
Destornillador perillero estría	X				
Pinza Voltiamperimetrica.	X				
Gira macho grande				X	
Gira macho pequeño				X	
Cautín				X	
Llaves de tubo	X				
Llave expansiva	X				
Hombre solo	X				
Cincel				X	
Punzones o botadores				X	
Torque				X	

FIRMA

NOMBRE

Consorcio	LISTA DE CHEQUEO PARA HERRAMIENTAS Y EQUIPOS	Código: FR-GS-016
		Versión: 00
		Vigente desde: 02/05/2023

Semana del 28 de agosto Hasta 12 de octubre del 2023

INSPECCION DE HERRAMIENTAS

TIPO DE HERRAMIENTA	ESTADO				OBSERVACIONES
	OPTIMO	REGULAR	DEFICIENTE	NO SE TIENE	
Herramientas Fijas					
Esmeril				X	
Taladro	X				
Prensa.				X	
Compresor				X	
Maquina de soldar				X	
Gato Hidráulico				X	
Equipo de oxicorte				X	
Herramientas Manuales					
Taladro percutor doble manija				X	
Guadaña				X	
Taladro sencillo (A)	X				
Lijadora				X	
Pulidora pequeña (A)				X	
Pulidora grande (B)				X	
Segueta pequeña				X	
Segueta grande				X	
Martillos grandes (Monas)				X	
Martillos	X				
Cuchillos				X	
Escalera de extensión	X				
Escalera fija.	X				
Machete				X	
Raches				X	
Brocas	X				
Llaves fijas	X				
Alicates de puntas	X				
Alicates eléctricos	X				

TIPO DE HERRAMIENTA	ESTADO				OBSERVACIONES
	OPTIMO	REGULAR	DEFICIENTE	NO SE TIENE	
Extensiones eléctricas	X				
Tijeras grandes	X				
Tijeras Pequeñas				X	
Motosierra				X	
Extensiones con lámparas				X	
Pelacable (A)	X				
Cortafrio (A)				X	
Cortafrio (B)				X	
Pinzas universales	X				
Destornillador de estria	X				
Destornillador perillero pala	X				
Destornillador perillero estria	X				
Pinza Voltiampérimetrica.	X				
Gira macho grande				X	
Gira macho pequeño				X	
Cautin				X	
Llaves de tubo	X				
Llave expansiva	X				
Hombre solo	X				
Cincel				X	
Punzones o botadores				X	
Torque				X	

FIRMA

NOMBRE Bastima Pequeño

Consorcio	LISTA DE CHEQUEO PARA HERRAMIENTAS Y EQUIPOS	Código: FR-GS-016
		Versión: 00
		Vigente desde: 02/05/2023

Semana del 14 de agosto Hasta 19 de agosto del 2023

INSPECCION DE HERRAMIENTAS

TIPO DE HERRAMIENTA	ESTADO				OBSERVACIONES
	OPTIMO	REGULAR	DEFICIENTE	NO SE TIENE	
Herramientas Fijas					
Esmeril				X	
Taladro	X				
Prensa.				X	
Compresor				X	
Maquina de soldar				X	
Gato Hidráulico				X	
Equipo de oxicorte				X	
Herramientas Manuales					
Taladro percutor doble manija				X	
Guadaña				X	
Taladro sencillo (A)	X				
Lijadora				X	
Pulidora pequeña (A)				X	
Pulidora grande (B)				X	
Segueta pequeña				X	
Segueta grande				X	
Martillos grandes (Monas)				X	
Martillos	X				
Cuchillos				X	
Escalera de extensión					
Escalera fija.					
Machete				X	
Raches				X	
Brocas	X				
Llaves fijas	X				
Alicates de puntas	X				
Alicates eléctricos	X				

TIPO DE HERRAMIENTA	ESTADO				OBSERVACIONES
	OPTIMO	REGULAR	DEFICIENTE	NO SE TIENE	
Extensiones eléctricas	X				
Tijeras grandes	X				
Tijeras Pequeñas				X	
Motosierra				X	
Extensiones con lámparas				X	
Pelacable (A)	X				
Cortafrío (A)				X	
Cortafrío (B)				X	
Pinzas universales	X				
Destornillador de estría	X				
Destornillador perillero pala	X				
Destornillador perillero estría	X				
Pinza Voltiamperimetrica.	X				
Gira macho grande				X	
Gira macho pequeño				X	
Cautín				X	
Llaves de tubo	X				
Llave expansiva	X				
Hombre solo	X				
Cincel				X	
Punzones o botadores				X	
Torque				X	

FIRMA

NOMBRE Stebins parquera

Consorcio	LISTA DE CHEQUEO PARA HERRAMIENTAS Y EQUIPOS	Código: FR-GS-016
		Versión: 00
		Vigente desde: 02/05/2023

Semana del 22 de agosto Hasta 26 de agosto del 2023

INSPECCION DE HERRAMIENTAS

TIPO DE HERRAMIENTA	ESTADO				OBSERVACIONES
	OPTIMO	REGULAR	DEFICIENTE	NO SE TIENE	
Herramientas Fijas					
Esmeril				X	
Taladro	X				
Prensa.				X	
Compresor				X	
Maquina de soldar				X	
Gato Hidráulico				X	
Equipo de oxicorte				X	
Herramientas Manuales					
Taladro percutor doble manija				X	
Guadaña				X	
Taladro sencillo (A)	X				
Lijadora				X	
Pulidora pequeña (A)				X	
Pulidora grande (B)				X	
Segueta pequeña				X	
Segueta grande				X	
Martillos grandes (Monas)				X	
Martillos	X				
Cuchillos				X	
Escalera de extensión	X				
Escalera fija.	X				
Machete				X	
Raches				X	
Brocas	X				
Llaves fijas	X				
Alicates de puntas	X				
Alicates eléctricos	X				

TIPO DE HERRAMIENTA	ESTADO				OBSERVACIONES
	OPTIMO	REGULAR	DEFICIENTE	NO SE TIENE	
Extensiones eléctricas	X				
Tijeras grandes	X				
Tijeras Pequeñas				X	
Motosierra				X	
Extensiones con lámparas				X	
Pelacable (A)	X				
Cortafrio (A)				X	
Cortafrio (B)				X	
Pinzas universales	X				
Destornillador de estria	X				
Destornillador perillero pala	X				
Destornillador perillero estria	X				
Pinza Voltiampérimetrica.	X				
Gira macho grande				X	
Gira macho pequeño				X	
Cautin				X	
Llaves de tubo	X				
Llave expansiva	X				
Hombre solo	X				
Cincel				X	
Punzones o botadores				X	
Torque				X	

FIRMA

NOMBRE Boris Gonzalez

Consorcio La Mercedes	LISTA DE CHEQUEO PARA HERRAMIENTAS Y EQUIPOS	Código: FR-GS-016
		Versión: 00
		Vigente desde: 02/05/2023

Semana del 28 de agosto Hasta 31 de agosto del 2023

INSPECCION DE HERRAMIENTAS


TIPO DE HERRAMIENTA	ESTADO				OBSERVACIONES
	OPTIMO	REGULAR	DEFICIENTE	NO SE TIENE	
Herramientas Fijas					
Esmeril				X	
Taladro	X				
Prensa.				X	
Compresor				X	
Maquina de soldar				X	
Gato Hidráulico				X	
Equipo de oxicorte				X	
Herramientas Manuales					
Taladro percutor doble manija				X	
Guadaña				X	
Taladro sencillo (A)	X				
Lijadora				X	
Pulidora pequeña (A)				X	
Pulidora grande (B)				X	
Segueta pequeña				X	
Segueta grande				X	
Martillos grandes (Monas)				X	
Martillos	X				
Cuchillos				X	
Escalera de extensión	X				
Escalera fija.	X				
Machete				X	
Raches				X	
Brocas	X				
Llaves fijas	X				
Alicates de puntas	X				
Alicates eléctricos	X				

TIPO DE HERRAMIENTA	ESTADO				OBSERVACIONES
	OPTIMO	REGULAR	DEFICIENTE	NO SE TIENE	
Extensiones eléctricas	X				
Tijeras grandes	X			X	
Tijeras Pequeñas				X	
Motosierra				X	
Extensiones con lámparas					
Pelacable (A)	X				
Cortafrio (A)				X	
Cortafrio (B)				X	
Pinzas universales	X				
Destornillador de estría	X				
Destornillador perillero pala	X				
Destornillador perillero estría	X				
Pinza Voltiampérimetrica.	X				
Gira macho grande				X	
Gira macho pequeño				X	
Cautín				X	
Llaves de tubo	X				
Llave expansiva	X				
Hombre solo	X				
Cincel				X	
Punzones o botadores				X	
Torque				X	

FIRMA

NOMBRE [illegible]

Elementos de primeros auxilios y atención de emergencia instalada en obra

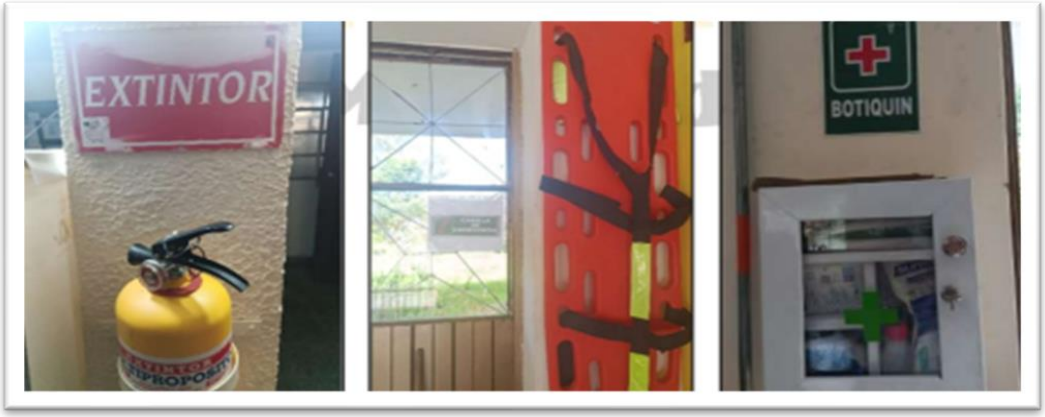

fuente: CONSORCIO IE MERCEDES

Instalación Valla informativa de obra



fuente: CONSORCIO IE MERCEDES

Evidencia del desarrollo de jornada de aseo



fuente: CONSORCIO IE MERCEDES

Servicio de baño para el personal de obra



fuente: CONSORCIO IE MERCEDES

Manejo de residuos solidos



fuente: CONSORCIO IE MERCEDES

FOLIO 9: Registro de uso correcto de los elementos de protección personal (entrega de dotaciones, planillas, fotos, etc.)

Consorcio la Mercedes	Sistema de gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo	Versión No. 00
		Código: FR-GS-001
	ENTREGA DE EPP	Fecha: 02/05/23

ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL

NOMBRE COLABORADOR	Alaba Acosta Acosta
CÉDULA	71885 34
CARGO	Tecnico electricista
ENTREGADO POR	Breyna Hely Pinilla Hinestroza

Por medio de la presente certifico que he recibido los siguientes Elementos de Protección Personal por parte del Consorcio la Mercedes. Asi mismo, al recibir estos elementos me comprometo a mantenerlos en buen estado y hacer buen uso de ellos. Para la reposición es necesario entregar los EPP antiguos o en deterioro.

FECHA	EPP	CANT.	ESTADO DEL EPP	FIRMA
1/08/23	Casco Dieléctrico	1	Nuevo	Alaba Acost
1/08/23	Botas	1	Nuevo	Alaba Acosta
1/08/23	Camisa Manga larga	1	Nuevo	Alaba Acosta
1/08/23	Pantalon	1	Nuevo	Alaba Acosta
1/08/23	1 par de guantes	1	Nuevo	Alaba Acosta

Consorcio la Mercedes	Sistema de gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo	Versión No. 00
		Código: FR-GS-001
	ENTREGA DE EPP	Fecha: 02/05/23

ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL

NOMBRE COLABORADOR	Willar Fidel Cachuayar Pena
CÉDULA	1032425572
CARGO	Tecnico Electricista
ENTREGADO POR	Brayner Helq Pinilla Alvarado

Por medio de la presente certifico que he recibido los siguientes Elementos de Protección Personal por parte del Consorcio la Mercedes. Asi mismo, al recibir estos elementos me comprometo a mantenerlos en buen estado y hacer buen uso de ellos. Para la reposición es necesario entregar los EPP antiguos o en deterioro.

FECHA	EPP	CANT.	ESTADO DEL EPP	FIRMA
1/08/23	Casco dielectrico	1	Nuevo	
1/08/23	Botas	1	Nuevo	
1/08/23	Camisa Manga larga	1	Nuevo	
1/08/23	Pantalon	1	Nuevo	
1/08/23	1 Par de Botas	1	Nuevo	

Consorcio la Mercedes	Sistema de gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo	Versión No. 00
		Código: FR-GS-001
	ENTREGA DE EPP	Fecha: 02/05/23

ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL

NOMBRE COLABORADOR	Edilson Acosta Pinedo
CÉDULA	1056710023
CARGO	Ayudante Electrico
ENTREGADO POR	Brayner Hely Pinilla Hallack

Por medio de la presente certifico que he recibido los siguientes Elementos de Protección Personal por parte del Consorcio la Mercedes. Así mismo, al recibir estos elementos me comprometo a mantenerlos en buen estado y hacer buen uso de ellos. Para la reposición es necesario entregar los EPP antiguos o en deterioro.

FECHA	EPP	CANT.	ESTADO DEL EPP	FIRMA
23/08/23	Casco Dielectrico	1	Nuevo	
23/08/23	Boton	1	Nuevo	
23/08/23	Camisa Manga largo	1	Nuevo	
23/08/23	Pantalon	1	Nuevo	
23/08/23	1 Par de guantes	1	Nuevo	

Consorcio le Mercedes	Sistema de gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo	Versión No. 00
		Código: FR-GS-001
	ENTREGA DE EPP	Fecha: 02/05/23

ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL

NOMBRE COLABORADOR	Julio Enrique Rodriguez Urbaneja
CÉDULA	7181295
CARGO	Ayudantes electricos
ENTREGADO POR	Bioyner Ilich Pinilla Hurtado

Por medio de la presente certifico que he recibido los siguientes Elementos de Protección Personal por parte del Consorcio la Mercedes. Asi mismo, al recibir estos elementos me comprometo a mantenerlos en buen estado y hacer buen uso de ellos. Para la reposición es necesario entregar los EPP antiguos o en deterioro.

FECHA	EPP	CANT.	ESTADO DEL EPP	FIRMA
23/08/23	Casco Dielectrico	1	Nuevo	Julio Enrique
23/08/23	Bota	1	Nuevo	Julio Enrique
23/08/23	Camisa Manga larga	1	Nuevo	Julio Enrique
23/08/23	Pantalón	1	Nuevo	Julio Enrique
23/08/23	1 Par de guantes	1	Nuevo	Julio Enrique

Consorcio la Mercedes	Sistema de gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo	Versión No. 00
		Código: FR-GS-001
	ENTREGA DE EPP	Fecha: 02/05/23


ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL

NOMBRE COLABORADOR	Johan David Suarez Gomez
CÉDULA	1002397295
CARGO	Ayudantes electricos
ENTREGADO POR	Brayner Hely Pineda Hurtado

Por medio de la presente certifico que he recibido los siguientes Elementos de Protección Personal por parte del Consorcio la Mercedes. Asi mismo, al recibir estos elementos me comprometo a mantenerlos en buen estado y hacer buen uso de ellos. Para la reposición es necesario entregar los EPP antiguos o en deterioro.

FECHA	EPP	CANT.	ESTADO DEL EPP	FIRMA
23/08/23	Casco Dielectrico	1	Nuevo	
23/08/23	Bota	1	Nuevo	
23/08/23	Camisa Manga larga	1	Nuevo	
23/08/23	Pantalon	1	Nuevo	
23/08/23	1 Par de Guantes	1	Nuevo	


FOLIO 10: REGISTRO FOTOGRAFICO 24 DE AGOSTO 2023

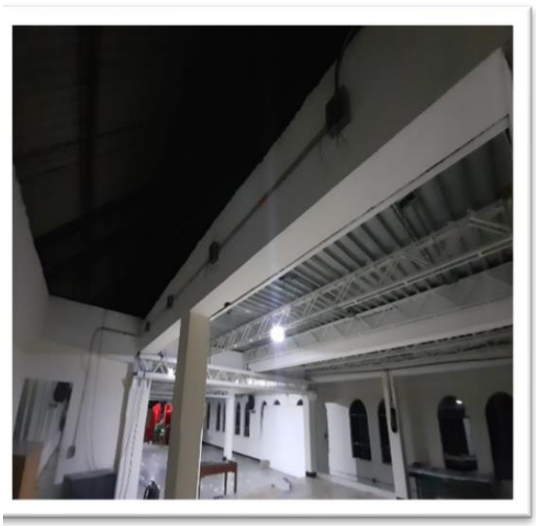

DUCTOS LUMINARIA. TARIMA



DUCTOS TOMACORRIENTE. TARIMA

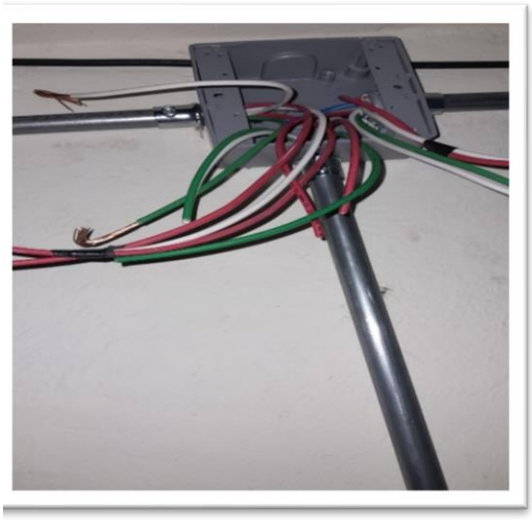

DUCTOS LED TIPO TORTUGA. AULA MULTIPLE



DUCTOS LED EMERGENCIA. AULA MULTIPLE

REGISTRO FOTOGRAFICO 25 DE AGOSTO 2023



LUMINARIA LED 40W. AULA MULTIPLE




LAMPARA EMERGENCIA ZONA AULA MULTIPLE

FUENTE: PROPIA




DUCTOS TOMACORRIENTE. LAB FISICA

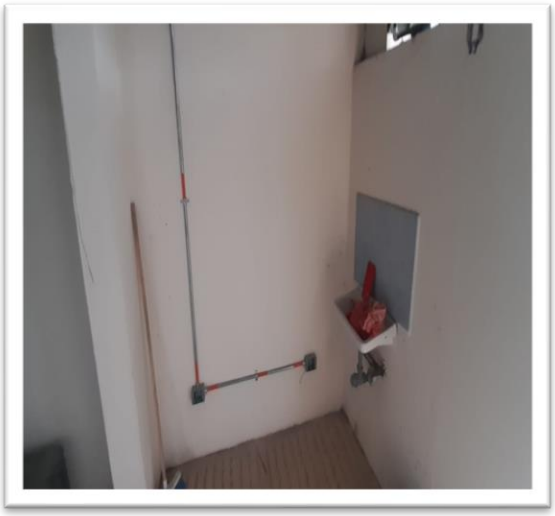


DUCTOS TOMACORRIENTE. CELADURIA


REGISTRO FOTOGRAFICO 26 DE AGOSTO 2023

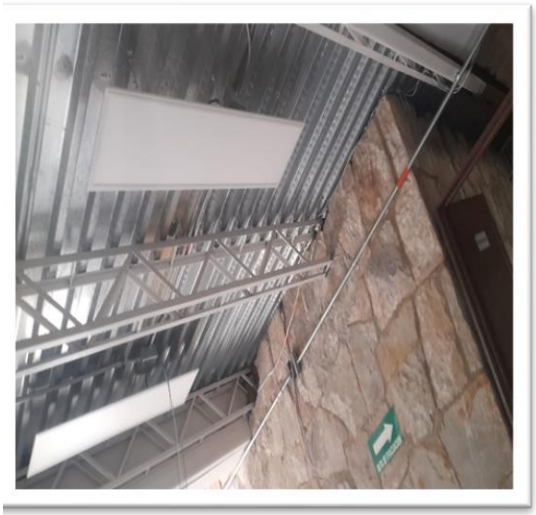


LUMINARIA LED 40W. AULA MULTIPLE

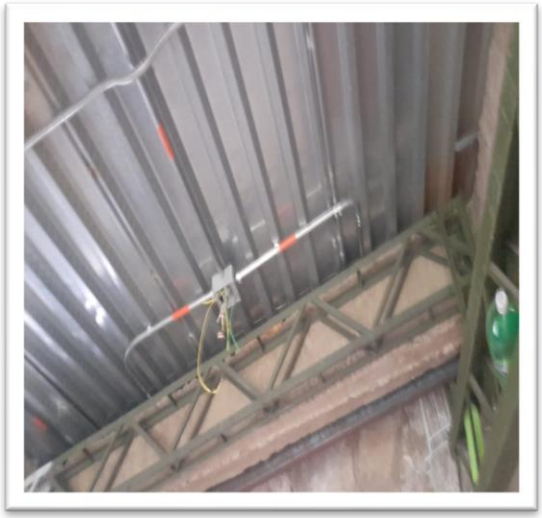

DUCTOS LUMINARIA. CELADURIA

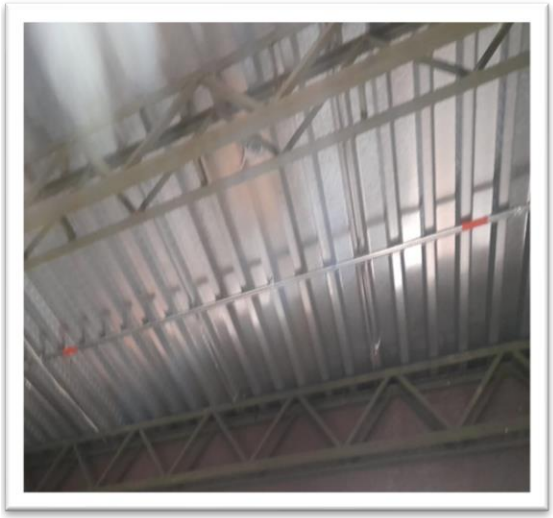

DUCTOS LUMINARIA. LAB QUÍMICA

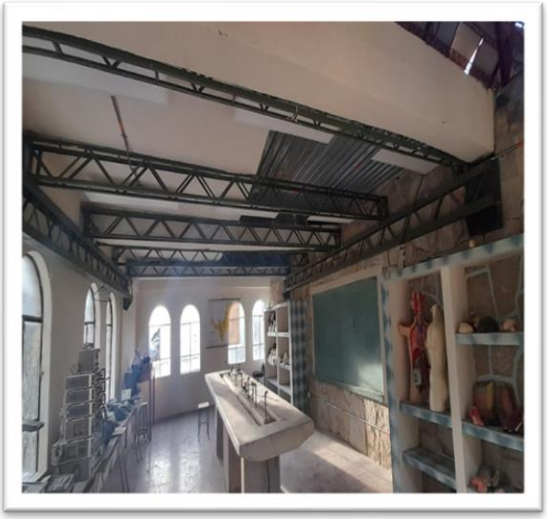

DUCTOS LUMINARIA Y TOMAS. LAB BIOLOGIA

FUENTE: PROPIA


REGISTRO FOTOGRAFICO 30 DE AGOSTO 2023



BALASTOS LUMIRARIA 40W. QUÍMICA



LUMINARIA DE EMERGENCIA. HALL

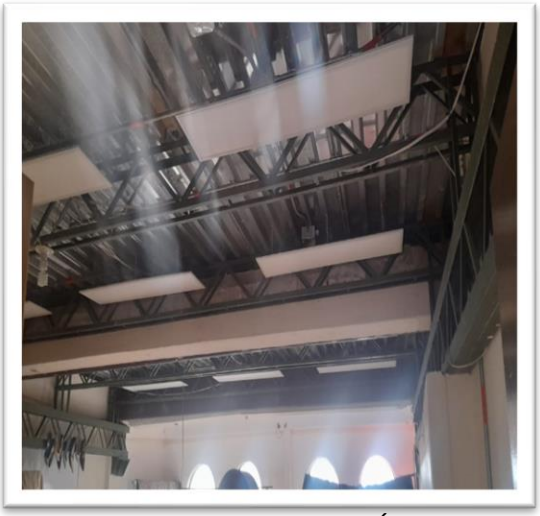

LUMIRARIA 40W. LAB FÍSICA



TOMACORRIENTES LAB. FÍSICA

REGISTRO FOTOGRAFICO 31 DE SEPTIEMBRE 2023



CAJA DE DISTRIBUCIÓN 12 CIRC. 3 PISO



DUCTOS TOMACORRIENTES, BIF, TRIF. ESCE

FUENTE: PROPIA



TOMACORRIENTE, LUMINARIA. CELADURIA



TOMACORRIENTE, LUMINARIA. ENTRAD 3 PISO

FUENTE: PROPIA

FECHA PRESENTE ACTA:	25 de agosto de 2023
CONTRATO / CONVENIO N°	Convenio Interadministrativo No. 2165 de 2023 Contrato de Obra No. GC-CT-2023-114
OBJETO	MEJORAMIENTO DE LAS INSTALACIONES ELECTRICAS RURALES DE LA INSTITUCIÓN EDUCTIVA NUESTRA SEÑORA DE LAS MERCEDES DE LA UVITA

LECTURA ACTA ANTERIOR

Aclaraciones al acta anterior:

No aplica.

VERIFICACIÓN DE COMPROMISOS PACTADOS

COMPROMISO	OBSERVACIÓN
No hay compromisos pactados por ser la primera acta a elaborar	No aplica

DESARROLLO DEL COMITÉ

Siendo las 10:40 a.m. en las instalaciones de la Institución Educativa Nuestra Señora de la Mercedes de la Uvita, Municipio de la Uvita, reunidos los abajo firmantes, procedieron a realizar visita a las instalaciones con el fin de corroborar las actividades que se viene ejecutando.

Se realiza desplazamiento por indicaciones del representante del contratista hacia el tercer nivel de la institución correspondiente al escenario y aula múltiple, en donde se constata la instalación de tubería EMT sobrepuesta sobre muros y techo, alambrado, instalación de lámparas de emergencia, tomacorrientes, iluminación de emergencia. Posteriormente se hace desplazamiento hacia la cancha de futbol y se corrobora los sitios de ubicación de postes y se aclaran inquietudes del contratista sobre los anclajes de los mismos.

El contratista de obra cuenta con 2 técnicos electricistas y 3 ayudantes. Por parte de la interventoría se encuentra un ingeniero electromecánico.

La fecha de inicio de la obra e interventoría se firmó desde el 1 de agosto de 2023, iniciando en primera instancia todo el tema de compra y transporte de suministros.

Se evidencia cambios en la ubicación de la iluminación en atención a la ubicación de algunas estructuras del techo que impiden su ubicación conforme al diseño entregado, para lo cual el supervisor por parte del

Departamento Ing. Sergio Moscoso, le indica que si bien son desplazamientos mínimos se requiere que se implanten estos cambios para modelar el estudio de iluminación y verificar que estas cumplen con lo estipulado en la normativas retilap.

FECHA PRÓXIMA REUNIÓN:	Se pacta realizar comités presenciales cada 15 días.

COMPROMISOS PACTADOS

COMPROMISO	FECHA	RESPONSABLE
Entrega de plano fotométrico del tercer piso escenario y aula multiple.	06/09/2023	Contratista
Entrega de informe No. 4 de supervisión conforme al formato de la Gobernación	15/09/2023	Municipio

PARTICIPANTES

NOMBRE	CARGO	CELULAR	FIRMA
Ronald Gerardo Cordero Jaime	Alcalde Municipal	3123235933	
José Luis Camero Jaime	Secretario de Planeación e Infraestructura Municipal		
Jorge Esteban Cupa	Apoyo técnico planeación	3124189897	
German Tiberio Ojeda Pedraza	Secretario de Minas y Energía de Boyacá	3112287642	
Sergio A. Moscoso	Supervisor Convenio Secretaria de Minas y Energía de Boyacá	3133976606	
José Armando Callejas Monroy	Representante del contratista	3138158633	
Mario Yamid Tobo	Representante de la interventoría	3144115 92	
Edwin Armando Arguello Pérez	Profesional de apoyo Secretaria de Minas Y energía de Boyacá	312 3774561	

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	901277891
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			PGL INGENIERIA Y CONSULTORIA SAS
CIUDAD/MUNICIPIO:	TUNJA	DEPARTAMENTO:	BOYACA
DIRECCIÓN:	CALLE 17 # 11-53 OFICINA 606	TELÉFONO:	7777777
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades de arquitectura e ingeniería y otras
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:		**7892988831**		TIPO DE PLANILLA:			E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	agosto	AÑO 2023	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	septiembre	AÑO 2023
DÍAS DE MORA:		1					
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2023/09/22		NÚMERO AUTORIZACIÓN:		175173777	

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
230301	230301-PORVENIR	1	$ 320.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 400	$ 0	$ 320.000	$ 400	$ 320.400
SUBTOTALES:										**$ 320.000**	**$ 400**	**$ 320.400**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 80.000	$ 0	$ 100	$ 0	$ 80.000	$ 100	$ 0	$ 80.100
SUBTOTALES:													**$ 80.000**	**$ 100**	**$ 0**	**$ 80.100**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-11	14-11 - ARL SURA	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 87.000	$ 87.000	$ 100	$ 0	$ 87.100
SUBTOTALES:									**$ 87.000**	**$ 100**	**$ 0**	**$ 87.100**

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO
CCF10	CCF10-COMFABOY	1	$ 80.000	$ 100	$ 80.100
SUBTOTALES:			**$ 80.000**	**$ 100**	**$ 80.100**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE									NOVEDADES															SEGURIDAD SOCIAL																		PARAFISCALES							
																								PENSIÓN								SALUD						ARP													
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP		APORTES VOLUNTARIOS		INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DIAS COT	IBC	CCF		SENA	ICBF	ESAP	MINEDU
																														SUBSISTENCIA	SOLIDARIDAD	EMPLEADOR	EMPLEADO																				ADMIN	TOTAL APORTE				
1	CC 74374029	PEREZ GOMEZ LUIS EUCARIO	DEPEND		$ 2.000.000	FIJO			SI																		230301-PORVENIR	30	$ 2.000.000	$ 320.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 320.000	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 2.000.000	$ 80.000	$ 0	$ 80.000	14-11 - ARL SURA	30	$ 2.000.000		$ 87.000	30	$ 2.000.000	CCF10-COMFABOY	$ 80.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL	**$ 567.700**

Fecha de Generación del documento: 06 de octubre de 2023

Empresa: PGL INGENIERIA Y CONSULTORIA SAS	**Identificación de la empresa:** 901277891
Sede:	**Municipio donde se prestó el servicio:**
Fecha de prestación del servicio: 08/07/2022	**Fecha de Elaboración:** 08/07/2022
Fecha de última modificación: 08/07/2022	**Persona que modificó:** LUIS EUCARIO PEREZ GOMEZ
Estado del Informe: Terminado	

Asesorado por

Tipo Identificación	Número Identificación	Nombre	Prestador
Cédula	74374029	LUIS EUCARIO PEREZ GOMEZ	

Introducción

La autoevaluación de los Estándares Mínimos es realizada por el empleador, según el artículo 28 de la Resolución 0312 de 2019, y los datos que ingreses obedecen única y exclusivamente a tu criterio como Compañía. ARL SURA no suministra o diligencia información, ni somos responsables por los resultados que de ella se generen. Una vez la completes, te entregaremos algunas recomendaciones para cumplir y/o mejorar el nivel evaluado.


ARL SURA informa que la empresa referenciada en el encabezado del presente documento, en cumplimiento de la normatividad vigente, actualmente se encuentra implementando el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) y para ello, la empresa aplicó la herramienta diagnóstica de la Resolución 0312 de 2019, cuyo resultado está plasmado en este informe.

© 2023. SURA. Todos los derechos

El presente informe tiene el carácter de un concepto técnico. Las conclusiones y/o recomendaciones en él contenidas se emiten en razón de la especialidad de los profesionales que intervinieron en su realización y no tienen carácter vinculante ni obligatorio.

Fecha de Generación del documento: 06 de octubre de 2023

Resumen de Resultados

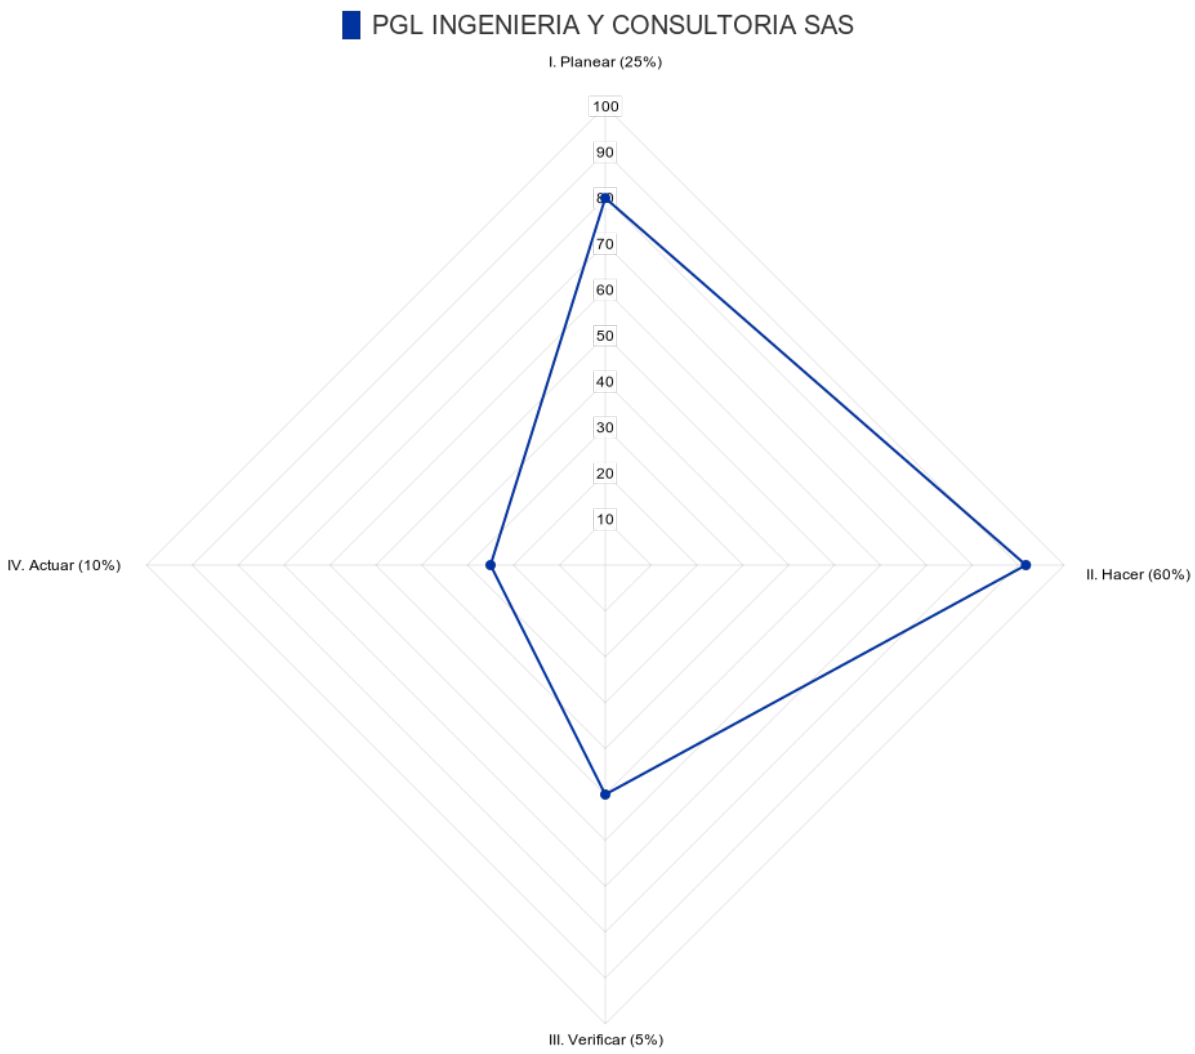

08/07/2022 PGL INGENIERIA Y CONSULTORIA SAS

Item evaluado	% Calificación Real	Valor Ponderado (%)	% Implementación
I. Planear (25%)	80	25	20
II. Hacer (60%)	91.67	60	55
III. Verificar (5%)	50	5	2.5
IV. Actuar (10%)	25	10	2.5
% Total implementación			**80.0**

De acuerdo a su porcentaje de implementación del 80.0 su resultado es MODERADAMENTE ACEPTABLE.

© 2023. SURA. Todos los derechos


El presente informe tiene el carácter de un concepto técnico. Las conclusiones y/o recomendaciones en él contenidas se emiten en razón de la especialidad de los profesionales que intervinieron en su realización y no tienen carácter vinculante ni obligatorio.


Fecha de Generación del documento: 06 de octubre de 2023

Detalle gráfico

A continuación podrá encontrar el detalle gráfico de cada uno de los aspectos evaluados y podrá comparar el resultado obtenido respecto al referente máximo a obtener


PGL INGENIERIA Y CONSULTORIA SAS

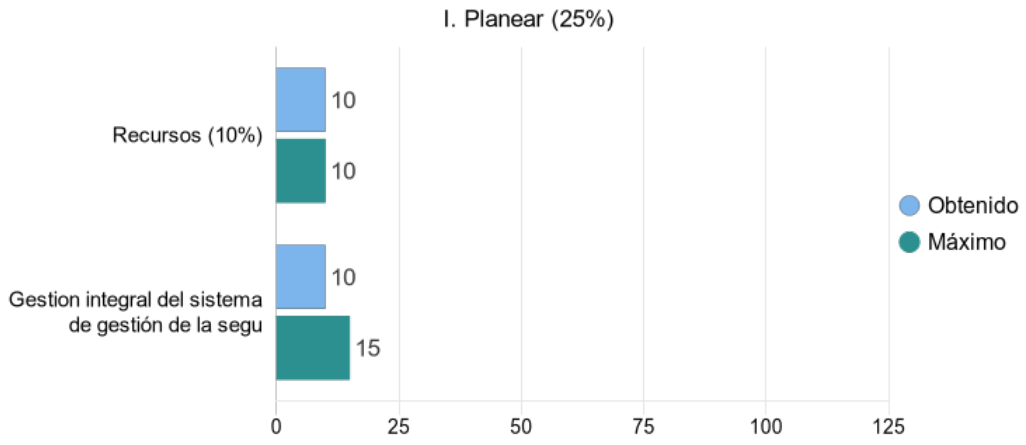


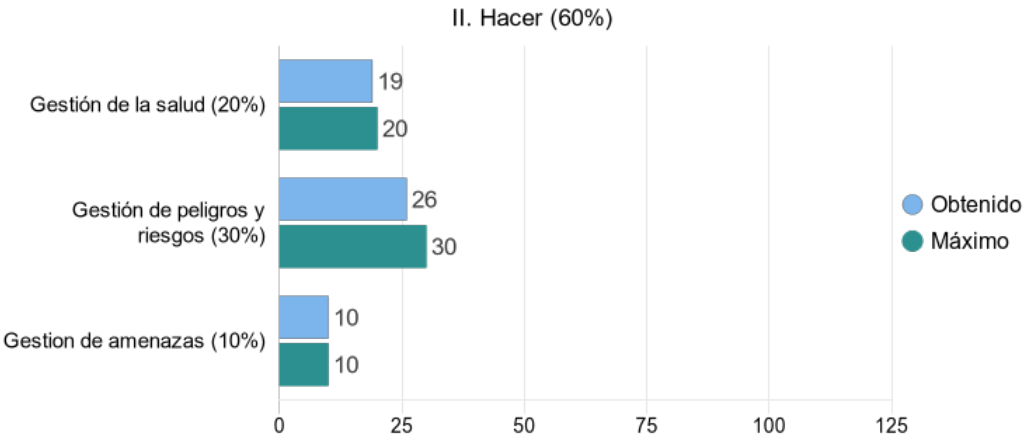


© 2023. SURA. Todos los derechos

El presente informe tiene el carácter de un concepto técnico. Las conclusiones y/o recomendaciones en él contenidas se emiten en razón de la especialidad de los profesionales que intervinieron en su realización y no tienen carácter vinculante ni obligatorio.

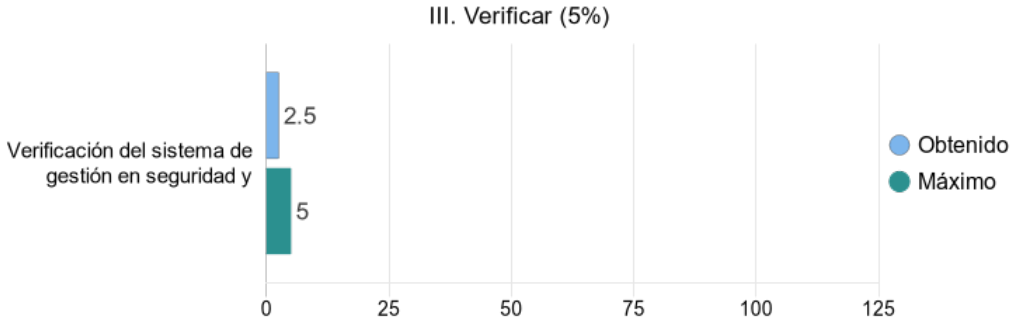

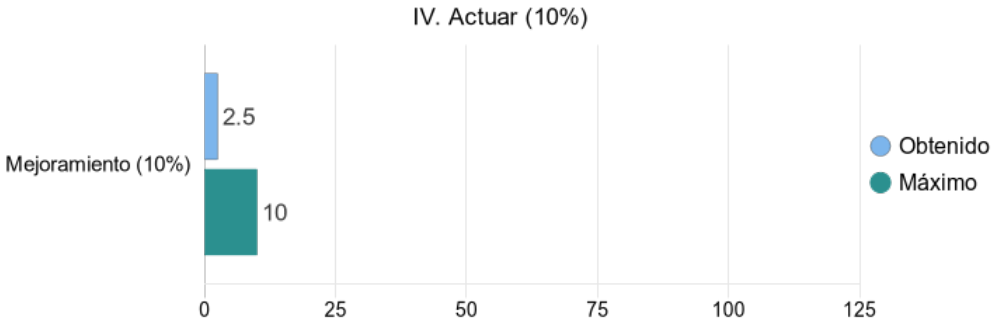


PGL INGENIERIA Y CONSULTORIA SAS

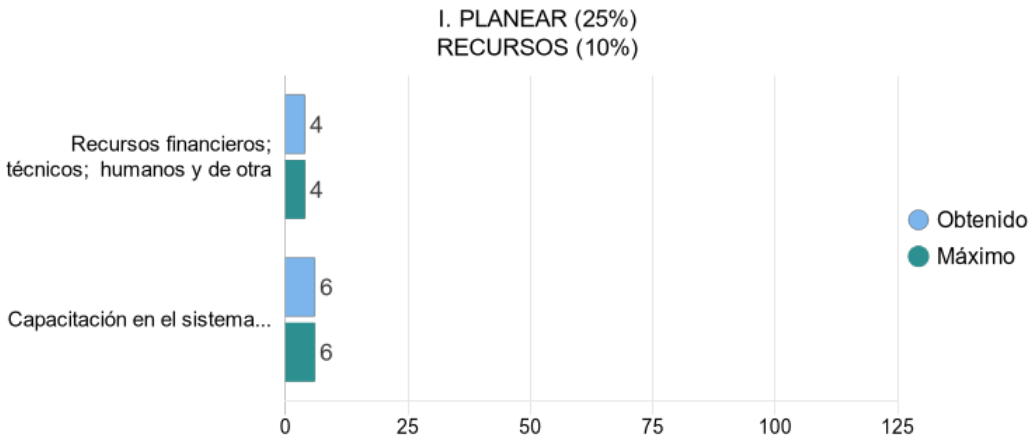


© 2023. SURA. Todos los derechos

El presente informe tiene el carácter de un concepto técnico. Las conclusiones y/o recomendaciones en él contenidas se emiten en razón de la especialidad de los profesionales que intervinieron en su realización y no tienen carácter vinculante ni obligatorio.


Fecha de Generación del documento: 06 de octubre de 2023

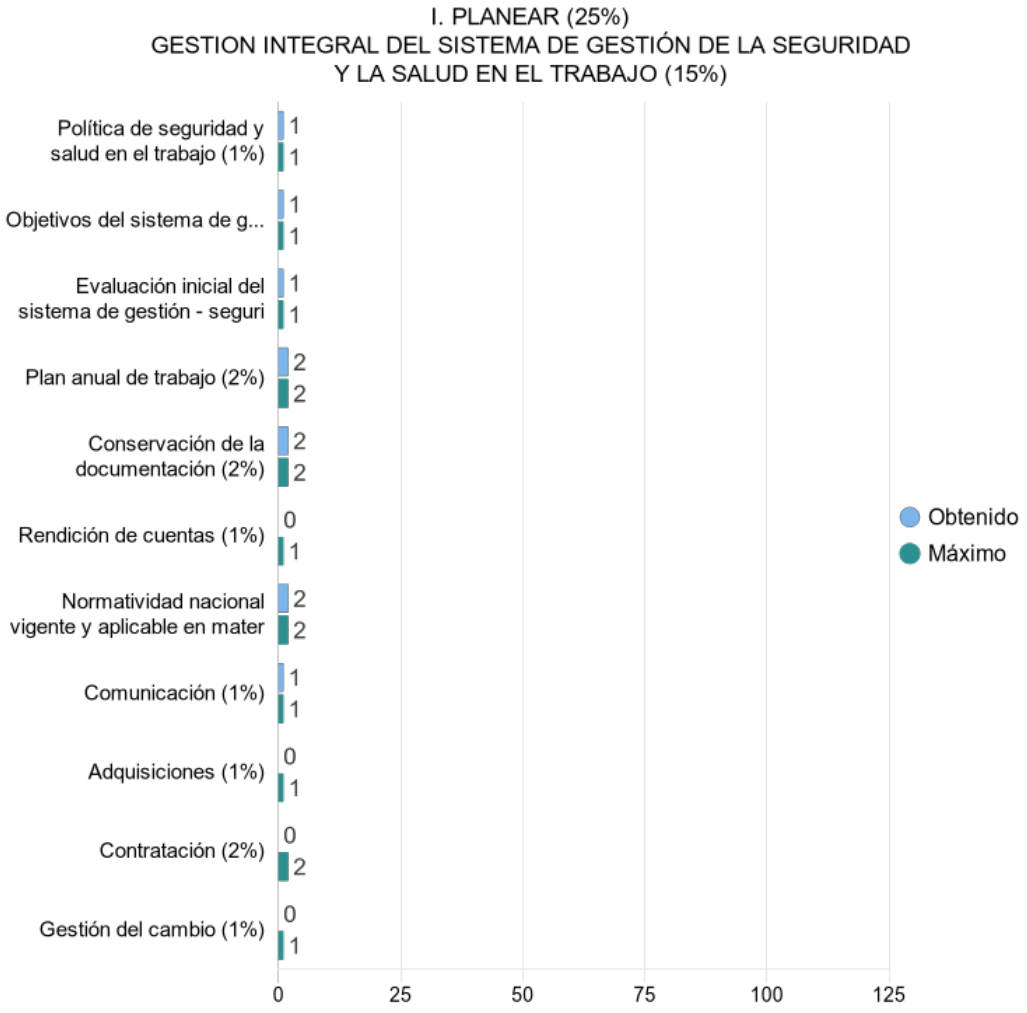


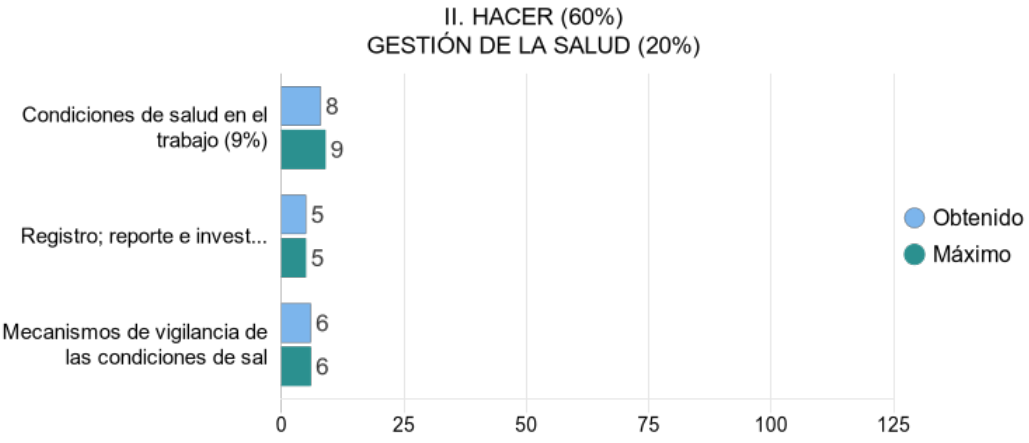


© 2023. SURA. Todos los derechos

El presente informe tiene el carácter de un concepto técnico. Las conclusiones y/o recomendaciones en él contenidas se emiten en razón de la especialidad de los profesionales que intervinieron en su realización y no tienen carácter vinculante ni obligatorio.

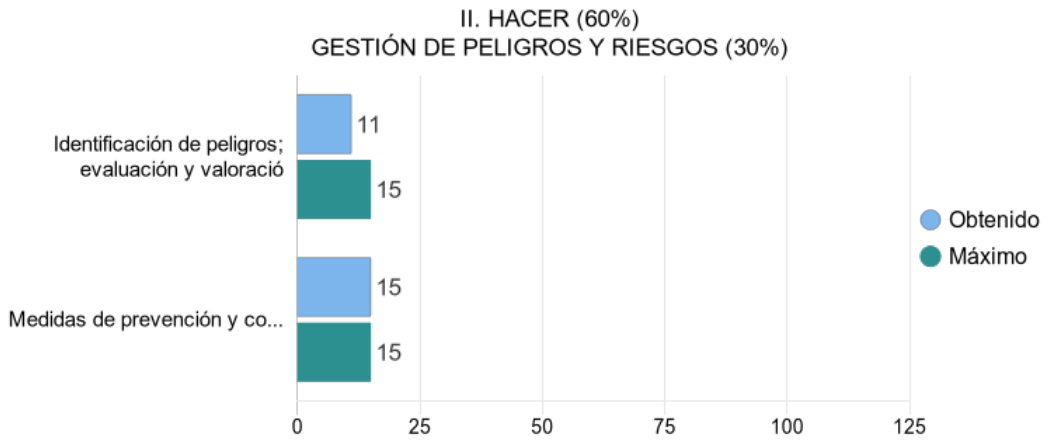


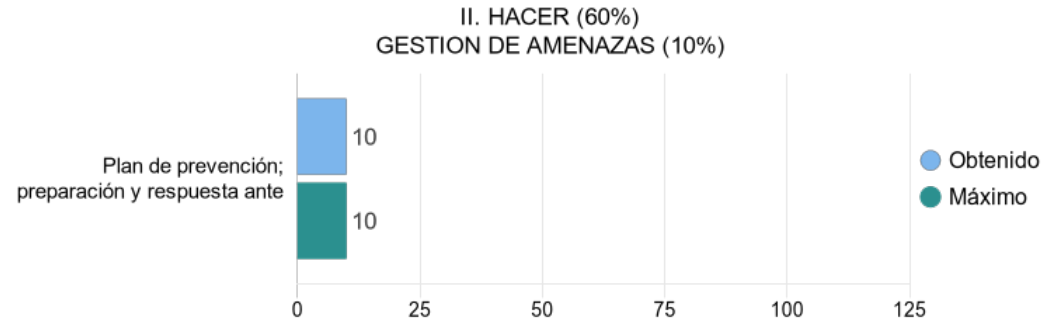

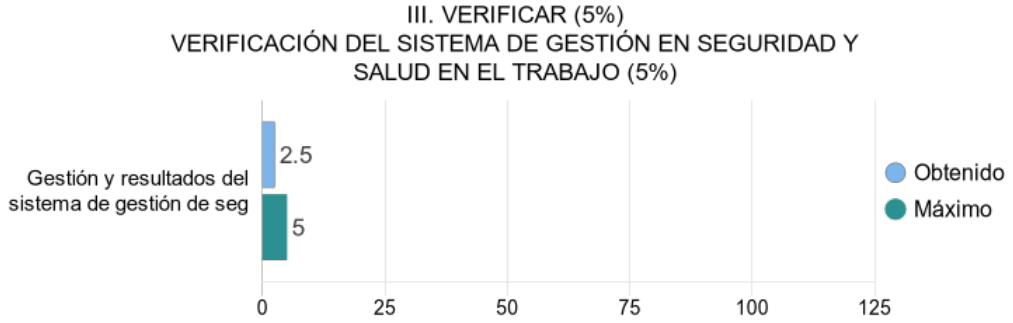

© 2023. SURA. Todos los derechos

El presente informe tiene el carácter de un concepto técnico. Las conclusiones y/o recomendaciones en él contenidas se emiten en razón de la especialidad de los profesionales que intervinieron en su realización y no tienen carácter vinculante ni obligatorio.

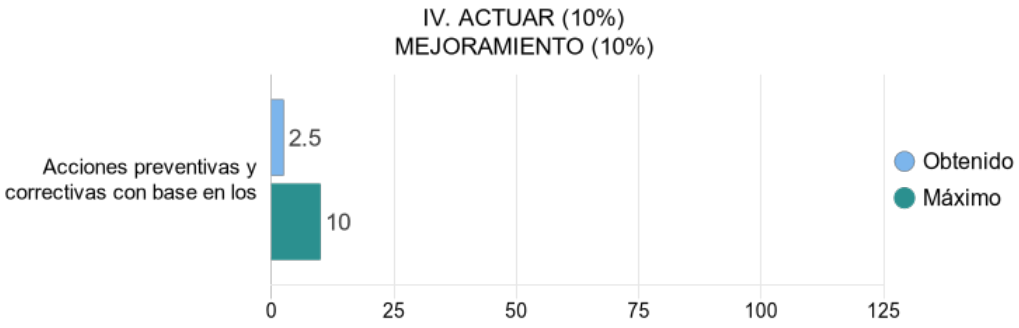

© 2023. SURA. Todos los derechos

El presente informe tiene el carácter de un concepto técnico. Las conclusiones y/o recomendaciones en él contenidas se emiten en razón de la especialidad de los profesionales que intervinieron en su realización y no tienen carácter vinculante ni obligatorio.

Fecha de Generación del documento: 06 de octubre de 2023

Recomendaciones / Observaciones PGL INGENIERIA Y CONSULTORIA SAS

Sección	Pregunta	Respuesta	Recomendaciones	Prioridad	Observación
I. Planear (25%)	1.1.3 Asignación de recursos para el Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST (0.5%)	Cumple totalmente	Debe mantener disponible las evidencias relacionadas con: - Definición y asignación de recursos físicos, humanos y financieros acorde con el plan de trabajo anual - La definición de recursos debe estar documentada.		
	1.1.4 Afiliación al Sistema General de Riesgos Laborales (0.5%)	Cumple totalmente	Debe mantener disponible las evidencias relacionadas con: - Afiliación y pago de la seguridad social de los trabajadores vinculados - Afiliación a Riesgos laborales de los trabajadores independientes - Pago de riesgos laborales de los trabajadores independientes en los casos en los que aplica (riesgo IV y V) - Verificación del pago de la seguridad social de los trabajadores independientes - Verificación de las agremiaciones autorizadas por el Ministerio de Salud y Protección social.		
	1.2.2 Inducción y Reinducción en Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST, actividades de Promoción y Prevención PyP (2%)	Cumple totalmente	Debe mantener disponible las evidencias relacionadas con: - Registro de inducción a todos los trabajadores independiente de su forma de contratación antes del inicio de las labores - Registro de reinducción a todos los trabajadores independiente de su forma de contratación - Contenido de la inducción considerando los elementos asociados con peligros y riesgos, prevención de accidentes y enfermedades laborales, entre otros		
	1.2.3 Responsables del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST con curso virtual de	Cumple totalmente	Debe mantener disponible las evidencias relacionadas con: - El certificado de aprobación de la		

© 2023. SURA. Todos los derechos

El presente informe tiene el carácter de un concepto técnico. Las conclusiones y/o recomendaciones en él contenidas se emiten en razón de la especialidad de los profesionales que intervinieron en su realización y no tienen carácter vinculante ni obligatorio.

	50 horas (2%)		capacitación virtual de 50 horas del SG-SST por parte del responsable del SG-SST		
	2.6.1 Rendición sobre el desempeño (1%)	No cumple	Debe establecer un mecanismo para que sea posible llevar a cabo la rendición de cuentas en SST por parte de todos los trabajadores de acuerdo con las responsabilidades en SST asignadas. - La rendición de cuentas debe estar documentada. - La rendición de cuentas debe realizarse por lo menos una vez al año.		
	2.9.1 Identificación, evaluación, para adquisición de productos y servicios en Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST (1%)	No cumple	Debe: - Elaborar un procedimiento documentado para identificar y evaluar las especificaciones en SST de las compras o adquisicion de productos y servicios. - Socilalizar el procedimiento a las partes interesadas y aplicar el procedimiento para compra y adquisiciones de productos y servicios. - Involucrar a los diferentes procesos para el establecimiento de las especificaciones en SST.		
	2.10.1 Evaluación y selección de proveedores y contratistas (2%)	No cumple	Debe definir los criterios relacionados con SST para la evaluación y selección de proveedores y contratistas - Verificar el cumplimiento de criterios relacionados con SST para la evaluación y selección de proveedores y contratistas. - Mantener las evidencias correspondientes al cumplimiento de los criterios de SST. - Determine los criterios de SST teniendo en cuenta los peligros y riesgos de los bienes y servicios suministrados y los requisitos legales asociados.		
	2.11.1 Evaluación del impacto de cambios internos y externos en el Sistema de Gestión de Seguridad y	No cumple	Debe: - Elaborar un procedimiento documentado para evaluar el impacto		

© 2023. SURA. Todos los derechos

El presente informe tiene el carácter de un concepto técnico. Las conclusiones y/o recomendaciones en él contenidas se emiten en razón de la especialidad de los profesionales que intervinieron en su realización y no tienen carácter vinculante ni obligatorio.

	Salud en el Trabajo SG-SST (1%)		sobre la Seguridad y salud en el trabajo generado por los cambios internos y externos. - Socializar el procedimiento y aplicar los requisitos establecidos en el procedimiento para la gestión del cambio teniendo en cuenta la identificación de peligros, evaluación y valoración del riesgos, la determinación de controles y la comunicación. - Verificar la participación del COPASST en la gestión del cambio.		
II. Hacer (60%)	3.1.1 Descripcion sociodemografica. Diagnostico de Condiciones de Salud (1%)	No cumple	Debe establecer la descripción sociodemográfica y el diagnóstico de las condiciones de salud de los trabajadores teniendo en cuenta las estadísticas sobre la salud de los trabajadores y los resultados de las evaluaciones médicas ocupacionales. - Defina mecanismos para mantener actualizada la información relacionada con la descripción sociodemográfica y el diagnóstico de condiciones de salud. - Defina mecanismos para mantener evidencia del seguimiento y definición de acciones relacionadas con la descripción sociodemográfica y el diagnóstico de las condiciones de salud.		
	3.1.4 Realización de los evaluaciones médicas ocupacionales: Peligros-Periodicidad Comunicación al Trabajador (1%)	Cumple totalmente	Debe mantener disponible las evidencias relacionadas con: - Los conceptos médicos ocupacionales - Documento con la frecuencia de realización de las evaluaciones médicas ocupacionales - Comunicación de los resultados de las evaluaciones médicas		
	3.2.1 Reporte de los accidentes de trabajo y enfermedad laboral a la ARL, EPS y Dirección Territorial del Ministerio de Trabajo (2%)	Cumple totalmente	Debe mantener disponibles las evidencias relacionadas con el reporte de los accidentes de trabajo y enfermedades laborales a la ARL, EPS y al Ministerio cuando corresponde.		

© 2023. SURA. Todos los derechos

El presente informe tiene el carácter de un concepto técnico. Las conclusiones y/o recomendaciones en él contenidas se emiten en razón de la especialidad de los profesionales que intervinieron en su realización y no tienen carácter vinculante ni obligatorio.

	3.2.2 Investigación de Incidentes, Accidentes y Enfermedades Laborales (2%)	Cumple totalmente	Debe mantener disponible las evidencias relacionadas con la investigación de los incidentes, accidentes y enfermedades laborales diagnosticadas y la definición de acciones para la intervención de las causas. También del envío de las investigaciones de accidentes graves y mortales a la ARL y Ministerio.		
	4.1.2 Identificación de peligros con participación de todos los niveles de la empresa (4%)	Cumple totalmente	Debe mantener disponible las evidencias relacionadas con la actualización de la identificación de peligros, evaluación y valoración de los riesgos por lo menos una vez al año o en caso eventos mortales o catastróficos.		
	4.1.4 Realización mediciones ambientales, químicos, físicos y biológicos (4%)	No cumple	Debe identificar los riesgos prioritarios provenientes de peligros químicos, físicos y/o biológicos que requieren mediciones ambientales. - Llevar a cabo mediciones ambientales - Implementar las acciones resultantes de las mediciones ambientales.		
	4.2.5 Mantenimiento periódico de instalaciones, equipos, máquinas, herramientas (2.5%)	Cumple totalmente	Debe mantener disponible las evidencias relacionadas con la realización del mantenimiento preventivo y correctivo de acuerdo con los manuales de uso, las inspecciones y el reporte de condiciones inseguras.		
	4.2.6 Entrega de Elementos de Protección Persona EPP, se verifica con contratistas y subcontratistas (2.5%)	Cumple totalmente	Debe mantener disponible las evidencias relacionadas con la entrega, reposición y capacitación de los elementos de protección personal.		
	5.1.1 Se cuenta con el Plan de Prevención, Preparación y respuesta ante emergencias (5%)	Cumple totalmente	Debe mantener disponible las evidencias relacionadas con la implementación de un plan de prevención, preparación y respuesta ante emergencias en el que se considera la revisión anual, los planos de las instalaciones, la señalización, la realización de simulacros por lo		

© 2023. SURA. Todos los derechos

El presente informe tiene el carácter de un concepto técnico. Las conclusiones y/o recomendaciones en él contenidas se emiten en razón de la especialidad de los profesionales que intervinieron en su realización y no tienen carácter vinculante ni obligatorio.

			menos una vez al año.		
III. Verificar (5%)	6.1.2 Las empresa adelanta auditoría por lo menos una vez al año (1.25%)	No cumple	Debe: - Establecer un programa de auditoria que considere: idoneidad del auditor, frecuencia de la auditoria, presentación de informes, alcance de la auditoria, metodología para la auditoria. - Planificar la auditoria con la participación del COPASST. - Definir planes de acción para el cierre de brechas identificadas.		
	6.1.3 Revisión anual de la alta dirección, resultados de la auditoría (1.25%)	No cumple	Debe llevar a cabo la auditoria al SG-SST y mantener los registros correspondientes: - Establecer un programa de auditoria que considere: idoneidad del auditor, frecuencia de la auditoria, presentación de informes, alcance de la auditoria, metodología para la auditoria. - Planificar la auditoria con la participación del COPASST. - Definir planes de acción para el cierre de brechas identificadas. - Llevar a cabo la revisión por la dirección y mantener los registros correspondientes.		
IV. Actuar (10%)	7.1.1 Definicion de acciones preventivas y correctivas con base en resultados del SG-SST (2.5%)	No cumple	Debe definir un mecanismo que le permita establecer acciones preventivas y correctivas de acuerdo con los hallazgos identificados en: 1. la supervisión de los resultados 2. la realización de las inspecciones de seguridad 3. la medición de los indicadores 4. las recomendaciones del COPASST 5. Investigacion de incidentes, accidentes y enfermedades laborales 6. Recomendaciones de la ARL o de las autoridades competentes 7. Resutados de los indicadore - Consolidar las acciones preventivas y correctivas		

© 2023. SURA. Todos los derechos

El presente informe tiene el carácter de un concepto técnico. Las conclusiones y/o recomendaciones en él contenidas se emiten en razón de la especialidad de los profesionales que intervinieron en su realización y no tienen carácter vinculante ni obligatorio.

			- Implementar las acciones preventivas y correctivas - Realizar seguimiento al cumplimiento de las acciones preventivas y correctivas		
	7.1.2 Acciones de mejora conforme a revisión de la alta dirección. (2.5%)	No cumple	Debe: - Establecer acciones preventivas, correctivas y de mejora cuando se identifique que las medidas de prevención y control han dejado de ser efectivas. - Implementar las acciones preventivas, correctivas y de mejora para garantizar la efectividad de las medidas de prevención y control. - Mantener las evidencias de las acciones preventivas, correctivas y de mejora que se implementen.		
	7.1.4 Elaboracion Plan de mejoramiento, implementacin de medidas y acciones correctivas solicitadas por autoridades y ARL (2.5%)	No cumple	Debe definir un mecanismo que le permita establecer acciones preventivas y correctivas de acuerdo con los requerimientos o recomendaciones de autoridades adminsitrativas y de las administradoras de riesgos laborales: - Consolidar las acciones preventivas y correctivas - Implementar las acciones preventivas y correctivas - Realizar seguimiento al cumplimiento de las acciones preventivas y correctivas - Mantener la evidencia de la implementación de las acciones preventivas y correctivas asociadas con los requerimiento o recomendaciones de autoridades administrativas y de las administradoras de riesgos laborales.		

Nota: En esta tabla aparecen las preguntas que tengan recomendaciones u observaciones

© 2023. SURA. Todos los derechos

El presente informe tiene el carácter de un concepto técnico. Las conclusiones y/o recomendaciones en él contenidas se emiten en razón de la especialidad de los profesionales que intervinieron en su realización y no tienen carácter vinculante ni obligatorio.

Fecha de Generación del documento: 06 de octubre de 2023

Tabla de referencia para valoración:

Planes de mejora conforme al resultado de la autoevaluación de los Estándares Mínimos. Los empleadores o contratantes con trabajadores dependientes, independientes, cooperados, en misión o contratistas y estudiantes deben realizar la autoevaluación de los Estándares Mínimos, el cual tendrá un resultado que obligan o no a realizar un plan de mejora, así:

CRITERIO	VALORACIÓN	ACCIÓN
Si el puntaje obtenido es menor al 60%	CRÍTICO	1. Realizar y tener a disposición del Ministerio del Trabajo un Plan de Mejoramiento de inmediato. 2. Enviar a la respectiva Administradora de Riesgos Laborales a la que se encuentre afiliada el empleador o contratante, un reporte de avances en el termino maximo de tres (3) meses despues de realizada la autoevaluacion de estandares Minimos. 3. Seguimiento anual y plan de visita a la empresa con valoracion critica, por parte del Ministerio del trabajo.
Si el puntaje obtenido está entre el 60 y 85%	MODERADAMENTE ACEPTABLE	1. Realizar y tener a disposición del Ministerio del Trabajo un Plan de Mejoramiento. 2. Enviar a la Administradora de Riesgos Laborales un reporte de avances en el termino maximo de seis (6) meses despues de realizada la autoevaluacion de Estandares Minimos. 3. Plan de visita por parte del Ministerio del trabajo.
Si el puntaje obtenido es mayor a 85%	ACEPTABLE	1. Mantener la calificación y evidencias a disposición del Ministerio del Trabajo, e incluir en el Plan de Anual de Trabajo las mejoras que se establezcan de acuerdo con la evaluacion.

© 2023. SURA. Todos los derechos

El presente informe tiene el carácter de un concepto técnico. Las conclusiones y/o recomendaciones en él contenidas se emiten en razón de la especialidad de los profesionales que intervinieron en su realización y no tienen carácter vinculante ni obligatorio.

SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A. – ARL SURA

Informa que la empresa PGL INGENIERIA Y CONSULTORIA SAS con Nit 901277891 , se encuentra afiliada a ARL SURA.

En cumplimiento de la normatividad vigente, actualmente se encuentra implementando el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) y para ello, PGL INGENIERIA Y CONSULTORIA SAS aplicó la herramienta diagnóstica de la Resolución 0312 de 2019 el 08/07/2022 cuyo resultado se presenta en este informe.

La autoevaluación de los Estándares Mínimos es realizada por el empleador según el artículo 28 de la Resolución 0312 de 2019, y los datos ingresados obedecen única y exclusivamente a su criterio como empresa. ARL SURA no suministra o diligencia información, ni es responsable de los resultados que de ella se generen.

El resultado obtenido es:

Item evaluado	% Calificación Real	Valor Ponderado (%)	% Implementación
I. Planear (25%)	80	25	20
II. Hacer (60%)	91.67	60	55
III. Verificar (5%)	50	5	2.5
IV. Actuar (10%)	25	10	2.5
% Total implementación			**80.0**

De acuerdo a su porcentaje de implementación del 80.0 su resultado es MODERADAMENTE ACEPTABLE.

La empresa es responsable en el desarrollo de las actividades para dar cumplimiento a los requisitos normativos legales vigentes, al monitoreo, disminución y control de los riesgos como también a la implementación total del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, garantizando el bienestar de sus trabajadores.

La presente comunicación se expide a solicitud de la empresa el 06/10/2023.

Atentamente



Gerencia Técnica Arl Sura
Código transacción: 2127751

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900670370	9	ELEVAR EDWIN VARGAS INGENIERIA SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	ELEVAR EDWIN VARGAS INGENIERIA SAS	CRA 11 17 23	TUNJA-BOYACA	7454126	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-08	2023-09	159663815	9456268694	E	2023/09/18	2023/09/14	BANCO DAVIVIENDA	0	$1,427,000

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: ELEVAR EDWIN VARGAS INGENIERIA SAS (2 Afiliados)						$2,817,334	$450,800			$2,817,334	$112,700			$2,817,334	$112,700			$2,817,334	$181,800		$0	$0
Centro de Trabajo: ELEVAR EDWIN VARGAS INGENIERIA (1 Afiliados)						$317,334	$50,800			$317,334	$12,700			$317,334	$12,700			$317,334	$7,800		$0	$0
Ciudad: TUNJA Depto: BOYACA (1 Afiliados)						$317,334	$50,800			$317,334	$12,700			$317,334	$12,700			$317,334	$7,800		$0	$0
1	CC	1052397453	TOBO MARIO	230201	7	$317,334	$50,800	EPS041	7	$317,334	$12,700	CCF10	7	$317,334	$12,700	14-11	7	$317,334	$7,800	7	$0	$0
Centro de Trabajo: ELEVAR EDWIN VARGAS INGENIERIA SAS (1 Afiliados)						$2,500,000	$400,000			$2,500,000	$100,000			$2,500,000	$100,000			$2,500,000	$174,000		$0	$0
Ciudad: TUNJA Depto: BOYACA (1 Afiliados)						$2,500,000	$400,000			$2,500,000	$100,000			$2,500,000	$100,000			$2,500,000	$174,000		$0	$0
2	CC	7175028	VARGAS EDWIN	25-14	30	$2,500,000	$400,000	EPS005	30	$2,500,000	$100,000	CCF10	30	$2,500,000	$100,000	14-11	30	$2,500,000	$174,000	30	$0	$0

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: ADMINISTRATIVOS (2 Afiliados)						$2,320,000	$371,200			$2,320,000	$92,800			$2,320,000	$92,800			$2,320,000	$12,200		$0	$0
Centro de Trabajo: TUNJA (2 Afiliados)						$2,320,000	$371,200			$2,320,000	$92,800			$2,320,000	$92,800			$2,320,000	$12,200		$0	$0
Ciudad: TUNJA Depto: BOYACA (2 Afiliados)						$2,320,000	$371,200			$2,320,000	$92,800			$2,320,000	$92,800			$2,320,000	$12,200		$0	$0
3	CC	1002365798	CRUZ NATALIA	230201	30	$1,160,000	$185,600	EPS005	30	$1,160,000	$46,400	CCF10	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	$6,100	30	$0	$0
4	CC	1049654058	OTALORA PAULA	25-14	30	$1,160,000	$185,600	EPS005	30	$1,160,000	$46,400	CCF10	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	$6,100	30	$0	$0
Total	**Afiliados(4)**					$5,137,334	$822,000			$5,137,334	$205,500			$5,137,334	$205,500			$5,137,334	$194,000		$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900670370	9	ELEVAR EDWIN VARGAS INGENIERIA SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	ELEVAR EDWIN VARGAS INGENIERIA SAS	CRA 11 17 23	TUNJA-BOYACA	7454126	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-08	2023-09	159663815	9456268694	E	2023/09/18	2023/09/14	BANCO DAVIVIENDA	0	$1,427,000

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)				4	$822,000	$0	$0	$822,000
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	2	$585,600	$0	$0	$585,600
PROTECCION	230201	800,229,739	0	2	$236,400	$0	$0	$236,400
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				4	$194,000	$0	$0	$194,000
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	4	$194,000	$0	$0	$194,000
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				4	$205,500	$0	$0	$205,500
COMFABOY	CCF10	891,800,213	8	4	$205,500	$0	$0	$205,500
EPS (ADMINISTRADORAS: 2)				4	$205,500	$0	$0	$205,500
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	1	$12,700	$0	$0	$12,700
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	3	$192,800	$0	$0	$192,800
TOTAL				4	$1,427,000	$0	$0	$1,427,000

PGL INGENIERIA Y CONSULTORIA S.A.S
R/L LUIS EUCARIO PÉREZ GÓMEZ
NIT: 9 0 1 2 7 7 8 9 1-3

CONTRATISTA INTERVENTOR

CERTIFICA QUE:

En cumplimiento a mis obligaciones como interventor del contrato de obra pública **Nº GC-CT-2023-114** CUYO OBJETO ES: **"MEJORAMIENTO DE LAS INSTALACIONES ELECTRICAS RURALES DE LA INSTITUCIÓN EDUCTIVA NUESTRA SEÑORA DE LAS MERCEDES DE MUNICIPIO DE LA UVITA ENMARCADO EN EL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO N° 2165 DE 2023 CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE LA UVITA Y LA GOBERNACIÓN DE BOYACÁ"** y conforme a lo establecido en el pliego de condiciones del proceso de licitación pública **Nº GC-LP-2023-1** en su anexo técnico **título 8 (INFORMACIÓN SOBRE EL PERSONAL PROFESIONAL**) y en sus *numerales 8.1 personal cave, 8.2 requisitos del personal y 8.3 maquinaria mínima exigida en el proyecto*. Después del acta de inicio el contratista **CONSORCIO IE MERCEDES** NIT: 901736175-8 R.L./ **JOSE LEONARDO ALVAREZ FONSECA** allego información en los primeros días. Información que fue revisada por nuestra firma dando aval y cumplimento según lo establecido en los requisitos técnicos del pliego de condiciones.

La presente se expide a solicitud del Municipio de La Uvita a los (4) días del mes de agosto de 2023.

Atentamente,

Firma: _____


Nombre: PGL INGENIERIA Y CONSULTORIA S.A.S
NIT: 9 0 1 2 7 7 8 9 1-3
R/L. **LUIS EUCARIO PÉREZ GÓMEZ**
C.C.: 7 4 .3 7 4 .0 2 9 de Duitama
Interventor

PGL INGENIERÍA Y CONSULTORÍA S.A.S

CERTIFICACIÓN

Yo, LUIS EUCARIO PÉREZ GÓMEZ, en calidad de interventor del alcance **“INTERVENTORÍA TÉCNICA, Y ADMINISTRATIVA PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA PÚBLICA CUYO OBJETO ES" MEJORAMIENTO DE LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS RURALES DE LA INSTITUCIÓN EDUCTIVA NUESTRA SEÑORA DE LAS MERCEDES DE MUNICIPIO DE LA UVITA ENMARCADO EN EL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO N° 2165 DE 2023 CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE LA UVITA Y LA GOBERNACIÓN DE BOYACÁ”** resultante del proceso de contratación N.º GC-LP-2023-01" , certifico que las planillas N.º 9457421490-9456988042-9457037363-9457204152-9456881370, corresponde a los pagos de seguridad de la firma CONSORCIO IE MERCEDES, durante el mes de septiembre 2023, al igual que los trabajadores que aparecen en las planillas integradas, fueron los que laboraron en el desarrollo del alcance perteneciente al contrato de referencia.

En constancia se firma en La Uvita a los 19 días del mes de octubre del 2023



PGL INGENIERÍA Y CONSULTORÍA S.A.S
LUIS EUCARIO PÉREZ GÓMEZ
INTERVENTOR

EL SUSCRITO SECRETARIO DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE LA UVITA DEPARTAMENTO DE BOYACA

CERTIFICA

Que el personal presentado para el desarrollo del proyecto: **"INTERVENTORÍA TECNICA, FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA PÚBLICA CUYO OBJETO ES "MEJORAMIENTO DE LAS INSTALACIONES ELECTRICAS RURALES DE LA INSTITUCIÓN EDUCTIVA NUESTRA SEÑORA DE LAS MERCEDES DE MUNICIPIO DE LA UVITA ENMARCADO EN EL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO N° 2165 DE 2023 CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE LA UVITA Y LA GOBERNACIÓN DE BOYACÁ" RESULTANTE DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN N.° GC-LP-2023-01"**, cumple con los requisitos exigidos en los perfiles profesionales.

Para constancia se firma en La Uvita a los diez (10) días del mes de agosto de 2023.

ING JOSE LUIS CAMERO JAIME
Secretario de Planeación e Infraestructura Municipal.
