SERVICIVIL SAS
NIT 800.147.909-3
DIAGONAL 62 No 43-151
Tel: (037) 6102194
Barrancabermeja - Colombia
SERVICIVIL_LTDA@HOTMAIL.COM

Factura electrónica de venta
No. FEVS 216

Señores	INSTITUCIÒN EDUCATIVA ESCUELA NORMAL SUPERIOR CRISTO REY		
NIT	800.036.029-0	**Teléfono**	(607) 6024401 - Ext. 000 - (607) 3143001059 - Ext. 000
Dirección	CR 28 53 08	**Ciudad**	Barrancabermeja - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	23/10/2024, 15:44
Expedición	23/10/2024, 15:44
Vencimiento	23/10/2024

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto
1	ACTA PARCIAL N. 01, CONTRATO 038-2024, MANTENIMIENTO, REPARACIONDE LA CUBIERTA, RED DE DRENAJE DE AGHUAS LLUVIAS Y ADECUACIONES EN EL COLISEO EN LAS INSTALACIONES DE LA ESCUELA NORMAL SUPERIOR CRISTO REY DE BARRANCABERMEJA.	1.00	32,025,859.94	32,025,859.94
2	ADMINISTRACION 28%	1.00	8,967,240.79	8,967,240.79
3	IMPREVISTOS 1%	1.00	320,258.60	320,258.60
4	UTILIDAD 5%	1.00	1,601,293.00	1,601,293.00

Total items: 4

Total Bruto	42,914,652.33
IVA 19%	304,245.67
Total a Pagar	43,218,898.00

Valor en Letras:
Cuarenta y tres millones doscientos dieciocho mil ochocientos noventa y ocho pesos m/cte

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:
Desembolso Crédito plus (CCD+) - Transferencia $ 43,218,898.00

Observaciones:
FAVOR CONSIGNAR EN LA CUENTA DE AHORROS No. 306-000071-12 A NOMBRE DE SERVICIVIL S.A.S. NIT. 800.147.909-3, BANCOLOMBIA.

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764061830653 aprobado en 20231213 prefijo FEVS desde el número 191 al 500 Vigencia: 12 Meses**
- Actividad Económica 4390 Otras actividades especializadas para la construcción de edificios y obras de ingeniería civil Tarifa 6xMIL
CUFE: c020cad442aa51dc659d5dfc4ddff1b49bb27277796df1d490575537206abf677ab44b79cfe6bd02c7fe431915ccea49

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

La confianza y la credibilidad

que usted ha depositado en Bancolombia nos llenan de orgullo y nos motivan para continuar **acompañándolo en el desarrollo de sus metas.**

Barrancabermeja, 17 de octubre de 2024

Señores
A QUIEN PUEDA INTERESAR
Barrancabermeja
Cordial saludo,

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que el siguiente cliente a la fecha de expedición de esta certificación tiene con el Banco los siguientes productos:

Oficina Dueña : BARRANCABERMEJA
Número Cuenta : 306-000071-12
Tipo de Cuenta : CUENTA AHORROS
Clase Cuenta : JURIDICA
Nombre Corto : SERVICIVIL S.A.S.
N.I.T : 800147909
Estado Cuenta : ACTIVA

El manejo de este (os) producto (s) es adecuado y responde a las condiciones y compromisos adquiridos con BANCOLOMBIA.

Si requiere Referencias Bancarias, Paz y Salvos, Extractos o Consultas de Movimientos por favor solicitarlos a través de la sucursal virtual en el banne, Bancolombia a *UN CLIC!*

Atentamente,

BANCOLOMBIA.
Barrancabermeja - Of. 496 Ivana
Asesor de servicios Nº 154
Cédula Nº

Marla Paola Ardila
Asesor Integral
Oficina Barrancabermeja 306
Barrancabermeja

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
BANCOLOMBIA S.A. Establecimiento Bancario.

ACTA PARCIAL No. 01

CONTRATO DE OBRA No. 038-2024

CONTRATANTE	INSTITUCIÓN EDUCATIVA ESCUELA NORMAL SUPERIOR CRISTO REY
NIT:	800.036.029-0
CONTRATISTA	SERVICIVIL SAS
NIT:	800.147.909-3
REPRESENTANTE LEGAL	JORGE TRUJILLO NIÑO
C.C:	13.893.413 DE BARRANCABERMEJA
DIRECCION	DIAGONAL 62 No. 43 – 151 BARRIO LAS GRANJAS
OBJETO	MANTENIMIENTO, REPARACION DE LA CUBIERTA, RED DE DRENAJE DE AGUAS LLUVIAS Y ADECUACIONES EN EL COLISEO EN LAS INSTALACIONES DE LA ESCUELA NORMAL SUPERIOR CRISTO REY DE BARRANCABERMEJA.
PLAZO DE EJECUCION	DOS (02) MES, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO
VALOR TOTAL	CIENTO TREINTA Y DOS MILLONES CIENTO CINCUENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS VEINTE PESOS MCTE ($132,153,220.00)
RÉGIMEN TRIBUTARIO:	Responsable IVA
SOPORTE PRESUPUESTAL:	DISPONIBILIDAD No. 24-00086 de fecha 05 de septiembre de 2024
CÓDIGO PRESUPUESTAL:	2.1.2.02.02.005-01 MANTENIMIENTO DEL ESTABLECIMIENTO
SUPERVISOR	LEUDER BARBOSA HERNANDEZ
FECHA DE INICIO	PRIMERO (01) DE OCTUBRE DE 2024
FECHA DE FINALIZACION	TREINTA (30) DE NOVIEMBRE DE 2024

Entre los suscritos a saber: Por una parte, **Lic. MARY DENIS DIAZ PLATA**, en su calidad de ordenadora del gasto, el Ingeniero **LEUDER BARBOSA HERNANDEZ**, en calidad de supervisor del contrato y por la otra aparte el contratista **JORGE TRUJILLO NIÑO** en calidad de representante legal de la empresa **SERVICIVIL SAS** identificada con NIT. 800.147.909-3, se reúnen para suscribir el Acta Parcial No. 01 del contrato de Obra No. 038-2024, cuyo objeto es "MANTENIMIENTO, REPARACION DE LA CUBIERTA, RED DE DRENAJE DE AGUAS LLUVIAS Y ADECUACIONES EN EL COLISEO EN LAS INSTALACIONES DE LA ESCUELA NORMAL SUPERIOR CRISTO REY DE BARRANCABERMEJA", de acuerdo con las siguientes consideraciones:

CONSIDERANDO QUE:

1. Que la ESCUELA NORMAL SUPERIOR CRISTO REY suscribió el contrato de obra No. 038-2024 a los veintiséis (26) días del mes de septiembre del 2024 cuyo objeto es "MANTENIMIENTO, REPARACION DE LA CUBIERTA, RED DE DRENAJE DE AGUAS LLUVIAS Y ADECUACIONES EN EL COLISEO EN LAS INSTALACIONES DE LA ESCUELA NORMAL SUPERIOR CRISTO REY DE BARRANCABERMEJA".

2. Que se suscribió el acta de inicio del mencionado contrato con fecha del PRIMERO (01) de OCTUBRE de 2024.

3. Que el contratista ha ejecutado parcialmente las actividades concernientes al objeto del contrato por un valor de CUARENTA Y TRES MILLONES DOSCIENTOS DIECIOCHO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS MCTE ($43,218,898,00) como consta en el archivo adjunto.

4. Que, de acuerdo con lo anterior mencionado, el balance financiero del contrato hasta la presente acta es el siguiente:

CONCEPTO	VALOR	VALOR
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$132.153.220,00	
TOTAL ACTA PARCIAL No. 01		**$43.218.989,00**
SALDO PENDIENTE POR COBRAR		**$ 88.934.324,00**
SUMAS IGUALES	**$132.153.220,00**	**$132.153.220,00**

5. El Supervisor certifica que revisó, verificó y constató el pago de los aportes a seguridad social y parafiscales por parte del contratista, con base en los soportes presentados por éste.

6. Por lo anterior las partes,

ACUERDAN:

1. Suscribir el Acta parcial No. 01 donde se da cumplimiento por parte del contratista JORGE TRUJILLO NIÑO, identificado con 13.893.413 DE BARRANCABERMEJA (SANTANDER), Representante Legal de la empresa SERVICIVIL S.A.S identificada con NIT 800.147.909-3, las actividades objeto del contrato, ejecutados durante el periodo (01 de Octubre de 2024 al 23 de Octubre de 2024), las en las memorias de cálculo presentado por el contratista y a su vez constatados y viabilizados por la supervisión de la Escuela Normal Superior Cristo Rey, dejando constancia que están conforme a las especificaciones y recibidos de conformidad con lo establecido en el mismo.

2. Recibir y autorizar el pago de la presente acta por la suma **CUARENTA Y TRES MILLONES DOSCIENTOS DIECIOCHO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS MCTE ($43,218,898,00).**

Para constancia de lo anterior se firma por los que en ella intervinieron, a los Veintitrés (23) días del mes de octubre de 2024.

POR LA INSTITUCIÓN EDUCTIVA
ESCUELA NORMAL SUPERIOR
CRISTO REY.

Lic. MARY DENIS DIAZ PLATA
RECTORA

LEUDER BARBOSA HERNANDEZ
SUPERVISOR

CONTRATISTA

JORGE TRUJILLO NIÑO
R.L SERVICIVIL SAS
Nit: 800.147.909-3

ACTA DE RECIBO PARCIAL No. 01 DEL CONTRATO DE OBRA No. 038-2024

OBJETO: MANTENIMIENTO, REPARACION DE LA CUBIERTA, RED DE DRENAJE DE AGUAS LLUVIAS Y ADECUACIONES EN EL COLISEO EN LAS INSTALACIONES DE LA ESCUELA NORMAL SUPERIOR CRISTO REY DE BARRANCABERMEJA.

FECHA DE INICIO: 1/10/2024
FECHA FINAL: 30/11/2024

VALOR INICIAL: CIENTO TREINTA Y DOS MILLONES CIENTO CINCUENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS VEINTE PESOS MCTE ($132,153,220.00)
CONTRATISTA : SERVICIVIL S.A.S.
SUPERVISOR: LEUDER BARBOSA HERNANDEZ
PERIODO A PAGAR: DEL 01 DE OCTUBRE 2024 AL 23 DE OCTUBRE DE 2024

PORCENTAJE EJECUTADO PRESENTE ACTA 32,70%
PORCENTAJE ACUMULADO TOTAL 32,70%

A los VEINTITRES (23) dias del mes de octubre del año 2024 se reunieron JORGE TRUJILLO NIÑO en calidad de representante de la firma contratista y el Ingeniero LEUDER BARBOSA HERNANDEZ supervisor, para realizar la presente acta de corte de las siguiente actividades según los siguientes considerandos y las condiciones que se detallan a continuación:

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CONDICIONES INICIALES DEL CONTRATO			CONDICIONES VIGENTES DEL CONTRATO			CANTIDADES EJECUTADAS			VALORES EJECUTADOS			SALDOS	
			CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR	PRESENTE ACTA No.01	ACUMULADO TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR	PRESENTE ACTA No.01	ACUMULADO TOTAL	CANTIDAD	VALOR
1	CUBIERTA															
1,1	Mantenimiento, limpieza e impermeabilización cubierta de circulación con aplicación de sikafill power 12 y emulsión asfactica de sika para juntas de dilatación	m2	160,00	$ 76.712,00	$ 12.273.920,00	160,00	$ 76.712,00	$ 12.273.920,00		150,00	150,00	$ -	$ 11.506.800,00	$ 11.506.800,00	10,00	$ 767.120,00
1,2	Desmonte de pañete afectado en placas de cubierta	m2	80,00	$ 11.754,00	$ 940.320,00	80,00	$ 11.754,00	$ 940.320,00		50,00	50,00	$ -	$ 587.700,00	$ 587.700,00	30,00	$ 352.620,00
1,3	Instalación de pañete en placa de cubierta	m2	80,00	$ 48.557,00	$ 3.884.560,00	80,00	$ 48.557,00	$ 3.884.560,00		50,00	50,00	$ -	$ 2.427.850,00	$ 2.427.850,00	30,00	$ 1.456.710,00
1,4	Pintura de placas de cubierta tipo 1 interiores	m2	160,00	$ 27.223,00	$ 4.355.680,00	160,00	$ 27.223,00	$ 4.355.680,00		150,00	150,00	$ -	$ 4.083.450,00	$ 4.083.450,00	10,00	$ 272.230,00
1,5	Desmonte bajantes existentes en fibro-cemento	Und	8,00	$ 30.069,00	$ 240.552,00	8,00	$ 30.069,00	$ 240.552,00		-	-	$ -	$ -	$ -	8,00	$ 240.552,00
1,6	Mantenimiento, limpieza e impermeabilización de viga canal - aplicación de sikafill power 12 y Sikafill 300 thermic	ml	80,00	$ 50.734,00	$ 4.058.720,00	80,00	$ 50.734,00	$ 4.058.720,00		-	-	$ -	$ -	$ -	80,00	$ 4.058.720,00
1,7	Suministro e instalación de bajantes en PVC - 4" (3m) incluye accesorios	Und	8,00	$ 137.169,00	$ 1.097.352,00	8,00	$ 137.169,00	$ 1.097.352,00		-	-	$ -	$ -	$ -	8,00	$ 1.097.352,00
2	RED DE AGUAS LLUVIAS															
2,1	Localización y Replanteo	ml	200,00	$ 2.664,00	$ 532.800,00	200,00	$ 2.664,00	$ 532.800,00		200,00	200,00	$ -	$ 532.800,00	$ 532.800,00	-	$ -
2.2	Cerramiento provisional para área de trabajo para protección de la excavación	ml	60,00	$ 11.073,00	$ 664.380,00	60,00	$ 11.073,00	$ 664.380,00		-	-	$ -	$ -	$ -	60,00	$ 664.380,00
2.3	Excavación Manual	m3	56,00	$ 35.087,00	$ 1.964.872,00	56,00	$ 35.087,00	$ 1.964.872,00		-	-	$ -	$ -	$ -	56,00	$ 1.964.872,00
2.4	Demolición enchape de piso y concreto (andenes)	m3	1,44	$ 79.774,00	$ 114.875,00	1,44	$ 79.774,00	$ 114.875,00		-	-	$ -	$ -	$ -	1,44	$ 114.874,56
2.5	Retiro de tubería de gres	m	200,00	$ 13.587,00	$ 2.717.400,00	200,00	$ 13.587,00	$ 2.717.400,00		-	-	$ -	$ -	$ -	200,00	$ 2.717.400,00
2.6	Suministro e instalación de Tubería novafort PVC 6", incluye cama de arena y relleno material de excavación	m	200,00	$ 58.881,00	$ 11.776.200,00	200,00	$ 58.881,00	$ 11.776.200,00		-	-	$ -	$ -	$ -	200,00	$ 11.776.200,00
2.7	Suministro e instalación de sistema de rejilla con tragante de 8" a 6" en aluminio, (incluye accesorios y conexionado a tubería de 6")	und	13,00	$ 470.488,00	$ 6.116.344,00	13,00	$ 470.488,00	$ 6.116.344,00		-	-	$ -	$ -	$ -	13,00	$ 6.116.344,00
2.8	Suministro e instalación concreto 3000 psi	m3	2,00	$ 787.492,00	$ 1.574.984,00	2,00	$ 787.492,00	$ 1.574.984,00		-	-	$ -	$ -	$ -	2,00	$ 1.574.984,00
2.9	Suministro e Instalación Tableta, incluye mortero de nivelación	ml	6,00	$ 73.326,00	$ 439.956,00	6,00	$ 73.326,00	$ 439.956,00		-	-	$ -	$ -	$ -	6,00	$ 439.956,00
2.10	Limpieza de carcamos de all (incluye trasiego para acopio temporal)	ml	120,00	$ 7.419,00	$ 890.280,00	120,00	$ 7.419,00	$ 890.280,00		120,00	120,00	$ -	$ 890.280,00	$ 890.280,00	-	$ -
2.11	Mantenimiento de rejillas de carcamos y rejillas de cajas de ALL	m	120,00	$ 100.304,00	$ 12.036.480,00	120,00	$ 100.304,00	$ 12.036.480,00		-	-	$ -	$ -	$ -	120,00	$ 12.036.480,00
2.12	Limpieza y disposición final de escombros	viaje	3,00	$ 636.102,00	$ 1.908.306,00	3,00	$ 636.102,00	$ 1.908.306,00		-	-	$ -	$ -	$ -	3,00	$ 1.908.306,00
3	COLISEO															
3,1	PRELIMINARES															
3.1.1	Lavado de muro en fondo del coliseo	m2	252,00	$ 8.417,00	$ 2.121.084,00	252,00	$ 8.417,00	$ 2.121.084,00		252,00	252,00	$ -	$ 2.121.084,00	$ 2.121.084,00	-	$ -
3.1.2	Lavado de graderias	m2	133,64	$ 8.417,00	$ 1.124.848,00	133,64	$ 8.417,00	$ 1.124.848,00		133,64	133,64	$ -	$ 1.124.848,00	$ 1.124.847,88	-	$ -
3.1.3	Desmonte de ventiladores deteriorados	und	8,00	$ 40.485,00	$ 323.880,00	8,00	$ 40.485,00	$ 323.880,00		7,00	7,00	$ -	$ 283.395,00	$ 283.395,00	1,00	$ 40.485,00
3,2	GRADERIAS															
3.2.1	Construccion de columnetas en concreto para graderias con dimensiones 0,10 m x 0,10 m incluye acero de refuerzo	ml	8,45	$ 159.933,00	$ 1.351.434,00	8,45	$ 159.933,00	$ 1.351.434,00		8,45	8,45	$ -	$ 1.351.434,00	$ 1.351.433,85	-	$ -
3.2.2	Construccion de muro en ladrillo a la vista para graderia	m2	6,24	$ 187.704,00	$ 1.171.273,00	6,24	$ 187.704,00	$ 1.171.273,00		6,24	6,24	$ -	$ 1.171.273,00	$ 1.171.272,96	-	$ -
3.2.3	Suministro e instalacion de barandas tubulares metalica galvanizada de seguridad para graderias	ml	31,60	$ 163.490,00	$ 5.166.284,00	31,60	$ 163.490,00	$ 5.166.284,00		17,20	17,20	$ -	$ 2.812.028,00	$ 2.812.028,00	14,40	$ 2.354.256,00
3.2.4	Construccion de pasos para acceso a graderia	und	32,00	$ 93.028,00	$ 2.976.896,00	32,00	$ 93.028,00	$ 2.976.896,00		32,00	32,00	$ -	$ 2.976.896,00	$ 2.976.896,00	-	$ -
3,3	SISTEMA ELECTRICO															
3.3.1	Desmonte, suministro e instalacion de canaleta para red electrica	ml	80,00	$ 25.538,00	$ 2.043.040,00	80,00	$ 25.538,00	$ 2.043.040,00		-	-	$ -	$ -	$ -	80,00	$ 2.043.040,00

ACTA DE RECIBO PARCIAL No. 01 DEL CONTRATO DE OBRA No. 038-2024

OBJETO: MANTENIMIENTO, REPARACION DE LA CUBIERTA, RED DE DRENAJE DE AGUAS LLUVIAS Y ADECUACIONES EN EL COLISEO EN LAS INSTALACIONES DE LA ESCUELA NORMAL SUPERIOR CRISTO REY DE BARRANCABERMEJA.

VALOR INICIAL: CIENTO TREINTA Y DOS MILLONES CIENTO CINCUENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS VEINTE PESOS MCTE ($132,153,220.00)

CONTRATISTA : SERVICIVIL S.A.S.

SUPERVISOR: LEUDER BARBOSA HERNANDEZ

PERIODO A PAGAR: DEL 01 DE OCTUBRE 2024 AL 23 DE OCTUBRE DE 2024

FECHA DE INICIO: 1/10/2024

FECHA FINAL: 30/11/2024

PORCENTAJE EJECUTADO PRESENTE ACTA 32,70%

PORCENTAJE ACUMULADO TOTAL 32,70%

A los VEINTITRES (23) días del mes de octubre del año 2024 se reunieron JORGE TRUJILLO NIÑO en calidad de representante de la firma contratista y el Ingeniero LEUDER BARBOSA HERNANDEZ supervisor, para realizar la presente acta de corte de las siguiente actividades según los siguientes considerandos y las condiciones que se detallan a continuación:

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CONDICIONES INICIALES DEL CONTRATO			CONDICIONES VIGENTES DEL CONTRATO			CANTIDADES EJECUTADAS			VALORES EJECUTADOS			SALDOS	
			CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR	PRESENTE ACTA No.01	ACUMULADO TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR	PRESENTE ACTA No.01	ACUMULADO TOTAL	CANTIDAD	VALOR
3.3.2	Suministro e instalacion de ventiladores	und	8,00	$ 513.024,00	$ 4.104.192,00	8,00	$ 513.024,00	$ 4.104.192,00		-	-	$ -	$ -	$ -	8,00	$ 4.104.192,00
3.3.3	Suministro e instalacion tablero trifasico	und	1,00	$ 344.618,00	$ 344.618,00	1,00	$ 344.618,00	$ 344.618,00		-	-	$ -	$ -	$ -	1,00	$ 344.618,00
3.3.4	Suministro e instalacion de luminaria parte superior central en cubierta	und	6,00	$ 136.086,00	$ 816.516,00	6,00	$ 136.086,00	$ 816.516,00		-	-	$ -	$ -	$ -	6,00	$ 816.516,00
3.4	MURO DE FONDO															
3.4.1	Suministro e instalacion de barniz para muros de fondo	m2	122,00	$ 23.661,00	$ 2.886.642,00	122,00	$ 23.661,00	$ 2.886.642,00		-	-	$ -	$ -	$ -	122,00	$ 2.886.642,00
3.4.2	Suministro e instalacion de pintura gris basalto para columnas y vigas de muro	m2	20,00	$ 30.562,00	$ 611.240,00	20,00	$ 30.562,00	$ 611.240,00		-	-	$ -	$ -	$ -	20,00	$ 611.240,00
3.5	CUBIERTA															
3.5.1	Suministro e instalacion de ipermeabilizacion (manto fiberglass o similar)	m2	30,00	$ 64.032,00	$ 1.920.960,00	30,00	$ 64.032,00	$ 1.920.960,00		-	-	$ -	$ -	$ -	30,00	$ 1.920.960,00
3.5.2	Suministro e instalacion de sika Fil 12 (Impermeabilizacion)	m2	30,00	$ 53.456,00	$ 1.603.680,00	30,00	$ 53.456,00	$ 1.603.680,00		-	-	$ -	$ -	$ -	30,00	$ 1.603.680,00
4	TRANSPORTE															
4,1	Transporte interno de material a punto de acopio	M3	16,00	$ 52.007,00	$ 832.112,00	16,00	$ 52.007,00	$ 832.112,00		3,00	3,00	$ -	$ 156.021,00	$ 156.021,00	13,00	$ 676.091,00
4.2	Retiro de material sobrante tipo escombro	M3	16,00	$ 58.804,00	$ 940.864,00	16,00	$ 58.804,00	$ 940.864,00		-	-	$ -	$ -	$ -	16,00	$ 940.864,00
	VALOR TOTAL COSTOS DIRECTOS				$ 97.927.544,00							$ -	$ 32.025.859,00	$ 32.025.859,00		$ 65.901.685,00
	VALOR TOTAL COSTOS INDIRECTOS				$ 33.295.364,00							$ -	$ 10.888.793,00	$ 10.888.793,00		$ 22.406.573,00
	ADMINISTRACIÓN	28%			$ 27.419.712,00							$ -	$ 8.967.241,00	$ 8.967.241,00		$ 18.452.472,00
	IMPREVISTOS	1%			$ 979.275,00							$ -	$ 320.259,00	$ 320.259,00		$ 659.017,00
	UTILIDAD	5%			$ 4.896.377,00							$ -	$ 1.601.293,00	$ 1.601.293,00		$ 3.295.084,00
	VALOR TOTAL COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS				$ 131.222.908,00							$ -	$ 42.914.652,00	$ 42.914.652,00		$ 88.308.258,00
	VALOR DEL IVA SOBRE UTILIDAD	19%			930.311,63								$ 304.246,00	$ 304.246,00		$ 626.066,00
	AMORTIZACION DE ANTICIPO (%)															
	VALOR A PAGAR				$ 132.153.219,63								$ 43.218.898,00	$ 43.218.898,00		$ 88.934.324,00

SON: CUARENTA Y TRES MILLONES DOSCIENTOS DIECIOCHO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS MCTE ($43,218,898,00)

El recibo por parte de la supervisión de las obras ejecutadas no exima al contratista de su responsabilidad y de las obligaciones a que hace referencia el citado contrato de obra.
Para constancia de lo anterior, firman la presente acta de parcial de pago los que en ella intervinieron.

Firma:
Nombre: JORGE TRUJILLO NIÑO
REPRESENTANTE LEGAL DEL CONTRATISTA

Firma:
Nombre: LEUDER BARBOSA HERNANDEZ
SUPERVISOR DEL CONTRATO DE OBRA No. 038-2024
ESCUELA NORMAL SUPERIOR CRISTO REY


NOTA: Se informa que la presente acta, se puede cancelar teniendo como base el principio de confiabilidad y responsabilidad del supervisor y el contratista.
Las mediciones en campo y las revisiones documentales que deberán hacerse por parte del supervisor(a).
Las cantidades y valores consignados en la presente acta son responsabilidad exclusiva del supervisor y el contratista.

SERVICIVIL SAS	**MANTENIMIENTO, REPARACION DE LA CUBIERTA, RED DE DRENAJE DE AGUAS LLUVIAS Y ADECUACIONES EN EL COLISEO EN LAS INSTALACIONES DE LA ESCUELA NORMAL SUPERIOR CRISTO REY DE BARRANCABERMEJA**			JHS ESCUELA NORMAL SUPERIOR CRISTO REY BARRANCABERMEJA
CONTRATISTA	SERVICIVL S.A.S	**NIT**	800.147.909-3	**CTO OBRA PUBLICA N°** 038-2024

FECHA	**DIA**	23	**MES**	10	**AÑO**	2024	**ACTA N°**	1	**ELABORÓ**	ING. JORGE TRUJILLO NIÑO

ITEM	**1,10**	**DESCRIPCIÓN**	Mantenimiento, limpieza e impermeabilización cubierta de circulación con aplicación de sikafill power 12 y emulsión asfactica de sika para juntas de dilatación	**UNIDAD**	M2

DIAGRAMA / FOTOGRAFIA/ PLANO

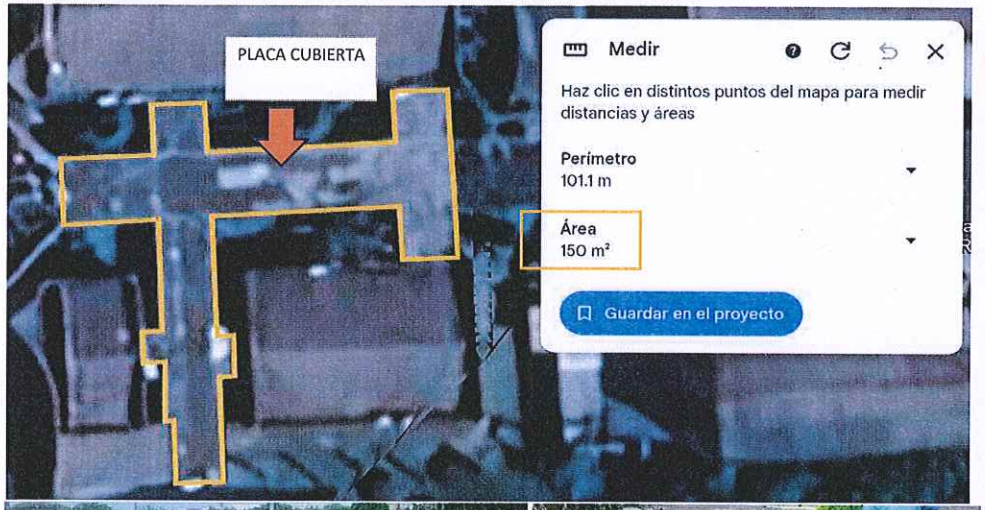









OPERACIONES MATEMATICAS

Mantenimiento, limpieza e impermeabilización cubierta de circulación con aplicación de sikafill power 12 y

Area Cubierta =		
Area	150,00	M2
Total =	150,00	M2
CANTIDAD EJECUTADA	**150,00**	**M2**

Contratista Residente de Obra Ing. JORGE TRUJILLO NIÑO	Supervisor LEUDER BARBOSA HERNANDEZ




SERVICIVIL SAS	MANTENIMIENTO, REPARACION DE LA CUBIERTA, RED DE DRENAJE DE AGUAS LLUVIAS Y ADECUACIONES EN EL COLISEO EN LAS INSTALACIONES DE LA ESCUELA NORMAL SUPERIOR CRISTO REY DE BARRANCABERMEJA	JHS ESCUELA NORMAL SUPERIOR CRISTO REY BARRANCABERMEJA


								HOJA	2	DE	2
FECHA	DIA	23	MES	10	AÑO	2024	ACTA N°	1	ELABORÓ	ING. JORGE TRUJILLO	

SUPERVISOR	LEUDER BARBOSA HERNANDEZ	NIT O C.C.		RESOLUCIÓN N°	
CONTRATISTA	SERVICIVIL S.A.S	NIT O C.C.	800.147.909-3	CONTRATO N°	038-2024

ITEM	1,10	DESCRIPCIÓN	Mantenimiento, limpieza e impermeabilización cubierta de circulación con aplicación de sikafill power 12 y emulsión asfactica de sika para juntas de dilatación	UNIDAD	M2

DIAGRAMA / FOTOGRAFIA/ PLANO

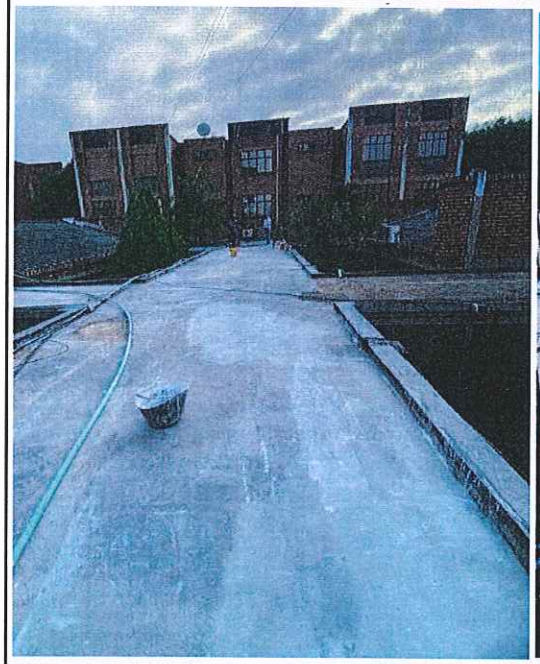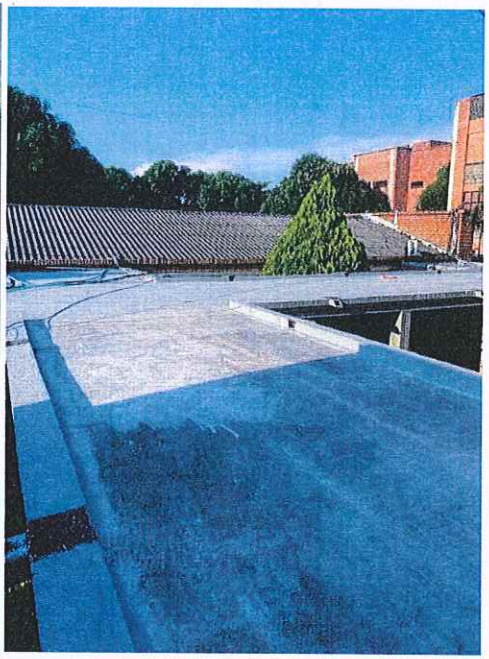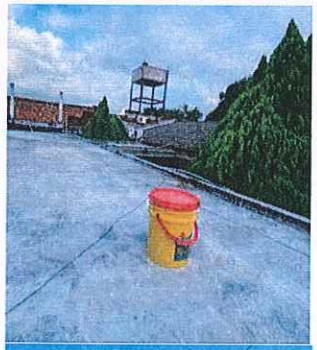

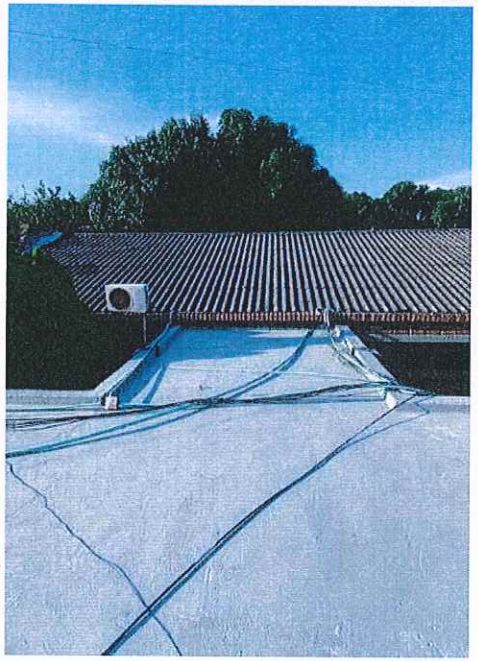OBSERVACIONES:


Contratista Residente de Obra Ing. JORGE TRUJILLO NIÑO	Supervisor LEUDER BARBOSA HERNANDEZ

SERVICIVIL SAS	**MANTENIMIENTO, REPARACION DE LA CUBIERTA, RED DE DRENAJE DE AGUAS LLUVIAS Y ADECUACIONES EN EL COLISEO EN LAS INSTALACIONES DE LA ESCUELA NORMAL SUPERIOR CRISTO REY DE BARRANCABERMEJA**				JHS ESCUELA NORMAL SUPERIOR CRISTO REY BARRANCABERMEJA
CONTRATISTA	SERVICIVL S.A.S	NIT	800.147.909-3	CTO OBRA PUBLICA N°	038-2024

FECHA	DIA	23	MES	10	AÑO	2024	ACTA N°	1	ELABORÓ	ING. JORGE TRUJILLO NIÑO

ITEM	1,20	DESCRIPCIÓN	Desmonte de pañete afectado en placas de cubierta	UNIDAD	M2

DIAGRAMA / FOTOGRAFIA/ PLANO

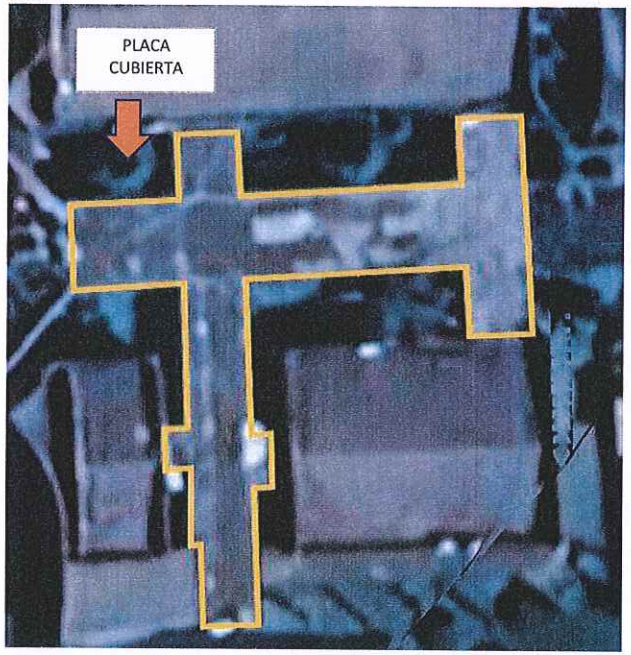





OPERACIONES MATEMATICAS

Desmonte de pañete afectado en placas de cubierta

PLACA CUBIERTA		
Área =	50,00	M2
Total =	50,00	M2
CANTIDAD EJECUTADA	**50,00**	**M2**

OBSERVACIONES:


Contratista Residente de Obra Ing. JORGE TRUJILLO NIÑO	Supervisor LEUDER BARBOSA HERNANDEZ

SERVICIVIL SAS	MANTENIMIENTO, REPARACION DE LA CUBIERTA, RED DE DRENAJE DE AGUAS LLUVIAS Y ADECUACIONES EN EL COLISEO EN LAS INSTALACIONES DE LA ESCUELA NORMAL SUPERIOR CRISTO REY DE BARRANCABERMEJA	JHS ESCUELA NORMAL SUPERIOR CRISTO REY BARRANCABERMEJA

								HOJA	2	DE	2
FECHA	DIA	23	MES	10	AÑO	2024	ACTA N°	1	ELABORÓ	ING. JORGE TRUJILLO	
SUPERVISOR	LEUDER BARBOSA HERNANDEZ						NIT O C.C.		RESOLUCIÓN N°		
CONTRATISTA	SERVICIVIL S.A.S						NIT O C.C.	800.147.909-3	CONTRATO N°	038-2024	

ITEM	1,2	DESCRIPCIÓN	Desmonte de pañete afectado en placas de cubierta	UNIDAD	M2

DIAGRAMA / FOTOGRAFIA/ PLANO

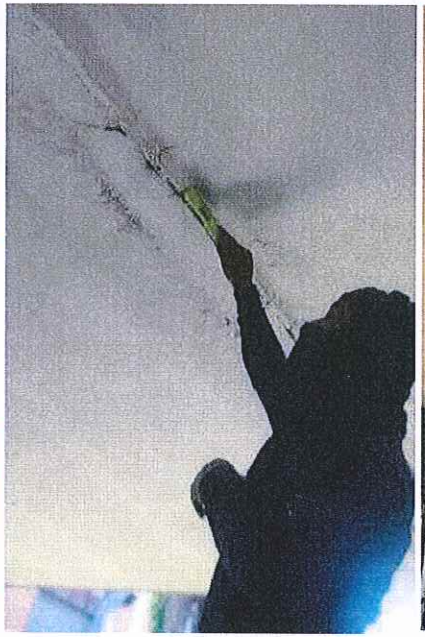

OBSERVACIONES:

Contratista Residente de Obra Ing. JORGE TRUJILLO NIÑO	Supervisor LEUDER BARBOSA HERNANDEZ


SERVICIVIL SAS	**MANTENIMIENTO, REPARACION DE LA CUBIERTA, RED DE DRENAJE DE AGUAS LLUVIAS Y ADECUACIONES EN EL COLISEO EN LAS INSTALACIONES DE LA ESCUELA NORMAL SUPERIOR CRISTO REY DE BARRANCABERMEJA**	JHS ESCUELA NORMAL SUPERIOR CRISTO REY BARRANCABERMEJA

CONTRATISTA	SERVICIVL S.A.S	NIT	- 800.147.909-3	CTO OBRA PUBLICA N°	038-2024

FECHA	DIA	23	MES	10	AÑO	2024	ACTA N°	1	ELABORÓ	ING. JORGE TRUJILLO NIÑO

ITEM	1,30	DESCRIPCIÓN	Instalación de pañete en placa de cubierta	UNIDAD	M2

DIAGRAMA / FOTOGRAFIA/ PLANO

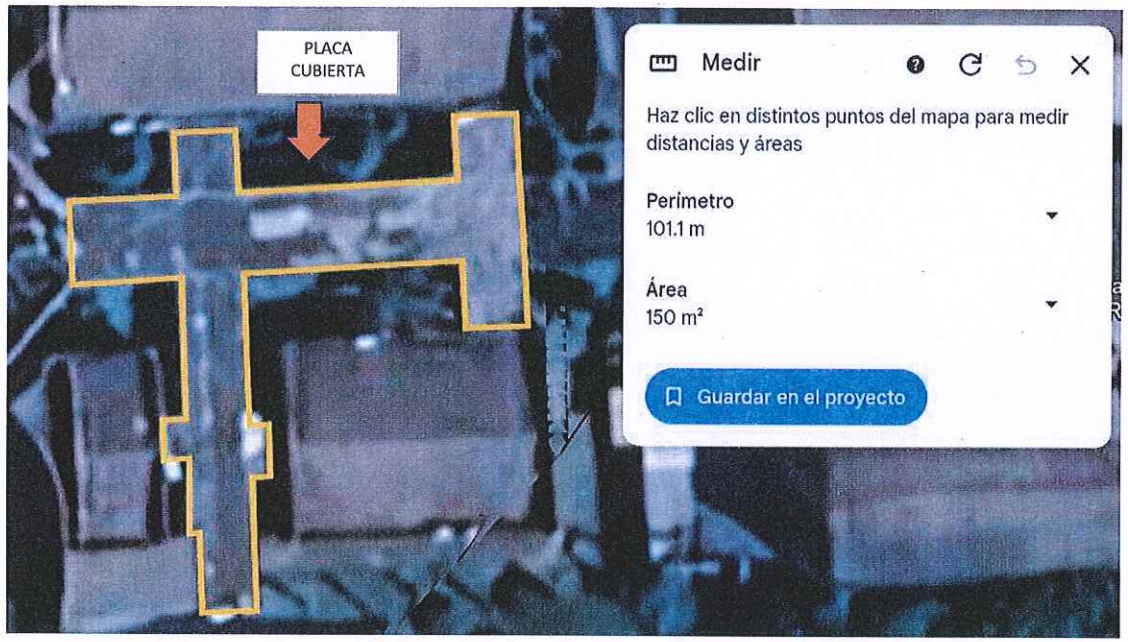

OPERACIONES MATEMATICAS

Instalación de pañete en placa de cubierta

PLACA CUBIERTA

Área =	50,00	M2
Total =	50,00	M2

CANTIDAD EJECUTADA	50,00	M2

OBSERVACIONES:

Contratista Residente de Obra	Supervisor
Ing. JORGE TRUJILLO NIÑO	LEUDER BARBOSA HERNANDEZ

SERVICIVIL SAS	MANTENIMIENTO, REPARACION DE LA CUBIERTA, RED DE DRENAJE DE AGUAS LLUVIAS Y ADECUACIONES EN EL COLISEO EN LAS INSTALACIONES DE LA ESCUELA NORMAL SUPERIOR CRISTO REY DE BARRANCABERMEJA	JHS ESCUELA NORMAL SUPERIOR CRISTO REY BARRANCABERMEJA

								HOJA	2	DE	2
FECHA	DIA	23	MES	10	AÑO	2024	ACTA N°	1	ELABORÓ	ING. JORGE TRUJILLO	

SUPERVISOR	LEUDER BARBOSA HERNANDEZ	NIT O C.C.		RESOLUCIÓN N°	
CONTRATISTA	SERVICIVIL S.A.S	NIT O C.C.	800.147.909-3	CONTRATO N°	038-2024

ITEM	1,30	DESCRIPCIÓN	Instalación de pañete en placa de cubierta	UNIDAD	M2

DIAGRAMA / FOTOGRAFIA/ PLANO






OBSERVACIONES:

Contratista Residente de Obra Ing. JORGE TRUJILLO NIÑO	Supervisor LEUDER BARBOSA HERNANDEZ


SERVICIVIL SAS	**MANTENIMIENTO, REPARACION DE LA CUBIERTA, RED DE DRENAJE DE AGUAS LLUVIAS Y ADECUACIONES EN EL COLISEO EN LAS INSTALACIONES DE LA ESCUELA NORMAL SUPERIOR CRISTO REY DE BARRANCABERMEJA**	JHS ESCUELA NORMAL SUPERIOR CRISTO REY BARRANCABERMEJA

CONTRATISTA	SERVICIVL S.A.S	NIT	800.147.909-3	CTO OBRA PUBLICA N°	038-2024

FECHA	DIA	23	MES	10	AÑO	2024	ACTA N°	1	ELABORÓ	ING. JORGE TRUJILLO NIÑO

ITEM	1,40	DESCRIPCIÓN	Pintura de placas de cubierta tipo 1 interiores	UNIDAD	M2

DIAGRAMA / FOTOGRAFIA/ PLANO

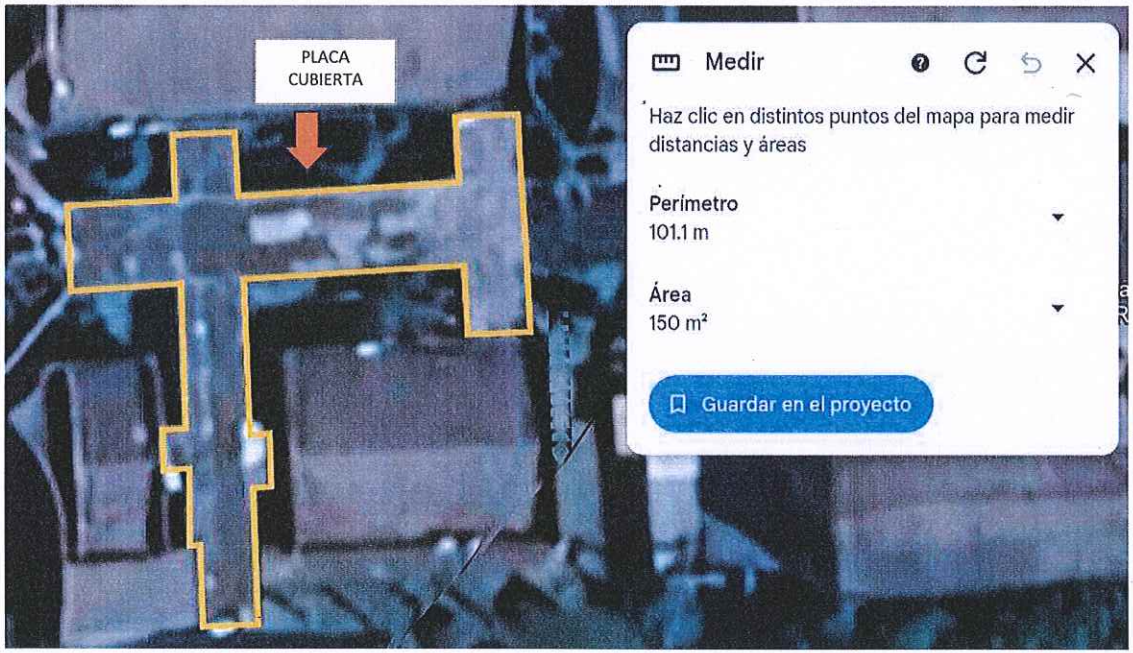

OPERACIONES MATEMATICAS

Pintura de placas de cubierta tipo 1 interiores

Area Cubierta =		
Area	150,00	M2
Total =	150,00	M2

CANTIDAD EJECUTADA	150,00	M2

OBSERVACIONES:

Contratista Residente de Obra Ing. JORGE TRUJILLO NIÑO	Supervisor LEUDER BARBOSA HERNANDEZ


SERVICIVIL SAS	MANTENIMIENTO, REPARACION DE LA CUBIERTA, RED DE DRENAJE DE AGUAS LLUVIAS Y ADECUACIONES EN EL COLISEO EN LAS INSTALACIONES DE LA ESCUELA NORMAL SUPERIOR CRISTO REY DE BARRANCABERMEJA	JHS ESCUELA NORMAL SUPERIOR CRISTO REY BARRANCABERMEJA


								HOJA	2	DE	2
FECHA	DIA	23	MES	10	AÑO	2024	ACTA N°	1	ELABORÓ	ING. JORGE TRUJILLO	

SUPERVISOR	LEUDER BARBOSA HERNANDEZ	NIT O C.C.		RESOLUCIÓN N°	
CONTRATISTA	SERVICIVIL S.A.S	NIT O C.C.	800.147.909-3	CONTRATO N°	038-2024

ITEM	1,40	DESCRIPCIÓN	Pintura de placas de cubierta tipo 1 interiores	UNIDAD	M2

DIAGRAMA / FOTOGRAFIA/ PLANO

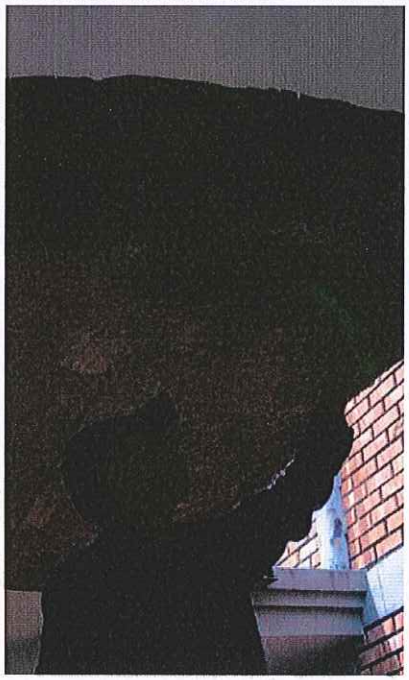OBSERVACIONES:

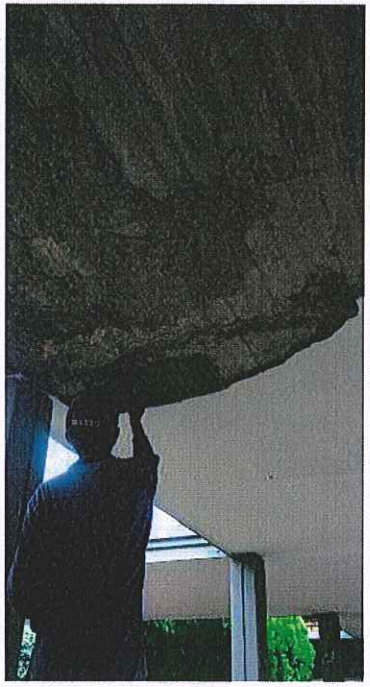Contratista Residente de Obra Ing. JORGE TRUJILLO NIÑO	Supervisor LEUDER BARBOSA HERNANDEZ


SERVICIVIL SAS	**MANTENIMIENTO, REPARACION DE LA CUBIERTA, RED DE DRENAJE DE AGUAS LLUVIAS Y ADECUACIONES EN EL COLISEO EN LAS INSTALACIONES DE LA ESCUELA NORMAL SUPERIOR CRISTO REY DE BARRANCABERMEJA**	JHS ESCUELA NORMAL SUPERIOR CRISTO REY BARRANCABERMEJA

CONTRATISTA	SERVICIVL S.A.S	NIT	800.147.909-3	CTO OBRA PUBLICA N°	038-2024

FECHA	DIA	23	MES	10	AÑO	2024	ACTA N°	1	ELABORÓ	ING. JORGE TRUJILLO NIÑO

ITEM	2,1	DESCRIPCIÓN	LOCALIZACION Y REPLANTEO	UNIDAD	ML

DIAGRAMA / FOTOGRAFIA/ PLANO

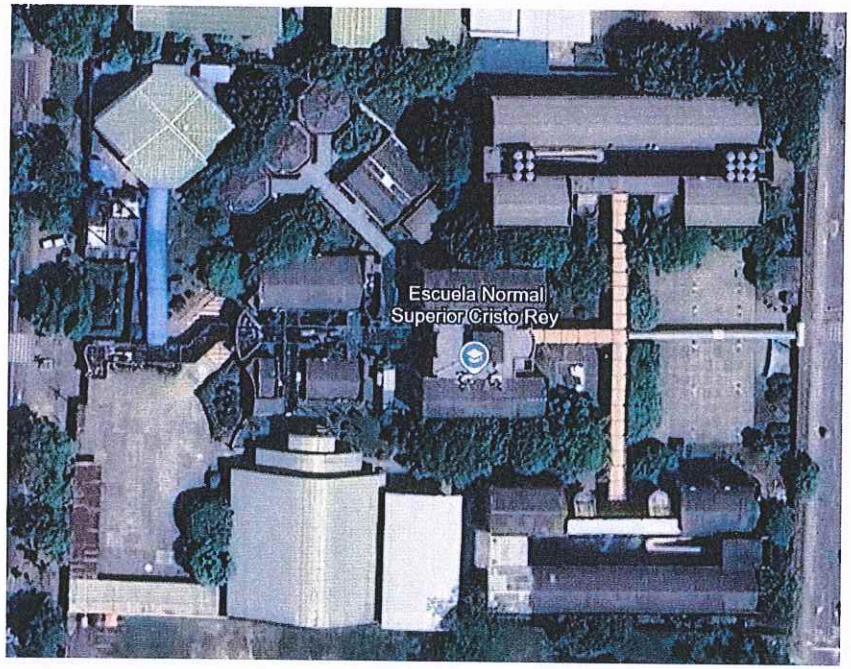

OPERACIONES MATEMATICAS

LOCALIZACION Y REPLANTEO

REPLANTEO

Largo = 200,00 ML

CANTIDAD EJECUTADA	200,00	ML

OBSERVACIONES:

Contratista Residente de Obra Ing. JORGE TRUJILLO NIÑO	Supervisor LEUDER BARBOSA HERNANDEZ


SERVICIVIL SAS	MANTENIMIENTO, REPARACION DE LA CUBIERTA, RED DE DRENAJE DE AGUAS LLUVIAS Y ADECUACIONES EN EL COLISEO EN LAS INSTALACIONES DE LA ESCUELA NORMAL SUPERIOR CRISTO REY DE BARRANCABERMEJA	JHS ESCUELA NORMAL SUPERIOR CRISTO REY BARRANCABERMEJA

								HOJA	2	DE	2
FECHA	DIA	23	MES	10	AÑO	2024	ACTA N°	1	ELABORÓ	ING. JORGE TRUJILLO	


SUPERVISOR	LEUDER BARBOSA HERNANDEZ	NIT O C.C.		RESOLUCIÓN N°	
CONTRATISTA	SERVICIVIL S.A.S	NIT O C.C.	800.147.909-3	CONTRATO N°	038-2024

ITEM	2,1	DESCRIPCIÓN	LOCALIZACION Y REPLANTEO	UNIDAD	ML

DIAGRAMA / FOTOGRAFIA/ PLANO

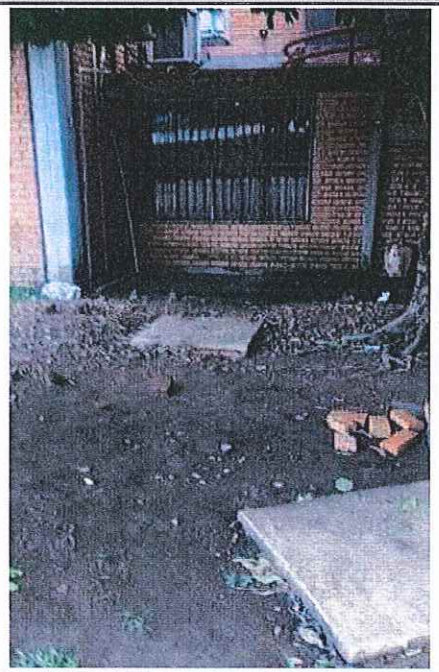



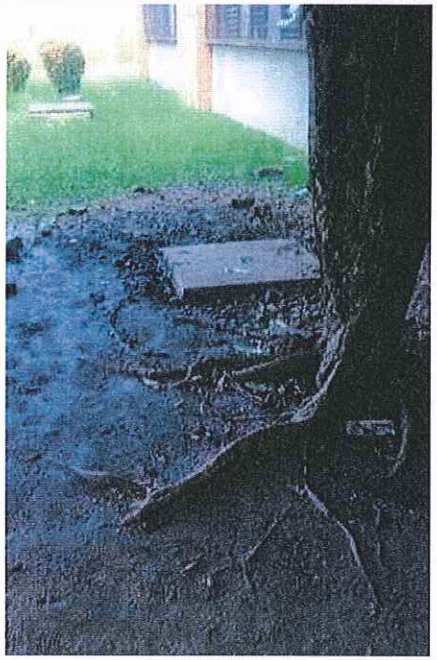

OBSERVACIONES:

Contratista Residente de Obra Ing. JORGE TRUJILLO NIÑO	Supervisor LEUDER BARBOSA HERNANDEZ


SERVICIVIL SAS	**MANTENIMIENTO, REPARACION DE LA CUBIERTA, RED DE DRENAJE DE AGUAS LLUVIAS Y ADECUACIONES EN EL COLISEO EN LAS INSTALACIONES DE LA ESCUELA NORMAL SUPERIOR CRISTO REY DE BARRANCABERMEJA**	JHS ESCUELA NORMAL SUPERIOR CRISTO REY BARRANCABERMEJA

CONTRATISTA	SERVICIVL S.A.S	NIT	800.147.909-3	CTO OBRA PUBLICA N°	038-2024

FECHA	DIA	23	MES	10	AÑO	2024	ACTA N°	1	ELABORÓ	ING. JORGE TRUJILLO NIÑO

ITEM	2,10	DESCRIPCIÓN	Limpieza de carcamos de all (incluye trasiego para acopio temporal)	UNIDAD	ML

DIAGRAMA / FOTOGRAFIA/ PLANO

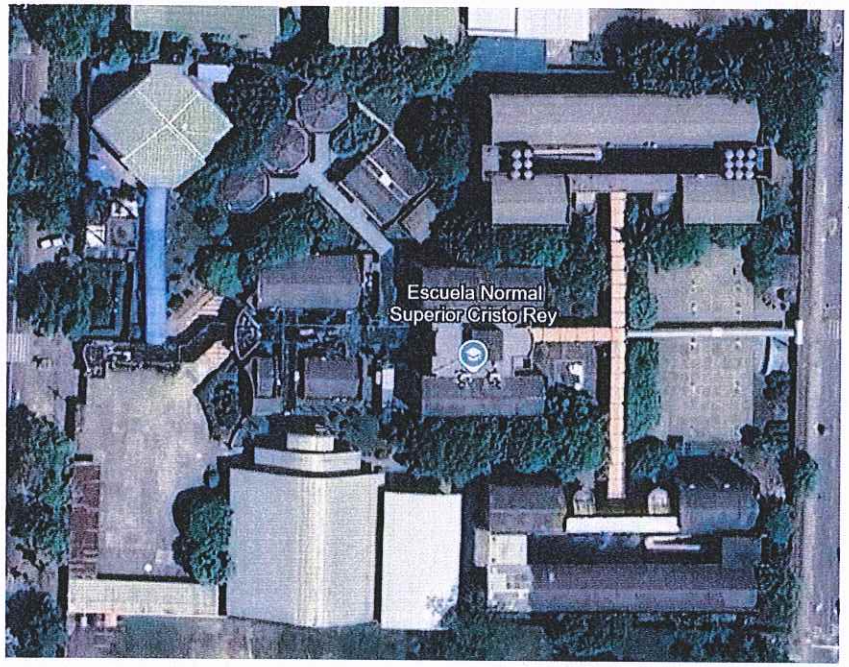

OPERACIONES MATEMATICAS

Limpieza de carcamos de all (incluye trasiego para acopio temporal)

Area Cubierta =

Largo = 120,00 ML

CANTIDAD EJECUTADA	120,00	ML

OBSERVACIONES:

Contratista Residente de Obra Ing. JORGE TRUJILLO NIÑO	Supervisor LEUDER BARBOSA HERNANDEZ

SERVICIVIL SAS	MANTENIMIENTO, REPARACION DE LA CUBIERTA, RED DE DRENAJE DE AGUAS LLUVIAS Y ADECUACIONES EN EL COLISEO EN LAS INSTALACIONES DE LA ESCUELA NORMAL SUPERIOR CRISTO REY DE BARRANCABERMEJA	JHS ESCUELA NORMAL SUPERIOR CRISTO REY BARRANCABERMEJA

								HOJA	2	DE	2
FECHA	DIA	23	MES	10	AÑO	2024	ACTA N°	1	ELABORÓ	ING. JORGE TRUJILLO	

SUPERVISOR	LEUDER BARBOSA HERNANDEZ	NIT O C.C.		RESOLUCIÓN N°	
CONTRATISTA	SERVICIVIL S.A.S	NIT O C.C.	800.147.909-3	CONTRATO N°	038-2024

ITEM	2,10	DESCRIPCIÓN	Limpieza de carcamos de all (incluye trasiego para acopio temporal)	UNIDAD	ML

DIAGRAMA / FOTOGRAFIA/ PLANO



OBSERVACIONES:


Contratista Residente de Obra Ing. JORGE TRUJILLO NIÑO	Supervisor LEUDER BARBOSA HERNANDEZ

SERVICIVIL SAS	**MANTENIMIENTO, REPARACION DE LA CUBIERTA, RED DE DRENAJE DE AGUAS LLUVIAS Y ADECUACIONES EN EL COLISEO EN LAS INSTALACIONES DE LA ESCUELA NORMAL SUPERIOR CRISTO REY DE BARRANCABERMEJA**			JHS ESCUELA NORMAL SUPERIOR CRISTO REY BARRANCABERMEJA
CONTRATISTA	SERVICIVL S.A.S	NIT	800.147.909-3	CTO OBRA PUBLICA N° 038-2024

FECHA	DIA	23	MES	10	AÑO	2024	ACTA N°	1	ELABORÓ	ING. JORGE TRUJILLO NIÑO

ITEM	3,1,1	DESCRIPCIÓN	LAVADO MURO EN FONDO COLISEO	UNIDAD	M2

DIAGRAMA / FOTOGRAFIA/ PLANO

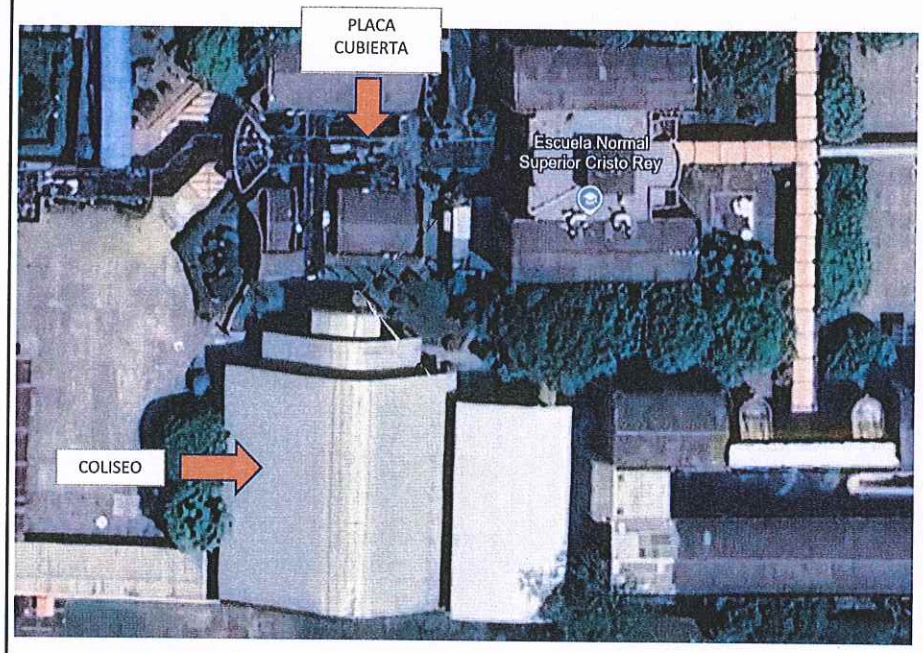



OPERACIONES MATEMATICAS

LAVADO MURO EN FONDO COLISEO

MURO DE FONDO

Área total	252,00	M
		M
Total =	252,00	M2

CANTIDAD EJECUTADA	252,00	M2

OBSERVACIONES:

Contratista Residente de Obra Ing. JORGE TRUJILLO NIÑO	Supervisor LEUDER BARBOSA HERNANDEZ

SERVICIVIL SAS	MANTENIMIENTO, REPARACION DE LA CUBIERTA, RED DE DRENAJE DE AGUAS LLUVIAS Y ADECUACIONES EN EL COLISEO EN LAS INSTALACIONES DE LA ESCUELA NORMAL SUPERIOR CRISTO REY DE BARRANCABERMEJA	JHS ESCUELA NORMAL SUPERIOR CRISTO REY BARRANCABERMEJA

								HOJA	2	DE	2
FECHA	DIA	23	MES	10	AÑO	2024	ACTA N°	1	ELABORÓ	ING. JORGE TRUJILLO	

SUPERVISOR	LEUDER BARBOSA HERNANDEZ	NIT O C.C.		RESOLUCIÓN N°	
CONTRATISTA	SERVICIVIL S.A.S	NIT O C.C.	800.147.909-3	CONTRATO N°	038-2024

ITEM	3,1,1	DESCRIPCIÓN	LAVADO MURO EN FONDO COLISEO	UNIDAD	M2

DIAGRAMA / FOTOGRAFIA/ PLANO



OBSERVACIONES:

Contratista Residente de Obra Ing. JORGE TRUJILLO NIÑO	Supervisor LEUDER BARBOSA HERNANDEZ


SERVICIVIL SAS	**MANTENIMIENTO, REPARACION DE LA CUBIERTA, RED DE DRENAJE DE AGUAS LLUVIAS Y ADECUACIONES EN EL COLISEO EN LAS INSTALACIONES DE LA ESCUELA NORMAL SUPERIOR CRISTO REY DE BARRANCABERMEJA**	JHS ESCUELA NORMAL SUPERIOR CRISTO REY BARRANCABERMEJA

CONTRATISTA	SERVICIVL S.A.S	NIT	800.147.909-3	CTO OBRA PUBLICA N°	038-2024

FECHA	DIA	23	MES	10	AÑO	2024	ACTA N°	1	ELABORÓ	ING. JORGE TRUJILLO NIÑO

ITEM	3,1,2	DESCRIPCIÓN	LAVADO DE GRADERIAS	UNIDAD	M2

DIAGRAMA / FOTOGRAFIA/ PLANO

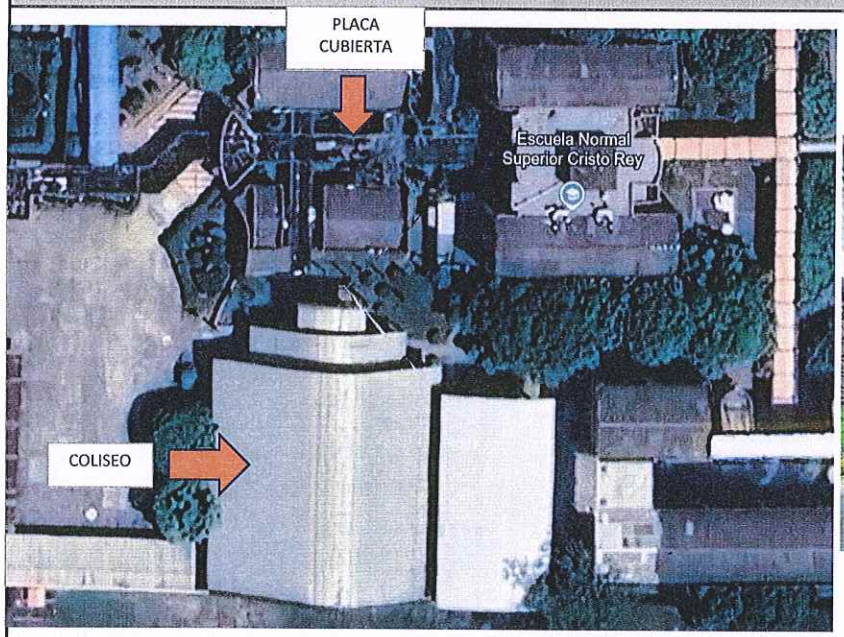



OPERACIONES MATEMATICAS

LAVADO DE GRADERIAS

GRADERIAS COLISEO		
Alto	0,32	M
Largo =	26,00	M
Cantidad	6,00	UND
Total =	49,92	M2
AREA MURO		
Alto	0,65	M
Largo =	26,00	M
Total =	16,90	M2
ÁREA TOTAL POR GRADERIA		
Total =	66,82	M2
ÁREA TOTAL DOS GRADERIA		
Cantidad	2,00	UND
Total =	133,64	M2
CANTIDAD EJECUTADA	133,64	M2

OBSERVACIONES:

Contratista Residente de Obra Ing. JORGE TRUJILLO NIÑO	Supervisor LEUDER BARROSA HERNANDEZ

SERVICIVIL SAS	MANTENIMIENTO, REPARACION DE LA CUBIERTA, RED DE DRENAJE DE AGUAS LLUVIAS Y ADECUACIONES EN EL COLISEO EN LAS INSTALACIONES DE LA ESCUELA NORMAL SUPERIOR CRISTO REY DE BARRANCABERMEJA	JHS ESCUELA NORMAL SUPERIOR CRISTO REY BARRANCABERMEJA


								HOJA	2	DE	2
FECHA	DIA	23	MES	10	AÑO	2024	ACTA N°	1	ELABORÓ	ING. JORGE TRUJILLO	


SUPERVISOR	LEUDER BARBOSA HERNANDEZ	NIT O C.C.		RESOLUCIÓN N°	
CONTRATISTA	SERVICIVIL S.A.S	NIT O C.C.	800.147.909-3	CONTRATO N°	038-2024

ITEM	3,1,2	DESCRIPCIÓN	LAVADO GRADERIAS	UNIDAD	M2

DIAGRAMA / FOTOGRAFIA/ PLANO



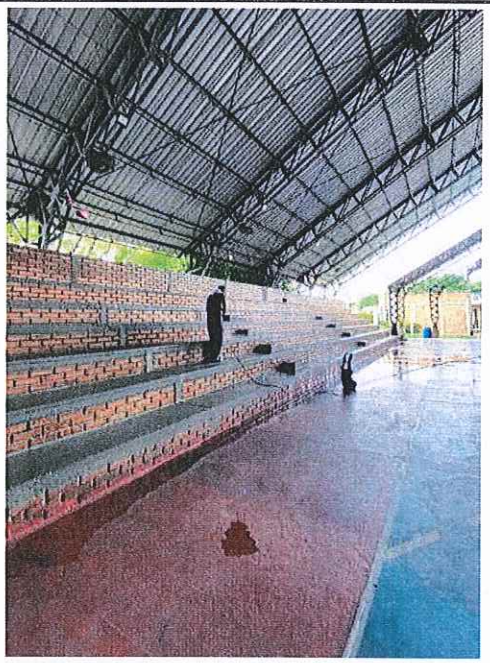

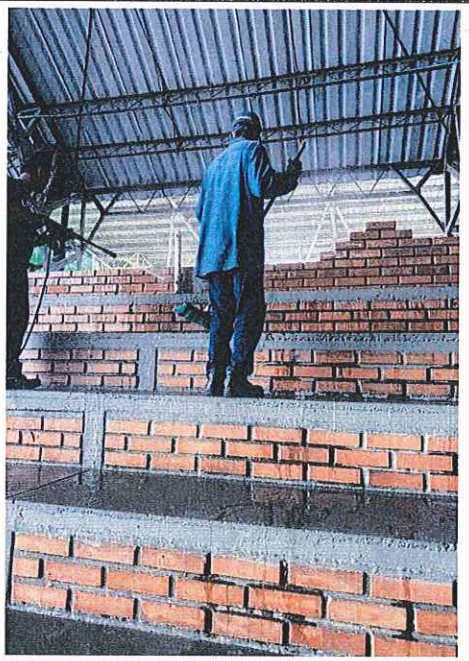

OBSERVACIONES:

Contratista Residente de Obra Ing. JORGE TRUJILLO NIÑO	Supervisor LEUDER BARBOSA HERNANDEZ


SERVICIVIL SAS	**MANTENIMIENTO, REPARACION DE LA CUBIERTA, RED DE DRENAJE DE AGUAS LLUVIAS Y ADECUACIONES EN EL COLISEO EN LAS INSTALACIONES DE LA ESCUELA NORMAL SUPERIOR CRISTO REY DE BARRANCABERMEJA**	JHS ESCUELA NORMAL SUPERIOR CRISTO REY BARRANCABERMEJA

CONTRATISTA	SERVICIVL S.A.S	NIT	800.147.909-3	CTO OBRA PUBLICA N°	038-2024

FECHA	DIA	23	MES	10	AÑO	2024	ACTA N°	1	ELABORÓ	ING. JORGE TRUJILLO NIÑO

ITEM	3,1,3	DESCRIPCIÓN	DESMONTE DE VENTILADORES DETERIORADOS	UNIDAD	UND

DIAGRAMA / FOTOGRAFIA/ PLANO

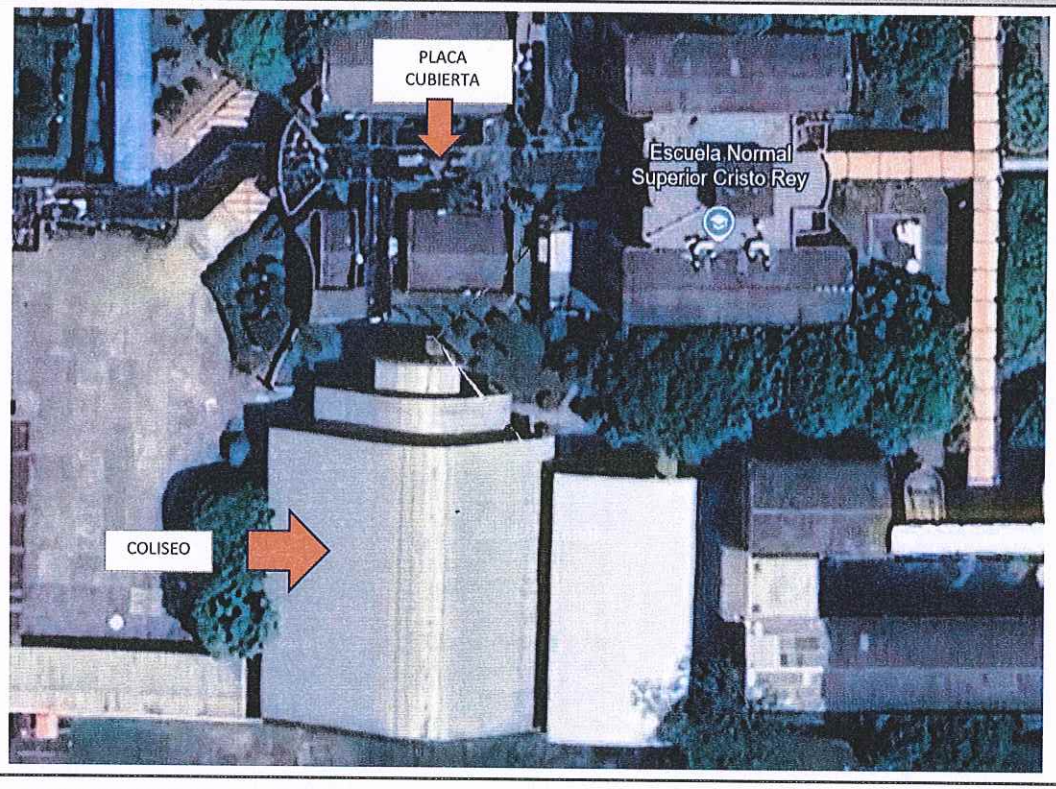

OPERACIONES MATEMATICAS

DESMONTE DE VENTILADORES DETERIORADOS

Ventiladores Coliseo		
Cantidad	7,00	UND
Total =	7,00	UND

CANTIDAD EJECUTADA	7,00	UND

OBSERVACIONES: Se desmontan los ventiladores existentes la fecha. Contractualmente estaban estipulados 8 UND de ventiladores, al momento de ejecutar la actividad se presencian 7 UND de ventiladores en mal estado

Contratista Residente de Obra	Supervisor
Ing. JORGE TRUJILLO NIÑO	LEUDER BARBOSA HERNANDEZ

SERVICIVIL SAS	MANTENIMIENTO, REPARACION DE LA CUBIERTA, RED DE DRENAJE DE AGUAS LLUVIAS Y ADECUACIONES EN EL COLISEO EN LAS INSTALACIONES DE LA ESCUELA NORMAL SUPERIOR CRISTO REY DE BARRANCABERMEJA	JHS ESCUELA NORMAL SUPERIOR CRISTO REY BARRANCABERMEJA


HOJA	2	DE	2

FECHA	DIA	23	MES	10	AÑO	2024	ACTA N°	1	ELABORÓ	ING. JORGE TRUJILLO

SUPERVISOR	LEUDER BARBOSA HERNANDEZ	NIT O C.C.		RESOLUCIÓN N°	
CONTRATISTA	SERVICIVIL S.A.S	NIT O C.C.	800.147.909-3	CONTRATO N°	038-2024

ITEM	3,1,3	DESCRIPCIÓN	DESMONTE DE VENTILADORES DETERIORADOS	UNIDAD	UND

DIAGRAMA / FOTOGRAFIA/ PLANO

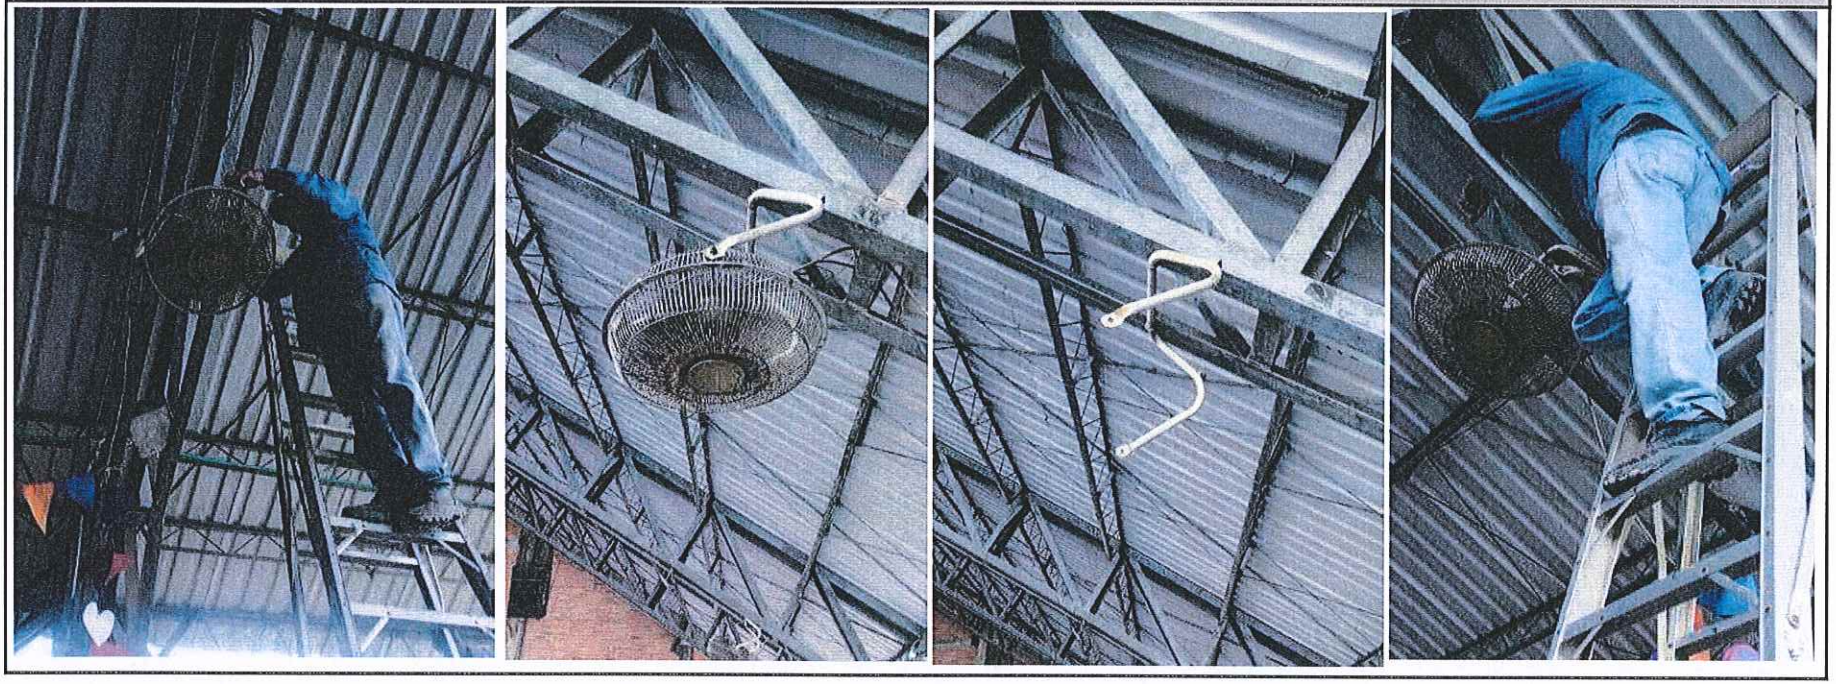

OBSERVACIONES: Se desmontan los ventiladores existentes la fecha. Contractualmente estaban estipulados 8 UND de ventiladores, al momento de ejecutar la actividad se presencian 7 UND de ventiladores en mal estado

Contratista Residente de Obra Ing. JORGE TRUJILLO NIÑO	Supervisor LEUDER BARBOSA HERNANDEZ


SERVICIVIL SAS	**MANTENIMIENTO, REPARACION DE LA CUBIERTA, RED DE DRENAJE DE AGUAS LLUVIAS Y ADECUACIONES EN EL COLISEO EN LAS INSTALACIONES DE LA ESCUELA NORMAL SUPERIOR CRISTO REY DE BARRANCABERMEJA**	JHS ESCUELA NORMAL SUPERIOR CRISTO REY BARRANCABERMEJA

CONTRATISTA	SERVICIVL S.A.S	NIT	800.147.909-3	CTO OBRA PUBLICA N°	038-2024

FECHA	DIA	23	MES	10	AÑO	2024	ACTA N°	1	ELABORÓ	ING. JORGE TRUJILLO NIÑO

ITEM	3,2,1	DESCRIPCIÓN	Construccion de columnetas en concreto para graderias con dimensiones 0,10 m x 0,10 m Incluye acero de refuerzo	UNIDAD	ML

DIAGRAMA / FOTOGRAFIA/ PLANO

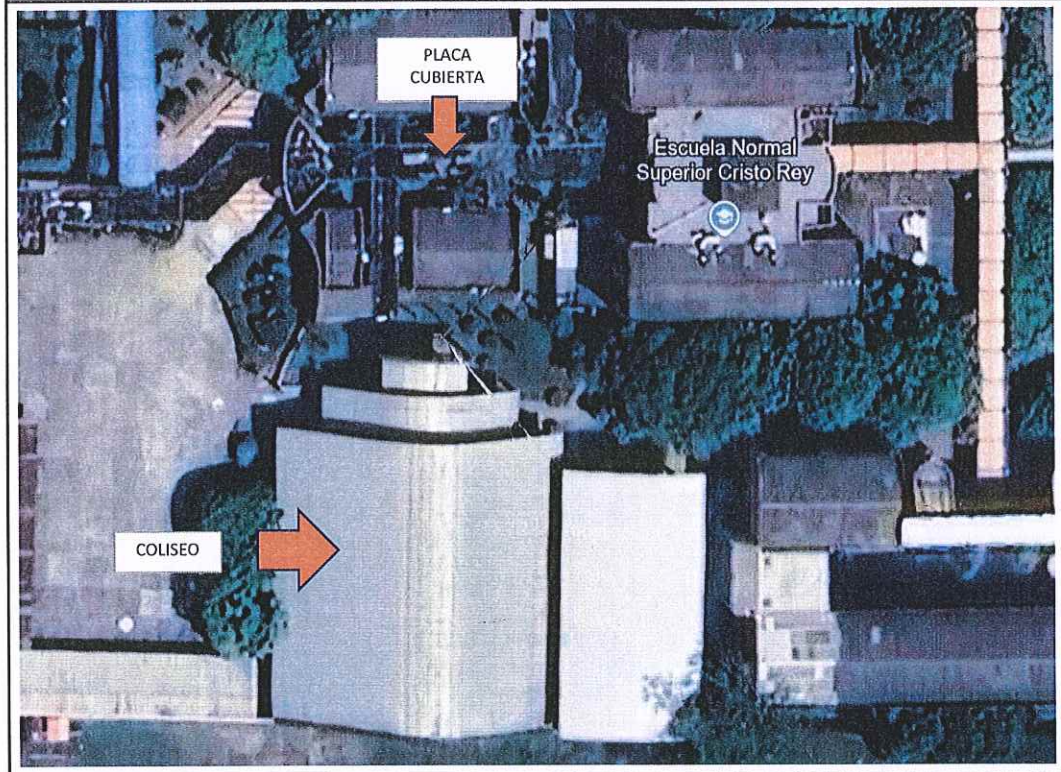

OPERACIONES MATEMATICAS

Construccion de columnetas en concreto para graderias con dimensiones 0,10 m x 0,10 m Incluye acero de refuerzo

AULA GALI =			
Longitud	0,65	ML	
Cantidad	13,00	UND	
Total =	8,45	ML	

CANTIDAD EJECUTADA	8,45	ML

OBSERVACIONES:

Contratista Residente de Obra Ing. JORGE TRUJILLO NIÑO	Supervisor LEUDER BARBOSA HERNANDEZ

SERVICIVIL SAS	MANTENIMIENTO, REPARACION DE LA CUBIERTA, RED DE DRENAJE DE AGUAS LLUVIAS Y ADECUACIONES EN EL COLISEO EN LAS INSTALACIONES DE LA ESCUELA NORMAL SUPERIOR CRISTO REY DE BARRANCABERMEJA	JHS ESCUELA NORMAL SUPERIOR CRISTO REY BARRANCABERMEJA

								HOJA	2	DE	2
FECHA	DIA	23	MES	10	AÑO	2024	ACTA N°	1	ELABORÓ	ING. JORGE TRUJILLO	


SUPERVISOR	LEUDER BARBOSA HERNANDEZ	NIT O C.C.		RESOLUCIÓN N°	
CONTRATISTA	SERVICIVIL S.A.S	NIT O C.C.	800.147.909-3	CONTRATO N°	038-2024

ITEM	3,2,1	DESCRIPCIÓN	Construccion de columnetas en concreto para graderias con dimensiones 0,10 m x 0,10 m Incluye acero de refuerzo	UNIDAD	ML

DIAGRAMA / FOTOGRAFIA/ PLANO





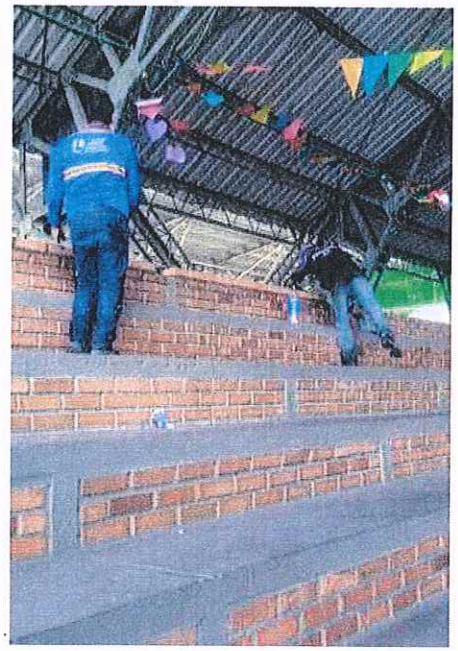

OBSERVACIONES:

Contratista Residente de Obra Ing. JORGE TRUJILLO NIÑO	Supervisor LEUDER BARBOSA HERNANDEZ


SERVICIVIL SAS	**MANTENIMIENTO, REPARACION DE LA CUBIERTA, RED DE DRENAJE DE AGUAS LLUVIAS Y ADECUACIONES EN EL COLISEO EN LAS INSTALACIONES DE LA ESCUELA NORMAL SUPERIOR CRISTO REY DE BARRANCABERMEJA**		ESCUELA NORMAL SUPERIOR CRISTO REY BARRANCABERMEJA


CONTRATISTA	SERVICIVL S.A.S	NIT	800.147.909-3	CTO OBRA PUBLICA N°	038-2024


FECHA	DIA	23	MES	10	AÑO	2024	ACTA N°	1	ELABORÓ	ING. JORGE TRUJILLO NIÑO

ITEM	3,2,2	DESCRIPCIÓN	Construccion de muro en ladrillo a la vista para graderia	UNIDAD	M2

DIAGRAMA / FOTOGRAFIA/ PLANO

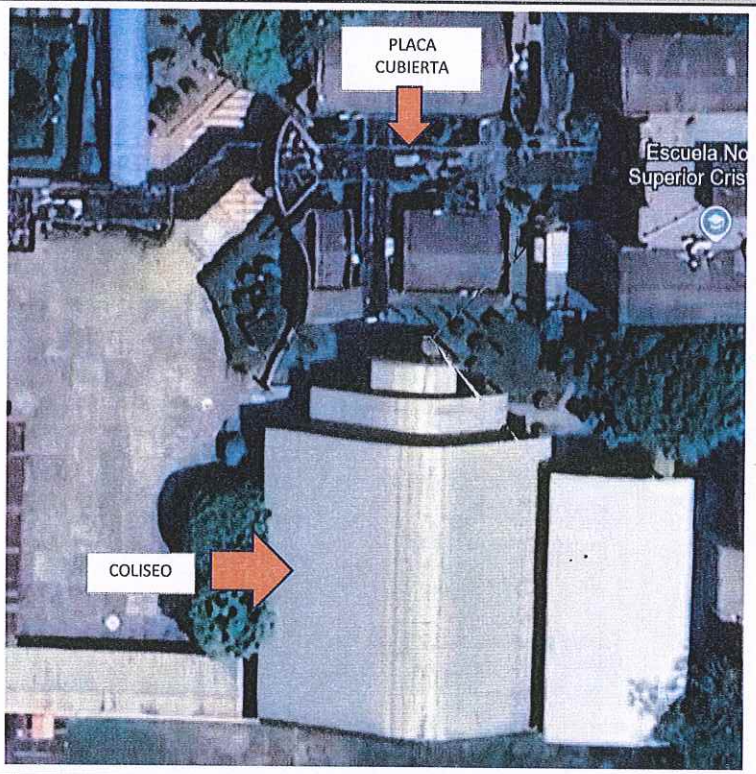

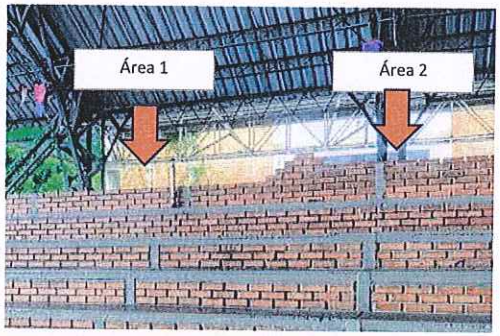

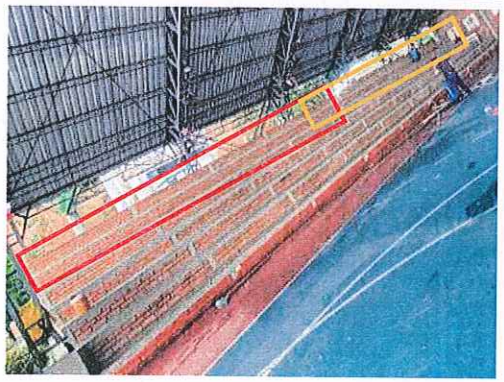

OPERACIONES MATEMATICAS

Construccion de muro en ladrillo a la vista para graderia

COLISEO			
Area 1			
Longitud	13,85	M	
Alto	0,32	M	
Área total	4,43	M2	
Área 2			
Longitud	11,33	M	
Alto	0,16	M	
Área total	1,81	M2	
TOTAL =	6,24	M2	
CANTIDAD EJECUTADA	6,24	M2	

OBSERVACIONES:



Contratista Residente de Obra	Supervisor
Ing. JORGE TRUJILLO NIÑO	LEUDER BARBOSA HERNANDEZ


SERVICIVIL SAS	MANTENIMIENTO, REPARACION DE LA CUBIERTA, RED DE DRENAJE DE AGUAS LLUVIAS Y ADECUACIONES EN EL COLISEO EN LAS INSTALACIONES DE LA ESCUELA NORMAL SUPERIOR CRISTO REY DE BARRANCABERMEJA	ESCUELA NORMAL SUPERIOR CRISTO REY BARRANCABERMEJA

								HOJA	2	DE	2
FECHA	DIA	23	MES	10	AÑO	2024	ACTA N°	1	ELABORÓ	ING. JORGE TRUJILLO	
SUPERVISOR	LEUDER BARBOSA HERNANDEZ						NIT O C.C.		RESOLUCION N°		
CONTRATISTA	SERVICIVIL S.A.S						NIT O C.C.	800.147.909-3	CONTRATO N°	038-2024	

ITEM	3,2,2	DESCRIPCIÓN	Construccion de muro en ladrillo a la vista para graderia	UNIDAD	M2

DIAGRAMA / FOTOGRAFIA/ PLANO

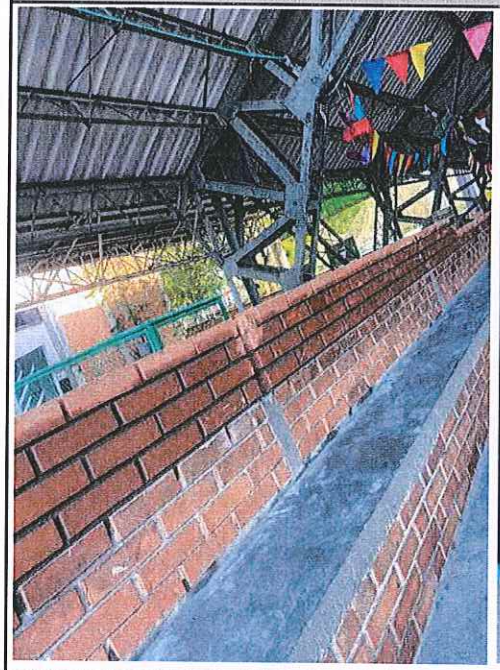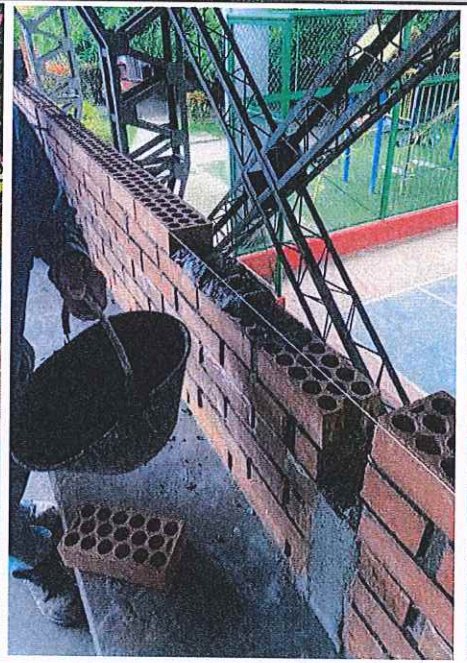

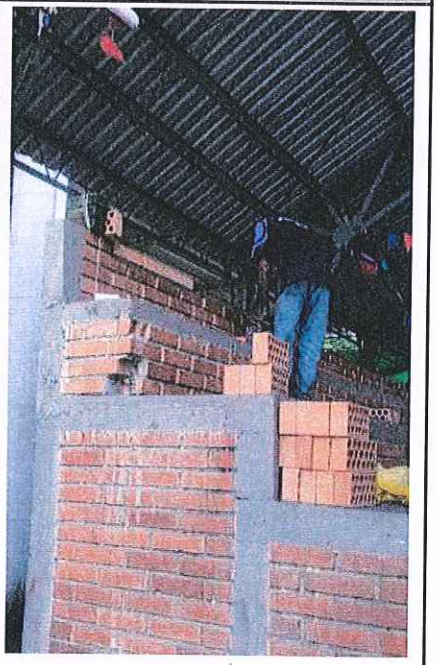OBSERVACIONES:


Contratista Residente de Obra Ing. JORGE TRUJILLO NIÑO	Supervisor LEUDER BARBOSA HERNANDEZ

SERVICIVIL SAS	**MANTENIMIENTO, REPARACION DE LA CUBIERTA, RED DE DRENAJE DE AGUAS LLUVIAS Y ADECUACIONES EN EL COLISEO EN LAS INSTALACIONES DE LA ESCUELA NORMAL SUPERIOR CRISTO REY DE BARRANCABERMEJA**				JHS ESCUELA NORMAL SUPERIOR CRISTO REY BARRANCABERMEJA
CONTRATISTA	SERVICIVL S.A.S	NIT	800.147.909-3	CTO OBRA PUBLICA N°	038-2024

FECHA	DIA	23	MES	10	AÑO	2024	ACTA N°	1	ELABORÓ	ING. JORGE TRUJILLO NIÑO

ITEM	3,2,3	DESCRIPCIÓN	Suministro e instalacion de barandas tubulares metalica galvanizada de seguridad para graderias	UNIDAD	ML

DIAGRAMA / FOTOGRAFIA/ PLANO

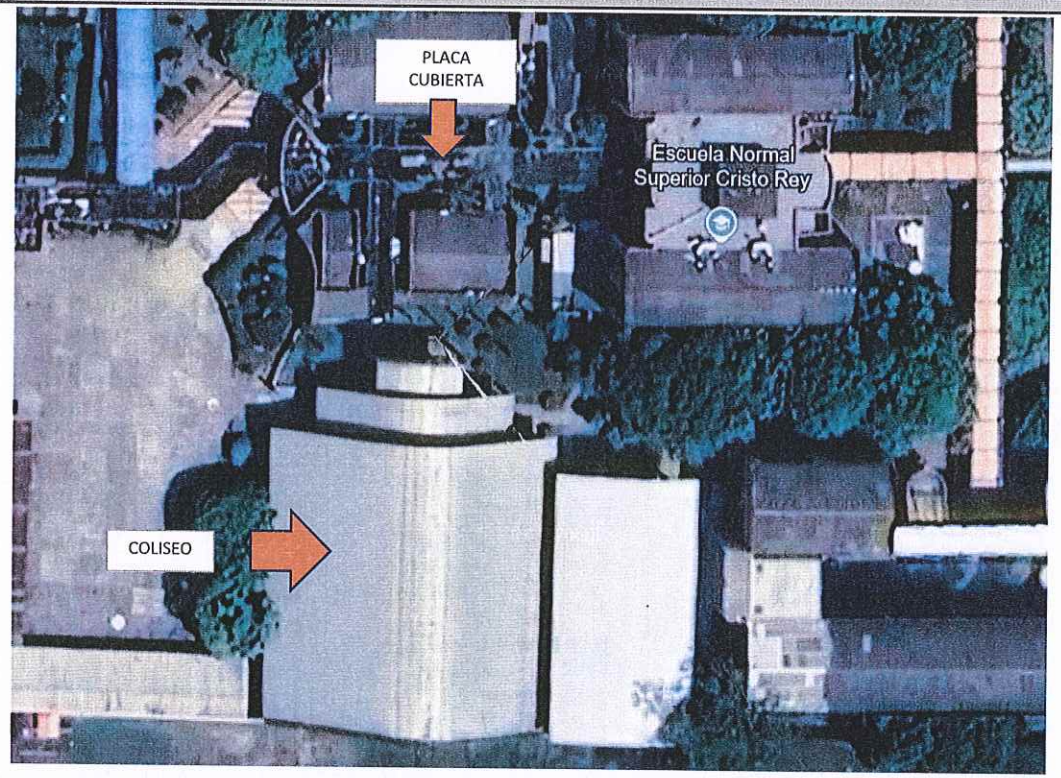

OPERACIONES MATEMATICAS

Suministro e instalacion de barandas tubulares metalica galvanizada de seguridad para graderias

COLISEO

Total =	17,20	ML

CANTIDAD EJECUTADA	17,20	ML


Contratista Residente de Obra	Supervisor
Ing. JORGE TRUJILLO NIÑO	LEUDER BARBOSA HERNANDEZ



SERVICIVIL SAS	MANTENIMIENTO, REPARACION DE LA CUBIERTA, RED DE DRENAJE DE AGUAS LLUVIAS Y ADECUACIONES EN EL COLISEO EN LAS INSTALACIONES DE LA ESCUELA NORMAL SUPERIOR CRISTO REY DE BARRANCABERMEJA	JHS ESCUELA NORMAL SUPERIOR CRISTO REY BARRANCABERMEJA

								HOJA	2	DE	2
FECHA	DIA	23	MES	10	AÑO	2024	ACTA N°	1	ELABORÓ	ING. JORGE TRUJILLO	
SUPERVISOR	LEUDER BARBOSA HERNANDEZ						NIT O C.C.		RESOLUCIÓN N°		
CONTRATISTA	SERVICIVIL S.A.S						NIT O C.C.	800.147.909-3	CONTRATO N°	038-2024	

ITEM	3,2,3	DESCRIPCIÓN	Suministro e instalacion de barandas tubulares metalica galvanizada de seguridad para graderias	UNIDAD	ML

DIAGRAMA / FOTOGRAFIA/ PLANO

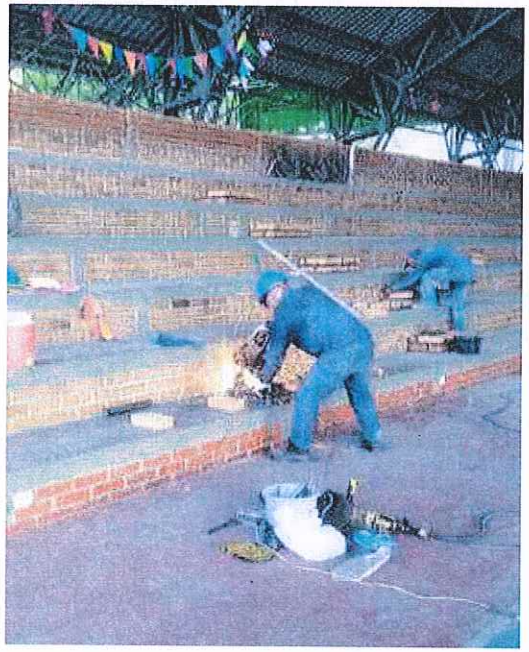

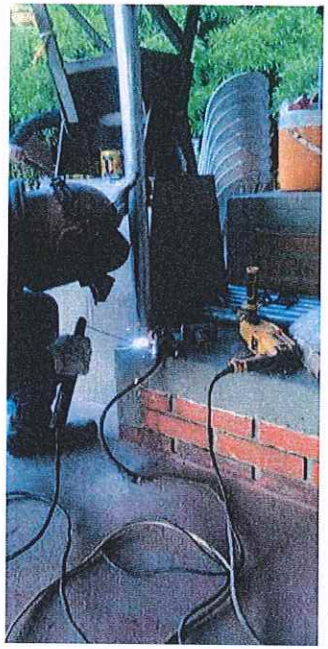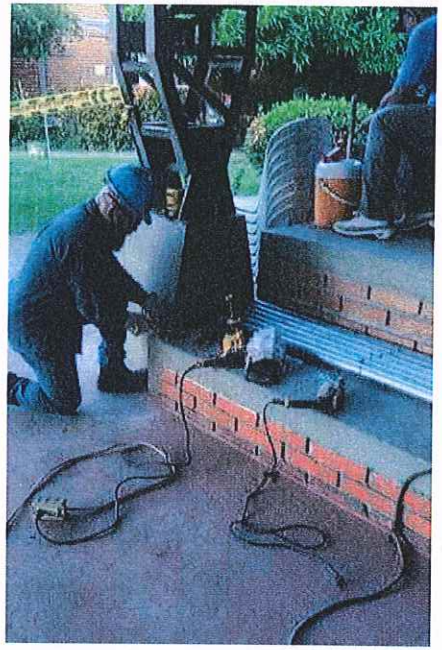OBSERVACIONES:

Contratista Residente de Obra Ing. JORGE TRUJILLO NIÑO	Supervisor LEUDER BARBOSA HERNANDEZ


SERVICIVIL SAS	**MANTENIMIENTO, REPARACION DE LA CUBIERTA, RED DE DRENAJE DE AGUAS LLUVIAS Y ADECUACIONES EN EL COLISEO EN LAS INSTALACIONES DE LA ESCUELA NORMAL SUPERIOR CRISTO REY DE BARRANCABERMEJA**	JHS ESCUELA NORMAL SUPERIOR CRISTO REY BARRANCABERMEJA

CONTRATISTA	SERVICIVL S.A.S	NIT	800.147.909-3	CTO OBRA PUBLICA N°	038-2024

FECHA	DIA	23	MES	10	AÑO	2024	ACTA N°	1	ELABORÓ	ING. JORGE TRUJILLO NIÑO

ITEM	3,2,4	DESCRIPCIÓN	Construccion de pasos para acceso a graderia	UNIDAD	UND

DIAGRAMA / FOTOGRAFIA/ PLANO

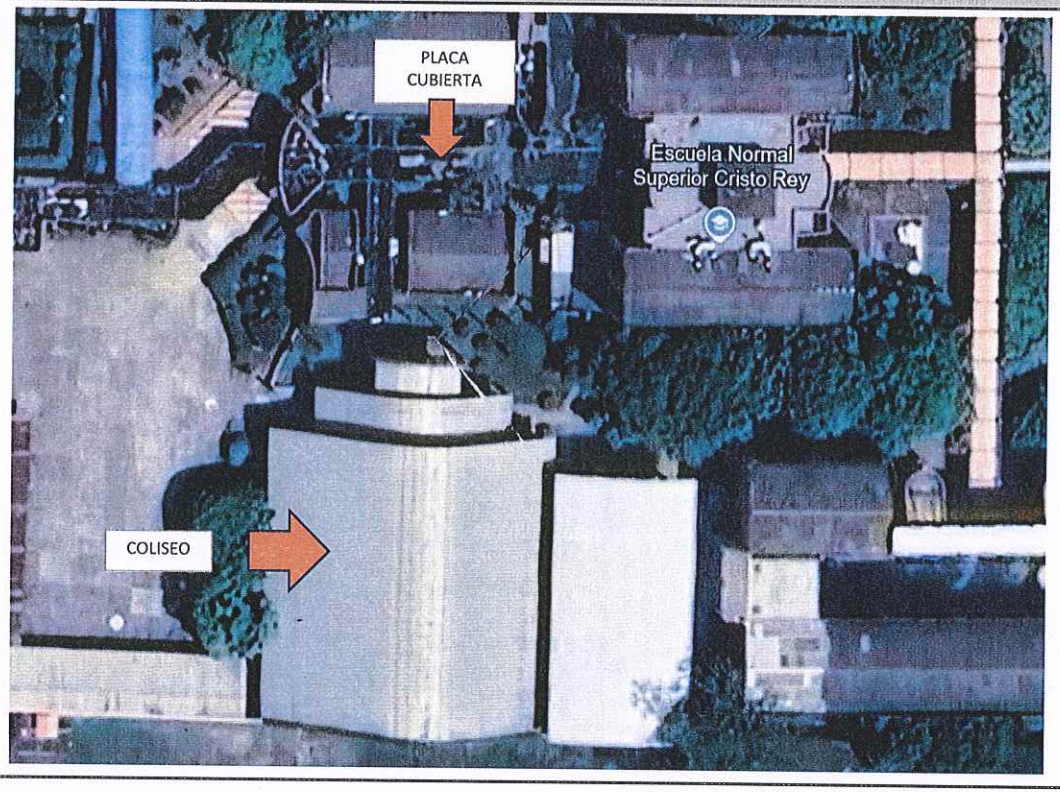

OPERACIONES MATEMATICAS

Construccion de pasos para acceso a graderia

COLISEO

Total = 32,00 UND

CANTIDAD EJECUTADA	32,00	UND

OBSERVACIONES:

Contratista Residente de Obra Ing. JORGE TRUJILLO NIÑO	Supervisor LEUDER BARBOSA HERNANDEZ


SERVICIVIL SAS	MANTENIMIENTO, REPARACION DE LA CUBIERTA, RED DE DRENAJE DE AGUAS LLUVIAS Y ADECUACIONES EN EL COLISEO EN LAS INSTALACIONES DE LA ESCUELA NORMAL SUPERIOR CRISTO REY DE BARRANCABERMEJA	JHS ESCUELA NORMAL SUPERIOR CRISTO REY BARRANCABERMEJA

								HOJA	2	DE	2
FECHA	DIA	23	MES	10	AÑO	2024	ACTA N°	1	ELABORÓ	ING. JORGE TRUJILLO	

SUPERVISOR	LEUDER BARBOSA HERNANDEZ	NIT O C.C.		RESOLUCIÓN N°	
CONTRATISTA	SERVICIVIL S.A.S	NIT O C.C.	800.147.909-3	CONTRATO N°	038-2024

ITEM	3,2,4	DESCRIPCIÓN	Construccion de pasos para acceso a graderia	UNIDAD	UND

DIAGRAMA / FOTOGRAFIA/ PLANO

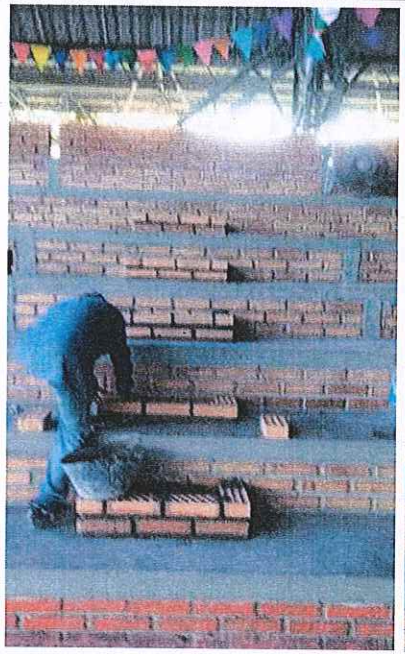





OBSERVACIONES:

Contratista Residente de Obra Ing. JORGE TRUJILLO NIÑO	Supervisor LEUDER BARBOSA HERNANDEZ


SERVICIVIL SAS	**MANTENIMIENTO, REPARACION DE LA CUBIERTA, RED DE DRENAJE DE AGUAS LLUVIAS Y ADECUACIONES EN EL COLISEO EN LAS INSTALACIONES DE LA ESCUELA NORMAL SUPERIOR CRISTO REY DE BARRANCABERMEJA**	JHS ESCUELA NORMAL SUPERIOR CRISTO REY BARRANCABERMEJA

CONTRATISTA	SERVICIVL S.A.S	NIT	800.147.909-3	CTO OBRA PUBLICA N°	038-2024

FECHA	DIA	23	MES	10	AÑO	2024	ACTA N°	1	ELABORÓ	ING. JORGE TRUJILLO NIÑO

ITEM	4,1	DESCRIPCIÓN	Transporte interno de material a punto de acopio	UNIDAD	M3

DIAGRAMA / FOTOGRAFIA/ PLANO

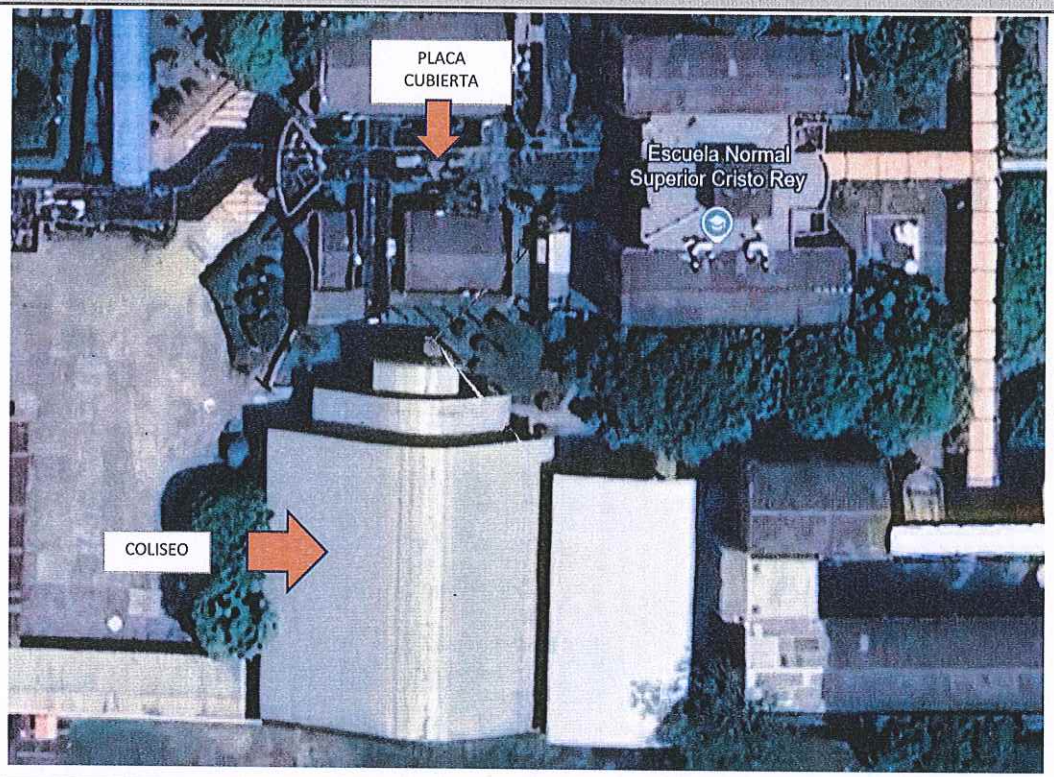

OPERACIONES MATEMATICAS

Transporte interno de material a punto de acopio

AULA GALI =

Total = 3,00 M3

CANTIDAD EJECUTADA	3,00	M3

OBSERVACIONES:

Contratista Residente de Obra Ing. JORGE TRUJILLO NIÑO	Supervisor LEUDER BARBOSA HERNANDEZ

SERVICIVIL SAS	MANTENIMIENTO, REPARACION DE LA CUBIERTA, RED DE DRENAJE DE AGUAS LLUVIAS Y ADECUACIONES EN EL COLISEO EN LAS INSTALACIONES DE LA ESCUELA NORMAL SUPERIOR CRISTO REY DE BARRANCABERMEJA	JHS ESCUELA NORMAL SUPERIOR CRISTO REY BARRANCABERMEJA

								HOJA	2	DE	2
FECHA	DIA	23	MES	10	AÑO	2024	ACTA N°	1	ELABORÓ	ING. JORGE TRUJILLO	

SUPERVISOR	LEUDER BARBOSA HERNANDEZ	NIT O C.C.		RESOLUCIÓN N°	
CONTRATISTA	SERVICIVIL S.A.S	NIT O C.C.	800.147.909-3	CONTRATO N°	038-2024

ITEM	4,1	DESCRIPCIÓN	Transporte interno de material a punto de acopio	UNIDAD	M3

DIAGRAMA / FOTOGRAFIA/ PLANO







OBSERVACIONES:

Contratista Residente de Obra Ing. JORGE TRUJILLO NIÑO	Supervisor LEUDER BARBOSA HERNANDEZ

compensar | miplanilla.com

REPORTE RESUMEN DE PAGO

Información básica de la planilla

Empresa:	SERVICIVIL SAS	**NIT:**	800147909
Tipo Planilla:	E	**Periodo liquidación Pensiones:**	septiembre 2024
Sucursal o Dependencia:	GERENCIA	**Periodo liquidación Salud:**	octubre 2024
Número de Radicación:	80363693	**Total a pagar:**	$1,257,400
Fecha de vencimiento:	03/10/2024	**Total de empleados:**	2
Fecha de Pago:	24/10/2024	**Número de Administradoras:**	5

Detalles del pago

Razón social recaudo:	Compensar OI	**Nit recaudo:**	9998600669427
Descripción:	MiPlanilla.com Pago Proteccion Social	**Medio de Pago:**	Pago Electronico por PSE
Banco:	BANCO BBVA COLOMBIA S.A.	**Número Autorización:**	1002469478
Estado de la transacción:	Transacción aprobada		

Código	NIT	Administradoras	Num. Afiliados	*Número de incapacidad por riesgos laborales	Valor descontado en incapacidad y/o licencia	Total Pagado
14-4	860002183	Seguros de Vida Colpatria S.A.	2		$0	$282,600
230301	800224808	Porvenir	1		$0	$324,900
25-14	900336004	Administradora Colombiana de Pensiones -	1		$0	$324,900
CCF38	890270275	Cafaba Caja de Compensacion Fliar	2		$0	$162,500
EPS005	800251440	Sanitas EPS	2		$0	$162,500
						$1,257,400

***Si descontó incapacidades o notas crédito debe informar a la administradora correspondiente los descuentos.**

Le informamos que el pago de la planilla No. 80363693, fue posterior a la fecha límite establecida en el Decreto 1670 de 2007. Sin embargo, para las administradoras el recibir el aporte no implica que esté aceptando o se esté allanando a la mora, ya que la Ley establece la obligatoriedad de recibirlo, al igual que para los empleadores y aportantes la obligación de cotizar oportunamente, lo que permite el reconocimiento de las prestaciones económicas (Incapacidades, Licencias de Maternidad y Paternidad), evitando además, el recobro al empleador o trabajador independiente de los servicios prestados durante el periodo de pago extemporáneo.

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	800147909-3	SERVICIVIL SAS	Dg 62 43 151	3125486349	servicivil_ltda@hotmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
SUCURSAL	B – menos de 200 c	OBRA CIVIL	07	SANTANDER	BARRANCABERMEJA	SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					7	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-10	2024-09	E	24/10/2024	81200873	$3.174.400	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	52.000	0		0		0	21	800	0	52.800	1
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	136.000	0		0		0	21	2.100	0	138.100	2
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	112.000	0		0		0	21	1.700	0	113.700	2
EPS041	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	900156264-2	104.000	0		0		0	21	1.600	0	105.600	2

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230301	Porvenir	800224808-8	624.000	0	0	0	0	21	9.400	0	633.400	3
231001	Colfondos	800227940-6	336.000	0	0	0	0	21	5.100	0	341.100	1
25-14	Colpensiones	900336004-7	656.000	0	0	0	0	21	9.900	0	665.900	3

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-4	Vida Colpatria S.A.	860002183-9	703.100				703.100	21	10.600	713.700			7.031	713.700	7

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF38	Cafaba	890270275-5	404.000	21	6.100	410.100	7

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	21	0	0	0
ICBF				
0	21	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	4	404.000	410.200
Pensión	3	1.616.000	1.640.400
Riesgos Laborales	1	703.100	713.700
CCF	1	404.000	410.100
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	9	3.127.100	3.174.400

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	800147909-3	SERVICIVIL SAS	Dg 62 43 151	3125486349	servicivil_ltda@hotmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
SUCURSAL	B – menos de 200 c	GERENCIA / 03	SANTANDER	BARRANCABERMEJA		SI

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD
					EMPLEADOS: 2 / UPC: 0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR
2024-10	2024-09	E	24/10/2024	80363693	$1.257.400

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Estrenado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCION	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1098736267	TRUJILLO VANEGAS JORGE LUIS	1	0			S																	230301	2.000.000	320.000	0	0	0	0	EPS005	2.000.000	80.000	14-4	2.000.000	5	139.200	CCF38	2.000.000	80.000	0	0	0	0	0
2	CC	13893413	TRUJILLO NIÑO JORGE	1	0			S																	25-14	2.000.000	320.000	0	0	0	0	EPS005	2.000.000	80.000	14-4	2.000.000	5	139.200	CCF38	2.000.000	80.000	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

REPORTE RESUMEN DE PAGO

Información básica de la planilla

Empresa:	SERVICIVIL SAS	**NIT:**	800147909
Tipo Planilla:	E	**Periodo liquidación Pensiones:**	septiembre 2024
Sucursal o Dependencia:	OBRA CIVIL	**Periodo liquidación Salud:**	octubre 2024
Número de Radicación:	81200873	**Total a pagar:**	$3,174,400
Fecha de vencimiento:	03/10/2024	**Total de empleados:**	7
Fecha de Pago:	24/10/2024	**Número de Administradoras:**	9

Detalles del pago

Razón social recaudo:	Compensar OI	**Nit recaudo:**	9998600669427
Descripción:	MiPlanilla.com Pago Proteccion Social	**Medio de Pago:**	Pago Electronico por PSE
Banco:	BANCO BBVA COLOMBIA S.A.	**Número Autorización:**	1002460173
Estado de la transacción:	Transacción aprobada		

Código	NIT	Administradoras	Num. Afiliados	*Número de incapacidad por riesgos laborales	Valor descontado en incapacidad y/o licencia	Total Pagado
14-4	860002183	Seguros de Vida Colpatria S.A.	7		$0	$713,700
230301	800224808	Porvenir	3		$0	$633,400
231001	800227940	Colfondos	1		$0	$341,100
25-14	900336004	Administradora Colombiana de Pensiones -	3		$0	$665,900
CCF38	890270275	Cafaba Caja de Compensacion Fliar	7		$0	$410,100
EPS005	800251440	Sanitas EPS	1		$0	$52,800
EPS017	830003564	Famisanar EPS Cafam Colsubsidio	2		$0	$138,100
EPS037	900156264	Nueva Promotora de Salud - Nueva EPS	2		$0	$113,700
EPS041	900156264	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	2		$0	$105,600
						$3,174,400

***Si descontó incapacidades o notas crédito debe informar a la administradora correspondiente los descuentos.**

Le informamos que el pago de la planilla No. 81200873, fue posterior a la fecha límite establecida en el Decreto 1670 de 2007. Sin embargo, para las administradoras el recibir el aporte no implica que esté aceptando o se esté allanando a la mora, ya que la Ley establece la obligatoriedad de recibirlo, al igual que para los empleadores y aportantes la obligación de cotizar oportunamente, lo que permite el reconocimiento de las prestaciones económicas (Incapacidades, Licencias de Maternidad y Paternidad), evitando además, el recobro al empleador o trabajador independiente de los servicios prestados durante el periodo de pago extemporáneo.

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	800147909-3	SERVICIVIL SAS	Dg 62 43 151	3125486349	servicivil_ltda@hotmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
SUCURSAL	B – menos de 200 c	GERENCIA	03	SANTANDER	BARRANCABERMEJA	SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					2	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-10	2024-09	E	24/10/2024	80363693	$1.257.400	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	160.000	0		0		0	21	2.500	0	162.500	2

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230301	Porvenir	800224808-8	320.000	0	0	0	0	21	4.900	0	324.900	1
25-14	Colpensiones	900336004-7	320.000	0	0	0	0	21	4.900	0	324.900	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-4	Vida Colpatria S.A.	860002183-9	278.400				278.400	21	4.200	282.600			2.784	282.600	2

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF38	Cafaba	890270275-5	160.000	21	2.500	162.500	2

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	21	0	0	0
ICBF				
0	21	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	160.000	162.500
Pensión	2	640.000	649.800
Riesgos Laborales	1	278.400	282.600
CCF	1	160.000	162.500
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	5	1.238.400	1.257.400

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	800147909-3	SERVICIVIL SAS	Dg 62 43 151	3125486349	servicivil_ltda@hotmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
SUCURSAL	B – menos de 200 c	OBRA CIVIL	07	SANTANDER	BARRANCABERMEJA	SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					7	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-10	2024-09	E	24/10/2024	81200873	$3.174.400	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES													PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCION	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1042211787	CAMACHO GUZMAN EDUARD SEBASTIAN	1	0			S																	230301	1.300.000	208.000	0	0	0	0	EPS041	1.300.000	52.000	14-4	1.300.000	5	90.500	CCF38	1.300.000	52.000	0	0	0	0	0
2	CC	13888460	FLOREZ OBREGON ANSELMO	1	0			S																	25-14	1.300.000	208.000	0	0	0	0	EPS037	1.300.000	52.000	14-4	1.300.000	5	90.500	CCF38	1.300.000	52.000	0	0	0	0	0
3	CC	91425338	FONSECA CORTES ILDE ALFONSO	1	0			S																	231001	2.100.000	336.000	0	0	0	0	EPS017	2.100.000	84.000	14-4	2.100.000	5	146.200	CCF38	2.100.000	84.000	0	0	0	0	0
4	CC	1096188953	GALEANO NIETO JUAN SEBASTIAN	1	0			S																	25-14	1.300.000	208.000	0	0	0	0	EPS017	1.300.000	52.000	14-4	1.300.000	5	90.500	CCF38	1.300.000	52.000	0	0	0	0	0
5	CC	1096231835	MACHADO CASTAÑO ARNOLD DAVID	1	0			S																	230301	1.300.000	208.000	0	0	0	0	EPS041	1.300.000	52.000	14-4	1.300.000	5	90.500	CCF38	1.300.000	52.000	0	0	0	0	0
6	CC	1096248077	RODRIGUEZ MACHADO RONNY ESNEIDER	1	0			S																	230301	1.300.000	208.000	0	0	0	0	EPS005	1.300.000	52.000	14-4	1.300.000	5	90.500	CCF38	1.300.000	52.000	0	0	0	0	0
7	CC	5789777	SIERRA CAAMAÑO ROQUE	1	0			S																	25-14	1.500.000	240.000	0	0	0	0	EPS037	1.500.000	60.000	14-4	1.500.000	5	104.400	CCF38	1.500.000	60.000	0	0	0	0	0


PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

SERVICIVIL SAS

OBRAS CIVILES, ARQUITECTÓNICAS, ELÉCTRICAS, MECÁNICAS, AMBIENTALES, HIDRÁULICAS, DE SERVICIOS PÚBLICOS DE SANEAMIENTO BÁSICO, DE DISPOSICION FINAL Y LA DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARIOS

NIT. 800.147.909-3

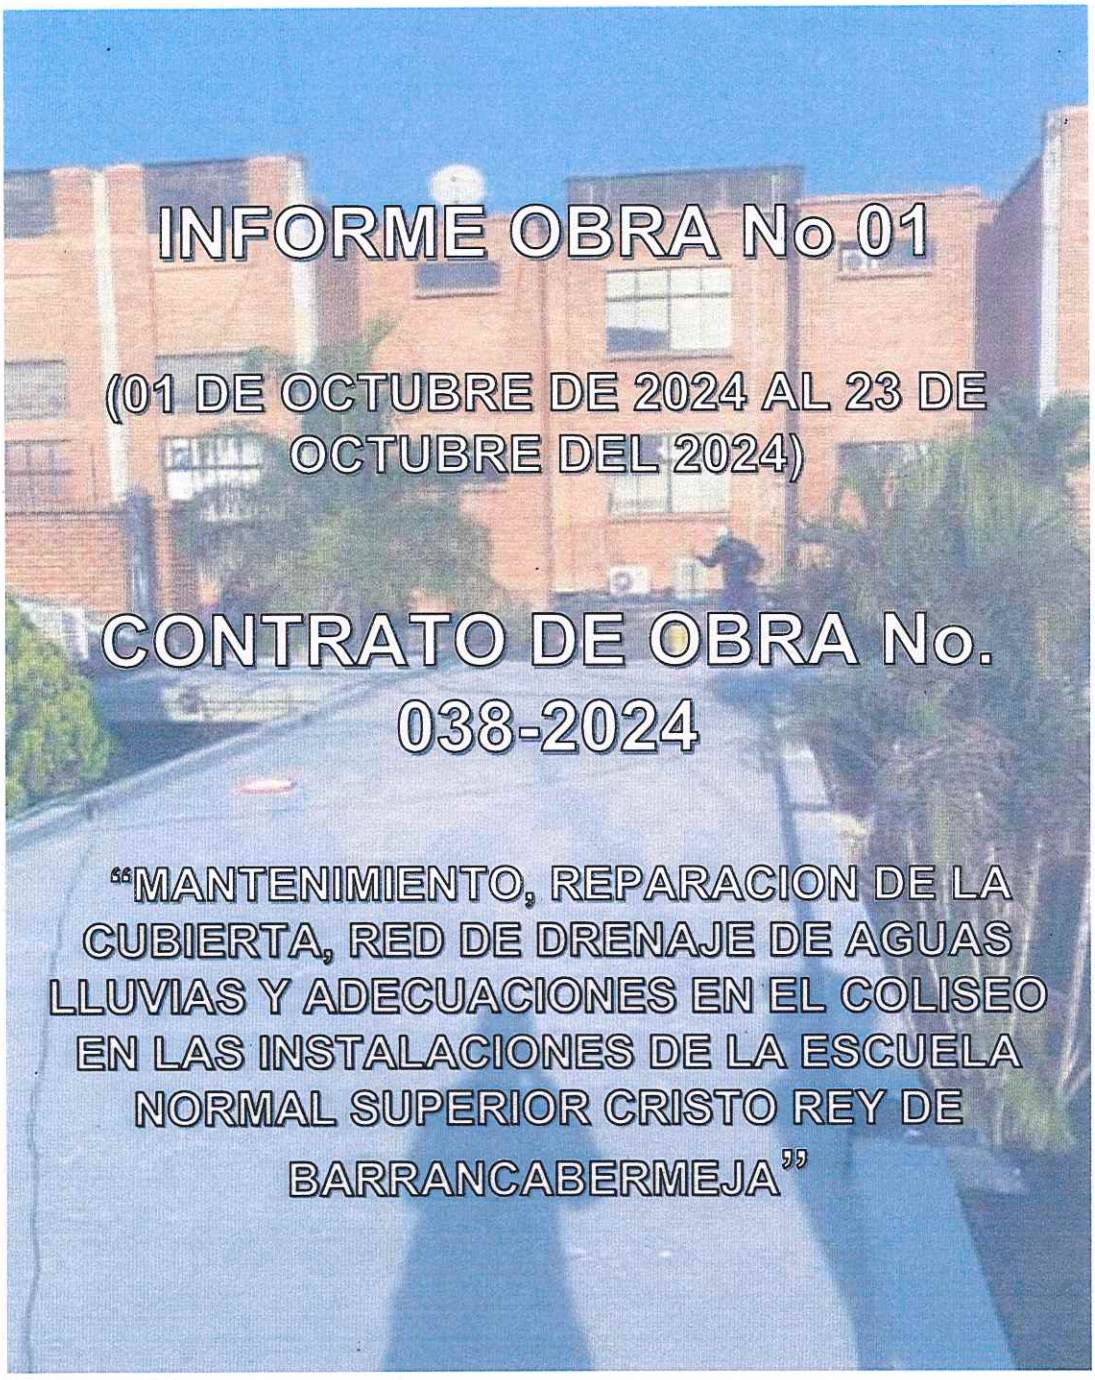

INFORME OBRA No 01

(01 DE OCTUBRE DE 2024 AL 23 DE OCTUBRE DEL 2024)

CONTRATO DE OBRA No. 038-2024

"MANTENIMIENTO, REPARACION DE LA CUBIERTA, RED DE DRENAJE DE AGUAS LLUVIAS Y ADECUACIONES EN EL COLISEO EN LAS INSTALACIONES DE LA ESCUELA NORMAL SUPERIOR CRISTO REY DE BARRANCABERMEJA"

CONTENIDO

1. INTRODUCCIÓN 4
2. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO 5
2.1 DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO 5
2.1.1 LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO 5
2.1.2 DESCRIPCION DEL PROYECTO 8
2.2 OBJETO DEL PROYECTO 8
2.3 ALCANCE DEL PROYECTO 9
3. ASPECTOS CONTRACTUALES 9
3.1 CONTRATOS SUSCRITOS 9
3.1.1 CONTRATO DE OBRA 9
4. ACTIVIDADES EJECUTADAS A LA FECHA, OCTUBRE 23 DE 2024 11
5. CONCLUSIONES Y RECMENDACIONES 12
6. ANEXO FOTOGRAFICO 13

TABLAS

Tabla 1. Cantidades para ejecutar según contrato 7
Tabla 2: Contrato de obra 10
Tabla 3. Actividades Ejecutadas durante el Periodo 11

FIGURAS

Figura 1. Municipio de Barrancabermeja 5

1. INTRODUCCIÓN

El presente informe de obra tiene como objetivo ofrecer un resumen detallado de las cantidades ejecutadas durante el periodo correspondiente al Acta Parcial No. 01 del contrato de obra No. 038-2024 cuyo propósito es el "MANTENIMIENTO, REPARACION DE LA CUBIERTA, RED DE DRENAJE DE AGUAS LLUVIAS Y ADECUACIONES EN EL COLISEO EN LAS INSTALACIONES DE LA ESCUELA NORMAL SUPERIOR CRISTO REY DE BARRANCABERMEJA"

Este informe incluye un registro del soporte técnico de las cantidades ejecutadas, las cuales están sustentadas en las memorias de cálculo pertinentes. El periodo abarcado por este informe va del 01 de octubre de 2024 al 23 de octubre de 2024, y ha sido elaborado por la empresa SERVICIVIL S.A.S. La presentación de estos datos es fundamental para garantizar la transparencia y la correcta ejecución del proyecto, así como para facilitar el seguimiento y la evaluación de los avances en la obra.

2. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO

2.1 DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO

2.1.1 LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO

El proyecto se desarrolla en el municipio de Barrancabermeja, departamento de Santander, la cual cuenta con una temperatura de 27,6° promedio y a 75,94 msnm.

Limita al norte con el norte municipio de Puerto Wilches, al sur con los municipios de Puerto Parra, Simacota y San Rafael de Chucuri, al oriente con el municipio de San Vicente de Chucuri y Girón, y al occidente con el rio Magdalena.

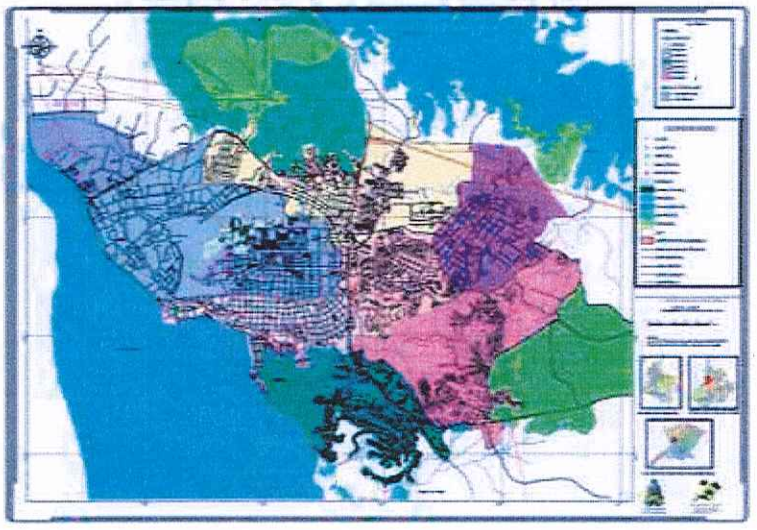


Figura 1. Municipio de Barrancabermeja

- MANTENIMIENTO, REPARACION DE LA CUBIERTA, RED DE DRENAJE DE AGUAS LLUVIAS Y ADECUACIONES EN EL COLISEO

EN LAS INSTALACIONES DE LA ESCUELA NORMAL SUPERIOR CRISTO REY DE BARRANCABERMEJA:

Se ubica en el área del Distrito de Barrancabermeja y tiene como ejecución las siguientes cantidades contractuales.

Nº	ÍTEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO SIN AIU	VALOR TOTAL SIN AIU
1	CUBIERTAS					
	1.1	Mantenimiento, limpieza e impermeabilización cubierta de circulación con aplicación de sikafill power 12 y emulsión asfáltica de sika para juntas de dilatación	m2	160	$ 76.712,00	$ 12.273.920,00
	1.2	Desmonte de pañete afectado en placas de cubierta	m2	80	$ 11.754,00	$ 940.320,00
	1.3	Instalación de pañete en placa de cubierta	m2	80	$ 48.557,00	$ 3.884.560,00
	1.4	Pintura de placas de cubierta tipo 1 interiores	m2	160	$ 27.223,00	$ 4.355.680,00
	1.5	Desmonte bajantes existentes en fibro-cemento	Und	8	$ 30.069,00	$ 240.552,00
	1.6	Mantenimiento, limpieza e impermeabilización de viga canal - aplicación de sikafill power 12 y Sikafill 300 thermic	ml	80	$ 50.734,00	$ 4.058.720,00
	1.7	Suministro e instalación de bajantes en PVC - 4" (3m) incluye accesorios	Und	8	$ 137.169,00	$ 1.097.352,00
2	RED DE AGUAS LLUVIAS					
	2.1	Localización y Replanteo	ml	200	$ 2.664,00	$ 532.800,00
	2.2	Cerramiento provisional para área de trabajo para protección de la excavación	ml	60	$ 11.073,00	$ 664.380,00
	2.3	Excavación Manual	m3	56	$ 35.087,00	$ 1.964.872,00
	2.4	Demolición enchape de piso y concreto (andenes)	m3	1,44	$ 79.774,00	$ 114.874,56
	2.5	Retiro de tubería de gres	m	200	$ 13.587,00	$ 2.717.400,00
	2.6	Suministro e instalación de Tubería Novafort PVC 6", incluye cama de arena y relleno material de excavación	m	200	$ 58.881,00	$ 11.776.200,00
	2.7	Suministro e instalación de sistema de rejilla con tragante de 8" a 6" en aluminio. (incluye accesorios y conexionado a tubería de 6")	und	13	$ 470.488,00	$ 6.116.344,00
	2.8	Suministro e instalación concreto 3000 psi	m3	2	$ 787.492,00	$ 1.574.984,00
	2.9	Suministro e Instalación Tableta, incluye mortero de nivelación	ml	6	$ 73.326,00	$ 439.956,00
	2.10	Limpieza de cárcamos de all (incluye trasiego para acopio temporal)	ml	120	$ 7.419,00	$ 890.280,00

	2.11	Mantenimiento de rejillas de cárcamos y rejillas de cajas de ALL	m	120	$ 100.304,00	$ 12.036.480,00
	2.12	Limpieza y disposición final de escombros	viaje	3	$ 636.102,00	$ 1.908.306,00
3	COLISEO					
	3.1	PRELIMINARES				
	3.1.1	Lavado de muro en fondo del coliseo	m2	252	$ 8.417,00	$ 2.121.084,00
	3.1.2	Lavado de graderías	m2	133,64	$ 8.417,00	$ 1.124.847,88
	3.1.3	Desmonte de ventiladores deteriorados	und	8	$ 40.485,00	$ 323.880,00
	3.2	GRADERIAS				
	3.2.1	Construcción de columnetas en concreto para graderías con dimensiones 0,10 m x 0,10 m Incluye acero de refuerzo	ml	8,45	$ 159.933,00	$ 1.351.433,85
	3.2.2	Construcción de muro en ladrillo a la vista para gradería	m2	6,24	$ 187.704,00	$ 1.171.272,96
	3.2.3	Suministro e instalación de barandas tubulares metálica galvanizada de seguridad para graderías	ml	31,6	$ 163.490,00	$ 5.166.284,00
	3.2.4	Construcción de pasos para acceso a gradería	und	32	$ 93.028,00	$ 2.976.896,00
	3.3	SISTEMA ELECTRICO				
	3.3.1	Desmonte, suministro e instalación de canaleta para red eléctrica	ml	80	$ 25.538,00	$ 2.043.040,00
	3.3.2	Suministro e instalación de ventiladores	und	8	$ 513.024,00	$ 4.104.192,00
	3.3.3	Suministro e instalación tablero trifásico	und	1	$ 344.618,00	$ 344.618,00
	3.3.4	Suministro e instalación de luminaria parte superior central en cubierta	und	6	$ 136.086,00	$ 816.516,00
	3.4	MURO DE FONDO				
	3.4.1	Suministro e instalación de barniz para muros de fondo	m2	122	$ 23.661,00	$ 2.886.642,00
	3.4.2	Suministro e instalación de pintura gris basalto para columnas y cigas de muro	m2	20	$ 30.562,00	$ 611.240,00
	3.5	CUBIERTA				
	3.5.1	Suministro e instalación de impermeabilización (manto fiberglass o similar)	m2	30	$ 64.032,00	$ 1.920.960,00
	3.5.2	Suministro e instalación de ska Fil 12 (Impermeabilización)	m2	30	$ 53.456,00	$ 1.603.680,00
4	TRANSPORTE					
	4.1	Transporte interno de material a punto de acopio	M3	16	$ 52.007,00	$ 832.112,00
	4.2	Retiro de material sobrante tipo escombro	M3	16	$ 58.804,00	$ 940.864,00

Tabla 1. Cantidades para ejecutar según contrato

2.1.2 DESCRIPCION DEL PROYECTO

El proyecto se origina con el propósito de satisfacer las necesidades básicas de la población y el mejoramiento de la calidad de la prestación de los servicios ofrecidos por la escuela Normal Superior Cristo Rey con el fin de garantizar espacios competentes y seguros para los estudiantes, docentes y trabajadores que la visitan. Recolectando lo anterior mencionado, se destacan los siguientes beneficios que se lograran mediante la ejecución de las actividades del presente contrato de obra y son las siguientes: 1) mejorar y adecuar las instalaciones del coliseo para garantizar una zona segura a los asistentes. 2)mitigar las inundaciones generadas en la zona debido a las aguas lluvias presentadas y los daños presentes en la red.

La institución educativa del Distrito de Barrancabermeja adjudica el contrato de obra No. 038-2024 a la empresa SERVICIVIL S.AS. para iniciar el proyecto titulado "MANTENIMIENTO, REPARACION DE LA CUBIERTA, RED DE DRENAJE DE AGUAS LLUVIAS Y ADECUACIONES EN EL COLISEO EN LAS INSTALACIONES DE LA ESCUELA NORMAL SUPERIOR CRISTO REY DE BARRANCABERMEJA". Esta iniciativa no solo asegurará la funcionalidad del coliseo, sino que también contribuirá al bienestar general de la comunidad educativa, proporcionando un entorno más seguro y adecuado para diversas actividades.

2.2 OBJETO DEL PROYECTO

Llevar a cabo el mantenimiento, reparación y adecuación de las instalaciones en la Escuela Normal Superior Cristo Rey, atendiendo a las necesidades específicas identificadas. Este proceso no solo garantizará la funcionalidad y seguridad de los espacios, sino que también mejorará el ambiente educativo, favoreciendo el aprendizaje y el desarrollo integral de los estudiantes. Además, se implementarán medidas para asegurar que las instalaciones cumplan con los estándares de calidad requeridos y se mantengan en óptimas condiciones para el uso diario de la

comunidad escolar. Lo anterior mediante el contrato de obra No. 038-2024 realizado entre la institución educativa y la empresa SERVICIVIL S.A.S.

2.3 ALCANCE DEL PROYECTO

Realizar el mantenimiento, reparación y adecuación de instalaciones en la escuela Normar Superior Cristo Rey que requieren la necesidad.

3. ASPECTOS CONTRACTUALES

3.1 CONTRATOS SUSCRITOS

A continuación, se relaciona la información actualizada del contrato de obra para la ejecución del presente proyecto:

3.1.1 CONTRATO DE OBRA

Los datos generales del contrato de obra se presentan en la siguiente tabla:

INFORME DE OBRA **FECHA:** 23-09-2024	**CONTRATO DE OBRA No. 038-2024**
INFORMACIÓN BÁSICA	**Objeto**: "MANTENIMIENTO, REPARACION DE LA CUBIERTA, RED DE DRENAJE DE AGUAS LLUVIAS Y ADECUACIONES EN EL COLISEO EN LAS INSTALACIONES DE LA ESCUELA NORMAL SUPERIOR CRISTO REY DE BARRANCABERMEJA". **Contratista: SERVICIVIL S.A.S.** **NIT:** 800.147.909-3 **Valor Inicial del Contrato:** $132.153.220,00

<table>
<tr><td></td><td>Fecha de Inicio: 01 de octubre de 2024

Plazo de Ejecución: DOS (02) MESES

Fecha de Terminación: 30 de noviembre de 2024

Supervisor: Leuder Barbosa Hernández</td></tr>
<tr><td></td><td>El Contrato presenta un avance de ejecución presupuestal acumulado de obra del 32.70%. hasta el 23 de octubre de 2024</td></tr>
<tr><td>ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO:</td><td><table><tr><th>DESCRIPCIÓN</th><th>VALOR</th></tr><tr><td>CTO 038-2024</td><td>$132.153.220,00</td></tr><tr><td>COBRO PRESENTE ACTA No. 01</td><td>$43.218.898,00</td></tr></table></td></tr>
<tr><td>RECURSOS HUMANOS ADMINISTRATIVOS</td><td>La Obra cuenta con el siguiente personal administrativo para la ejecución de las actividades

PERSONAL

• Ingeniero director de Obra
• Ingeniero Residente de Obra</td></tr>
<tr><td>ASPECTOS ADMINISTRATIVOS</td><td><table><tr><td>GARANTÍAS</td><td>Valor</td><td>vigencia inicial (dd/mm/aa)</td><td>Vigencia final (dd/mm/aa)</td></tr><tr><td>CUMPLIMIENTO</td><td>$ 26.430.644,00</td><td>01/10/2024</td><td>01/12/2024</td></tr><tr><td>SAL Y PRESTAC</td><td>$ 13.215.322,00</td><td>01/10/2024</td><td>01/12/2027</td></tr><tr><td>CALIDAD DEL SERVICIO</td><td>$13.215.322,00</td><td>01/10/2024</td><td>01/12/2024</td></tr><tr><td>CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTODE BIENES</td><td>$13.215.322,00</td><td>01/10/2024</td><td>31/03/2025</td></tr><tr><td colspan="4">RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL</td></tr><tr><td>PREDIOS LABORALES Y OPERACIONES</td><td>$260.000.000,00</td><td>01/10/2024</td><td>01/12/2024</td></tr></table></td></tr>
</table>

Tabla 2: Contrato de obra

4. ACTIVIDADES EJECUTADAS A LA FECHA, OCTUBRE 23 DE 2024

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CONDICIONES INICIALES DEL CONTRATO			CANTIDADES EJECUTADAS	VALORES EJECUTADOS
			CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	PRESENTE ACTA No.01	PRESENTE ACTA No.01
1	CUBIERTA						
1,1	Mantenimiento, limpieza e impermeabilización cubierta de circulación con aplicación de sikafill power 12 y emulsión asfactica de sika para juntas de dilatación	m2	*160,00*	*$ 76.712,00*	$ 12.273.920,00	150,00	$ 11.506.800,00
1,2	Desmonte de pañete afectado en placas de cubierta	m2	*80,00*	*$ 11.754,00*	$ 940.320,00	50,00	$ 587.700,00
1,3	Instalación de pañete en placa de cubierta	m2	*80,00*	*$ 48.557,00*	$ 3.884.560,00	50,00	$ 2.427.850,00
1,4	Pintura de placas de cubierta tipo 1 interiores	m2	*160,00*	*$ 27.223,00*	$ 4.355.680,00	150,00	$ 4.083.450,00
2	RED DE AGUAS LLUVIAS						
2.1	Localización y Replanteo	ml	*200,00*	*$ 2.664,00*	$ 532.800,00	200,00	$ 532.800,00
2.10	Limpieza de carcamos de all (incluye trasiego para acopio temporal)	ml	*120,00*	*$ 7.419,00*	$ 890.280,00	120,00	$ 890.280,00
3	COLISEO						
3,1	PRELIMINARES						
3.1.1	Lavado de muro en fondo del coliseo	m2	*252,00*	*$ 8.417,00*	$ 2.121.084,00	252,00	$ 2.121.084,00
3.1.2	Lavado de graderías	m2	*133,64*	*$ 8.417,00*	$ 1.124.848,00	133,64	$ 1.124.848,00
3.1.3	Desmonte de ventiladores deteriorados	und	*8,00*	*$ 40.485,00*	$ 323.880,00	7,00	$ 283.395,00
3.2	GRADERIAS						
3.2.1	Construcción de columnetas en concreto para graderias con dimensiones 0,10 m x 0,10 m Incluye acero de refuerzo	ml	*8,45*	*$ 159.933,00*	$ 1.351.434,00	8,45	$ 1.351.434,00
3.2.2	Construcción de muro en ladrillo a la vista para gradería	m2	*6,24*	*$ 187.704,00*	$ 1.171.273,00	6,24	$ 1.171.273,00
3.2.3	Suministro e instalación de barandas tubulares metálica galvanizada de seguridad para graderías	ml	*31,60*	*$ 163.490,00*	$ 5.166.284,00	17,20	$ 2.812.028,00
3.2.4	Construcción de pasos para acceso a gradería	und	*32,00*	*$ 93.028,00*	$ 2.976.896,00	32,00	$ 2.976.896,00
4	TRANSPORTE						
4.1	Transporte interno de material a punto de acopio	M3	*16,00*	*$ 52.007,00*	$ 832.112,00	3,00	$ 156.021,00
	VALOR TOTAL COSTOS DIRECTOS				$ 97.927.544,00		$ 32.025.859,00
	VALOR TOTAL COSTOS INDIRECTOS				$ 33.295.364,00		$ 10.888.793,00
	ADMINISTRACIÓN	28%			$ 27.419.712,00		$ 8.967.241,00
	IMPREVISTOS	1%			$ 979.275,00		$ 320.259,00
	UTILIDAD	5%			$ 4.896.377,00		$ 1.601.293,00
VALOR TOTAL COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS					$ 131.222.908,00		$ 42.914.652,00
VALOR DEL IVA SOBRE UTILIDAD		19%			930.311,63		$ 304.246,00
AMORTIZACION DE ANTICIPO (%)							
VALOR A PAGAR					$ 132.153.219,63		$ 43.218.898,00

Tabla 3. Actividades Ejecutadas durante el Periodo

5. CONCLUSIONES Y RECMENDACIONES

Por lo anterior se evidencia que, a la fecha del presente informe, correspondiente al periodo del 01 de octubre de 2024 al 23 de octubre de 2024, se ha alcanzado un avance de obra del 32.70% para un valor de avance de $43,218,898,00 (CUARENTA Y TRES MILLONES DOSCIENTOS DIECIOCHO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS MCTE. Avance de obra acumulado del 32.70%, lo que indica un progreso significativo en cuanto a la ejecución.

Se recomienda mantener una comunicación fluida entre todos los involucrados en el proyecto, lo que facilitará la identificación y resolución de posibles inconvenientes de manera oportuna.

JORGE TRUJILLO NIÑO
Representante Legal
SERVICIVIL S.A.S.
Nit: 800.147.909-3

6. ANEXO FOTOGRAFICO

ASUNTO: Informe para el Mantenimiento, reparación de la cubierta, red de drenaje de aguas lluvias y adecuaciones en el coliseo en las instalaciones de la escuela normal superior cristo rey de Barrancabermeja. A continuación, se relacionan las actividades ejecutadas en este periodo junto a su respectivo registro fotográfico para soporte.

A. Cubierta

1. Actividades ejecutadas en el corte No.01

1.1. Mantenimiento, limpieza e impermeabilización cubierta de circulación con aplicación de Sikafill power 12 años y emulsión asfáltica de sika para juntas de dilatación.






SERVICIVIL
SAS

OBRAS CIVILES, ARQUITECTÓNICAS, ELÉCTRICAS, MECÁNICAS, AMBIENTALES, HIDRÁULICAS, DE SERVICIOS PÚBLICOS DE SANEAMIENTO BÁSICO, DE DISPOSICION FINAL Y LA DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARIOS

NIT. 800.147.909-3

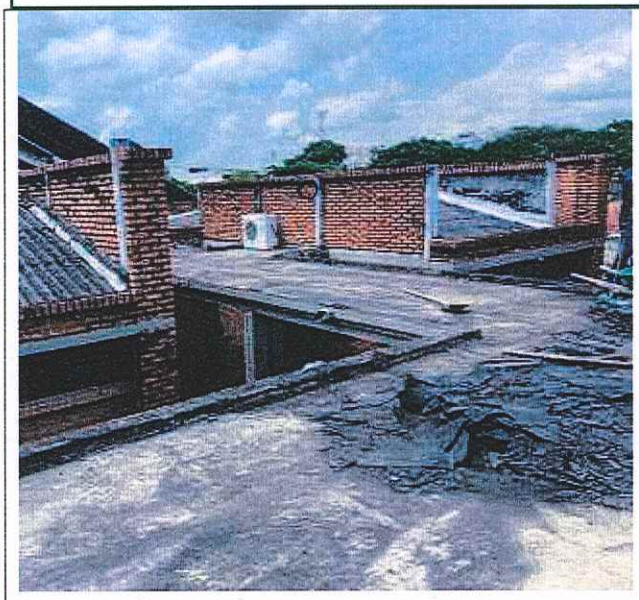









SERVICIVIL SAS

OBRAS CIVILES, ARQUITECTÓNICAS, ELÉCTRICAS, MECÁNICAS, AMBIENTALES, HIDRÁULICAS, DE SERVICIOS PÚBLICOS DE SANEAMIENTO BÁSICO, DE DISPOSICION FINAL Y LA DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARIOS

NIT. 800.147.909-3



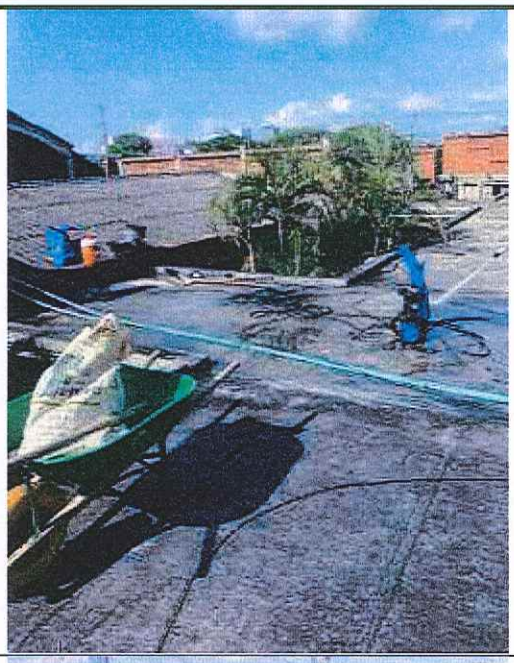

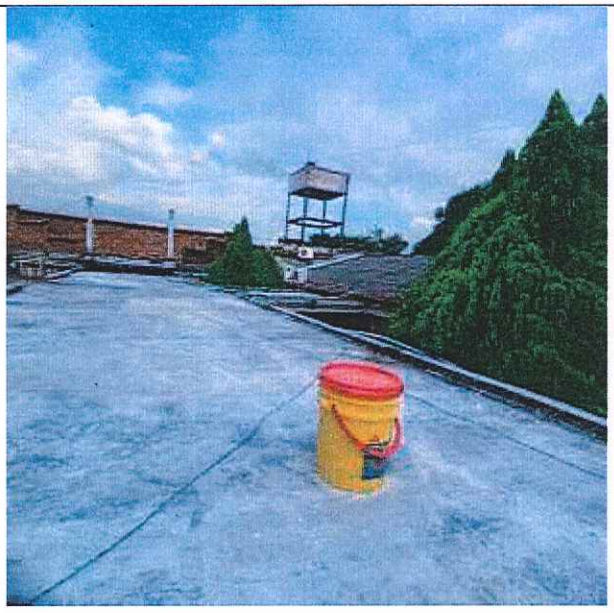






SERVICIVIL SAS

OBRAS CIVILES, ARQUITECTÓNICAS, ELÉCTRICAS, MECÁNICAS, AMBIENTALES, HIDRÁULICAS, DE SERVICIOS PÚBLICOS DE SANEAMIENTO BÁSICO, DE DISPOSICION FINAL Y LA DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARIOS

NIT. 800.147.909-3

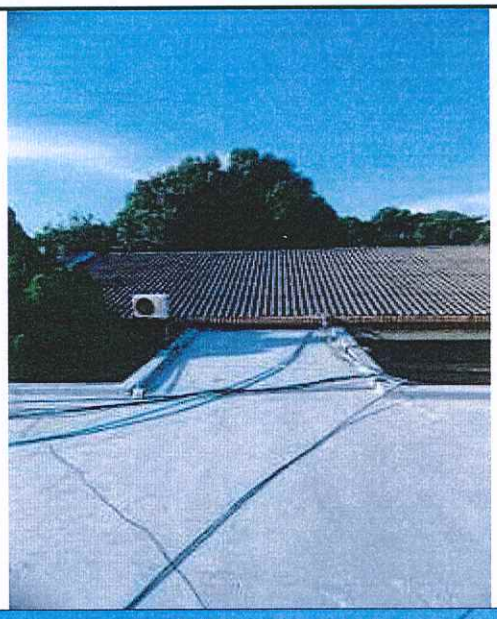

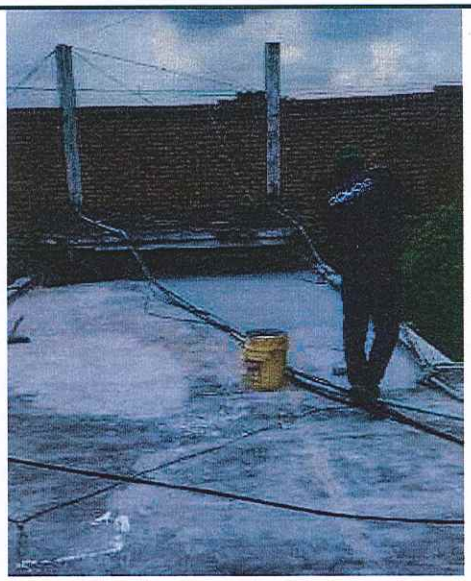

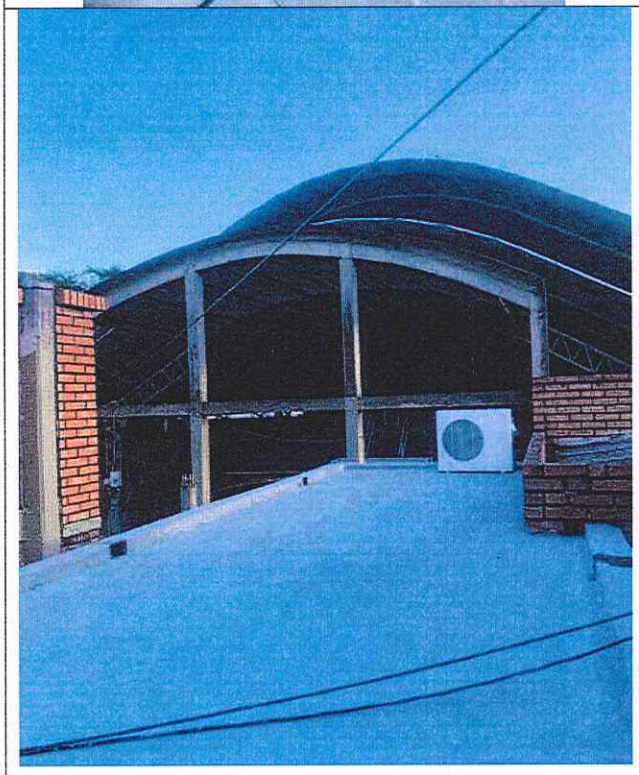



1.2. Desmonte de pañete afectado en placas de cubierta



1.3. Instalación de pañete en placa de cubierta



B. COLISEO


3.1.1. Lavado de muro en fondo del coliseo.











3.1.2. Lavado de graderías en el coliseo.

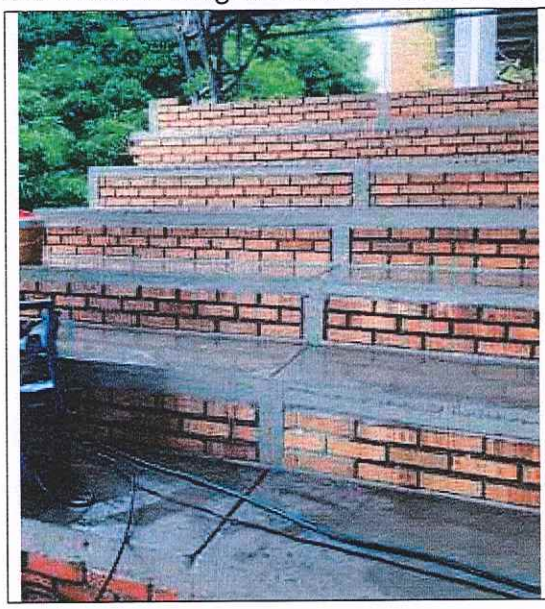

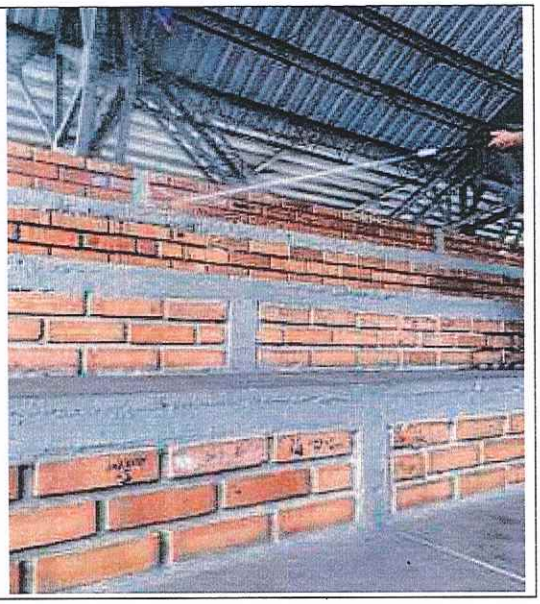

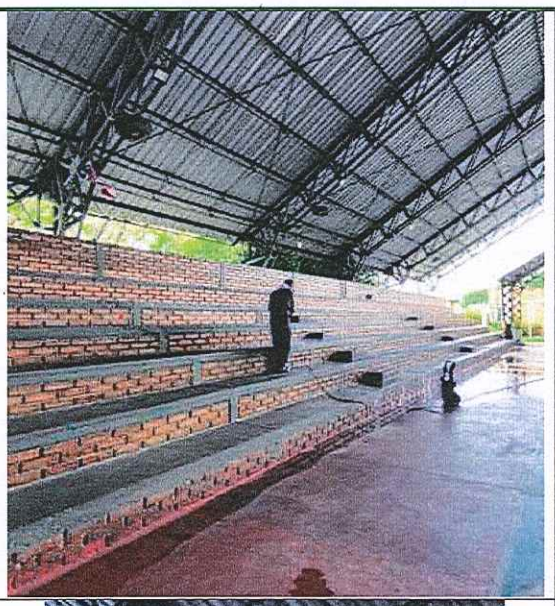

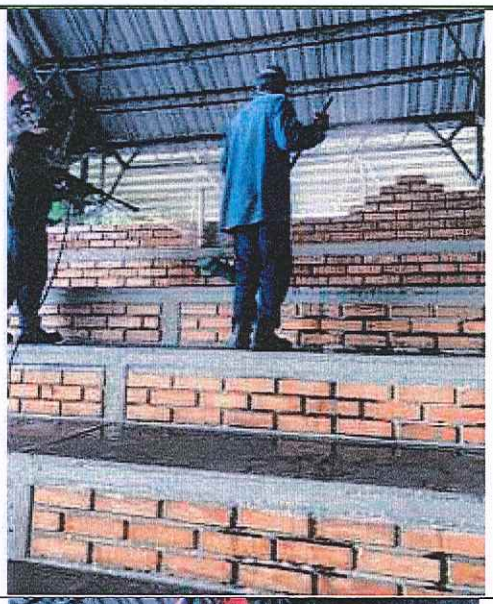

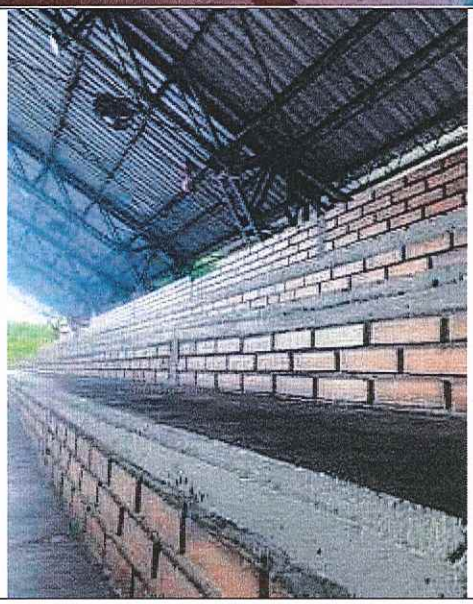








3.1.3. Desmonte de ventiladores



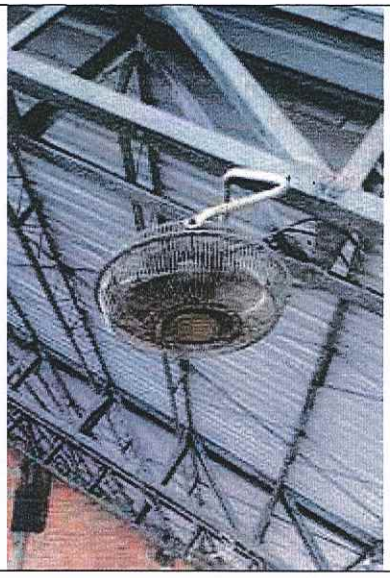





3.2.1. Construcción de columnetas en concreto para graderías con dimensiones 0,10 m x 0,10 m Incluye acero de refuerzo







3.2.2. Construcción de muro en ladrillo a la vista para gradería




3.2.3. Suministro e instalación de barandas tubulares metálica galvanizada de seguridad para graderías

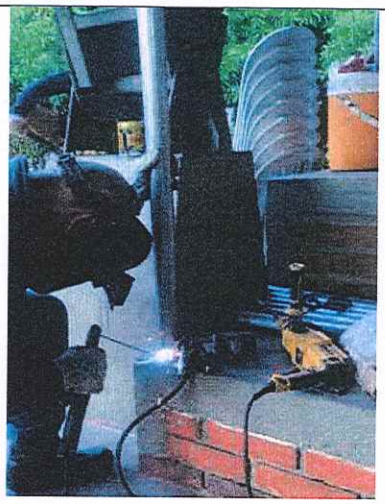

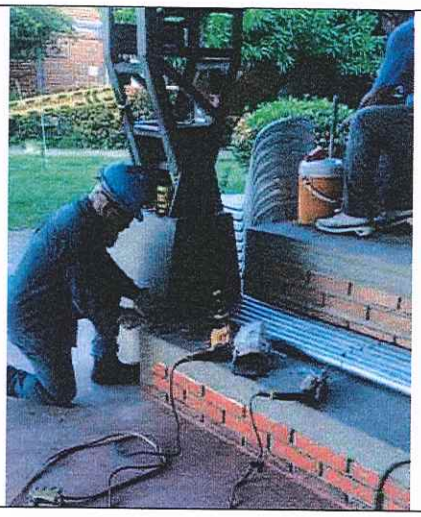

3.2.4. Construcción de pasos para acceso a graderías

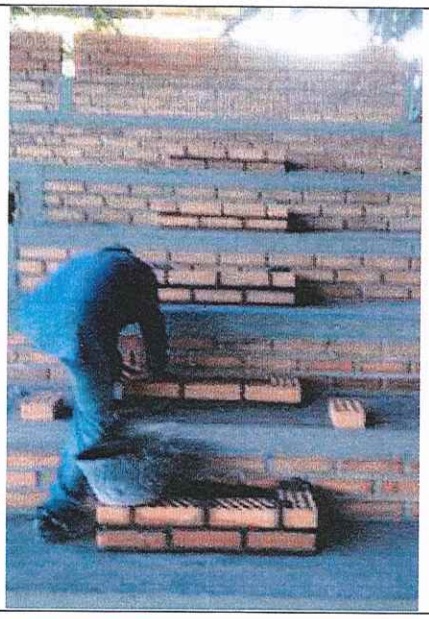



C. RED DE AGUAS LLUVIAS

1 limpieza de cárcamos



SERVICIVIL SAS	SERVICIVIL S.A.S	CODIGO: F-01
	BITACORA DE CAMPO	VERSIÓN: 1

MANTENIMIENTO, REPARACION DE LA CUBIERTA, RED DE DRENAJE DE AGUAS LLUVIAS Y ADECUACIONES EN EL COLISEO EN LAS INSTALACIONES DE LA ESCUELA NORMAL SUPERIOR CRISTO REY DE BARRANCABERMEJA

FECCHA D 2 M 10 A 2024

REPORTE DE LLUVIA

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Sin lluvia
	con																														Con lluvia

EQUIPO								
MEZCLADORAS	0		CANECAS	0		HERRAMIENTAS MENORES	0	
RANAS	0		CAMIONETA	0		SECCION DE ANDAMIOS	0	
VIBRADORES	0		VOLQUETA	0				
PERSONAL								
INGENIEROS	2		ALMACENISTAS	0				
MAESTRO	0		OBREROS	0				
OFICIALES	0		CONDUCTORES	0				
CONTROLES AMBIENTALES	CUMPLE			CUMPLE			CUMPLE	
	SI	NO		SI	NO		SI	NO
ZONAS DE ACOPIO MATERIAL		x	DISPOSICION DE MATERIALES		x	RECOLECCION RESIDUOS SÓLIDOS		
SEÑALIZACION AREAS		x	PROTECCION CAUCES			DERRAMES QUIMICOS		
CONTROLES EN S&SO		x						
USO DE EPP		x	DOTACIÓN PERSONAL		x	ASEO Y LIMPIEZA AREAS		
AFILIACIONES		x	EXTINTOR Y CAMILLA		x	BAÑOS PUBLICOS		

RESUMEN DE ACTIVIDADES

Se inician labores a las 7:00 a.m. y finalizan a las 6:00 p.m.

Jornada de revisión de cronograma, presupuesto y actividades a ejecutar por parte de los profesionales encargados

Día lluvioso

ELABORO: Jorge Trujillo

RESIDENTE: _____

SUPERVISOR : _____

Ing. Leuder Barbosa Hernandez

SERVICIVIL SAS	SERVICIVIL S.A.S	CODIGO: F-01
	BITACORA DE CAMPO	VERSIÓN: 1

MANTENIMIENTO, REPARACION DE LA CUBIERTA, RED DE DRENAJE DE AGUAS LLUVIAS Y ADECUACIONES EN EL COLISEO EN LAS INSTALACIONES DE LA ESCUELA NORMAL SUPERIOR CRISTO REY DE BARRANCABERMEJA

FECCHA D 3 M 10 A 2024

REPORTE DE LLUVIA

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
		sin																													Sin lluvia
																															Con lluvia

EQUIPO								
MEZCLADORAS	0		CANECAS	0		HERRAMIENTAS MENORES	0	
RANAS	0		CAMIONETA	0		SECCION DE ANDAMIOS	0	
VIBRADORES	0		VOLQUETA	0				
PERSONAL								
INGENIEROS	2		ALMACENISTAS	0				
MAESTRO	1		OBREROS	2				
OFICIALES	0		CONDUCTORES	0				
CONTROLES AMBIENTALES	CUMPLE SI	CUMPLE NO		CUMPLE SI	CUMPLE NO		CUMPLE SI	CUMPLE NO
ZONAS DE ACOPIO MATERIAL		x	DISPOSICION DE MATERIALES		x	RECOLECCION RESIDUOS SÓLIDOS		
SEÑALIZACION AREAS		x	PROTECCION CAUCES			DERRAMES QUIMICOS		
CONTROLES EN S&SO		x						
USO DE EPP		x	DOTACIÓN PERSONAL		x	ASEO Y LIMPIEZA AREAS		
AFILIACIONES		x	EXTINTOR Y CAMILLA		x	BAÑOS PUBLICOS		

RESUMEN DE ACTIVIDADES

Se inician labores a las 7:00 a.m. y finalizan a las 6:00 p.m.

Jornada de revisión de cronograma, presupuesto y actividades a ejecutar por parte de los profesionales encargado. Temas de oficina como preparacion del personal para trabajar en la ejecucion de las actividades. Actividades realizadas en oficina central

Día soleado

ELABORO: Jorge Trujillo

RESIDENTE: _____

SUPERVISOR : _____

Ing. Leuder Barbosa Hernandez

SERVICIVIL SAS	SERVICIVIL S.A.S	CODIGO: F-01
	BITACORA DE CAMPO	VERSIÓN: 1

MANTENIMIENTO, REPARACION DE LA CUBIERTA, RED DE DRENAJE DE AGUAS LLUVIAS Y ADECUACIONES EN EL COLISEO EN LAS INSTALACIONES DE LA ESCUELA NORMAL SUPERIOR CRISTO REY DE BARRANCABERMEJA

FECCHA D 4 M 10 A 2024

REPORTE DE LLUVIA	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Sin lluvia
				sin																												Con lluvia

EQUIPO								
MEZCLADORAS	0		CANECAS	0		HERRAMIENTAS MENORES	0	
RANAS	0		CAMIONETA	0		SECCION DE ANDAMIOS	0	
VIBRADORES	0		VOLQUETA	0				
PERSONAL								
INGENIEROS	2		ALMACENISTAS	0				
MAESTRO	1		OBREROS	2				
OFICIALES	0		CONDUCTORES	0				
CONTROLES AMBIENTALES	CUMPLE			CUMPLE			CUMPLE	
	SI	NO		SI	NO		SI	NO
ZONAS DE ACOPIO MATERIAL		x	DISPOSICION DE MATERIALES		x	RECOLECCION RESIDUOS SÓLIDOS		
SEÑALIZACION AREAS		x	PROTECCION CAUCES			DERRAMES QUIMICOS		
CONTROLES EN S&SO		x						
USO DE EPP		x	DOTACIÓN PERSONAL		x	ASEO Y LIMPIEZA AREAS		
AFILIACIONES		x	EXTINTOR Y CAMILLA		x	BAÑOS PUBLICOS		

RESUMEN DE ACTIVIDADES

Se inician labores a las 7:00 a.m. y finalizan a las 6:00 p.m.

Se continua jornada de revisión de cronograma, presupuesto y actividades a ejecutar por parte de los profesionales encargados y programacion del personal operativo encargados de realizar los trabajos en campo.Se realiza charla SST a los trabajadores sobre orden y aseo . Envio de oficio N0.001 solicitando el ingreso del personal a las instalaciones de la institucion educativa para iniciar actividades programadas.

Día soleado

ELABORO: Jorge Trujillo

RESIDENTE: _____

SUPERVISOR : _____

Ing. Leuder Barbosa Hernandez

SERVICIVIL SAS	SERVICIVIL S.A.S	CODIGO: F-01
	BITACORA DE CAMPO	VERSIÓN: 1

MANTENIMIENTO, REPARACION DE LA CUBIERTA, RED DE DRENAJE DE AGUAS LLUVIAS Y ADECUACIONES EN EL COLISEO EN LAS INSTALACIONES DE LA ESCUELA NORMAL SUPERIOR CRISTO REY DE BARRANCABERMEJA

FECCHA D 5 M 10 A 2024

REPORTE DE LLUVIA

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
				Sin																											Sin lluvia
																															Con lluvia

EQUIPO								
MEZCLADORAS	0	CANECAS	0	HERRAMIENTAS MENORES	0			
RANAS	0	CAMIONETA	0	SECCION DE ANDAMIOS	0			
VIBRADORES	0	VOLQUETA	0					
PERSONAL								
INGENIEROS	2	ALMACENISTAS	0					
MAESTRO	1	OBREROS	2					
OFICIALES	0	CONDUCTORES	0					
CONTROLES AMBIENTALES	CUMPLE		CUMPLE			CUMPLE		
	SI	NO	SI	NO		SI	NO	
ZONAS DE ACOPIO MATERIAL		x	DISPOSICION DE MATERIALES		x	RECOLECCION RESIDUOS SÓLIDOS		
SEÑALIZACION AREAS		x	PROTECCION CAUCES			DERRAMES QUIMICOS		
CONTROLES EN S&SO		x						
USO DE EPP		x	DOTACIÓN PERSONAL		x	ASEO Y LIMPIEZA AREAS		
AFILIACIONES		x	EXTINTOR Y CAMILLA		x	BAÑOS PUBLICOS		

RESUMEN DE ACTIVIDADES

Se inician labores a las 7:00 a.m. y finalizan a las 10:00 a.m.

Se realiza preparacion de herramientas, equipos y materiales a trasladar al área a intervenir para iniciar actividades programadas según cronograma

Día soleado

ELABORO: Jorge Trujillo

RESIDENTE: _____

SUPERVISOR : _____

Ing. Leuder Barbosa Hernandez

SERVICIVIL SAS	SERVICIVIL S.A.S	CODIGO: F-01
	BITACORA DE CAMPO	VERSIÓN: 1

MANTENIMIENTO, REPARACION DE LA CUBIERTA, RED DE DRENAJE DE AGUAS LLUVIAS Y ADECUACIONES EN EL COLISEO EN LAS INSTALACIONES DE LA ESCUELA NORMAL SUPERIOR CRISTO REY DE BARRANCABERMEJA

FECCHA D 7 M 10 A 2024

REPORTE DE LLUVIA	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
							sin																									Sin lluvia
																																Con lluvia

EQUIPO							
MEZCLADORAS	0	CANECAS	1	HERRAMIENTAS MENORES	4		
RANAS	0	CAMIONETA	1	SECCION DE ANDAMIOS	0		
VIBRADORES	0	VOLQUETA	0				
PERSONAL							
INGENIEROS	2	ALMACENISTAS	0				
MAESTRO	1	OBREROS	2				
OFICIALES	0	CONDUCTORES	0				
CONTROLES AMBIENTALES	CUMPLE SI	CUMPLE NO		CUMPLE SI	CUMPLE NO		CUMPLE SI	CUMPLE NO
ZONAS DE ACOPIO MATERIAL	x		DISPOSICION DE MATERIALES	x		RECOLECCION RESIDUOS SÓLIDOS	x	
SEÑALIZACION AREAS	x		PROTECCION CAUCES			DERRAMES QUIMICOS		
CONTROLES EN S&SO	x							
USO DE EPP	x		DOTACIÓN PERSONAL	x		ASEO Y LIMPIEZA AREAS	x	
AFILIACIONES	x		EXTINTOR Y CAMILLA			BAÑOS PUBLICOS		

RESUMEN DE ACTIVIDADES

Se inician labores a las 7:00 a.m. y finalizan a las 5:00 p.m.

Se da ingreso al personal de trabajo, Se inician actividades en instalaciones de cubierta del área a intervenir. Se realizan actividades de localización y replanteo para alcanzables del capitulo de redes de aguas lluvias. Traslado de equipos y herramientas necesaria para el inicio y ejecucion de actividades. Adecuacion del área de trabajo

Día soleado

ELABORO: Jorge Trujillo

RESIDENTE: _____

SUPERVISOR : _____

Ing. Leuder Barbosa Hernandez

SERVICIVIL SAS	SERVICIVIL S.A.S	CODIGO: F-01
	BITACORA DE CAMPO	VERSIÓN: 1

MANTENIMIENTO, REPARACION DE LA CUBIERTA, RED DE DRENAJE DE AGUAS LLUVIAS Y ADECUACIONES EN EL COLISEO EN LAS INSTALACIONES DE LA ESCUELA NORMAL SUPERIOR CRISTO REY DE BARRANCABERMEJA

FECCHA D 8 M 10 A 2024

REPORTE DE LLUVIA	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
								sin																								Sin lluvia / Con lluvia

EQUIPO								
MEZCLADORAS	0		CANECAS	0		HERRAMIENTAS MENORES	4	
RANAS	0		CAMIONETA	0		SECCION DE ANDAMIOS	0	
VIBRADORES	0		VOLQUETA	0				
PERSONAL								
INGENIEROS	2		ALMACENISTAS	0				
MAESTRO	1		OBREROS	2				
OFICIALES	0		CONDUCTORES	0				
CONTROLES AMBIENTALES	CUMPLE			CUMPLE			CUMPLE	
	SI	NO		SI	NO		SI	NO
ZONAS DE ACOPIO MATERIAL	x		DISPOSICION DE MATERIALES	x		RECOLECCION RESIDUOS SÓLIDOS	x	
SEÑALIZACION AREAS	x		PROTECCION CAUCES			DERRAMES QUIMICOS		
CONTROLES EN S&SO	x							
USO DE EPP	x		DOTACIÓN PERSONAL	x		ASEO Y LIMPIEZA AREAS	x	
AFILIACIONES	x		EXTINTOR Y CAMILLA			BAÑOS PUBLICOS		

RESUMEN DE ACTIVIDADES

Se inician labores a las 7:00 a.m. y finalizan a las 6:00 p.m.

Se continua actividad de localizacion y replanteo para la adecuacion de red de aguas lluvias en zona de interes. No se cuenta con planos de diseño donde se detalle la trazabilidad de las redes de alcantarillado. Se realizaron ensayos para verificar la fluides, despeje y disposicion final de la red de aguas lluvias existente. Adecuación del área de trabajo.

Día soleado

ELABORO: Jorge Trujillo

RESIDENTE: _____

SUPERVISOR : _____

Ing. Leuder Barbosa Hernandez

SERVICIVIL SAS	SERVICIVIL S.A.S	CODIGO: F-01
	BITACORA DE CAMPO	VERSIÓN: 1

MANTENIMIENTO, REPARACION DE LA CUBIERTA, RED DE DRENAJE DE AGUAS LLUVIAS Y ADECUACIONES EN EL COLISEO EN LAS INSTALACIONES DE LA ESCUELA NORMAL SUPERIOR CRISTO REY DE BARRANCABERMEJA

FECCHA D 9 M 10 A 2024

REPORTE DE LLUVIA	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
									sin																							Sin lluvia
																																Con lluvia

EQUIPO							
MEZCLADORAS	0	CANECAS	1	HERRAMIENTAS MENORES	4		
RANAS	0	CAMIONETA	0	SECCION DE ANDAMIOS	4		
VIBRADORES	0	VOLQUETA	0				
PERSONAL							
INGENIEROS	2	ALMACENISTAS	0				
MAESTRO	1	OBREROS	2				
OFICIALES	0	CONDUCTORES	0				
CONTROLES AMBIENTALES	CUMPLE SI	CUMPLE NO		CUMPLE SI	CUMPLE NO		CUMPLE SI	CUMPLE NO
ZONAS DE ACOPIO MATERIAL	x		DISPOSICION DE MATERIALES	x		RECOLECCION RESIDUOS SÓLIDOS	x	
SEÑALIZACION AREAS	x		PROTECCION CAUCES			DERRAMES QUIMICOS		
CONTROLES EN S&SO	x							
USO DE EPP	x		DOTACIÓN PERSONAL	x		ASEO Y LIMPIEZA AREAS	x	
AFILIACIONES	x		EXTINTOR Y CAMILLA			BAÑOS PUBLICOS		

RESUMEN DE ACTIVIDADES

Se inician labores a las 7:00 a.m. y finalizan a las 6:00 p.m.

Se continua actividad de localizacion y replanteo para la adecuacion de red de aguas lluvias en zona de interes.se continua con la adecuacion del área de trabajo, y traslado de herramientas faltantes

Día soleado

ELABORO: Jorge Trujillo

RESIDENTE: _____

SUPERVISOR : _____

Ing. Leuder Barbosa Hernandez

SERVICIVIL SAS	SERVICIVIL S.A.S	CODIGO: F-01
	BITACORA DE CAMPO	VERSIÓN: 1

MANTENIMIENTO, REPARACION DE LA CUBIERTA, RED DE DRENAJE DE AGUAS LLUVIAS Y ADECUACIONES EN EL COLISEO EN LAS INSTALACIONES DE LA ESCUELA NORMAL SUPERIOR CRISTO REY DE BARRANCABERMEJA

FECCHA D 10 M 10 A 2024

REPORTE DE LLUVIA	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
										con																						Con lluvia

EQUIPO								
MEZCLADORAS	0	CANECAS	1	HERRAMIENTAS MENORES	4			
RANAS	0	CAMIONETA	1	SECCION DE ANDAMIOS	4			
VIBRADORES	0	VOLQUETA	0					
PERSONAL								
INGENIEROS	2	ALMACENISTAS	0					
MAESTRO	1	OBREROS	2					
OFICIALES	0	CONDUCTORES	0					
CONTROLES AMBIENTALES	CUMPLE SI	CUMPLE NO		CUMPLE SI	CUMPLE NO		CUMPLE SI	CUMPLE NO
ZONAS DE ACOPIO MATERIAL	x		DISPOSICION DE MATERIALES	x		RECOLECCION RESIDUOS SÓLIDOS	x	
SEÑALIZACION AREAS	x		PROTECCION CAUCES			DERRAMES QUIMICOS		
CONTROLES EN S&SO	x							
USO DE EPP	x		DOTACIÓN PERSONAL	x		ASEO Y LIMPIEZA AREAS	x	
AFILIACIONES	x		EXTINTOR Y CAMILLA			BAÑOS PUBLICOS		

RESUMEN DE ACTIVIDADES
Se inician labores a las 7:00 a.m. y finalizan a las 6:00 p.m.
Se suspenden actividades durante la jornada de la mañana por fuertes lluvias presentes en el distrito, para lo cual impedia el trabajo en la zona. Se continuan actividades en area de cubierta con el despeje de material deteriorado.
Día soleado

ELABORO: Jorge Trujillo

RESIDENTE: _____

SUPERVISOR : _____

Ing. Leuder Barbosa Hernandez

SERVICIVIL SAS	SERVICIVIL S.A.S	CODIGO: F-01
	BITACORA DE CAMPO	VERSIÓN: 1

MANTENIMIENTO, REPARACION DE LA CUBIERTA, RED DE DRENAJE DE AGUAS LLUVIAS Y ADECUACIONES EN EL COLISEO EN LAS INSTALACIONES DE LA ESCUELA NORMAL SUPERIOR CRISTO REY DE BARRANCABERMEJA

FECCHA D 11 M 10 A 2024

REPORTE DE LLUVIA	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
											sin																				Sin lluvia
																															Con lluvia

EQUIPO								
MEZCLADORAS	0		CANECAS	1		HERRAMIENTAS MENORES	4	
RANAS	0		CAMIONETA	1		SECCION DE ANDAMIOS	4	
VIBRADORES	0		VOLQUETA	0				
PERSONAL								
INGENIEROS	2		ALMACENISTAS	0				
MAESTRO	1		OBREROS	2				
OFICIALES	0		CONDUCTORES	0				
CONTROLES AMBIENTALES	CUMPLE			CUMPLE			CUMPLE	
	SI	NO		SI	NO		SI	NO
ZONAS DE ACOPIO MATERIAL	x		DISPOSICION DE MATERIALES	x		RECOLECCION RESIDUOS SÓLIDOS	x	
SEÑALIZACION AREAS	x		PROTECCION CAUCES			DERRAMES QUIMICOS		
CONTROLES EN S&SO	x							
USO DE EPP	x		DOTACIÓN PERSONAL	x		ASEO Y LIMPIEZA AREAS	x	
AFILIACIONES	x		EXTINTOR Y CAMILLA			BAÑOS PUBLICOS		

RESUMEN DE ACTIVIDADES

Se inician labores a las 7:00 a.m. y finalizan a las 5:00 p.m.

Antes de iniciar actividades, se realiza charla SST sobre simulacro de emergencia y primeros auxilios con el fin de proporcionar informacion clara sobre protocolos de respuesta ante una emergencia. Se continuan actividades en área de la cubierta con el desmantelamiento del material deteriorado para realizar la correcta impermeabilizacion del área.

Día soleado

ELABORO: Jorge Trujillo

RESIDENTE: _____

SUPERVISOR : _____

Ing. Leuder Barbosa Hernandez

SERVICIVIL SAS	SERVICIVIL S.A.S	CODIGO: F-01
	BITACORA DE CAMPO	VERSIÓN: 1

MANTENIMIENTO, REPARACION DE LA CUBIERTA, RED DE DRENAJE DE AGUAS LLUVIAS Y ADECUACIONES EN EL COLISEO EN LAS INSTALACIONES DE LA ESCUELA NORMAL SUPERIOR CRISTO REY DE BARRANCABERMEJA

FECCHA D 12 M 10 A 2024

REPORTE DE LLUVIA	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
												sin																				Sin lluvia
																																Con lluvia

EQUIPO							
MEZCLADORAS	0	CANECAS	1	HERRAMIENTAS MENORES	4		
RANAS	0	CAMIONETA	1	SECCION DE ANDAMIOS	4		
VIBRADORES	0	VOLQUETA	0				
PERSONAL							
INGENIEROS	2	ALMACENISTAS	0				
MAESTRO	1	OBREROS	2				
OFICIALES	0	CONDUCTORES	0				
CONTROLES AMBIENTALES	CUMPLE SI	CUMPLE NO		CUMPLE SI	CUMPLE NO		CUMPLE SI	CUMPLE NO
ZONAS DE ACOPIO MATERIAL	x		DISPOSICION DE MATERIALES	x		RECOLECCION RESIDUOS SÓLIDOS	x	
SEÑALIZACION AREAS	x		PROTECCION CAUCES			DERRAMES QUIMICOS		
CONTROLES EN S&SO	x							
USO DE EPP	x		DOTACIÓN PERSONAL	x		ASEO Y LIMPIEZA AREAS	x	
AFILIACIONES	x		EXTINTOR Y CAMILLA			BAÑOS PUBLICOS		

RESUMEN DE ACTIVIDADES
Se inician labores a las 7:00 a.m. y finalizan a las 10:00 a.m.
Se continua actividad en área de cubierta y se realiza el transporte interno de material a punto de acopio.
Día soleado

ELABORO: Jorge Trujillo

RESIDENTE: _____

SUPERVISOR : _____

Ing. Leuder Barbosa Hernández

SERVICIVIL SAS	SERVICIVIL S.A.S	CODIGO: F-01
	BITACORA DE CAMPO	VERSIÓN: 1

MANTENIMIENTO, REPARACION DE LA CUBIERTA, RED DE DRENAJE DE AGUAS LLUVIAS Y ADECUACIONES EN EL COLISEO EN LAS INSTALACIONES DE LA ESCUELA NORMAL SUPERIOR CRISTO REY DE BARRANCABERMEJA

FECCHA D 15 M 10 A 2024

REPORTE DE LLUVIA	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Sin lluvia
															sin																	Con lluvia

EQUIPO							
MEZCLADORAS	0	CANECAS	1	HERRAMIENTAS MENORES	4		
RANAS	0	CAMIONETA	1	SECCION DE ANDAMIOS	6		
VIBRADORES	0	VOLQUETA	0	EQUIPO MENOR	1		
PERSONAL							
INGENIEROS	2	ALMACENISTAS	0				
MAESTRO	1	OBREROS	2				
OFICIALES	0	CONDUCTORES	0				
CONTROLES AMBIENTALES	CUMPLE SI	CUMPLE NO		CUMPLE SI	CUMPLE NO		CUMPLE SI	CUMPLE NO
ZONAS DE ACOPIO MATERIAL	x		DISPOSICION DE MATERIALES	x		RECOLECCION RESIDUOS SÓLIDOS	x	
SEÑALIZACION AREAS	x		PROTECCION CAUCES			DERRAMES QUIMICOS		
CONTROLES EN S&SO	x							
USO DE EPP	x		DOTACIÓN PERSONAL	x		ASEO Y LIMPIEZA AREAS	x	
AFILIACIONES	x		EXTINTOR Y CAMILLA			BAÑOS PUBLICOS		

RESUMEN DE ACTIVIDADES
Se inician labores a las 7:00 a.m. y finalizan a las 5:00 p.m.
Se realizan actividades en la placa cubierta, despeje de manto existente, puesto en sitio de acopio para su traslado a disposicion final. Se realiza lavado con hidrolavadora en área de cubuerta
Día soleado

ELABORO: Jorge Trujillo

RESIDENTE: _____

SUPERVISOR : _____

Ing. Leuder Barbosa Hernandez

SERVICIVIL SAS	SERVICIVIL S.A.S	CODIGO: F-01
	BITACORA DE CAMPO	VERSIÓN: 1

MANTENIMIENTO, REPARACION DE LA CUBIERTA, RED DE DRENAJE DE AGUAS LLUVIAS Y ADECUACIONES EN EL COLISEO EN LAS INSTALACIONES DE LA ESCUELA NORMAL SUPERIOR CRISTO REY DE BARRANCABERMEJA

FECCHA D 16 M 10 A 2024

REPORTE DE LLUVIA	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
																sin																Sin lluvia
																																Con lluvia

EQUIPO								
MEZCLADORAS	0		CANECAS	1		HERRAMIENTAS MENORES	4	
RANAS	0		CAMIONETA	1		SECCION DE ANDAMIOS	6	
VIBRADORES	0		VOLQUETA	0		EQUIPO MENOR	1	
PERSONAL								
INGENIEROS	2		ALMACENISTAS	0				
MAESTRO	1		OBREROS	2				
OFICIALES	0		CONDUCTORES	0				
CONTROLES AMBIENTALES	CUMPLE			CUMPLE			CUMPLE	
	SI	NO		SI	NO		SI	NO
ZONAS DE ACOPIO MATERIAL	x		DISPOSICION DE MATERIALES	x		RECOLECCION RESIDUOS SÓLIDOS	x	
SEÑALIZACION AREAS	x		PROTECCION CAUCES			DERRAMES QUIMICOS		
CONTROLES EN S&SO	x							
USO DE EPP	x		DOTACIÓN PERSONAL	x		ASEO Y LIMPIEZA AREAS	x	
AFILIACIONES	x		EXTINTOR Y CAMILLA			BAÑOS PUBLICOS		

RESUMEN DE ACTIVIDADES

Se inician labores a las 7:00 a.m. y finalizan a las 5:00 p.m.

Se realizan despejes de manto existente en placa cubierta. Se solicita comité de obra para exposicion de necesidades y sugerencias a los interesados del proyecto

Día soleado

ELABORO: Jorge Trujillo

RESIDENTE: _____

SUPERVISOR : _____

Ing. Leuder Barbosa Hernandez

SERVICIVIL SAS	SERVICIVIL S.A.S	CODIGO: F-01
	BITACORA DE CAMPO	VERSIÓN: 1

MANTENIMIENTO, REPARACION DE LA CUBIERTA, RED DE DRENAJE DE AGUAS LLUVIAS Y ADECUACIONES EN EL COLISEO EN LAS INSTALACIONES DE LA ESCUELA NORMAL SUPERIOR CRISTO REY DE BARRANCABERMEJA

FECCHA D 2 M 10 A 2024

REPORTE DE LLUVIA	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
																	sin															Sin lluvia
																																Con lluvia

EQUIPO							
MEZCLADORAS	0	CANECAS	1	HERRAMIENTAS MENORES	4		
RANAS	0	CAMIONETA	1	SECCION DE ANDAMIOS	6		
VIBRADORES	0	VOLQUETA	0	EQUIPO MENOR	1		
PERSONAL							
INGENIEROS	2	ALMACENISTAS	0				
MAESTRO	1	OBREROS	2				
OFICIALES	0	CONDUCTORES	0				
CONTROLES AMBIENTALES	CUMPLE SI	CUMPLE NO		CUMPLE SI	CUMPLE NO		CUMPLE SI	CUMPLE NO
ZONAS DE ACOPIO MATERIAL	x		DISPOSICION DE MATERIALES	x		RECOLECCION RESIDUOS SÓLIDOS	x	
SEÑALIZACION AREAS	x		PROTECCION CAUCES			DERRAMES QUIMICOS		
CONTROLES EN S&SO	x							
USO DE EPP	x		DOTACIÓN PERSONAL	x		ASEO Y LIMPIEZA AREAS	x	
AFILIACIONES	x		EXTINTOR Y CAMILLA			BAÑOS PUBLICOS		

RESUMEN DE ACTIVIDADES
Se inician labores a las 7:00 a.m. y finalizan a las 4:30 p.m.
Se continua lavado con hidrolavadora, despeje en zona de carcamos por suciedad y empozamientos de aguas en la cubierta. Se reunen las partes interesadas al comité de obra.
Día soleado

ELABORO: Jorge Trujillo

RESIDENTE: _____

SUPERVISOR : _____

Ing. Leuder Barbosa Hernandez

SERVICIVIL SAS	SERVICIVIL S.A.S	CODIGO: F-01
	BITACORA DE CAMPO	VERSIÓN: 1

MANTENIMIENTO, REPARACION DE LA CUBIERTA, RED DE DRENAJE DE AGUAS LLUVIAS Y ADECUACIONES EN EL COLISEO EN LAS INSTALACIONES DE LA ESCUELA NORMAL SUPERIOR CRISTO REY DE BARRANCABERMEJA

FECCHA D 18 M 10 A 2024

REPORTE DE LLUVIA	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
																		sin														Sin lluvia
																																Con lluvia

EQUIPO								
MEZCLADORAS	0		CANECAS	1		HERRAMIENTAS MENORES	4	
RANAS	0		CAMIONETA	1		SECCION DE ANDAMIOS	6	
VIBRADORES	0		VOLQUETA	0		EQUIPO MENOR	1	
PERSONAL								
INGENIEROS	2		ALMACENISTAS	0				
MAESTRO	1		OBREROS	2				
OFICIALES	0		CONDUCTORES	0				
CONTROLES AMBIENTALES	CUMPLE			CUMPLE			CUMPLE	
	SI	NO		SI	NO		SI	NO
ZONAS DE ACOPIO MATERIAL	x		DISPOSICION DE MATERIALES	x		RECOLECCION RESIDUOS SÓLIDOS	x	
SEÑALIZACION AREAS	x		PROTECCION CAUCES			DERRAMES QUIMICOS		
CONTROLES EN S&SO	x							
USO DE EPP	x		DOTACIÓN PERSONAL	x		ASEO Y LIMPIEZA AREAS	x	
AFILIACIONES	x		EXTINTOR Y CAMILLA			BAÑOS PUBLICOS		

RESUMEN DE ACTIVIDADES
Se inician labores a las 7:00 a.m. y finalizan a las 5:00 p.m.
Se continua con el lavado del área faltante en la placa cubierta. Se aplica la emulsion asfaltica en un 64% de ejecucion
Día soleado

ELABORO: Jorge Trujillo

RESIDENTE: _____

SUPERVISOR : _____

Ing. Leuder Barbosa Hernandez

SERVICIVIL SAS	SERVICIVIL S.A.S	CODIGO: F-01
	BITACORA DE CAMPO	VERSIÓN: 1

MANTENIMIENTO, REPARACION DE LA CUBIERTA, RED DE DRENAJE DE AGUAS LLUVIAS Y ADECUACIONES EN EL COLISEO EN LAS INSTALACIONES DE LA ESCUELA NORMAL SUPERIOR CRISTO REY DE BARRANCABERMEJA

FECCHA D 19 M 10 . A 2024

REPORTE DE LLUVIA

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
																		con													Sin lluvia
																															Con lluvia

EQUIPO							
MEZCLADORAS	0	CANECAS	1	HERRAMIENTAS MENORES	4		
RANAS	0	CAMIONETA	1	SECCION DE ANDAMIOS	6		
VIBRADORES	0	VOLQUETA	0	EQUIPO MENOR	1		
PERSONAL							
INGENIEROS	2	ALMACENISTAS	0				
MAESTRO	1	OBREROS	2				
OFICIALES	0	CONDUCTORES	0				
CONTROLES AMBIENTALES	CUMPLE SI	CUMPLE NO		CUMPLE SI	CUMPLE NO		CUMPLE SI	CUMPLE NO
ZONAS DE ACOPIO MATERIAL	x		DISPOSICION DE MATERIALES	x		RECOLECCION RESIDUOS SÓLIDOS	x	
SEÑALIZACION AREAS	x		PROTECCION CAUCES			DERRAMES QUIMICOS		
CONTROLES EN S&SO	x							
USO DE EPP	x		DOTACIÓN PERSONAL	x		ASEO Y LIMPIEZA AREAS	x	
AFILIACIONES	x		EXTINTOR Y CAMILLA			BAÑOS PUBLICOS		

RESUMEN DE ACTIVIDADES
Se inician labores a las 7:00 a.m. y finalizan a las 2:00 p.m.
Se suspenden actividades faltantes en área de la cubierta por lluvias durante la mañana (esto afecta la aplicación de los impermeabilizantes) y por el contrario se adelantan y se inician actividades en el coliseo, lavado de graderias y muro de fondo con hidrolavadora. Instalacion de anadamios.
Día soleado

ELABORO: Jorge Trujillo

RESIDENTE: _____

SUPERVISOR : _____

Ing. Leuder Barbosa Hernandez

SERVICIVIL SAS	SERVICIVIL S.A.S	CODIGO: F-01
	BITACORA DE CAMPO	VERSIÓN: 1

MANTENIMIENTO, REPARACION DE LA CUBIERTA, RED DE DRENAJE DE AGUAS LLUVIAS Y ADECUACIONES EN EL COLISEO EN LAS INSTALACIONES DE LA ESCUELA NORMAL SUPERIOR CRISTO REY DE BARRANCABERMEJA

FECCHA D 21 M 10 A 2024

REPORTE DE LLUVIA	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
																					sin											Sin lluvia
																																Con lluvia

EQUIPO							
MEZCLADORAS	0	CANECAS	1	HERRAMIENTAS MENORES	4		
RANAS	0	CAMIONETA	1	SECCION DE ANDAMIOS	6		
VIBRADORES	0	VOLQUETA	0	EQUIPO MENOR	1		
PERSONAL							
INGENIEROS	2	ALMACENISTAS	0	SOLDADOR	1		
MAESTRO	1	OBREROS	2				
OFICIALES	0	CONDUCTORES	0				
CONTROLES AMBIENTALES	CUMPLE SI	CUMPLE NO		CUMPLE SI	CUMPLE NO		CUMPLE SI	CUMPLE NO
ZONAS DE ACOPIO MATERIAL	x		DISPOSICION DE MATERIALES	x		RECOLECCION RESIDUOS SÓLIDOS	x	
SEÑALIZACION AREAS	x		PROTECCION CAUCES			DERRAMES QUIMICOS		
CONTROLES EN S&SO	x							
USO DE EPP	x		DOTACIÓN PERSONAL	x		ASEO Y LIMPIEZA AREAS	x	
AFILIACIONES	x		EXTINTOR Y CAMILLA			BAÑOS PUBLICOS		

RESUMEN DE ACTIVIDADES

Se inician labores a las 7:00 a.m. y finalizan a las 4:30 p.m.

Se realiza desmonte e instalacion de pañete afectado en placa cubierta y se realiza el desmonte de bajante existente en fibra-cemento. Se realiza la limpieza de carcamos del all . Se desmontan ventiladores existentes en el coliseo (7 UND). Se inicia la construccion de las columnetas en concreto, muro ladrillo a la vista, pasos para acceso en escalas e instalacion de barandas metalicas para las graderias del coliseo.

Día soleado

ELABORO: Jorge Trujillo

RESIDENTE: _____

SUPERVISOR : _____

Ing. Leuder Barbosa Hernandez

SERVICIVIL SAS	SERVICIVIL S.A.S	CODIGO: F-01
	BITACORA DE CAMPO	VERSIÓN: 1

MANTENIMIENTO, REPARACION DE LA CUBIERTA, RED DE DRENAJE DE AGUAS LLUVIAS Y ADECUACIONES EN EL COLISEO EN LAS INSTALACIONES DE LA ESCUELA NORMAL SUPERIOR CRISTO REY DE BARRANCABERMEJA

FECCHA D 22 M 10 A 2024

REPORTE DE LLUVIA	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
																						sin										Sin lluvia
																																Con lluvia

EQUIPO							
MEZCLADORAS	0	CANECAS	1	HERRAMIENTAS MENORES	5		
RANAS	0	CAMIONETA	1	SECCION DE ANDAMIOS	6		
VIBRADORES	0	VOLQUETA	0	EQUIPO MENOR	1		
PERSONAL							
INGENIEROS	2	ALMACENISTAS	0	SOLDADOR	1		
MAESTRO	1	OBREROS	2				
OFICIALES	0	CONDUCTORES	0				
CONTROLES AMBIENTALES	CUMPLE SI	CUMPLE NO		CUMPLE SI	CUMPLE NO		CUMPLE SI	CUMPLE NO
ZONAS DE ACOPIO MATERIAL	x		DISPOSICION DE MATERIALES	x		RECOLECCION RESIDUOS SÓLIDOS	x	
SEÑALIZACION AREAS	x		PROTECCION CAUCES			DERRAMES QUIMICOS		
CONTROLES EN S&SO	x							
USO DE EPP	x		DOTACIÓN PERSONAL	x		ASEO Y LIMPIEZA AREAS	x	
AFILIACIONES	x		EXTINTOR Y CAMILLA			BAÑOS PUBLICOS		

RESUMEN DE ACTIVIDADES
Se inician labores a las 7:00 a.m. y finalizan a las 5:00 p.m.
Se realizo instalacion de pañete afectado en el área de placa cubierta, se realizaron actividades en el coliseo, actividades como construccion de muro a la vista y columneta en graderia faltate (parte izquierda pegada a la cancha) construccion de columnetas faltantes en parte externa, construccion de vigueta de la graderia derecha (pegada a la zona del parqueadero) e instalacion de barandas metalicas para seguridad de las graderias.
Día soleado

ELABORO: Jorge Trujillo

RESIDENTE: _____

SUPERVISOR : _____

Ing. Leuder Barbosa Hernandez

SERVICIVIL SAS	SERVICIVIL S.A.S	CODIGO: F-01
	BITACORA DE CAMPO	VERSIÓN: 1

MANTENIMIENTO, REPARACION DE LA CUBIERTA, RED DE DRENAJE DE AGUAS LLUVIAS Y ADECUACIONES EN EL COLISEO EN LAS INSTALACIONES DE LA ESCUELA NORMAL SUPERIOR CRISTO REY DE BARRANCABERMEJA

FECCHA D 23 M 10 A 2024

REPORTE DE LLUVIA	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
																							sin									Sin lluvia
																																Con lluvia

EQUIPO							
MEZCLADORAS	0	CANECAS	1	HERRAMIENTAS MENORES	5		
RANAS	0	CAMIONETA	1	SECCION DE ANDAMIOS	6		
VIBRADORES	0	VOLQUETA	0	EQUIPO MENOR	2		
PERSONAL							
INGENIEROS	2	ALMACENISTAS	0	SOLDADOR	1		
MAESTRO	1	OBREROS	2				
OFICIALES	0	CONDUCTORES	0				
CONTROLES AMBIENTALES	CUMPLE SI	CUMPLE NO		CUMPLE SI	CUMPLE NO		CUMPLE SI	CUMPLE NO
ZONAS DE ACOPIO MATERIAL	x		DISPOSICION DE MATERIALES	x		RECOLECCION RESIDUOS SÓLIDOS	x	
SEÑALIZACION AREAS	x		PROTECCION CAUCES			DERRAMES QUIMICOS		
CONTROLES EN S&SO	x							
USO DE EPP	x		DOTACIÓN PERSONAL	x		ASEO Y LIMPIEZA AREAS	x	
AFILIACIONES	x		EXTINTOR Y CAMILLA			BAÑOS PUBLICOS		

RESUMEN DE ACTIVIDADES
Se inician labores a las 7:00 a.m. y finalizan a las 5:00 p.m.
Se continua contruccion de muro ladrillo a la vista en graderia faltante, construccion de columnetas y vigueta faltante en ambas graderias. Se continua con el suministro e instalacion de barandas para graderias.Se realiza actividad de pintura de placa de cubierta en zona interior. Se reunen las partes interesadas (contratista y supervisor) para revisar avance de obra a la fecha con las actividades ejecutadas en campo, revision de actas para corte No. 01
Día soleado

ELABORO: Jorge Trujillo

RESIDENTE: _____

SUPERVISOR : _____

Ing. Leuder Barbosa Hernández
