	LISTA DE CHEQUEO LIQUIDACIÓN DE CONTRATO	Código: F - 489 Versión: 001 Fecha: Agosto de 2023

TIPO DE CONTRATO:	OBRA	**NUMERO DE CONTRATO:**	100-103-13-09-00001-2024
CONTRATISTA:	UNION TEMPORAL CEMENTERIOS 2024 NIT: 901.811.916-1 ERIKA LORENA LESMES AGUIRRE 1.121.865.059 DE VILLAVICENCIO		
OBJETO :	CONSTRUCCION BOVEDAS Y OSARIOS EN EL CEMENTERIO DEL MUNICIPIO DE PUERTO LOPEZ – META		
CONTRATISTA DE INTERVENTORIA:	N/A	**NUMERO DE CONTRATO:**	N/A
OBJETO :	N/A		
SUPERVISOR :	MARYLIN PAOLA FONSECA CRUZ		
SECRETARIA LIDER DEL PROCESO :	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA		

DOCUMENTOS REQUERIDOS	CODIGO FORMATO	CASILLA DE VERIFICACION SI / NO / N/A		
		SI	NO	NA
SOLICITUD Y APROBACION POR PARTE DEL INTERVENTOR O SUPERVISOR (Según Aplique)	N.A			X
SOLICITUD DEL CONTRATISTA Y DESCRIPCCION DE JUSTIFICACION CON RESPECTIVOS SOPORTES (Según Aplique)	N.A	X		
OFICIO DE RADICACION DE LA SOLICITUD POR LA SECRETARIA LIDER DEL PROCESO NOTA: En el caso que el Supervisor sea la Secretaria Lider del Proceso solo remite un oficio de solicitud.	N.A	X		
ACTA TERMINACIÓN (Verificar que se realice el respectivo cargue en Plataforma de Secop)	F-100	X		
ACTA VISITA PREVIA PARA RECIBO FINAL DEFINITIVO (APLICA A CONTRATOS DE OBRA)	F-257	X		
ACTA DE RECIBO FINAL (Verificar que se realice el respectivo cargue en Plataforma de Secop)	F-101	X		
ACTA DE PAGO	F-094	X		
CANTIDADES DE PAGO	F-284	X		
MEMORIA DE CALCULO (Cantidades totales Ejecutadas por cada item contractual)	F-260	X		
INFORME FINAL DEL CONTRATISTA	N.A	X		
INFORME DE ESPECIALISTAS (APLICA PARA CONSULTORIA - INTERVENTORIA)	NA			X
INFORME DE INTERVENTORIA O SUPERVISOR (Según Corresponda)	F- 487 F- 095	X		
SOPORTES DE COSTOS INDIRECTOS (APLICA PARA CONSULTORIA - INTERVENTORIA)	NA			X
ACTUALIZACIÓN Y APROBACIÓN DE POLIZAS (Acta de recibo definitivo de obra) (Garantia Unica de cumplimiento y Responsabilidad Civil Extracontractual)	N.A	X		
MANUAL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO OBRA (APLICA A CONTRATOS DE OBRA)	F-256			X
PLANOS CONTRATO - RECORD - EN FISICO DEBIDAMENTE FIRMADOS Y EN CD CON ARCHIVO DIGITAL (DWG)	N.A			X
ACTA PARCIAL DE PAGO	F-109	X		
ACTA DE LIQUIDACION	F-104	X		
ACTA DE EVALUACION Y CUMPLIMIENTO	F-105	X		
ACTA DE ENTREGA A LA COMUNIDAD (APLICA A CONTRATOS DE OBRA)	F-106			X
ACTA APROBACIÓN AIU OBRA	F-237	X		
ACTA JUSTIFICACION DE IMPREVISTOS (APLICA A CONTRATOS DE OBRA)	F-327	X		
INFORME Y DOCUMENTOS SOPORTES DE LIQUIDACION DE GASTOS ADMINISTRATIVOS (APLICA A CONTRATOS DE OBRA)	N.A	X		
EVALUACION DE PROVEEDORES	F-093	X		
CONTROL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL	F-261	X		
IMPLEMENTACION PLAN DE MANEJO AMBIENTAL	F-253			X
ACTA RESUMEN ENSAYOS Y PRUEBAS DE LABORATORIO (Relacionar Planilla por Perdido de Ejecución según corresponda)	F-251			X
CERTIFICADOS DE CALIDAD DE MATERIALES UTILIZADOS (APLICA A CONTRATOS DE OBRA)	N.A			X
CERTIFICACION DE SUPERVISION E INTERVENTORIA	F-313	X		
ENTRADA A ALMACEN MUNICIPAL (Aplica para constratos de suministros)	NA			X
PAZ Y SALVO SEGURIDAD SOCIAL DEL CONTRATISTA, Expedido por Contador Publico o Revisor Fiscal (según corresponda) con los soportes que acreditan al profesional (copia de cedula de ciudadania, copia de Tarjeta Profesional , Copia de certificado de antecedentes vigentes a la radicacion	N.A	X		
ACTA CONTROL Y SEGUIMIENTO SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES (Desde el inicio hasta la fecha de cobro, Pagos al sistema de seguridad social integral del personal.)	F-252			x

Código Postal 502001
Calle 6 Nro 4 -40
Telefonos 6450412-6451867
contactenos@puertolopez-meta.gov.co

	LISTA DE CHEQUEO LIQUIDACIÓN DE CONTRATO	Código: F - 489 Versión: 001 Fecha: Agosto de 2023

TIPO DE CONTRATO:	OBRA	**NUMERO DE CONTRATO:**	100-103-13-09-00001-2024
CONTRATISTA:	UNION TEMPORAL CEMENTERIOS 2024 NIT: 901.811.916-1 ERIKA LORENA LESMES AGUIRRE 1.121.865.059 DE VILLAVICENCIO		
OBJETO :	CONSTRUCCION BOVEDAS Y OSARIOS EN EL CEMENTERIO DEL MUNICIPIO DE PUERTO LOPEZ – META		
CONTRATISTA DE INTERVENTORIA:	N/A	**NUMERO DE CONTRATO:**	N/A
OBJETO :	N/A		
SUPERVISOR :	MARYLIN PAOLA FONSECA CRUZ		
SECRETARIA LIDER DEL PROCESO :	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA		

DOCUMENTOS REQUERIDOS	CODIGO FORMATO	CASILLA DE VERIFICACION SI / NO / N/A		
		SI	NO	NA
ACTA DE RELACION PERSONAL DE OBRA (Desde el inicio hasta la fecha de cobro, Pagos al sistema de seguridad social integral del personal.)	F-244	X		
PAZ Y SALVO SEGURIDAD INTEGRAL Y PARAFISCALES DEL CONTRATISTA. Original emitido por las entidades correspondientes.	-	X		
PAZ Y SALVO PERSONAL QUE LABORO Y SUBCONTRATISTAS.	-			X
PAZ Y SALVO SEGURIDAD SOCIAL DEL CONTRATISTA, emitido por la Interventoria del proyecto o Supervisor (Según Corresponda)	-			X
BITACORA (APLICA A CONTRATOS QUE DEMANDE EN LA MINUTA)	F-249	X		
REGISTRO FOTOGRÁFICO (ARCHIVO JPG) SECUENCIAL ITEM POR ITEM, CON EL COMPILADO DE TODAS LAS FOTOGRAFÍAS TOMADAS A LO LARGO DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO	N.A	X		
INFORME PLAN INVERSION ANTICIPO	F-259			X
CERTIFICACIÓN BANCARIA DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS COMPROBANTE DE PAGO DE LOS RENDIMIENTOS GENERADOS EN LA CUENTA DONDE SE MANEJARON LOS RECURSOS DESEMBOLSADOS POR CONCEPTO DE ANTICIPO	Emitida por el banco			X
FACTURA Y COPIA DEL REGISTRO UNICO TRIBUTARIO (RUT)	N.A	X		
CERTIFICADO DE CUENTA BANCARIA (Vigencia No Mayor a 30 dias)	N.A	X		
RUTA DE PAGO (PROYECTA OFICINA DE CONTRATACION)	F-395	X		
UNA VEZ FIRMADA LA ACTA DE LIQUIDACIÓN, se debe garantizar el siguiente tramite:				

NOTAS:
***SUSCRITA LA ACTA DE LIQUIDACIÓN, LA INTERVENTORÍA / SUPERVISOR ASIGNADO DEBERÁ ASEGURARSE QUE LA OFICINA DE CONTRATACIÓN REALICE LA PUBLICACIÓN EN EL SECOP DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 3 DE LA LEY 1150 DE 2007 Y EL DECRETO REGLAMENTARIO 1082 DE 2015.**
****TODOS LOS DOCUMENTOS DEBEN SER ORIGINALES, IMPRESIÓN CLARA, DEBEN ESTAR FOLIADOS 1-200 EN CARPETAS DE CONFORMIDAD A LA LEY DE ARCHIVO Y CARGADOS A EN EL SISTEMA ELECTRÓNICO PARA LA CONTRATACIÓN PÚBLICA – SECOP-**
*****LA LISTA DE CHEQUEO DEBE IR FIRMADA POR LOS PROFESIONALES RESPONSABLES DEL PROCESO, COMO INDICADOR DE EVALUACIÓN , REVISIÓN Y DEL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS AQUÍ ESTABLECIDOS.**
******DILIGENCIAR CASILLA DE VERIFICACIÓN DEL PRESENTE FORMATO , SEGÚN APLIQUE EL TIPO DE CONTRATO QUE SOLICITA EL TRAMITE**
******* UNA VEZ SEA APROBADA ACTA DE LIQUIDACIÓN EN COMUN ACUERDO DE LAS PARTES Y SE REALICE EL CARGUE DE TODA LA INFORMACIÓN REQUERIDA DURANTE EL PROCESO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO , LA SUPERVISIÓN DEBERÁ GARANTIZAR A LA OFICINA DE CONTRATACIÓN SE DIO POR TERMINADO EL PROCESO EN LA PLATAFORMA DEL SISTEMA ELECTRÓNICO PARA LA CONTRATACIÓN PÚBLICA – SECOP-**

NUMERO DE CARPETAS RADICADAS	
TOTAL FOLIOS	

Firma
UNION TEMPORAL CEMENTERIOS 2024
CONTRATISTA

Firma
NOMBRE DE LA INTERVENTORIA: N/A
INTERVENTOR

Firma
Nombre: MARYLIN PAOLA FONSECA CRUZ
Cargo: Secretaria de Infraestructura
SUPERVISOR
Nota : Diligenciar , según corresponda

Firma
Nombre:
APOYO A LA SUPERVISIÓN

Código Postal 502001
Calle 6 Nro 4 -40
Telefonos 6450412-6451867
contactenos@puertolopez-meta.gov.co

ALCALDÍA PUERTO LOPEZ	RECONOCIMIENTO Y PAGO (PAGO PARCIAL O FINAL)	**Código: F-539**
		Versión: 002
		Fecha: Enero 2024

Fecha de elaboración del reconocimiento:	18/06/2024		Periodo de Pago:		Del	01/04/2024	Al	30/04/2024
Contrato No. y Fecha:	DEL CONTRATO DE OBRA N°100-103-13-09-00001-2024 DE 2024 SUSCRITO EL 18/03/2024							
Contratista:	UNION TEMPORAL CEMENTERIOS 2024					c.c. o Nit.	901.811.916-1	
Representante Legal:	ERIKA LORENA LESMES AGUIRRE					c.c.	1.121.865.059	
Tipo de Pago:	Parcial		Final	X	Número de Pago:			

El suscrito SUPERVISOR del contrato de la referencia, actuando en el marco de las competencias que le corresponden frente a la permanente vigilancia de la correcta ejecución contractual, reguladas en el Artículo 83 y siguientes de la ley 1474 de 2011, se permite solicitar:

1. A la **Oficina de Contratación** que, para efectos de la conformación documental del expediente único contractual, incorpore la documentación correspondiente al pago de la cuenta de cobro **FINAL** del contrato de la referencia;

2. A la **Secretaría de Hacienda**, se sirva disponer el trámite correspondiente a la ruta de pago de la cuenta de cobro **FINAL** del contrato de la referencia, por cuanto cumple con todos los requisitos para que sea pagada; la cual cuenta con los siguientes soportes documentales:

N.	Documento (Marcar con X los documentos que aplican al pago, los que no con N/A)	Contratación	Hacienda	Secop
1	OFICIO DE SOLICITUD DE COBRO PARCIAL REMITIDO POR EL CONTRATISTA	X	X	X
2	ACTA DE PAGO (FORMATO F-094 VERSION 03)	X	X	X
3	INFORME DE SUPERVISION (FORMATO F-095 VERSION 04)	X	N/A	X
4	INFORME DEL CONTRATISTA	x	N/A	x
5	COMPROBANTE DE ENTRADA A ALMACÉN (Para Contratos de suministro) (Copia Hacienda – Original Contratación)	N/A	N/A	N/A
6	FACTURA DE VENTA O CUENTA DE COBRO DE BIENES O SERVICIOS (Original Hacienda – Copia contratación)	X	X	X
7	PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL • Planilla integrada en la que conste el pago de aporte y el IBC. (Persona Natural). • Esquema de presunción de costos, de acuerdo a lo establecido por el ministerio de salud y protección social y la UGPP. (Trabajadores independientes por cuenta propia o con contrato diferente a prestación de servicios) • Certificado expedido por el representante legal y/o revisor fiscal (Si está obligado a tenerlo), donde acredite que se encuentra a paz y salvo con aportes a seguridad social y parafiscales durante los últimos 6 meses, anexando tarjeta profesional, cédula de ciudadanía y antecedentes de la profesión vigentes del revisor fiscal (Persona Jurídica)	X	X	X
8	COPIA RUT. o NIT. COMPLETO (Primer pago o cesión del contrato) En Uniones Temporales o Consorcio presentar RUT completo de los participantes	N/A	N/A	N/A
9	CERTIFICACIÓN BANCARIA (Primer pago o si realiza cambio de cuenta)	N/A	N/A	N/A
10	COPIA CERTIFICADO DE AFILIACIÓN ARL (Primer pago del contrato inicial, cesión, o prorroga) (Persona Natural)	N/A	N/A	N/A
11	COPIA MODIFICACIONES DEL CONTRATO (Pago posterior a la modificación)	N/A	N/A	N/A

	RECONOCIMIENTO Y PAGO (PAGO PARCIAL O FINAL)	**Código: F-539**
ALCALDÍA PUERTO LÓPEZ		Versión: 002
		Fecha: Enero 2024

	(Para Adición último pago del contrato inicial y primer pago de la adición)			
12	ACTA DE TERMINACIÓN (FORMATO F-100)	X	X	X
13	ACTA DE LIQUIDACIÓN (SI APLICA)	N/A	N/A	N/A

Valor a Pagar (Letras y Números):	**TREINTA Y SEIS MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS TREINTA PESOS MC/TE ($36.389.830)**

Nombre:	MARYLIN PAOLA FONSECA CRUZ	Nombre:	ERIKA LORENA LESMES AGUIRRE
Cargo:	SECRETARIA INFRAESTRUCTURA	Cargo:	CONTRATISTA
Supervisor		Contratista	

ALCALDÍA PUERTO LOPEZ	OFICIO	Código: F - 287
		Versión: 002
		Fecha: Enero 2024

Puerto López, 13 de septiembre de 2024

SI.150.25.496.09.2024

ALCALDÍA DE PUERTO LÓPEZ - META
Oficina de Contratación
fecha: 13/09/24 Hora: 03:40 pm
Recibido por:

Doctora
JOHANNA PAOLA VEGA MORENO
Jefe Oficina de Contratación
Alcaldía de Puerto López – Meta

Referencia: CONTRATO DE OBRA No. 100-103-13-09-00001-2024CUYO OBJETO ES **"CONSTRUCCION BOVEDAS Y OSARIOS EN EL CEMENTERIO DEL MUNICIPIO DE PUERTO LOPEZ – META."**

Asunto: Radicación documentos de liquidación del contrato de obra No. 100-103-13-09-00001-2024

Reciba un cordial saludo,

Por medio de la presente la secretaria de Infraestructura del municipio de Puerto López – Meta, hace entrega de los documentos de liquidación del contrato de obra No. 100-103-13-09-00001-2024 cuyo objeto es **"CONSTRUCCION BOVEDAS Y OSARIOS EN EL CEMENTERIO DEL MUNICIPIO DE PUERTO LOPEZ – META",** para su respectivo tramite y acciones pertinentes.

ALCALDÍA DE PUERTO LÓPEZ - META
Oficina de Contratación
fecha: 22/11/24 Hora: 04:39 pm
Recibido por:

Atentamente,

ALCALDÍA DE PUERTO LÓPEZ - META
Oficina de Contratación
fecha: 25/11/24 Hora: 07:39 a m.
Recibido por:

MARYLIN PAOLA FONSECA CRUZ
Secretaria de Infraestructura Municipal

Elaborado:	Revisado:	Aprobado:
Nombre: Diego Andres Garay	Nombre: Marylin Paola Fonseca	Nombre: Marylin Paola Fonseca
Cargo: Profesional Universitario	Cargo: Secretaria de Infraestructura	Cargo: Secretaria de Infraestructura
Fecha: 13/09/2024	Fecha: 13/09/2024	Fecha: 13/09/2024

Código Postal 502001
Calle 6 Nro 4 – 40
Telefonos 6450412 – 6451867
Email: contactenos@puertolopez-meta.gov.co

	ACTA DE TERMINACION	F-100
ALCALDÍA PUERTO LÓPEZ		Version:002
		AGOSTO DE 2023

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

TIPO DE CONTRATO	:	OBRA		
CONTRATO N°	:	No. 100-103-13-09-00001-2024		
OBJETO	:	CONSTRUCCION BOVEDAS Y OSARIOS EN EL CEMENTERIO DEL MUNICIPIO DE PUERTO LOPEZ – META		
CONTRATISTA	:	UNION TEMPORAL CEMENTERIOS 2024		
NIT Ó CÉDULA	:	901811916-1	No. CELULAR:	3132125961
REPRESENTANTE LEGAL DEL CONTRATISTA	:	ERIKA LORENA LESMES AGUIRRE		
CÉDULA	:	1121865059	No. CELULAR:	3132125961
CONTRATO DE INTERVENTORIA N°	:	N/A		
CONTRATISTA DE INTERVENTORIA	:	N/A		
NIT Ó CÉDULA	:	N/A	No. CELULAR:	N/A
REPRESENTANTE LEGAL DE LA INTERVENTORIA	:	N/A		
CÉDULA	:	N/A	No. CELULAR:	N/A
NOMBRE SUPERVISOR	:	MARYLIN PAOLA FONSECA CRUZ		
CARGO	:	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA		
CÉDULA	:	1121885470	No. CELULAR:	3232914334
VALOR DEL CONTRATO INICIAL	:	$ 36.389.830,00	FECHA DEL CONTRATO	18/03/2024
PLAZO DE EJECUCION	:	DIAS 0 MESES 1	HASTA	30/04/2024
FECHA DE INICIO	:	01/04/2024	FECHA DE TERMINACION INICIAL :	30/04/2024
FORMA DE PAGO	:	El municipio pagará al contratista pagos parciales hasta el 90% del valor del contrato, teniendo en cuenta el avance físico de la obra; y el 10% restante se cancelará con la liquidación del contrato, para lo cual se tendrá en cuenta lo siguiente: a) El valor de la primera acta parcial se realizará cuando se haya ejecutado como mínimo el veinte (20%) de ejecución de avance de la obra, liquidadas por el sistema de precios unitarios, pactadas en el contrato o debidamente aprobadas por la supervisión, previa presentación de informe de contratista, soportes de pagos de seguridad social y parafiscales, informe de supervisor, factura y demás documentos solicitados. b) Un 70% mediante actas parciales de obra, liquidadas por el sistema de precios unitarios, pactadas en el contrato o debidamente aprobadas por la supervisión previa presentación de informe de contratista, soportes de pagos de seguridad social y parafiscales, informe de supervisión, factura y demás documentos solicitados. c) El diez por ciento (10%) final, a la liquidación del contrato, previa certificación de cumplimiento total de la ejecución suscrita por el supervisor designado y la suscripción del acta de liquidación final por parte del interventor designado y las partes.		
No. CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	:	00360	No. REGISTRO PRESUPUESTAL:	00494
VALOR	:	$ 36.389.830,00	VALOR :	$ 36.389.830,00
FUENTES DE FINANCIACION	:	FUENTE: PROPIOS / N/A / N/A / N/A	VALOR:	$ 36.389.830,00 / $ / $ / $
CODIGO Y DENOMINACION PRESUPUESTAL	:	2.3.40.4002.1400.05 BPIN 2020505730014 Construcción mejoramiento y mantenimiento de la infraestructura de equipamiento y bienes de uso público del municipio de Puerto López		

2. ANTECEDENTES DEL CONTRATO

A . PRORROGAS

ACTA N°	FECHA ACTA	TIEMPO	
		MES	DIAS
1	30/04/2024	0	10
N/A	N/A	N/A	N/A

B. SUSPENSIONES - AMPLIACIONES A SUSPENSIÓNES

ACTA N°	FECHA ACTA	TIEMPO	
		MES	DIAS
N/A	N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A	N/A

C. REINICIO

ACTA N°	FECHA ACTA	TIEMPO SUSPENSIÓN	
		MES	DIAS
N/A	N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A	N/A

FECHA ACTUAL DE TERMINACIÓN 10/05/2024

	ACTA DE TERMINACION	F-100
ALCALDÍA PUERTO LÓPEZ		Version.002
		AGOSTO DE 2023

D. MODIFICACION DE CANTIDADES (BALANCE DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES)

ACTA N°	FECHA ACTA	VALOR ($)
N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A

VALOR ACTUAL DEL CONTRATO ($) N/A

E. ADICIONES PRESUPUESTALES

ACTA N°	FECHA ACTA	VALOR ($)
N/A	N/A	N/A

No. CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL : N/A

No. REGISTRO PRESUPUESTAL: N/A

VALOR : N/A

VALOR : N/A

FUENTES DE FINANCIACION :

FUENTE:	VALOR:
N/A	N/A
N/A	N/A
N/A	N/A
N/A	N/A
N/A	N/A

VALOR ACTUALIZADO DEL CONTRATO ($) $ N/A

3. CONDICIONES ACTUALES DEL CONTRATO

VALOR ACTUALIZADO DEL CONTRATO ($)	$ 36.389.830,00			
PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO	10	**DIAS**	1	**MESES**
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL DEL CONTRATO	10/05/2024			

En las instalaciones locativas de la Alcaldía Municipal de Puerto López-Meta a los diez (10) días del mes mayo del año 2024 se reunieron : UNION TEMPORAL CEMENTERIOS 2024 identificado con Nit 901811916-1, Representada Legalmente por ERIKA LORENA LESMES AGUIRRE Y MARYLIN PAOLA FONSECA CRUZ actuando en calidad de supervisor del Contrato de obra No. 100-103-13-09-00001-2024 suscrito el dia 18 /03/2024, con el fin de suscribir la presente acta de Terminación del contrato mencionado anteriormente; lo anterior habiéndose cumplido satisfactoriamente el objeto, plazos mencionados y condiciones contractuales pactadas.

Para constancia de lo anterior, se firma en Puerto Lopez -Meta , a los diez (10) días del mes mayo del año 2024

Firma	Firma
UNION TEMPORAL CEMENTERIOS 2024 **ERIKA LORENA LESMES AGUIRRE** **CONTRATISTA**	**N/A** **INTERVENTORIA**
Firma	
MARYLIN PAOLA FONSECA CRUZ **Cargo : SUPERVISOR ASIGNADO**	**Nota :** Diligenciar celda de supervisor según aplique

ALCALDIA PUERTO LOPEZ	ACTA VISITA PARA RECIBO DEFINITO DE OBRA	Código: F -257
		Versión: 001
		Fecha: Septiembre de 2020

OBJETO PROYECTO:	CONSTRUCCION BOVEDAS Y OSARIOS EN EL CEMENTERIO DEL MUNICIPIO DE PUERTO LOPEZ – META
CONTRATISTA:	UNION TEMPORAL CEMENTERIOS 20204
CORREO ELECTRONICO:	sjisuministrossas@gmail.com
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	N/A
INTERVENTORÍA:	N/A
CORREO ELECTRONICO:	N/A
SUPERVISOR:	MARYLIN PAOLA FONSECA CRUZ
APOYO A LA SUPERVISIÓN:	N/A
CONTRATO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN N°	N/A

VIGENCIA INICIAL

TIEMPO DE EJECUCIÓN	1	Meses	0	Días
FECHA DE INICIACIÓN:				1/04/2024
FECHA DE TERMINACIÓN				30/04/2024

VIGENCIA ACTUAL

TIEMPO DE EJECUCIÓN	1	Meses	10	Días
FECHA DE TERMINACIÓN				10/05/2024

VALOR DEL PROYECTO

N°	PROYECTO N°	VALOR ($) INICIAL	VALOR ($) ADICIONAL	VALOR ($) ACTUAL
1	494	$ 36.389.830,00	0	$ 36.389.830,00
2				$ -
		VALOR ACTUAL DEL PROYECTO		$ 36.389.830,00

Se reunieron en el sitio de las obras los abajo firmantes con el fin de efectuar la visita previa para la posterior suscripción del Acta de Recibo Definitivo de las Obras objeto del proyecto.

CARACTERÍSTICAS DE LA OBRA

(En el cuadro anexo se presenta la relación de pendientes del proyecto y observaciones)

No.	LOCALIZACIÓN	OBSERVACIONES
1		**UBICACIÓN:** Av 14 Carrera 9 - CEMENTERIO MUNICIPAL **DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES PENDIENTES:** Al momento de la realizacion de la visita el contratista no tiene actividades pendientes por ejecutar.

OBSERVACIONES GENERALES:

El contratista dio cabal cumpliento a las activiades contratas, al momento de la visita se verifican medidas de obra, el contratista ya levanto los escombros y posibles restantes de material utilizado se evidencia que las activiades se ejecutaron de acuerdo a las especificaciones tecnicas contratadas.

ALCALDÍA PUERTO LÓPEZ	**ACTA VISITA PARA RECIBO DEFINITO DE OBRA**	**Código: F -257** Versión: 001 Fecha: Septiembre de 2020

Mediante la suscripción de la presente Acta, la Supervision asume plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida y el Contratista de obra asume el compromiso de realizar las actividades pendientes, las cuales se verificarán al momento del recibo definitivo de las obras.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella,
el dia 10 de Mayo de 2024

Firma
Nombre: JUAN CARLOS PALACIOS MOLINA
RESIDENTE DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 52202-084671

Firma
Nombre: ERIKA LORENA LESMES AGUIRRE
REPRESENTANTE LEGAL

Firma
Nombre: MARYLIN PAOLA FONSECA CRUZ
SUPERVISOR
N° Matrícula Profesional:

Firma
Nombre: N/A
APOYO A LA SUPERVISIÓN
N° Matrícula Profesional:

Nota 1: Cuando el proyecto no contempla profesional de Apoyo a la Supervisión, se selecciona de la lista desplegable para firma el cargo de Director Operativo de Ejecución, seguimiento y control de proyectos.

Nota 2: Los formatos deben ser registrados según su correspondencia, asi mismo las casillas de N° de matricula profesional deben ser diligenciadas en su totalidad.

Nota 3: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

	ACTA DE RECIBO FINAL	F-101
		Version:002
		FECHA : AGOSTO DE 2023

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

TIPO DE CONTRATO	:	OBRA		
CONTRATO N°	:	100-103-13-09-00001-2024		
OBJETO	:	CONSTRUCCION BOVEDAS Y OSARIOS EN EL CEMENTERIO DEL MUNICIPIO DE PUERTO LOPEZ – META		
CONTRATISTA	:	UNION TEMPORAL CEMENTERIOS 2024		
NIT Ó CÉDULA	:	901.811.916-1	**No. CELULAR:**	3132125961
REPRESENTANTE LEGAL DEL CONTRATISTA	:	ERIKA LORENA LESMES AGUIRRE		
CÉDULA	:	1.121.865.059	**No. CELULAR:**	3132125961
CONTRATO DE INTERVENTORIA N°	:	N/A		
CONTRATISTA DE INTERVENTORIA	:	N/A		
NIT Ó CÉDULA	:	N/A	**No. CELULAR:**	N/A
REPRESENTANTE LEGAL DE LA INTERVENTORIA	:	N/A		
CÉDULA	:	N/A	**No. CELULAR:**	N/A
NOMBRE SUPERVISOR	:	MARYLIN PAOLA FONSECA CRUZ		
CARGO	:	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA		
CÉDULA	:	1.121.885.470	**No. CELULAR:**	3232914334
VALOR DEL CONTRATO INICIAL	:	$ 36.389.830,00	**FECHA DEL CONTRATO**	18/03/2024
PLAZO DE EJECUCION	:	**DIAS** 0 **MESES** 1	**HASTA**	30/04/2024
FECHA DE INICIO	:	1/04/2024	**FECHA DE TERMINACION INICIAL :**	30/04/2024

FORMA DE PAGO :

El Municipio pagará el valor del contrato resultante del presente proceso de la siguiente manera:
El municipio pagará al contratista pagos parciales hasta el 90% del valor del contrato, teniendo en cuenta el avance físico de la obra; y el 10% restante se cancelará con la liquidación del contrato, para lo cual se tendrá en cuenta lo siguiente:
a) El valor de la primera acta parcial se realizará cuando se haya ejecutado como mínimo el veinte (20%) de ejecución de avance de la obra, liquidadas por el sistema de Precios Unitarios, pactadas en el contrato o debidamente aprobadas por la supervisión, previa presentación de informe de contratista, soportes de pagos de seguridad social y parafiscales, informe de supervisor, factura y demás documentos solicitados.
b) Un 70% mediante actas parciales de obra, liquidadas por el sistema de Precios Unitarios, pactadas en el contrato o debidamente aprobadas por la supervisión previa presentación de informe de contratista, soportes de pagos de seguridad social y parafiscales, informe de supervisión, factura y demás documentos solicitados.
c) El Diez por ciento (10%) final, a la liquidación del contrato, previa certificación de cumplimiento total de la ejecución suscrita por el supervisor designado y la suscripción del acta de liquidación final por parte del supervisor designado y las partes.
Para el trámite del pago el contratista deberá presentar ante el SUPERVISOR:
1.La CERTIFICACIÓN de cumplimiento por parte de la supervisión, como funcionario competente para ejercer las tareas de vigilancia de la correcta ejecución contractual.
2.La factura o documento equivalente, según corresponda en cada caso.
3.La acreditación del pago de seguridad social integral y parafiscal si a ello hubiere lugar.
4.Acta de recibo Parcial debidamente suscrita por el MUNICIPIO y el CONTRATISTA.
5.Memorias de cálculo de cada ítem, soportado con registro fotográfico a color, registrando cada uno de los ítems de ejecución. 6. Copia de la bitácora.
7.Para efectos de cada pago (parcial y final), el supervisor deberá exigir al contratista la acreditación sobre el cumplimiento de sus obligaciones frente al Sistema Integral de Seguridad Social y parafiscales, en los términos de las Leyes 789 de 2002, 828 de 2003, 1150 de 2.007 y demás normas complementarias y reglamentarias sobre la materia.
8.Todos los documentos exigidos por parte de la supervisión, para lo cual se entregará al contratista la lista con requisitos documentales según corresponda para el trámite de los pagos. Entre los que se encuentran los siguientes: Acta de pago parcial, memorias de cálculo, informe técnico con el cumplimiento de las obligaciones pactadas, actos administrativos, garantías del contrato, aportes de seguridad social, registro de avance de obra, seguimiento de comités técnicos, Registro fotográfico de cada una de las actividades reportadas y conclusiones técnicas, pruebas de calidad (laboratorios), certificado de calidad de materiales utilizados, factura de cobro.
9.Para el pago final se debe presentar la respectiva acta de terminación y de liquidación.
10.Y los demás que legalmente sean aplicables.
La última acta de pago no será inferior al DIEZ POR CIENTO (10%) del valor total del contrato y se cancelará una vez el Contratista entregue al Municipio:
-Acta de liquidación del contrato debidamente suscrita por EL MUNICIPIO y el CONTRATISTA.
-Paz y salvo del Ministerio de la Protección Social donde se haga constar la inexistencia de reclamaciones laborales a cargo del contratista; y Paz y Salvo de pagos de aportes parafiscales por el contrato ejecutado.
-Paz y salvo del personal vinculado al contrato durante el termino de ejecución
-Memorias de cálculo de cada ítem, con su registro fotográfico a color.
-Planos Récord debidamente avalados, que incluya detalles, refuerzos estructurales conforme las actividades ejecutadas en cumplimiento del objeto contratado.
-Registro fotográfico (archivo jpg) secuencial ítem por ítem contratado, con el compilado de todas las fotografías tomadas a lo largo de la ejecución del contrato.
-Todos los soportes digitalizados.
-Original de la bitácora.
-Actualización de la garantía única.
-Acta de Entrega
-Manual de Mantenimiento y operación.
-Pruebas de calidad (laboratorios) conforme las actividades contratadas
-Certificado de calidad de los materiales utilizados en la ejecución de actividades contratadas.

	ACTA DE RECIBO FINAL	F-101
ALCALDÍA PUERTO LÓPEZ		Version:002
		FECHA : AGOSTO DE 2023

-Informe técnico final donde se relaciona toda la cronología del contrato, actuaciones administrativas, pagos realizados, garantías del contrato actualizadas con fecha de aprobación, cumplimiento de las obligaciones pactadas, relación del personal y sus aportes al sistema integral de seguridad social, registro de las actividades ejecutadas, registro fotográfico, conclusiones técnicas.
-Informe de legalización de los gastos Administrativos, con respectivos soportes
-Informe de legalización de los gastos Imprevistos, con respectivos soportes
-Los pagos correspondientes deberán contar con el previo Vo.Bo. del Supervisor designado por EL MUNICIPIO y la certificación de recibo a satisfacción de las obras entregadas.
Si el contratista no presenta la cuenta con sus soportes respectivos, dentro de la vigencia fiscal correspondiente, no podrá hacer ninguna reclamación judicial o extrajudicial de actualizaciones, intereses o sobrecostos sobre el valor de la cuenta.Para el caso de Imprevistos se deberá suscribir Acta de liquidación de imprevistos causados, debidamente justificados suscrita por el Supervisor y el Contratista previo informe de los mismos allegados por el Contratista al porcentaje destinado de Imprevistos del AIU. El pago y reconocimiento de los imprevistos serán analizados por el municipio a través del supervisor de conformidad con las orientaciones impartidas por la Contraloría Departamental del Meta en Circular externa No. 13 del 19 de abril de 2021.
Los pagos se realizarán mediante transferencias bancarias a las cuentas del contratista y para tal efecto se enviarán las facturas al correo electrónico sechacienda@puertolopez-meta.gov.co
El contratista solicitara de manera voluntaria el plan de pagos, teniendo en cuenta el cumplimiento de las disposiciones expuestas en este numeral.
El Contratista deberá presentar para el trámite de sus cuentas además de los documentos relacionados la factura de venta, conforme al Decreto 2242 de 2015, y la Resolución 000042 de 2020, la cual deberá ser enviada al correo electrónico sechacienda@puertolopez-meta.gov.co, la fecha de la factura debe corresponder al mes de su elaboración, y en ella constará el número del contrato, el concepto del bien o servicio que se está cobrando. En caso de no estar obligado a facturar, deberá presentar el documento equivalente
Nota1: Todos los pagos estarán sujetos a los desembolsos que efectué la Tesorería Municipal, sin perjuicio del cumplimiento del objeto contractual y demás requisitos legales para su cancelación.

No. CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD	: 00360	**No. REGISTRO PRESUPUESTAL:**	00494	
VALOR	: $ 36.389.830,00	**VALOR :**	$ 36.389.830,00	
FUENTES DE FINANCIACION	: **FUENTE:**	**VALOR:**		
	PROPIOS		$ 36.389.830,00	
	N/A		$	
	N/A		$	
	N/A		$	
CODIGO Y DENOMINACION PRESUPUESTAL	: 2.3.40.4002.1400.05 BPIN 2020505730014 Construcción mejoramiento y mantenimiento de la infraestructura de equipamiento y bienes de uso público del municipio de Puerto López			

2. ANTECEDENTES DEL CONTRATO

A . PRORROGAS

ACTA N°	FECHA ACTA	TIEMPO	
		MES	DIAS
1	30/04/2024	0	10
N/A	N/A	N/A	N/A

B. SUSPENSIONES - AMPLIACIONES A SUSPENSIÓNES

ACTA N°	FECHA ACTA	TIEMPO	
		MES	DIAS
N/A	N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A	N/A

C. REINICIO

ACTA N°	FECHA ACTA	TIEMPO SUSPENSION	
		MES	DIAS
N/A	N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A	N/A

FECHA ACTUAL DE TERMINACIÓN 10/05/2024

D. MODIFICACION DE CANTIDADES (BALANCE DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES)

ACTA N°	FECHA ACTA	VALOR ($)
N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A

VALOR ACTUAL DEL CONTRATO ($) N/A

E. ADICIONES PRESUPUESTALES

ACTA N°	FECHA ACTA	VALOR ($)
N/A	N/A	N/A

No. CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD	: N/A	**No. REGISTRO PRESUPUESTAL:**	N/A	
VALOR	: N/A	**VALOR :**	N/A	
FUENTES DE FINANCIACION	: **FUENTE:**	**VALOR:**		
	N/A		N/A	
	N/A		N/A	
	N/A		N/A	
	N/A		N/A	

VALOR ACTUALIZADO DEL CONTRATO ($) N/A

	ACTA DE RECIBO FINAL	F-101
ALCALDÍA PUERTO LÓPEZ		Version:002
		FECHA : AGOSTO DE 2023

3. CONDICIONES ACTUALES DEL CONTRATO

VALOR ACTUALIZADO DEL CONTRATO ($)	$ 36.389.830,00			
PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO	10	**DIAS**	1	**MESES**
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL DEL CONTRATO	10/05/2024			

En las instalaciones locativas de la Alcaldía Municipal de Puerto López-Meta a los Doce (12) días del mes Junio del año 2024 se reunieron : **UNION TEMPORAL CEMENTERIOS 2024**, identificada con Nit 901.811.916-1, Representada Legalmente por **ERIKA LORENA LESMES AGUIRRE** dentificada con C.C 1.121.865.059, y la ingeniera **MARYLIN PAOLA FONSECA CRUZ**, actuando en calidad de supervisor del Contrato de obras No. 100-103-13-09-00001-2024 DE 2024 suscrito el día 18/03/2024, con el fin de suscribir la presente acta de Recibo Final del contrato mencionado anteriormente; lo anterior habiéndose cumplido satisfactoriamente el objeto, plazos mencionados y condiciones contractuales pactadas.

(a) ITEM No.	(b) DESCRIPCION ACTIVIDAD	(c) UNID.	CONDICIONES INICIALES			CONDICIONES FINALES		
			(d) CANT	(e) VR UNIT	(f) VR PARCIAL	(g) CANT	(h) VR UNIT	(i) VR TOTAL
1,0	**CONSTRUCCIÓN BOVEDAS**				**$ 22.131.492,86**			**$ 22.131.492,86**
1,1	LOCALIZACION Y REPLANTEO CONVENCIONAL OBRA ARQUITECTÓNICA (M2) NO INCLUYE COMISIÓN TOPOGRAFICA.	M2	17,88	$ 3.754,73	$ 67.134,57	17,88	$ 3.754,73	$ 67.134,57
1,2	DESCAPOTE MANUAL H= 0.15 M CON TRASIEGO DE MATERIAL SOBRANTE	M2	17,88	$ 8.831,61	$ 157.909,19	17,88	$ 8.831,61	$ 157.909,19
1,3	SOLADO, LIMPIEZA EN CONCRETO 13.8 MPa (2000 PSI)	M3	0,15	$ 604.816,44	$ 90.722,47	0,15	$ 604.816,44	$ 90.722,47
1,4	VIGA EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	1,42	$ 969.060,92	$ 1.376.066,51	1,42	$ 969.060,92	$ 1.376.066,51
1,5	RELLENO CON MATERIAL MIXTO DE RÍO SIN PROCESAR TAMAÑO MAX. 2" SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN MANUAL CON EQUIPO LIVIANO.	M3	3,63	$ 62.183,02	$ 225.724,36	3,63	$ 62.183,02	$ 225.724,36
1,6	COLUMNA EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	0,90	$ 1.342.043,29	$ 1.207.838,96	0,90	$ 1.342.043,29	$ 1.207.838,96
1,7	ACERO DE REFUERZO FY=4200 MPa (4200 KG/CM2, G60) INCLUYE SUMINISTRO, FIGURADO, ARMADO, COLOCACIÓN Y AMARRE.	KG	401,51	$ 8.629,76	$ 3.464.934,94	401,51	$ 8.629,76	$ 3.464.934,94
1,8	MURO EN BLOQUE FLEXA No. 5, 0.12X0.20X0.30 M (MORTERO TIPO S 1:4)	M2	57,87	$ 53.733,97	$ 3.109.584,84	57,87	$ 53.733,97	$ 3.109.584,84
1,9	PLACA DE CONTRAPISO EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	1,25	$ 789.895,18	$ 987.368,98	1,25	$ 789.895,18	$ 987.368,96
1,10	PLACA DE ENTREPISO MACIZA EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	3,85	$ 1.118.389,28	$ 4.305.798,73	3,85	$ 1.118.389,28	$ 4.305.798,73
1,11	MALLA ELECTROSOLDADA FY=5000 KG/CM2, 500 MPA. FIGURADO, ARMADO, COLOCACIÓN Y AMARRE. SUMINISTRO E INSTALACIÓN	KG	151,54	$ 9.286,62	$ 1.407.294,39	151,54	$ 9.286,62	$ 1.407.294,39
1,12	PAÑETE MURO EXTERIOR Y CULATAS MORTERO 1:4 IMPERMEABILIZADO. SUMINISTRO Y APLICACIÓN.	M2	30,01	$ 34.927,40	$ 1.048.171,27	30,01	$ 34.927,40	$ 1.048.171,27
1,13	PAÑETE MUROS INTERIORES MORTERO 1:4 SOBRE MALLA CON VENA. INCLUYE FILOS Y DILATACIONES. SUMINISTRO Y APLICACIÓN.	M2	90,57	$ 42.936,22	$ 3.888.733,45	90,57	$ 42.936,22	$ 3.888.733,45
1,14	PINTURA VINILO T. CORAZA EXTERIOR 3 MANOS	M2	56,21	$ 14.129,34	$ 794.210,20	56,21	$ 14.129,34	$ 794.210,20
2,0	**CONSTRUCCION OSARIOS**				**$ 5.647.003,67**			**$ 5.647.003,67**
2,1	DESMONTE DE ESTRUCTURA METALICA DE CUBIERTA. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO	M2	22,00	$ 19.493,79	$ 428.863,38	22,00	$ 19.493,79	$ 428.863,38
2,2	DESMONTE DE TEJA PLASTICA Y/O DE ZINC. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO	M2	22,00	$ 7.209,82	$ 158.616,04	22,00	$ 7.209,82	$ 158.616,04

ALCALDIA PUERTO LOPEZ	ACTA DE RECIBO FINAL								F-101 Version:002 FECHA : AGOSTO DE 2023
2,3	DEMOLICION CONCRETO SIMPLE. INCLUYE TRASIEGO Y CARGUE MANUAL	M3	0,12	$ 337.201,33	$ 40.464,16	0,12	$ 337.201,33	$ 40.464,16	
2,4	MURO EN BLOQUE FLEXA No. 4 0.10X0.20X0.30 M(MORTERO TIPO S 1:3)	M2	15,38	$ 54.269,15	$ 834.659,53	15,38	$ 54.269,15	$ 834.659,53	
2,5	PAÑETE MURO EXTERIOR Y CULATAS MORTERO 1:4 IMPERMEABILIZADO. SUMINISTRO Y APLICACIÓN	M2	6,00	$ 34.927,40	$ 209.564,40	6,00	$ 34.927,40	$ 209.564,40	
2,6	PAÑETE MUROS INTERIORES MORTERO 1:4 SOBRE MALLA CON VENA. INCLUYE FILOS Y DILATACIONES. SUMINISTRO Y APLICACIÓN	M2	14,67	$ 42.936,22	$ 629.874,35	14,67	$ 42.936,22	$ 629.874,35	
2,7	PLACA DE ENTREPISO MACIZA EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	0,64	$ 1.118.389,28	$ 715.769,14	0,64	$ 1.118.389,28	$ 715.769,14	
2,8	MALLA ELECTROSOLDADA FY=5000 KG/CM2, 500 MPA. FIGURADO, ARMADO, COLOCACIÓN Y AMARRE. SUMINISTRO E INSTALACIÓN	KG	16,62	$ 9.286,62	$ 154.343,62	16,62	$ 9.286,62	$ 154.343,62	
2,9	PEDESTALES EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	0,02	$ 2.218.727,61	$ 44.374,55	0,02	$ 2.218.727,61	$ 44.374,55	
2,10	CORREA PERFIL RECTAN PHR NEGRO 80X40X2.0 MM CAL. 14	ML	32,30	$ 27.090,69	$ 875.029,29	32,30	$ 27.090,69	$ 875.029,29	
2,11	PINTURA VINILO T. CORAZA EXTERIOR 3 MANOS	M2	15,67	$ 14.129,34	$ 221.406,76	15,67	$ 14.129,34	$ 221.406,76	
2,12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CUBIERTA ARQUITECTONICA METALICA PERFIL TRAPEZOIDAL TIPO ACESCO. NO INCLUYE ESTRUCTURA	M2	22,00	$ 43.097,89	$ 948.153,58	22,00	$ 43.097,89	$ 948.153,58	
2,13	VÍGA AÉREA EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	0,08	$ 1.309.091,15	$ 104.727,29	0,08	$ 1.309.091,15	$ 104.727,29	
2,14	ACERO DE REFUERZO FY=4200 MPa (4200 KG/CM2, G60) INCLUYE SUMINISTRO, FIGURADO, ARMADO, COLOCACIÓN Y AMARRE	KG	32,58	$ 8.629,76	$ 281.157,58	32,58	$ 8.629,76	$ 281.157,58	
				COSTO DIRECTO	**$ 27.778.496,52**				**$ 27.778.496,52**
				ADMINISTRACION	**25% $ 6.944.624,13**				**$ 6.944.624,13**
				IMPREVISTOS	**1% $ 277.784,97**				**$ 277.784,97**
				UTILIDAD	**5% $ 1.388.924,83**				**$ 1.388.924,83**
				AIU	**31% $ 8.611.333,92**				**$ 8.611.333,92**
				COSTO TOTAL	**$ 36.389.830,44**				**$ 36.389.830,44**
				COSTO TOTAL AJUSTE AL PESO	**$ 36.389.830,00**				**$ 36.389.830,00**

Para constancia de lo anterior, se firma en Puerto Lopez -Meta , a los Doce (12) días del mes Junio del año 2024

Firma	Firma
UNION TEMPORAL CEMENTERIOS 2024 NIT.: 901.811.916-1 **ERIKA LORENA LESMES AGUIRRE** C.C. 1.121.865.059 de Villavicencio **CONTRATISTA**	**N/A** **INTERVENTORIA**
Firma	Firma
Cargo : MARYLIN PAOLA FONSECA CRUZ **SUPERVISOR ASIGNADO**	**Nota :** Diligenciar celda de supervisor según aplique

ALCALDÍA PUERTO LÓPEZ	**ACTA DE PAGO**	**Código: F – 094** Versión: 003 Fecha: Enero de 2024

ACTA DE PAGO FINAL
PERIODO DEL 01/04/2024 AL 10/05/2024
FECHA DE PRESENTACIÓN 18/06/2024

Contrato No. y Fecha:	**CONTRATO DE OBRA No 100-103-13-09-00001-2024 DE 2024 SUSCRITO EL 18/03/2024**		
Contratista: (Persona natural o jurídica que figura en el contrato.)	**UNION TEMPORAL CEMENTERIOS 2024**	Nit./c.c.	**901.811.916-1**
Representante Legal: (Soló para persona jurídica)	ERIKA LORENA LESMES AGUIRRE	C.C.	1.121.865.059
Supervisor:	MARYLIN PAOLA FONSECA CRUZ	C.C.	1.121.885.470
Objeto: CONSTRUCCION BOVEDAS Y OSARIOS EN EL CEMENTERIO DEL MUNICIPIO DE PUERTO LOPEZ – META			
RELACIONAR SEGÚN LO ESTABLECIDO EN EL CLAUSULADO CONSTRUCCION BOVEDAS Y OSARIOS EN EL CEMENTERIO DEL MUNICIPIO DE PUERTO LOPEZ – META			
Valor inicial del contrato: (Letras y Números)	Treinta y Seis Millones Trescientos Ochenta y Nueve Mil Ochocientos Treinta Pesos M/cte ($ 36.389.830,00)		
Término Inicial de Ejecución:	1 MES		
Fecha de Inicio según Acta de Inicio:	01/04/2024	Fecha Finalización según Acta de Inicio:	30/04/2024

Modificaciones (Adiciones, Prórrogas, Suspensiones, Cesiones, Reinicios)			
Tipo de Modificación	Fecha de expedición del documento	Valor (Aplica solo para adiciones)	Tiempo (aplica solo para prórrogas)
PRORROGA	30/04/2024	N/A	10 DIAS
Término Total de Ejecución: (Inicial + prórroga)	1 MES Y 10 DIAS	Fecha Finalización: (Inicial + prórroga)	10/05/2024
Valor total del contrato, incluyendo adiciones: (Letras y Números)	Treinta y Seis Millones Trescientos Ochenta y Nueve Mil Ochocientos Treinta Pesos M/cte ($ 36.389.830,00)		
*Diligencie sólo si existen modificaciones, de lo contrario N/A **Inserte filas si requiere			

Forma de Pago: CLÁUSULA PRIMERA. - VALOR DEL CONTRATO y FORMA DE PAGO
El Municipio pagará el valor del contrato resultante del presente proceso de la siguiente manera: El municipio pagará al contratista pagos parciales hasta el 90% del valor del contrato, teniendo en cuenta el avance físico de la obra; y el 10% restante se cancelará con la liquidación del contrato, para lo cual se tendrá en cuenta lo siguiente: a) El valor de la primera acta parcial se realizará cuando se haya ejecutado como mínimo el veinte (20%) de ejecución de avance de la obra, liquidadas por el sistema de Precios Unitarios, pactadas en el contrato o debidamente aprobadas por la supervisión, previa presentación de informe de contratista, soportes de pagos de seguridad social y parafiscales, informe de supervisor, factura y demás documentos solicitados.

b) Un 70% mediante actas parciales de obra, liquidadas por el sistema de Precios Unitarios, pactadas en el contrato o debidamente aprobadas por la supervisión previa presentación de informe de contratista, soportes de pagos de seguridad social y parafiscales, informe de supervisión, factura y demás documentos solicitados.
c) El Diez por ciento (10%) final, a la liquidación del contrato, previa certificación de cumplimiento total de la ejecución suscrita por el supervisor designado y la suscripción del acta de liquidación final por parte del supervisor designado y las partes.
Para el trámite del pago el contratista deberá presentar ante el SUPERVISOR:
1.La CERTIFICACIÓN de cumplimiento por parte de la supervisión, como funcionario competente para ejercer las tareas de vigilancia de la correcta ejecución contractual.
2.La factura o documento equivalente, según corresponda en cada caso.
3.La acreditación del pago de seguridad social integral y parafiscal si a ello hubiere lugar.
4.Acta de recibo Parcial debidamente suscrita por el MUNICIPIO y el CONTRATISTA.
5.Memorias de cálculo de cada ítem, soportado con registro fotográfico a color, registrando cada uno de los ítems de ejecución. 6. Copia de la bitácora.
7.Para efectos de cada pago (parcial y final), el supervisor deberá exigir al contratista la acreditación sobre el cumplimiento de sus obligaciones frente al Sistema Integral de Seguridad Social y parafiscales, en los términos de las Leyes 789 de 2002, 828 de 2003, 1150 de 2.007 y demás normas complementarias y reglamentarias sobre la materia.
8.Todos los documentos exigidos por parte de la supervisión, para lo cual se entregará al contratista la lista con requisitos documentales según corresponda para el trámite de los pagos. Entre los que se encuentran los siguientes: Acta de pago parcial, memorias de cálculo, informe técnico con el cumplimiento de las obligaciones pactadas, actos administrativos, garantías del contrato, aportes de seguridad social, registro de avance de obra, seguimiento de comités técnicos, Registro fotográfico de cada una de las actividades reportadas y conclusiones técnicas, pruebas de calidad (laboratorios), certificado de calidad de materiales utilizados, factura de cobro.
9.Para el pago final se debe presentar la respectiva acta de terminación y de liquidación.
10.Y los demás que legalmente sean aplicables.
La última acta de pago no será inferior al DIEZ POR CIENTO (10%) del valor total del contrato y se cancelará una vez el Contratista entregue al Municipio:
-Acta de liquidación del contrato debidamente suscrita por EL MUNICIPIO y el CONTRATISTA.
-Paz y salvo del Ministerio de la Protección Social donde se haga constar la inexistencia de reclamaciones laborales a cargo del contratista; y Paz y Salvo de pagos de aportes parafiscales por el contrato ejecutado.
-Paz y salvo del personal vinculado al contrato durante el termino de ejecución
-Memorias de cálculo de cada ítem, con su registro fotográfico a color.
-Planos Récord debidamente avalados, que incluya detalles, refuerzos estructurales conforme las actividades ejecutadas en cumplimiento del objeto contratado.
-Registro fotográfico (archivo jpg) secuencial ítem por ítem contratado, con el compilado de todas las fotografías tomadas a lo largo de la ejecución del contrato.
-Todos los soportes digitalizados.
-Original de la bitácora.
-Actualización de la garantía única.
-Acta de Entrega
-Manual de Mantenimiento y operación.
-Pruebas de calidad (laboratorios) conforme las actividades contratadas
-Certificado de calidad de los materiales utilizados en la ejecución de actividades contratadas.
-Informe técnico final donde se relaciona toda la cronología del contrato, actuaciones administrativas, pagos realizados, garantías del contrato actualizadas con fecha de aprobación, cumplimiento de las obligaciones pactadas, relación del personal y sus aportes al sistema integral de seguridad social, registro de las actividades ejecutadas, registro fotográfico, conclusiones técnicas.

ALCALDIA PUERTO LOPEZ	**ACTA DE PAGO**	**Código: F – 094** Versión: 003 Fecha: Enero de 2024

-Informe de legalización de los gastos Administrativos, con respectivos soportes
-Informe de legalización de los gastos Imprevistos, con respectivos soportes
-Los pagos correspondientes deberán contar con el previo Vo.Bo. del Supervisor designado por EL MUNICIPIO y la certificación de recibo a satisfacción de las obras entregadas.
Si el contratista no presenta la cuenta con sus soportes respectivos, dentro de la vigencia fiscal correspondiente, no podrá hacer ninguna reclamación judicial o extrajudicial de actualizaciones, intereses o sobrecostos sobre el valor de la cuenta.Para el caso de Imprevistos se deberá suscribir Acta de liquidación de imprevistos causados, debidamente justificados suscrita por el Supervisor y el Contratista previo informe de los mismos allegados por el Contratista al porcentaje destinado de Imprevistos del AIU.
El pago y reconocimiento de los imprevistos serán analizados por el municipio a través del supervisor de conformidad con las orientaciones impartidas por la Contraloría Departamental del Meta en Circular externa No. 13 del 19 de abril de 2021.
Los pagos se realizarán mediante transferencias bancarias a las cuentas del contratista y para tal efecto se enviarán las facturas al correo electrónico sechacienda@puertolopez-meta.gov.co
El contratista solicitara de manera voluntaria el plan de pagos, teniendo en cuenta el cumplimiento de las disposiciones expuestas en este numeral.
El Contratista deberá presentar para el trámite de sus cuentas además de los documentos relacionados la factura de venta, conforme al Decreto 2242 de 2015, y la Resolución 000042 de 2020, la cual deberá ser enviada al correo electrónico sechacienda@puertolopez-meta.gov.co, la fecha de la factura debe corresponder al mes de su elaboración, y en ella constará el número del contrato, el concepto del bien o servicio que se está cobrando. En caso de no estar obligado a facturar, deberá presentar el documento equivalente
Nota1: Todos los pagos estarán sujetos a los desembolsos que efectué la Tesorería Municipal, sin perjuicio del cumplimiento del objeto contractual y demás requisitos legales para su cancelación.

INFORMACIÓN FINANCIERA					
Contrato Inicial, Certificado de Disponibilidad Presupuestal:					
Número y Fecha:	**00360**	**Inversión**	X	**Funcionamiento**	
Rubro presupuestal:	2.3.40.4002.1400.05 BPIN 2020505730014 Construcción mejoramiento y mantenimiento de la infraestructura de equipamiento y bienes de uso público del municipio de Puerto López				
Valor: (Letras y Números)	Treinta y Seis Millones Trescientos Ochenta y Nueve Mil Ochocientos Treinta Pesos M/cte ($ 36.389.830,00)				
Contrato Inicial, Registro Presupuestal:					
Número y Fecha:	**00494**	**Inversión**	X	**Funcionamiento**	
Rubro presupuestal:	2.3.40.4002.1400.05 BPIN 2020505730014 Construcción mejoramiento y mantenimiento de la infraestructura de equipamiento y bienes de uso público del municipio de Puerto López				
Valor: (Letras y Números)	Treinta y Seis Millones Trescientos Ochenta y Nueve Mil Ochocientos Treinta Pesos M/cte ($ 36.389.830,00)				
INFORMACIÓN FINANCIERA - ADICION					
Adición, Certificado de Disponibilidad Presupuestal:					
Número y Fecha:	N/A	**Inversión**	N/A	**Funcionamiento**	N/A
Rubro presupuestal:	N/A				
Valor: (Letras y Números)	N/A				
Adición, Registro Presupuestal:					
Número y Fecha:	N/A	**Inversión**	N/A	**Funcionamiento**	N/A
Rubro presupuestal:	N/A				

ALCALDÍA PUERTO LÓPEZ	**ACTA DE PAGO**	**Código: F – 094** Versión: 003 Fecha: Enero de 2024

Valor: (Letras y Números)	N/A

Nota: Realice copia de la tabla si se presenta más de una adición

Vigencia de Garantías (cuando aplique)

GARANTIAS.	ASEGURADORA	Nº DE POLIZA	Fecha Inicial	Fecha Final	Valor Asegurado
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	SEGUROS DEL ESTADO	11-44-101221672	01/04/2024	10/09/2024	$ 3.638.983,00
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES	SEGUROS DEL ESTADO	11-44-101221672	01/04/2024	10/05/2027	$ 1.819.491,50
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	SEGUROS DEL ESTADO	11-44-101221672	10/05/2024	10/05/2029	$ 7.277.966,00
RC EXTRACONTRACTUAL	SEGUROS DEL ESTADO	11-40-101061560	18/03/2024	10/05/2024	$ 260.000.000

Modificaciones y/o Adiciones:
El 30 de Abril de 2024, se realizó adición en tiempo de Diez (10) ya que debido al mal tiempo se requirió adicionar para darle terminación al contrato.

Periodo de Pago:	Del	**01/04/2024**	Al	**10/05/2024**			
Tipo de Pago:	Anticipo		Parcial		Final	x	No. de Pago	01

No. de Comprobante de Entrada a Almacén: (Contrato de Suministro)	**N/A**

Valor Total Autorizado a Pagar			
Valor Total Autorizado a Pagar (Letras Máximo 2 Decimales)	Treinta y Seis Millones Trescientos Ochenta y Nueve Mil Ochocientos Treinta Pesos M/cte ($ 36.389.830,00)		
Por cada Registro Presupuestal (R.P.) y Clasificador Presupuestal que avale el contrato, se debe especificar el Valor a Afectar. Inserte filas si requiere.			
No. R.P.	**Rubro Presupuestal**	**Nombre**	**Valor a Afectar**
00494	2.3.40.4002.1400.05 BPIN 2020505730014 Construcción mejoramiento y mantenimiento de la infraestructura de equipamiento y bienes de uso público del municipio de Puerto López	**PROPIOS**	**$ 36.389.830,00**
Valor Total Autorizado a Pagar (números máximo 2 decimales)			**$ 36.389.830,00**

ALCALDÍA PUERTO LOPEZ	**ACTA DE PAGO**	**Código: F – 094** Versión: 003 Fecha: Enero de 2024

Anticipo (Letras y Números máximo 2 Decimales)			**N/A**
Amortización del Anticipo:			
Valor (Letras y Números máximo 2 Decimales)			**N/A**
Porcentaje:	**N/A**	Observaciones:	**N/A**

Balance Financiero de Ejecución del Contrato Inicial						
RELACION DE PAGOS CONTRATO						
ACTA No.	CONCEPTO	VALOR	AMORTIZACIÓN	NETO PARCIAL	ACUMULADO	% EJECUCION FINANCIERA
1	**Anticipo**	**N/A**	**N/A**	**N/A**	**N/A**	
2	Acta final de pago	$ 36.389.830	$0.000.000	$36.389.830	$ 36.389.830	%100
N/A	Valor por ejecutar o no ejecutado	$0.000.000	$0.000.000	$0.000.000	$0.000.000	%00

Nota: Inserte o Elimine filas si requiere.

Artículo 3.2.7.5 del Decreto 780 de 2016 modificado por el Decreto 1273 de 2018, en relación con el pago y retención de aportes al Sistema de Seguridad Integral y Parafiscales. **El contratista:**			
Concepto	**Si**	**No**	**Detalle**
1. ¿Ostenta la calidad de pensionado o tiene requisitos cumplidos para la pensión o por disposiciones legales no está obligado a cotizar a pensiones?		**X**	
2. ¿Cotiza por otros ingresos provenientes de vinculación laboral y/o reglamentaria, mesadas pensionales, independiente por cuenta propia u otros contratos?		**X**	
3. ¿La totalidad de los ingresos mensuales son iguales o superiores a cuatro (4) salarios mínimos mensuales legales vigentes, producto de los ingresos provenientes de vinculación laboral y/o reglamentaria, independiente por cuenta propia u otros contratos?		**X**	
4. ¿El valor total de sus IBC es superior a 4 salarios mininos mensuales legales vigentes?		**X**	
5. ¿Cotiza por el límite máximo de cotización de veinticinco (25) salarios mínimos mensuales legales?		**X**	
6. ¿Efectúa aportes por un Ingreso Base de Cotización (IBC) superior al 40% del valor mensualizado del contrato?		**X**	
7. ¿Pertenece a un Régimen Especial o de Excepción en salud?		**X**	
8. ¿Cotiza a salud de manera directa a la Entidad Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (ADRES) de conformidad con lo establecido por el Articulo 2.1.13.5?		**X**	
9. ¿Efectúa de forma voluntaria aportes a una Caja de Compensación Familiar?		**X**	
10. ¿Realiza aportes voluntarios a pensión?		**X**	

ALCALDÍA PUERTO LOPEZ	ACTA DE PAGO	Código: F – 094
		Versión: 003
		Fecha: Enero de 2024

Pago de Seguridad Social	Datos
Periodo Cotizado	03-2024
Número de Planilla	29346085
IBC (Ingreso Base de Cotización)	$ 1.300.000
Valor pagado a SALUD	$ 165.100
Valor pagado a PENSIÓN	$ 211.300
Valor pagado a ARL	$ 7.000
Valor pagado a FSP	$ 0.000.000
Nota: Si realizó pago para más de un Periodo o finalizando contrato Inserte nueva columna	

Pago de Seguridad Social	Datos
Periodo Cotizado	04-2024
Número de Planilla	29811944
IBC (Ingreso Base de Cotización)	$ 1.300.000
Valor pagado a SALUD	$ 163.600
Valor pagado a PENSIÓN	$ 209.400
Valor pagado a ARL	$ 6.900
Valor pagado a FSP	$ 0.000.000
Nota: Si realizó pago para más de un Periodo o finalizando contrato Inserte nueva columna	

Pago de Seguridad Social: (Persona Jurídica)	Si N/A
Certificado expedido por el Representante legal	SI
Certificado expedido por el Contador Publico	SI
Nota: Si es persona natural se diligencia N/A	

ALCALDÍA PUERTO LOPEZ	**ACTA DE PAGO**	**Código: F – 094** Versión: 003 Fecha: Enero de 2024

CERTIFICACIÓN

La ingeniera **MARYLIN PAOLA FONSECA CRUZ** en su calidad de SUPERVISORA del **CONTRATO DE 100-103-13-09-00001-2024 DE 2024 SUSCRITO EL 18/03/2024. CERTIFICA QUE DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO DESDE 01/04/2024 HASTA 10/05/2024 ,** el contratista dio cabal cumplimiento al objeto contractual, a las obligaciones y/o actividades asignadas y entregó a entera satisfacción los productos derivados de la ejecución del contrato mencionado anteriormente.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervinieron y aprueban hoy Dieciocho (18) de Junio de 2024.

MARYLIN PAOLA FONSECA CRUZ	**UNION TEMPORAL CEMENTERIOS 2024** **ERIKA LORENA LESMES AGUIRRE** Representante Legal
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	CONTRATO Nº 100-103-13-09-00001-2024
Supervisor	**Contratista**

	CANTIDADES DE PAGO	Código: F - 284
ALCALDÍA PUERTO LÓPEZ		Versión: 001
		Fecha: Octubre de 2020

CONTRATO N°	100-103-13-09-00001-2024	PROYECTO N°	
ACTA DE PAGO PARCIAL N°	1	PERIODO ACTA DE PAGO PARCIAL:	1/04/2024 a 10/06/2024
OBJETO CONTRATO:	CONSTRUCCIÓN DE BOVEDAS Y OSARIOS EN EL CEMENTERIO DEL MUNICIPIO DE PUERTO LOPEZ META	OBJETO PROYECTO:	
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	$ 36.389.830,00	VALOR TOTAL DEL PROYECTO:	N/A
CONTRATISTA:	UNION TEMPORAL CEMENTERIOS 2024	CONTRATO DE INTERVENTORIA N°	N/A
NIT:	901.811.916-1	INTERVENTORÍA:	N/A
CORREO ELECTRONICO CONTRATISTA:	licitacionesdyg@gmail.com	CORREO ELECTRONICO INTERVENTORIA	N/A
SUPERVISOR:	MARYLIN PAOLA FONSECA CRUZ	APOYO A LA SUPERVISION:	N/A
CORREO ELECTRONICO INTERVENTORIA:	secinfraestructura@puertolopez-meta.gov.co	CONTRATO DE APOYO A LA SUPERVISION N°	N/A
FECHA DE INICIACIÓN:	1/04/2024	FECHA PRESENTE ACTA:	18/06/2024

N° ITEM	CONDICIONES INICIALES					CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA DE MAYORES Y MENORES		OBRA EJECUTADA						
								ACTAS ANTERIORES		PRESENTE ACTA		ACUMULADO		
	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	%
1,00	CONSTRUCCIÓN BOVEDAS													
1,01	LOCALIZACION Y REPLANTEO CONVENCIONAL OBRA ARQUITECTÓNICA (M2) NO INCLUYE COMISIÓN TOPOGRAFICA.	M2	17,88	$ 3.754,73	$ 67.134,57	0,00	$ -	0,00	$ -	17,88	$ 67.134,57	17,88	$ 67.134,57	100%
1,02	DESCAPOTE MANUAL H= 0.15 M CON TRASIEGO DE MATERIAL SOBRANTE	M2	17,88	$ 8.831,61	$ 157.909,19	0,00	$ -	0,00	$ -	17,88	$ 157.909,19	17,88	$ 157.909,19	100%
1,03	SOLADO, LIMPIEZA EN CONCRETO 13.8 MPa (2000 PSI)	M3	0,15	$ 604.816,44	$ 90.722,47	0,00	$ -	0,00	$ -	0,15	$ 90.722,47	0,15	$ 90.722,47	100%
1,04	VIGA EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	1,42	$ 969.060,92	$ 1.376.066,51	0,00	$ -	0,00	$ -	1,42	$ 1.376.066,51	1,42	$ 1.376.066,51	100%
1,05	RELLENO CON MATERIAL MIXTO DE RÍO SIN PROCESAR TAMAÑO MAX. 2" SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN MANUAL CON EQUIPO LIVIANO.	M3	3,63	$ 62.183,02	$ 225.724,36	0,00	$ -	0,00	$ -	3,63	$ 225.724,36	3,63	$ 225.724,36	100%
1,06	COLUMNA EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	0,90	$ 1.342.043,29	$ 1.207.838,96	0,00	$ -	0,00	$ -	0,90	$ 1.207.838,96	0,90	$ 1.207.838,96	100%
1,07	ACERO DE REFUERZO FY=4200 MPa (4200 KG/CM2, G60) INCLUYE SUMINISTRO, FIGURADO, ARMADO, COLOCACIÓN Y AMARRE.	KG	401,51	$ 8.629,76	$ 3.464.934,94	0,00	$ -	0,00	$ -	401,51	$ 3.464.934,94	401,51	$ 3.464.934,94	100%
1,08	MURO EN BLOQUE FLEXA No. 5, 0.12X0.20X0.30 M (MORTERO TIPO S 1:4)	M2	57,87	$ 53.733,97	$ 3.109.584,84	0,00	$ -	0,00	$ -	57,87	$ 3.109.584,84	57,87	$ 3.109.584,84	100%
1,09	PLACA DE CONTRAPISO EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	1,25	$ 789.895,18	$ 987.368,98	0,00	$ -	0,00	$ -	1,25	$ 987.368,98	1,25	$ 987.368,98	100%
1,10	PLACA DE ENTREPISO MACIZA EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	3,85	$ 1.118.389,28	$ 4.305.798,73	0,00	$ -	0,00	$ -	3,85	$ 4.305.798,73	3,85	$ 4.305.798,73	100%
1,11	MALLA ELECTROSOLDADA FY=5000 KG/CM2, 500 MPA. FIGURADO, ARMADO, COLOCACIÓN Y AMARRE. SUMINISTRO E INSTALACIÓN	KG	151,54	$ 9.286,62	$ 1.407.294,39	0,00	$ -	0,00	$ -	151,54	$ 1.407.294,39	151,54	$ 1.407.294,39	100%
1,12	PAÑETE MURO EXTERIOR Y CULATAS MORTERO 1:4 IMPERMEABILIZADO. SUMINISTRO Y APLICACIÓN.	M2	30,01	$ 34.927,40	$ 1.048.171,27	0,00	$ -	0,00	$ -	30,01	$ 1.048.171,27	30,01	$ 1.048.171,27	100%
1,13	PAÑETE MUROS INTERIORES MORTERO 1:4 SOBRE MALLA CON VENA. INCLUYE FILOS Y DILATACIONES. SUMINISTRO Y APLICACIÓN.	M2	90,57	$ 42.936,22	$ 3.888.733,45	0,00	$ -	0,00	$ -	90,57	$ 3.888.733,45	90,57	$ 3.888.733,45	100%
1,14	PINTURA VINILO T. CORAZA EXTERIOR 3 MANOS	M2	56,21	$ 14.129,34	$ 794.210,20	0,00	$ -	0,00	$ -	56,21	$ 794.210,20	56,21	$ 794.210,20	100%
				SUBTOTAL	$ 22.131.492,86		$ -				$ 22.131.492,86		$ 22.131.492,86	100%

Carrera 31 No. 38-41 Centro
Villavicencio - Meta
www.alm-meta.gov.co
gerencia@idm-meta.gov.co

ALCALDÍA PUERTO LÓPEZ	CANTIDADES DE PAGO	Código: F - 284
		Versión: 001
		Fecha: Octubre de 2020

CONTRATO N°	100-103-13-09-00001-2024	**PROYECTO N°**	
ACTA DE PAGO PARCIAL N°	1	**PERIODO ACTA DE PAGO PARCIAL:**	1/04/2024 a 10/05/2024
OBJETO CONTRATO:	CONSTRUCCION DE BOVEDAS Y OSARIOS EN EL CEMENTERIO DEL MUNICIPIO DE PUERTO LOPEZ META	**OBJETO PROYECTO:**	
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	$ 36.389.830,00	**VALOR TOTAL DEL PROYECTO:**	N/A
CONTRATISTA:	UNION TEMPORAL CEMENTERIOS 2024	**CONTRATO DE INTERVENTORIA N°**	N/A
NIT:	901.811.916-1	**INTERVENTORIA:**	N/A
CORREO ELECTRONICO CONTRATISTA:	licitacionesdyg@gmail.com	**CORREO ELECTRONICO INTERVENTORIA**	N/A
SUPERVISOR:	MARYLIN PAOLA FONSECA CRUZ	**APOYO A LA SUPERVISION:**	N/A
CORREO ELECTRONICO INTERVENTORIA:	secinfraestructura@puertolopez-meta.gov.co	**CONTRATO DE APOYO A LA SUPERVISION N°**	N/A
FECHA DE INICIACIÓN:	1/04/2024	**FECHA PRESENTE ACTA:**	18/06/2024

N° ITEM	CONDICIONES INICIALES					CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA DE MAYORES Y MENORES		OBRA EJECUTADA						
								ACTAS ANTERIORES		PRESENTE ACTA		ACUMULADO		
	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	%
2.00	**CONSTRUCCION OSARIOS**													
2.01	DESMONTE DE ESTRUCTURA METALICA DE CUBIERTA. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO	M2	22,00	$ 19.493,79	$ 428.863,38	0,00	$ -	0,00	$ -	22,00	$ 428.863,38	22,00	$ 428.863,38	100%
2.02	DESMONTE DE TEJA PLASTICA Y/O DE ZINC. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO	M2	22,00	$ 7.209,82	$ 158.616,04	0,00	$ -	0,00	$ -	22,00	$ 158.616,04	22,00	$ 158.616,04	100%
2.03	DEMOLICION CONCRETO SIMPLE. INCLUYE TRASIEGO Y CARGUE MANUAL	M3	0,12	$ 337.201,33	$ 40.464,16	0,00	$ -	0,00	$ -	0,12	$ 40.464,16	0,12	$ 40.464,16	100%
2.04	MURO EN BLOQUE FLEXA No. 4 0.10X0.20X0.30 M(MORTERO TIPO S 1:3)	M2	15,38	$ 54.269,15	$ 834.659,53	0,00	$ -	0,00	$ -	15,38	$ 834.659,53	15,38	$ 834.659,53	100%
2.05	PAÑETE MURO EXTERIOR Y CULATAS MORTERO 1:4 IMPERMEABILIZADO. SUMINISTRO Y APLICACIÓN	M2	6,00	$ 34.927,40	$ 209.564,40	0,00	$ -	0,00	$ -	6,00	$ 209.564,40	6,00	$ 209.564,40	100%
2.06	PAÑETE MUROS INTERIORES MORTERO 1:4 SOBRE MALLA CON VENA. INCLUYE FILOS Y DILATACIONES. SUMINISTRO Y APLICACIÓN	M2	14,67	$ 42.936,22	$ 629.874,35	0,00	$ -	0,00		14,67	$ 629.874,35	14,67	$ 629.874,35	100%
2.07	PLACA DE ENTREPISO MACIZA EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	0,64	$ 1.118.389,28	$ 715.769,14	0,00	$ -	0,00	$ -	0,64	$ 715.769,14	0,64	$ 715.769,14	100%
2.08	MALLA ELECTROSOLDADA FY=5000 KG/CM2, 500 MPA. FIGURADO, ARMADO, COLOCACIÓN Y AMARRE. SUMINISTRO E INSTALACIÓN	KG	16,62	$ 9.286,62	$ 154.343,62	0,00	$ -	0,00	$ -	16,62	$ 154.343,62	16,62	$ 154.343,62	100%
2.09	PEDESTALES EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	0,02	$ 2.218.727,61	$ 44.374,55	0,00	$ -	0,00	$ -	0,02	$ 44.374,55	0,02	$ 44.374,55	100%
2.10	CORREA PERFIL RECTAN PHR NEGRO 80X40X2.0 MM CAL. 14	ML	32,30	$ 27.090,69	$ 875.029,29	0,00	$ -	0,00		32,30	$ 875.029,29	32,30	$ 875.029,29	100%
2.11	PINTURA VINILO T. CORAZA EXTERIOR 3 MANOS	M2	15,67	$ 14.129,34	$ 221.406,76	0,00	$ -	0,00	$ -	15,67	$ 221.406,76	15,67	$ 221.406,76	100%
2.12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CUBIERTA ARQUITECTONICA METALICA PERFIL TRAPEZOIDAL TIPO ACESCO. NO INCLUYE ESTRUCTURA	M2	22,00	$ 43.097,89	$ 948.153,58	0,00	$ -	0,00	$ -	22,00	$ 948.153,58	22,00	$ 948.153,58	100%
2.13	VÍGA AÉREA EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	0,08	$ 1.309.091,15	$ 104.727,29	0,00	$ -	0,00	$ -	0,08	$ 104.727,29	0,08	$ 104.727,29	100%
2.14	ACERO DE REFUERZO FY=4200 MPa (4200 KG/CM2, G60) INCLUYE SUMINISTRO, FIGURADO, ARMADO, COLOCACIÓN Y AMARRE	KG	32,58	$ 8.629,76	$ 281.157,58	0,00	$ -	0,00	$ -	32,58	$ 281.157,58	32,58	$ 281.157,58	100%
				SUBTOTAL	**$ 5.647.003,67**		$ -		$ -		**$ 5.647.003,67**		**$ 5.647.003,67**	**100%**
	COSTO DIRECTO				**$ 27.778.496,52**		$ -				**$ 27.778.496,52**		**$ 27.778.496,52**	
	ADMINISTRACION			25%	$ 6.944.624,13		$ -				$ 6.944.624,13		$ 6.944.624,13	
	IMPREVISTOS			1%	$ 277.784,97		$ -				$ 277.784,97		$ 277.784,97	
	UTILIDAD			5%	$ 1.388.924,83		$ -				$ 1.388.924,83		$ 1.388.924,83	
	AIU 31%				**$ 8.611.333,92**		$ -				**$ 8.611.333,92**		**$ 8.611.333,92**	
	COSTO TOTAL				**$ 36.389.830,44**		$ -				**$ 36.389.830,44**		**$ 36.389.830,44**	**100,00%**
	COSTO TOTAL AJUSTADO AL PESO				**$ 36.389.830,00**		$ -				**$ 36.389.830,00**		**$ 36.389.830,00**	**100,00%**

Carrera 31 No. 38-41 Centro
Villavicencio - Meta
www.alm-meta.gov.co
gerencia@idm-meta.gov.co

19

	CANTIDADES DE PAGO	Código: F - 284
ALCALDIA PUERTO LOPEZ		Versión: 001
		Fecha: Octubre de 2020

CONTRATO N°	100-103-13-09-00001-2024	**PROYECTO N°**	
ACTA DE PAGO PARCIAL N°	1	**PERIODO ACTA DE PAGO PARCIAL:**	1/04/2024 a 10/05/2024
OBJETO CONTRATO:	CONSTRUCCION DE BOVEDAS Y OSARIOS EN EL CEMENTERIO DEL MUNICIPIO DE PUERTO LOPEZ META	**OBJETO PROYECTO:**	
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	$ 36.389.830,00	**VALOR TOTAL DEL PROYECTO:**	N/A
CONTRATISTA:	UNION TEMPORAL CEMENTERIOS 2024	**CONTRATO DE INTERVENTORIA N°**	N/A
NIT:	901.811.916-1	**INTERVENTORIA:**	N/A
CORREO ELECTRONICO CONTRATISTA:	licitacionesdyg@gmail.com	**CORREO ELECTRONICO INTERVENTORIA**	N/A
SUPERVISOR:	MARYLIN PAOLA FONSECA CRUZ	**APOYO A LA SUPERVISION:**	N/A
CORREO ELECTRONICO INTERVENTORIA:	secinfraestructura@puertolopez-meta.gov.co	**CONTRATO DE APOYO A LA SUPERVISION N°**	N/A
FECHA DE INICIACIÓN:	1/04/2024	**FECHA PRESENTE ACTA:**	18/06/2024

N° ITEM	CONDICIONES INICIALES					CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA DE MAYORES Y MENORES		OBRA EJECUTADA						
								ACTAS ANTERIORES		PRESENTE ACTA		ACUMULADO		
	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	%

CONDICIONES GENERALES

VALOR TOTAL	$ 36.389.830,00	**ACTA 1**	$ -
CONDICIONES ACTUALIZADAS	$ 36.389.830,00	**ACTA 2**	$ -
ANTICIPO	$ -	**ACTA 3**	$ -
PRESENTE ACTA	$ 36.389.830,00	**PRESENTE ACTA**	$ 36.389.830,00
ACUMULADO	$ 36.389.830,00	**TOTALES**	$ **36.389.830,00**

RESUMEN	%	$
EJECUTADO	100,00%	$ 36.389.830,00
POR EJECUTAR	0,00%	$ -
POR AMORTIZAR	0,00%	$ -
TOTALES	**100,00%**	$ **36.389.830,00**

RELACIÓN DE PAGOS PROYECTO N° 2020505730014 (Registro Presupuestal No. 00494 DE 2023)

ACTA No.	CONCEPTO	VALOR	AMORTIZACIÓN	NETO PARCIAL	ACUMULADO
1	ANTICIPO	$ -	$ -	$ -	$ -
2	PAGO PARCIAL N°1	$ -	$ -	$ -	$ -
3	PRESENTE ACTA	$ 36.389.830,00	$ -	$ 36.389.830,00	$ 36.389.830,00
4	VALOR POR EJECUTAR O NO EJECUTADO	$ -	$ -	$ -	$ 36.389.830,00

VALOR A PAGAR PRESENTE ACTA: **TREINTA Y SEIS MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS TREINTA PESOS M/CTE**

NOTAS

1: El contador del contratista y supervisor, Certifica que revisó, verificó y constató el pago de los Parafisicales de Ley por parte del contratista, con base en los soportes presentados por éste.

2: Las cantidades y valores consignados en la presente Acta son responsabilidad exclusiva del Contratista y supervisor. El pago de la presente acta se realizará con base en el principio de confiabilidad y responsabilidad con la que la supervision y el Contratista realizan las mediciones en campo y las revisiones efectuadas por parte de la Supervision.

3. Que la Supervision certifica que el contratista **UNION TEMPORAL CEMENTERIOS 2024** identificado con el NIT 901811916-1, Cumplio con la clausula forma de pago y se encuentra a paz y salvo de los pagos al sistema de seguridad social integral de los periodos relacionados en la presente acta.

4. El contrato de obra N°100-103-13-09-0001-2024 representado legalmente por **UNION TEMPORAL CEMENTERIOS 2024**, durante su ejecución ha tenido modificaciones en su conformación o cesión de derechos por parte de los consorciados: SI ____ de fecha _____. NO_x_.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella el día: 18 de Junio de 2024

Firma:
Nombre: **ERIKA LORENA LESMES AGUIRRE**
REPRESENTANTE LEGAL ~~CONTRATISTA OBRA~~

Firma:
Nombre: N/A
DIRECTOR DE OBRA
N° Matricula Profesional: N/A

Firma:
Nombre: **MARYLIN PAOLA FONSECA CRUZ**
SUPERVIOR
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

Firma: Carlo Moreno C.
CARLOS ALBERTO MORENO CRUZ
Contador Publico
Matricula Profesional: 198354-T

Nota: en la presente acta se debera adjuntar el certificado bancario y las respectivas tarjetas y antecedentes de los contadores.

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

Carrera 31 No. 38-41 C
Villavicencio -
www.idm-meta.g
gerencia@idm-meta.g

20

	MEMORIA DE CALCULO OBRA	Código: F - 260
ALCALDÍA PUERTO LOPEZ		Versión: 002
		Fecha: Enero de 2021


CONTRATO N°	100-103-13-09-00001-2024	PROYECTO N°	
FECHA DE INICIO:	1/04/2024	FECHA DE TERMINACIÓN	10/05/2024
OBJETO PROYECTO:	"CONSTRUCCION BOVEDAS Y OSARIOS EN EL CEMENTERIO DEL MUNICIPIO DE PUERTO LOPEZ - META"		
CONTRATISTA :	UNION TEMPORAL CEMENTERIOS 2024		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	100-103-13-09-00001-2024		
INTERVENTORÍA:	ING. MARYLIN PAOLA FONSECA CRUZ		
ACTA:	**Pago Final, Liquidación del 18 de junio de 2024**		
PERIODO DE CORTE DE LA PRESENTE ACTA	**01/04/2024 al 10/05/2024**		

CAPITULO:	**CONSTRUCCION DE BOVEDAS**	
N° ÍTEM	**DESCRIPCIÓN**	**UNIDAD**
1,01	LOCALIZACION Y REPLANTEO CONVENCIONAL OBRA ARQUITECTONICA (M2) NO INCLUYE COMISION TOPOGRAFICA	M2

DESCRIPCIÓN	**DIMENSIONES**				
	ANCHO	**ALTO**	**LONGITUD**	**CANTIDAD**	**TOTAL**
BOVEDAS	2.50	N/A	7,15	1.00	17,88
PASAN:				**SUBTOTAL**	17,88
				TOTAL	

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA



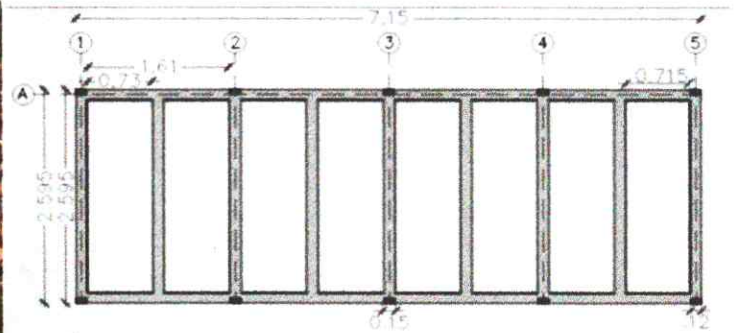

B1 PLANTA–ESTRUCTURAL

Firma
Nombre: ERIKA LORENA LESMES AGUIRRE
Representante Legal
Contratista

Firma
Nombre: JUAN CARLOS PALACIOS MOLINA
RESIDENTE DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 52202-084671

Firma
Nombre: MARYLIN PAOLA FONSECA CRUZ
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
SUPERVISORA

Firma
Nombre:
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional:

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

ALCALDÍA PUERTO LOPEZ	MEMORIA DE CALCULO OBRA	Código: F - 260
		Versión: 002
		Fecha: Enero de 2021


CONTRATO N°	100-103-13-09-00001-2024	PROYECTO N°	
FECHA DE INICIO:	1/04/2024	FECHA DE TERMINACIÓN	10/05/2024
OBJETO PROYECTO:	"CONSTRUCCION BOVEDAS Y OSARIOS EN EL CEMENTERIO DEL MUNICIPIO DE PUERTO LOPEZ - META"		
CONTRATISTA :	UNION TEMPORAL CEMENTERIOS 2024		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	100-103-13-09-00001-2024		
INTERVENTORÍA:	ING. MARYLIN PAOLA FONSECA CRUZ		
ACTA:	Pago Final, Liquidación del 18 de junio de 2024		
PERIODO DE CORTE DE LA PRESENTE ACTA	01/04/2024 al 10/05/2024		

CAPITULO:	CONSTRUCCION DE BOVEDAS	
N° ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
1,02	DESCAPOTE MANUAL H=8.15 M CON TRASIEGO DE MATERIAL SOBRANTE	M3

DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES				
	ANCHO	ALTO	LONGITUD	CANTIDAD	TOTAL
DESCAPOTE MANUAL AREA DE LAS BOVEDAS	2.50	N/A	7,15	1.00	17,88
PASAN:				SUBTOTAL	17,88
				TOTAL	17,88

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA



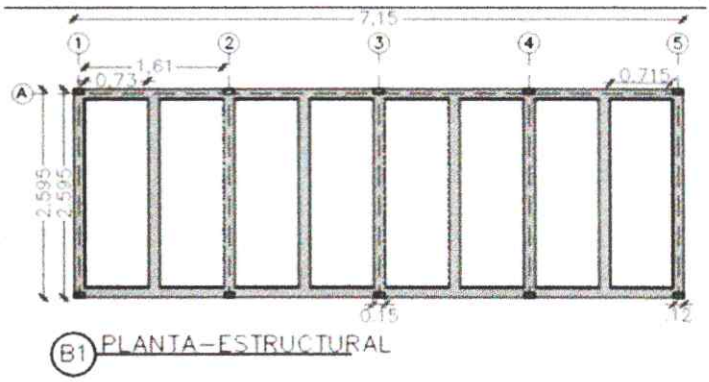

B1 PLANTA–ESTRUCTURAL

Firma
Nombre: ERIKA LORENA LEGMES AGUIRRE
Representante Legal
Contratista

Firma
Nombre: MARYLIN PAOLA FONSECA CRUZ
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
SUPERVISORA

Firma
Nombre: JUAN CARLOS PALACIOS MOLINA
RESIDENTE DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 52202-084671

Firma
Nombre:
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional:

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

	MEMORIA DE CALCULO OBRA	Código: F - 260
ALCALDIA PUERTO LOPEZ		Versión: 002
		Fecha: Enero de 2021

CONTRATO N°	100-103-13-09-00001-2024	PROYECTO N°	
FECHA DE INICIO:	1/04/2024	FECHA DE TERMINACIÓN	10/05/2024
OBJETO PROYECTO:	"CONSTRUCCION BOVEDAS Y OSARIOS EN EL CEMENTERIO DEL MUNICIPIO DE PUERTO LOPEZ - META"		
CONTRATISTA :	UNION TEMPORAL CEMENTERIOS 2024		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	100-103-13-09-00001-2024		
INTERVENTORÍA:	ING. MARYLIN PAOLA FONSECA CRUZ		


ACTA:	**Pago Final, Liquidación del 18 de junio de 2024**
PERIODO DE CORTE DE LA PRESENTE ACTA	**01/04/2024 al 10/05/2024**

CAPITULO:	**CONSTRUCCION DE BOVEDAS**	
N° ÍTEM	**DESCRIPCIÓN**	**UNIDAD**
1,03	SOLDADO,LIMPIEZA DE CONCRETO 13,8 MP a (2000PSI)	M3

DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES				
	ANCHO	ALTO	LONGITUD	CANTIDAD	TOTAL
SOLADO LONGITUDINAL EJE 1 (A-I)	0,15	0,03	7.00	1.00	0,03
SOLADO LONGITUDINAL EJE 2 (A-I)	0,15	0,03	7.00	1.00	0,03
SOLADO TRASNVERSAL A (1-2)	0,15	0,03	2,62	1.00	0,01
SOLADO TRASNVERSAL B (1-2)	0,15	0,03	2,62	1.00	0,01
SOLADO TRASNVERSAL C (1-2)	0,15	0,03	2,62	1.00	0,01
SOLADO TRASNVERSAL D (1-2)	0,15	0,03	2,62	1.00	0,01
SOLADO TRASNVERSAL E (1-2)	0,15	0,03	2,62	1.00	0,01
SOLADO TRASNVERSAL F (1-2)	0,15	0,03	2,62	1.00	0,01
SOLADO TRASNVERSAL G (1-2)	0,15	0,03	2,62	1.00	0,01
SOLADO TRASNVERSAL H (1-2)	0,15	0,03	2,62	1.00	0,01
SOLADO TRASNVERSAL I (1-2)	0,15	0,03	2,62	1.00	0,01
PASAN:				SUBTOTAL	0,15
				TOTAL	0,15

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA





(B1) PLANTA-ESTRUCTURAL



Firma
Nombre: ERIKA LORENA LESMES AGUIRRE
Representante Legal
Contratista

Firma
Nombre: JUAN CARLOS PALACIOS MOLINA
RESIDENTE DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 52202-084671

Firma
Nombre: MARYLIN PAOLA FONSECA CRUZ
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
SUPERVISORA

Firma
Nombre:
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional:

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

ALCALDÍA PUERTO LÓPEZ	MEMORIA DE CALCULO OBRA	Código: F - 260 Versión: 002 Fecha: Enero de 2021


CONTRATO N°	100-103-13-09-00001-2024	PROYECTO N°	
FECHA DE INICIO:	1/04/2024	FECHA DE TERMINACIÓN	10/05/2024
OBJETO PROYECTO:	"CONSTRUCCION BOVEDAS Y OSARIOS EN EL CEMENTERIO DEL MUNICIPIO DE PUERTO LOPEZ - META"		
CONTRATISTA :	UNION TEMPORAL CEMENTERIOS 2024		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	100-103-13-09-00001-2024		
INTERVENTORÍA:	ING. MARYLIN PAOLA FONSECA CRUZ		
ACTA:	**Pago Final, Liquidación del 18 de junio de 2024**		
PERIODO DE CORTE DE LA PRESENTE ACTA	**01/04/2024 al 10/05/2024**		


CAPITULO:	**CONSTRUCCION DE BOVEDAS**	
N° ÍTEM	**DESCRIPCIÓN**	**UNIDAD**
1,04	VIGA EN CONCRETO 20,07 Mpa (3000PSI) MEZCLA EN OBRA, SUMINISTRO Y CONSTRUCCION	M3

DESCRIPCIÓN	**DIMENSIONES**				
	ANCHO	**ALTO**	**LONGITUD**	**CANTIDAD**	**TOTAL**
VIGA LONGITUDINAL 1 (A-I)	0,15	0,25	7.00	1.00	0,26
VIGA LONGITUDINAL 2 (A-I)	0,15	0,25	7.00	1.00	0,26
VIGA TRANSVERSAL A (1-2)	0,15	0,25	2,62	1.00	0.10
VIGA TRANSVERSAL B (1-2)	0,15	0,25	2,62	1.00	0.11
VIGA TRANSVERSAL C (1-2)	0,15	0,25	2,62	1.00	0.12
VIGA TRANSVERSAL D (1-2)	0,15	0,25	2,62	1.00	0.13
VIGA TRANSVERSAL E (1-2)	0,15	0,25	2,62	1.00	0.14
VIGA TRANSVERSAL F (1-2)	0,15	0,25	2,62	1.00	0.15
VIGA TRANSVERSAL G (1-2)	0,15	0,25	2,62	1.00	0.16
VIGA TRANSVERSAL H (1-2)	0,15	0,25	2,62	1.00	0.17
VIGA TRANSVERSAL I (1-2)	0,15	0,25	2,62	1.00	0.18
PASAN:				**SUBTOTAL**	1,42
				TOTAL	1,42

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA







Firma
Nombre: ERIKA LORENA LESMES AGUIRRE
Representante Legal
Contratista

Firma
Nombre: JUAN CARLOS PALACIOS MOLINA
RESIDENTE DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 52202-084671

Firma
Nombre: MARYLIN PAOLA FONSECA CRUZ
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
SUPERVISORA

Firma
Nombre:
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional:

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

ALCALDÍA PUERTO LOPEZ	MEMORIA DE CALCULO OBRA	Código: F - 260 Versión: 002 Fecha: Enero de 2021

CONTRATO N°	100-103-13-09-00001-2024	PROYECTO N°	
FECHA DE INICIO:	1/04/2024	FECHA DE TERMINACIÓN	10/05/2024
OBJETO PROYECTO:	"CONSTRUCCION BOVEDAS Y OSARIOS EN EL CEMENTERIO DEL MUNICIPIO DE PUERTO LOPEZ - META"		
CONTRATISTA :	UNION TEMPORAL CEMENTERIOS 2024		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	100-103-13-09-00001-2024		
INTERVENTORÍA:	ING. MARYLIN PAOLA FONSECA CRUZ		
ACTA:	Pago Final, Liquidación del 18 de junio de 2024		
PERIODO DE CORTE DE LA PRESENTE ACTA	01/04/2024 al 10/05/2024		

CAPITULO:	CONSTRUCCION DE BOVEDAS	
N° ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
1.05	RELLENO CON MATERIAL MIXTO DE RÍO SIN PROCESAR TAMAÑO MAX. 2" SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN MANUAL CON EQUIPO LIVIANO	M3

DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES				
	ANCHO	ALTO	LONGITUD	CANTIDAD	TOTAL
RELLENO PARA NIVEL BOVEDA	0,73	0,28	2,22	8.00	3,63
PASAN:				SUBTOTAL	3,63
				TOTAL	3,63

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA







Firma
Nombre: ERIKA LORENA LESMES AGUIRRE
Representante Legal
Contratista

Firma
Nombre: MARYLIN PAOLA FONSECA CRUZ
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
SUPERVISORA

Firma
Nombre: JUAN CARLOS PALACIOS MOLINA
RESIDENTE DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 52202-084671

Firma
Nombre:
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional:

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

	MEMORIA DE CALCULO OBRA	Código: F - 260
ALCALDÍA PUERTO LÓPEZ		Versión: 002
		Fecha: Enero de 2021


CONTRATO N°	100-103-13-09-00001-2024	PROYECTO N°	
FECHA DE INICIO:	1/04/2024	FECHA DE TERMINACIÓN	10/05/2024
OBJETO PROYECTO:	"CONSTRUCCION BOVEDAS Y OSARIOS EN EL CEMENTERIO DEL MUNICIPIO DE PUERTO LOPEZ - META"		
CONTRATISTA :	UNION TEMPORAL CEMENTERIOS 2024		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	100-103-13-09-00001-2024		
INTERVENTORÍA:	ING. MARYLIN PAOLA FONSECA CRUZ		
ACTA:	Pago Final, Liquidación del 18 de junio de 2024		
PERIODO DE CORTE DE LA PRESENTE ACTA	01/04/2024 al 10/05/2024		

CAPITULO:	CONSTRUCCION DE BOVEDAS	
N° ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
1.06	COLUMNA EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3

DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES				
	ANCHO	ALTO	LONGITUD	CANTIDAD	TOTAL
COLUMNAS EJE A	0,15	2,33	0,15	2.00	0.10
COLUMNAS EJE B	0,15	2,33	0,15	2.00	0.10
COLUMNAS EJE C	0,15	2,33	0,15	2.00	0.10
COLUMNAS EJE D	0,15	2,33	0,15	2.00	0.10
COLUMNAS EJE E	0,15	2,33	0,15	2.00	0.10
COLUMNAS EJE F	0,15	2,33	0,15	2.00	0.10
COLUMNAS EJE G	0,15	2,33	0,15	2.00	0.10
COLUMNAS EJE H	0,15	2,33	0,15	2.00	0.10
COLUMNAS EJE I	0,15	2,33	0,15	2.00	0.10
PASAN:				SUBTOTAL	0.90
				TOTAL	0.90

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA



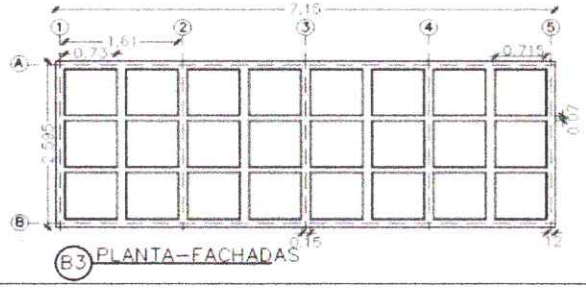



Firma
Nombre: ERIKA LORENA LESMES AGUIRRE
Representante Legal
Contratista

Firma
Nombre: MARYLIN PAOLA FONSECA CRUZ
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
SUPERVISORA

Firma
Nombre: JUAN CARLOS PALACIOS MOLINA
RESIDENTE DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 52202-084671

Firma
Nombre:
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional:

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

	MEMORIA DE CALCULO OBRA	Código: F - 260
ALCALDÍA PUERTO LOPEZ		Versión: 002
		Fecha: Enero de 2021

CONTRATO N°	**100-103-13-09-00001-2024**	**PROYECTO N°**	
FECHA DE INICIO:	1/04/2024	FECHA DE TERMINACIÓN	10/05/2024
OBJETO PROYECTO:	"CONSTRUCCION BOVEDAS Y OSARIOS EN EL CEMENTERIO DEL MUNICIPIO DE PUERTO LOPEZ - META"		
CONTRATISTA :	UNION TEMPORAL CEMENTERIOS 2024		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	100-103-13-09-00001-2024		
INTERVENTORÍA:	ING. MARYLIN PAOLA FONSECA CRUZ		
ACTA:	**Pago Final, Liquidación del 18 de junio de 2024**		
PERIODO DE CORTE DE LA PRESENTE ACTA	**01/04/2024 al 10/05/2024**		

CAPITULO:	**CONSTRUCCION DE BOVEDAS**	
N° ÍTEM	**DESCRIPCIÓN**	**UNIDAD**
1.07	ACERO DE REFUERZO FY=4200 MPa (4200 KG/CM2, G60) INCLUYE SUMINISTRO, FIGURADO, ARMADO, COLOCACIÓN Y AMARRE.	KG

DESCRIPCIÓN	**DIMENSIONES**				
	ANCHO	**KG/ML**	**LONGITUD**	**CANTIDAD**	**TOTAL**
ACERO EJE VIGA 1 (A-I)	N/A	0,994	7.40	4.00	29,42
ACERO EJE VIGA 2 (A-I)	N/A	0,994	7.40	4.00	29,42
ACERO EJE VIGA (A,B,C,D,E,F,G,H,I) (1-2)	N/A	0,994	2,75	36.00	98,41
ACERO VIGAS EJES (1-2) TRANSVERSAL	N/A	0.560	0,72	88.00	35,48
ACERO VIGAS EJES (A,B,C,D,E,F,G,H,I) TRANSVERSAL	N/A	0.560	0,72	126.00	50.80
ACERO REFUERZO COLUMNAS LONGITUDINAL	N/A	0,994	3,01	40.00	119,58
ACERO REFUERZO COLUMNAS TRANSVERSAL	N/A	0.560	0,38	180.00	38.30
PASAN:				**SUBTOTAL**	401,51
				TOTAL	401,51

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA





Firma
Nombre: ERIKA LORENA LESMES AGUIRRE
Representante Legal
Contratista

Firma
Nombre: JUAN CARLOS PALACIOS MOLINA
RESIDENTE DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 52202-084671

Firma
Nombre: MARYLIN PAOLA FONSECA CRUZ
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
SUPERVISORA

Firma
Nombre:
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional:

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.


	MEMORIA DE CALCULO OBRA	Código: F - 260
ALCALDIA PUERTO LOPEZ		Versión: 002
		Fecha: Enero de 2021


CONTRATO N°	100-103-13-09-00001-2024	PROYECTO N°	
FECHA DE INICIO:	1/04/2024	FECHA DE TERMINACIÓN	10/05/2024
OBJETO PROYECTO:	"CONSTRUCCION BOVEDAS Y OSARIOS EN EL CEMENTERIO DEL MUNICIPIO DE PUERTO LOPEZ - META"		
CONTRATISTA :	UNION TEMPORAL CEMENTERIOS 2024		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	100-103-13-09-00001-2024		
INTERVENTORÍA:	ING. MARYLIN PAOLA FONSECA CRUZ		
ACTA:	Pago Final, Liquidación del 18 de junio de 2024		
PERIODO DE CORTE DE LA PRESENTE ACTA	01/04/2024 al 10/05/2024		

CAPITULO:	CONSTRUCCION DE BOVEDAS	
N° ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
1,08	MURO EN BLOQUE FLEXA No. 5, 0.12X0.20X0.30 M (MORTERO TIPO S 1:4)	M2

DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES				
	ANCHO	ALTO	LONGITUD	CANTIDAD	TOTAL
MUROS NIVEL	N/A	0,73	2,22	9.00	14,59
MUROS NIVEL	N/A	0,73	2,22	9.00	14,59
MUROS NIVEL	N/A	0,73	2,22	9.00	14,59
MUROS NIVEL	N/A	0,73	1,61	4.00	4.70
MUROS NIVEL	N/A	0,73	1,61	4.00	4.70
MUROS NIVEL	N/A	0,73	1,61	4.00	4.70
PASAN:				SUBTOTAL	57,87
				TOTAL	57,87

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA

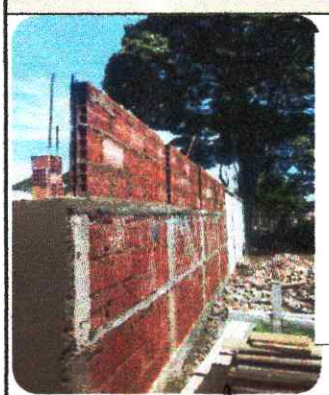

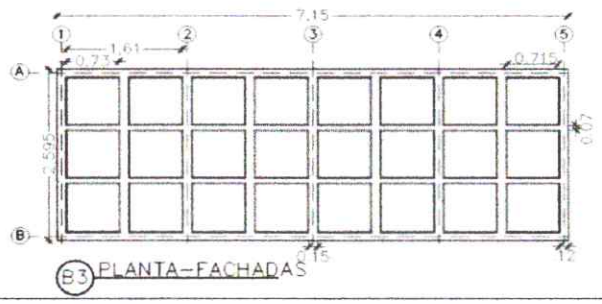



Firma
Nombre: ERIKA LORENA LESMES AGUIRRE
Representante Legal
Contratista

Firma
Nombre: MARYLIN PAOLA FONSECA CRUZ
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
SUPERVISORA

Firma
Nombre: JUAN CARLOS PALACIOS MOLINA
RESIDENTE DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 52202-084671

Firma
Nombre:
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional:

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

ALCALDÍA PUERTO LÓPEZ	MEMORIA DE CALCULO OBRA	Código: F - 260
		Versión: 002
		Fecha: Enero de 2021


CONTRATO N°	100-103-13-09-00001-2024	PROYECTO N°	
FECHA DE INICIO:	1/04/2024	FECHA DE TERMINACIÓN	10/05/2024
OBJETO PROYECTO:	"CONSTRUCCION BOVEDAS Y OSARIOS EN EL CEMENTERIO DEL MUNICIPIO DE PUERTO LOPEZ - META"		
CONTRATISTA :	UNION TEMPORAL CEMENTERIOS 2024		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	100-103-13-09-00001-2024		
INTERVENTORÍA:	ING. MARYLIN PAOLA FONSECA CRUZ		
ACTA:	Pago Final, Liquidación del 18 de junio de 2024		
PERIODO DE CORTE DE LA PRESENTE ACTA	01/04/2024 al 10/05/2024		

CAPITULO:	CONSTRUCCION DE BOVEDAS	
N° ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
1,09	PLACA DE CONTRAPISO EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3

DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES				
	ANCHO	ALTO	LONGITUD	CANTIDAD	TOTAL
PLACA NIVEL 0,00-0,07	2.50	0,07	7,15	1.00	1,25
PASAN:				SUBTOTAL	1,25
				TOTAL	1,25

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA



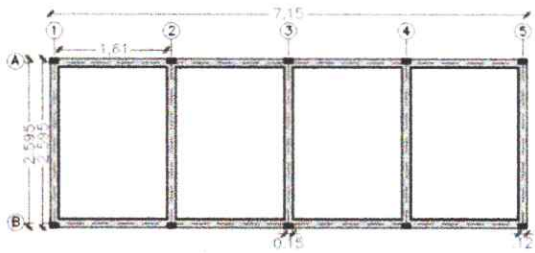



Firma
Nombre: ERIKA LORENA LESMES AGUIRRE
Representante Legal
Contratista

Firma
Nombre: MARYLIN PAOLA FONSECA CRUZ
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
SUPERVISORA

Firma
Nombre: JUAN CARLOS PALACIOS MOLINA
RESIDENTE DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 52202-084671

Firma
Nombre:
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional:

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

	MEMORIA DE CALCULO OBRA	Código: F - 260
ALCALDIA PUERTO LOPEZ		Versión: 002
		Fecha: Enero de 2021


CONTRATO N°	100-103-13-09-00001-2024	PROYECTO N°	
FECHA DE INICIO:	1/04/2024	FECHA DE TERMINACIÓN	10/05/2024
OBJETO PROYECTO:	"CONSTRUCCION BOVEDAS Y OSARIOS EN EL CEMENTERIO DEL MUNICIPIO DE PUERTO LOPEZ - META"		
CONTRATISTA :	UNION TEMPORAL CEMENTERIOS 2024		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	100-103-13-09-00001-2024		
INTERVENTORÍA:	ING. MARYLIN PAOLA FONSECA CRUZ		


ACTA:	**Pago Final, Liquidación del 18 de junio de 2024**
PERIODO DE CORTE DE LA PRESENTE ACTA	**01/04/2024 al 10/05/2024**

CAPITULO:	**CONSTRUCCION DE BOVEDAS**	
N° ÍTEM	**DESCRIPCIÓN**	**UNIDAD**
1.10	PLACA DE ENTREPISO MACIZA EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3

DESCRIPCIÓN	**DIMENSIONES**				
	ANCHO	**ALTO**	**LONGITUD**	**CANTIDAD**	**TOTAL**
PLACA NIVEL 0,74- 0,81	2.50	0,07	7,15	1.00	1,25
PLACA NIVEL 1,48-1,55	2.50	0,07	7,15	1.00	1,25
PLACA NIVEL 2,22-2,29	2.70	0,07	7,15	1.00	1,35
PASAN:				SUBTOTAL	3,85
				TOTAL	3,85

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA

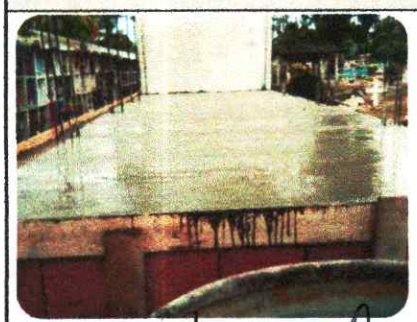





Firma
Nombre: ERIKA LORENA LESMES AGUIRRE
Representante Legal
Contratista

Firma
Nombre: JUAN CARLOS PALACIOS MOLINA
RESIDENTE DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 52202-084671

Firma
Nombre: MARYLIN PAOLA FONSECA CRUZ
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
SUPERVISORA

Firma
Nombre:
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional:

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

ALCALDIA PUERTO LOPEZ	**MEMORIA DE CALCULO OBRA**	**Código: F - 260** Versión: 002 Fecha: Enero de 2021

CONTRATO N°	100-103-13-09-00001-2024	**PROYECTO N°**	
FECHA DE INICIO:	1/04/2024	FECHA DE TERMINACIÓN	10/05/2024
OBJETO PROYECTO:	"CONSTRUCCION BOVEDAS Y OSARIOS EN EL CEMENTERIO DEL MUNICIPIO DE PUERTO LOPEZ - META"		
CONTRATISTA :	UNION TEMPORAL CEMENTERIOS 2024		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	100-103-13-09-00001-2024		
INTERVENTORÍA:	ING. MARYLIN PAOLA FONSECA CRUZ		
ACTA:	**Pago Final, Liquidación del 18 de junio de 2024**		
PERIODO DE CORTE DE LA PRESENTE ACTA	**01/04/2024 al 10/05/2024**		

CAPITULO:	**CONSTRUCCION DE BOVEDAS**	
N° ÍTEM	**DESCRIPCIÓN**	**UNIDAD**
1,11	MALLA ELECTROSOLDADA FY=5000 KG/CM2, 500 MPA. FIGURADO, ARMADO, COLOCACIÓN Y AMARRE. SUMINISTRO E INSTALACIÓN	KG

DESCRIPCIÓN	**DIMENSIONES**				
	ANCHO	**KG/M2**	**LONGITUD**	**CANTIDAD**	**TOTAL**
MALLA ELECROSOLDADA XX-131 PLACAS NIVEL 0,74-0,81	2.50	2,078	7,15	1.00	37,14
MALLA ELECROSOLDADA XX-131 PLACAS NIVEL 1,48-1,55	2.50	2,078	7,15	1.00	37,14
MALLA ELECROSOLDADA XX-131 PLACAS NIVEL 2,22-2,29	2.70	2,078	7,15	1.00	40,12
MALLA ELECROSOLDADA XX-131 PLACAS NIVEL 0,00-0,07	2.50	2,078	7,15	1.00	37,14
PASAN:				**SUBTOTAL**	151,54
				TOTAL	151,54

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA





Firma
Nombre: ERIKA LORENA LESMES AGUIRRE
Representante Legal
Contratista

Firma
Nombre: JUAN CARLOS PALACIOS MOLINA
RESIDENTE DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 52202-084671

Firma
Nombre: MARYLIN PAOLA FONSECA CRUZ
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
SUPERVISORA

Firma
Nombre:
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional:

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

ALCALDÍA PUERTO LOPEZ	MEMORIA DE CALCULO OBRA	Código: F - 260
		Versión: 002
		Fecha: Enero de 2021

CONTRATO N°	100-103-13-09-00001-2024	PROYECTO N°	
FECHA DE INICIO:	1/04/2024	FECHA DE TERMINACIÓN	10/05/2024
OBJETO PROYECTO:	"CONSTRUCCION BOVEDAS Y OSARIOS EN EL CEMENTERIO DEL MUNICIPIO DE PUERTO LOPEZ - META"		
CONTRATISTA :	UNION TEMPORAL CEMENTERIOS 2024		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	100-103-13-09-00001-2024		
INTERVENTORÍA:	ING. MARYLIN PAOLA FONSECA CRUZ		

ACTA:	**Pago Final, Liquidación del 18 de junio de 2024**
PERIODO DE CORTE DE LA PRESENTE ACTA	**01/04/2024 al 10/05/2024**

CAPITULO:	**CONSTRUCCION DE BOVEDAS**	
N° ÍTEM	**DESCRIPCIÓN**	**UNIDAD**
1.12	PAÑETE MURO EXTERIOR Y CULATAS MORTERO 1:4 IMPERMEABILIZADO. SUMINISTRO Y APLICACIÓN.	M2

DESCRIPCIÓN	**DIMENSIONES**				
	ANCHO	**ALTO**	**LONGITUD**	**CANTIDAD**	**TOTAL**
MUROS LATERALES	2.50	2,47	N/A	2.00	12,35
MUROS POSTERIORES	7,15	2,47	N/A	1.00	17,66
PASAN:				SUBTOTAL	30,01
				TOTAL	30,01

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA



Firma
Nombre: ERIKA LORENA LESMES AGUIRRE
Representante Legal
Contratista

Firma
Nombre: JUAN CARLOS PALACIOS MOLINA
RESIDENTE DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 52202-084671

Firma
Nombre: MARYLIN PAOLA FONSECA CRUZ
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
SUPERVISORA

Firma
Nombre:
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional:

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.


	MEMORIA DE CALCULO OBRA	Código: F - 260
ALCALDÍA PUERTO LOPEZ		Versión: 002
		Fecha: Enero de 2021


CONTRATO N°	100-103-13-09-00001-2024	PROYECTO N°	
FECHA DE INICIO:	1/04/2024	FECHA DE TERMINACIÓN	10/05/2024
OBJETO PROYECTO:	"CONSTRUCCION BOVEDAS Y OSARIOS EN EL CEMENTERIO DEL MUNICIPIO DE PUERTO LOPEZ - META"		
CONTRATISTA :	UNION TEMPORAL CEMENTERIOS 2024		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	100-103-13-09-00001-2024		
INTERVENTORÍA:	ING. MARYLIN PAOLA FONSECA CRUZ		
ACTA:	**Pago Final, Liquidación del 18 de junio de 2024**		
PERIODO DE CORTE DE LA PRESENTE ACTA	**01/04/2024 al 10/05/2024**		

CAPITULO:	**CONSTRUCCION DE BOVEDAS**	
N° ÍTEM	**DESCRIPCIÓN**	**UNIDAD**
1,13	PAÑETE MUROS INTERIORES MORTERO 1:4 SOBRE MALLA CON VENA. INCLUYE FILOS Y DILATACIONES. SUMINISTRO Y APLICACIÓN.	M2

DESCRIPCIÓN	**DIMENSIONES**				
	ANCHO	**ALTO**	**LONGITUD**	**CANTIDAD**	**TOTAL**
MUROS NIVEL 0,07-0,74 (1-2) EJES (A,B,C,D,E,F,G,H,I)	N/A	0,73	2,22	16.00	25,93
MUROS NIVEL 0,81-1,48 (1-2) EJES (A,B,C,D,E,F,G,H,I)	N/A	0,73	2,22	16.00	25,93
MUROS NIVEL 1,55-2,22 (1-2) EJES (A,B,C,D,E,F,G,H,I)	N/A	0,73	2,22	16.00	25,93
MUROS NIVEL 0,07-0,74 (A-I) EJE (1-2)	N/A	0,73	0,73	8.00	4,26
MUROS NIVEL 0,81-1,48 (A-I) EJE (1-2)	N/A	0,73	0,73	8.00	4,26
MUROS NIVEL1,55-2,22 (A-I) EJE (1-2)	N/A	0,73	0,73	8.00	4,26
PASAN:				**SUBTOTAL**	90,57
				TOTAL	90,57

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA

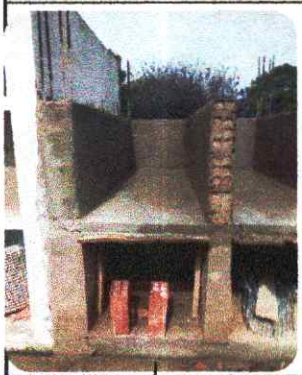

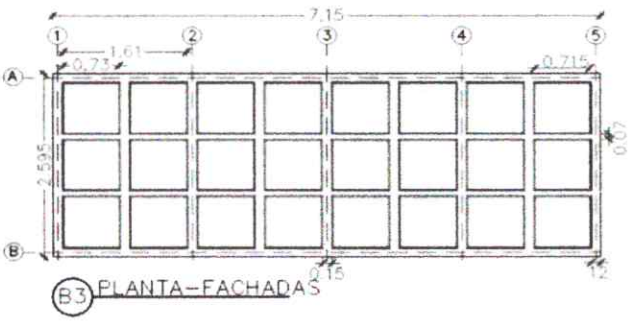



Firma
Nombre: ERIKA LORENA LESMES AGUIRRE
Representante Legal
Contratista

Firma
Nombre: JUAN CARLOS PALACIOS MOLINA
RESIDENTE DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 52202-084671

Firma
Nombre: MARYLIN PAOLA FONSECA CRUZ
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
SUPERVISORA

Firma
Nombre:
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional:

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

ALCALDIA PUERTO LOPEZ	MEMORIA DE CALCULO OBRA	Código: F - 260 Versión: 002 Fecha: Enero de 2021


CONTRATO N°	100-103-13-09-00001-2024	PROYECTO N°	
FECHA DE INICIO:	1/04/2024	FECHA DE TERMINACIÓN	10/05/2024
OBJETO PROYECTO:	"CONSTRUCCION BOVEDAS Y OSARIOS EN EL CEMENTERIO DEL MUNICIPIO DE PUERTO LOPEZ - META"		
CONTRATISTA :	UNION TEMPORAL CEMENTERIOS 2024		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	100-103-13-09-00001-2024		
INTERVENTORÍA:	ING. MARYLIN PAOLA FONSECA CRUZ		
ACTA:	**Pago Final, Liquidación del 18 de junio de 2024**		
PERIODO DE CORTE DE LA PRESENTE ACTA	**01/04/2024 al 10/05/2024**		

CAPITULO:	**CONSTRUCCION DE BOVEDAS**	
N° ÍTEM	**DESCRIPCIÓN**	**UNIDAD**
1,14	PINTURA VINILO T. CORAZA EXTERIOR 3 MANOS	M2

DESCRIPCIÓN	**DIMENSIONES**				
	ANCHO	**ALTO**	**LONGITUD**	**CANTIDAD**	**TOTAL**
MUROS LATERALES	2.50	2,47	N/A	2.00	12,35
MUROS POSTERIORES	7,15	2,47	N/A	1.00	17,66
CARA SUPERIOR PLACA SUPERIOR	7,15	N/A	2.70	1.00	19,31
PINTURA AREAS FRONTALES	N/A	0,07	7,15	4.00	2.00
	0,15	0,73	N/A	27.00	2,96
PINTURA VIGA DE CIMENTACION SOBRE NIVEL 0,00	N/A	0.10	7,15	2.00	1,43
	N/A	0.10	2.50	2.00	0.50
PASAN:				**SUBTOTAL**	56,21
				TOTAL	56,21

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA



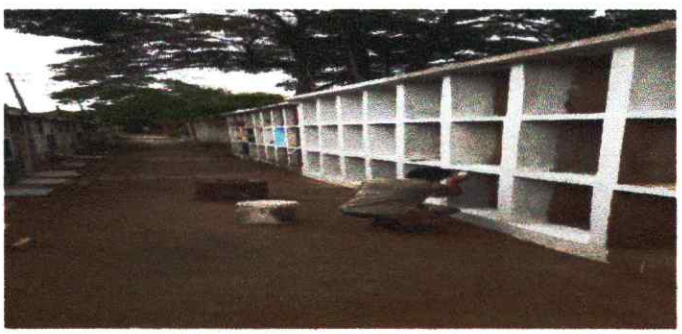

Firma
Nombre: ERIKA LORENA LESMES AGUIRRE
Representante Legal
Contratista

Firma
Nombre: MARYLIN PAOLA FONSECA CRUZ
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
SUPERVISORA

Firma
Nombre: JUAN CARLOS PALACIOS MOLINA
RESIDENTE DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 52202-084671

Firma
Nombre:
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional:

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

ALCALDÍA PUERTO LÓPEZ	**MEMORIA DE CALCULO OBRA**	**Código: F - 260** Versión: 002 Fecha: Enero de 2021

CONTRATO N°	100-103-13-09-00001-2024	**PROYECTO N°**	
FECHA DE INICIO:	1/04/2024	FECHA DE TERMINACIÓN	10/05/2024
OBJETO PROYECTO:	"CONSTRUCCION BOVEDAS Y OSARIOS EN EL CEMENTERIO DEL MUNICIPIO DE PUERTO LOPEZ - META"		
CONTRATISTA :	UNION TEMPORAL CEMENTERIOS 2024		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	100-103-13-09-00001-2024		
INTERVENTORÍA:	ING. MARYLIN PAOLA FONSECA CRUZ		
ACTA:	**Pago Final, Liquidación del 18 de junio de 2024**		
PERIODO DE CORTE DE LA PRESENTE ACTA	**01/04/2024 al 10/05/2024**		

CAPITULO:	**CONSTRUCCION OSARIOS**	
N° ÍTEM	**DESCRIPCIÓN**	**UNIDAD**
2,01	DESMONTE DE ESTRUCTURA METALICA DE CUBIERTA. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO.	M2

DESCRIPCIÓN	**DIMENSIONES**				
	ANCHO	**ALTO**	**LONGITUD**	**CANTIDAD**	**TOTAL**
DESMONTE ESTRUCTURA METALICA	2,20	N/A	10,00	1,0	22,00
PASAN:				**SUBTOTAL**	22.00
				TOTAL	22,00

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA





Firma
Nombre: ERIKA LORENA LESMES AGUIRRE
Representante Legal
Contratista

Firma
Nombre: MARYLIN PAOLA FONSECA CRUZ
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
SUPERVISORA

Firma
Nombre: JUAN CARLOS PALACIOS MOLINA
RESIDENTE DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 52262-084671

Firma
Nombre:
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional:

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

ALCALDÍA PUERTO LOPEZ	**MEMORIA DE CALCULO OBRA**	**Código: F - 260** Versión: 002 Fecha: Enero de 2021

CONTRATO N°	**100-103-13-09-00001-2024**	**PROYECTO N°**	
FECHA DE INICIO:	1/04/2024	FECHA DE TERMINACIÓN	10/05/2024
OBJETO PROYECTO:	"CONSTRUCCION BOVEDAS Y OSARIOS EN EL CEMENTERIO DEL MUNICIPIO DE PUERTO LOPEZ - META"		
CONTRATISTA :	UNION TEMPORAL CEMENTERIOS 2024		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	100-103-13-09-00001-2024		
INTERVENTORÍA:	ING. MARYLIN PAOLA FONSECA CRUZ		

ACTA:	**Pago Final, Liquidación del 18 de junio de 2024**
PERIODO DE CORTE DE LA PRESENTE ACTA	**01/04/2024 al 10/05/2024**

CAPITULO:	**CONSTRUCCION OSARIOS**	
N° ÍTEM	**DESCRIPCIÓN**	**UNIDAD**
2,02	DESMONTE DE TEJA ARQUITECTONICA COLOR AZUL. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO	M2

DESCRIPCIÓN	**DIMENSIONES**				
	ANCHO	**ALTO**	**LONGITUD**	**CANTIDAD**	**TOTAL**
DESMONTE CUBIERTA EN TEJA ARQUITECTONICA	**2.20**	**N/A**	**10.00**	**1.00**	**22.00**
PASAN:				**SUBTOTAL**	**22.00**
				TOTAL	**22,00**

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA





Firma
Nombre: ERIKA LORENA LESMES AGUIRRE
Representante Legal
Contratista

Firma
Nombre: MARYLIN PAOLA FONSECA CRUZ
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
SUPERVISORA

Firma
Nombre: JUAN CARLOS PALACIOS MOLINA
RESIDENTE DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 52202-084671

Firma
Nombre:
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional:

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

ALCALDÍA PUERTO LOPEZ	MEMORIA DE CALCULO OBRA	Código: F - 260 Versión: 002 Fecha: Enero de 2021

CONTRATO N°	100-103-13-09-00001-2024	PROYECTO N°	
FECHA DE INICIO:	1/04/2024	FECHA DE TERMINACIÓN	10/05/2024
OBJETO PROYECTO:	"CONSTRUCCION BOVEDAS Y OSARIOS EN EL CEMENTERIO DEL MUNICIPIO DE PUERTO LOPEZ - META"		
CONTRATISTA :	UNION TEMPORAL CEMENTERIOS 2024		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	100-103-13-09-00001-2024		
INTERVENTORÍA:	ING. MARYLIN PAOLA FONSECA CRUZ		
ACTA:	Pago Final, Liquidación del 18 de junio de 2024		
PERIODO DE CORTE DE LA PRESENTE ACTA	01/04/2024 al 10/05/2024		

CAPITULO:	CONSTRUCCION OSARIOS	
N° ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
2,03	DEMOLICION CONCRETO SIMPLE. INCLUYE TRASIEGO Y CARGUE MANUAL	M3

DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES				
	ANCHO	ALTO	LONGITUD	CANTIDAD	TOTAL
DEMOLICIÓN PLACA PARA PEDESTALES	0.20	0.20	0.20	3.00	12.00
PASAN:				SUBTOTAL	12.00
				TOTAL	12.00

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA





Firma
Nombre: ERIKA LORENA LESMES AGUIRRE
Representante Legal
Contratista

Firma
Nombre: MARYLIN PAOLA FONSECA CRUZ
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
SUPERVISORA

Firma
Nombre: JUAN CARLOS PALACIOS MOLINA
RESIDENTE DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 52202-084671

Firma
Nombre:
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional:

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

	MEMORIA DE CALCULO OBRA	Código: F - 260
ALCALDÍA PUERTO LOPEZ		Versión: 002
		Fecha: Enero de 2021

CONTRATO N°	100-103-13-09-00001-2024	PROYECTO N°	
FECHA DE INICIO:	1/04/2024	FECHA DE TERMINACIÓN	10/05/2024
OBJETO PROYECTO:	"CONSTRUCCION BOVEDAS Y OSARIOS EN EL CEMENTERIO DEL MUNICIPIO DE PUERTO LOPEZ - META"		
CONTRATISTA :	UNION TEMPORAL CEMENTERIOS 2024		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	100-103-13-09-00001-2024		
INTERVENTORÍA:	ING. MARYLIN PAOLA FONSECA CRUZ		
ACTA:	Pago Final, Liquidación del 18 de junio de 2024		
PERIODO DE CORTE DE LA PRESENTE ACTA	01/04/2024 al 10/05/2024		

CAPITULO:	CONSTRUCCION OSARIOS	
N° ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
2,04	MURO EN BLOQUE FLEXA No. 4 0.10X0.20X0.30 M(MORTERO TIPO S 1:3)	M2

DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES				
	ANCHO	ALTO	LONGITUD	CANTIDAD	TOTAL
MUROS SEPARACION DE OSARIOS	0.80	0,35		21.00	5,88
		0,35	10.00	1.00	3.50
		0.60	10.00	1.00	6.00
PASAN:				SUBTOTAL	15,38
				TOTAL	15,38

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA





Firma
Nombre: ERIKA LORENA LESMES AGUIRRE
Representante Legal
Contratista

Firma
Nombre: MARYLIN PAOLA FONSECA CRUZ
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
SUPERVISORA

Firma
Nombre: JUAN CARLOS PALACIOS MOLINA
RESIDENTE DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 52202-084671

Firma
Nombre:
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional:

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

ALCALDÍA PUERTO LOPEZ	**MEMORIA DE CALCULO OBRA**	**Código: F - 260** Versión: 002 Fecha: Enero de 2021

CONTRATO N°	**100-103-13-09-00001-2024**	**PROYECTO N°**	
FECHA DE INICIO:	1/04/2024	FECHA DE TERMINACIÓN	10/05/2024
OBJETO PROYECTO:	"CONSTRUCCION BOVEDAS Y OSARIOS EN EL CEMENTERIO DEL MUNICIPIO DE PUERTO LOPEZ - META"		
CONTRATISTA :	UNION TEMPORAL CEMENTERIOS 2024		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	100-103-13-09-00001-2024		
INTERVENTORÍA:	ING. MARYLIN PAOLA FONSECA CRUZ		
ACTA:	**Pago Final, Liquidación del 18 de junio de 2024**		
PERIODO DE CORTE DE LA PRESENTE ACTA	**01/04/2024 al 10/05/2024**		

CAPITULO:	**CONSTRUCCION OSARIOS**	
N° ÍTEM	**DESCRIPCIÓN**	**UNIDAD**
2,05	PAÑETE MURO EXTERIOR Y CULATAS MORTERO 1:4 IMPERMEABILIZADO. SUMINISTRO Y APLICACIÓN	M2

DESCRIPCIÓN	**DIMENSIONES**				
	ANCHO	**ALTO**	**LONGITUD**	**CANTIDAD**	**TOTAL**
PAÑETE AREA EXTERIOR MURO CERRAMIENTO	N/A	0.60	10.00	1.00	6.00
PASAN:				**SUBTOTAL**	6.00
				TOTAL	6.00

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA



Firma
Nombre: ERIKA LORENA LESMES AGUIRRE
Representante Legal
Contratista

Firma
Nombre: MARYLIN PAOLA FONSECA CRUZ
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
SUPERVISORA

Firma
Nombre: JUAN CARLOS PALACIOS MOLINA
RESIDENTE DE OBRA
N° Matrícula Profesional 52202-084671

Firma
Nombre:
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional:

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.


ALCALDÍA PUERTO LÓPEZ	MEMORIA DE CALCULO OBRA	Código: F - 260 Versión: 002 Fecha: Enero de 2021

CONTRATO N°	100-103-13-09-00001-2024	PROYECTO N°	
FECHA DE INICIO:	1/04/2024	FECHA DE TERMINACIÓN	10/05/2024
OBJETO PROYECTO:	"CONSTRUCCION BOVEDAS Y OSARIOS EN EL CEMENTERIO DEL MUNICIPIO DE PUERTO LOPEZ - META"		
CONTRATISTA :	UNION TEMPORAL CEMENTERIOS 2024		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	100-103-13-09-00001-2024		
INTERVENTORÍA:	ING. MARYLIN PAOLA FONSECA CRUZ		
ACTA:	Pago Final, Liquidación del 18 de junio de 2024		
PERIODO DE CORTE DE LA PRESENTE ACTA	01/04/2024 al 10/05/2024		

CAPITULO:	CONSTRUCCION OSARIOS	
N° ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
2,06	PAÑETE MUROS INTERIORES MORTERO 1:4 SOBRE MALLA CON VENA. INCLUYE FILOS Y DILATACIONES. SUMINISTRO Y APLICACIÓN	M2

DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES				
	ANCHO	ALTO	LONGITUD	CANTIDAD	TOTAL
PAÑETE MUROS DIVISORIOS DE OSARIOS	0.80	0,35	N/A	41.00	11,48
PAÑETE AREA FONDO OSARIOS	0,35	0,35	N/A	20.00	2,45
PAÑETE AREA FRONTAL MUROS DIVISORIOS	0.10	0,35	N/A	21.00	0,74
PASAN:				SUBTOTAL	14,67
				TOTAL	14,67

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA

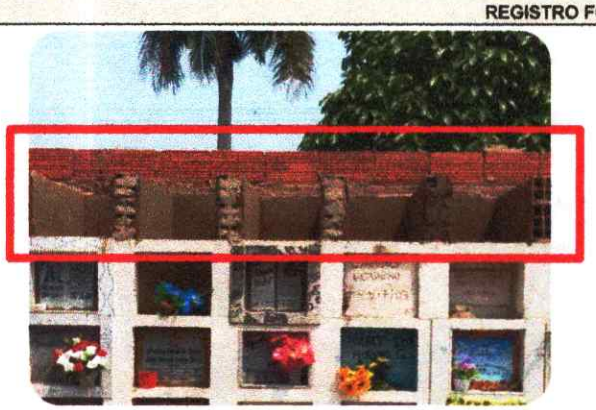



Firma
Nombre: ERIKA LORENA LESMES AGUIRRE
Representante Legal
Contratista

Firma
Nombre: MARYLIN PAOLA FONSECA CRUZ
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
SUPERVISORA

Firma
Nombre: JUAN CARLOS PALACIOS MOLINA
RESIDENTE DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 52202-084671

Firma
Nombre:
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional:

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

ALCALDÍA PUERTO LÓPEZ	MEMORIA DE CALCULO OBRA	Código: F - 260 Versión: 002 Fecha: Enero de 2021

CONTRATO N°	**100-103-13-09-00001-2024**	**PROYECTO N°**	
FECHA DE INICIO:	1/04/2024	FECHA DE TERMINACIÓN	10/05/2024
OBJETO PROYECTO:	"CONSTRUCCION BOVEDAS Y OSARIOS EN EL CEMENTERIO DEL MUNICIPIO DE PUERTO LOPEZ - META"		
CONTRATISTA :	UNION TEMPORAL CEMENTERIOS 2024		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	100-103-13-09-00001-2024		
INTERVENTORÍA:	ING. MARYLIN PAOLA FONSECA CRUZ		
ACTA:	**Pago Final, Liquidación del 18 de junio de 2024**		
PERIODO DE CORTE DE LA PRESENTE ACTA	**01/04/2024 al 10/05/2024**		

CAPITULO:	**CONSTRUCCION OSARIOS**	
N° ÍTEM	**DESCRIPCIÓN**	**UNIDAD**
2,07	PLACA DE ENTREPISO MACIZA EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3

DESCRIPCIÓN	**DIMENSIONES**				
	ANCHO	**ALTO**	**LONGITUD**	**CANTIDAD**	**TOTAL**
PLACA AREA SUPERIOR OSARIO	0.80	0.08	10.00	1.00	0,64
PASAN:				**SUBTOTAL**	0,64
				TOTAL	0,64

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA





Firma
Nombre: ERIKA LORENA LESMES AGUILERA
Representante Legal
Contratista

Firma
Nombre: MARYLIN PAOLA FONSECA CRUZ
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
SUPERVISORA

Firma
Nombre: JUAN CARLOS PALACIOS MOLINA
RESIDENTE DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 52202-084671

Firma
Nombre:
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional:

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

ALCALDÍA PUERTO LOPEZ	**MEMORIA DE CALCULO OBRA**	**Código: F - 260** Versión: 002 Fecha: Enero de 2021

CONTRATO N°	100-103-13-09-00001-2024	**PROYECTO N°**	
FECHA DE INICIO:	1/04/2024	FECHA DE TERMINACIÓN	10/05/2024
OBJETO PROYECTO:	"CONSTRUCCION BOVEDAS Y OSARIOS EN EL CEMENTERIO DEL MUNICIPIO DE PUERTO LOPEZ - META"		
CONTRATISTA :	UNION TEMPORAL CEMENTERIOS 2024		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	100-103-13-09-00001-2024		
INTERVENTORÍA:	ING. MARYLIN PAOLA FONSECA CRUZ		
ACTA:	**Pago Final, Liquidación del 18 de junio de 2024**		
PERIODO DE CORTE DE LA PRESENTE ACTA	**01/04/2024 al 10/05/2024**		

CAPITULO:	**CONSTRUCCION OSARIOS**	
N° ÍTEM	**DESCRIPCIÓN**	**UNIDAD**
2,08	MALLA ELECTROSOLDADA FY=5000 KG/CM2, 500 MPA. FIGURADO, ARMADO, COLOCACIÓN Y AMARRE. SUMINISTRO E INSTALACIÓN	KG

DESCRIPCIÓN	**DIMENSIONES**				
	ANCHO	**KG/M2**	**LONGITUD**	**CANTIDAD**	**TOTAL**
MALLA ELECTROSOLDADA XX-131 PLACA OSARIO	0.80	2,078	10.00	1.00	16,62
PASAN:				**SUBTOTAL**	16,62
				TOTAL	16,62

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA





Firma
Nombre: ERIKA LORENA LESMES AGUIRRE
Representante Legal
Contratista

Firma
Nombre: MARYLIN PAOLA FONSECA CRUZ
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
SUPERVISORA

Firma
Nombre: JUAN CARLOS PALACIOS MOLINA
RESIDENTE DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 52202-084671

Firma
Nombre:
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional:

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

ALCALDÍA PUERTO LOPEZ	MEMORIA DE CALCULO OBRA	Código: F - 260 Versión: 002 Fecha: Enero de 2021

CONTRATO N°	100-103-13-09-00001-2024	PROYECTO N°	
FECHA DE INICIO:	1/04/2024	FECHA DE TERMINACIÓN	10/05/2024
OBJETO PROYECTO:	"CONSTRUCCION BOVEDAS Y OSARIOS EN EL CEMENTERIO DEL MUNICIPIO DE PUERTO LOPEZ - META"		
CONTRATISTA :	UNION TEMPORAL CEMENTERIOS 2024		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	100-103-13-09-00001-2024		
INTERVENTORÍA:	ING. MARYLIN PAOLA FONSECA CRUZ		
ACTA:	Pago Final, Liquidación del 18 de junio de 2024		
PERIODO DE CORTE DE LA PRESENTE ACTA	01/04/2024 al 10/05/2024		

CAPITULO:	CONSTRUCCION OSARIOS	
N° ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
2,09	PEDESTALES EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3

DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES				
	ANCHO	ALTO	LONGITUD	CANTIDAD	TOTAL
PEDESTALES PERFILES	0.20	0.20	0.20	3.00	0,02
PASAN:				SUBTOTAL	0,02
				TOTAL	0,02

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA





Firma
Nombre: ERIKA LORENA LEGMES AGUIRRE
Representante Legal
Contratista

Firma
Nombre: MARYLIN PAOLA FONSECA CRUZ
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
SUPERVISORA

Firma
Nombre: JUAN CARLOS PALACIOS MOLINA
RESIDENTE DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 52202-084671

Firma
Nombre:
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional:

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

ALCALDIA PUERTO LOPEZ	MEMORIA DE CALCULO OBRA	Código: F - 260
		Versión: 002
		Fecha: Enero de 2021

CONTRATO N°	100-103-13-09-00001-2024	PROYECTO N°	
FECHA DE INICIO:	1/04/2024	FECHA DE TERMINACIÓN	10/05/2024
OBJETO PROYECTO:	"CONSTRUCCION BOVEDAS Y OSARIOS EN EL CEMENTERIO DEL MUNICIPIO DE PUERTO LOPEZ - META"		
CONTRATISTA :	UNION TEMPORAL CEMENTERIOS 2024		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	100-103-13-09-00001-2024		
INTERVENTORÍA:	ING. MARYLIN PAOLA FONSECA CRUZ		
ACTA:	Pago Final, Liquidación del 18 de junio de 2024		
PERIODO DE CORTE DE LA PRESENTE ACTA	01/04/2024 al 10/05/2024		

CAPITULO:	CONSTRUCCION OSARIOS	
N° ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
2,10	CORREA PERFIL RECTAN PHR NEGRO 80X40X2.0 MM CAL. 14	ML

DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES				
	ANCHO	ALTO	LONGITUD	CANTIDAD	TOTAL
PERFILES APOYO ESTRUCTURA CUBIERTA	N/A	2,8	N/A	3,00	8,40
PERFILES ESTRUCTURA CUBIERTA	N/A	N/A	1,95	2,00	3,90
	N/A	N/A	10,00	2,00	20,00
PASAN:				SUBTOTAL	32,30
				TOTAL	32.30

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA



Firma
Nombre: ERIKA LORENA LEGMES AGUIRRE
Representante Legal
Contratista

Firma
Nombre: MARYLIN PAOLA FONSECA CRUZ
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
SUPERVISORA

Firma
Nombre: JUAN CARLOS PALACIOS MOLINA
RESIDENTE DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 52202-084671

Firma
Nombre:
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional:

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

	MEMORIA DE CALCULO OBRA	Código: F - 260
ALCALDIA PUERTO LOPEZ		Versión: 002
		Fecha: Enero de 2021


CONTRATO N°	100-103-13-09-00001-2024	PROYECTO N°	
FECHA DE INICIO:	1/04/2024	FECHA DE TERMINACIÓN	10/05/2024
OBJETO PROYECTO:	"CONSTRUCCION BOVEDAS Y OSARIOS EN EL CEMENTERIO DEL MUNICIPIO DE PUERTO LOPEZ - META"		
CONTRATISTA :	UNION TEMPORAL CEMENTERIOS 2024		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	100-103-13-09-00001-2024		
INTERVENTORÍA:	ING. MARYLIN PAOLA FONSECA CRUZ		

ACTA:	**Pago Final, Liquidación del 18 de junio de 2024**
PERIODO DE CORTE DE LA PRESENTE ACTA	**01/04/2024 al 10/05/2024**

CAPITULO:	**CONSTRUCCION OSARIOS**	
N° ÍTEM	**DESCRIPCIÓN**	**UNIDAD**
2,11	PINTURA VINILO T. CORAZA EXTERIOR 3 MANOS	M2

DESCRIPCIÓN	**DIMENSIONES**				
	ANCHO	**ALTO**	**LONGITUD**	**CANTIDAD**	**TOTAL**
PINTURA MURO DIVISORIOS AREA EXTERIOR	0.80	0,35	N/A	1.00	0,28
PINTURA AREA FRONTAL MUROS DIVISORIOS	0.10	0,35	N/A	21.00	0,74
PINTURA AREA EXTERIOR MURO CERRAMIENTO	N/A	0.60	10.00	1.00	6.00
PINTURA PLACA AREA FRONTAL	N/A	0,06	10.00	1.00	0.60
PINTURA PLACA AREA LATERAL	N/A	0,06	0.80	1.00	0,05
PINTURA PLACA AREA SUPERIOR	0.80	N/A	10.00	1.00	8.00
PASAN:				**SUBTOTAL**	15,67
				TOTAL	15,67

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA

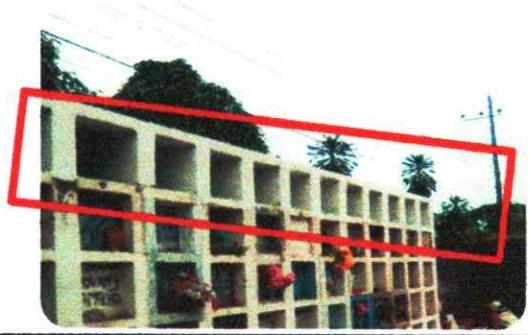

Firma
Nombre: ERIKA LORENA LESMES AGUIRRE
Representante Legal
Contratista

Firma
Nombre: MARYLIN PAOLA FONSECA CRUZ
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
SUPERVISORA

Firma
Nombre: JUAN CARLOS PALACIOS MOLINA
RESIDENTE DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 52202-084671

Firma
Nombre:
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional:

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

ALCALDÍA PUERTO LOPEZ	MEMORIA DE CALCULO OBRA	Código: F - 260 Versión: 002 Fecha: Enero de 2021

CONTRATO N°	100-103-13-09-00001-2024	PROYECTO N°	
FECHA DE INICIO:	1/04/2024	FECHA DE TERMINACIÓN	10/05/2024
OBJETO PROYECTO:	"CONSTRUCCION BOVEDAS Y OSARIOS EN EL CEMENTERIO DEL MUNICIPIO DE PUERTO LOPEZ - META"		
CONTRATISTA :	UNION TEMPORAL CEMENTERIOS 2024		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	100-103-13-09-00001-2024		
INTERVENTORÍA:	ING. MARYLIN PAOLA FONSECA CRUZ		
ACTA:	Pago Final, Liquidación del 18 de junio de 2024		
PERIODO DE CORTE DE LA PRESENTE ACTA	01/04/2024 al 10/05/2024		

CAPITULO:	CONSTRUCCION OSARIOS	
N° ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
2,12	SUMINISTRO E INSTALACION CUBIERTA ARQUITECTONICA METAUCA PERFIL TRAPEZOIDA, TIPO ACESCO. NO INCLUYE ESTRUCTURA.	M2

DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES				
	ANCHO	ALTO	LONGITUD	CANTIDAD	TOTAL
CUNIERTA OSARIOS	2,20	N/A	10,00	1,0	22,00
PASAN:				SUBTOTAL	22,00
				TOTAL	22,00

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA





Firma
Nombre: ERIKA LORENA LEGMES AGUIRRE
Representante Legal
Contratista

Firma
Nombre: MARYLIN PAOLA FONSECA CRUZ
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
SUPERVISORA

Firma
Nombre: JUAN CARLOS PALACIOS MOLINA
RESIDENTE DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 52202-084671

Firma
Nombre: N/A
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional:

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

ALCALDÍA PUERTO LÓPEZ	**MEMORIA DE CALCULO OBRA**	**Código: F - 260** Versión: 002 Fecha: Enero de 2021


CONTRATO N°	100-103-13-09-00001-2024	**PROYECTO N°**	
FECHA DE INICIO:	1/04/2024	FECHA DE TERMINACIÓN	10/05/2024
OBJETO PROYECTO:	"CONSTRUCCION BOVEDAS Y OSARIOS EN EL CEMENTERIO DEL MUNICIPIO DE PUERTO LOPEZ - META"		
CONTRATISTA :	UNION TEMPORAL CEMENTERIOS 2024		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	100-103-13-09-00001-2024		
INTERVENTORÍA:	ING. MARYLIN PAOLA FONSECA CRUZ		
ACTA:	**Pago Final, Liquidación del 18 de junio de 2024**		
PERIODO DE CORTE DE LA PRESENTE ACTA	**01/04/2024 al 10/05/2024**		

CAPITULO:	**CONSTRUCCION OSARIOS**	
N° ÍTEM	**DESCRIPCIÓN**	**UNIDAD**
2,13	VIGA AÉREA EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3

DESCRIPCIÓN	**DIMENSIONES**				
	ANCHO	**ALTO**	**LONGITUD**	**CANTIDAD**	**TOTAL**
VIGA AEREA MURO CERRAMIENTO	0.10	0,07	10.00	1.00	0,07
LATERALES	0.10	0,07	0,67	2.00	0,01
PASAN:				**SUBTOTAL**	0,08
				TOTAL	0,08

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA



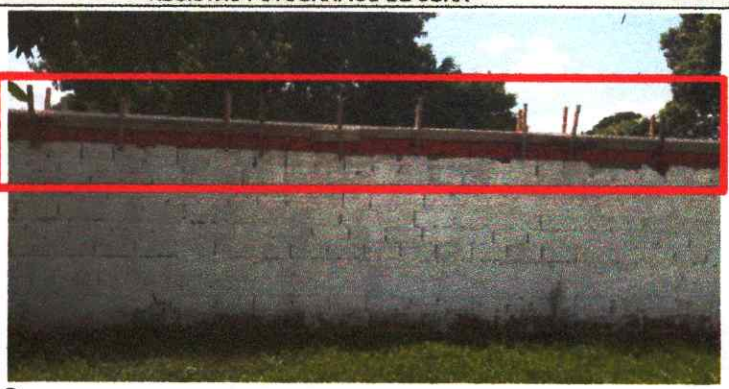

Firma
Nombre: ERIKA LORENA LESMES AGUIRRE
Representante Legal
Contratista

Firma
Nombre: MARYLIN PAOLA FONSECA CRUZ
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
SUPERVISORA

Firma
Nombre: JUAN CARLOS PALACIOS MOLINA
RESIDENTE DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 52202-084671

Firma
Nombre:
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional:

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

ALCALDÍA PUERTO LÓPEZ	MEMORIA DE CALCULO OBRA	Código: F - 260 Versión: 002 Fecha: Enero de 2021

CONTRATO N°	100-103-13-09-00001-2024	PROYECTO N°	
FECHA DE INICIO:	1/04/2024	FECHA DE TERMINACIÓN	10/05/2024
OBJETO PROYECTO:	"CONSTRUCCION BOVEDAS Y OSARIOS EN EL CEMENTERIO DEL MUNICIPIO DE PUERTO LOPEZ - META"		
CONTRATISTA :	UNION TEMPORAL CEMENTERIOS 2024		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	100-103-13-09-00001-2024		
INTERVENTORÍA:	ING. MARYLIN PAOLA FONSECA CRUZ		
ACTA:	**Pago Final, Liquidación del 18 de junio de 2024**		
PERIODO DE CORTE DE LA PRESENTE ACTA	**01/04/2024 al 10/05/2024**		

CAPITULO:	**CONSTRUCCION OSARIOS**	
N° ÍTEM	**DESCRIPCIÓN**	**UNIDAD**
2,14	ACERO DE REFUERZO FY=4200 MPa (4200 KG/CM2, G60) INCLUYE SUMINISTRO, FIGURADO, ARMADO, COLOCACIÓN Y AMARRE	Kg

DESCRIPCIÓN	**DIMENSIONES**				
	ANCHO	**KG/ML**	**LONGITUD**	**CANTIDAD**	**TOTAL**
ACERO VIGA AEREA HORIZONTAL	N/A	0,994	10,12	2.00	20,12
ACERO DE REFUERZO TRANSVERSAL VIGA AEREA HORIZONTAL	N/A	0.560	0,16	98.00	8,78
ACERO VIGA AEREA VERTICA	N/A	0,994	0.70	4.00	2,78
ACERO DE REFUERZO TRANSVERSAL VIGA AEREA LATERAL	N/A	0.560	0,18	10.00	0.90
PASAN:				**SUBTOTAL**	32,58
				TOTAL	32,58

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA





Firma
Nombre: ERIKA LORENA LESMES AGUIRRE
Representante Legal
Contratista

Firma
Nombre: MARYLIN PAOLA FONSECA CRUZ
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
SUPERVISORA

Firma
Nombre: JUAN CARLOS PALACIOS MOLINA
RESIDENTE DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 52202-084671

Firma
Nombre:
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional:

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

Villavicencio Meta, 18 de Junio de 2024.

ALCALDÍA DE PUERTO LÓPEZ - META
Oficina de Contratación
fecha: 22/11/24 Hora: 04:39pm
Recibido por:

Ingeniera:
MARYLIN PAOLA FONSECA CRUZ.
Secretaria de Infraestructura.
Supervisora.
Alcaldía de Puerto López – Meta

REFERENCIA: CONTRATO DE OBRA No. 100-103-13-09-00001 DE 2024 CUYO OBJETO ES **"CONSTRUCCION BOVEDAS Y OSARIOS EN EL CEMENTERIO DEL MUNICIPIO DE PUERTO LOPEZ META".**

Asunto: RADICACIÓN LIQUIDACIÓN.

Cordial saludo,

Por medio de la presente, me permito radicar ante ustedes la carpeta de liquidación del CONTRATO DE OBRA No. 100-103-13-09-00001 DE 2024 **"CONSTRUCCION BOVEDAS Y OSARIOS EN EL CEMENTERIO DEL MUNICIPIO DE PUERTO LOPEZ META"**, solicitamos de igual forma la aprobación del mismo.

Sin otro particular,

ERIKA LORENA LESMES AGUIRRE
CC. 1.121.865.059 de Villavicencio
Representante Legal
UNION TEMPORAL CEMENTERIOS 2024.

UNION TEMPORAL CEMENTERIOS 2024

INFORME FINAL DE OBRA

CONTRATO DE OBRA No. 100-103-13-09-00001-2024

OBJETO:

"CONSTRUCCION BOVEDAS Y OSARIOS EN EL CEMENTERIO DEL MUNICIPIO DE PUERTO LOPEZ - META"



CONTRATISTA
UNION TEMPORAL CEMENTERIOS 2024

SUPERVISION:
ING. MARYLIN PAOLA FONSECA CRUZ
Secretaria De Infraestructura.

Puerto López – Meta
18 de Junio de 2024.

INFORME FINAL DE OBRA

UNION TEMPORAL CEMENTERIOS 2024

1. INTRODUCCION

El Municipio de Puerto López Meta, mediante **CONTRATO DE OBRA No. 100-103-13-09-00001-2024**, adjudico a la **UNION TEMPORAL CEMENTERIOS 2024**, identificada con Nit. 901.811.916-1, representado legalmente por **ERIKA LORENA LESMES AGUIRRE**, identificada con cedula de ciudadanía No. 1.121.865.059 de Villavicencio Meta, cuyo objeto es: **"CONSTRUCCION BOVEDAS Y OSARIOS EN EL CEMENTERIO DEL MUNICIPIO DE PUERTO LOPEZ - META",** el 18 de Marzo de 2024 y dando inicio el 01 de Abril de 2024.

El valor del presente contrato corresponde a la suma de **TREINTA Y SEIS MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS TREINTA PESOS ($ 36.389.830,00)**, incluidos todos los impuestos a que haya lugar; lo anterior teniendo en cuenta la oferta económica presentada por la **UNION TEMPORAL CEMENTERIOS 2024.**

En el presente informe se describen las actividades desarrolladas por la **UNION TEMPORAL CEMENTERIOS 2024**, desde la fecha de inicio 1 de Abril de 2024 hasta la fecha de terminación del contrato de obra es decir el 10 de Mayo de 2024.

Las actividades aquí descriptas fueron ejecutadas satisfactoriamente, y aprobadas por la Supervisión.

2. OBJETIVOS

2.1. OBJETIVO GENERAL.

Dar a conocer a la supervisión y al Municipio de Puerto López, el avance logrado hasta la fecha del presente informe del **CONTRATO DE OBRA No. 100-103-13-09-00001-2024.**

Mediante este informe también se busca constatar el cumplimiento y las condiciones establecidas para la ejecución de las obras y evidenciar el logro de los objetivos y las obligaciones establecidas en el Contrato.

2.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS.

- ✓ Presentar tablas de cantidades ejecutadas, obra ejecutada desde el 1 de Abril hasta la fecha de terminación es decir 10 de mayo de 2024.
- ✓ Relacionar registro fotográfico para soportar las actividades descritas como ejecutadas en el tiempo transcurrido.
- ✓ Presentar un informe con un avance total de ejecución a satisfacción del 100% ejecutado.

3. GENERALIDADES DEL PROYECTO.

3.1. ALCANCE DEL PROYECTO.

En desarrollo del **"CONSTRUCCION BOVEDAS Y OSARIOS EN EL CEMENTERIO DEL MUNICIPIO DE PUERTO LOPEZ - META",** se pretende realizar dos actividades principales, las cuales son la construcción de bóvedas y construcción de Osarios.

4. LOCALIZACIÓN GEOGRAFICA

4.1. IDENTIFICACION DEL MUNICIPIO.

- **Nombre del municipio:** Puerto López.
- **Nit:** 892.099.325-0
- **Código DANE:** 50573
- **Fecha de Fundación:** 1 de mayo 1935
- **Departamento:** Meta
- **Población:** 33.440 habitantes
- **Extensión total:** 6.740 Km²
- Extensión área urbana: 9.5 Km2
- Extensión área rural: 6730.5 Km2
- **Altitud:** 365 Msnm
- **Temperatura Promedio:** 26.5 °C
- **Limites:** al Norte con los municipios de Cumaral, Cabuyaro y el departamento de Casanare; Al oriente con el municipio de Puerto Gaitán; al sur con el municipio de San Martin, y al occidente con los municipios de San Carlos De Guaroa y Villavicencio.


4.2 GEOGRAFIA.

Puerto López es un Municipio colombiano ubicado en el departamento del Meta, es conocido nacionalmente como el Ombligo de Colombia debido a que coincide con el centro geográfico del territorio continental del país, toda vez que según el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, al promediar la latitud y la longitud de Colombia, el municipio de Puerto López se encuentra en un punto equidistante, por tal razón se elevó en el "Alto de Menegua" una obra escultural en forma de obelisco realizada por el escultor colombiano Miguel Roa Iregui, mediante dicha obra se describe gráficamente la ubicación geográfica, industria y economía, cultura, flora y fauna de éste municipio del llano colombiano. Puerto López es además uno de los más importantes puertos fluviales sobre río Meta y está localizado a 86 km al Este de Villavicencio.

INFORME FINAL DE OBRA


UNION TEMPORAL CEMENTERIOS 2024

Históricamente el municipio de Puerto López perteneció al globo general de la hacienda YACUANA (adjudicada por el Estado colombiano a los Convers, mediante resolución No. 50 del 11 de agosto de 1896), dividida en 6 fundaciones, correspondiendo la denominada Banderas al área actual del municipio.

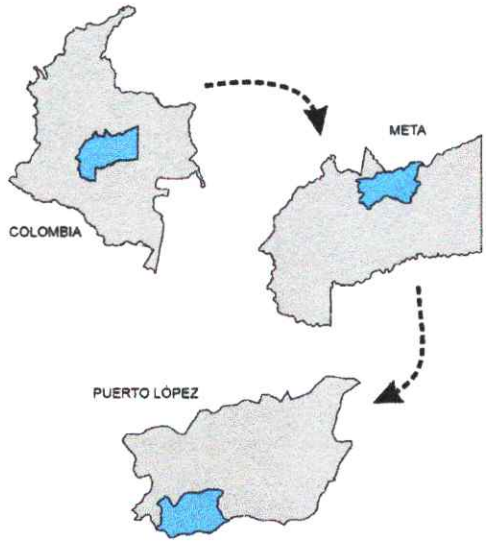

4.3. UBICACIÓN EJECUCION DE LA OBRA

LUGAR	AVENIDA	CARRERA
CEMENTERIO CENTRAL DE PTO LOPEZ	AVENIDA 14	CARRERA 9

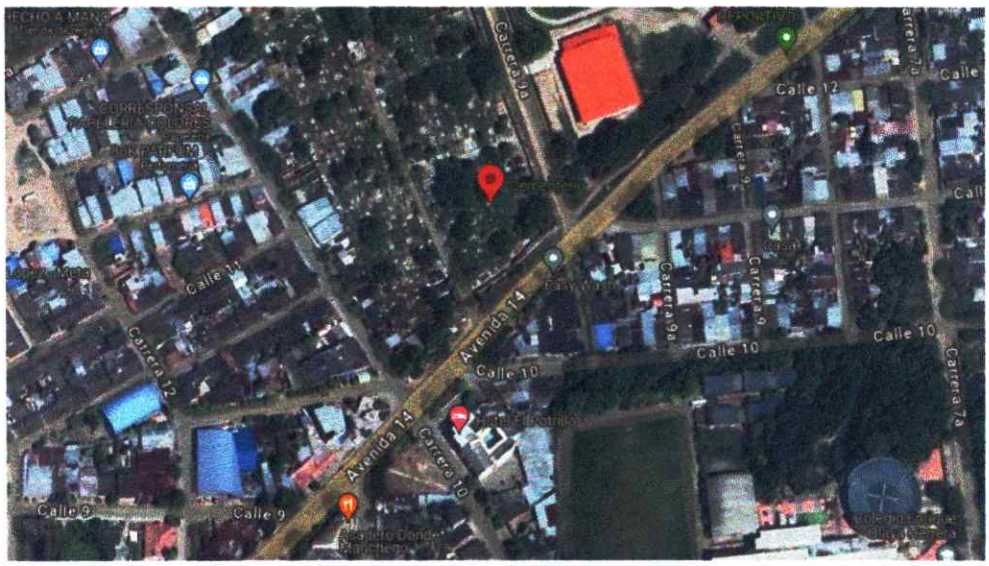

5. CONDICIONES DEL CONTRATO

5.1. INFORMACION GENERAL

A continuación, se relacionan los datos generales del **CONTRATO DE OBRA No. 100-103-13-09-00001-2024.**

INFORMACION BASICA	
CONTRATISTA	**UNION TEMPORAL CEMENTERIOS 2024** Nit.: 901.811.916-1 R/L. ERIKA LORENA LESMES AGUIRRE CC. 1.121.865.059 de Villavicencio
SUPERVISION	**ING. MARYLIN PAOLA FONSECA CRUZ** Secretaria de Infraestructura
INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO	
CONTRATO No.	100-103-13-09-00001-2024
CLASE DE CONTRATO:	CONTRATO DE OBRA
OBJETO:	"CONSTRUCCION BOVEDAS Y OSARIOS EN EL CEMENTERIO DEL MUNICIPIO DE PUERTO LOPEZ - META"
VALOR DEL CONTRATO:	TREINTA Y SEIS MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS TREINTA PESOS ($ 36.389.830,00)
FECHA DEL CONTRATO:	18 DE MARZO DE 2024
FECHA DE INICIO:	1 DE ABRIL DE 2024
PLAZO DE EJECUCION:	1 MES
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	30 DE ABRIL DE 2024
ADICION EN TIEMPO:	10 DIAS
PLAZO DE EJECUCION FINAL:	1 MES Y 10 DIAS
NUEVA FECHA DE TERMINACION:	10 DE MAYO DE 2024

5.2. CONDICIONES CONTRATADAS.

Una vez suscrito el Contrato de Obra No. 100-103-13-09-00001-2024, las condiciones contractuales son las siguientes:

ÍTEM	ACTIVIDAD	UND	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL
1	CONSTRUCCION BOVEDAS				
1,1	LOCALIZACION Y REPLANTEO CONVENCIONAL OBRA ARQUITECTÓNICA (M2) NO INCLUYE COMISIÓN TOPOGRAFICA	M2	17,88	$ 3.754,73	$ 67.135,00
1,2	DESCAPOTE MANUAL H= 0.15 M CON TRASIEGO DE MATERIAL SOBRANTE	M2	17,88	$ 8.831,61	$ 157.909,00
1,3	SOLADO, LIMPIEZA EN CONCRETO 13.8 MPa (2000 PSI)	M3	0,15	$ 604.816,44	$ 90.722,00
1,4	VIGA EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	1,42	$ 969.060,92	$ 1.376.067,00
1,5	RELLENO CON MATERIAL MIXTO DE RÍO SIN PROCESAR TAMAÑO MAX. 2" SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN MANUAL CON EQUIPO LIVIANO	M3	3,63	$ 62.183,02	$ 225.724,00
1,6	COLUMNA EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	0,90	$ 1.342.043,29	$ 1.207.839,00
1,7	ACERO DE REFUERZO FY=4200 MPa (4200 KG/CM2, G60) INCLUYE SUMINISTRO, FIGURADO, ARMADO, COLOCACIÓN Y AMARRE.	KG	401,51	$ 8.629,76	$ 3.464.935,00
1,8	MURO EN BLOQUE FLEXA No. 5, 0.12X0.20X0.30 M (MORTERO TIPO S 1:4)	M2	57,87	$ 53.733,97	$ 3.109.585,00
1,9	PLACA DE CONTRAPISO EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	1,25	$ 789.895,18	$ 987.369,00
1,10	PLACA DE ENTREPISO MACIZA EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	3,85	$ 1.118.389,28	$ 4.305.799,00
1,11	MALLA ELECTROSOLDADA FY=5000 KG/CM2, 500 MPA. FIGURADO, ARMADO, COLOCACIÓN Y AMARRE. SUMINISTRO E INSTALACIÓN	KG	151,54	$ 9.286,62	$ 1.407.294,00
1,12	PAÑETE MURO EXTERIOR Y CULATAS MORTERO 1:4 IMPERMEABILIZADO. SUMINISTRO Y APLICACIÓN.	M2	30,01	$ 34.927,40	$ 1.048.171,00
1,13	PAÑETE MUROS INTERIORES MORTERO 1:4 SOBRE MALLA CON VENA. INCLUYE FILOS Y DILATACIONES. SUMINISTRO Y APLICACIÓN	M2	90,57	$ 42.936,22	$ 3.888.733,00

1,14	PINTURA VINILO T. CORAZA EXTERIOR 3 MANOS	M2	56,21	$ 14.129,34	$ 794.210,00
				COSTO SUBTOTAL	**$ 22.131.492,00**
2	**CONSTRUCCION OSARIOS**				
2,1	DESMONTE DE ESTRUCTURA METALICA DE CUBIERTA. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO	M2	22,00	$ 19.493,79	$ 428.863,00
2,2	DESMONTE DE TEJA PLASTICA Y/O DE ZINC. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO	M2	22,00	$ 7.209,82	$ 158.616,00
2,3	DEMOLICION CONCRETO SIMPLE. INCLUYE TRASIEGO Y CARGUE MANUAL	M3	0,12	$ 337.201,33	$ 40.464,00
2,4	MURO EN BLOQUE FLEXA No. 4 0.10X0.20X0.30 M(MORTERO TIPO S 1:3)	M2	15,38	$ 54.269,15	$ 834.660,00
2,5	PAÑETE MURO EXTERIOR Y CULATAS MORTERO 1:4 IMPERMEABILIZADO. SUMINISTRO Y APLICACIÓN	M2	6,00	$ 34.927,40	$ 209.564,00
2,6	PAÑETE MUROS INTERIORES MORTERO 1:4 SOBRE MALLA CON VENA. INCLUYE FILOS Y DILATACIONES. SUMINISTRO Y APLICACIÓN	M2	14,67	$ 42.936,22	$ 629.874,00
2,7	PLACA DE ENTREPISO MACIZA EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	0,64	$ 1.118.389,28	$ 715.769,00
2,8	MALLA ELECTROSOLDADA FY=5000 KG/CM2, 500 MPA. FIGURADO, ARMADO, COLOCACIÓN Y AMARRE. SUMINISTRO E INSTALACIÓN	KG	16,62	$ 9.286,62	$ 154.344,00
2,9	PEDESTALES EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	0,02	$ 2.218.727,61	$ 44.375,00
2,10	CORREA PERFIL RECTAN PHR NEGRO 80X40X2.0 MM CAL. 14	ML	32,30	$ 27.090,69	$ 875.029,00
2,11	PINTURA VINILO T. CORAZA EXTERIOR 3 MANOS	M2	15,67	$ 14.129,34	$ 221.407,00
2,12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CUBIERTA ARQUITECTONICA METALICA PERFIL TRAPEZOIDAL TIPO ACESCO. NO INCLUYE ESTRUCTURA	M2	22,00	$ 43.097,89	$ 948.154,00
2,13	VÍGA AÉREA EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	0,08	$ 1.309.091,15	$ 104.727,00
2,14	ACERO DE REFUERZO FY=4200 MPa (4200 KG/CM2, G60) INCLUYE SUMINISTRO, FIGURADO, ARMADO, COLOCACIÓN Y AMARRE	KG	32,58	$ 8.629,76	$ 281.158,00
				COSTO SUBTOTAL	**$ 5.647.004,00**
					$ 27.778.496,00

ADMINISTRACION	25%	$ 6.944.624,00
IMPREVISTOS	1%	$ 277.785,00
UTILIDAD	5%	$ 1.388.925,00
TOTAL AIU	31%	$ 8.611.334,00
TOTAL COSTO CONTRATO DE OBRA		**$ 36.389.830,00**

5.3. OBRA EJECUTADA

A continuación, se presenta cada una de las actividades ejecutadas desde el 1 de Abril hasta el 10 de Mayo de 2024, donde se realiza solicitud de prórroga, con un porcentaje de ejecución de la obra de 100%.

CAPITULO 1. CONSTRUCCIÓN DE BOVEDAS

ITEM 1.1 LOCALIZACION Y REPLANTEO CONVENCIONAL OBRA ARQUITECTÓNICA (M2) NO INCLUYE COMISIÓN TOPOGRAFICA.

A la fecha del presente informe se ejecutó el 100% de las cantidades contratadas inicialmente es decir 11,88 M2, no fue necesario ni modificación, ni mayores ni menores cantidades.





ITEM 1.2 DESCAPOTE MANUAL H= 0.15 M CON TRASIEGO DE MATERIAL SOBRANTE


A la fecha del presente informe se ejecutó el 100% de las cantidades contratadas inicialmente es decir 11,88 M2, no fue necesario ni modificación, ni mayores ni menores cantidades.





ITEM 1.3 SOLADO, LIMPIEZA EN CONCRETO 13.8 MPa (2000 PSI)

A la fecha del presente informe se ejecutó el 100% de las cantidades contratadas inicialmente es decir 0,15 M3, no fue necesario ni modificación, ni mayores ni menores cantidades.

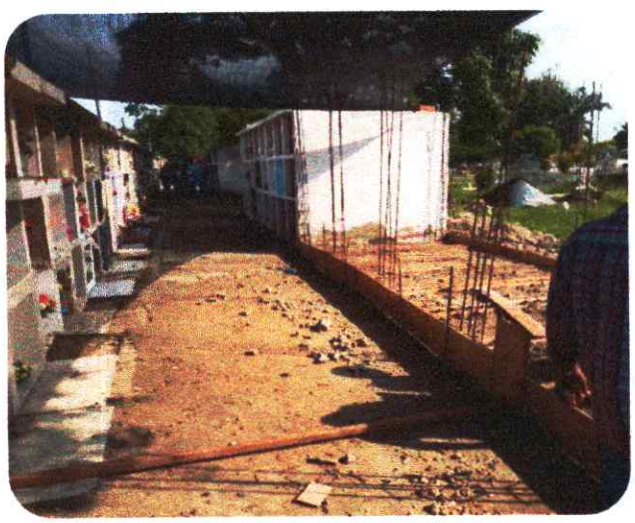



ITEM 1.4 VIGA EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN

A la fecha del presente informe se ejecutó el 100% de las cantidades contratadas inicialmente es decir 1,42 M3, no fue necesario ni modificación, ni mayores ni menores cantidades.



ITEM 1.5 RELLENO CON MATERIAL MIXTO DE RÍO SIN PROCESAR TAMAÑO MAX. 2" SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN MANUAL CON EQUIPO LIVIANO.

A la fecha del presente informe se ejecutó el 100% de las cantidades contratadas inicialmente es decir 3,63 M3, no fue necesario ni modificación, ni mayores ni menores cantidades.








ITEM 1.6 COLUMNA EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN


A la fecha del presente informe se ejecutó el 100% de las cantidades contratadas inicialmente es decir 0,90 M3, no fue necesario ni modificación, ni mayores ni menores cantidades.



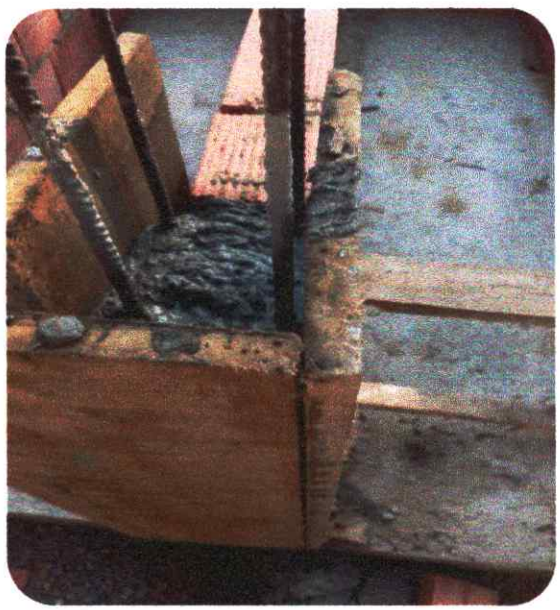

ITEM 1.7 ACERO DE REFUERZO FY=4200 MPa (4200 KG/CM2, G60) INCLUYE SUMINISTRO, FIGURADO, ARMADO, COLOCACIÓN Y AMARRE.

A la fecha del presente informe se ejecutó el 100% de las cantidades contratadas inicialmente es decir 151,54 Kg, no fue necesario ni modificación, ni mayores ni menores cantidades.

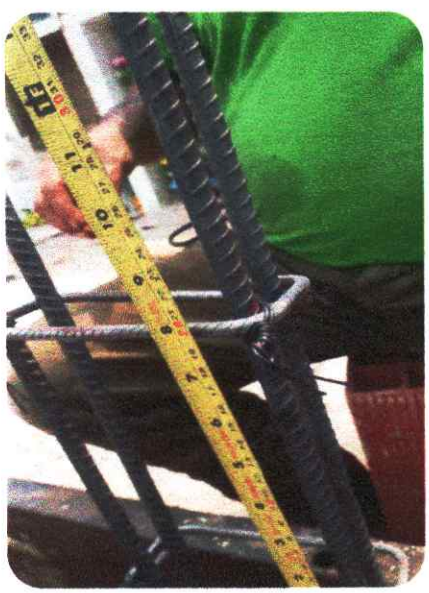



ITEM 1.8 MURO EN BLOQUE FLEXA No. 5, 0.12X0.20X0.30 M (MORTERO TIPO S 1:4)

A la fecha del presente informe se ejecutó el 100% de las cantidades contratadas inicialmente es decir 57,87 M2, no fue necesario ni modificación, ni mayores ni menores cantidades.





ITEM 1.9 PLACA DE CONTRAPISO EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN

A la fecha del presente informe se ejecutó el 100% de las cantidades contratadas inicialmente es decir 1,25 M3, no fue necesario ni modificación, ni mayores ni menores cantidades.





ITEM 1.10 PLACA DE ENTREPISO MACIZA EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN

A la fecha del presente informe se ejecutó el 100% de las cantidades contratadas inicialmente es decir 3.85 M3, no fue necesario ni modificación, ni mayores ni menores cantidades.





ITEM 1.11 MALLA ELECTROSOLDADA FY=5000 KG/CM2, 500 MPA. FIGURADO, ARMADO, COLOCACIÓN Y AMARRE. SUMINISTRO E INSTALACIÓN

A la fecha del presente informe se ejecutó el 100% de las cantidades contratadas inicialmente es decir 151,54 Kg, no fue necesario ni modificación, ni mayores ni menores cantidades.





ITEM 1.12 PAÑETE MURO EXTERIOR Y CULATAS MORTERO 1:4 IMPERMEABILIZADO. SUMINISTRO Y APLICACIÓN.

A la fecha del presente informe se ejecutó el 100% de las cantidades contratadas inicialmente es decir 30,01 M2, no fue necesario ni modificación, ni mayores ni menores cantidades.



ITEM 1.13 PAÑETE MUROS INTERIORES MORTERO 1:4 SOBRE MALLA CON VENA. INCLUYE FILOS Y DILATACIONES. SUMINISTRO Y APLICACIÓN.

A la fecha del presente informe se ejecutó el 100% de las cantidades contratadas inicialmente es decir 90,57 M2, no fue necesario ni modificación, ni mayores ni menores cantidades.






INFORME FINAL DE OBRA

UNION TEMPORAL CEMENTERIOS 2024

ITEM 1.14 PINTURA VINILO T. CORAZA EXTERIOR 3 MANOS.

A la fecha del presente informe se ejecutó el 100% de las cantidades contratadas inicialmente es decir 56.21 M2, no fue necesario ni modificación, ni mayores ni menores cantidades.



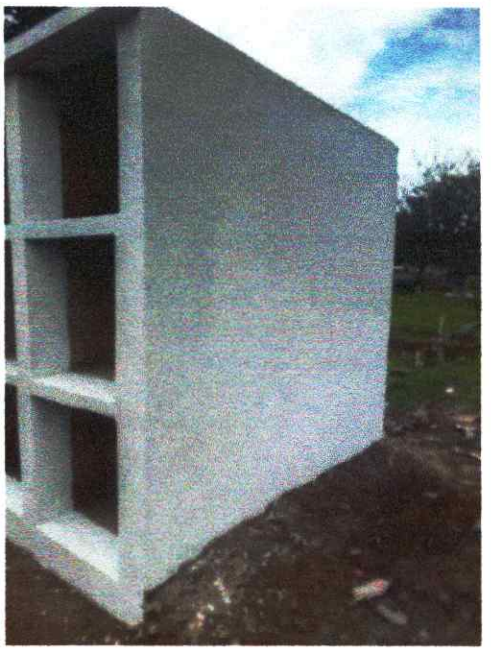



CAPITULO 2. CONSTRUCCION DE OSARIOS.

ITEM 2.1. DESMONTE DE ESTRUCTURA METALICA DE CUBIERTA. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO.

A la fecha del presente informe se ejecutó el 100% de las cantidades contratadas inicialmente es decir 22,00 M2, no fue necesario ni modificación, ni mayores ni menores cantidades.





ITEM 2.2. DESMONTE DE TEJA PLASTICA Y/O DE ZINC. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO

A la fecha del presente informe se ejecutó el 100% de las cantidades contratadas inicialmente es decir 22,00 M2, no fue necesario ni modificación, ni mayores ni menores cantidades





INFORME FINAL DE OBRA

UNION TEMPORAL CEMENTERIOS 2024

ITEM 2.3. DEMOLICION CONCRETO SIMPLE. INCLUYE TRASIEGO Y CARGUE MANUAL

A la fecha del presente informe se ejecutó el 100% de las cantidades contratadas inicialmente es decir 0,12 M3, no fue necesario ni modificación, ni mayores ni menores cantidades



ITEM 2.4. MURO EN BLOQUE FLEXA No. 4 0.10X0.20X0.30 M(MORTERO TIPO S 1:3)

A la fecha del presente informe se ejecutó el 100% de las cantidades contratadas inicialmente es decir 15,38 M2, no fue necesario ni modificación, ni mayores ni menores cantidades





ITEM 2.5. PAÑETE MURO EXTERIOR Y CULATAS MORTERO 1:4 IMPERMEABILIZADO. SUMINISTRO Y APLICACIÓN


A la fecha del presente informe se ejecutó el 100% de las cantidades contratadas inicialmente es decir 6,00 M2, no fue necesario ni modificación, ni mayores ni menores cantidades



ITEM 2.6. PAÑETE MUROS INTERIORES MORTERO 1:4 SOBRE MALLA CON VENA. INCLUYE FILOS Y DILATACIONES. SUMINISTRO Y APLICACIÓN

A la fecha del presente informe se ejecutó el 100% de las cantidades contratadas inicialmente es decir 14,67 M2, no fue necesario ni modificación, ni mayores ni menores cantidades



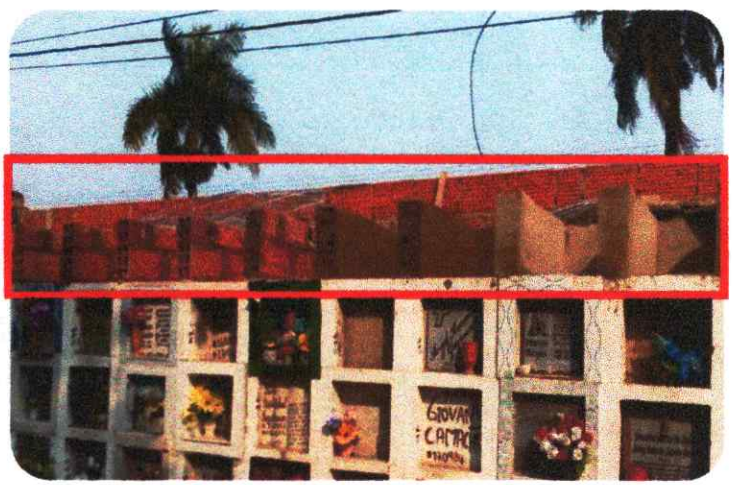

ITEM 2.7. PLACA DE ENTREPISO MACIZA EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN

A la fecha del presente informe se ejecutó el 100% de las cantidades contratadas inicialmente es decir 0,64 M3, no fue necesario ni modificación, ni mayores ni menores cantidades





ITEM 2.8. MALLA ELECTROSOLDADA FY=5000 KG/CM2, 500 MPA. FIGURADO, ARMADO, COLOCACIÓN Y AMARRE. SUMINISTRO E INSTALACIÓN

A la fecha del presente informe se ejecutó el 100% de las cantidades contratadas inicialmente es decir 16,62 Kg, no fue necesario ni modificación, ni mayores ni menores cantidades





ITEM 2.9. PEDESTALES EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN

A la fecha del presente informe se ejecutó el 100% de las cantidades contratadas inicialmente es decir 0,02 M3, no fue necesario ni modificación, ni mayores ni menores cantidades





ITEM 2.10. CORREA PERFIL RECTAN PHR NEGRO 80X40X2.0 MM CAL. 14

A la fecha del presente informe se ejecutó el 100% de las cantidades contratadas inicialmente es decir 32,30 Ml, no fue necesario ni modificación, ni mayores ni menores cantidades



ITEM 2.11. PINTURA VINILO T. CORAZA EXTERIOR 3 MANOS

A la fecha del presente informe se ejecutó el 100% de las cantidades contratadas inicialmente es decir 15.67 M2, no fue necesario ni modificación, ni mayores ni menores cantidades



ITEM 2.12. SUMINISTRO E INSTALACIÓN CUBIERTA ARQUITECTONICA METALICA PERFIL TRAPEZOIDAL TIPO ACESCO. NO INCLUYE ESTRUCTURA


A la fecha del presente informe se ejecutó el 100% de las cantidades contratadas inicialmente es decir 22,00 M2, no fue necesario ni modificación, ni mayores ni menores cantidades



ITEM 2.13. VÍGA AÉREA EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN

A la fecha del presente informe se ejecutó el 100% de las cantidades contratadas inicialmente es decir 0.08 m3, no fue necesario ni modificación, ni mayores ni menores cantidades



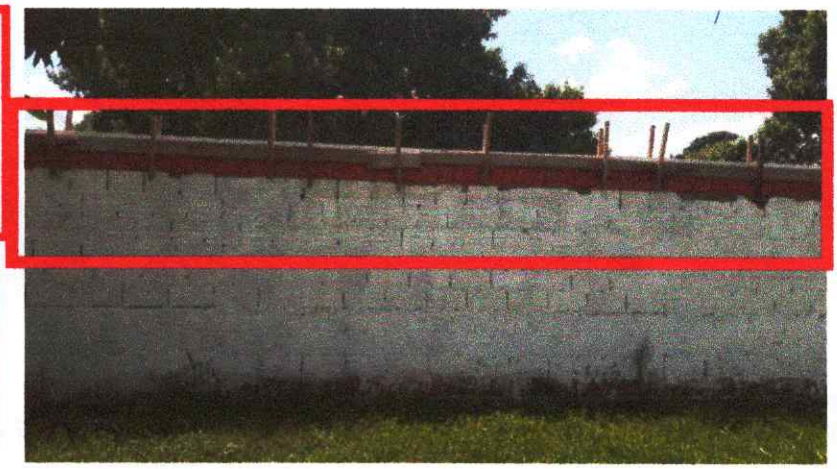

ITEM 2.14. ACERO DE REFUERZO FY=4200 MPa (4200 KG/CM2, G60) INCLUYE SUMINISTRO, FIGURADO, ARMADO, COLOCACIÓN Y AMARRE

A la fecha del presente informe se ejecutó el 100% de las cantidades contratadas inicialmente es decir 32.58 kg, no fue necesario ni modificación, ni mayores ni menores cantidades



UNION TEMPORAL CEMENTERIOS 2024

RESUMEN DE LAS OBRAS EJECUTADAS						
N° ITEM	CONDICIONES INICIALES			OBRA EJECUTADA		
				ACUMULADO		
	DESCRIPCIÓN	UND	VALOR UNITARIO	CANT.	VALOR	%
1.00	**CONSTRUCCIÓN BOVEDAS**					
1,01	LOCALIZACION Y REPLANTEO CONVENCIONAL OBRA ARQUITECTÓNICA (M2) NO INCLUYE COMISIÓN TOPOGRAFICA.	M2	$ 3.754,73	17,88	$ 67.134,57	100%
1,02	DESCAPOTE MANUAL H= 0.15 M CON TRASIEGO DE MATERIAL SOBRANTE	M2	$ 8.831,61	17,88	$ 157.909,19	100%
1,03	SOLADO, LIMPIEZA EN CONCRETO 13.8 MPa (2000 PSI)	M3	$ 604.816,44	0,15	$ 90.722,47	100%
1,04	VIGA EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	$ 969.060,92	1,42	$ 1.376.066,51	100%
1,05	RELLENO CON MATERIAL MIXTO DE RÍO SIN PROCESAR TAMAÑO MAX. 2" SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN MANUAL CON EQUIPO LIVIANO.	M3	$ 62.183,02	3,63	$ 225.724,36	100%
1,06	COLUMNA EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	$ 1.342.043,29	0,90	$ 1.207.838,96	100%
1,07	ACERO DE REFUERZO FY=4200 MPa (4200 KG/CM2, G60) INCLUYE SUMINISTRO, FIGURADO, ARMADO, COLOCACIÓN Y AMARRE.	KG	$ 8.629,76	401,51	$ 3.464.934,94	100%
1,08	MURO EN BLOQUE FLEXA No. 5, 0.12X0.20X0.30 M (MORTERO TIPO S 1:4)	M2	$ 53.733,97	57,87	$ 3.109.584,84	100%
1,09	PLACA DE CONTRAPISO EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	$ 789.895,18	1,25	$ 987.368,98	100%

1,10	PLACA DE ENTREPISO MACIZA EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	$ 1.118.389,28	3,85	$ 4.305.798,73	100%
1,11	MALLA ELECTROSOLDADA FY=5000 KG/CM2, 500 MPA. FIGURADO, ARMADO, COLOCACIÓN Y AMARRE. SUMINISTRO E INSTALACIÓN	KG	$ 9.286,62	151,54	$ 1.407.294,39	100%
1,12	PAÑETE MURO EXTERIOR Y CULATAS MORTERO 1:4 IMPERMEABILIZADO. SUMINISTRO Y APLICACIÓN.	M2	$ 34.927,40	30,01	$ 1.048.171,27	100%
1,13	PAÑETE MUROS INTERIORES MORTERO 1:4 SOBRE MALLA CON VENA. INCLUYE FILOS Y DILATACIONES. SUMINISTRO Y APLICACIÓN.	M2	$ 42.936,22	90,57	$ 3.888.733,45	100%
1,14	PINTURA VINILO T. CORAZA EXTERIOR 3 MANOS	M2	$ 14.129,34	56.21	$ 794.210,20	100%
			SUBTOTAL		**$ 22.131.492,86**	**100%**
2.00	**CONSTRUCCION OSARIOS**					
2.01	DESMONTE DE ESTRUCTURA METALICA DE CUBIERTA. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO	M2	$ 19.493,79	22,00	$ 428.863,38	100%
2.02	DESMONTE DE TEJA PLASTICA Y/O DE ZINC. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO	M2	$ 7.209,82	22,00	$ 158.616,04	100%
2.03	DEMOLICION CONCRETO SIMPLE. INCLUYE TRASIEGO Y CARGUE MANUAL	M3	$ 337.201,33	0,12	$ 40.464,16	100%
2.04	MURO EN BLOQUE FLEXA No. 4 0.10X0.20X0.30 M(MORTERO TIPO S 1:3)	M2	$ 54.269,15	15,38	$ 834.659,53	100%
2.05	PAÑETE MURO EXTERIOR Y CULATAS MORTERO 1:4 IMPERMEABILIZADO. SUMINISTRO Y APLICACIÓN	M2	$ 34.927,40	6,00	$ 209.564,40	100%
2.06	PAÑETE MUROS INTERIORES MORTERO 1:4 SOBRE MALLA CON VENA. INCLUYE FILOS Y DILATACIONES. SUMINISTRO Y APLICACIÓN	M2	$ 42.936,22	14,67	$ 629.874,35	100%
2.07	PLACA DE ENTREPISO MACIZA EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	$ 1.118.389,28	0,64	$ 715.769,14	100%

2.08	MALLA ELECTROSOLDADA FY=5000 KG/CM2, 500 MPA. FIGURADO, ARMADO, COLOCACIÓN Y AMARRE. SUMINISTRO E INSTALACIÓN	KG	$ 9.286,62	16,62	$ 154.343,62	100%
2.09	PEDESTALES EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	$ 2.218.727,61	0,02	$ 44.374,55	100%
2.10	CORREA PERFIL RECTAN PHR NEGRO 80X40X2.0 MM CAL. 14	ML	$ 27.090,69	32,30	$ 875.029,29	100%
2.11	PINTURA VINILO T. CORAZA EXTERIOR 3 MANOS	M2	$ 14.129,34	15,67	$ 21.406,76	100%
2.12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CUBIERTA ARQUITECTONICA METALICA PERFIL TRAPEZOIDAL TIPO ACESCO. NO INCLUYE ESTRUCTURA	M2	$ 43.097,89	22,00	$ 948.153,58	100%
2.13	VÍGA AÉREA EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	$ 1.309.091,15	0,08	$ 104.727,29	100%
2.14	ACERO DE REFUERZO FY=4200 MPa (4200 KG/CM2, G60) INCLUYE SUMINISTRO, FIGURADO, ARMADO, COLOCACIÓN Y AMARRE	KG	$ 8.629,76	35,58	$ 281.157,58	100%
			SUBTOTAL		**$ 5.647.003,67**	**100%**
COSTO DIRECTO					**$ 27.778..496,52**	
ADMINISTRACION			25%		$ 6.944.624,13	
IMPREVISTOS			1%		$ 277.784,97	
UTILIDAD			5%		$ 1.388.924,83	
AIU 31%					**$ 8.611.333,92**	
COSTO TOTAL					**$ 36.389.830,44**	**100%**
COSTO TOTAL AJUSTADO AL PESO					**$ 36.389.830,00**	**100%**

6. BALANCE FINANCIERO.

El contratista a fecha 10 de Mayo de 2024, tiene un avance de obra del 100%, el cual da avance financiero de Treinta y Seis Millones Trescientos Ochenta y Nueve Mil Ochocientos Treinta pesos M/cte ($ **36.389.830,00**), ejecutando así el 100% de las actividades contratadas.

BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO DE OBRA		**%**
ANTICIPO	N/A	**N/A**
VALOR EJECUTADO	$ 36.389.830,00	**100%**
VALOR POR EJECUTAR	$ 0,00	**0.0%**
VALOR ACTUALIZADO DEL CONTRATO	**$ 36.389.830,00**	**100%**

7. GARANTIAS DEL CONTRATO

El CONTRATISTA se comprometió a construir a favor del MUNICIPIO y presentar a éste, dentro de un (01) día hábil siguiente a la firma del contrato, la garantía única otorgada a través de una entidad bancaria o compañía aseguradora, cuya póliza matriz esté aprobada por la Superintendencia Bancaria que ampare los riesgos de; cumplimiento, pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales, estabilidad y calidad de obra y la responsabilidad civil extracontractual especificados y establecidos en el contrato de obra No. 100-103-13-09-00001-2024.

GARANTIAS DEL CONTRATO INICIALES			
GARANTIA DE CUMPLIMIENTO No. 11-44-101221672 Anexo 0			
AMPARO	**DESDE**	**HASTA**	**VALOR**
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	18/03/2024	18/08/2024	$ 3.638.983,00
PAGO SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	18/03/2024	18/04/2027	$ 1.819.491,50
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	30/04/2024	30/04/2029	$ 7.277.966,00
GARANTIA DE RCE 11-40-101061560 ANEXO 0			
RESPONSABILIDAD CIIVL EXTRACONTRACTUAL	18/03/2024	18/04/2022	$ 260.000.000

GARANTIAS ACTA DE INICIO			
GARANTIA DE CUMPLIMIENTO No. 11-44-101221672 Anexo 1 y 2			
AMPARO	**DESDE**	**HASTA**	**VALOR**
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	01/04/2024	01/09/2024	$ 3.638.983,00
PAGO SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	01/04/2024	02/05/2027	$ 1.819.491,50
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	02/05/2024	02/05/2029	$ 7.277.966,00
GARANTIA DE RCE 11-40-101061560 ANEXO 2			
RESPONSABILIDAD CIIVL EXTRACONTRACTUAL	01/04/2024	02/05/2024	$ 260.000.000

INFORME FINAL DE OBRA

UNION TEMPORAL CEMENTERIOS 2024

GARANTIAS PRORROGA			
GARANTIA DE CUMPLIMIENTO No. 11-44-101221672 Anexo 3			
AMPARO	**DESDE**	**HASTA**	**VALOR**
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	01/04/2024	10/09/2024	$ 3.638.983,00
PAGO SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	01/04/2024	10/05/2027	$ 1.819.491,50
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	02/05/2024	02/05/2029	$ 7.277.966,00
GARANTIA DE RCE 11-40-101061560 ANEXO 3			
RESPONSABILIDAD CIIVL EXTRACONTRACTUAL	01/04/2024	10/05/2024	$ 260.000.000

GARANTIAS TERMINACION			
GARANTIA DE CUMPLIMIENTO No. 11-44-101221672 Anexo 5			
AMPARO	**DESDE**	**HASTA**	**VALOR**
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	01/04/2024	10/09/2024	$ 3.638.983,00
PAGO SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	01/04/2024	10/05/2027	$ 1.819.491,50
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	10/05/2024	10/05/2029	$ 7.277.966,00

8. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.

- Se recomienda al Municipio de Puerto López, revisar y estar al tanto del estado de estos equipamientos para garantizar la seguridad de los mismos.
- Una vez finalizadas las labores contractuales, se dio cumplimiento a todas las obligaciones establecidas en la Clausula Sexta "Obligaciones Generales de las partes".
- LA UNIÓN TEMPORAL CEMENTERIOS 2024, dio cabal cumplimiento a las actividades específicas establecidas en la Clausula Séptima del contrato de Obra.
- A la fecha del presente informe no se cuenta con alguna sugerencia de mejora por parte del Supervisor o Contratante.
- LA UNIÓN TEMPORAL CEMENTERIOS 2024, da por terminadas las labores contractuales el 10 de Mayo de 2024, las cuales fueron aprobadas por la supervisión.

Atentamente;

ERIKA LORENA LESMES AGUIRRE.
C.C. 1.121.865.059 de Villavicencio.
Representante Legal.
UNION TEMPORAL CEMENTERIOS 2024.

ALCALDÍA PUERTO LOPEZ	**INFORME DE SUPERVISIÓN O INTERVENTORIA A CONTRATO OBRA- CONSULTORIA- INTERVENTORIA**	**Código: F – 487** Versión: 002 Fecha: agosto de 2023

INFORME N° 02

PERIODO DEL *01-04-2024* ***AL*** *10-05-2024*

FECHA DE PRESETANCION: *18-06-2024*

INFORME FINAL

INFORMACIÓN BASICA				
TIPO DE CONTRATO :	*OBRA*			
CONTRATO N° :	100-103-13-09-00001-2024			
OBJETO CONTRATO :	CONSTRUCCION BOVEDAS Y OSARIOS EN EL CEMENTERIO DEL MUNICIPIO DE PUERTO LOPEZ - META			
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	TREINTA Y SEIS MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS TREINTA PESOS ($ 36.389.830,00)			
CONTRATISTA:	UNION TEMPORAL CEMENTERIOS 2024			
CORREO ELECTRONICO:	sjisuministrossas@gmail.com			
FECHA DE INICIACIÓN:	*01-04-2024*			
PLAZO DE EJECUCIÓN:	*1*	***Meses***		***Días***
FECHA DE TERMINACIÓN:	*30/04/2024*			
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°:	*N/A*			
OBJETO DE LA INTERVENTORÍA:	*N/A*			
CORREO ELECTRONICO:	*N/A*			
SUPERVISOR ASIGNADO:	**ING. MARYLIN PAOLA FONSECA CRUZ** Secretaria de Infraestructura.			
FECHA DE ASIGNACIÓN:	*N/A*			
CORREO ELECTRONICO:	secinfraestructura@puertolopez-meta.gov.co			

MODIFICACIONES AL CONTRATO				
PRORROGA N° 01:				*N/A*
TIEMPO:	*N/A*	***Meses***	*10*	***Días***
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN:				*10 DE MAYO DE 2024*
SUSPENSIÓN N° 01:				*N/A*
TIEMPO:	*N/A*	***Meses***	*N/A*	***Días***
AMPLIACION N° 01 A SUSPENSION N°01:	*N/A*	***Meses***	*N/A*	***Días***


NIT: 892099325-0
Código Postal 502001
Calle 6 No. 4 – 40
Teléfonos 645 0412 – 645 1867
Email: contactenos@puertolopez-meta.gov.co

TIEMPO:				
REINICIO N° 02:	*N/A*			
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN :				*N/A*
MODIFICACIÓN N°01:				*N/A*
VALOR MODIFICADO:				*N/A*
FECHA ADICIONAL N° 01:				*N/A*
VALOR ADICIONAL :				*N/A*
VALOR ACTUALIZADO :				*N/A*
FECHA ACTUAL DE TERMINACION:				*N/A*

LOCALIZACIÓN GEOGRAFICA DEL PROYECTO

MUNICIPIO:	*Puerto López Meta*	***VEREDA:***	*N/A*
CORREGIMIENTO:	*N/A*	***BARRIO:***	*Centro*
COORDENADAS:	*Avenida 14 Carrera 9*		

MAPA DE LOCALIZACIÓN GEOGRAFICA DEL PROYECTO

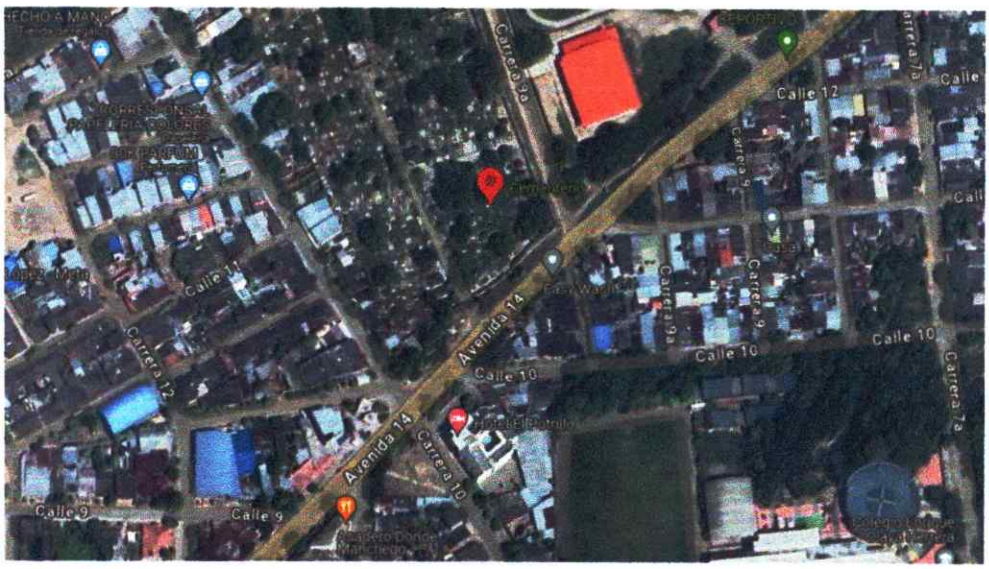

NIT: 892099325-0
Código Postal 502001
Calle 6 No. 4 – 40
Teléfonos 645 0412 – 645 1867
Email: contactenos@puertolopez-meta.gov.co

ALCALDÍA PUERTO LOPEZ	**INFORME DE SUPERVISIÓN O INTERVENTORIA A CONTRATO OBRA- CONSULTORIA-INTERVENTORIA**	**Código: F – 487** Versión: 002 Fecha: agosto de 2023

A. INFORME TECNICO

1. CONTROL PROGRAMACIÓN Y AVANCE

Avance físico

ACTIVIDAD	PROGRAMADO				EJECUTADO			
	MENSUAL		ACUMULADO		MENSUAL		ACUMULADO	
LOCALIZACION Y REPLANTEO CONVENCIONAL OBRA ARQUITECTÓNICA (M2) NO INCLUYE COMISIÓN TOPOGRAFICA.	100%	$ 67.134,57	100%	$ 67.134,57	100%	$ 67.134,57	100%	$ 67.134,57
DESCAPOTE MANUAL H= 0.15 M CON TRASIEGO DE MATERIAL SOBRANTE	100%	$157.909,19	100%	$157.909,19	100%	$157.909,19	100%	$157.909,19
SOLADO, LIMPIEZA EN CONCRETO 13.8 MPa (2000 PSI)	100%	$90.722,47	100%	$90.722,47	100%	$90.722,47	100%	$90.722,47
VIGA EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI)	100%	1.376.066,51	100%	1.376.066,51	100%	1.376.066,51	100%	1.376.066,51

NIT: 892099325-0
Código Postal 502001
Calle 6 No. 4 – 40
Teléfonos 645 0412 – 645 1867
Email: contactenos@puertolopez-meta.gov.co

MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN								
RELLENO CON MATERIAL MIXTO DE RÍO SIN PROCESAR TAMAÑO MAX. 2" SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN MANUAL CON EQUIPO LIVIANO.	*100%*	*225.724,36*	*100%*	*225.724,36*	*100%*	*225.724,36*	*100%*	*225.724,36*
COLUMNA EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	*100%*	*1.207.838,96*	*100%*	*1.207.838,96*	*100%*	*1.207.838,96*	*100%*	*1.207.838,96*
ACERO DE REFUERZO FY=4200 MPa (4200	*100%*	*3.464.934,94*	*100%*	*3.464.934,94*	*100%*	*3.464.934,94*	*100%*	*3.464.934,94*

NIT: 892099325-0
Código Postal 502001
Calle 6 No. 4 – 40
Teléfonos 645 0412 – 645 1867
Email: contactenos@puertolopez-meta.gov.co

KG/CM2, G60) INCLUYE SUMINISTRO, FIGURADO, ARMADO, COLOCACIÓN Y AMARRE.								
MURO EN BLOQUE FLEXA No. 5, 0.12X0.20X 0.30 M (MORTERO TIPO S 1:4)	*100%*	*3.109.584,84*	*100%*	*3.109.584,84*	*100%*	*3.109.584,84*	*100%*	*3.109.584,84*
PLACA DE CONTRAPISO EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	*100%*	*987.368,98*	*100%*	*987.368,98*	*100%*	*987.368,98*	*100%*	*987.368,98*
PLACA DE ENTREPISO MACIZA EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	*100%*	*4.305.798,73*	*68%*	*2.907.812,13*	*68%*	*2.907.812,13*	*68%*	*2.907.812,13*

MALLA ELECTROSOLDADA FY=5000 KG/CM2, 500 MPA. FIGURADO, ARMADO, COLOCACIÓN Y AMARRE. SUMINISTRO E INSTALACIÓN	*100%*	*1.407.294,39*	*100%*	*1.407.294,39*	*100%*	*1.407.294,39*	*100%*	*1.407.294,39*
PAÑETE MURO EXTERIOR Y CULATAS MORTERO 1:4 IMPERMEABILIZADO. SUMINISTRO Y APLICACIÓN.	*100%*	*1.048.171,27*	*100%*	*1.048.171,27*	*100%*	*1.048.171,27*	*100%*	*1.048.171,27*
PAÑETE MUROS INTERIORES MORTERO 1:4 SOBRE MALLA CON VENA. INCLUYE FILOS Y DILATACIONES. SUMINISTRO Y	*100%*	*3.888.733,45*	*100%*	*3.888.733,45*	*100%*	*3.888.733,45*	*100%*	*3.888.733,45*

NIT: 892099325-0
Código Postal 502001
Calle 6 No. 4 – 40
Teléfonos 645 0412 – 645 1867
Email: contactenos@puertolopez-meta.gov.co

APLICACIÓN.								
PINTURA VINILO T. CORAZA EXTERIOR 3 MANOS	*100%*	*794.210,20*	*100%*	*794.210,20*	*100%*	*794.210,20*	*100%*	*794.210,20*
CONSTRUCCION OSARIOS								
DESMONTE DE ESTRUCTURA METALICA DE CUBIERTA. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO	*100%*	*428.863,38*	*100%*	*428.863,38*	*100%*	*428.863,38*	*100%*	*428.863,38*
DESMONTE DE TEJA PLASTICA Y/O DE ZINC. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO	*100%*	*158.616,04*	*100%*	*158.616,04*	*100%*	*158.616,04*	*100%*	*158.616,04*
DEMOLICION CONCRETO SIMPLE. INCLUYE	*100%*	*40.464,16*	*100%*	*40.464,16*	*100%*	*40.464,16*	*100%*	*40.464,16*

NIT: 892099325-0
Código Postal 502001
Calle 6 No. 4 – 40
Teléfonos 645 0412 – 645 1867
Email: contactenos@puertolopez-meta.gov.co

TRASIEGO Y CARGUE MANUAL								
MURO EN BLOQUE FLEXA No. 4 0.10X0.20X 0.30 M(MORTERO TIPO S 1:3)	*10 0%*	*834.659,53*	*100 %*	*834.659,53*	*100 %*	*834.659,53*	*10 0%*	*834.659,53*
PAÑETE MURO EXTERIOR Y CULATAS MORTERO 1:4 IMPERMEABILIZADO. SUMINISTRO Y APLICACIÓN	*10 0%*	*209.564,40*	*100 %*	*209.564,40*	*100 %*	*209.564,40*	*10 0%*	*209.564,40*
PAÑETE MUROS INTERIORES MORTERO 1:4 SOBRE MALLA CON VENA. INCLUYE FILOS Y DILATACIONES. SUMINISTRO Y APLICACIÓN	*10 0%*	*629.874,35*	*100 %*	*629.874,35*	*100 %*	*629.874,35*	*10 0%*	*629.874,35*


PLACA DE ENTREPISO MACIZA EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	*100%*	*715.769,14*	*100%*	*715.769,14*	*100%*	*715.769,14*	*100%*	*715.769,14*
MALLA ELECTROSOLDADA FY=5000 KG/CM2, 500 MPA. FIGURADO, ARMADO, COLOCACIÓN Y AMARRE. SUMINISTRO E INSTALACIÓN	*100%*	*154.343,62*	*100%*	*154.343,62*	*100%*	*154.343,62*	*100%*	*154.343,62*
PEDESTALES EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	*100%*	*44.374,55*	*100%*	*44.374,55*	*100%*	*44.374,55*	*100%*	*44.374,55*
CORREA PERFIL RECTANPHR	*100%*	*875.029,29*	*100%*	*875.029,29*	*100%*	*875.029,29*	*100%*	*875.029,29*

NIT: 892099325-0
Código Postal 502001
Calle 6 No. 4 – 40
Teléfonos 645 0412 – 645 1867
Email: contactenos@puertolopez-meta.gov.co

NEGRO 80X40X2.0 MM CAL. 14								
PINTURA VINILO T. CORAZA EXTERIOR 3 MANOS	*10 0%*	*221.406,76*	*100 %*	*221.406,76*	*100 %*	*221.406,76*	*10 0%*	*221.406,76*
SUMINISTRO E INSTALACIÓN CUBIERTA ARQUITECTONICA METALICA PERFIL TRAPEZOIDAL TIPO ACESCO. NO INCLUYE ESTRUCTURA	*10 0%*	*948.153,58*	*100 %*	*948.153,58*	*100 %*	*948.153,58*	*10 0%*	*948.153,58*
VÍGA AÉREA EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	*10 0%*	*104.727,29*	*100 %*	*104.727,29*	*100 %*	*104.727,29*	*10 0%*	*104.727,29*
ACERO DE REFUERZO FY=4200 MPa (4200 KG/CM2, G60) INCLUYE	*10 0%*	*281.157,58*	*100 %*	*281.157,58*	*100 %*	*281.157,58*	*10 0%*	*281.157,58*

SUMINISTRO, FIGURADO, ARMADO, COLOCACIÓN Y AMARRE								

Grafica Avance Físico

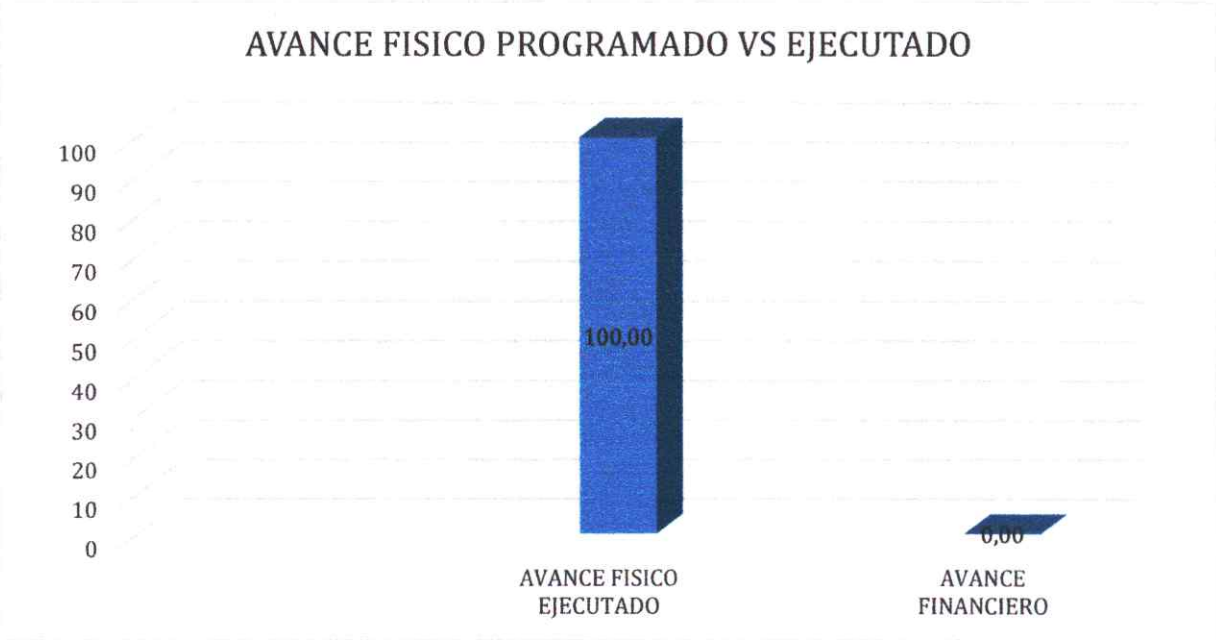

2. *GESTIÓN TECNICA Y DOCUMENTAL*

Relacionar Oficios y documentos proyectados, durante el desarrollo del contrato en el periodo reportado en el presente informe, solicitudes comunidad, entidades, temas varios e Informes presentados, requerimientos y demás.

FECHA OFICIO	REFERENCIA - RADICADO	ASUNTO	QUIEN ELABORA	QUIEN RECIBE
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

NIT: 892099325-0
Código Postal 502001
Calle 6 No. 4 – 40
Teléfonos 645 0412 – 645 1867
Email: contactenos@puertolopez-meta.gov.co

2.1.COMITÉS , REUNIONES Y ASPECTOS SOCIALES

COMITÉ/ REUNION	*FECHA*	*ASPECTOS TRATADOS*
N/A	N/A	N/A

Nota :

B. CUMPLIMIENTO DE PLANES Y ESPECIFICACIONES

1. PROCESO CONSTRUCTIVO

Dentro del tiempo de ejecución el cual corresponde desde el 01 de abril de 2024 al 10 de mayo de 2024, se evidencio que el contratista llevó a cabo el proceso constructivo conforme a las especificaciones técnicas establecidas por la entidad, cumpliendo a cabalidad con las cantidades y actividades contractuales, implementando todos los índices de calidad, seguridad, técnicos y ambientales en cada uno de los ítems reportados en el presente informe.

2. MATERIALES Y CONTROL DE CALIDAD

Ensayos y pruebas de laboratorio realizadas

DESCRIPCIÓN / ENSAYO	*FECHA*	*NORMA*
Densidad en terreno *Ensayo a compresión en cilindros de concreto* *C.B.R Muestra inalterada* *Flexión de Vigas de Concreto* *Rodadura Asfáltica* *Límite de Consistencia* *Desgaste* *Proctor* *Gradación* *Abrasión de Agregados en la Máquina de los ángeles* *Granulometría* *Equivalente de Arena* *otros (Especificar)*	*N/A*	*N/A*

NIT: 892099325-0
Código Postal 502001
Calle 6 No. 4 – 40
Teléfonos 645 0412 – 645 1867
Email: contactenos@puertolopez-meta.gov.co

Nota : *Dar aplicabilidad al F -251 Acta Resumen Ensayos y Pruebas de Laboratorio, remitir como anexo al presente informe*

3. SISTEMA DE GESTIÓN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Relacionar la aplicación de la normatividad vigente sobre seguridad industrial, salud ocupacional y señalización.

FECHA	ACTIVIDAD SST REALIZADA	OBSERVACIÓN /ACCIÓN
N/A	N/A	N/A

Nota : *Diligenciar F- 261 Control de Seguridad Industrial, remitir como anexo al presente informe*

4. MANEJO AMBIENTAL

ACTIVIDAD PROPUESTA PARA EL MANEJO AMBIENTAL	AVANCE DE LA ACTIVIDAD A LA FECHA	OBSERVACIÓN / ACCIÓN
N/A	N/A	N/A

Nota : *Diligenciar F- 253 Implementación Plan de Manejo Ambiental, remitir como anexo al presente informe*

C. INFORME ADMINISTRATIVO

1. PERSONAL ACTUAL PROFESIONAL VIGENTE

NOMBRE	CARGO	% DEDICACION PERSONA- MES
Juan Carlos Palacios Molina	Residente de obra	100%

Nota: *En el caso que durante el periodo reportado en el presente informe existió cambio de personal propuesto inicialmente por el contratista. Es necesario diligenciar, aprobar por las partes el F-243 Acta Aprobación Personal Obra y presentarlo como anexo al presente informe.*

2. APORTES DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

NUMERO DE PLANILLA:		29346085				
NOMBRE PERSONAL	CARGO Y/O OFICIO	CEDULA	DÍAS COT	RELACIONAR EMPRESA PRESTADORA DEL SERVICIO		
				SALUD	PENSIÓN	ARL
Juan carlos palacios molina	Residente de obra	1298008 2	30	165.100	211.300	7000

NIT: 892099325-0
Código Postal 502001
Calle 6 No. 4 – 40
Teléfonos 645 0412 – 645 1867
Email: contactenos@puertolopez-meta.gov.co

NUMERO DE PLANILLA:		29811944				
NOMBRE PERSONAL	CARGO Y/O OFICIO	CEDULA	DÍAS COT	RELACIONAR EMPRESA PRESTADORA DEL SERVICIO		
				SALUD	PENSIÓN	ARL
Juan carlos palacios molina	Residente de obra	1298008 2	30	163.800	209.400	6.900

Nota: *Diligenciar F- 252 Acta Control y Seguimiento Seguridad Social y Parafiscales, remitir como anexo al presente informe*

D. INFORME GESTIÓN CONTRACTUAL Y JURIDICA DEL PROYECTO

1. ACTOS ADMINISTRATIVOS CELEBRADOS

PRORROGAS, SUSPENSIONES, AMPLIACIONES DE SUSPENSION Y REINICIO		
ACTA N° Y FECHA	TIEMPO (MESES / DIAS)	JUSTIFICACIÓN
01 30 -04-2024	10 DIAS	Se prorrogo tiempo para culminar las actividades contratadas

ADICIÓN		
CONTRATO ADICIONAL N° Y FECHA	VALOR ($)	JUSTIFICACIÓN
N/A	N/A	N/A

MODIFICACIÓN		
ACTA N° Y FECHA	VALOR ACTUALIZADO ($)	JUSTIFICACIÓN
N/A	N/A	N/A

2. ACTA DE VISITA PREVIA A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO

N/A

3. ACTA DE SOCIALIZACIÓN PREVIA A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO

N/A

NIT: 892099325-0
Código Postal 502001
Calle 6 No. 4 – 40
Teléfonos 645 0412 – 645 1867
Email: contactenos@puertolopez-meta.gov.co

4. ACTA DE VISITA PREVIA A LA TERMINACIÓN DEL CONTRATO

El dia 10 de Mayo del 2024, se realizó visita al lugar de ejecución de la obra, para realizar el recibo definitivo de obra.

5. ACTA DE SOCIALIZACIÓN DE ENTREGA A LA COMUNIDAD BENEFICIADA CON LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO

N/A

6. GARANTIAS:

6.1. GARANTIA INICIAL

POLIZA DE CUMPLIMIENTO N°	***11-44-101221672***
ANEXO N°	***0***
POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL DERIVADO DE CUMPLIMIENTO N°	***11-40-101061560***
ANEXO N°	***0***
FECHA DE APROBACIÓN POR PARTE DE LA ENTIDAD CONTRATANTE	
NUMERO DE RESOLUCION DE APROBACION	
COMPAÑÍA DE SEGUROS	***SEGUROS DEL ESTADO***

GARANTIAS	***VIGENCIA***		***VALOR ASEGURADO***
	DESDE	***HASTA***	
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	18/03/2024	18/08/2024	$ 3.638.983,00
PAGO SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	18/03/2024	18/04/2027	$ 1.819.491,50
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	30/04/2024	30/04/2029	$ 7.277.966,00
RESPONSABILIDAD CIIVL EXTRACONTRACTUAL	29/11/2022	28/12/2022	$ 260.000.000

NIT: 892099325-0
Código Postal 502001
Calle 6 No. 4 – 40
Teléfonos 645 0412 – 645 1867
Email: contactenos@puertolopez-meta.gov.co

6.2. ACTUALIZACION ACTA DE INICIO

POLIZA DE CUMPLIMIENTO N°	***11-44-101221672***
ANEXO N°	***2***
POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL DERIVADO DE CUMPLIMIENTO N°	***11-40-101061560***
ANEXO N°	***2***
FECHA DE APROBACIÓN POR PARTE DE LA ENTIDAD CONTRATANTE	
NUMERO DE RESOLUCION DE APROBACION	
COMPAÑÍA DE SEGUROS	***SEGUROS DEL ESTADO***

GARANTIAS	***VIGENCIA***		***VALOR ASEGURADO***
	DESDE	***HASTA***	
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	01/04/2024	01/09/2024	$ 3.638.983,00
PAGO SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	01/04/2024	02/05/2027	$ 1.819.491,50
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	02/05/2024	02/05/2029	$ 7.277.966,00
RESPONSABILIDAD CIIVL EXTRACONTRACTUAL	01/04/2024	02/05/2024	$ 260.000.000

6.3 ACTUALIZACION PRORROGA No. 1

POLIZA DE CUMPLIMIENTO N°	***11-44-101221672***
ANEXO N°	***3***
POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL DERIVADO DE CUMPLIMIENTO N°	***11-40-101061560***
ANEXO N°	***3***
FECHA DE APROBACIÓN POR PARTE DE LA ENTIDAD CONTRATANTE	
NUMERO DE RESOLUCION DE APROBACION	
COMPAÑÍA DE SEGUROS	***SEGUROS DEL ESTADO***

NIT: 892099325-0
Código Postal 502001
Calle 6 No. 4 – 40
Teléfonos 645 0412 – 645 1867
Email: contactenos@puertolopez-meta.gov.co

GARANTIAS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	01/04/2024	10/09/2024	$ 3.638.983,00
PAGO SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	01/04/2024	10/05/2027	$ 1.819.491,50
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	02/05/2024	02/05/2029	$ 7.277.966,00
RESPONSABILIDAD CIIVL EXTRACONTRACTUAL	01/04/2024	10/05/2024	$ 260.000.000

6.3. Actualización acta de terminación

POLIZA DE CUMPLIMIENTO N°	***11-44-101221672***
ANEXO N°	***5***
POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL DERIVADO DE CUMPLIMIENTO N°	***11-40-101061560***
ANEXO N°	***N/A***
FECHA DE APROBACIÓN POR PARTE DE LA ENTIDAD CONTRATANTE	
NUMERO DE RESOLUCION DE APROBACION	
COMPAÑÍA DE SEGUROS	***SEGUROS DEL ESTADO***

GARANTIAS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	01/04/2024	10/09/2024	$ 3.638.983,00
PAGO SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	01/04/2024	10/05/2027	$ 1.819.491,50
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	02/05/2024	10/05/2029	$ 7.277.966,00

NIT: 892099325-0
Código Postal 502001
Calle 6 No. 4 – 40
Teléfonos 645 0412 – 645 1867
Email: contactenos@puertolopez-meta.gov.co

RESPONSABILIDAD CIIVL EXTRACONTRACTUAL	01/04/2024	10/05/2024	$ 260.000.000

E. INFORME FINANCIERO

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

No.	FECHA	RUBRO	VALOR
00360	*19/02/2024*	*BPIN 2020505730014 CONSTRUCCION MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE EQUIPAMIENTO Y BIENES DE USO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE PUERTO LOPEZ META*	*$ 36.389.830,00*

REGISTRO PRESUPUESTAL

No.	FECHA	RUBRO	VALOR
00494	*18/03/2024*	*BPIN 2020505730014 CONSTRUCCION MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE EQUIPAMIENTO Y BIENES DE USO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE PUERTO LOPEZ META*	*$ 36.389.830,00*

PAGOS REALIZADOS

ACTA No.	EGRESO No.	FECHA	% EJECUCION	VALOR PAGO	VALOR AMORTIZADO	VALOR DESCUENTO	VALOR ACUMULADO
N/A	*N/A*	*N/A*	*N/A*	*N/A*	*N/A*	*N/A*	*N/A*
		TOTALES					

NIT: 892099325-0
Código Postal 502001
Calle 6 No. 4 – 40
Teléfonos 645 0412 – 645 1867
Email: contactenos@puertolopez-meta.gov.co

ALCALDÍA PUERTO LOPEZ	**INFORME DE SUPERVISIÓN O INTERVENTORIA A CONTRATO OBRA- CONSULTORIA- INTERVENTORIA**	**Código: F – 487** Versión: 002 Fecha: agosto de 2023

PERIODO QUE COMPRENDE EL INFORME FINANCIERO: 01-04-2024 al 10/05/2024

Avance físico ejecutado 100 % y avance financiero ejecutado 0,00%



INVERSION ANTICIPO

CHEQUE/COMPROBANTE No.	FECHA CHEQUE/COMPROB.	BENEFICIARIO	VALOR	ITEM	DESCRIPCIÓN EGRESO
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Nota: *Diligenciar F-226 Acta Plan de Inversión del Anticipo y F-259 Informe Plan Inversión Anticipo Obra , remitir como anexo al presente informe cuando aplique*

F. PROBLEMAS PRESENTADOS Y SOLUCIONES ADOPTADAS

No se contaba dentro del presupuesto con la disposición final de escombros, para lo cual el contratista lo soluciono con el rubro de los imprevistos.

G. AVANCE FISICO A LA FECHA DEL PRESENTE INFORME

La obra actualmente tiene un avance del 100,00% de ejecución de las actividades contratadas.

NIT: 892099325-0
Código Postal 502001
Calle 6 No. 4 – 40
Teléfonos 645 0412 – 645 1867
Email: contactenos@puertolopez-meta.gov.co

ALCALDÍA PUERTO LÓPEZ	INFORME DE SUPERVISIÓN O INTERVENTORIA A CONTRATO OBRA- CONSULTORIA-INTERVENTORIA	Código: F – 487 Versión: 002 Fecha: agosto de 2023

H. REGISTRO FOTOGRÁFICO DEL AVANCE REPORTADO A LA FECHA .

ITEMS	ACTIVIDAD	CANTIDAD	
1.1	BOVEDAS	EJECUTADO	%
	LOCALIZACION Y REPLANTEO CONVENCIONAL OBRA ARQUITECTÓNICA (M2) NO INCLUYE COMISIÓN TOPOGRAFICA	11.88 M2	100
			
	OBSERVACIONES		
	Se ubicó y se marcó el terreno donde se iba a realizar la obra		

NIT: 892099325-0
Código Postal 502001
Calle 6 No. 4 – 40
Teléfonos 645 0412 – 645 1867
Email: contactenos@puertolopez-meta.gov.co

ITEMS	ACTIVIDAD	CANTIDAD	
1.2	BOVEDAS	EJECUTADO	%
	DESCAPOTE MANUAL H= 0.15 M CON TRASIEGO DE MATERIAL SOBRANTE	11.88 M2	100
			
	OBSERVACIONES		
	Se realizó el desplazamiento y retiro de la capa vegetal de forma manual, para iniciar las excavaciones y rellenos pertinentes		

NIT: 892099325-0
Código Postal 502001
Calle 6 No. 4 – 40
Teléfonos 645 0412 – 645 1867
Email: contactenos@puertolopez-meta.gov.co

	INFORME DE SUPERVISIÓN O INTERVENTORIA A CONTRATO OBRA- CONSULTORIA-INTERVENTORIA	Código: F – 487
		Versión: 002
		Fecha: agosto de 2023

ITEMS	ACTIVIDAD	CANTIDAD	
1.3	BOVEDAS	EJECUTADO	%
	SOLADO, LIMPIEZA EN CONCRETO 13.8 MPa (2000 PSI)	0.15 M3	100
			
	OBSERVACIONES		
	Se realiza el solado con la limpieza en concreto de 2000 Psi, 13.8 mpa		

ITEMS	ACTIVIDAD	CANTIDAD	
1.4	BOVEDAS	EJECUTADO	%
	VIGA EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	1.42 M3	100
			
	OBSERVACIONES		
	Se realizó la construcción de las vigas en concreto de 20.7 Mpa para la cimentación		

NIT: 892099325-0
Código Postal 502001
Calle 6 No. 4 – 40
Teléfonos 645 0412 – 645 1867
Email: contactenos@puertolopez-meta.gov.co

ITEMS	ACTIVIDAD	CANTIDAD	
1.5	**BOVEDAS**	**EJECUTADO**	**%**
	RELLENO CON MATERIAL MIXTO DE RÍO SIN PROCESAR TAMAÑO MAX. 2" SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN MANUAL CON EQUIPO LIVIANO	**3.63 M3**	**100**
			
	OBSERVACIONES		
	Se realizó el suministro y compactación con equipo liviano del relleno, con material de rio mixto sin procesar de un tamaño de 2"		

ITEMS	ACTIVIDAD	CANTIDAD	
1.6	**BOVEDAS**	**EJECUTADO**	**%**
	COLUMNA EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	**0.90 M3**	**100**
			
	OBSERVACIONES		
	Se realizo la construcción de las columnas en concreto en obra de 3000PSI, - 20.7 Mpa, según planos		

NIT: 892099325-0
Código Postal 502001
Calle 6 No. 4 – 40
Teléfonos 645 0412 – 645 1867
Email: contactenos@puertolopez-meta.gov.co

ALCALDÍA PUERTO LOPEZ	INFORME DE SUPERVISIÓN O INTERVENTORIA A CONTRATO OBRA- CONSULTORIA-INTERVENTORIA	Código: F – 487 Versión: 002 Fecha: agosto de 2023

ITEMS	ACTIVIDAD	CANTIDAD	
1.7	BOVEDAS	EJECUTADO	%
	ACERO DE REFUERZO FY=4200 MPa (4200 KG/CM2, G60) INCLUYE SUMINISTRO, FIGURADO, ARMADO, COLOCACIÓN Y AMARRE.	151.54 KG	100
			
	OBSERVACIONES		
	Se realizó el suministro, transporte, almacenamiento, corte, doblamiento y colocación de barras de acero en la estructura de concreto.		

ITEMS	ACTIVIDAD	CANTIDAD	
1.8	BOVEDAS	EJECUTADO	%
	MURO EN BLOQUE FLEXA No. 5, 0.12X0.20X0.30 M (MORTERO TIPO S 1:4	57,87 M2	100
			
	OBSERVACIONES		
	Se realizó la construcción del muro en bloque FLEXA No.5. 0.10 0.20 * 0.30 m, de acuerdo a los planos*		

NIT: 892099325-0
Código Postal 502001
Calle 6 No. 4 – 40
Teléfonos 645 0412 – 645 1867
Email: contactenos@puertolopez-meta.gov.co

ITEMS	ACTIVIDAD	CANTIDAD	
1.9	BOVEDAS	EJECUTADO	%
	PLACA DE CONTRAPISO EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	1.25 M3	100
			
	OBSERVACIONES		
	Se realizo la ejecución de la placa en concreto a la vista de 3000 psi		

ITEMS	ACTIVIDAD	CANTIDAD	
1.10	BOVEDAS	EJECUTADO	%
	PLACA DE ENTREPISO MACIZA EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	2.60 M3	68
			
	OBSERVACIONES		
	Se realizó la construcción de la placa maciza en concreto de 3000 Psi – 20.7 Mpa de acuerdo a los planos arquitectónicos y estructurales		


NIT: 892099325-0
Código Postal 502001
Calle 6 No. 4 – 40
Teléfonos 645 0412 – 645 1867
Email: contactenos@puertolopez-meta.gov.co

ITEMS	ACTIVIDAD	CANTIDAD	
1.11	**BOVEDAS**	**EJECUTADO**	**%**
	MALLA ELECTROSOLDADA FY=5000 KG/CM2, 500 MPA. FIGURADO, ARMADO, COLOCACIÓN Y AMARRE. SUMINISTRO E INSTALACIÓN	**151,54 KG**	**100**
			
	OBSERVACIONES		
	Se realizó el suministro y colocación de la malla electro soldada de hacer en la estructura de concreto		

ITEMS	ACTIVIDAD	CANTIDAD	
1.12	**BOVEDAS**	**EJECUTADO**	**%**
	PAÑETE MURO EXTERIOR Y CULATAS MORTERO 1:4 IMPERMEABILIZADO. SUMINISTRO Y APLICACIÓN.	**30.01 M2**	**100**
			
	OBSERVACIONES		
	Se realizó la construcción y aplicación de mezcla de materiales (Arena, cemento gris y agua, denominado pañete en los muros exteriores		

NIT: 892099325-0
Código Postal 502001
Calle 6 No. 4 – 40
Teléfonos 645 0412 – 645 1867
Email: contactenos@puertolopez-meta.gov.co

ITEMS	ACTIVIDAD	CANTIDAD	
1.13	BOVEDAS	EJECUTADO	%
	PAÑETE MUROS INTERIORES MORTERO 1:4 SOBRE MALLA CON VENA. INCLUYE FILOS Y DILATACIONES. SUMINISTRO Y APLICACIÓN	90.57 M2	100
			
	OBSERVACIONES		
	Se realizó la construcción y aplicación de mezcla de materiales (Arena, cemento gris y agua, denominado pañete en los muros interiores		

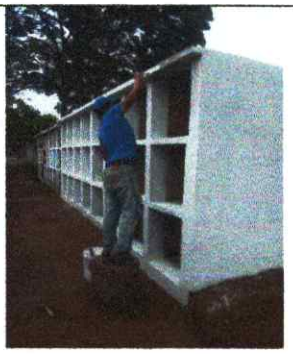ITEMS	ACTIVIDAD	CANTIDAD	
1.14	BOVEDAS	EJECUTADO	%
	PINTURA VINILO T. CORAZA EXTERIOR 3 MANOS	30.01 M2	100
			
	OBSERVACIONES		
	Se realizo la aplicación de pintura vinilo Tipo coraza exterior en 3 manos		

NIT: 892099325-0
Código Postal 502001
Calle 6 No. 4 – 40
Teléfonos 645 0412 – 645 1867
Email: contactenos@puertolopez-meta.gov.co

ALCALDÍA PUERTO LOPEZ	**INFORME DE SUPERVISIÓN O INTERVENTORIA A CONTRATO OBRA- CONSULTORIA- INTERVENTORIA**	**Código: F – 487** Versión: 002 Fecha: agosto de 2023

ITEMS	ACTIVIDAD	CANTIDAD	
2.1	OSARIOS	EJECUTADO	%
	DESMONTE DE ESTRUCTURA METALICA DE CUBIERTA. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO	22.00 M2	100
			
	OBSERVACIONES		
	Se realizo el desmonte de la estructura metálica existente		

ITEMS	ACTIVIDAD	CANTIDAD	
2.2	OSARIOS	EJECUTADO	%
	DESMONTE DE TEJA PLASTICA Y/O DE ZINC. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO	22.00 M2	100
			
	OBSERVACIONES		
	Se realizó el desmonte y retiro de las tejas existentes		

NIT: 892099325-0
Código Postal 502001
Calle 6 No. 4 – 40
Teléfonos 645 0412 – 645 1867
Email: contactenos@puertolopez-meta.gov.co

ITEMS	ACTIVIDAD	CANTIDAD	
2.3	OSARIOS	EJECUTADO	%
	DEMOLICION CONCRETO SIMPLE. INCLUYE TRASIEGO Y CARGUE MANUAL	0.12 M3	100
			
	OBSERVACIONES		
	Se realizó la demolición del concreto simple, y se realizó el respectivo retiro		

ITEMS	ACTIVIDAD	CANTIDAD	
2.4	OSARIOS	EJECUTADO	%
	MURO EN BLOQUE FLEXA No. 4 0.10X0.20X0.30 M(MORTERO TIPO S 1:3)	15.38 M2	100
			
	OBSERVACIONES		
	Se realizo la construcción del muro en bloque Flexa No.5. 0.10 * 0.20 *0.30 M		

NIT: 892099325-0
Código Postal 502001
Calle 6 No. 4 – 40
Teléfonos 645 0412 – 645 1867
Email: contactenos@puertolopez-meta.gov.co

ALCALDÍA PUERTO LÓPEZ	INFORME DE SUPERVISIÓN O INTERVENTORIA A CONTRATO OBRA- CONSULTORIA-INTERVENTORIA	Código: F – 487 Versión: 002 Fecha: agosto de 2023


ITEMS	ACTIVIDAD	CANTIDAD	
2.5	OSARIOS	EJECUTADO	%
	PAÑETE MURO EXTERIOR Y CULATAS MORTERO 1:4 IMPERMEABILIZADO. SUMINISTRO Y APLICACIÓN	6.00 M2	100
			
	OBSERVACIONES		
	Se realizó la aplicación de mezcla en obra de arena, cemento gris y agua en los muros exteriores		

ITEMS	ACTIVIDAD	CANTIDAD	
2.6	OSARIOS	EJECUTADO	%
	PAÑETE MUROS INTERIORES MORTERO 1:4 SOBRE MALLA CON VENA. INCLUYE FILOS Y DILATACIONES. SUMINISTRO Y APLICACIÓN	14.67 M2	100
			
	OBSERVACIONES		
	Se realizó la aplicación de mezcla en obra de arena, cemento gris y agua en los muros Interiores		

NIT: 892099325-0
Código Postal 502001
Calle 6 No. 4 – 40
Teléfonos 645 0412 – 645 1867
Email: contactenos@puertolopez-meta.gov.co

ALCALDIA PUERTO LOPEZ	INFORME DE SUPERVISIÓN O INTERVENTORIA A CONTRATO OBRA- CONSULTORIA- INTERVENTORIA	Código: F – 487
		Versión: 002
		Fecha: agosto de 2023

ITEMS	ACTIVIDAD	CANTIDAD	
2.7	OSARIOS	EJECUTADO	%
	PLACA DE ENTREPISO MACIZA EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	0.64 M3	100
			
	OBSERVACIONES		
	Se realizó la construcción de la placa maciza en concreto de 3000 psi – 20.7 MPS		

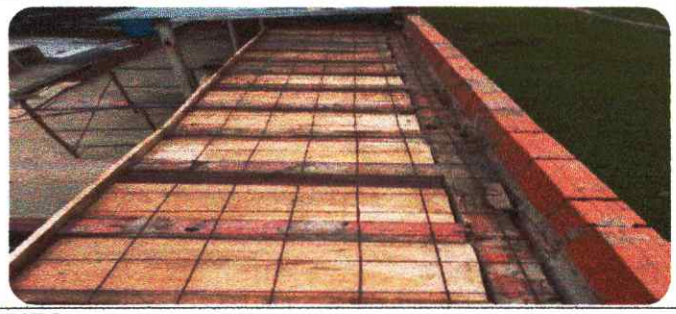ITEMS	ACTIVIDAD	CANTIDAD	
2.8	OSARIOS	EJECUTADO	%
	MALLA ELECTROSOLDADA FY=5000 KG/CM2, 500 MPA. FIGURADO, ARMADO, COLOCACIÓN Y AMARRE. SUMINISTRO E INSTALACIÓN	16.62 KG	100
			
	OBSERVACIONES		
	Se realizó el suministro e instalación de la malla electro soldada de acero en las estructuras de concreto.		

NIT: 892099325-0
Código Postal 502001
Calle 6 No. 4 – 40
Teléfonos 645 0412 – 645 1867
Email: contactenos@puertolopez-meta.gov.co

ALCALDÍA PUERTO LOPEZ	**INFORME DE SUPERVISIÓN O INTERVENTORIA A CONTRATO OBRA- CONSULTORIA- INTERVENTORIA**	**Código: F – 487** Versión: 002 Fecha: agosto de 2023

ITEMS	ACTIVIDAD	CANTIDAD	
2.9	OSARIOS	EJECUTADO	%
	PEDESTALES EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	0.02 M3	100
			
	OBSERVACIONES		
	Se realizó la construcción del pedestal en concreto mezcla en obra de 3000psi		

ITEMS	ACTIVIDAD	CANTIDAD	
2.10	OSARIOS	EJECUTADO	%
	CORREA PERFIL RECTAN PHR NEGRO 80X40X2.0 MM CAL. 14	32.30 ML	100
			
	OBSERVACIONES		
	Se realizó el suministro e instalación de corra perfil RECTAN PHR NEGRO 80X40X2.0 MM CAL. 14		

NIT: 892099325-0
Código Postal 502001
Calle 6 No. 4 – 40
Teléfonos 645 0412 – 645 1867
Email: contactenos@puertolopez-meta.gov.co

ITEMS	ACTIVIDAD	CANTIDAD	
2.11	OSARIOS	EJECUTADO	%
	. PINTURA VINILO T. CORAZA EXTERIOR 3 MANOS	15.67 M2	100
			
	OBSERVACIONES		
	Se realizó la aplicación de pintura vinilo tipo coraza en 3 manos		

ITEMS	ACTIVIDAD	CANTIDAD	
2.12	OSARIOS	EJECUTADO	%
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CUBIERTA ARQUITECTONICA METALICA PERFIL TRAPEZOIDAL TIPO ACESCO. NO INCLUYE ESTRUCTURA	22.00 m2	100
			
	OBSERVACIONES		
	Se realizó el suministro e instalación de la cubierta arquitectónica metálica en perfil trapezoidal acceso		

NIT: 892099325-0
Código Postal 502001
Calle 6 No. 4 – 40
Teléfonos 645 0412 – 645 1867
Email: contactenos@puertolopez-meta.gov.co

ITEMS	ACTIVIDAD	CANTIDAD	
2.13	OSARIOS	EJECUTADO	%
	VÍGA AÉREA EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	0.08 M3	100
			
	OBSERVACIONES		
	Se realizó la construcción de las vigas en concreto en obra de 3000 PSI -20.7 MPA		

ITEMS	ACTIVIDAD	CANTIDAD	
2.14	OSARIOS	EJECUTADO	%
	ACERO DE REFUERZO FY=4200 MPa (4200 KG/CM2, G60) INCLUYE SUMINISTRO, FIGURADO, ARMADO, COLOCACIÓN Y AMARRE	32.58 Kg	100
			
	OBSERVACIONES		
	Se realizo el suministro e instalación delas barras de acero en las estructuras en concreto.		

NIT: 892099325-0
Código Postal 502001
Calle 6 No. 4 – 40
Teléfonos 645 0412 – 645 1867
Email: contactenos@puertolopez-meta.gov.co

G. JUSTIFICACIÓN Y VIABILIDAD A TRAMITE DE PRORROGA – SUSPENSIÓN - REINICIO

El contratista de obra se ve en la obligación de prorrogar el contrato, ya que el mal clima ha presentado fuertes lluvias en el Municipio lo que ocasionó un leve retraso en la ejecución de las actividades contratadas.

Actualmente faltan por ejecutar en el tiempo de la presente solicitud de prórroga los ítems 1.14 PINTURA VINILO T. CORAZA EXTERIOR 3 MANOS de las Bovedas y el ítem 2.05 PAÑETE MURO EXTERIOR Y CULATAS MORTERO 1:4 IMPERMEABILIZADO. SUMINISTRO Y APLICACIÓN, Item 2.12 PINTURA VINILO T. CORAZA EXTERIOR 3 MANOS, ítem 2.13 VÍGA AÉREA EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN, ítem 2.14 ACERO DE REFUERZO FY=4200 MPa (4200 KG/CM2, G60) INCLUYE SUMINISTRO, FIGURADO, ARMADO, COLOCACIÓN Y AMARRE de los osarios.

H. JUSTIFICACIÓN Y VIABILIDAD A TRAMITE DE MODIFICACION – ADICION PRESUPUESTAL

La supervisión da la viabilidad y aprobación a la Solicitud del Contratista frente a trámite de Prorroga, ya que los retrasos presentados se deben a un factor externo que no depende ni del contratista ni de la entidad.

El clima ha estado muy fuerte y en días de lluvias no es posible ejecutar o adelantar labores en obra.

NIT: 892099325-0
Código Postal 502001
Calle 6 No. 4 – 40
Teléfonos 645 0412 – 645 1867
Email: contactenos@puertolopez-meta.gov.co

ALCALDÍA PUERTO LÓPEZ	**INFORME DE SUPERVISIÓN O INTERVENTORIA A CONTRATO OBRA- CONSULTORIA- INTERVENTORIA**	**Código: F – 487** Versión: 002 Fecha: agosto de 2023

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

En el periodo transcurrido desde el 01 de Abril hasta el 10 de mayo, se ejecutó un 100% de las actividades contratadas, dando así por terminado el contrato de obra.

Una vez realizada la visita de recibo de las obras, la supervisión aprueba la liquidación del contrato ya que todas las actividades contratadas fueron ejecutadas a satisfacción.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervinieron y aprueban, a los Dieciocho (18) días del mes de Junio de 2024.

H. ANEXOS

El informe debe contener como mínimo los siguientes soportes documentales:

- Registro fotográfico detallado
- Copia de la bitácora de la obra
- Correspondencia generada entre el contratista – Interventor – supervisor – entidad contratante.
- Control de Seguridad Industrial.
- Control de equipos.
- Estado del tiempo
- Manejo Ambiental
- Actas de comité técnico.
- Copia afiliaciones del personal y pagos de seguridad social.
- Copia de los ensayos de laboratorio, certificados de calidad de los materiales, y demás documentos que soporten el control de calidad.

Firma	Firma
Nombre: MARYLIN PAOLA FONSECA CRUZ	Nombre: JUAN CARLOS PALACIOS MOLINA
SUPERVISOR ASIGNADO	RESIDENTE DE OBRA
N° Matrícula Profesional:	N° Matrícula Profesional: 52202-084671 NRÑ

NIT: 892099325-0
Código Postal 502001
Calle 6 No. 4 – 40
Teléfonos 645 0412 – 645 1867
Email: contactenos@puertolopez-meta.gov.co

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	BOGOTA	11	11-44-101221672	1

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
01	08	2024	18	03	2024	00:00	18	04	2029	23:59	ANEXO DE MODIFICACION

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN
UNION TEMPORAL CEMENTERIO 2024		NIT: 901.811.916-1
DIRECCIÓN: KM 14 VIA ACACIAS VEREDA LAS MERCEDES FCA NARANJITOS	CIUDAD: VILLAVICENCIO, META	TELÉFONO: 3132125961

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:		IDENTIFICACIÓN
MUNICIPIO DE PUERTO LOPEZ		NIT: 892.099.325-0
DIRECCIÓN: CENTRO CALLE 1	CIUDAD: PUERTO LOPEZ, META	TELÉFONO 6450411
ADICIONAL:		

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN ECU010B, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO DE OBRA CIVIL NO. 100-103-13-09-00001-2024 CUYO OBJETO ES: CONSTRUCCION DE BOVEDAS Y OSARIOS EN EL CEMENTERIO DE PUERTO LOPEZ META.

NOTA: SE AMPARA EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, EL PAGO DE MULTAS Y LA CLAUSULA PENAL PECUNIARIA CONVENIDAS.
SEGUROS DEL ESTADO S.A. RENUNCIA AL BENEFICIO DE EXCUSION.

AMPAROS

RIESGO: CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL	SUMA ASEG/ANTERIOR

ACLARACIONES

POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO Y SEGUN ACTA DE INICIO DE FECHA 01/04/2024 SE AJUSTAN VIGENCIA

LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES SIN MODIFICAR CONTINUAN VIGENTES

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ ***(185,639.00)	$ *****(8,000.00)	$ ****(36,791.00)	$ *********(230,430.00)	$ *****(12,736,440.50)	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
FERNANDO PIÑEROS MARTINEZ	195130	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 13 NO 96-60/74 - TELEFONO: 2180903 - BOGOTA, D.C.

11-44-101221672

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	BOGOTA	11	11-44-101221672	1

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
01	08	2024	18	03	2024	00:00	18	04	2029	23:59	ANEXO DE MODIFICACION

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN	
	UNION TEMPORAL CEMENTERIO 2024		NIT: 901.811.916-1
DIRECCIÓN: KM 14 VIA ACACIAS VEREDA LAS MERCEDES FCA NARANJITOS	**CIUDAD:** VILLAVICENCIO, META	**TELÉFONO:**	3132125961

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:		IDENTIFICACIÓN	
	MUNICIPIO DE PUERTO LOPEZ		NIT: 892.099.325-0
DIRECCIÓN: CENTRO CALLE 1	**CIUDAD:** PUERTO LOPEZ, META	**TELÉFONO:**	6450411

ADICIONAL:

TEXTO ACLARATORIO

PARTICIPANTES CONSORCIO - UNION TEMPORAL :

NOMBRE	IDENTIFICACION	PARTICIPACION
PALACIOS MOLINA JUAN CARLOS	12980082	1.00
SJI SUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES S.A.S	901539430-7	99.00

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 13 NO 96-60/74 - TELEFONO: 2180903 - BOGOTA, D.C.

11-44-101221672

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

DIRLAYALBINO

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	BOGOTA	11	11-44-101221672	2

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
01	08	2024	01	04	2024	00:00	02	05	2029	23:59	ANEXO DE TRASLADO DE VIGENCIA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL	IDENTIFICACIÓN
UNION TEMPORAL CEMENTERIO 2024	NIT: 901.811.916-1

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
KM 14 VIA ACACIAS VEREDA LAS MERCEDES FCA NARANJITOS	VILLAVICENCIO, META	3132125961

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:	IDENTIFICACIÓN
MUNICIPIO DE PUERTO LOPEZ	NIT: 892.099.325-0

DIRECCIÓN:	CIUDAD:	TELÉFONO
CENTRO CALLE 1	PUERTO LOPEZ, META	6450411

ADICIONAL:

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN ECU010B, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO DE OBRA CIVIL NO. 100-103-13-09-00001-2024 CUYO OBJETO ES: CONSTRUCCION DE BOVEDAS Y OSARIOS EN EL CEMENTERIO DE PUERTO LOPEZ META.

NOTA: SE AMPARA EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, EL PAGO DE MULTAS Y LA CLAUSULA PENAL PECUNIARIA CONVENIDAS.
SEGUROS DEL ESTADO S.A. RENUNCIA AL BENEFICIO DE EXCUSION.

AMPAROS

RIESGO: CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL	SUMA ASEG/ANTERIOR
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	01/04/2024	01/09/2024	$3,638,983.00	
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	01/04/2024	02/05/2027	$1,819,491.50	
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	02/05/2024	02/05/2029	$7,277,966.00	

ACLARACIONES

POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO Y SEGUN ACTA DE INICIO DE FECHA 01/04/2024 SE AJUSTAN VIGENCIA

LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES SIN MODIFICAR CONTINUAN VIGENTES

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ *****185,639.00	$ *******8,000.00	$ ******36,791.00	$ **********230,430.00	$ *******12,736,440.50	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
FERNANDO PIÑEROS MARTINEZ	195130	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 13 NO 96-60/74 - TELEFONO: 2180903 - BOGOTA, D.C.

11-44-101221672

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	BOGOTA	11	11-44-101221672	2

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
01	08	2024	01	04	2024	00:00	02	05	2029	23:59	ANEXO DE TRASLADO DE VIGENCIA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN
UNION TEMPORAL CEMENTERIO 2024		NIT: 901.811.916-1
DIRECCIÓN: KM 14 VIA ACACIAS VEREDA LAS MERCEDES FCA NARANJITOS	**CIUDAD:** VILLAVICENCIO, META	**TELÉFONO:** 3132125961

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:		IDENTIFICACIÓN
MUNICIPIO DE PUERTO LOPEZ		NIT: 892.099.325-0
DIRECCIÓN: CENTRO CALLE 1	**CIUDAD:** PUERTO LOPEZ, META	**TELÉFONO:** 6450411

ADICIONAL:

TEXTO ACLARATORIO

PARTICIPANTES CONSORCIO - UNION TEMPORAL :

NOMBRE	IDENTIFICACION	PARTICIPACION
PALACIOS MOLINA JUAN CARLOS	12980082	1.00
SJI SUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES S.A.S	901539430-7	99.00

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 13 NO 96-60/74 - TELEFONO: 2180903 - BOGOTA, D.C.

11-44-101221672

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

DIRLA YALBINO

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

117

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

RCE CONTRATOS

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	BOGOTA	11	11-40-101061560	2

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
01	08	2024	01	04	2024	00:00	02	05	2024	23:59	ANEXO DE TRASLADO DE VIGENCIA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN
UNION TEMPORAL CEMENTERIO 2024		NIT: 901.811.916-1
DIRECCIÓN: KM 14 VIA ACACIAS VEREDA LAS MERCEDES FCA NARANJITOS	CIUDAD: VILLAVICENCIO, META	TELÉFONO: 3132125961

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO:		IDENTIFICACIÓN
MUNICIPIO DE PUERTO LOPEZ		NIT: 892.099.325-0
DIRECCIÓN: CENTRO CALLE 1	CIUDAD: PUERTO LOPEZ, META	TELÉFONO 6450411

BENEFICIARIO: 892099325 - MUNICIPIO DE PUERTO LOPEZ

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN 15-05-2020 - 1329-P-06-00000-E-RCE-002A-D00I / 31-03-22 -1329-P-06-00000-E-RCE-001P-D00I, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

SE AMPARA LA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DEL CONTRATO DE OBRA CIVIL NO. 100-103-13-09-00001-2024 CUYO OBJETO ES: CONSTRUCCION DE BOVEDAS Y OSARIOS EN EL CEMENTERIO DE PUERTO LOPEZ META.

NOTA:
BENEFICIARIOS: TERCEROS AFECTADOS.

AMPAROS

RIESGO: CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES

AMPAROS	DEDUCIBLE	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG ACTUAL	SUMA ASEG ANTERIOR
PREDIOS LABORES Y OPERACIONES	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	01/04/2024	02/05/2024	$260,000,000.00	
DAÑO EMERGENTE Y LUCRO CESANTE	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	01/04/2024	02/05/2024	$260,000,000.00	
PERJUICIOS EXTRAPATRIMONIALES	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	01/04/2024	02/05/2024	$260,000,000.00	

ACLARACIONES

POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO Y SEGUN ACTA DE INICIO DE FECHA 01/04/2024 SE AJUSTAN VIGENCIA

LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES SIN MODIFICAR CONTINUAN VIGENTE

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ ******88,328.00	$ *******3,000.00	$ ******17,352.00	$ **********108,681.00	$ ******260,000,000.00	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
FERNANDO PIÑEROS MARTINEZ	195130	100.00			

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO.
QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.
NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN
PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 13 NO 96-60/74 - TELEFONO: 2180903 - BOGOTA, D.C.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

11-40-101061560

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

1/8

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

RCE CONTRATOS

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	BOGOTA	11	11-40-101061560	2

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
01	08	2024	01	04	2024	00:00	02	05	2024	23:59	ANEXO DE TRASLADO DE VIGENCIA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN
UNION TEMPORAL CEMENTERIO 2024		NIT: 901.811.916-1
DIRECCIÓN: KM 14 VIA ACACIAS VEREDA LAS MERCEDES FCA NARANJITOS	**CIUDAD:** VILLAVICENCIO, META	**TELÉFONO:** 3132125961

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO:		IDENTIFICACIÓN
MUNICIPIO DE PUERTO LOPEZ		NIT: 892.099.325-0
DIRECCIÓN: CENTRO CALLE 1	**CIUDAD:** PUERTO LOPEZ, META	**TELÉFONO:** 6450411

BENEFICIARIO: 892099325 - MUNICIPIO DE PUERTO LOPEZ

AMPAROS	DEDUCIBLE	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG ACTUAL	SUMA ASEG ANTERIOR
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	01/04/2024	02/05/2024	$260,000,000.00	
RESPONSABILIDAD CIVIL PATRONAL	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	01/04/2024	02/05/2024	$260,000,000.00	
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	01/04/2024	02/05/2024	$260,000,000.00	

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO. QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 13 NO 96-60/74 - TELEFONO: 2180903 - BOGOTA, D.C.

11-40-101061560

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

DIRLAYALBINO

2

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

RCE CONTRATOS

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	BOGOTA	11	11-40-101061560	2

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
01	08	2024	01	04	2024	00:00	02	05	2024	23:59	ANEXO DE TRASLADO DE VIGENCIA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN
UNION TEMPORAL CEMENTERIO 2024		NIT: 901.811.916-1

DIRECCIÓN:	CIUDAD:	TELEFONO:
KM 14 VIA ACACIAS VEREDA LAS MERCEDES FCA NARANJITOS	VILLAVICENCIO, META	3132125961

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO:		IDENTIFICACIÓN
MUNICIPIO DE PUERTO LOPEZ		NIT: 892.099.325-0

DIRECCIÓN:	CIUDAD:	TELÉFONO:
CENTRO CALLE 1	PUERTO LOPEZ, META	6450411

BENEFICIARIO: 892099325 - MUNICIPIO DE PUERTO LOPEZ

TEXTO ACLARATORIO

PARTICIPANTES CONSORCIO - UNION TEMPORAL :

NOMBRE	IDENTIFICACION	PARTICIPACION
PALACIOS MOLINA JUAN CARLOS	12980082	1.00
SJI SUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES S.A.S	901539430-7	99.00

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO. QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 13 NO 96-60/74 - TELEFONO: 2180903 - BOGOTA, D.C.

11-40-101061560

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

180

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	BOGOTA	11	11-44-101221672	3

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
01	08	2024	01	04	2024	00:00	02	05	2029	23:59	ANEXO DE PRORROGA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL	IDENTIFICACIÓN
UNION TEMPORAL CEMENTERIO 2024	NIT: 901.811.916-1

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
KM 14 VIA ACACIAS VEREDA LAS MERCEDES FCA NARANJITOS	VILLAVICENCIO, META	3132125961

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:	IDENTIFICACIÓN
MUNICIPIO DE PUERTO LOPEZ	NIT: 892.099.325-0

DIRECCIÓN:	CIUDAD:	TELÉFONO
CENTRO CALLE 1	PUERTO LOPEZ, META	6450411

ADICIONAL:

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN ECU010B, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO DE OBRA CIVIL NO. 100-103-13-09-00001-2024 CUYO OBJETO ES: CONSTRUCCION DE BOVEDAS Y OSARIOS EN EL CEMENTERIO DE PUERTO LOPEZ META.

NOTA: SE AMPARA EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, EL PAGO DE MULTAS Y LA CLAUSULA PENAL PECUNIARIA CONVENIDAS.
SEGUROS DEL ESTADO S.A. RENUNCIA AL BENEFICIO DE EXCUSION.

AMPAROS

RIESGO: CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL	SUMA ASEG/ANTERIOR
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	01/04/2024	10/09/2024	$3,638,983.00	$3,638,983.00
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	01/04/2024	10/05/2027	$1,819,491.50	$1,819,491.50
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	02/05/2024	02/05/2029	$7,277,966.00	

ACLARACIONES

POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO Y SEGUN ACTA DE PRORROGA No.1 DE FECHA DEL 30/04/2024, SE PRORROGA HASTA EL 10/05/2024

LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES SIN MODIFICAR CONTINUAN VIGENTE

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ ******16,000.00	$ *******8,000.00	$ *******4,560.00	$ **********28,560.00	$ *******12,736,440.50	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
FERNANDO PIÑEROS MARTINEZ	195130	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 13 NO 96-60/74 - TELEFONO: 2180903 - BOGOTA, D.C.

11-44-101221672

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	BOGOTA	11	11-44-101221672	3

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
01	08	2024	01	04	2024	00:00	02	05	2029	23:59	ANEXO DE PRORROGA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN
UNION TEMPORAL CEMENTERIO 2024		NIT: 901.811.916-1
DIRECCIÓN: KM 14 VIA ACACIAS VEREDA LAS MERCEDES FCA NARANJITOS	**CIUDAD:** VILLAVICENCIO, META	**TELÉFONO:** 3132125961

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:		IDENTIFICACIÓN
MUNICIPIO DE PUERTO LOPEZ		NIT: 892.099.325-0
DIRECCIÓN: CENTRO CALLE 1	**CIUDAD:** PUERTO LOPEZ, META	**TELÉFONO:** 6450411

ADICIONAL:

TEXTO ACLARATORIO

PARTICIPANTES CONSORCIO - UNION TEMPORAL :

NOMBRE	IDENTIFICACION	PARTICIPACION
PALACIOS MOLINA JUAN CARLOS	12980082	1.00
SJI SUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES S.A.S	901539430-7	99.00

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 13 NO 96-60/74 - TELEFONO: 2180903 - BOGOTA, D.C.

11-44-101221672

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

DIRLEYALBINO

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

RCE CONTRATOS

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	BOGOTA	11	11-40-101061560	3

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
02	08	2024	01	04	2024	00:00	10	05	2024	23:59	ANEXO DE PRORROGA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL	IDENTIFICACIÓN
UNION TEMPORAL CEMENTERIO 2024	NIT: 901.811.916-1

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
KM 14 VIA ACACIAS VEREDA LAS MERCEDES FCA NARANJITOS	VILLAVICENCIO, META	3132125961

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO	IDENTIFICACIÓN
MUNICIPIO DE PUERTO LOPEZ	NIT: 892.099.325-0

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CENTRO CALLE 1	PUERTO LOPEZ, META	6450411

BENEFICIARIO: 892099325 - MUNICIPIO DE PUERTO LOPEZ

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN 15-05-2020 - 1329-P-06-00000-E-RCE-002A-D00I / 31-03-22 -1329-P-06-00000-E-RCE-001P-D00I, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

SE AMPARA LA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DEL CONTRATO DE OBRA CIVIL NO. 100-103-13-09-00001-2024 CUYO OBJETO ES: CONSTRUCCION DE BOVEDAS Y OSARIOS EN EL CEMENTERIO DE PUERTO LOPEZ META.

NOTA:
BENEFICIARIOS: TERCEROS AFECTADOS.

AMPAROS

RIESGO: CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES

AMPAROS	DEDUCIBLE	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG ACTUAL	SUMA ASEG ANTERIOR
PREDIOS LABORES Y OPERACIONES	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	01/04/2024	10/05/2024	$260,000,000.00	$260,000,000.00
DAÑO EMERGENTE Y LUCRO CESANTE	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	01/04/2024	10/05/2024	$260,000,000.00	$260,000,000.00
PERJUICIOS EXTRAPATRIMONIALES	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	01/04/2024	10/05/2024	$260,000,000.00	$260,000,000.00

ACLARACIONES

POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO Y SEGUN ACTA DE PRORROGA No.1 DE FECHA DEL 30/04/2024, SE PRORROGA HASTA EL 10/05/2024

LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES SIN MODIFICAR CONTINUAN VIGENTE

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ ******22,794.00	$ *******3,000.00	$ *******4,900.00	$ **********30,695.00	$ ******260,000,000.00	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
FERNANDO PIÑEROS MARTINEZ	195130	100.00			

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO.

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 13 NO 96-60/74 - TELEFONO: 2180903 - BOGOTA, D.C.

11-40-101061560

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

RCE CONTRATOS

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	BOGOTA	11	11-40-101061560	3

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
02	08	2024	01	04	2024	00:00	10	05	2024	23:59	ANEXO DE PRORROGA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN
UNION TEMPORAL CEMENTERIO 2024		NIT: 901.811.916-1
DIRECCIÓN: KM 14 VIA ACACIAS VEREDA LAS MERCEDES FCA NARANJITOS	**CIUDAD:** VILLAVICENCIO, META	**TELÉFONO:** 3132125961

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO:		IDENTIFICACIÓN
MUNICIPIO DE PUERTO LOPEZ		NIT: 892.099.325-0
DIRECCIÓN: CENTRO CALLE 1	**CIUDAD:** PUERTO LOPEZ, META	**TELÉFONO:** 6450411

BENEFICIARIO: 892099325 - MUNICIPIO DE PUERTO LOPEZ

AMPAROS	DEDUCIBLE	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG ACTUAL	SUMA ASEG ANTERIOR
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	01/04/2024	10/05/2024	$260,000,000.00	$260,000,000.00
RESPONSABILIDAD CIVIL PATRONAL	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	01/04/2024	10/05/2024	$260,000,000.00	$260,000,000.00
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	01/04/2024	10/05/2024	$260,000,000.00	$260,000,000.00

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO. QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 13 NO 96-60/74 - TELEFONO: 2180903 - BOGOTA, D.C.

11-40-101061560

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

RCE CONTRATOS

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	BOGOTA	11	11-40-101061560	3

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
02	08	2024	01	04	2024	00:00	10	05	2024	23:59	ANEXO DE PRORROGA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN
UNION TEMPORAL CEMENTERIO 2024		NIT: 901.811.916-1
DIRECCIÓN: KM 14 VIA ACACIAS VEREDA LAS MERCEDES FCA NARANJITOS	**CIUDAD:** VILLAVICENCIO, META	**TELÉFONO:** 3132125961

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO:		IDENTIFICACIÓN
MUNICIPIO DE PUERTO LOPEZ		NIT: 892.099.325-0
DIRECCIÓN: CENTRO CALLE 1	**CIUDAD:** PUERTO LOPEZ, META	**TELÉFONO:** 6450411

BENEFICIARIO: 892099325 - MUNICIPIO DE PUERTO LOPEZ

TEXTO ACLARATORIO

PARTICIPANTES CONSORCIO - UNION TEMPORAL :

NOMBRE	IDENTIFICACION	PARTICIPACION
PALACIOS MOLINA JUAN CARLOS	12980082	1.00
SJI SUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES S.A.S	901539430-7	99.00

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO. QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 13 NO 96-60/74 - TELEFONO: 2180903 - BOGOTA, D.C.

11-40-101061560

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

DIRLA/ALBINO

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	BOGOTA	11	11-44-101221672	5

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
01	08	2024	01	04	2024	00:00	10	05	2029	23:59	ANEXO DE PRORROGA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL	IDENTIFICACIÓN
UNION TEMPORAL CEMENTERIO 2024	NIT: 901.811.916-1

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
KM 14 VIA ACACIAS VEREDA LAS MERCEDES FCA NARANJITOS	VILLAVICENCIO, META	3132125961

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:	IDENTIFICACIÓN
MUNICIPIO DE PUERTO LOPEZ	NIT: 892.099.325-0

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CENTRO CALLE 1	PUERTO LOPEZ, META	6450411

ADICIONAL:

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN ECU010B, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO DE OBRA CIVIL NO. 100-103-13-09-00001-2024 CUYO OBJETO ES: CONSTRUCCION DE BOVEDAS Y OSARIOS EN EL CEMENTERIO DE PUERTO LOPEZ META.

NOTA: SE AMPARA EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, EL PAGO DE MULTAS Y LA CLAUSULA PENAL PECUNIARIA CONVENIDAS.
SEGUROS DEL ESTADO S.A. RENUNCIA AL BENEFICIO DE EXCUSION.

AMPAROS

RIESGO: CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL	SUMA ASEG/ANTERIOR
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	01/04/2024	10/09/2024	$3,638,983.00	
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	01/04/2024	10/05/2027	$1,819,491.50	
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	10/05/2024	10/05/2029	$7,277,966.00	$7,277,966.00

ACLARACIONES

POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO Y SEGUN ACTA DE TERMINACION DE FECHA 10/05/2024 SE AJUSTA EL AMPARO DE ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA

LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES SIN MODIFICAR CONTINUAN VIGENTE

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ **********0.00	$ **********0.00	$ **********0.00	$ **********0.00	$ *******12,736,440.50	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
FERNANDO PIÑEROS MARTINEZ	195130	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 13 NO 96-60/74 - TELEFONO: 2180903 - BOGOTA, D.C.

11-44-101221672

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	BOGOTA	11	11-44-101221672	5

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
01	08	2024	01	04	2024	00:00	10	05	2029	23:59	ANEXO DE PRORROGA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN	
UNION TEMPORAL CEMENTERIO 2024		NIT: 901.811.916-1	
DIRECCIÓN: KM 14 VIA ACACIAS VEREDA LAS MERCEDES FCA NARANJITOS	**CIUDAD:** VILLAVICENCIO, META	**TELÉFONO:**	3132125961

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:		IDENTIFICACIÓN	
MUNICIPIO DE PUERTO LOPEZ		NIT: 892.099.325-0	
DIRECCIÓN: CENTRO CALLE 1	**CIUDAD:** PUERTO LOPEZ, META	**TELÉFONO:**	6450411

ADICIONAL:

TEXTO ACLARATORIO

PARTICIPANTES CONSORCIO - UNION TEMPORAL :

NOMBRE	IDENTIFICACION	PARTICIPACION
PALACIOS MOLINA JUAN CARLOS	12980082	1.00
SJI SUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES S.A.S	901539430-7	99.00

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 13 NO 96-60/74 - TELEFONO: 2180903 - BOGOTA, D.C.

11-44-101221672

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

	ACTA PARCIAL DE PAGO	F-109
		Version:002
		FECHA AGOSTO DE 2023

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

TIPO DE CONTRATO	OBRA		CONTRATO N°	100-103-13-09-00001-2024	
OBJETO	CONSTRUCCION BOVEDAS Y OSARIOS EN EL CEMENTERIO DEL MUNICIPIO DE PUERTO LOPEZ – META				
CONTRATISTA	UNION TEMPORAL CEMENTERIOS 2024		NIT Ó CÉDULA	901.811.916-1	
REPRESENTANTE LEGAL DEL CONTRATISTA	ERIKA LORENA LESMES AGUIRRE	CÉDULA	1.121.865.059	No. CELULAR	3132125961
CONTRATO DE INTERVENTORIA N°	N/A	CONTRATISTA DE INTERVENTORIA	N/A		
NIT Ó CÉDULA	N/A	REPRESENTANTE LEGAL DE LA INTERVENTORIA	N/A		
NOMBRE SUPERVISOR	MARYLIN PAOLA FONSECA CRUZ	CARGO	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA		
VALOR DEL CONTRATO INICIAL	$ 36.389.830,00	FECHA DEL CONTRATO	18/03/2024		
PLAZO DE EJECUCION	DIAS 0	MESES 1	HASTA	30/04/2024	
FECHA DE INICIO	1/04/2024	FECHA DE TERMINACION INICIAL :	30/04/2024		

FORMA DE PAGO :

El Municipio pagará el valor del contrato resultante del presente proceso de la siguiente manera.
El municipio pagará al contratista pagos parciales hasta el 90% del valor del contrato, teniendo en cuenta el avance físico de la obra, y el 10% restante se cancelará con la liquidación del contrato, para lo cual se tendrá en cuenta lo siguiente
a) El valor de la primera acta parcial se realizará cuando se haya ejecutado como mínimo el veinte (20%) de ejecución de avance de la obra, liquidadas por el sistema de Precios Unitarios, pactadas en el contrato o debidamente aprobadas por la supervisión, previa presentación de informe de contratista, soportes de pagos de seguridad social y parafiscales, informe de supervisor, factura y demás documentos solicitados.
b) Un 70% mediante actas parciales de obra, liquidadas por el sistema de Precios Unitarios, pactadas en el contrato o debidamente aprobadas por la supervisión previa presentación de informe de contratista, soportes de pagos de seguridad social y parafiscales, informe de supervisión, factura y demás documentos solicitados.
c) El Diez por ciento (10%) final, o la liquidación del contrato, previa certificación de cumplimiento total de la ejecución suscrita por el supervisor designado y la suscripción del acta de liquidación final por parte del supervisor designado y las partes.
Para el trámite del pago el contratista deberá presentar ante el SUPERVISOR:
1.La CERTIFICACIÓN de cumplimiento por parte de la supervisión, como funcionario competente para ejercer las tareas de vigilancia de la correcta ejecución contractual.
2.La factura o documento equivalente, según corresponda en cada caso.
3.La acreditación del pago de seguridad social integral y parafiscal si a ello hubiere lugar.
4.Acta de recibo Parcial debidamente suscrita por el MUNICIPIO y el CONTRATISTA.
5.Memorias de cálculo de cada ítem, soportado con registro fotográfico a color, registrando cada uno de los ítems de ejecución. 6. Copia de la bitácora.
7.Para efectos de cada pago (parcial y final), el supervisor deberá exigir al contratista la acreditación sobre el cumplimiento de sus obligaciones frente al Sistema Integral de Seguridad Social y parafiscales, en los términos de las Leyes 789 de 2002, 828 de 2003, 1150 de 2.007 y demás normas complementarias y reglamentarias sobre la materia.
8 Todos los documentos exigidos por parte de la supervisión, para lo cual se entregará al contratista la lista con requisitos documentales según corresponda para el trámite de los pagos. Entre los que se encuentran los siguientes: Acta de pago parcial, memorias de cálculo, informe técnico con el cumplimiento de las obligaciones pactadas, actos administrativos, garantías del contrato, aportes de seguridad social, registro de avance de obra, seguimiento de comités técnicos. Registro fotográfico de cada una de las actividades reportadas y conclusiones técnicas, pruebas de calidad (laboratorios), certificado de calidad de materiales utilizados, factura de cobro.
9.Para el pago final se debe presentar la respectiva acta de terminación y de liquidación.
10.Y los demás que legalmente sean aplicables.
La última acta de pago no será inferior al DIEZ POR CIENTO (10%) del valor total del contrato y se cancelará una vez el Contratista entregue al Municipio.
-Acta de liquidación del contrato debidamente suscrita por EL MUNICIPIO y el CONTRATISTA
-Paz y salvo del Ministerio de la Protección Social donde se haga constar la inexistencia de reclamaciones laborales a cargo del contratista, y Paz y Salvo de pagos de aportes parafiscales por el contrato ejecutado.
-Paz y salvo del personal vinculado al contrato durante el termino de ejecución
-Memorias de cálculo de cada ítem, con su registro fotográfico a color.
-Planos Récord debidamente avalados, que incluya detalles, refuerzos estructurales conforme las actividades ejecutadas en cumplimiento del objeto contratado.
-Registro fotográfico (archivo jpg) secuencial ítem por ítem contratado, con el compilado de todas las fotografías tomadas a lo largo de la ejecución del contrato.
-Todos los soportes digitalizados.
-Original de la bitácora.
-Actualización de la garantía única.
-Acta de Entrega
-Manual de Mantenimiento y operación.
-Pruebas de calidad (laboratorios) conforme las actividades contratadas
-Certificado de calidad de los materiales utilizados en la ejecución de actividades contratadas.
-Informe técnico final donde se relaciona toda la cronología del contrato, actuaciones administrativas, pagos realizados, garantías del contrato actualizadas con fecha de aprobación, cumplimiento de las obligaciones pactadas, relación del personal y sus aportes al sistema integral de seguridad social, registro de las actividades ejecutadas, registro fotográfico, conclusiones técnicas.
-Informe de legalización de los gastos Administrativos, con respectivos soportes
-Informe de legalización de los gastos Imprevistos, con respectivos soportes
-Los pagos correspondientes deberán contar con el previo Vo.Bo. del Supervisor designado por EL MUNICIPIO y la certificación de recibo a satisfacción de las obras entregadas.
Si el contratista no presenta la cuenta con sus soportes respectivos, dentro de la vigencia fiscal correspondiente, no podrá hacer ninguna reclamación judicial o extrajudicial de actualizaciones, intereses o sobrecostos sobre el valor de la cuenta.Para el caso de Imprevistos se deberá suscribir Acta de liquidación de imprevistos causados, debidamente justificados suscrita por el Supervisor y el Contratista previo informe de los mismos allegados por el Contratista el porcentaje destinado de Imprevistos del AIU. El pago y reconocimiento de los imprevistos serán analizados por el municipio a través del supervisor de conformidad con las orientaciones impartidas por la Contralor a Departamental del Meta en Circular externa No. 13 del 19 de abril de 2021.
Los pagos se realizarán mediante transferencias bancarias a las cuentas del contratista y para tal efecto se enviarán las facturas al correo electrónico sechacienda@puertolopez-meta.gov.co
El contratista solicitara de manera voluntaria el plan de pagos, teniendo en cuenta el cumplimiento de las disposiciones expuestas en este numeral.
El Contratista deberá presentar para el trámite de sus cuentas además de los documentos relacionados la factura de venta, conforme al Decreto 2242 de 2015, y la Resolución 000042 de 2020, la cual deberá ser enviada al correo electrónico sechacienda@puertolopez-meta.gov.co, la fecha de la factura debe corresponder al mes de su elaboración, y en ella consterá el número del contrato, el concepto del bien o servicio que se está cobrando. En caso de no estar obligado a facturar, deberá presentar el documento equivalente
Nota1. Todos los pagos estarán sujetos a los descuentos que efectúe la Tesorería Municipal, sin perjuicio del cumplimiento del objeto contractual y demás requisitos legales para su cancelación.

No. CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	00360	FECHA:	19/02/2024	No. REGISTRO PRESUPUESTAL:	00494	FECHA:	18/04/2024
VALOR	$ 36.389.830,00			VALOR :	$ 36.389.830,00		

FUENTES DE FINANCIACION :

FUENTE:	VALOR:
PROPIOS	$ 36.389.830,00
N/A	$
N/A	$

CODIGO Y DENOMINACION PRESUPUESTAL : 2.3.40.4002.1400.05 BPIN 20205057300014 Construcción mejoramiento y mantenimiento de la infraestructura de equipamiento y bienes de uso público del municipio de Puerto López

2. ANTECEDENTES DEL CONTRATO

A. PRORROGAS

ACTA N°	FECHA ACTA	TIEMPO MES	TIEMPO DIAS
1	30/04/2024	0	10
N/A	N/A	N/A	N/A

B. SUSPENSIONES - AMPLIACIONES A SUSPENSIONES

ACTA N°	FECHA ACTA	TIEMPO MES	TIEMPO DIAS
N/A	N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A	N/A

C. REINICIO

ACTA N°	FECHA ACTA	TIEMPO SUSPENSION MES	TIEMPO SUSPENSION DIAS
N/A	N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A	N/A

FECHA ACTUAL DE TERMINACIÓN 10/05/2024

D. MODIFICACION DE CANTIDADES (BALANCE DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES)

ACTA N°	FECHA ACTA	VALOR ($)
N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A

VALOR ACTUAL DEL CONTRATO ($) N/A

E. ADICIONES PRESUPUESTALES

ACTA N°	FECHA ACTA	VALOR ($)
N/A	N/A	N/A

No. CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	N/A	FECHA:	N/A	No. REGISTRO PRESUPUESTAL:	N/A	FECHA:	N/A
VALOR	N/A			VALOR :	N/A		

FUENTES DE FINANCIACION :

FUENTE:	VALOR:
N/A	N/A
N/A	N/A
N/A	N/A
N/A	N/A

CODIGO Y DENOMINACION PRESUPUESTAL : N/A

VALOR ACTUALIZADO DEL CONTRATO ($) N/A

3. CONDICIONES ACTUALES DEL CONTRATO

VALOR ACTUALIZADO DEL CONTRATO ($) N/A

PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO 10 DIAS 1 MESES

FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL DEL CONTRATO 10/05/2024

	ACTA PARCIAL DE PAGO	F-109 Version:002 FECHA : AGOSTO DE 2023

En las instalaciones locativas de la Alcaldía Municipal de Puerto López-Meta a los Dieciocho (18) días del mes Junio del año 2024 se reunieron : **UNION TEMPORAL CEMENTERIOS 2024**, identificada con Nit 901.811.916-1, Representada Legalmente por **ERIKA LORENA LESMES AGUIRRE** identificada con C.C 1.121.865.059, y la ingeniera **MARYLIN PAOLA FONSECA CRUZ**, actuando en calidad de supervisor del Contrato de obras No. 100-103-13-09-00001-2024 DE 2024 suscrito el día 18/03/2024, con el fin de suscribir la presente ACTA FINAL del contrato mencionado anteriormente así:

(a) ITEM No.	(b) DESCRIPCION ACTIVIDAD	(c) UNID.	CONDICIONES ACTUALIZADAS			ACTAS ANTERIORES		PRESENTE ACTA		ACOMULADO A LA PRESENTE ACTA		
			(d) CANT	(e) VR UNIT	(f) VR PARCIAL	(g) CANT	(e) VR UNIT	(i) CANT	(e) VR UNIT	(g+i) (j)CANT	(e) VR UNIT	(j*e)(k)VR TOTAL
1.	**CONSTRUCCIÓN BOVEDAS**				$ 22.131.492,86				$ 22.131.492,86			$ 22.131.492,86
1,1	LOCALIZACION Y REPLANTEO CONVENCIONAL OBRA ARQUITECTÓNICA (M2) NO INCLUYE COMISIÓN TOPOGRAFICA	M2	17,88	$ 3.754,73	$ 67.134,57	0,00	$ -	17,88	$ 67.134,57	17,88	$ 3.754,73	$ 67.134,57
1,2	DESCAPOTE MANUAL H= 0.15 M CON TRASIEGO DE MATERIAL SOBRANTE	M2	17,88	$ 8.831,61	$ 157.909,19	0,00	$ -	17,88	$ 157.909,19	17,88	$ 8.831,61	$ 157.909,19
1,3	SOLADO, LIMPIEZA EN CONCRETO 13 8 MPa (2000 PSI)	M3	0,15	$ 604.816,44	$ 90.722,47	0,00	$ -	0,15	$ 90.722,47	0,15	$ 604.816,44	$ 90.722,47
1,4	VIGA EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	1,42	$ 969.060,92	$ 1.376.066,51	0,00	$ -	1,42	$ 1.376.066,51	1,42	$ 969.060,92	$ 1.376.066,51
1,5	RELLENO CON MATERIAL MIXTO DE RÍO SIN PROCESAR TAMAÑO MAX. 2" SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN MANUAL CON EQUIPO LIVIANO.	M3	3,63	$ 62.183,02	$ 225.724,36	0,00	$ -	3,63	$ 225.724,36	3,63	$ 62.183,02	$ 225.724,36
1,6	COLUMNA EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	0,90	$ 1.342.043,29	$ 1.207.838,96	0,00	$ -	0,90	$ 1.207.838,96	0,90	$ 1.342.043,29	$ 1.207.838,96
1,7	ACERO DE REFUERZO FY=4200 MPa (4200 KG/CM2, G60) INCLUYE SUMINISTRO, FIGURADO, ARMADO, COLOCACIÓN Y AMARRE	KG	401,51	$ 8.629,76	$ 3.464.934,94	0,00	$ -	401,51	$ 3.464.934,94	401,51	$ 8.629,76	$ 3.464.934,94
1,8	MURO EN BLOQUE FLEXA No. 5, 0.12X0.20X0.30 M (MORTERO TIPO S 1:4)	M2	57,87	$ 53.733,97	$ 3.109.584,84	0,00	$ -	57,87	$ 3.109.584,84	57,87	$ 53.733,97	$ 3.109.584,84
1,9	PLACA DE CONTRAPISO EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	1,25	$ 789.895,18	$ 987.368,98	0,00	$ -	1,25	$ 987.368,98	1,25	$ 789.895,18	$ 987.368,98
1,10	PLACA DE ENTREPISO MACIZA EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	3,85	$ 1.118.389,28	$ 4.305.798,73	0,00	$ -	3,85	$ 4.305.798,73	3,85	$ 1.118.389,28	$ 4.305.798,73
1,11	MALLA ELECTROSOLDADA FY=5000 KG/CM2, 500 MPA. FIGURADO, ARMADO, COLOCACIÓN Y AMARRE. SUMINISTRO E INSTALACIÓN	KG	151,54	$ 9.286,82	$ 1.407.294,39	0,00	$ -	151,54	$ 1.407.294,39	151,54	$ 9.286,82	$ 1.407.294,39
1,12	PAÑETE MURO EXTERIOR Y CULATAS MORTERO 1:4 IMPERMEABILIZADO SUMINISTRO Y APLICACIÓN	M2	30,01	$ 34.927,40	$ 1.048.171,27	0,00	$ -	30,01	$ 1.048.171,27	30,01	$ 34.927,40	$ 1.048.171,27
1,13	PAÑETE MUROS INTERIORES MORTERO 1:4 SOBRE MALLA CON VENA. INCLUYE FILOS Y DILATACIONES. SUMINISTRO Y APLICACIÓN.	M2	90,57	$ 42.936,22	$ 3.888.733,45	0,00	$ -	90,57	$ 3.888.733,45	90,57	$ 42.936,22	$ 3.888.733,45
1,14	PINTURA VINILO T. CORAZA EXTERIOR 3 MANOS	M2	56,21	$ 14.129,34	$ 794.210,20	0,00	$ -	56,21	$ 794.210,20	56,21	$ 14.129,34	$ 794.210,20
2.	**CONSTRUCCION OSARIOS**				$ 5.647.003,67				$ 5.647.003,67			$ 5.647.003,67
2,1	DESMONTE DE ESTRUCTURA METALICA DE CUBIERTA. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO	M2	22,00	$ 19.493,79	$ 428.863,38	0,00	$ -	22,00	$ 428.863,38	22,00	$ 19.493,79	$ 428.863,38
2,2	DESMONTE DE TEJA PLASTICA Y/O DE ZINC. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO	M2	22,00	$ 7.209,82	$ 158.616,04	0,00	$ -	22,00	$ 158.616,04	22,00	$ 7.209,82	$ 158.616,04
2,3	DEMOLICION CONCRETO SIMPLE. INCLUYE TRASIEGO Y CARGUE MANUAL	M3	0,12	$ 337.201,33	$ 40.464,16	0,00	$ -	0,12	$ 40.464,16	0,12	$ 337.201,33	$ 40.464,16
2,4	MURO EN BLOQUE FLEXA No. 4 0.10X0.20X0.30 M(MORTERO TIPO S 1:3)	M2	15,38	$ 54.269,15	$ 834.659,53	0,00	$ -	15,38	$ 834.659,53	15,38	$ 54.269,15	$ 834.659,53
2,5	PAÑETE MURO EXTERIOR Y CULATAS MORTERO 1:4 IMPERMEABILIZADO SUMINISTRO Y APLICACIÓN	M2	6,00	$ 34.927,40	$ 209.564,40	0,00	$ -	6,00	$ 209.564,40	6,00	$ 34.927,40	$ 209.564,40
2,6	PAÑETE MUROS INTERIORES MORTERO 1:4 SOBRE MALLA CON VENA. INCLUYE FILOS Y DILATACIONES. SUMINISTRO Y APLICACIÓN	M2	14,67	$ 42.936,22	$ 629.874,35	0,00	$ -	14,67	$ 629.874,35	14,67	$ 42.936,22	$ 629.874,35
2,7	PLACA DE ENTREPISO MACIZA EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	0,64	$ 1.118.389,28	$ 715.769,14	0,00	$ -	0,64	$ 715.769,14	0,64	$ 1.118.389,28	$ 715.769,14
2,8	MALLA ELECTROSOLDADA FY=5000 KG/CM2, 500 MPA. FIGURADO, ARMADO, COLOCACIÓN Y AMARRE. SUMINISTRO E INSTALACIÓN	KG	16,62	$ 9.286,82	$ 154.343,62	0,00	$ -	16,62	$ 154.343,62	16,62	$ 9.286,82	$ 154.343,62
2,9	PEDESTALES EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	0,02	$ 2.218.727,61	$ 44.374,55	0,00	$ -	0,02	$ 44.374,55	0,02	$ 2.218.727,61	$ 44.374,55
2,10	CORREA PERFIL RECTAN PHR NEGRO 80X40X2 0 MM CAL. 14	ML	32,30	$ 27.090,69	$ 875.029,29	0,00	$ -	32,30	$ 875.029,29	32,30	$ 27.090,69	$ 875.029,29
2,11	PINTURA VINILO T. CORAZA EXTERIOR 3 MANOS	M2	15,67	$ 14.129,34	$ 221.406,76	0,00	$ -	15,67	$ 221.406,76	15,67	$ 14.129,34	$ 221.406,76
2,12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CUBIERTA ARQUITECTONICA METALICA PERFIL TRAPEZOIDAL TIPO ACESCO. NO INCLUYE ESTRUCTURA	M2	22,00	$ 43.097,89	$ 948.153,58	0,00	$ -	22,00	$ 948.153,58	22,00	$ 43.097,89	$ 948.153,58
2,13	VÍGA AÉREA EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	0,08	$ 1.309.091,15	$ 104.727,29	0,00	$ -	0,08	$ 104.727,29	0,08	$ 1.309.091,15	$ 104.727,29
2,14	ACERO DE REFUERZO FY=4200 MPa (4200 KG/CM2, G60) INCLUYE SUMINISTRO, FIGURADO, ARMADO, COLOCACIÓN Y AMARRE	KG	32,58	$ 8.629,76	$ 281.157,58	0,00	$ -	32,58	$ 281.157,58	32,58	$ 8.629,76	$ 281.157,58
				COSTO DIRECTO	$ 27.778.496,52		$ -		$ 27.778.496,52			$ 27.778.496,52
				ADMINISTRACION 25%	$ 6.944.624,13		$ -		$ 6.944.624,13			$ 6.944.624,13
				IMPREVISTOS 1%	$ 277.784,97		$ -		$ 277.784,97			$ 277.784,97
				UTILIDAD 5%	$ 1.388.924,83		$ -		$ 1.388.924,83			$ 1.388.924,83
				AIU 31%	$ 8.611.333,92		$ -		$ 8.611.333,92			$ 8.611.333,92
				COSTO TOTAL	$ 36.389.830,44		$ -		$ 36.389.830,44			$ 36.389.830,44
				COSTO TOTAL AJSUTE AL PESO	$ 36.389.830,00		$ -		$ 36.389.830,00			$ 36.389.830,00

Nota : Anexo a la presente acta se hace entrega de Memorias de Calculo F-260 , donde se hace la cuantificacion de cada una de las actividades objeto de cobro de la presente acta.

Para constancia de lo anteser, se firma en Puerto Lopez -Meta, a los Dieciocho (18) dias del mes Junio del año 2024

UNION TEMPORAL CEMENTERIOS 2024
NIT : 901.811.916-1
ERIKA LORENA LESMES AGUIRRE
C.C. 1.121.865.059 de Villavicencio
CONTRATISTA

N/A
INTERVENTORIA

MARYLIN PAOLA FONSECA CRUZ
SUPERVISOR ASIGNADO

Nota : Diligenciar celda de supervisor según aplique

ALCALDIA PUERTO LOPEZ	ACTA DE LIQUIDACION	F-104 Version:002 Agosto de 2023

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO.

TIPO DE CONTRATO	:	OBRA		
CONTRATO N°	:	100-103-13-09-00001 de 2024		
OBJETO	:	"CONSTRUCCION BOVEDAS Y OSARIOS EN EL CEMENTERIO DEL MUNICIPIO DE PUERTO LOPEZ - META"		
CONTRATISTA	:	UNION TEMPORAL CEMENTERIOS 2024		
NIT O CÉDULA	:	901.811.916-1	No. CELULAR:	3132125961
REPRESENTANTE LEGAL DEL CONTRATISTA	:	ERIKA LORENA LESMES AGUIRRE		
NIT O CÉDULA	:	1.121.865.059	No. CELULAR:	3132125961
CONTRATO DE INTERVENTORIA N°	:	N/A		
CONTRATISTA DE INTERVENTORIA	:	N/A		
NIT Ó CÉDULA	:	N/A		
REPRESENTANTE LEGAL DE LA INTERVENTORIA	:	N/A		
SUPERVISOR	:	MARYLIN PAOLA FONSECA CRUZ		
CARGO	:	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA		
CÉDULA	:	1.121.885.470	No. CELULAR	3232914334
VALOR DEL CONTRATO INICIAL	:	$ 36.389.830,00		
FECHA INICIACION :		1/04/2024		
PLAZO DE EJECUCION:		0 DIAS	1	MESES
		HASTA 30/04/2024		
FECHA DE TERMINACION:		30/04/2024		
PRORROGA N° 01		30/04/2024		
PLAZO DE EJECUCION:		10 DIAS	N/A	MESES
FECHA SUSPENSIÓN:		N/A		
TIEMPO:		N/A DIAS	N/A	MESES
FECHA AMPLIACION DE LA SUSPENSIÓN:		N/A		
TIEMPO:		N/A DIAS	N/A	MESES
FECHA REINICIO:		N/A		
PLAZO DE EJECUCION TOTAL:		1 MES Y 10 DIAS		
FECHA DE TERMINACION FINAL :		10/05/2024		
FECHA DE RECIBO		18/06/2024		

NOTA 1. : EN CASO DE SER NECESARIO AGREGAR CELDAS QUE SEAN NECESARIAS.
NOTA 2. :DILIGENCIAR CRONOLOGICAMENTE CONFORME LAS ACTUACIONES SUSCRITAS Y APROBADAS POR LAS PARTES.

CONTRATOS ADICIONALES :

No.	VALOR	FECHA
1	N/A	N/A
2	N/A	N/A

130

ALCALDIA PUERTO LOPEZ	**ACTA DE LIQUIDACION**	**F-104** Version:002 Agosto de 2023

MODIFICACIONES AL CONTRATO :

No.	VALOR	FECHA
1	N/A	N/A
2	N/A	N/A

VALOR ACTUAL DEL CONTRATO : N/A

En el Municipio de Puerto López, Departamento del Meta, el 25 NOV 2024 días del mes de _____ del año (2024), se reunieron JOHANNA PAOLA VEGA MORENO, en calidad de JEFE DE LA OFICINA DE CONTRATACION , ERIKA LORENA LESMES AGUIRRE en calidad de Representante legal del CONTRATISTA y MARYLIN PAOLA FONSECA CRUZ en calidad de supervisor, con el objeto de liquidar el contrato de OBRA No. 100-103-13-09-00001-2024 de 2024, suscrito el dia Dieciocho(18) días del mes de Marzo del año Dos mil Veinticuatro (2024), habiéndose cumplido satisfactoriamente el objeto contractual pactado en el contrato.

Las actividades se desarrollaron a satisfaccion de acuerdo al informe de activiades que se presente para la liquidación correspondiente.

2. CONDICIONES FINANCIERAS DEL CONTRATO.

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	**$ 36.389.830,00**
VALOR TOTAL DE ADICIONES REALIZADAS AL CONTRATO	**$ -**
VALOR ACTUAL DEL CONTRATO	**$ 36.389.830,00**
VALOR EJECUTADO	**$ -**
VALOR NO EJECUTADO	**$ -**
VALOR SANCIONES	**$ -**
VALOR ANTICIPO SIN AMORTIZACIÓN	**$ -**
DEVOLUCION ANTICIPO	**$ -**
VALOR OTROS DESCUENTOS (ESPECIFICAR)	**$ -**
VALOR PENDIENTE DE PAGO AL CONTRATISTA	**$ 36.389.830,00**

2.1. BALANCE FINANCIERO

ACTA	FECHA	VALOR
ANTICIPO DE 0,0%	N/A	**$ -**
ACTA PARCIAL No. 01	N/A	**$ -**
ACTA PARCIAL No. 02	N/A	**$ -**
ACTA PARCIAL No. 03	N/A	**$ -**
VALOR TOTAL		**$ -**
VALOR PRESENTE ACTA DE LIQUIDACION		**$ 36.389.830,00**
SALDO A FAVOR DEL MUNICIPIO		**$ -**

2.2. FUENTES DE FINANCIACIÓN

FUENTE	REG. PPTAL	VALOR INICIAL	VALOR PAGADO	VALOR A PAGAR	SALDO
PROPIOS	00494	$ 36.389.830,00	$ -	**$ 36.389.830,00**	$ -
TOTALES				**$ 36.389.830,00**	$ -

3. RECLAMOS Y GARANTIAS

El Contratista, acepta la presente acta de liquidación del contrato y se compromete a no elevar ninguna reclamación relacionada con la presente acta y con el contrato respectivo por estar de acuerdo con todo con lo que ella contiene y se manifiesta a Paz y Salvo en lo mencionado a continuación:

3.1. GARANTÍAS.

ASEGURADORA	**SEGUROS DEL ESTADO**
POLIZA UNICA No	**11-44-101221672**
POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL No.	**11-40-101061560**
DIRECCION DE NOTIFICACIONES	**CARRERA 13 No. 96 - 60/74**

ALCALDIA PUERTO LOPEZ	ACTA DE LIQUIDACION	F-104 Version:002 Agosto de 2023

3.1.1. BUEN MANEJO Y COORECTA INVERSIÓN DEL ANTICIPO.

VALOR ASEGURADO	:		N/A		
VIGENCIA	:	**DESDE**	N/A	**HASTA:**	N/A

3.1.2. DE CUMPLIMIENTO

VALOR ASEGURADO	:	$	3.638.983,00		
VIGENCIA	:	**DESDE**	1/04/2024	**HASTA:**	10/09/2024

3.1.3. PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES

VALOR ASEGURADO	:	$	1.819.491,50		
VIGENCIA	:	**DESDE**	1/04/2024	**HASTA:**	10/05/2027

3.1.4. ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA

VALOR ASEGURADO	:	$	7.277.966,00		
VIGENCIA	:	**DESDE**	10/05/2024	**HASTA:**	10/05/2029

3.1.5. CALIDAD Y BUEN FUNCIONAMIENTO DE BIENES Y EQUIPOS

VALOR ASEGURADO	:		N/A		
VIGENCIA	:	**DESDE**	N/A	**HASTA:**	N/A

3.1.6. OTRA:

VALOR ASEGURADO	:		N/A		
VIGENCIA	:	**DESDE**	N/A	**HASTA:**	N/A

4. ANEXOS PRESENTADOS AL TRAMITE .

ACTA DE TERMINACION (02) FOLIOS
ACTA DE RECIBO FINAL (04) FOLIOS
INFORME CONTRATISTA (28) FOLIOS
INFORME SUPERVISOR (36) FOLIOS
MEMORIAS DE CALCULO (28) FOLIOS
BITACORA DE OBRA (66) FOLIOS
CANTIDADES DE PAGO (03) FOLIOS

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta por los que en ella intervinieron el 25 NOV 2024

UNION TEMPORAL CEMENTERIOS 2024	N/A
R.L ERIKA LORENA LESMES AGUIRRE	**NOMBRE EMPRESA / PERSONA NATURAL**
CONTRATISTA	**R.L NOMBRES Y APELLIDOS**
	INTERVENTOR
JOHANNA PAOLA VEGA MORENO	**MARYLIN PAOLA FONSECA CRUZ**
JEFE DE LA OFICINA DE CONTRATACION	**CARGO : SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA**
	SUPERVISOR ASIGNADO

Nota : Diligenciar celda de supervisor según aplique

ALCALDÍA PUERTO LÓPEZ

ACTA DE EVALUACION Y CUMPLIMIENTO

Código: F - 105
Versión: 001
Fecha: Agosto de 2017

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

CONTRATO Nº:	100-103-13-09-00001-2024
OBJETO:	CONSTRUCCION BOVEDAS Y OSARIOS EN EL CEMENTERIO DEL MUNICIPIO DE PUERTO LOPEZ – META
CONTRATISTA:	UNION TEMPORAL CEMENTERIOS 2024 NIT: 901.811.916-1 ERIKA LORENA LESMES AGUIRRE 1.121.865.059 DE VILLAVICENCIO
INTERVENTOR:	N/A
SUPERVISOR:	MARYLIN PAOLA FONSECA CRUZ

2. DATOS ESPECÍFICOS

(a) REQUERIMIENTO INCUMPLIDO	(b) FECHA	(c) NOTIFICADO POR OFICIO	(d) RECOMENDACIONES / OBSERVACIONES
Por incumplimiento en las garantías	NO		NO HUBO INCUMPLIMIENTO
Por incumplimientos en los requisitos de personal mínimo	NO		NO HUBO INCUMPLIMIENTO
Por incumplimiento de las actividades y procedimientos de interventoría	NO		NO HUBO INCUMPLIMIENTO
Por incumplimiento en la presentación de informes	NO		NO HUBO INCUMPLIMIENTO
Por no solicitar el inicio del procedimiento de imposición de multas o recomendar la declaratoria de caducidad al contratista de obra	NO		NO HUBO INCUMPLIMIENTO
Por mala calidad o deficiencias de acabado en obras recibidas por la Interventoría	NO		NO HUBO INCUMPLIMIENTO
Por incumplimiento de las obligaciones establecidas en el clausulado del contrato	NO		NO HUBO INCUMPLIMIENTO
Por incumplimiento de las instrucciones que imparta el Secretario de Despacho o Supervisor (la Agencia Logística) para evitar que se ejerza inadecuadamente sus funciones de inspección, vigilancia y control	NO		NO HUBO INCUMPLIMIENTO
Por presentar información errada a nivel general y específicamente en los formatos del manual de Interventoría	NO		NO HUBO INCUMPLIMIENTO
Otros: ____ Cuales?	NO		NO HUBO INCUMPLIMIENTO

Anexos: _____folios

Para constancia de lo anterior, se firma, a los Dieciocho (18) del mes de Junio de 2024

Elaboró :	Aprobó
N/A Firma del Interventor	Firma del Supervisor

ALCALDÍA PUERTO LOPEZ	ACTA DE APROBACIÓN AIU OBRA	Código: F - 237
		Versión: 001
		Fecha: Agosto de 2020

CONTRATO N°	100-103-13-09-00001-2024	**PROYECTO N°**	100-103-13-09-00001-2024
OBJETO DEL CONTRATO:	CONSTRUCCION DE BOVEDAS Y OSARIOS EN EL CEMENTERIO DEL MUNICIPIO DE PUERTO LOPEZ META		
OBJETO DEL PROYECTO:	N/A		
CONTRATO DE INTERVENTORIA N°	N/A		
INTERVENTORÍA:	N/A		

ANALISIS DEL AIU

VALOR COSTOS DIRECTOS DEL PROYECTO:	$ 27.778.497						
% AIU	31%	% Administración	25%	% Imprevistos	1%	% Utilidad	5%
TOTAL AIU	$ 8.611.333,92	Total Administración	$ 6.944.624	Total Imprevistos	$ 277.785	Total Utilidad	$ 1.388.925

DESCRIPCIÓN ADMINISTRACIÓN

A. PERSONAL Y OTROS RECURSOS:

PERSONAL

CARGO	ASIGNACIÓN MENSUAL			TIEMPO (EN MESES)	PARCIAL	PORCENTAJE RESPECTO AL COSTO DIRECTO DEL PROYECTO
	BASICO	FACTOR PRESTACIONAL	TOTAL			
Residente de obra	$ 1.300.000,00	1,00	$ 1.300.000,00	1,10	$ 1.430.000	5,148%
			$ 0,00		$ -	0,000%
			$ 0,00		$ -	0,000%
			$ 0,00		$ -	0,000%
SUB TOTAL					**$ 1.430.000**	**5,148%**

OTROS RECURSOS

DESCRIPCIÓN	COSTO MENSUAL	TIEMPO (EN MESES)	PARCIAL	PORCENTAJE RESPECTO AL COSTO DIRECTO DEL PROYECTO
			$ -	0,000%
			$ -	0,000%
			$ -	0,000%
			$ -	0,000%
SUB TOTAL			**$ -**	**0,000%**

B. IMPUESTOS, DERECHOS Y GARANTIAS

DESCRIPCIÓN	VALOR	PORCENTAJE RESPECTO AL COSTO DIRECTO DEL PROYECTO
Descuentos Municipio de Puerto Lopez	$ 5.116.258	18,418%
Garantias del contrato	$ 398.366	1,434%
	$ -	0,000%
	$ -	0,000%
	$ -	0,000%
SUB TOTAL	$ 5.514.624	**19,852%**

C. ACTIVIDADES VARIAS

DESCRIPCIÓN	VALOR	PORCENTAJE RESPECTO AL COSTO DIRECTO DEL PROYECTO
	$ -	0,000%
	$ -	0,000%
SUB TOTAL	$ -	**0,000%**

TOTAL ADMINISTRACIÓN	**$ 6.944.624,00**	**100,000%**

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, el dia **martes, 18 de junio de 2024**

Firma

Nombre: ERIKA LORENA LEGMES AGUIRRE
REPRESENTANTE LEGAL CONTRATISTA OBRA

Firma

Nombre: JUAN CARLOS PALACIOS MOLINA
RESIDENTE DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 52202 - 084671 NRÑ

Firma

Nombre: MARYLIN PAOLA FONSECA CRUZ
SUPERVISORA

N/A

Firma

Nombre:
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional:

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

ALCALDÍA PUERTO LOPEZ	**ACTA DE JUSTIFICACION DE IMPREVISTOS**	**Código: F – 327**
		Versión: 001
		Fecha: febrero de 2021

INFORMACION BASICA	
CONTRATISTA	UNION TEMPORAL CEMENTERIOS 2024
INTERVENTOR	N/A
SUPERVISOR TÉCNICO	MARYLIN PAOLA FONSECA CRUZ
INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO	
TIPO DE CONTRATO	OBRA
OBJETO:	CONSTRUCCION DE BOVEDAS Y OSARIOS EN EL CEMENTERIO DEL MUNICIPIO DE PUERTO LOPEZ META
VALOR INICIAL:	TREINTA Y SEIS MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS TREINTA PESOS M/TC ($ 36.389.830,00)
FORMA DE PAGO:	El Municipio pagará el valor del contrato resultante del presente proceso de la siguiente manera: El municipio pagará al contratista pagos parciales hasta el 90% del valor del contrato, teniendo en cuenta el avance físico de la obra; y el 10% restante se cancelará con la liquidación del contrato, para lo cual se tendrá en cuenta lo siguiente: a) El valor de la primera acta parcial se realizará cuando se haya ejecutado como mínimo el veinte (20%) de ejecución de avance de la obra, liquidadas por el sistema de Precios Unitarios, pactadas en el contrato o debidamente aprobadas por la supervisión, previa presentación de informe de contratista, soportes de pagos de seguridad social y parafiscales, informe de supervisor, factura y demás documentos solicitados. b) Un 70% mediante actas parciales de obra, liquidadas por el sistema de Precios Unitarios, pactadas en el contrato o debidamente aprobadas por la supervisión previa presentación de informe de contratista, soportes de pagos de seguridad social y parafiscales, informe de supervisión, factura y demás documentos solicitados. c) El Diez por ciento (10%) final, a la liquidación del contrato, previa certificación de cumplimiento total de la ejecución suscrita por el supervisor designado y la suscripción del acta de liquidación final por parte del supervisor designado y las partes. Para el trámite del pago el contratista deberá presentar ante el SUPERVISOR: 1.La CERTIFICACIÓN de cumplimiento por parte de la supervisión, como funcionario competente para ejercer las tareas de vigilancia de la correcta ejecución contractual. 2.La factura o documento equivalente, según corresponda en cada caso. 3.La acreditación del pago de seguridad social integral y parafiscal si a ello hubiere lugar. 4.Acta de recibo Parcial debidamente suscrita por el MUNICIPIO y el CONTRATISTA. 5.Memorias de cálculo de cada ítem, soportado con registro fotográfico a color, registrando cada uno de los ítems de ejecución. 6. Copia de la bitácora.

Código Postal 502001
Calle 6 Nro 4 – 40
Telefonos 6450412 – 6451867
Email: contactenos@puertolopez-meta.gov.co

ALCALDÍA PUERTO LOPEZ	**ACTA DE JUSTIFICACION DE IMPREVISTOS**	**Código: F – 327**
		Versión: 001
		Fecha: febrero de 2021

	7.Para efectos de cada pago (parcial y final), el supervisor deberá exigir al contratista la acreditación sobre el cumplimiento de sus obligaciones frente al Sistema Integral de Seguridad Social y parafiscales, en los términos de las Leyes 789 de 2002, 828 de 2003, 1150 de 2.007 y demás normas complementarias y reglamentarias sobre la materia. 8.Todos los documentos exigidos por parte de la supervisión, para lo cual se entregará al contratista la lista con requisitos documentales según corresponda para el trámite de los pagos. Entre los que se encuentran los siguientes: Acta de pago parcial, memorias de cálculo, informe técnico con el cumplimiento de las obligaciones pactadas, actos administrativos, garantías del contrato, aportes de seguridad social, registro de avance de obra, seguimiento de comités técnicos, Registro fotográfico de cada una de las actividades reportadas y conclusiones técnicas, pruebas de calidad (laboratorios), certificado de calidad de materiales utilizados, factura de cobro. 9.Para el pago final se debe presentar la respectiva acta de terminación y de liquidación. 10.Y los demás que legalmente sean aplicables. La última acta de pago no será inferior al DIEZ POR CIENTO (10%) del valor total del contrato y se cancelará una vez el Contratista entregue al Municipio: -Acta de liquidación del contrato debidamente suscrita por EL MUNICIPIO y el CONTRATISTA. -Paz y salvo del Ministerio de la Protección Social donde se haga constar la inexistencia de reclamaciones laborales a cargo del contratista; y Paz y Salvo de pagos de aportes parafiscales por el contrato ejecutado. -Paz y salvo del personal vinculado al contrato durante el termino de ejecución -Memorias de cálculo de cada ítem, con su registro fotográfico a color. -Planos Récord debidamente avalados, que incluya detalles, refuerzos estructurales conforme las actividades ejecutadas en cumplimiento del objeto contratado. -Registro fotográfico (archivo jpg) secuencial ítem por ítem contratado, con el compilado de todas las fotografías tomadas a lo largo de la ejecución del contrato. -Todos los soportes digitalizados. -Original de la bitácora. -Actualización de la garantía única. -Acta de Entrega -Manual de Mantenimiento y operación. -Pruebas de calidad (laboratorios) conforme las actividades contratadas -Certificado de calidad de los materiales utilizados en la ejecución de actividades contratadas. -Informe técnico final donde se relaciona toda la cronología del contrato, actuaciones administrativas, pagos realizados, garantías del contrato actualizadas con fecha de aprobación, cumplimiento de las obligaciones pactadas, relación del personal y sus aportes al sistema integral de seguridad social, registro de las actividades ejecutadas, registro fotográfico, conclusiones técnicas.

Código Postal 502001
Calle 6 Nro 4 – 40
Telefonos 6450412 – 6451867
Email: contactenos@puertolopez-meta.gov.co

ALCALDÍA PUERTO LOPEZ	**ACTA DE JUSTIFICACION DE IMPREVISTOS**	**Código: F – 327** Versión: 001 Fecha: febrero de 2021

	-Informe de legalización de los gastos Administrativos, con respectivos soportes -Informe de legalización de los gastos Imprevistos, con respectivos soportes -Los pagos correspondientes deberán contar con el previo Vo.Bo. del Supervisor designado por EL MUNICIPIO y la certificación de recibo a satisfacción de las obras entregadas. Si el contratista no presenta la cuenta con sus soportes respectivos, dentro de la vigencia fiscal correspondiente, no podrá hacer ninguna reclamación judicial o extrajudicial de actualizaciones, intereses o sobrecostos sobre el valor de la cuenta. Para el caso de Imprevistos se deberá suscribir Acta de liquidación de imprevistos causados, debidamente justificados suscrita por el Supervisor y el Contratista previo informe de los mismos allegados por el Contratista al porcentaje destinado de Imprevistos del AIU. El pago y reconocimiento de los imprevistos serán analizados por el municipio a través del supervisor de conformidad con las orientaciones impartidas por la Contraloría Departamental del Meta en Circular externa No. 13 del 19 de abril de 2021. Los pagos se realizarán mediante transferencias bancarias a las cuentas del contratista y para tal efecto se enviarán las facturas al correo electrónico sechacienda@puertolopez-meta.gov.co El contratista solicitara de manera voluntaria el plan de pagos, teniendo en cuenta el cumplimiento de las disposiciones expuestas en este numeral. El Contratista deberá presentar para el trámite de sus cuentas además de los documentos relacionados la factura de venta, conforme al Decreto 2242 de 2015, y la Resolución 000042 de 2020, la cual deberá ser enviada al correo electrónico sechacienda@puertolopez-meta.gov.co, la fecha de la factura debe corresponder al mes de su elaboración, y en ella constará el número del contrato, el concepto del bien o servicio que se está cobrando. En caso de no estar obligado a facturar, deberá presentar el documento equivalente Nota1: Todos los pagos estarán sujetos a los desembolsos que efectué la Tesorería Municipal, sin perjuicio del cumplimiento del objeto contractual y demás requisitos legales para su cancelación.
VALOR ACTUALIZADO:	TREINTA Y SEIS MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS TREINTA PESOS M/TC ($ 36.389.830,00)
FECHA DE INICIACIÓN:	01 DE ABRIL DE 2024
FECHA DE TERMINACION:	30 DE ABRIL DE 2024
FECHA DE SUSPENSION:	N/A
TIEMPO DE SUSPENSION:	N/A
FECHA DE REINICIO:	N/A
PRORROGA 1:	(10 DIAS) 30 DE ABRIL DE 2024
PRORROGA 2:	N/A
PRORROGA 3:	N/A
PRORROGA 4:	N/A
PRORROGA 5:	N/A
NUEVA FECHA DE TERMINACION	10 DE MAYO DE 2024

TIEMPO	1	MES	10	DIAS

Código Postal 502001
Calle 6 Nro 4 – 40
Telefonos 6450412 – 6451867
Email: contactenos@puertolopez-meta.gov.co

ALCALDÍA PUERTO LOPEZ	**ACTA DE JUSTIFICACION DE IMPREVISTOS**	**Código: F – 327** Versión: 001 Fecha: febrero de 2021

JUSTIFICACION

En el municipio de Puerto López; Departamento de Meta, el 18 de Junio de 2024, se suscribió la siguiente acta por parte **ERIKA LORENA LESMES AGUIRRE**, quien actúa en su calidad de representante legal de **LA UNION TEMPORAL CEMENTERIOS 2024**, en calidad de CONTRATISTA; con el fin de liquidar los costos de los imprevistos que se presentaron en el Contrato No.100-103-13-09-00001 DE 2024 SUSCRITO EL 18 DE MARZO DE 2024, en cumplimiento con las obligaciones realizadas durante el período comprendido entre el 01 DE ABRIL DE 2024 y EL 10 DE MAYO DE 2024.

En la ejecución del proyecto fue necesario realizar la disposición final de escombros, ya que dentro de las actividades contratas no se contaba con la disposición final de escombros.

OBJETO CONTRATO			
ÍTEM: NO PREVISTO			
UNIDAD DE MEDIDA: GL			
DESCRIPCION	**CANTIDAD (GL)**	**VR UNITARIO**	**VR PARCIAL**
DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS, DEL DESCAPOTE DE LA ESTRUCTURA METALICA Y DE LA TEJA	1	$ 277.784,97	$ 277.784,97

Tabla N° 1 la anterior tabla muestra el gasto que fue adquirido por el contratista y el cual no estaba incluido en los ítems contractuales lo que le conllevo a un gasto como imprevisto.
Los diferentes ítems de los imprevistos fueron tomados de las actividades ejecutadas en campo

VALOR TOTAL DE IMPREVISTOS DE OBRA	**$ 277.784,97**
VALOR TOTAL DE IMPREVISTOS CONTRACTUALES	**$ 277.784,97**
DIFERENCIA	**$ 0.00**

Firma

ERIKA LORENA LESMES AGUIRRE
Representante Legal
UNION TEMPORAL CEMENTERIOS 2024
CONTRATISTA

MARYLIN PAOLA FONSECA CRUZ
Supervisora
Secretaria de Infraestructura.

Código Postal 502001
Calle 6 Nro 4 – 40
Telefonos 6450412 – 6451867
Email: contactenos@puertolopez-meta.gov.co

ALCALDÍA PUERTO LOPEZ	**ACTA DE JUSTIFICACION DE IMPREVISTOS**	**Código: F – 327**
		Versión: 001
		Fecha: febrero de 2021

REGISTRO FOTOGRÁFICO





Código Postal 502001
Calle 6 Nro 4 – 40
Telefonos 6450412 – 6451867
Email: contactenos@puertolopez-meta.gov.co

CUENTA DE COBRO No. 005

UNION TEMPORAL CEMENTERIO 2024
NIT: 901.811.916-1

DEBE A:

MARCO TULIO MORENO MORENO
CC N. 17.315.726 de Villavicencio

POR CONCEPTO DE: CARGUE, TRASLADO, DESCARGUE Y DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS DEL CONTRATO DE CONSTRUCCION DE BOVEDAS Y OSARIOS DEL CEMENTERIO MUNICIPAL DE PUERTO LOPEZ META.

POR LA SUMA DE: DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS CON NOVENTA Y SIETE CENTAVOS ($277.784.97).

Atentamente;

MARCO TULIO MORENO MORENO
CC N. 17.315.724 de Villavicencio

Villavicencio Meta, 18 de Junio de 2024.

Ingeniera:
MARYLIN PAOLA FONSECA CRUZ.
Secretaria de Infraestructura.
Supervisora.
Alcaldía de Puerto López – Meta

REFERENCIA: CONTRATO DE OBRA No. 100-103-13-09-00001 DE 2024 CUYO OBJETO ES **"CONSTRUCCION BOVEDAS Y OSARIOS EN EL CEMENTERIO DEL MUNICIPIO DE PUERTO LOPEZ META".**

Asunto: CERTIFICACION PAGOS ADMINISTRATIVOS.

Cordial saludo,

Por medio de la presente, me permito CERTIFICAR los pagos ADMINSITRATIVOS derivados del contrato de la referencia.

1. Impuestos realizados por el MUNICIPIO DE PUERTO LOPEZ META.

   Corresponde a la suma de $ 5.116.258.

2. Garantías del contrato.

   Corresponde a un valor de $ 398.366

3. Pagos realizados al residente de obra.

   Corresponde a un valor de $ 1.430.000

Se adjunta los respectivos pagos de las garantías del contrato y del residente de obra, en cuanto los descuentos del Municipios estos los realizan al momento del pago del contrato.

Sin otro particular,

ERIKA LORENA LESMES AGUIRRE.
CC. 1.121.865.059 de Villavicencio Meta.
Representante Legal.

CARLOS ALBERTO MORENO CRUZ
CC. 86.082.604 de Villavicencio
Contador Publico
TP: 19834 -T

141

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

Bogotá D.C, 14 de agosto de 2024

Señores
MUNICIPIO DE PUERTO LOPEZ META
Ciudad

Ref. Constancia de pago

Mediante el presente **SEGUROS DEL ESTADO S.A** identificado con Nit. 860.009.578-6 hace constar la expedición de la siguiente póliza cuyo tomador es **UNION TEMPORAL CEMENTERIO 2024** con NIT. **901.811.916-1**

RAMO	No. POLIZA	ANEXO	VALOR
RCE CUM. ESTATAL	11-40-101061560 11-44-101221672	0 - 1 - 2- 3 - 4 - 5	$398.366

La póliza en mención se encuentra recaudada

Dicha constancia se expide a solicitud del asegurado a los 14 días del mes de agosto de 2024

Cordial saludo

ADRIANA RINCON
Área de Cartera
Sucursal Antiguo country

142

				Comprobante de Egreso No. 006			
Ciudad: Villavicencio		FECHA	D: 10	M: 05	A: 2024		
Recibido de: Union Temporal Cementerio 2024					$: 1.430.000		
Dirección: vda las mercedes							
La suma de (en letras): Un millón Cuatrocientos Treinta Mil Pesos M/cte							
Por concepto de: Pago Residente de Obra contrato 100-103-13-09-00001							
Corresponde desde el 01 de abril al 10 de mayo de 2024							
Cheque No	Banco			Sucursal	Efectivo x		
				Firma y Sello Juan Carlos Palacios Molina			
				c.c. X	Nit	No 12.980.082	
Elaborado **Admon 1**	Aprobado **RI**	Contabilizado		Fecha de recibido	D **10**	M **05**	A **2024**

ALCALDÍA PUERTO LOPEZ	EVALUACION DE PROVEEDORES	Código: F - 093
		Versión: 001
		Fecha: Agosto de 2017

Los siguientes son los criterios para realizar la evaluación del proveedor una vez a finalizada la prestación del servicio y/o entrega del bien

FECHA EVALUACION	18/06/2024	No. CONTRATO	100-103-13-09-00001-2024	DE	2024

NOMBRE DEL PROVEEDOR (CONTRATISTA)	UNION TEMPORAL CEMENTERIOS 2024
DOCUMENTO DE IDENTIDAD O NIT:	NIT: 901.811.916-1

NOMBRE DEL INTERVENTOR Ó SUPÉRVISOR	MARYLIN PAOLA FONSECA CRUZ

TIPO DE CONTRATO	PRESTACION SERVICIOS	X	SUMINISTRO		CONVENIO	

Marque con una X en la casilla frente a la opcion que evalua la ejecucion, solo una vez por item.

Para el item 1, 2 y 4 solo hay 2 opciones de Rango de Evaluación con puntaje de 1 ó 5; para los demás items existen 3 Rangos de Evaluación 1-3 y 5

ITEM	CRITERIO	PUNTAJE					
		1		3		5	
1	Cumplimiento del objeto del contrato	No cumple				Cumple	X
2	Calidad de bien, obra o servicio	No cumple				Cumple	X
3	Cumplimiento en los tiempos de entrega o ejecución	No cumple		Entrega inoportuna justificada adecuadamente		Cumple	X
4	Solución a quejas y reclamos	No cumple				Cumple o no se presentaron	X

Consolidar Puntaje por ítem	ITEM 1	5
	ITEM 2	5
	ITEM 3	5
	ITEM 4	5
	TOTAL	20

EVALUACION DE ACUERDO A TOTAL DEL PUNTAJE	
	MARQUE CON UNA X
DE 16 A 20 CUMPLE	X
MENOS DE 16 NO CUMPLE	

OBSERVACIONES
El contratista cumplio a cabalidad

Firma del Interventor/Supervisor

Firma de Enterado por parte del Contratista

	CONTROL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL	Código: F -261
		Versión: 001
		Fecha: Septiembre de 2020

PROYECTO:	BPIN 2020506730014 CONSTRUCCION MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE QUIPAMIENTO Y BIENES DE USO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE PUERTO LOPEZ

OBJETO DEL PROYECTO:	CONSTRUCCIÓN DE BÓVEDAS Y OSARIOS EN EL CEMENTERIO DEL MUNICIPIO DE PUERTO LOPEZ - META		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	N/A		
INTERVENTORÍA:	N/A		
FECHA DE INSPECCIÓN:	7/05/2024	N° DE TRABAJADORES:	4

CRITERIO DE EVALUACIÓN DE SISO

Escriba el valor correspondiente en la columna "criterio de calificación" teniendo en cuenta los siguientes rangos: A. Cumple completamente con el criterio enunciado (10 puntos); B. Cumple parcialmente con el criterio enunciado (5 puntos); C. Cumple con el mínimo del criterio enunciado (3 puntos); D. No cumple con el criterio enunciado (0 puntos); E. No aplica el ítem.

ÍTEM	DOCUMENTACION BASICA LEGAL	CRITERIO DE CALIFICACIÓN				
		A	B	C	D	E
		10	5	3	0	N.A
1	Tiene copia cada trabajador de Afiliaciones (nuevos) y pagos(> 30 días) ARP, EPS y AFP	X				
2	Existe el Registro de charla diaria (de la semana en curso), y capacitación	X				
3	Existen inspecciones o registros preoperacionales de: (Herramientas, EPP)	X				
4	Existe un panorama de riesgos actualizado acorde a las actividades.	X				
5	Se cuenta con el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo actualizado, disponible, vigente y firmado por el representante legal de la empresa	X				
6	Se cuentan con las hojas de seguridad de los productos químicos en el sitio de trabajo y almacenamiento (combustibles, etc.)	X				
7	Se poseen procedimientos de trabajo , en el cual encuentran identificadas las actividades criticas con sus riesgos y controles.	X				
8	Se cuenta con el plan de emergencia, para actividades criticas y en general que correspondan al alcance de la actividad desarrollada.	X				
9	El personal cuenta con un programa de inducción en SGSST, Medio ambiente, actividades y riesgos del cargo.(divulgacion de procedimientos)	X				
	SUBTOTAL	90	0	0	0	0
	Valor Estructura: % Obtenido (A+B+C)/(90- NA)	100%				

ÍTEM	GESTIÓN AMBIENTAL Y SANITARIA	10	5	3	0	N.A
10	Está la zona de trabajo limpia, ordenada sin residuos.		X			
11	Las unidades sanitarias fijas ó portátiles están limpias.		X			
12	Están demarcado y organizado el almacenamiento provisional de los residuos para la disposición final		X			
13	Esta demarcado y organizado el almacenamiento provisional de residuos generados de todas clases.		X			
14	El material, equipos y herramientas están organizado.		X			
15	El materia de descapote se acopia y se protege		X			
16	La bodega de almacenamiento esta en orden y aseo	X				
	SUBTOTAL	10	30	0	0	0
	Valor Estructura: % Obtenido (A+B+C)/(70-NA)	57%				

ITEM	GESTIÓN DEL PELIGRO	10	5	3	0	N.A
17	Las Excavaciones son seguras (escombro a 1 metro de la orilla o más según profundidad)	X				
18	La excavación cuenta con escaleras, pasos firmes, señalización, se tiene entibado o se maneja talud, el personal está alejado de la herramienta mecánica					X
19	Herramientas y/o escombros en areas vecinas, que generen algun tipo de riesgo al personal.	X				
20	Hay recurso de comunicaciones constante en buen estado de funcionamiento que garanticen la comunicación integral en caso de necesitarse.	X				
21	Se cuenta con los equipos necesarios para realizar monitoreo de atmosferas requerido (gases)					X
22	Los equipos tienen guarda de seguridad (Ranas, mezcladoras, etc..)					X
23	Se cuenta con equipos de rescate en sitio para trabajos en alturas y/o espacios confinados					X
	SUBTOTAL	30	0	0	0	4
	Valor % Obtenido (A+B+C)/(70-NA)	100%				

ÍTEM	ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL	CRITERIO DE CALIFICACIÓN				
		A	B	C	D	E
		10	5	3	0	N.A
34	El personal posee y utiliza de manera adecuada los EPP requeridos para la labor	X				
35	El personal cuenta con dotación adecuada	X				
36	Cascos de seguridad con ratcher para trabajos en alturas	X				
37	Se cuenta con barbuquejo	X				
38	Botas de caucho en buen estado con punta reforzada	X				
39	Botas de cuero en buen estado con punta reforzada	X				
40	Protección respiratoria adecuada para la labor.	X				
41	Camisa manga larga y pantalón en buen estado	X				
42	Cuentan con gafas de seguridad oscuras y claras	X				
43	Están utilizando protección auditiva adecuada para la labor.	X				
44	se cuenta en campo con elementos de protección de personal para reposición según necesidad.	X				
45	El personal visitante tiene los EPP de acuerdo al riesgo para ingresar.	X				
	SUBTOTAL	120	0	0	0	0
	Valor Estructura: % Obtenido (A+B+C)/(120-NA)	100%				

ÍTEM	MEDICINA PREVENTIVA	10	5	3	0	N.A
46	Se han practicado los exámenes de ingreso y periódicos a los trabajadores, Ver registro (Registro expedido por medico especialista en S.O)					X
47	Conformación, Capacitación, del Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo	X				
48	Existen beneficios de recreación y deporte para el personal, de conformidad con el Articulo 21 de la Ley 50 de 1990.					X
	SUBTOTAL	10	0	0	0	2
	Valor Estructura: % Obtenido (A+B+C)/(30-NA)	100%				

ÍTEM	SEÑALIZACIÓN	10	5	3	0	N.A
49	Se evidencian etiquetas con advertencias de peligro e instrucciones generales.		X			
50	Se cuenta con avisos preventivos, conos, demarcación con cinta peligro, identificando excavaciones, trabajos en vías, etc		X			
51	Tienen Protección o señalización las varillas salientes de las estructuras o pisos		X			
52	Se tiene señalizada y demarcada las áreas de trabajo		X			
53	Las áreas de trabajo están delimitadas y tiene avisos de prevención		X			
	SUBTOTAL	0	25	0	0	0
	Valor Estructura: % Obtenido (A+B+C)/(50-NA)	50%				

OBJETO DEL PROYECTO:	CONSTRUCCION DE BOVEDAS Y OSARIOS EN EL CEMENTERIO DEL MUNICIPIO DE PUERTO LOPEZ - META
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	N/A
INTERVENTORÍA	N/A
FECHA DE INSPECCIÓN:	7/05/2024
N° DE TRABAJADORES:	4

CRITERIO DE EVALUACIÓN DE SISO

Escriba el valor correspondiente en la columna "criterio de calificación" teniendo en cuenta los siguientes rangos. A. Cumple completamente con el criterio enunciado (10 puntos); B. Cumple parcialmente con el criterio enunciado (5 puntos); C. Cumple con el mínimo del criterio enunciado (3 puntos); D. No cumple con el criterio enunciado (0 puntos); E. No aplica el ítem

ÍTEM	DOCUMENTACION BASICA LEGAL	CRITERIO DE CALIFICACIÓN A	B	C	D	E
		10	5	3	0	N.A
ITEM	MANEJO DE CARGAS Y MAQUINARIA PESADA	10	5	3	0	N.A
24	Están las Eslingas en óptimo estado de funcionamiento y cuentan con etiqueta de capacidad de carga y características del fabricante					X
25	Se cuenta con Plan de Izaje y tiene todos los riesgos asociados a la labor, cuenta con cálculos según norma (capacidades, puntos de apoyo ASME B30.5).					X
26	El personal que realiza la labor se encuentra certificado (aparejador, supervisor del Izaje, Operador).					X
27	Se señaliza y demarca la carga					X
	SUBTOTAL	0	0	0	0	4
	Valor : % Obtenido (A+B+C)/(40-NA)					
ITEM	PREPARACIÓN Y RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS	10	5	3	0	N.A
28	Se cuenta con el kit de primeros auxilios en el frente de trabajo de acuerdo a la labor y numero de trabajadores expuestos.		X			
29	Se realiza divulgación y entrenamiento en el plan de emergencias a trabajadores y visitantes .		X			
30	Los extintores están ubicados adecuadamente en el área y los trabajadores conocen su ubicación y utilización					X
31	La ruta de evacuación está debidamente señalizada, y el personal está enterado de la ubicación del punto de encuentro			X		
32	La empresa tiene contemplado un plan para la atención de emergencias de riesgo identificado					X
33	Se tienen conformadas la brigada de emergencia (incendio, evacuación, primeros auxilios) y poseen un programa de entrenamiento periódico.					X
	SUBTOTAL	0	10	3	0	3
	Valor Estructura: % Obtenido (A+B+C)/(60-NA)	43%				

ÍTEM	ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL	CRITERIO DE CALIFICACIÓN A	B	C	D	E
		10	5	3	0	N.A
ITEM	TRABAJOS EN ALTURAS	10	5	3	0	N.A
54	Se cuenta con elementos de protección pasiva, equipos certificados y cumplen con especificaciones técnicas. (escaleras, andamios, plataformas).	X				
55	Se cuenta con los elementos y equipos de protección personal de acuerdo al trabajo a realizar (arnés, cuerdas, eslingas, conectores) y se tienen las fichas de inspección de cada uno. (Ver registro)	X				
56	Se cuenta con kit y plan de rescate para trabajos en altura especifico para la labor	X				
57	Se cuenta con el coordinador certificado para trabajo seguro en alturas					X
58	Se cuenta con el rescatista certificado para trabajo seguro en alturas					X
	SUBTOTAL	30	0	0	0	2
	Valor Estructura: % Obtenido (A+B+C)/(40-NA)	150%				

GESTION EN CAMPO

	COMPONENTES	% OBTENIDO	10	5	3	0	N.A
1	DOCUMENTACION EN CAMPO	100%	90	0	0	0	0
2	ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL	100%	120	0	0	0	0
3	GESTIÓN AMBIENTAL Y SANITARIA	57%	10	30	0	0	0
4	MEDICINA PREVENTIVA	100%	10	0	0	0	2
5	GESTIÓN DEL PELIGRO	100%	30	0	0	0	4
6	SEÑALIZACIÓN	50%	0	25	0	0	0
7	MANEJO DE CARGAS Y MAQUINARIA PESADA		0	0	0	0	4
8	TRABAJOS EN ALTURAS	150%	30	0	0	0	2
9	PREPARACIÓN Y RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS	43%	0	10	3	0	3
	RESULTADO DE NUESTRA GESTIÓN EN CAMPO	87,6%	290	65	3	0	15

ALTO	MEDIO	BAJO
X		

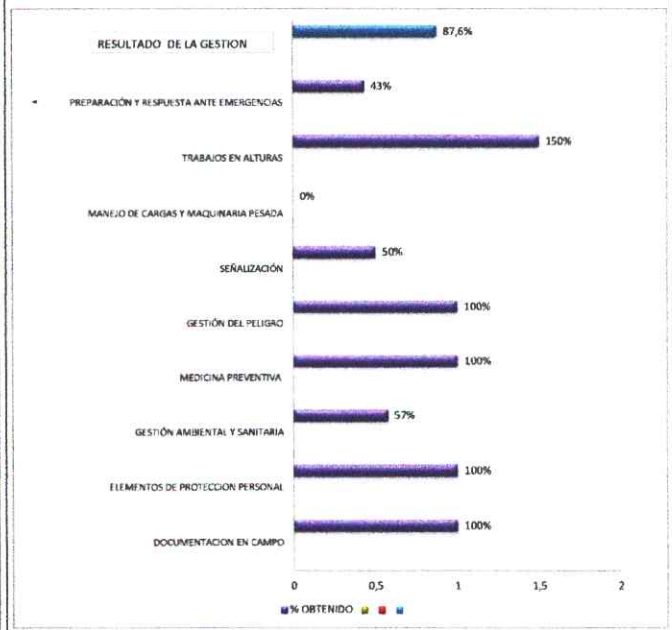


GRAFICO DE GESTION SISO

OBSERVACIONES

ÍTEM RELACIONADO	RECOMENDACIONES	FECHA DE SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO

OBSERVACIONES GENERALES

Firma
JUAN CARLOS PALACIOS MOLINA
RESIDENTE DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 52202-084671

Firma
MARYLIN PAOLA FONSECA CRUZ
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
SUPERVISORA

N/A

Firma
Nombre
PROFESIONAL SGSST OBRA
N° Matrícula Profesional:

N/A

Firma
Nombre
PROFESIONAL EN SGSST INTERVENTORIA
N° Matrícula Profesional:

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

ALCALDÍA PUERTO LOPEZ	CERTIFICACION DE SUPERVISION E INTERVENTORIA	Código: F – 313
		Versión: 001
		Fecha: Enero de 2021

EL SUSCRITO SUPERVISOR DEL CONTRATO DE OBRA No. 100-103-13-09-00001-2024 DEL 18 DE MARZO DE 2024

CERTIFICA

Que, el contratista denominado **UNION TEMPORAL CEMENTERIOS 2024**, identificada con **NIT: 901.811.916-1** y Representada legalmente por **ERIKA LORENA LESMES AGUIRRE**, quien se identifica con cedula de ciudadanía No. **1.121.865.059** de Villavicencio Meta, han cumplido a satisfacción con el **100%** de las actividades derivadas del contrato de obra N: **100-103-13-09-0001-2024**, cuyo objeto es "CONSTRUCCION BOVEDAS Y OSARIOS EN EL CEMENTERIO DEL MUNICIPIO DE PUERTO LOPEZ – META"; durante el periodo comprendido entre el 01 de Abril al 10 de Mayo de 2024.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervinieron y aprueban, a los 10 SEP 2024

MARYLIN PAOLA FONSECA CRUZ
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
SUPERVISORA

UNION TEMPORAL CEMENTERIOS 2024

Villavicencio Meta, 18 de Junio de 2024.

Señores:
MUNICIPIO DE PUERTO LOPEZ.
Ciudad.

REF.: CONTRATO DE OBRA No. 100-103-13-09-00001-2024

OBJETO: "CONSTRUCCION BOVEDAS Y OSARIOS EN EL CEMENTERIO DEL MUNICIPIO DE PUERTO LOPEZ – META"

Estimados señores:

Los suscritos, **ERIKA LORENA LESMES AGUIRRE**, identificada con 1.121.865.059, en mi condición de Representante Legal y **CARLOS ALBERTO MORENO CRUZ,** identificado con cedula de ciudadanía No. 86.082.604 de Villavicencio en calidad de Contador público con tarjeta profesional No. 198354 - T de **LA UNION TEMPORAL CEMENTERIOS 2024** identificada con Nit 901.811.916 - 1, declaro bajo la gravedad de juramento que LA UNION TEMPORAL CEMENTERIOS 2024, **NO** se encuentra obligado a cancelar aportes parafiscales: CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR, ICBF y SENA.

Lo anterior, de acuerdo a lo establecido en el artículo 65 de la Ley 1819 de 2016, articulo 114-1 del Estatuto Tributario la Sociedad cumple con los parámetros allí establecidos para estar exonerada del pago de los aportes parafiscales a favor del Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y las cotizaciones al Régimen Contributivo de Salud, en lo referente a los trabajadores que devenguen, individualmente considerados, menos de diez (10) salarios mínimos mensuales legales vigentes.

Nombre del proponente	UNION TEMPORAL CEMENTERIOS 2024
Nombre del representante legal	ERIKA LORENA LESMES AGUIRRE
C. C. No.	1.121.865.059 de Villavicencio Meta
Dirección de correo	KM 14 Via Acacias Vda Las Mercedes
Correo electrónico	sjisuministrossas@gmail.com
Ciudad	Villavicencio

Cordialmente,

ERIKA LORENA LESMES AGUIRRE.
CC. 1.121.865.059 de Villavicencio Meta.
Representante Legal.

CARLOS ALBERTO MORENO CRUZ
CC. 86.082.604 de Villavicencio
Contador Publico
TP: 19834 -T

UNION TEMPORAL CEMENTERIOS 2024

Villavicencio Meta, 18 de Junio de 2024.

Señores:
MUNICIPIO DE PUERTO LOPEZ.
Ciudad.

REF.: CONTRATO DE OBRA No. 100-103-13-09-00001-2024

OBJETO: "CONSTRUCCION BOVEDAS Y OSARIOS EN EL CEMENTERIO DEL MUNICIPIO DE PUERTO LOPEZ – META"

Estimados señores:

Yo, **ERIKA LORENA LESMES AGUIRRE**, identificado con 1.121.865.059, en mi condición de Representante Legal de **LA UNION TEMPORAL CEMENTERIOS 2024** identificada con Nit 901.811.916 - 1, certifico el pago de los aportes de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, (Articulo 65 Ley 1819 de 2016), pagados por la unión temporal desde el 01 de Abril hasta el 10 de mayo de 2024.

Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Nombre del proponente	UNION TEMPORAL CEMENTERIOS 2024
Nombre del representante legal	ERIKA LORENA LESMES AGUIRRE
C. C. No.	1.121.865.059 de Villavicencio Meta
Dirección de correo	KM 14 Via Acacias Vda Las Mercedes
Correo electrónico	sjisuministrossas@gmail.com
Ciudad	Villavicencio


Cordialmente,

ERIKA LORENA LESMES AGUIRRE.
CC. 1.121.865.059 de Villavicencio Meta.
Representante Legal.

CARLOS ALBERTO MORENO CRUZ
CC. 86.082.604 de Villavicencio
Contador Publico
TP: 19834 -T

CARLOS ALBERTO MORENO CRUZ
CONTADOR PUBLICO
TP: 198354-T



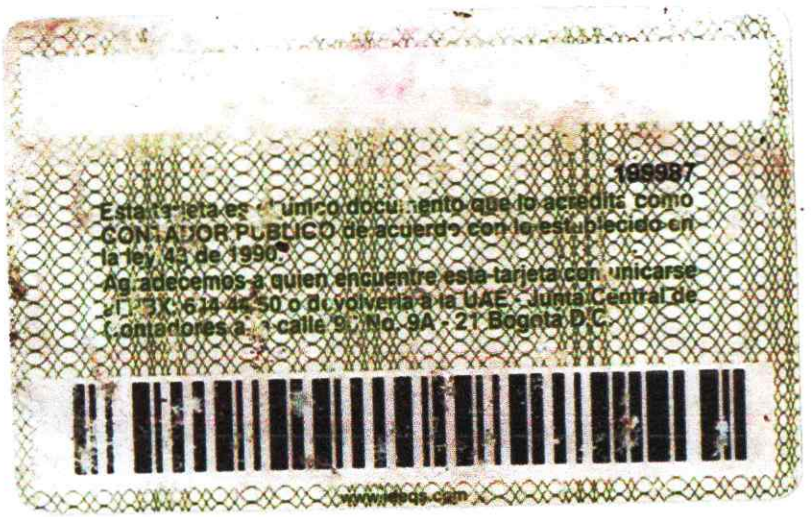

CARLOS ALBERTO MORENO CRUZ
CONTADOR PUBLICO
TP: 198354-T





151

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

0 5 2 0 A 1 A 1 F 3 D C 3 9 1 6

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **CARLOS ALBERTO MORENO CRUZ** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 86082604 de VILLAVICENCIO (META) Y Tarjeta Profesional No 198354-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *

	ACTA DE RELACION PERSONAL DE OBRA	Código: F - 244
ALCALDÍA PUERTO LOPEZ		Versión: 001
		Fecha: Septiembre de 2020

CONTRATO N°	**100-103-13-09-00001-2024**	**PROYECTO N°**	**2020505730014**
OBJETO DEL CONTRATO	CONSTRUCCION DE BOVEDAS Y OSARIOS EN EL CEMENTERIO DEL MUNICIPIO DE PUERTO LOPEZ META		
OBJETO DEL PROYECTO:	CONSTRUCCION DE BOVEDAS Y OSARIOS EN EL CEMENTERIO DEL MUNICIPIO DE PUERTO LOPEZ META		
CONTRATISTA:	UNION TEMPORAL CEMENTERIOS 2024		
NIT:	901811.916-1		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	N/A		
INTERVENTORÍA:	N/A		

PERIODO COMPRENDIDO ENTRE: 1 de abril de 2024 a 30 de abril de 2024

Nombres y Apellidos	Cargo y/o oficio	Cedula	Tipo de Vinculacion	Fecha de Ingreso	Fecha de Retiro	Asignación Salarial	AFILIACION								Ingreso Base de Cotización
							EPS	%	PENSION	%	ARL	NIVEL	Caja de Compensación	%	
JUAN CARLOS PALACIOS MOLINA	RESIDENTE	12.980.082	INDEPENDIENTE	1/04/2024	10/052024	$ 1.300.000,00	SANITAS	12,5	PORVENIR	16	POSITIVA	$ 1,00	N/A		$ 1.300.000,00

Nota: Mediante la presente acta se acredita que el personal de la ejecución del proyecto se encuentra Afiliado a los sistemas de seguridad social en Salud, Pensión y Riesgos; incluso los trabajadores independientes.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, a los **martes, 18 de junio de 2024**

Firma:
Nombre: ERIKA LORENA LEMES AGUIRRE
REPRESENTANTE LEGAL CONTRATISTA DE OBRA

Firma:
Nombre: MARYLIN PAOLA FONSECA CRUZ
Secretaria de Infraestructura
SUPERVISORA

Firma: N/A
Nombre:
DIRECTOR DE OBRA
N° Matrícula Profesional:

Firma: N/A
Nombre:
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional:

Firma: Carlos Moreno C.
Nombre: CARLOS ALBERTO MORENO CRUZ
CONTADOR DE CONTRATISTA
N° Matrícula Profesional: 198354 -T

Firma: N/A
Nombre:
CONTADOR DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional:

OBSERVACIONES:

Nota: Se debe Anexar a la presente Acta las afiliaciones del personal relacionado, previamente verificadas por la Supervisión.

Nota: Los formatos deben ser registrados según su correspondencia, asi mismo las casillas de N° de matricula profesional, deben ser diligenciadas en su totalidad.

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

ALCALDIA PUERTO LOPEZ	ACTA CONTROL Y SEGUIMIENTO SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES	Código: F - 252 Versión: 001 Fecha: Septiembre de 2020

PROYECTO:	

Fecha: 18/06/2024

CONTRATO N°	100-103-13-09-00001-2024	PROYECTO N°	2020505730014
OBJETO DEL PROYECTO:	CONSTRUCCION DE BOVEDAS Y OSARIOS EN EL CEMENTERIO DEL MUNICIPIO DE PUERTO LOPEZ META		
CONTRATISTA:	UNION TEMPORAL CEMENTERIOS 2024		
NIT:	901.811.916-1		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	N/A		
INTERVENTORÍA:	N/A		

NUMERO DE PLANILLA:							PERIODO COMPRENDIDO ENTRE:			1 de abril de 2024	a	30 de abril de 2024	
Nombre personal	Cargo y/o oficio	cedula	sueldo	Dias Cotizados	SALUD		PENSIÓN		Valor Riesgos profesionales	I.C.B.F.	SENA	caja de compensación	Total a pagar
					EPS	VALOR	PENSION	VALOR					
JUAN CARLOS PALACIOS MOLINA	RESIDENTE	12.980.082	$ 1.300.000,00	30	SANITAS	165100	PORVENIR	$ 211.300,00	$ 7.000,00	N/A	N/A	N/A	$ 383.400,00
												Total	$ 383.400,00

Nota: los pagos parafiscales serán verificados por la interventoria o supervisión y se anexan a la presente acta.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, el día 18 de Junio de 2024

Firma:
Nombre: ERIKA LORENA LESMES AGUIRRE
REPRESENTANTE LEGAL CONTRATISTA OBRA

Firma:
Nombre: MARYLIN PAOLA FONSECA CRUZ
Secretaria de Infraestructura
SUPERVISORA

Firma: N/A
Nombre:
DIRECTOR DE OBRA
N° Matrícula Profesional:

Firma: N/A
Nombre:
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional:

Firma: Carlos Moreno C.
Nombre: CARLOS ALBERTO MORENO CRUZ
CONTADOR DE CONTRATISTA OBRA
N° Matricula Profesional: 198354-T

Firma: N/A
Nombre:
CONTADOR DE INTERVENTORÍA
N° Matricula Profesional:

OBSERVACIONES

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

154

ASOPAGOS s.a.

RAZÓN SOCIAL :	PALACIOS MOLINA JUAN CARLOS
IDENTIFICACIÓN:	CC-12980082
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2024-05-06
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2024-04-18
FECHA DE PAGO:	2024-05-07
ENTIDAD DE PAGO:	BANCOLOMBIA
PERÍODO PENSIÓN:	2024-03
PERÍODO SALUD:	2024-03
NÚMERO PLANILLA:	29346085
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	29346085
TIPO DE PLANILLA:	I

ODIGO TIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS005	800251440	SANITAS	1	$ 1.300.000	$ 0	$ 0	$ 2.600	$ 162.500	$ 165.100
230301	800224808	PORVENIR	1	$ 1.300.000	$ 0	$ 0	$ 3.300	$ 208.000	$ 211.300
14-23	860011153	POSITIVA	1	$ 1.300.000	$ 0	$ 0	$ 200	$ 6.800	$ 7.000
				Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 6.100	$ 377.300	$ 383.400

PAGADO

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	22/05/2024

	ACTA DE RELACION PERSONAL DE OBRA	Código: F - 244
ALCALDÍA PUERTO LÓPEZ		Versión: 001
		Fecha: Septiembre de 2020

CONTRATO N°	**100-103-13-09-00001-2024**	**PROYECTO N°**	**2020505730014**
OBJETO DEL CONTRATO	CONSTRUCCION DE BOVEDAS Y OSARIOS EN EL CEMENTERIO DEL MUNICIPIO DE PUERTO LOPEZ META		
OBJETO DEL PROYECTO:	CONSTRUCCION DE BOVEDAS Y OSARIOS EN EL CEMENTERIO DEL MUNICIPIO DE PUERTO LOPEZ META		
CONTRATISTA:	UNION TEMPORAL CEMENTERIOS 2024		
NIT:	901811.916-1		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	N/A		
INTERVENTORÍA:	N/A		

PERIODO COMPRENDIDO ENTRE: 1 de mayo de 2024 a 10 de mayo de 2024

Nombres y Apellidos	Cargo y/o oficio	Cedula	Tipo de Vinculacion	Fecha de Ingreso	Fecha de Retiro	Asignación Salarial	AFILIACION								Ingreso Base de Cotización
							EPS	%	PENSION	%	ARL	NIVEL	Caja de Compensación	%	
JUAN CARLOS PALACIOS MOLINA	RESIDENTE	12.980.082	INDEPENDIENTE	1/04/2024	10/052024	$ 1.300.000,00	SANITAS	162500	PORVENIR	16	POSITIVA	$ 1,00	N/A		$ 1.300.000,00

Nota: Mediante la presente acta se acredita que el personal de la ejecución del proyecto se encuentra Afiliado a los sistemas de seguridad social en Salud, Pensión y Riesgos; incluso los trabajadores independientes.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, a los **martes, 18 de junio de 2024**

Firma:
Nombre: ERIKA LORENA LESMES AGUIRRE
REPRESENTANTE LEGAL CONTRATISTA DE OBRA

Firma:
Nombre: MARYLIN PAOLA FONSECA CRUZ
Secretaria de Infraestructura
SUPERVISORA

Firma: N/A
Nombre:
DIRECTOR DE OBRA
N° Matrícula Profesional:

Firma: N/A
Nombre:
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional:

Firma: Carlos Moreno C.
Nombre: CARLOS ALBERTO MORENO CRUZ
CONTADOR DE CONTRATISTA
N° Matrícula Profesional: 198354 -T

Firma: N/A
Nombre:
CONTADOR DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional:

OBSERVACIONES:

Nota: Se debe Anexar a la presente Acta las afiliaciones del personal relacionado, previamente verificadas por la Supervisión.

Nota: Los formatos deben ser registrados según su correspondencia, asi mismo las casillas de N° de matricula profesional, deben ser diligenciadas en su totalidad.

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

ALCALDÍA PUERTO LOPEZ	**ACTA CONTROL Y SEGUIMIENTO SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES**	**Código: F - 252** Versión: 001 Fecha: Septiembre de 2020

PROYECTO:	

Fecha: 18/06/2024

CONTRATO N°	**100-103-13-09-00001-2024**	**PROYECTO N°**	**2020505730014**
OBJETO DEL PROYECTO:	CONSTRUCCION DE BOVEDAS Y OSARIOS EN EL CEMENTERIO DEL MUNICIPIO DE PUERTO LOPEZ META		
CONTRATISTA:	UNION TEMPORAL CEMENTERIOS 2024		
NIT:	901.811.916-1		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	N/A		
INTERVENTORÍA:	N/A		

NUMERO DE PLANILLA:					**PERIODO COMPRENDIDO ENTRE:**		1 de mayo de 2024	a	30 de mayo de 2024			
Nombre personal	**Cargo y/o oficio**	**cedula**	**sueldo**	**Dias Cotizados**	**SALUD**		**PENSIÓN**		**Valor Riesgos profesionales**	**I.C.B.F.**	**SENA**	**caja de compensación**	**Total a pagar**
					EPS	**VALOR**	**PENSION**	**VALOR**					
JUAN CARLOS PALACIOS MOLINA	RESIDENTE	12.980.082	$ 1.300.000,00	30	SANITAS	163600	PORVENIR	$ 209.400,00	$ 6.900,00	N/A	N/A	N/A	$ 379.900,00
												Total	$ 379.900,00

Nota: los pagos parafiscales serán verificados por la interventoria o supervisión y se anexan a la presente acta.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, el día 18 de junio de 2024

Firma:
Nombre: ERIKA LORENA LEGUIZAMO AGUILERA
REPRESENTANTE LEGAL CONTRATISTA OBRA

Firma:
Nombre: MARYLIN PAOLA FONSECA CRUZ
Secretaria de Infraestructura
SUPERVISORA

Firma: N/A
Nombre:
DIRECTOR DE OBRA
N° Matrícula Profesional:

Firma: N/A
Nombre:
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional:

Firma: Carlos Moreno C.
Nombre: CARLOS ALBERTO MORENO CRUZ
CONTADOR DE CONTRATISTA OBRA
N° Matricula Profesional: 198354-T

Firma: N/A
Nombre:
CONTADOR DE INTERVENTORÍA
N° Matricula Profesional:

OBSERVACIONES:

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

13

ASOPAGOS s.a.

RAZÓN SOCIAL :	PALACIOS MOLINA JUAN CARLOS
IDENTIFICACIÓN:	CC-12980082
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2024-05-30
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2024-05-22
FECHA DE PAGO:	2024-05-30
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO DAVIVIENDA
PERÍODO PENSIÓN:	2024-04
PERÍODO SALUD:	2024-04
NÚMERO PLANILLA:	29811944
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	29811944
TIPO DE PLANILLA:	I

DIGO TIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS005	800251440	SANITAS	1	$ 1.300.000	$ 0	$ 0	$ 1.100	$ 162.500	$ 163.600
230301	800224808	PORVENIR	1	$ 1.300.000	$ 0	$ 0	$ 1.400	$ 208.000	$ 209.400
14-23	860011153	POSITIVA	1	$ 1.300.000	$ 0	$ 0	$ 100	$ 6.800	$ 6.900
				Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 2.600	$ 377.300	$ 379.900

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	24/06/2024

PAZ Y SALVO

Yo, **JUAN CARLOS PALACIOS MOLINA**, identificado con cedula de ciudadanía No. 12.980.082 de Pasto, me permito certificar que la UNION TEMPORAL CEMENTERIOS 2024, identificada con Nit. 901.811.916-1, se encuentra a Paz y Salvo, por todo concepto en lo que refiere al tema del contrato de obra No. 100-103-13-09-00001-2024, cuyo Objeto es: **CONSTRUCCION DE BOVEDAS Y OSARIOS EN EL CEMENTERIO DEL MUNICIPIO DE PUERTO LOPEZ META.**

El presente certificado se expide por solicitud del interesado a los Dieciocho (18) días del mes de Julio de 2024.

Cordialmente.

Firma:
Nombre: JUAN CARLOS PALACIOS MOLINA.
Cedula: 12.980.082 de Pasto
Cargo: Residente de Obra

159

Instituto Colombiano de Bienestar Familiar
Cecilia De la Fuente de Lleras
Regional Meta

50500

CERTIFICADO DE PAGO DE APORTES PARAFISCALES 3%
LEY 89 DE 1998

El Coordinador Financiero del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar Regional Meta certifica que, la **UNION TEMPORAL CEMENTERIO 2024**, identificado con **NIT 901.811.916-1**, representada legalmente por la señora **ERIKA LORENA LESMES AGUIRRE**, identificada con la cedula de ciudadanía No. 1.121.865.059 expedida en Villavicencio y con domicilio en el Km 14 vía Acacias Vra. Las Mercedes, Fca. Naranjitos, canceló al **INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR ICBF,** por concepto de aportes parafiscales del 3%, Ley 89 de 1988, por medio de la Planilla Integrada de liquidación de Aportes - PILA, el valor de **DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS PESOS M/CTE ($264.500)**, por concepto de personal que laboró en el desarrollo y ejecución del contrato de obra No. 100-103-13-09-00001-2024, correspondiente al periodo de marzo de 2024 a mayo de 2024, suscrito con la **ALCALDÍA DE PUERTO LOPEZ - META.**

Se expide el presente certificado de acuerdo con el radicado No. 20245050000O0104967 de fecha 2024-08-21.

En constancia se firma en Villavicencio, a los doce (12) días del mes de septiembre de 2024.

LEONARDO GONZALEZ VILLALOBOS
Coordinador Grupo Financiero
ICBF Regional Meta

Elaboró: Blanca Alcira Delgado Cristancho

160

Cofrem	FORMATO "CERTIFICACIÓN DE APORTES"	
	Dependencia Generadora: **División de Aportes**	Página 1 de 1

160- 2527

Villavicencio, 09 de septiembre 2024

Cofrem

Correspondencia Despachada
Vigencia: 2024 - No Radicacion: D-28961
Folios: 1
Destinatarios: UNION TEMPORAL CEMENTERIO 2024-(VILLAVICENCIO)
Enviado Por: LINA PAOLA ANDRADE CHAVEZ-Division de Aportes
Fecha : 10/09/2024-10:39 AM

EL JEFE DE LA DIVISIÓN DE APORTES

HACE CONSTAR

Que, revisada nuestra base de datos de Empleadores Afiliados, encontramos que la firma **UNION TEMPORAL CEMENTERIO 2024** con identificación No **901.811.916** se encuentra registrado como Empleador Aportante a esta Corporación, a la fecha efectúo aportes parafiscales para subsidio familiar sobre el 4%, por los meses de marzo a mayo de 2024.

COFREM 4%	$ 102.000,00
TOTAL	$ 102.000,00

SON: CIENTO DOS MIL PESOS M/CTE

Esta certificación se expide para **LIQUIDAR CONTRATO DE OBRA # 100-103-13-09-00001 DE 2024** con la entidad **ALCALDIA DE PUERTO LOPEZ - META**

WILLIAM MEDINA CORTES

161

lo exclusivo con Código de Barras No. de referencia 7590703

9 90 230901 EMVCO

Redeban

AGO 28 2024 11:47:29 RBMDES 9.90

CORRESPONSAL
BANCOLOMBIA
BARRIO LA NUEVA FLORES
CL 12 A 17 62 LA NUEVA
C. UNICO: 3007041908 TER: AAOWZ673
RECIBO: 088775 RRN: 137856
APRO: 312723

RECAUDO
CONVENIO: 29232
SERVICIO NACIONAL DE
REF: 7590703

VALOR $ 91.000

TU CORRESPONSAL BANCARIO NO DEBE COBRARTE POR HACER ESTA TRANSACCION.
Bancolombia es responsable por los servicios prestados por el CB. El CB no puede prestar servicios financieros por su cuenta. Verifique que la información en este documento este correcta. Para reclamos comuniquese al 018000912345. Conserve esta tirilla como soporte.

*** CLIENTE ***

NTE SE RECIBE PAGOS EN EFECTIVO
CON CHEQUE DE GERENCIA

izaje

9034-1

IMPORTANTE: El pago oportuno de este cupón es válido máximo hasta el quinto dia de haberse generado, en caso contrario debe volver a realizar la liquidacion y generar un nuevo cupón

REFERENCIA		
No. 115976347		
FECHA DE EXPEDICIÓN		
28	08	2024
FECHA VENCIMIENTO		
02	09	2024

I TEMPORAL — NIT o C.C. 901811916

1 VIA — Teléfono +57,313

DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
)		
NOVENTA Y UNO MIL PESOS.	SUBTOTAL	$ 91,000.00
	IVA	
	TOTAL FACTURA	$ 91,000.00

Observaciones
Al realizar su pago tenga en cuenta lo siguiente:
La impresión de este cupón debe realizarse con impresora láser de alta resolución.
Si va a cancelar con Cheque, solo se recibe Cheque de Gerencia.
Al cancelar su pago se debe hacer solo por un medio de pago (todo en efectivo o todo con cheque de gerencia).
Se deben presentar todas las copias de la impresión en la Sucursal o Corresponsal Bancario.
Si se presenta algún incidente con el cupón y/o la Plataforma de Pagos SENA escribanos al correo certiaportes@sena.edu.co
Términos y condiciones podrá encontrarlos en www.sena.edu.co

(415)7707012100010(8020)7590703(3900)000000091000(96)20240902

Bancolombia

CONVENIO No. 29232 — **REFERENCIA No.** 115976347

Ciudad | D | M | A | NIT 901811916 | Telefono

Nombre del Pagador / Cliente: UNION TEMPORAL

Bco	CHEQUE No.	CUENTA No.	CONCEPTO	VALOR

Los cheques incluidos en esta consignación son sujetos a verificación posterior Por el total indicado en la misma. El banco solo ampara el efectivo indicado en el original de la consignación. Si hubiere errores o faltantes, el banco hará los ajustes necesarios en la cuenta corriente del cliente. Sobre el valor de la consignación hecha en el cheque no puede girarse hasta dichos cheques sean corrientes.

CANTIDAD DE CHEQUES

EFECTIVO	
CHEQUE	
TOTAL	

AREA PARA SELLO

ALCALDÍA PUERTO LÓPEZ	BITACORA DE OBRA	Código: F - 249
		Versión: 001
		Fecha: Septiembre de 2020

PROYECTO:

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA DIA	FECHA MES	FECHA AÑO	HORA Inicio de labores	HORA Terminación de labores
Municipio Puerto lopez - Meta	01	4	2024	6:00 am	4:00 pm

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

CONTRATO OBRA N°	100-103-13-09-00001-2024	PROYECTO N°	
CONTRATO INTERVENTORIA N°	100-103-13-09-00001-2024		
OBJETO PROYECTO	Construccion bovedas y osarios en el cementerio del municipio de Puerto lopez - Meta		
TIEMPO DE EJECUCION			

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES:
NUBLADO	X	X		
TORMENTA				
LLUVIOSO			X	
SOLEADO				
Tiempo de standby por lluvias				

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
MAESTRO	1					
OFICIAL	2					
OPERARIO						
AYUDANTE	2					
CELADOR						
TOPOGRAFO						
CADENERO						
OTRO						

ASPECTOS TECNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CANT. EJECUTADA	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS (SI/NO)	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)
Localizacion y replanteo convencional obra arquitectonica.	M2	NO fue necesario ni modificación ni mayores, ni menores cantidades	14,88 M2	SI	SI

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES
	NOTA: LAS OBSERVACIONES DEBEN SER DILIGENCIADAS POR EL RESIDENTE DE INTERVENTORIA DONDE DEBE JUSTIFICAR LAS RAZONES POR LAS CUALES SE DESARROLLA LA ACTIVIDAD

Scanned with ACE Scanner

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
Municipio Puerto lopez - Meta	1	08	2024	6:00 am	4:00 pm

OBSERVACIONES GENERALES

NOTA: LAS OBSERVACIONES DEBEN SER DILIGENCIADAS POR EL RESIDENTE DE INTERVENTORIA, CON EL OBJETO DE DEJAR CONSTANCIA DE LA CONFORMIDAD DE LAS ACTIVIDADES

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
Nombre:	RESIDENTE DE OBRA	N° Mat. Profesional:	
Nombre:	RESIDENTE DE INTERVENTORIA	N° Mat. Profesional:	
Nombre:	DIRECTOR DE OBRA	N° Mat. Profesional:	
Nombre:	DIRECTOR DE INTERVENTORIA	N° Mat. Profesional:	
Cuando se presentan visitas de profesionales especializados u otras entidades, se registran observaciones generales y se firma a continuacion:			
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

Scanned with ACE Scanner

	BITACORA DE OBRA	Código: F - 249
ALCALDIA PUERTO LOPEZ		Versión: 001
		Fecha: Septiembre de 2020

PROYECTO:	

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminacion de labores
Municipio Puerto lopez - Meta	1	09	2024	6:00 am	4:00 pm

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

CONTRATO OBRA N°	100-103-13-09-00001-2024	PROYECTO N°	
CONTRATO INTERVENTORIA N°	100-103-13-09-00001-2024		
OBJETO PROYECTO	Construcción de bovedas y osarios en el cementerio del municipio de Puerto lopez - Meta		
TIEMPO DE EJECUCION			

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES:
NUBLADO	X		X	
TORMENTA				
LLUVIOSO				
SOLEADO		X		
Tiempo de standby por lluvias				

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
MAESTRO	1					
OFICIAL	2					
OPERARIO						
AYUDANTE	2					
CELADOR						
TOPOGRAFO						
CADENERO						
OTRO						

ASPECTOS TECNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CANT. EJECUTADA	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS (SI/NO)	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)
Descapote manual	M2	remoción cuidadosa y precisa de la capa superficial del suelo, eliminación de obstaculos.	1488 M2	SI	SI

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES
	NOTA: LAS OBSERVACIONES DEBEN SER DILIGENCIADAS POR EL RESIDENTE DE INTERVENTORIA, DONDE DEBE JUSTIFICAR LAS RAZONES POR LAS CUALES SE DESARROLLA LA ACTIVIDAD.

Scanned with ACE Scanner

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DÍA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminacion de labores
Municipio Puerto lopez - Meta	1	04	2021	6:00am	1:00 pm

OBSERVACIONES GENERALES

NOTA: LAS OBSERVACIONES DEBEN SER DILIGENCIADAS POR EL RESIDENTE DE INTERVENTORIA, CON EL OBJETO DE DEJAR CONSTANCIA DE LA CONFORMIDAD DE LAS ACTIVIDADES

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
Nombre:	RESIDENTE DE OBRA	N° Mat. Profesional:	
Nombre:	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional:	
Nombre:	DIRECTOR DE OBRA	N° Mat. Profesional:	
Nombre:	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional:	
Cuando se presentan visitas de profesionales especializados u otras entidades, se registran observaciones generales y se firma a continuación:			
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

Scanned with ACE Scanner

	BITACORA DE OBRA	Código: F - 249
ALCALDÍA PUERTO LÓPEZ		Versión: 001
		Fecha: Septiembre de 2020

PROYECTO:	

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
Municipio Puerto Lopez - Meta	2	04	2024	6:00am	4:00 pm

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

CONTRATO OBRA N°	100-103-13-09-00001-2024	PROYECTO N°	
CONTRATO INTERVENTORIA N°	100-103-13-09-00001-2024		
OBJETO PROYECTO	Construcción bovedas y osarios en el cementerio del municipio de puerto lopez - Meta		
TIEMPO DE EJECUCION			

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES:
NUBLADO			X	
TORMENTA				
LLUVIOSO				
SOLEADO	X	X		
Tiempo de standby por lluvias				

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
MAESTRO	1					
OFICIAL	2					
OPERARIO						
AYUDANTE	2					
CELADOR						
TOPOGRAFO						
CADENERO						
OTRO						

ASPECTOS TECNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CANT. EJECUTADA	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS (SI/NO)	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)
Solado, limpieza en concreto	M3	Preparar y limpiar el área.	0,15	Si	SI

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES
	NOTA: LAS OBSERVACIONES DEBEN SER DILIGENCIADAS POR EL RESIDENTE DE INTERVENTORIA DONDE DEBE JUSTIFICAR LAS RAZONES POR LAS CUALES SE DESARROLLA LA ACTIVIDAD

Scanned with ACE Scanner

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
Municipio Puerto Lopez - Meta	2	03	2021	6:00 am	4:00 pm

OBSERVACIONES GENERALES

NOTA: LAS OBSERVACIONES DEBEN SER DILIGENCIADAS POR EL RESIDENTE DE INTERVENTORIA, CON EL OBJETO DE DEJAR CONSTANCIA DE LA CONFORMIDAD DE LAS ACTIVIDADES.

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
Nombre:	RESIDENTE DE OBRA	N° Mat. Profesional:	
Nombre:	RESIDENTE DE INTERVENTORIA	N° Mat. Profesional:	
Nombre:	DIRECTOR DE OBRA	N° Mat. Profesional:	
Nombre:	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional:	
Cuando se presentan visitas de profesionales especializados u otras entidades, se registran observaciones generales y se firma a continuacion:			
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

Scanned with ACE Scanner

	BITACORA DE OBRA	Código: F - 249
		Versión: 001
		Fecha: Septiembre de 2020

PROYECTO:	

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
Municipio Puerto lopez - Meta	3	04	2024	8:00 am	4:00pm

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

CONTRATO OBRA N°	100-103-13-09-00001-2024	PROYECTO N°	
CONTRATO INTERVENTORIA N°	100-103-13-09-00001-2024		
OBJETO PROYECTO	Construcción bovedas y osarios en el cementerio del municipio de Puerto lopez - Meta		
TIEMPO DE EJECUCION			

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES:
NUBLADO	X	X	X	
TORMENTA				
LLUVIOSO				
SOLEADO				
Tiempo de standby por lluvias				

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
MAESTRO	1					
OFICIAL	2					
OPERARIO						
AYUDANTE	2					
CELADOR						
TOPOGRAFO						
CADENERO						
OTRO						

ASPECTOS TECNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CANT. EJECUTADA	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS (SI/NO)	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)
Solado, limpieza en concreto	M3	Fundido con espesor de 2.5 cm	0,15	SI	SI

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES
	NOTA: LAS OBSERVACIONES DEBEN SER DILIGENCIADAS POR EL RESIDENTE DE INTERVENTORIA DONDE DEBE JUSTIFICAR LAS RAZONES POR LAS CUALES SE DESARROLLA LA ACTIVIDAD

Scanned with ACE Scanner

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
Municipio puerto lopez - Meta	3	04	2024	8:00 am	4:00 pm

OBSERVACIONES GENERALES

NOTA: LAS OBSERVACIONES DEBEN SER DILIGENCIADAS POR EL RESIDENTE DE INTERVENTORIA, CON EL OBJETO DE DEJAR CONSTANCIA DE LA CONFORMIDAD DE LAS ACTIVIDADES.

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
Nombre:	RESIDENTE DE OBRA	N° Mat. Profesional:	
Nombre:	RESIDENTE DE INTERVENTORIA	N° Mat. Profesional:	
Nombre:	DIRECTOR DE OBRA	N° Mat. Profesional:	
Nombre:	DIRECTOR DE INTERVENTORIA	N° Mat. Profesional:	
Cuando se presentan visitas de profesionales especializados u otras entidades, se registran observaciones generales y se firma a continuación:			
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

Scanned with ACE Scanner

	BITACORA DE OBRA	Código: F - 249
ALCALDIA PUERTO LOPEZ		Versión: 001
		Fecha: Septiembre de 2020

PROYECTO:	

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
Municipio Puerto lopez - Meta	21	04	2024	6:00 am	4:00 pm

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

CONTRATO OBRA N°	100-108-13-09-00001-2024	PROYECTO N°	
CONTRATO INTERVENTORIA N°	100-103-13-09-00001-2024		
OBJETO PROYECTO	Construcción de bovedas y osarios en el cementerio del municipio de Puerto lopez - Meta		
TIEMPO DE EJECUCION			

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES:
NUBLADO				
TORMENTA				
LLUVIOSO				
SOLEADO	X	X	X	
Tiempo de standby por lluvias				

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
MAESTRO	1					
OFICIAL	2					
OPERARIO						
AYUDANTE	2					
CELADOR						
TOPOGRAFO						
CADENERO						
OTRO						

ASPECTOS TECNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CANT. EJECUTADA	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS (SI/NO)	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)
Viga en concreto 20.7 MPa	M3	Amarre de hierro y encofrado	1.42	Si	Si

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES
	NOTA: LAS OBSERVACIONES DEBEN SER DILIGENCIADAS POR EL RESIDENTE DE INTERVENTORIA, DONDE DEBE JUSTIFICAR LAS RAZONES POR LAS CUALES SE DESARROLLA LA ACTIVIDAD.

Scanned with ACE Scanner

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
Municipio Puerto lopez - Meta	4	04	2024	6:00am	4:00 pm

OBSERVACIONES GENERALES

NOTA: LAS OBSERVACIONES DEBEN SER DILIGENCIADAS POR EL RESIDENTE DE INTERVENTORIA CON EL OBJETO DE DEJAR CONSTANCIA DE LA CONFORMIDAD DE LAS ACTIVIDADES.

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
Nombre:	RESIDENTE DE OBRA	N° Mat. Profesional:	
Nombre:	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional:	
Nombre:	DIRECTOR DE OBRA	N° Mat. Profesional:	
Nombre:	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional:	
Cuando se presentan visitas de profesionales especializados u otras entidades, se registran observaciones generales y se firma a continuación:			
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

Scanned with ACE Scanner

ALCALDIA PUERTO LOPEZ	BITACORA DE OBRA	Código: F - 249
		Versión: 001
		Fecha: Septiembre de 2020

PROYECTO:	

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
Municipio Puerto Lopez - Meta	5	9	2024	5:00 am	4:00 pm

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

CONTRATO OBRA N°	100-103-13-09-00001-2024	PROYECTO N°	
CONTRATO INTERVENTORIA N°	100-103-13-09-00001-2024		
OBJETO PROYECTO	Construcción bovedas y osarios en el cementerio del municipio de Puerto lopez - Meta.		
TIEMPO DE EJECUCION			

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES:
NUBLADO		X	X	
TORMENTA				
LLUVIOSO				
SOLEADO	X			
Tiempo de standby por lluvias				

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
MAESTRO	1					
OFICIAL	2					
OPERARIO						
AYUDANTE	2					
CELADOR						
TOPOGRAFO						
CADENERO						
OTRO						

ASPECTOS TECNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CANT. EJECUTADA	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS (SI/NO)	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)
Viga en Concreto 20.7MPa	M3	Mezcla de concreto, reforzada con acero.	1.42	SI	SI

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES
	NOTA: LAS OBSERVACIONES DEBEN SER DILIGENCIADAS POR EL RESIDENTE DE INTERVENTORIA, DONDE DEBE JUSTIFICAR LAS RAZONES POR LAS CUALES SE DESARROLLA LA ACTIVIDAD

Scanned with ACE Scanner

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
Municipio Puerto Lopez - Meta	5	04	2024	6:00 am	4:00 pm

OBSERVACIONES GENERALES

NOTA: LAS OBSERVACIONES DEBEN SER DILIGENCIADAS POR EL RESIDENTE DE INTERVENTORIA, CON EL OBJETO DE DEJAR CONSTANCIA DE LA CONFORMIDAD DE LAS ACTIVIDADES

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
Nombre:	RESIDENTE DE OBRA	N° Mat. Profesional:	
Nombre:	RESIDENTE DE INTERVENTORIA	N° Mat. Profesional:	
Nombre:	DIRECTOR DE OBRA	N° Mat. Profesional:	
Nombre:	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional:	
Cuando se presentan visitas de profesionales especializados u otras entidades, se registran observaciones generales y se firma a continuacion:			
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

Scanned with ACE Scanner

ALCALDIA PUERTO LOPEZ	BITACORA DE OBRA	Código: F - 249
		Versión: 001
		Fecha: Septiembre de 2020

PROYECTO:	

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
Municipio Puerto lopez - Meta	8	04	2024	6:00 am	4:00 pm

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

CONTRATO OBRA N°	100-103-13-09-00001-2024	PROYECTO N°	
CONTRATO INTERVENTORIA N°	100-103-13-09-00001-2024		
OBJETO PROYECTO	Construcción bovedas y osarios en el cementerio del municipio de Puerto lopez - Meta		
TIEMPO DE EJECUCION			

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES:
NUBLADO	X	X	X	
TORMENTA				
LLUVIOSO				
SOLEADO				
Tiempo de standby por lluvias				

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
MAESTRO	1					
OFICIAL	2					
OPERARIO						
AYUDANTE	2					
CELADOR						
TOPÓGRAFO						
CADENERO						
OTRO						

ASPECTOS TECNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CANT. EJECUTADA	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS (SI/NO)	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)
Relleno con material Mixto	M3	uso de materiales como tierra y grava. Para nivelar y reforzar el terreno antes de la construcción	3,63	SI	SI

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES
	NOTA: LAS OBSERVACIONES DEBEN SER DILIGENCIADAS POR EL RESIDENTE DE INTERVENTORÍA, DONDE DEBE JUSTIFICAR LAS RAZONES POR LAS CUALES SE DESARROLLA LA ACTIVIDAD

Scanned with ACE Scanner

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
Municipio Puerto lopez - Meta	8	04	2024	6:00 am	4:00 pm

OBSERVACIONES GENERALES

NOTA: LAS OBSERVACIONES DEBEN SER DILIGENCIADAS POR EL RESIDENTE DE INTERVENTORÍA CON EL OBJETO DE DEJAR CONSTANCIA DE LA CONFORMIDAD DE LAS ACTIVIDADES

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
Nombre:	RESIDENTE DE OBRA	N° Mat. Profesional:	
Nombre:	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional:	
Nombre:	DIRECTOR DE OBRA	N° Mat. Profesional:	
Nombre:	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional:	
Cuando se presentan visitas de profesionales especializados u otras entidades, se registran observaciones generales y se firma a continuación:			
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

Scanned with ACE Scanner

ALCALDIA PUERTO LOPEZ	BITACORA DE OBRA	Código: F - 249 Versión: 001 Fecha: Septiembre de 2020

PROYECTO:	

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
Municipio Puerto lopez - Meta	9	04	2024	6:00am	4:00 pm

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

CONTRATO OBRA N°	100-103-13-09-00001-2023	PROYECTO N°	
CONTRATO INTERVENTORIA N°	100-103-13-09-00001-2024		
OBJETO PROYECTO	Construcción de bovedas y osarios en el Cementerio del Municipio Puerto lopez - Meta		
TIEMPO DE EJECUCION			

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES:
NUBLADO			X	
TORMENTA				
LLUVIOSO				
SOLEADO	X	X		
Tiempo de standby por lluvias				

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
MAESTRO	1					
OFICIAL	2					
OPERARIO						
AYUDANTE	2					
CELADOR						
TOPÓGRAFO						
CADENERO						
OTRO						

ASPECTOS TECNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CANT. EJECUTADA	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS (SI/NO)	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)
Columna en concreto 20.7MPa	M3	Amarre de hierro y encofrado	0.90	SI	SI

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES
	NOTA: LAS OBSERVACIONES DEBEN SER DILIGENCIADAS POR EL RESIDENTE DE INTERVENTORIA, DONDE DEB JUSTIFICAR LAS RAZONES POR LAS CUALES SE DESARROLLA LA ACTIVIDAD.

Scanned with ACE Scanner

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
Municipio Puerto lopez-Meta	9	04	2024	8:00 am	4:00 pm

OBSERVACIONES GENERALES

NOTA. LAS OBSERVACIONES DEBEN SER DILIGENCIADAS POR EL RESIDENTE DE INTERVENTORIA, CON EL OBJETO DE DEJAR CONSTANCIA DE LA CONFORMIDAD DE LAS ACTIVIDADES.

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
Nombre:	RESIDENTE DE OBRA	N° Mat. Profesional:	
Nombre:	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional:	
Nombre:	DIRECTOR DE OBRA	N° Mat. Profesional:	
Nombre:	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional:	
Cuando se presentan visitas de profesionales especializados u otras entidades, se registran observaciones generales y se firma a continuación:			
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

Scanned with ACE Scanner

ALCALDÍA PUERTO LÓPEZ	BITACORA DE OBRA	Código: F - 249 Versión: 001 Fecha: Septiembre de 2020

PROYECTO:	

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
Municipio Puerto lopez - Meta	9	09	2024	6:00 am	4:00 pm

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

CONTRATO OBRA N°	100-103-13-09-00001-2024	PROYECTO N°	
CONTRATO INTERVENTORIA N°	100-103-13-09-00001-2024		
OBJETO PROYECTO	Construcción de bovedas y osarios en el cementerio del Municipio de Puerto lopez - Meta		
TIEMPO DE EJECUCION			

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES:
NUBLADO			X	
TORMENTA				
LLUVIOSO				
SOLEADO	X	X		
Tiempo de standby por lluvias				

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
MAESTRO	1					
OFICIAL	2					
OPERARIO						
AYUDANTE	2					
CELADOR						
TOPÓGRAFO						
CADENERO						
OTRO						

ASPECTOS TÉCNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CANT. EJECUTADA	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS (SI/NO)	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)
Acero de refuerzo Fy=4200Kg/cm2	Kg	Figurado, armado, colocación y amarre	401,51	SI	SI

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES
	NOTA: LAS OBSERVACIONES DEBEN SER DILIGENCIADAS POR EL RESIDENTE DE INTERVENTORIA. DONDE DEBE JUSTIFICAR LAS RAZONES POR LAS CUALES SE DESARROLLA LA ACTIVIDAD

Scanned with ACE Scanner

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
Municipio Puerto lopez-Meta	9	09	2024	6:00 am	9:00 pm

OBSERVACIONES GENERALES

NOTA: LAS OBSERVACIONES DEBEN SER DILIGENCIADAS POR EL RESIDENTE DE INTERVENTORIA. CON EL OBJETO DE DEJAR CONSTANCIA DE LA CONFORMIDAD DE LAS ACTIVIDADES

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
Nombre:	RESIDENTE DE OBRA	N° Mat. Profesional:	
Nombre:	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional:	
Nombre:	DIRECTOR DE OBRA	N° Mat. Profesional:	
Nombre:	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional:	
Cuando se presentan visitas de profesionales especializados u otras entidades, se registran observaciones generales y se firma a continuación:			
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

Scanned with ACE Scanner

ALCALDIA PUERTO LOPEZ	BITACORA DE OBRA	Código: F - 249 Versión: 001 Fecha: Septiembre de 2020

PROYECTO:	

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
Municipio Puerto lopez - Meta	10	04	2024	8:00 am	4:00 pm

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

CONTRATO OBRA N°	100-103-13-09-00001-2024	PROYECTO N°	
CONTRATO INTERVENTORIA N°	100-103-13-09-00001-2024		
OBJETO PROYECTO	Construccion de bovedas y osarios en el cementerio del municipio de Puerto lopez - Meta		
TIEMPO DE EJECUCION			

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES:
NUBLADO	X	X		
TORMENTA				
LLUVIOSO			X	
SOLEADO				
Tiempo de standby por lluvias				

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
MAESTRO	1					
OFICIAL	2					
OPERARIO						
AYUDANTE	2					
CELADOR						
TOPÓGRAFO						
CADENERO						
OTRO						

ASPECTOS TECNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CANT. EJECUTADA	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS (SI/NO)	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)
Columna en concreto 2da MB	M3	Fundido con concreto reforzado 3000 PSI	0.90	SI	SI

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES
	NOTA: LAS OBSERVACIONES DEBEN SER DILIGENCIADAS POR EL RESIDENTE DE INTERVENTORÍA. DONDE DEBE JUSTIFICAR LAS RAZONES POR LAS CUALES SE DESARROLLA LA ACTIVIDAD.

Scanned with ACE Scanner

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
Municipio Puerto Lopez-Meta	10	04	2024	6:00 am	1:00 pm

OBSERVACIONES GENERALES

NOTA: LAS OBSERVACIONES DEBEN SER DILIGENCIADAS POR EL RESIDENTE DE INTERVENTORÍA, CON EL OBJETO DE DEJAR CONSTANCIA DE LA CONFORMIDAD DE LAS ACTIVIDADES

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
Nombre:	RESIDENTE DE OBRA	N° Mat. Profesional:	
Nombre:	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional:	
Nombre:	DIRECTOR DE OBRA	N° Mat. Profesional:	
Nombre:	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional:	
Cuando se presentan visitas de profesionales especializados u otras entidades, se registran observaciones generales y se firma a continuación:			
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional.	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

Scanned with ACE Scanner

ALCALDIA PUERTO LOPEZ	BITACORA DE OBRA	Código: F - 249 Versión: 001 Fecha: Septiembre de 2020

PROYECTO:	

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
Municipio Puerto lopez-Meta	12	04	2024	6:00 am	4:00 pm

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

CONTRATO OBRA N°	100-03-13-09-00001-2024	PROYECTO N°	
CONTRATO INTERVENTORIA N°	100-03-13-09-00001-2024		
OBJETO PROYECTO	Construccion de bovedas y osarios en el Cementerio del municipio de Puerto lopez-Meta		
TIEMPO DE EJECUCION			

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES:
NUBLADO				
TORMENTA				
LLUVIOSO				
SOLEADO	X	X	X	
Tiempo de standby por lluvias				

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
MAESTRO	1					
OFICIAL	2					
OPERARIO						
AYUDANTE	2					
CELADOR						
TOPÓGRAFO						
CADENERO						
OTRO						

ASPECTOS TÉCNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CANT. EJECUTADA	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS (SI/NO)	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)
Placa de contrapiso en concreto 20.7 MPa	M3	Concreto reforzado en 3000 Psi con 7cm de espesor	1,25	SI	SI

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES
	NOTA: LAS OBSERVACIONES DEBEN SER DILIGENCIADAS POR EL RESIDENTE DE INTERVENTORÍA, DONDE DEBE JUSTIFICAR LAS RAZONES POR LAS CUALES SE DESARROLLA LA ACTIVIDAD.

Scanned with ACE Scanner

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
Municipio Puerto lopez - Meta	17	04	2024	6:00 am	4:00 pm

OBSERVACIONES GENERALES

NOTA: LAS OBSERVACIONES DEBEN SER DILIGENCIADAS POR EL RESIDENTE DE INTERVENTORIA CON EL OBJETO DE DEJAR CONSTANCIA DE LA CONFORMIDAD DE LAS ACTIVIDADES.

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
Nombre:	RESIDENTE DE OBRA	N° Mat. Profesional:	
Nombre:	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional:	
Nombre:	DIRECTOR DE OBRA	N° Mat. Profesional:	
Nombre:	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional:	
Cuando se presentan visitas de profesionales especializados u otras entidades, se registran observaciones generales y se firma a continuación:			
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

Scanned with ACE Scanner

ALCALDIA PUERTO LOPEZ	BITACORA DE OBRA	Código: F - 249 Versión: 001 Fecha: Septiembre de 2020

PROYECTO:	

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA DIA	FECHA MES	FECHA AÑO	HORA Inicio de labores	HORA Terminación de labores
Municipio Puerto lopez - Meta	13	09	2024	6:00 am	4:00 pm

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

CONTRATO OBRA N°	100-103-13-09-00001-2024	PROYECTO N°	
CONTRATO INTERVENTORIA N°	100-103-13-09-00001-2024		
OBJETO PROYECTO	Construcción de bovedas y osarios en el cementerio del municipio de Puerto lopez - Meta.		
TIEMPO DE EJECUCION			

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES:
NUBLADO	X		X	
TORMENTA				
LLUVIOSO				
SOLEADO		X		
Tiempo de standby por lluvias				

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
MAESTRO	1					
OFICIAL	2					
OPERARIO						
AYUDANTE	2					
CELADOR						
TOPÓGRAFO						
CADENERO						
OTRO						

ASPECTOS TECNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CANT. EJECUTADA	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS (SI/NO)	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)
Placa de entrepiso maciza en concreto 20.7 MPa	M3	instalación de losa solida de concreto, para separar niveles en la estructura	3,85	Si	Si

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES
	NOTA: LAS OBSERVACIONES DEBEN SER DILIGENCIADAS POR EL RESIDENTE DE INTERVENTORÍA, DONDE DEBE JUSTIFICAR LAS RAZONES POR LAS CUALES SE DESARROLLA LA ACTIVIDAD

Scanned with ACE Scanner

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
Municipio Puerto lopez - Meta	15	09	2024	6:00 am	4:00 pm

OBSERVACIONES GENERALES

NOTA: LAS OBSERVACIONES DEBEN SER DILIGENCIADAS POR EL RESIDENTE DE INTERVENTORÍA, CON EL OBJETO DE DEJAR CONSTANCIA DE LA CONFORMIDAD DE LAS ACTIVIDADES

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
Nombre:	RESIDENTE DE OBRA	N° Mat. Profesional:	
Nombre:	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional:	
Nombre:	DIRECTOR DE OBRA	N° Mat. Profesional:	
Nombre:	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional:	
Cuando se presentan visitas de profesionales especializados u otras entidades, se registran observaciones generales y se firma a continuación:			
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

Scanned with ACE Scanner

ALCALDÍA PUERTO LÓPEZ	BITACORA DE OBRA	Código: F - 249 Versión: 001 Fecha: Septiembre de 2020

PROYECTO:

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
Municipio Puerto lopez - Meta	15	04	2024	5:00 am	4:50 pm

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

CONTRATO OBRA N°	100-103-13-09-00001-2021	PROYECTO N°	
CONTRATO INTERVENTORIA N°	100103-13-001-00001-2021		
OBJETO PROYECTO	Construccion de bovedas y osarios en el Cementerio del Municipio de Puerto lopez - Meta		
TIEMPO DE EJECUCION			

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES:
NUBLADO	X	X	X	
TORMENTA				
LLUVIOSO				
SOLEADO				
Tiempo de standby por lluvias				

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
MAESTRO	1					
OFICIAL	2					
OPERARIO						
AYUDANTE	2					
CELADOR						
TOPÓGRAFO						
CADENERO						
OTRO						

ASPECTOS TECNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CANT. EJECUTADA	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS (SI/NO)	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)
Malla electrosoldada FY = 5000 KG/CM2, 500 MPa	KG	barras de acero soldadas entre sí en una configuración de cuadrícula.	151,54	SI	SI

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES
	NOTA. LAS OBSERVACIONES DEBEN SER DILIGENCIADAS POR EL RESIDENTE DE INTERVENTORIA. DONDE DEBE JUSTIFICAR LAS RAZONES POR LAS CUALES SE DESARROLLA LA ACTIVIDAD

Scanned with ACE Scanner

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
Municipio Puerto Lopez - Meta	15	04	2024	6:00 am	4:00 pm

OBSERVACIONES GENERALES

NOTA: LAS OBSERVACIONES DEBEN SER DILIGENCIADAS POR EL RESIDENTE DE INTERVENTORÍA, CON EL OBJETO DE DEJAR CONSTANCIA DE LA CONFORMIDAD DE LAS ACTIVIDADES

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
Nombre:	RESIDENTE DE OBRA	N° Mat. Profesional:	
Nombre:	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional:	
Nombre:	DIRECTOR DE OBRA	N° Mat. Profesional:	
Nombre:	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional:	
Cuando se presentan visitas de profesionales especializados u otras entidades, se registran observaciones generales y se firma a continuación:			
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

Scanned with ACE Scanner

ALCALDIA PUERTO LOPEZ	BITACORA DE OBRA	Código: F - 249 Versión: 001 Fecha: Septiembre de 2020

PROYECTO:

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
Municipio Puerto lopez - Meta	17	09	2021	6:00 am	4:00 pm

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

CONTRATO OBRA N°	100-103-13-09-00001-2021	PROYECTO N°	
CONTRATO INTERVENTORIA N°	100-103-13-09-00001-2021		
OBJETO PROYECTO	Construccion de bovedas y osarios en el cementerio del Municipio de Puerto lopez - Meta		
TIEMPO DE EJECUCION			

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES:
NUBLADO				
TORMENTA				
LLUVIOSO			X	
SOLEADO	X	X		
Tiempo de standby por lluvias				

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
MAESTRO	1					
OFICIAL	2					
OPERARIO						
AYUDANTE	2					
CELADOR						
TOPÓGRAFO						
CADENERO						
OTRO						

ASPECTOS TECNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CANT. EJECUTADA	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS (SI/NO)	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)
Dañete muro exterior y calatas Mortero	M2	aplicación de una capa delgada de mortero	30,01	SI	SI

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES
	NOTA: LAS OBSERVACIONES DEBEN SER DILIGENCIADAS POR EL RESIDENTE DE INTERVENTORÍA. DONDE DEBE JUSTIFICAR LAS RAZONES POR LAS CUALES SE DESARROLLA LA ACTIVIDAD.

Scanned with ACE Scanner

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
Municipio Puerto Lopez - Meta	17	04	2024	6:00am	4:00pm

OBSERVACIONES GENERALES

NOTA: LAS OBSERVACIONES DEBEN SER DILIGENCIADAS POR EL RESIDENTE DE INTERVENTORIA, CON EL OBJETO DE DEJAR CONSTANCIA DE LA CONFORMIDAD DE LAS ACTIVIDADES.

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
Nombre:	RESIDENTE DE OBRA	N° Mat. Profesional:	
Nombre:	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional:	
Nombre:	DIRECTOR DE OBRA	N° Mat. Profesional:	
Nombre:	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional:	
Cuando se presentan visitas de profesionales especializados u otras entidades, se registran observaciones generales y se firma a continuación:			
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

Scanned with ACE Scanner

ALCALDIA PUERTO LOPEZ	BITACORA DE OBRA	Código: F - 249
		Versión: 001
		Fecha: Septiembre de 2020

PROYECTO:	

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
Municipio Puerto Lopez - Meta	18	04	2024	8:00 AM	4:00 PM

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

CONTRATO OBRA N°	100-103-13-09-00001-2024	PROYECTO N°	
CONTRATO INTERVENTORIA N°	100-103-13-09-00001-2024		
OBJETO PROYECTO	Construcción de bovedas y osarios en el cementerio del municipio de Puerto Lopez - Meta		
TIEMPO DE EJECUCION			

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES:
NUBLADO				
TORMENTA				
LLUVIOSO				
SOLEADO	X	X	X	
Tiempo de standby por lluvias				

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
MAESTRO	1					
OFICIAL	2					
OPERARIO						
AYUDANTE	2					
CELADOR						
TOPÓGRAFO						
CADENERO						
OTRO						

ASPECTOS TÉCNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CANT. EJECUTADA	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS (SI/NO)	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)
Pañete muros interiores mortero 1:4 Sobre malla	M2	1 Parte de cemento por 4 partes de arena sobre una malla con textura.	90,57	SI	SI

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES
	NOTA: LAS OBSERVACIONES DEBEN SER DILIGENCIADAS POR EL RESIDENTE DE INTERVENTORÍA, DONDE DEBE JUSTIFICAR LAS RAZONES POR LAS CUALES SE DESARROLLA LA ACTIVIDAD.

Scanned with ACE Scanner

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
Municipio Puerto Lopez - Meta	18	04	2024	6:00 am	4:00 pm

OBSERVACIONES GENERALES

NOTA: LAS OBSERVACIONES DEBEN SER DILIGENCIADAS POR EL RESIDENTE DE INTERVENTORÍA, CON EL OBJETO DE DEJAR CONSTANCIA DE LA CONFORMIDAD DE LAS ACTIVIDADES

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
Nombre:	RESIDENTE DE OBRA	N° Mat. Profesional:	
Nombre:	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional:	
Nombre:	DIRECTOR DE OBRA	N° Mat. Profesional:	
Nombre:	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional:	
Cuando se presentan visitas de profesionales especializados u otras entidades, se registran observaciones generales y se firma a continuación:			
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

Scanned with ACE Scanner

ALCALDIA PUERTO LOPEZ	BITACORA DE OBRA	Código: F - 249
		Versión: 001
		Fecha: Septiembre de 2020

PROYECTO:

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
Municipio Puerto Lopez - Meta	19	09	2021	6:00 am	4:00 pm

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

CONTRATO OBRA N°	100-103-13-09-00001-2021	PROYECTO N°	
CONTRATO INTERVENTORIA N°	100-103-13-09-00001-2021		
OBJETO PROYECTO	Construccion de bovedas y osarios en el cementerio del municipio de Puerto lopez - Meta		
TIEMPO DE EJECUCION			

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE
NUBLADO			
TORMENTA			
LLUVIOSO	X	X	X
SOLEADO			
Tiempo de standby por lluvias			

OBSERVACIONES: Toco aplazar el trabajo.

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
MAESTRO	1					
OFICIAL	2					
OPERARIO						
AYUDANTE	2					
CELADOR						
TOPÓGRAFO						
CADENERO						
OTRO						

ASPECTOS TÉCNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CANT. EJECUTADA	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS (SI/NO)	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)
Pintura Vinilo T. Coraza Exterior 3 manos	M2	se utilizaron 5 galones, y pintada Placa superior	56,21	SI	SI

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES
	NOTA: LAS OBSERVACIONES DEBEN SER DILIGENCIADAS POR EL RESIDENTE DE INTERVENTORÍA, DONDE DEBE JUSTIFICAR LAS RAZONES POR LAS CUALES SE DESARROLLA LA ACTIVIDAD.

Scanned with ACE Scanner

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
Municipio Puerto Lopez	19	04	2024	6:00 am	4:00 pm

OBSERVACIONES GENERALES

NOTA: LAS OBSERVACIONES DEBEN SER DILIGENCIADAS POR EL RESIDENTE DE INTERVENTORÍA. CON EL OBJETO DE DEJAR CONSTANCIA DE LA CONFORMIDAD DE LAS ACTIVIDADES.

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
Nombre:	RESIDENTE DE OBRA	N° Mat. Profesional:	
Nombre:	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional:	
Nombre:	DIRECTOR DE OBRA	N° Mat. Profesional:	
Nombre:	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional:	
Cuando se presentan visitas de profesionales especializados u otras entidades, se registran observaciones generales y se firma a continuación:			
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

Scanned with ACE Scanner

ALCALDÍA PUERTO LÓPEZ	BITACORA DE OBRA	Código: F - 249
		Versión: 001
		Fecha: Septiembre de 2020

PROYECTO:	

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
Municipio Puerto lopez - Meta	22	04	2024	6:00 am	4:00 pm

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

CONTRATO OBRA N°	100-103-13-09-00001-2024	PROYECTO N°	
CONTRATO INTERVENTORIA N°	100-103-13-09-00001-2024		
OBJETO PROYECTO	Construccion de bovedas y osarios en el cementerio del municipio de Puerto lopez - Meta		
TIEMPO DE EJECUCION			

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES:
NUBLADO				
TORMENTA				
LLUVIOSO				
SOLEADO	X	X	X	
Tiempo de standby por lluvias				

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
MAESTRO	1					
OFICIAL	2					
OPERARIO						
AYUDANTE	2					
CELADOR						
TOPÓGRAFO						
CADENERO						
OTRO						

ASPECTOS TECNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CANT. EJECUTADA	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS (SI/NO)	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)
Pintura vinilo T. Coraza exterior 3 manos	M2	Retoma de trabajo	56,21	SI	SI

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES
	NOTA: LAS OBSERVACIONES DEBEN SER DILIGENCIADAS POR EL RESIDENTE DE INTERVENTORIA DONDE DEBE JUSTIFICAR LAS RAZONES POR LAS CUALES SE DESARROLLA LA ACTIVIDAD

Scanned with ACE Scanner

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
Municipio Puerto lopez - Meta	22	04	2024	6:00 am	4:00 pm

OBSERVACIONES GENERALES

NOTA: LAS OBSERVACIONES DEBEN SER DILIGENCIADAS POR EL RESIDENTE DE INTERVENTORÍA, CON EL OBJETO DE DEJAR CONSTANCIA DE LA CONFORMIDAD DE LAS ACTIVIDADES.

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
Nombre:	RESIDENTE DE OBRA	N° Mat. Profesional:	
Nombre:	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional:	
Nombre:	DIRECTOR DE OBRA	N° Mat. Profesional:	
Nombre:	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional:	
Cuando se presentan visitas de profesionales especializados u otras entidades, se registran observaciones generales y se firma a continuación:			
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

Scanned with ACE Scanner

ALCALDIA PUERTO LOPEZ	BITACORA DE OBRA	Código: F - 249 Versión: 001 Fecha: Septiembre de 2020

PROYECTO:	

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
Municipio Puerto lopez - Meta	23	04	2024	6:00 am	4:00 pm

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

CONTRATO OBRA N°	100-103-13-09-00001-2024	PROYECTO N°	
CONTRATO INTERVENTORIA N°	100-103-13-09-00001-2024		
OBJETO PROYECTO	Construccion de bovedas y osarios en el cementerio del municipio de Puerto lopez - Meta		
TIEMPO DE EJECUCION			

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES:
NUBLADO	X			
TORMENTA				
LLUVIOSO				
SOLEADO		X	X	
Tiempo de standby por lluvias				

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
MAESTRO						
OFICIAL	1					
OPERARIO						
AYUDANTE	2					
CELADOR						
TOPÓGRAFO						
CADENERO						
OTRO						

ASPECTOS TÉCNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CANT. EJECUTADA	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS (SI/NO)	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)
Pintura vinilo T. coraza exterior 3 manos	M2	ultimo retoque	56,21	SI	SI

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES
	NOTA: LAS OBSERVACIONES DEBEN SER DILIGENCIADAS POR EL RESIDENTE DE INTERVENTORIA, DONDE DEBE JUSTIFICAR LAS RAZONES POR LAS CUALES SE DESARROLLA LA ACTIVIDAD.

Scanned with ACE Scanner

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DÍA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
Municipio Puerto lopez-Meta	23	04	2024	6:00 am	4:00 pm

OBSERVACIONES GENERALES

NOTA: LAS OBSERVACIONES DEBEN SER DILIGENCIADAS POR EL RESIDENTE DE INTERVENTORÍA, CON EL OBJETO DE DEJAR CONSTANCIA DE LA CONFORMIDAD DE LAS ACTIVIDADES.

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
Nombre:	RESIDENTE DE OBRA	N° Mat. Profesional:	
Nombre:	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional:	
Nombre:	DIRECTOR DE OBRA	N° Mat. Profesional:	
Nombre:	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional:	
Cuando se presentan visitas de profesionales especializados u otras entidades, se registran observaciones generales y se firma a continuación:			
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

Scanned with ACE Scanner

ALCALDIA PUERTO LOPEZ	BITACORA DE OBRA	Código: F - 249 Versión: 001 Fecha: Septiembre de 2020

PROYECTO:	

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
Municipio Puerto lopez - Meta	8	04	2024	6:00 am	1:00 pm

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

CONTRATO OBRA N°	100-103-13-09-00001-2024	PROYECTO N°	
CONTRATO INTERVENTORIA N°	100-103-13-09-00001-2024		
OBJETO PROYECTO	Construcción de bovedas y osarios en el cementerio del municipio de Puerto lopez - Meta		
TIEMPO DE EJECUCION			

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES:
NUBLADO				
TORMENTA				
LLUVIOSO				
SOLEADO	x	x	x	
Tiempo de standby por lluvias				

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
MAESTRO	1					
OFICIAL	2					
OPERARIO						
AYUDANTE	2					
CELADOR						
TOPÓGRAFO						
CADENERO						
OTRO						

ASPECTOS TECNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CANT. EJECUTADA	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS (SI/NO)	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)
Desmonte de estructura metalica de cobertа.	M2	Retiro de superficie de techo.	22,00	SI	SI

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES
	NOTA: LAS OBSERVACIONES DEBEN SER DILIGENCIADAS POR EL RESIDENTE DE INTERVENTORIA, DONDE DEBE JUSTIFICAR LAS RAZONES POR LAS CUALES SE DESARROLLA LA ACTIVIDAD

Scanned with ACE Scanner

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
Municipio Puerto lopez - Meta	8	04	2024	6:00 am	4:00 pm

OBSERVACIONES GENERALES

NOTA: LAS OBSERVACIONES DEBEN SER DILIGENCIADAS POR EL RESIDENTE DE INTERVENTORÍA, CON EL OBJETO DE DEJAR CONSTANCIA DE LA CONFORMIDAD DE LAS ACTIVIDADES.

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
Nombre:	RESIDENTE DE OBRA	N° Mat. Profesional:	
Nombre:	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional:	
Nombre:	DIRECTOR DE OBRA	N° Mat. Profesional:	
Nombre:	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional:	
Cuando se presentan visitas de profesionales especializados u otras entidades, se registran observaciones generales y se firma a continuación:			
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

Scanned with ACE Scanner

ALCALDÍA PUERTO LÓPEZ	BITACORA DE OBRA	Código: F - 249
		Versión: 001
		Fecha: Septiembre de 2020

PROYECTO:	

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
Municipio Puerto lopez - Meta	10	09	2024	6:00 am	4:00 pm

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

CONTRATO OBRA N°	100-103-13-0...00001-2024	PROYECTO N°	
CONTRATO INTERVENTORIA N°	100-103-13-09-00001-2024		
OBJETO PROYECTO	Construccion de bovedas y osarios en el cementerio del Municipio de Puerto lopez-meta.		
TIEMPO DE EJECUCION			

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES:
NUBLADO				
TORMENTA				
LLUVIOSO				
SOLEADO	X	X	X	
Tiempo de standby por lluvias				

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
MAESTRO	1					
OFICIAL	2					
OPERARIO						
AYUDANTE	2					
CELADOR						
TOPÓGRAFO						
CADENERO						
OTRO						

ASPECTOS TECNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CANT. EJECUTADA	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS (SI/NO)	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)
Desmonte de teja plastica y/o de zinc.	M2	Retiro de teja dignotectonica color azul.	M2	SI	SI

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES
	NOTA: LAS OBSERVACIONES DEBEN SER DILIGENCIADAS POR EL RESIDENTE DE INTERVENTORIA, DONDE DEBE JUSTIFICAR LAS RAZONES POR LAS CUALES SE DESARROLLA LA ACTIVIDAD.

Scanned with ACE Scanner

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
Municipio Puerto Lopez - Meta	10	04	2024	6:00 am	4:00 pm

OBSERVACIONES GENERALES

NOTA: LAS OBSERVACIONES DEBEN SER DILIGENCIADAS POR EL RESIDENTE DE INTERVENTORÍA. CON EL OBJETO DE DEJAR CONSTANCIA DE LA CONFORMIDAD DE LAS ACTIVIDADES.

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
Nombre:	RESIDENTE DE OBRA	N° Mat. Profesional:	
Nombre:	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional:	
Nombre:	DIRECTOR DE OBRA	N° Mat. Profesional:	
Nombre:	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional:	
Cuando se presentan visitas de profesionales especializados u otras entidades, se registran observaciones generales y se firma a continuación:			
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

Scanned with ACE Scanner

ALCALDÍA PUERTO LOPEZ	BITACORA DE OBRA	Código: F - 249 Versión: 001 Fecha: Septiembre de 2020

PROYECTO:	

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	ANO	Inicio de labores	Terminación de labores
Municipio Puerto lopez – Meta	23	09	2024	6:00 am	4:00 pm

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

CONTRATO OBRA N°	100-103-13-09-00001-2024	PROYECTO N°	
CONTRATO INTERVENTORIA N°	100-103-13-09-00001-2024		
OBJETO PROYECTO	Construcción de bovedas y osarios en el cementerio del municipio de Puerto lopez- meta.		
TIEMPO DE EJECUCION			

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES:
NUBLADO	X		X	
TORMENTA				
LLUVIOSO				
SOLEADO		X		
Tiempo de standby por lluvias				

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
MAESTRO	1					
OFICIAL	2					
OPERARIO						
AYUDANTE	2					
CELADOR						
TOPÓGRAFO						
CADENERO						
OTRO						

ASPECTOS TÉCNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CANT. EJECUTADA	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS (SI/NO)	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)
Demolición concreto simple incluye trasiego	M3	Proceso de reconstrucción de estructuras.	0,12	SI	SI

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES
	NOTA: LAS OBSERVACIONES DEBEN SER DILIGENCIADAS POR EL RESIDENTE DE INTERVENTORÍA, DONDE DEBE JUSTIFICAR LAS RAZONES POR LAS CUALES SE DESARROLLA LA ACTIVIDAD.

Scanned with ACE Scanner

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
Municipio Puerto López - Meta	23	04	2023	6:00 am	4:00 pm

OBSERVACIONES GENERALES

NOTA: LAS OBSERVACIONES DEBEN SER DILIGENCIADAS POR EL RESIDENTE DE INTERVENTORÍA, CON EL OBJETO DE DEJAR CONSTANCIA DE LA CONFORMIDAD DE LAS ACTIVIDADES.

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
Nombre:	RESIDENTE DE OBRA	N° Mat. Profesional:	
Nombre:	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional:	
Nombre:	DIRECTOR DE OBRA	N° Mat. Profesional:	
Nombre:	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional:	
Cuando se presentan visitas de profesionales especializados u otras entidades, se registran observaciones generales y se firma a continuación:			
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

Scanned with ACE Scanner

ALCALDÍA PUERTO LÓPEZ	BITACORA DE OBRA	Código: F - 249 Versión: 001 Fecha: Septiembre de 2020

PROYECTO:

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
Municipio Puerto lopez - Meta	24	04	2024	8:00am	4:00pm

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

CONTRATO OBRA N°	100-103-13-09-00001-2024	PROYECTO N°	
CONTRATO INTERVENTORIA N°	100-103-13-09-00001-2024		
OBJETO PROYECTO	Construccion de bovedas y osarios en el cementerio del municipio Puerto lopez - Meta		
TIEMPO DE EJECUCION			

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES:
NUBLADO	X		X	
TORMENTA				
LLUVIOSO				
SOLEADO		X		
Tiempo de standby por lluvias				

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
MAESTRO						
OFICIAL	2					
OPERARIO						
AYUDANTE	2					
CELADOR						
TOPÓGRAFO						
CADENERO						
OTRO						

ASPECTOS TECNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CANT. EJECUTADA	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS (SI/NO)	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)
Muro en bloque flexa No. 9.010 x 0.20 x 0.30 M	M2	paredes divisorias de osarios.	15,38	Si	Si

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES
	NOTA: LAS OBSERVACIONES DEBEN SER DILIGENCIADAS POR EL RESIDENTE DE INTERVENTORÍA, DONDE DEBE JUSTIFICAR LAS RAZONES POR LAS CUALES SE DESARROLLA LA ACTIVIDAD.
se pidio bloque #4 pero no conside con el eje existente	se avanzo con bloque #5 para coincidir con el eje existente

Scanned with ACE Scanner

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
Municipio Puerto Lopez - Meta	24	04	2024	6:00 am	4:00 pm

OBSERVACIONES GENERALES

NOTA: LAS OBSERVACIONES DEBEN SER DILIGENCIADAS POR EL RESIDENTE DE INTERVENTORÍA, CON EL OBJETO DE DEJAR CONSTANCIA DE LA CONFORMIDAD DE LAS ACTIVIDADES.

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
Nombre:	RESIDENTE DE OBRA	N° Mat. Profesional:	
Nombre:	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional:	
Nombre:	DIRECTOR DE OBRA	N° Mat. Profesional:	
Nombre:	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional:	
Cuando se presentan visitas de profesionales especializados u otras entidades, se registran observaciones generales y se firma a continuación:			
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

Scanned with ACE Scanner

ALCALDIA PUERTO LOPEZ	BITACORA DE OBRA	Código: F - 249 Versión: 001 Fecha: Septiembre de 2020

PROYECTO:

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA DIA	FECHA MES	FECHA AÑO	HORA Inicio de labores	HORA Terminación de labores
Municipio Puerto lopez - Meta	25	04	2024	6:00 am	4:00 pm

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

CONTRATO OBRA N°	100-103-13-09-00001-2024	PROYECTO N°	
CONTRATO INTERVENTORIA N°	100-103-13-09-00001-2024		
OBJETO PROYECTO	Construccion de bovedas y osarios en el cementerio del Municipio de Puerto lopez - Meta		
TIEMPO DE EJECUCION			

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES:
NUBLADO				
TORMENTA				
LLUVIOSO				
SOLEADO				
Tiempo de standby por lluvias				

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
MAESTRO	1					
OFICIAL	2					
OPERARIO						
AYUDANTE	2					
CELADOR						
TOPÓGRAFO						
CADENERO						
OTRO						

ASPECTOS TECNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CANT. EJECUTADA	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS (SI/NO)	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)
Pañete muros interiores mortero 1:4	M2	Nivelación de muros interios y superficies	14,69	Si	Si

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES
	NOTA: LAS OBSERVACIONES DEBEN SER DILIGENCIADAS POR EL RESIDENTE DE INTERVENTORÍA. DONDE DEBE JUSTIFICAR LAS RAZONES POR LAS CUALES SE DESARROLLA LA ACTIVIDAD.

Scanned with ACE Scanner

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
Municipio Puerto lopez - Meta	25	04	2024	6:00 am	4:00 pm

OBSERVACIONES GENERALES

NOTA: LAS OBSERVACIONES DEBEN SER DILIGENCIADAS POR EL RESIDENTE DE INTERVENTORÍA, CON EL OBJETO DE DEJAR CONSTANCIA DE LA CONFORMIDAD DE LAS ACTIVIDADES

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
Nombre:	RESIDENTE DE OBRA	N° Mat. Profesional:	
Nombre:	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional:	
Nombre:	DIRECTOR DE OBRA	N° Mat. Profesional:	
Nombre:	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional:	
Cuando se presentan visitas de profesionales especializados u otras entidades, se registran observaciones generales y se firma a continuación:			
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

Scanned with ACE Scanner

ALCALDIA PUERTO LOPEZ	BITACORA DE OBRA	Código: F - 249 Versión: 001 Fecha: Septiembre de 2020

PROYECTO:						
CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA DIA	FECHA MES	FECHA AÑO	HORA Inicio de labores	HORA Terminación de labores
Municipio Puerto lopez - Meta	26	04	2024	6:00am	4:00 pm

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

CONTRATO OBRA N°	100-103-13-09-00001-2024	PROYECTO N°	
CONTRATO INTERVENTORIA N°	100-103-13-09-00001-2024		
OBJETO PROYECTO	Construcción de bovedas y osarios en el cementerio del municipio de Puerto lopez - Meta		
TIEMPO DE EJECUCION			

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES:
NUBLADO				
TORMENTA				
LLUVIOSO			x	
SOLEADO	x	x		
Tiempo de standby por lluvias				

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
MAESTRO	1					
OFICIAL	2					
OPERARIO						
AYUDANTE	2					
CELADOR						
TOPÓGRAFO						
CADENERO						
OTRO						

ASPECTOS TÉCNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CANT. EJECUTADA	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS (SI/NO)	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)
Pañete muro exterior y Culatas Mortero 1:4	M2	Nivelar y alisar la superficie cubriendo imperfecciones	6:00	Si	Si

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES
	NOTA: LAS OBSERVACIONES DEBEN SER DILIGENCIADAS POR EL RESIDENTE DE INTERVENTORÍA, DONDE DEBE JUSTIFICAR LAS RAZONES POR LAS CUALES SE DESARROLLA LA ACTIVIDAD.

Scanned with ACE Scanner

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
Municipio Puerto Lopez - Meta	25	09	2024	8:00 am	4:00 pm

OBSERVACIONES GENERALES

NOTA. LAS OBSERVACIONES DEBEN SER DILIGENCIADAS POR EL RESIDENTE DE INTERVENTORÍA, CON EL OBJETO DE DEJAR CONSTANCIA DE LA CONFORMIDAD DE LAS ACTIVIDADES.

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
Nombre:	RESIDENTE DE OBRA	N° Mat. Profesional:	
Nombre:	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional:	
Nombre:	DIRECTOR DE OBRA	N° Mat. Profesional:	
Nombre:	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional:	
Cuando se presentan visitas de profesionales especializados u otras entidades, se registran observaciones generales y se firma a continuación:			
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

Scanned with ACE Scanner

ALCALDIA PUERTO LOPEZ	BITACORA DE OBRA	Código: F - 249 Versión: 001 Fecha: Septiembre de 2020

PROYECTO:	

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
Municipio Puerto lopez - Meta	29	04	2024	5:00 am	4:00 pm

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

CONTRATO OBRA N°	100-103-13-09-00001-2024	PROYECTO N°	
CONTRATO INTERVENTORIA N°	100-103-13-09-00001-2024		
OBJETO PROYECTO	Construccion de bovedas y osarios en el cementerio del municipio de Puerto lopez - Meta		
TIEMPO DE EJECUCION			

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES:
NUBLADO	✓	✓	✓	
TORMENTA				
LLUVIOSO				
SOLEADO				
Tiempo de standby por lluvias				

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
MAESTRO	1					
OFICIAL	2					
OPERARIO						
AYUDANTE	2					
CELADOR						
TOPÓGRAFO						
CADENERO						
OTRO						

ASPECTOS TECNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CANT. EJECUTADA	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS (SI/NO)	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)
Placa de entrepiso maciza en concreto 20.7 MPa	M3	diseñado para separar niveles	0,64	SI	SI

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES
	NOTA: LAS OBSERVACIONES DEBEN SER DILIGENCIADAS POR EL RESIDENTE DE INTERVENTORÍA. DONDE DEBE JUSTIFICAR LAS RAZONES POR LAS CUALES SE DESARROLLA LA ACTIVIDAD

Scanned with ACE Scanner

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
Municipio Puerto Lopez - Meta	29	04	2024	6:00 am	4:00 pm

OBSERVACIONES GENERALES

NOTA: LAS OBSERVACIONES DEBEN SER DILIGENCIADAS POR EL RESIDENTE DE INTERVENTORÍA, CON EL OBJETO DE DEJAR CONSTANCIA DE LA CONFORMIDAD DE LAS ACTIVIDADES.

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
Nombre:	RESIDENTE DE OBRA	N° Mat. Profesional:	
Nombre:	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional:	
Nombre:	DIRECTOR DE OBRA	N° Mat. Profesional:	
Nombre:	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional:	
Cuando se presentan visitas de profesionales especializados u otras entidades, se registran observaciones generales y se firma a continuación:			
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

Scanned with ACE Scanner

ALCALDIA PUERTO LOPEZ	BITACORA DE OBRA	Código: F - 249
		Versión: 001
		Fecha: Septiembre de 2020

PROYECTO:	

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
Municipio Puerto lopez - Meta	30	09	2024	5:00 am	4:00 pm

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

CONTRATO OBRA N°	100-103-13-09-00001-2024	PROYECTO N°	
CONTRATO INTERVENTORIA N°	100-103-13-09-00001-2024		
OBJETO PROYECTO	Construccion de bovedas y osarios en el cementerio del municipio de puerto lopez - meta		
TIEMPO DE EJECUCION			

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES:
NUBLADO		X	X	
TORMENTA				
LLUVIOSO				
SOLEADO	X			
Tiempo de standby por lluvias				

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
MAESTRO	1					
OFICIAL	2					
OPERARIO						
AYUDANTE	2					
CELADOR						
TOPÓGRAFO						
CADENERO						
OTRO						

ASPECTOS TECNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CANT. EJECUTADA	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS (SI/NO)	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)
Malla electrosoldada FY= 5000 KG/cm2, 500 MPa	KG	Figurado, armado, Colocacion y amarre.	16,62	SI	SI

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES
	NOTA: LAS OBSERVACIONES DEBEN SER DILIGENCIADAS POR EL RESIDENTE DE INTERVENTORÍA. DONDE DEBE JUSTIFICAR LAS RAZONES POR LAS CUALES SE DESARROLLA LA ACTIVIDAD

Scanned with ACE Scanner

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
Municipio Puerto Lopez - Meta	30	09	2024	8:00 am	4:00 pm

OBSERVACIONES GENERALES

NOTA: LAS OBSERVACIONES DEBEN SER DILIGENCIADAS POR EL RESIDENTE DE INTERVENTORÍA, CON EL OBJETO DE DEJAR CONSTANCIA DE LA CONFORMIDAD DE LAS ACTIVIDADES.

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
Nombre:	RESIDENTE DE OBRA	N° Mat. Profesional:	
Nombre:	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional:	
Nombre:	DIRECTOR DE OBRA	N° Mat. Profesional:	
Nombre:	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional:	
Cuando se presentan visitas de profesionales especializados u otras entidades, se registran observaciones generales y se firma a continuación:			
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

Scanned with ACE Scanner

ALCALDÍA PUERTO LOPEZ	BITACORA DE OBRA	Código: F - 249 Versión: 001 Fecha: Septiembre de 2020

PROYECTO:	

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
Municipio Puerto lopez-Meta	1	05	2024	6:00 am	4:00 pm

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

CONTRATO OBRA N°	100-103-13-09-00001-2024	PROYECTO N°	
CONTRATO INTERVENTORIA N°	100-103-13-09-00001-2024		
OBJETO PROYECTO	Construccion de bovedas y osarios en el cementerio del municipio de Puerto lopez-Meta		
TIEMPO DE EJECUCION			

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES:
NUBLADO	X			
TORMENTA				
LLUVIOSO				
SOLEADO		X	X	
Tiempo de standby por lluvias				

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
MAESTRO	1					
OFICIAL	2					
OPERARIO						
AYUDANTE	2					
CELADOR						
TOPÓGRAFO						
CADENERO						
OTRO						

ASPECTOS TECNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CANT. EJECUTADA	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS (SI/NO)	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)
Pedestales en Concreto 20.7 MPa (3000 PSI)	M3	Fundidos en Concreto de 40 cm de alto x 20 cm	0,02	SI	SI

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES
	NOTA. LAS OBSERVACIONES DEBEN SER DILIGENCIADAS POR EL RESIDENTE DE INTERVENTORÍA. DONDE DEBE JUSTIFICAR LAS RAZONES POR LAS CUALES SE DESARROLLA LA ACTIVIDAD

Scanned with ACE Scanner

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
Municipio Puerto lopez - Meta	1	05	2024	6:00 am	4:00 pm

OBSERVACIONES GENERALES

NOTA: LAS OBSERVACIONES DEBEN SER DILIGENCIADAS POR EL RESIDENTE DE INTERVENTORÍA, CON EL OBJETO DE DEJAR CONSTANCIA DE LA CONFORMIDAD DE LAS ACTIVIDADES.

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
Nombre:	RESIDENTE DE OBRA	N° Mat. Profesional:	
Nombre:	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional:	
Nombre:	DIRECTOR DE OBRA	N° Mat. Profesional:	
Nombre:	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional:	
Cuando se presentan visitas de profesionales especializados u otras entidades, se registran observaciones generales y se firma a continuación:			
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

Scanned with ACE Scanner

ALCALDIA PUERTO LOPEZ	BITACORA DE OBRA	Código: F - 249 Versión: 001 Fecha: Septiembre de 2020

PROYECTO:	

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
Municipio Puerto lopez - Meta	2	05	2024	8:00 am	4:00 pm

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

CONTRATO OBRA N°	100-103-13-09-00001-2024	PROYECTO N°	
CONTRATO INTERVENTORIA N°	100-103-13-09-00001-2024		
OBJETO PROYECTO	Construccion de bovedas y osarios en el cementerio del municipio de Puerto lopez - meta.		
TIEMPO DE EJECUCION			

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES:
NUBLADO				
TORMENTA				
LLUVIOSO				
SOLEADO				
Tiempo de standby por lluvias				

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
MAESTRO	1					
OFICIAL	2					
OPERARIO						
AYUDANTE	2					
CELADOR						
TOPÓGRAFO						
CADENERO						
OTRO						

ASPECTOS TÉCNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CANT. EJECUTADA	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS (SI/NO)	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)
Correa perfil rectan PHR negro 80x40x20 MM cal 14	ML	Perfiles apoyo estructura	32,30	SI	SI

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES
	NOTA: LAS OBSERVACIONES DEBEN SER DILIGENCIADAS POR EL RESIDENTE DE INTERVENTORIA. DONDE DEBE JUSTIFICAR LAS RAZONES POR LAS CUALES SE DESARROLLA LA ACTIVIDAD.

Scanned with ACE Scanner

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
Municipio Puerto Lopez-Meta	2	05	2024	6:00 am	4:00 pm

OBSERVACIONES GENERALES

NOTA: LAS OBSERVACIONES DEBEN SER DILIGENCIADAS POR EL RESIDENTE DE INTERVENTORÍA, CON EL OBJETO DE DEJAR CONSTANCIA DE LA CONFORMIDAD DE LAS ACTIVIDADES

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
Nombre:	RESIDENTE DE OBRA	N° Mat. Profesional:	
Nombre:	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional:	
Nombre:	DIRECTOR DE OBRA	N° Mat. Profesional:	
Nombre:	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional:	
Cuando se presentan visitas de profesionales especializados u otras entidades, se registran observaciones generales y se firma a continuación:			
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.			

Scanned with ACE Scanner

ALCALDIA PUERTO LOPEZ	BITACORA DE OBRA	Código: F - 249 Versión: 001 Fecha: Septiembre de 2020

PROYECTO:

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
Municipio Puerto Lopez - Meta	3	05	2024	6:00 am	4:00 pm

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

CONTRATO OBRA N°	100-103-13-09-00001-2024	PROYECTO N°	
CONTRATO INTERVENTORIA N°	100-103-13-09-00001-2024		
OBJETO PROYECTO	Construccion de bovedas y osarios en el cementerio del municipio de Puerto Lopez - Meta		
TIEMPO DE EJECUCION			

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE
NUBLADO			
TORMENTA			
LLUVIOSO	X	X	X
SOLEADO			
Tiempo de standby por lluvias			

OBSERVACIONES: No se pudo realizar el trabajo debido al Clima

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
MAESTRO	1					
OFICIAL	2					
OPERARIO						
AYUDANTE	2					
CELADOR						
TOPÓGRAFO						
CADENERO						
OTRO						

ASPECTOS TÉCNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CANT. EJECUTADA	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS (SI/NO)	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)
Pintura Vinilo T. Coraza Exterior 3 manos	M2	se utilizaron 3 galones. y pintada placa superior	15,67	SI	SI

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES
	NOTA: LAS OBSERVACIONES DEBEN SER DILIGENCIADAS POR EL RESIDENTE DE INTERVENTORÍA, DONDE DEBE JUSTIFICAR LAS RAZONES POR LAS CUALES SE DESARROLLA LA ACTIVIDAD

Scanned with ACE Scanner

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
Municipio Puerto Lopez-Meta	3	05	2024	6:00 am	4:00 pm

OBSERVACIONES GENERALES

NOTA: LAS OBSERVACIONES DEBEN SER DILIGENCIADAS POR EL RESIDENTE DE INTERVENTORIA, CON EL OBJETO DE DEJAR CONSTANCIA DE LA CONFORMIDAD DE LAS ACTIVIDADES.

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
Nombre:	RESIDENTE DE OBRA	N° Mat. Profesional:	
Nombre:	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional:	
Nombre:	DIRECTOR DE OBRA	N° Mat. Profesional:	
Nombre:	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional:	
Cuando se presentan visitas de profesionales especializados u otras entidades, se registran observaciones generales y se firma a continuación:			
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

Scanned with ACE Scanner

ALCALDIA PUERTO LOPEZ	BITACORA DE OBRA	Código: F - 249
		Versión: 001
		Fecha: Septiembre de 2020

PROYECTO:	

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
Municipio Puerto lopez - Meta	6	08	2024	6:00 am	4:00 pm

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

CONTRATO OBRA N°	100-103-13-09-00001-2024	PROYECTO N°	
CONTRATO INTERVENTORIA N°	100-103-13-09-00001-2024		
OBJETO PROYECTO	Construcción de bovedas y osarios en el cementerio del municipio de Puerto lopez-Meta		
TIEMPO DE EJECUCION			

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES:
NUBLADO	X		X	
TORMENTA				
LLUVIOSO				
SOLEADO		X		
Tiempo de standby por lluvias				

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
MAESTRO	1					
OFICIAL	2					
OPERARIO						
AYUDANTE	2					
CELADOR						
TOPÓGRAFO						
CADENERO						
OTRO						

ASPECTOS TÉCNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CANT. EJECUTADA	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS (SI/NO)	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)
Pintura Vinilo T. Coraza Exterior 3 manos	M2	Retoma de trabajo	15,67	SI	SI

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES
	NOTA: LAS OBSERVACIONES DEBEN SER DILIGENCIADAS POR EL RESIDENTE DE INTERVENTORÍA, DONDE DEBE JUSTIFICAR LAS RAZONES POR LAS CUALES SE DESARROLLA LA ACTIVIDAD

Scanned with ACE Scanner

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
Municipio Puerto lopez - Meta	6	05	2025	6:00 am	4:00 pm

OBSERVACIONES GENERALES

NOTA: LAS OBSERVACIONES DEBEN SER DILIGENCIADAS POR EL RESIDENTE DE INTERVENTORIA. CON EL OBJETO DE DEJAR CONSTANCIA DE LA CONFORMIDAD DE LAS ACTIVIDADES.

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
Nombre:	RESIDENTE DE OBRA	N° Mat. Profesional:	
Nombre:	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional:	
Nombre:	DIRECTOR DE OBRA	N° Mat. Profesional:	
Nombre:	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional:	
Cuando se presentan visitas de profesionales especializados u otras entidades, se registran observaciones generales y se firma a continuación:			
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

Scanned with ACE Scanner

ALCALDÍA PUERTO LÓPEZ	BITACORA DE OBRA	Código: F - 249 Versión: 001 Fecha: Septiembre de 2020

PROYECTO:	

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
Municipio Puerto lopez - Meta	7	05	2024	8:00 am	4:00 pm

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

CONTRATO OBRA N°	100-103-13-09-00001-2024	PROYECTO N°	
CONTRATO INTERVENTORIA N°	100-103-13-09-00001-2024		
OBJETO PROYECTO	Construcción de bovedas y osarios en el cementerio del municipio de Puerto lopez - Meta		
TIEMPO DE EJECUCION			

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES:
NUBLADO				
TORMENTA				
LLUVIOSO				
SOLEADO	X	X	X	
Tiempo de standby por lluvias				

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
MAESTRO	1					
OFICIAL	2					
OPERARIO						
AYUDANTE	2					
CELADOR						
TOPÓGRAFO						
CADENERO						
OTRO						

ASPECTOS TÉCNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CANT. EJECUTADA	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS (SI/NO)	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)
Pintura vinilo T. Coraza Exterior 3 manos	M2	ultimo retoque	15,67	SI	SI

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES
	NOTA: LAS OBSERVACIONES DEBEN SER DILIGENCIADAS POR EL RESIDENTE DE INTERVENTORÍA, DONDE DEBE JUSTIFICAR LAS RAZONES POR LAS CUALES SE DESARROLLA LA ACTIVIDAD.

Scanned with ACE Scanner

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
Municipio Puerto lopez - Meta	7	05	2025	6:00 am	4:00 pm

OBSERVACIONES GENERALES

NOTA: LAS OBSERVACIONES DEBEN SER DILIGENCIADAS POR EL RESIDENTE DE INTERVENTORÍA, CON EL OBJETO DE DEJAR CONSTANCIA DE LA CONFORMIDAD DE LAS ACTIVIDADES

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
Nombre:	RESIDENTE DE OBRA	N° Mat. Profesional:	
Nombre:	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional:	
Nombre:	DIRECTOR DE OBRA	N° Mat. Profesional:	
Nombre:	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional:	
Cuando se presentan visitas de profesionales especializados u otras entidades, se registran observaciones generales y se firma a continuación:			
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

Scanned with ACE Scanner

ALCALDÍA PUERTO LÓPEZ	BITACORA DE OBRA	Código: F - 249 Versión: 001 Fecha: Septiembre de 2020

PROYECTO:	

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
Municipio Puerto lopez - Meta	8	05	2024	6:00 am	4:00 pm

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

CONTRATO OBRA N°	100-103-13-09-00001-2024	PROYECTO N°	
CONTRATO INTERVENTORIA N°	100-103-13-09-00001-2024		
OBJETO PROYECTO	Construcción de bovedas y osarios en el cementerio del Municipio de Puerto lopez - Meta		
TIEMPO DE EJECUCION			

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES:
NUBLADO				
TORMENTA				
LLUVIOSO				
SOLEADO	X	X	X	
Tiempo de standby por lluvias				

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
MAESTRO	1					
OFICIAL	2					
OPERARIO						
AYUDANTE	2					
CELADOR						
TOPÓGRAFO						
CADENERO						
OTRO						

ASPECTOS TÉCNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CANT. EJECUTADA	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS (SI/NO)	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)
Suministro e instalación cubierta arquitectonica metalica	M2	instalación cubierta.	22,00	SI	SI

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES
	NOTA: LAS OBSERVACIONES DEBEN SER DILIGENCIADAS POR EL RESIDENTE DE INTERVENTORÍA. DONDE DEBE JUSTIFICAR LAS RAZONES POR LAS CUALES SE DESARROLLA LA ACTIVIDAD.

Scanned with ACE Scanner

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
Municipio Puerto Lopez - Meta	8	05	2024	6:00 am	4:00 pm

OBSERVACIONES GENERALES

NOTA: LAS OBSERVACIONES DEBEN SER DILIGENCIADAS POR EL RESIDENTE DE INTERVENTORÍA, CON EL OBJETO DE DEJAR CONSTANCIA DE LA CONFORMIDAD DE LAS ACTIVIDADES.

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
Nombre:	RESIDENTE DE OBRA	N° Mat. Profesional:	
Nombre:	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional:	
Nombre:	DIRECTOR DE OBRA	N° Mat. Profesional:	
Nombre:	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional:	
Cuando se presentan visitas de profesionales especializados u otras entidades, se registran observaciones generales y se firma a continuación:			
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

Scanned with ACE Scanner

ALCALDIA PUERTO LOPEZ	BITACORA DE OBRA	Código: F - 249
		Versión: 001
		Fecha: Septiembre de 2020

PROYECTO:	

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
Municipio Puerto lopez-Meta	9	05	2025	6:00 am	4:00 pm

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

CONTRATO OBRA N°	100-103-13-09-00001-2025	PROYECTO N°	
CONTRATO INTERVENTORIA N°	100-103-13-09-00001-2024		
OBJETO PROYECTO	Construcción de bovedas y asaltos en el cementerio del municipio de Puerto lopez -Meta		
TIEMPO DE EJECUCION			

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES:
NUBLADO	X	X		
TORMENTA				
LLUVIOSO			X	
SOLEADO				
Tiempo de standby por lluvias				

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
MAESTRO	1					
OFICIAL	2					
OPERARIO						
AYUDANTE	2					
CELADOR						
TOPÓGRAFO						
CADENERO						
OTRO						

ASPECTOS TÉCNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CANT. EJECUTADA	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS (SI/NO)	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)
Viga aerea en concreto 20.7 MPa (3000 PSI)	M3	Armare de hierro y encofrado	908	SI	SI

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES
	NOTA: LAS OBSERVACIONES DEBEN SER DILIGENCIADAS POR EL RESIDENTE DE INTERVENTORÍA, DONDE DEBE JUSTIFICAR LAS RAZONES POR LAS CUALES SE DESARROLLA LA ACTIVIDAD.

Scanned with ACE Scanner

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
Municipio Puerto lopez - Meta	9	09	2024	6:00 am	4:00 Pm

OBSERVACIONES GENERALES

NOTA: LAS OBSERVACIONES DEBEN SER DILIGENCIADAS POR EL RESIDENTE DE INTERVENTORÍA, CON EL OBJETO DE DEJAR CONSTANCIA DE LA CONFORMIDAD DE LAS ACTIVIDADES.

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
Nombre:	RESIDENTE DE OBRA	N° Mat. Profesional:	
Nombre:	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional:	
Nombre:	DIRECTOR DE OBRA	N° Mat. Profesional:	
Nombre:	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional:	
Cuando se presentan visitas de profesionales especializados u otras entidades, se registran observaciones generales y se firma a continuación:			
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

Scanned with ACE Scanner

CONTRATO DE CESIÓN DE DERECHOS ECONÓMICOS

Los suscritos **ERIKA LORENA LESMES AGUIRRE**, mayor de edad, vecina de la ciudad de Villavicencio, identificado con la cédula de ciudadanía número 1.121.865.059 de Villavicencio, obrando en nombre y representación de la **UNION TEMPORAL CEMENTERIOS 2024**, identificada legalmente con Nit: 901.811.916 - 1 de una parte denominada **EL CEDENTE**; y de la otra **URIEL ALFONSO RODRIGUEZ**, también mayor, vecino de la ciudad de Puerto López Meta, identificado con la cédula de ciudadanía número 79.462.970 de Bogotá, **ACTUANDO EN NOMBRE PROPIO**, en adelante denominada **EL CESIONARIO**, hemos celebrado el presente contrato previas las siguientes consideraciones:

CONSIDERACIONES

PRIMERA. El pasado 18 de Marzo de 2024 EL CEDENTE, **UNION TEMPORAL CEMENTERIOS 2024** suscribió con la entidad **ALCALDIA MUNICIPAL DE PUERTO LOPEZ META**, (en adelante denominada La Entidad) el contrato de Obra No. 100-103-13-09-00001-2024, cuyo objeto es: CONSTRUCCION BOVEDAS Y OSARIOS EN EL CEMENTERIO DEL MUNICIPIO DE PUERTO LOPEZ – META.

SEGUNDA. El Valor total de la orden de compra cedida es la cantidad de **TREINTA Y SEIS MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS TREINTA PESOS ($ 36.389.830,00)**, y se pagará, de conformidad con los términos del contrato de Obra No. 100-103-13-09-00001-2024 citada en la consideración Primera anterior.

TERCERA. Por ser de interés para las dos partes del presente acuerdo de cesión, EL CONTRATISTA/ CEDENTE desea ceder el valor equivalente al cien por ciento (100%) del valor de los derechos económicos mas no las obligaciones a **URIEL ALFONSO RODRIGUEZ**. y ésta última está interesada en aceptar la cesión.

CUARTA. Los representantes de ambas partes manifiestan tener capacidad suficiente para obligar a las sociedades representadas en este acuerdo. De conformidad con lo anterior, las partes de mutuo acuerdo pactan una cesión de derechos económicos, conforme a las siguientes:

CLÁUSULAS:

CLÁUSULA PRIMERA. CESIÓN DE DERECHOS ECONÓMICOS: la **UNION TEMPORAL CEMENTERIOS 2024**, cede y transfiere en forma irrevocable y definitiva a **URIEL ALFONSO RODRIGUEZ,** por medio del presente documento el 100% de sus derechos económicos, mas no las obligaciones, contenidos en el Contrato Cedido.

PARÁGRAFO PRIMERO: Los derechos económicos cedidos se derivan del contrato de interventoría No. 100-103-13-09-00001-2024, cuyo objeto es: **CONSTRUCCION BOVEDAS Y OSARIOS EN EL CEMENTERIO DEL MUNICIPIO DE PUERTO LOPEZ – META** y que el CEDENTE se compromete a ejecutar en tiempo y forma de conformidad con el Contrato Cedido.

PARÁGRAFO SEGUNDO: Las facturas que EL CONTRATISTA CEDENTE emita y radique ante La entidad **ALCALDIA MUNICIPAL DE PUERTO LOPEZ META**, para su respectivo pago serán endosadas a favor de CESIONARIO si este lo requiriere.

CLÁUSULA SEGUNDA. CONDICIONES Y LEGITIMIDAD DE LOS DERECHOS CEDIDOS: El CEDENTE declara que es el único titular de los derechos patrimoniales que por este acto son cedidos y en consecuencia, puede disponer de ellos sin ningún tipo de limitación o gravamen. En todo caso, el CEDENTE acepta que responderá por cualquier reclamo que se pueda presentar, exonerando de cualquier responsabilidad al CESIONARIO.

CLÁUSULA TERCERA. INSTRUCCIÓN DE PAGO: EL CONTRATISTA CEDENTE se compromete a notificar a la **ALCALDIA MUNICIPAL DE PUERTO LOPEZ META**, a más tardar dentro de los tres días siguientes a la fecha del presente documento, sobre la cesión de los derechos con el fin de que autorice el pago directamente a **URIEL ALFONSO RODRIGUEZ**, con la instrucción para que los pagos se hagan a la siguiente cuenta: **Banco Bancolombia cuenta Ahorros No. 80217827039,** El monto total para consignar en esta cuenta es la cantidad de **TREINTA Y SEIS MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS TREINTA PESOS ($ 36.389.830,00)**, El aviso de que trata la presente cláusula deberá incluir copia del presente contrato de cesión con el fin de que **UNION TEMPORAL CEMENTERIOS 2024,** de cumplimiento a cada uno de los pagos tal como se prevé en el parágrafo primero siguiente.

PARÁGRAFO PRIMERO: Procedimiento para el pago al Cesionario: De cada factura que El cedente presente a La Entidad en desarrollo o ejecución de las obligaciones contenidas en el contrato de interventoría No. 100-103-13-09-00001-2024 ya citada, El cedente se compromete a dar aviso dentro de los tres días siguientes a la radicación de la factura, a El Cesionario enviando copia de la respectiva factura y dará aviso a La Entidad para que el 100% de su valor sea pagado directamente a la Cesionaria.

PARÁGRAFO SEGUNDO: Si por alguna razón, a pesar de la notificación que se le haga sobre la cesión, La Entidad llegare a realizar alguno de estos pagos al CEDENTE este último deberá en un término no mayor de cinco (5) días calendario, reembolsar dichas sumas de dinero a **URIEL ALFONSO RODRIGUEZ**, a la cuenta de Ahorros descrita en la presente cláusula.

CLÁUSULA CUARTA. ACEPTACIÓN: EL CESIONARIO acepta la cesión de los derechos económicos contenidos en el Contrato Cedido. Por consiguiente, con la suscripción de este documento EL CESIONARIO adquiere todos los derechos que de él se derivan.

CLÁUSULA QUINTA. INCUMPLIMIENTO: En caso de cualquier incumplimiento del pago de las obligaciones cedidas, EL CESIONARIO podrá iniciar cualquier acción judicial o administrativa para el cobro de las obligaciones, sin necesidad de consentimiento del CEDENTE.

CLÁUSULA SEXTA. MODIFICACIONES: EL CEDENTE no podrá hacer cambios o modificaciones al Contrato Cedido o a las obligaciones cedidas, sin previo consentimiento expreso y escrito del CESIONARIO.

CLÁUSULA SÉPTIMA. PERFECCIONAMIENTO: El presente contrato se perfecciona con la firma de las partes.

Para constancia, se suscribe en la ciudad de Villavicencio Meta, a los Veinte (20) días del mes de Junio de dos mil Veinticuatro (2024) en dos ejemplares del mismo tenor.

EL CEDENTE

ERIKA LORENA LESMES AGUIRRE
CC. 1.121.865.059 de Villavicencio
Representante Legal
UNION TEMPORAL CEMENTERIOS 2024
NIT: 901.811.916 - 1

EL CESIONARIO

Uriel Alfonso Rodriguez

URIEL ALFONSO RODRIGUEZ
CC. 79.462.970 de Bogotá.
Actuando en Nombre Propio.

RECONOCIMIENTO Y AUTENTICACIÓN DE FIRMA
Artículo 73 Decreto Ley 960 de 1970

COD 13443

En la ciudad de Puerto López, Departamento de Meta, República de Colombia, el veinte (20) de junio de dos mil veinticuatro (2024), en la Notaría única del Círculo de Puerto López, compareció: URIEL ALFONSO RODRIGUEZ , identificado con Cédula de Ciudadanía / NUIP 0079462970, quien manifestó que firma este documento en presencia del Notario, quien da fe de ello.

13443-1



Uriel Alfonso Rodriguez

b004b9f2de

-------- Firma autógrafa --------

20/06/2024 15:10:19

Conforme al Artículo 18 del Decreto - Ley 019 de 2012, el compareciente fue identificado mediante cotejo biométrico en línea de su huella dactilar con la información biográfica y biométrica de la base de datos de la Registraduría Nacional del Estado Civil.

Acorde a la autorización del usuario, se dio tratamiento legal relacionado con la protección de sus datos personales y las políticas de seguridad de la información establecidas por la Registraduría Nacional del Estado Civil.

Esta Acta se asocia al documento que contiene la siguiente información: CONTRATO DE CESION DE DERECHOS ECONOMICOS

PEDRO ALFONSO PABON PARRA
Notario Único del Círculo de Puerto López , Departamento de Meta
Consulte este documento en https://notariid.notariasegura.com.co
Número Único de Transacción: b004b9f2de, 20/06/2024 15:10:31

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
FEC1
Forma de pago: CONTADO
Fecha: 12/08/2024
Medio de pago: Consignación bancaria
Moneda / TRM: COP / $ 0,00

UNION TEMPORAL CEMENTERIO 2024
NIT: 901811916-1
Bogota, D.c. Colombia
Fecha generación: 12/08/2024 10:38:02
Fecha expedición: 12/08/2024 10:38:02

DATOS PARA FACTURACIÓN
MUNICIPIO DE PUERTO LOPEZ
NIT 892099325-0
calle 6 No. 4 - 40
Puerto López (MET), Colombia
sechacienda@puertolopez-meta.gov.co
puerto lopez

CUFE: 06ae8a77af811ef30465a78c96ed28871b0837cdfc11d8e1830f775da7f9e206c6ed4fcbb14e7ebdbce31931d7b4c1ca

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANT.	V. UNIT.	IMP.	TOTAL
1	C01 COSTO DIRECTO	1	27.778.496,00		27.778.496,00
2	C02 ADMINISTRACION 25%	1	6.944.624,00		6.944.624,00
3	C03 IMPREVISTOS	1	277.785,00		277.785,00
4	C04 UTILIDAD 5%	1	1.388.925,00		1.388.925,00

Total cantidad : 4
TREINTA Y SEIS MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS TREINTA PESOS M/CTE

SUBTOTAL	$ 36.389.830,00
TOTAL NETO	**$ 36.389.830,00**

CONTRATO DE OBRA 100-103-13-09-00001-2024
CONSTRUCCION DE BOVEDAS Y OSARIOS EN EL CEMENTERIO DEL MUNICIPIO DE PUERTO LOPEZ META

Documento oficial de autorización de numeracion de facturación según resolución número 18764073670475 vigencia de 25/06/2024 al 25/06/2026 rango del 1 al 1000 prefijo FEC. Esta factura se asimila en todos sus efectos a la letra de cambio.

Proveedor Tecnológico : ALIADDO SAS NIT:830099003-5 - www.aliaddo.com

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 9 Solicitud de actualización de datos de identificación

4. Número de formulario 14991240171

(415)7707212489984(8020) 000001499124017 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 8 1 1 9 1 6	1	Impuestos y Aduanas de Villavicencio 2 2	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	27. Fecha expedición
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
UNION TEMPORAL CEMENTERIO 2024

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Meta 5 0	Villavicencio 0 0 1

41. Dirección principal
KM 14 VIA ACACIAS VDA LAS MERCEDES FCA NARANJITOS

42. Correo electrónico sjisuministrossas@gmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3 1 3 2 1 2 5 9 6 1	

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades			Ocupación		Número establecimientos
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2	51. Código		52. Número establecimientos
4 2 9 0	2 0 2 4 0 3 0 8								

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	7	1	4	1	6	5	5																			

07- Retención en la fuente a título de rent
14- Informante de exogena
16- Obligación facturar por ingresos bienes
55 - Informante de Beneficiarios Finales

Usuarios aduaneros

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
54. Código																				

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI ☐ NO ☐ 60. No. de Folios: 61. Fecha 2024 - 03 - 14 / 09 : 53: 59

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre PERDOMO BERNAL ISMAEL ENRIQUE
985. Cargo Analista IV

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

Página 2 de 4 **Hoja 2**

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14991240171

(415)7707212489984(8020) 000001499124017 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
9 0 1 8 1 1 9 1 6	1	Impuestos y Aduanas de Villavicencio	2 2	

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza	2	63. Formas asociativas		64. Entidades e institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados	
65. Fondos		66. Cooperativas		67. Sociedades y organismos extranjeros	
68. Sin personería jurídica	7	69. Otras organizaciones no clasificadas		70. Beneficio	1

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	0 4	
72. Número		
73. Fecha	2 0 2 4 0 3 0 8	
74. Número de notaría		
75. Entidad de registro	0 1	
76. Fecha de registro	2 0 2 4 0 3 1 3	
77. No. Matrícula mercantil		
78. Departamento	5 0	
79. Ciudad/Municipio	5 7 3	
Vigencia		
80. Desde	2 0 2 4 0 3 0 8	
81. Hasta	2 0 2 5 0 5 0 8	

Composición del Capital

82. Nacional	1 0 0 %
83. Nacional público	0 . 0 %
84. Nacional privado	1 0 0 . 0 %
85. Extranjero	0 %
86. Extranjero público	0 . 0 %
87. Extranjero privado	0 . 0 %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

Estado y Beneficio

Ítem	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1				-
2				-
3				-
4				-
5				-

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Representación

001

Página 3 de 4 **Hoja 3**

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14991240171

(415)7707212489984(8020) 000001499124017 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
9 0 1 8 1 1 9 1 6	1	Impuestos y Aduanas de Villavicencio	2 2	

Representación

1

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL PRIN 1 8	2 0 2 4 0 3 0 8

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadaní 1 3	1 1 2 1 8 6 5 0 5 9		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
LESMES	AGUIRRE	ERIKA	LORENA

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

2

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL SUPL 1 9	2 0 2 4 0 3 0 8

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadan 1 3	8 6 0 8 2 6 0 4		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
MORENO	CRUZ	CARLOS	ALBERTO

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

3

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

4

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

5

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14991240171

(415)7707212489984(8020) 000001499124017 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
9 0 1 8 1 1 9 1 6	1	Impuestos y Aduanas de Villavicencio	2 2	

Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

1

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
Cédula de Ciudada 1 3	1 2 9 8 0 0 8 2		COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres
PALACIOS	MOLINA	JUAN	CARLOS

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
	1	2 0 2 4 0 3 0 8	

2

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
NIT 3 1	9 0 1 5 3 9 4 3 0	7	COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social: SJI SUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES S.A.S

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
	9 9	2 0 2 4 0 3 0 8	

3

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

4

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

5

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Autorización Numeración de Facturación

1876

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 18764073670475

(415)7707212489984(8020) 001876407367047 5

5. Número de Identificación Tributaria - NIT	6. DV	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
9 0 1 8 1 1 9 1 6	1				

11. Razón social
UNION TEMPORAL CEMENTERIO 2024

12. Dirección seccional
Impuestos y Aduanas de Villavicencio — Cód. 2 2

Dirección
KM 14 VIA ACACIAS VDA LAS MERCEDES FCA NARANJITOS

25. País	26.Departamento	27. Municipio
Colombia	Meta	Villavicencio

La U.A.E. Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, conforme a la facultad discrecional establecida en el artículo 684 - 2 del Estatuto Tributario y en virtud de lo estipulado en la Resolución 0042 del 05/05/2020, por la cual se dictan otras disposiciones en materia de sistemas de facturación; previo estudio y evaluación de la solicitud realizada por el contribuyente, representante legal o apoderado debidamente acreditado; determina autorizar los rangos de numeración de facturación y/o documento equivalente. En los casos, en que se agote dicha numeración antes de culminar su vigencia, el interesado tendrá derecho a solicitar una nueva autorización, de acuerdo con el tramite establecido.

Las vigencias de los rangos de numeración de facturación, se contarán a partir de la formalización de éste documento oficial.

Si el obligado a facturar; no hubiere agotado la numeración de facturación transcurrido el término de la vigencia autorizada, con 15 dias de antelación podrá solicitar la habilitación de la numeración sobrante.

Cuando se trate de una solicitud de inhabilitación de la numeración de facturación y/o documento equivalente, la vigencia es permanente, por lo tanto, no procede la habilitación de dichos rangos.

AUTORIZADO

Nota: La no adopción o violación de los sistemas técnicos de control, dará lugar a la sanción establecida en el artículo 684-2 del E.T

Firma del solicitante

Firma del funcionario autorizado

DIAN
2024-06-25 / 10:55:23 AM
Fecha Acuse de Recibo
Firmado

1001. Apellidos y nombres LESMES AGUIRRE ERIKA LORENA
1002. Tipo documento Cédula de Ciudadanía
1003. No. Identificación 1121865059 1004. DV 6
1005. Cod. Representación Representante Legal Principal
1006. Organización UNION TEMPORAL CEMENTERIO 2024

984. Apellidos y nombres
985. Cargo
989. Dependencia SUBDIRECCION DE FACTURA ELECTRONICA Y SOLUCI
990. Lugar administrativo
991. Organización U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACION
992. Área
993. Establecimiento

997. Fecha formalización 2 0 2 4 0 6 2 5 / 1 0 : 5 5 : 2 3

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Autorización Numeración de Facturación

1876

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 18764073670475

(415)7707212489984(8020) 001876407367047 5

5. Número de Identificación Tributaria - NIT	6. DV	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
901811916	1				

11. Razón social: UNION TEMPORAL CEMENTERIO 2024

Rangos de numeración para autorizar, habilitar o inhabilitar

	29. Establecimiento	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.
1	UNION TEMPORAL CEMENTERIO 2024 KM 14 VIA ACACIAS VDA LAS MERCEDES FCA NARANJITOS	FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA	4	FEC	1	1,000	24	AUTORIZACIÓN	1
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									

AUTORIZADO

Certificación Bancaria

Bancolombia

Puerto Lopez, 31 de Julio de 2024.

Señor

A quien pueda Interesar

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que URIEL ALFONSO RODRIGUEZ identificado(a) con CC No. 79462970 a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el Banco los siguientes productos:

Nombre Producto	Número Producto	Fecha Apertura (aaaa/mm/dd)	Estado
CUENTA AHORROS PLAN ESTANDAR	80217827039	2014/01/07	A ACTIVA

* **Importante:** Esta constancia solo hace referencia al producto mencionado anteriormente.
*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia los siguientes números: Medellín - Local: (57-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (57-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (575) 361 88 88 - Cali - Local: (57-2) 554 05 05 – Resto del país: 01800 09 12345. Sucursales Telefónicas en el exterior: España (34) 900 995 717 - Estados Unidos (1) 1 866 379 97 14.

ALCALDÍA PUERTO LÓPEZ	**CERTIFICACIÓN** **ALCALDÍA DE PUERTO LÓPEZ**	**Código: F - 291** Versión: 002 Fecha: Enero de 2024

LA SUSCRITA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE PUERTO LÓPEZ – META

CERTIFICA

Que el contratista Unión Temporal Cementerios 2024 identificado con Nit No. 901811916-1, quien ejecutó el contrato de obra No. 100-103-13-09-00001-2024 cuyo objeto es "**CONSTRUCCION BOVEDAS Y OSARIOS EN EL CEMENTERIO DE PUERTO LÓPEZ – META**" suscrito con esta entidad, ha cumplido con todas las obligaciones en materia de seguridad social, conforme a lo estipulado en el contrato mencionado.

La presente se realiza para los efectos correspondientes al pago por liquidación, solicitado por el contratista de obra y dando cumplimiento a las obligaciones suscritas por parte del municipio

Se expide a los diez (10) días del mes de septiembre del 2024.

Cordialmente,

MARYLIN PAOLA FONSECA CRUZ
Secretaria de Infraestructura Municipal

Código Postal 502001
Calle 6 Nro 4 – 40
Telefonos 6450412 – 6451867
Email: contactenos@puertolopez-meta.gov.co
