CONSORCIO PARQUES DP

2024 GRUPO VII

Nit. 901.817.334-0

INFORME MENSUAL DE OBRA No. 002
(PERIODO DEL 23 DE MAYO AL 22 DE JUNIO DE 2024)

CONSORCIO PARQUES DP
2024 GRUPO VII
Nit. 901.817.334-0

CONSTRUCCIÓN DE LA UNIDAD DEPORTIVA LA MAGDALENA.

INTERVENTOR: EDUBAR S.A.

ENTIDAD CONTRATANTE: DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA.

BARRANQUILLA - ATLÁNTICO

JUNIO 2024

TABLA DE CONTENIDO

1. INTRODUCCIÓN 4

2. CARACTERISTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO 5

2.1. ANTECEDENTES DEL PROYECTO 5

2.2. LOCALIZACIÓN 6

2.3. OBRAS CONTEMPLADAS EN EL PROYECTO 6

3. ESTADO DEL CONTRATO DE OBRA 7

3.1. INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO 7

3.2. AVANCE Y ESTADO DE LAS OBRAS CONTRATO DE OBRA 11

3.3. PERSONAL DE CONTRATISTA EN OBRA 11

3.4. EQUIPOS DEL CONTRATISTA EN OBRA 11

3.5. DIFICULTADES PRESENCIADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO. 12

3.6. ASPECTOS SOCIOAMBIENTALES Y SST. 12

3.6.1. GESTIÓN SOCIAL. 13

3.6.2. MANEJO AMBIENTAL DE OBRAS. 14

3.6.3. SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJO. 18

LISTA DE ILUSTRACIONES

- Ilustración No. 01. Detalle geográfico ubicación del Proyecto.

LISTA DE CUADROS

- Cuadro No. 01. Información general del contrato de obra.
- Cuadro No. 02. Resumen de las pólizas del contrato.
- Cuadro No. 03. Vigencias de pólizas.
- Cuadro No. 04. Avance del proyecto por capítulos.
- Cuadro No. 05. Relación de permisos ambientales.
- Cuadro No. 06. Información y divulgación.
- Cuadro No. 07. Relación de volquetas.
- Cuadro No. 08. Consolidado de generación de RCD.
- Cuadro No. 09. Manejo de materiales.
- Cuadro No. 10. Relación de materiales.
- Cuadro No. 11. Relación de instalaciones temporales.
- Cuadro No. 12. Relación de baños portátiles.
- Cuadro No. 13. Relación de maquinaria disponible en obra.
- Cuadro No. 14. Análisis de seguridad en el trabajo.
- Cuadro No. 15. Relación de inspecciones.
- Cuadro No. 16. Relación de accidentes.
- Cuadro No. 17. Relación de charlas.

LISTA DE ANEXOS

- ANEXO No. 01. Bitácora de obra.
- ANEXO No. 02. Listado de verificación de Ambiental y SST.
- ANEXO No. 03. Certificado de limpieza sanitario.
- ANEXO No. 04. Inventario forestal.
- ANEXO No. 05. Manejo de materiales.
- ANEXO No. 06. Permisos ambientales.
- ANEXO No. 07. Documentación de canteras
- ANEXO No. 08. Análisis de trabajos seguros.
- ANEXO No. 09. Charlas de seguridad.
- ANEXO No. 10. Documentación maquinaria.
- ANEXO No. 11. Entrega de EPP.
- ANEXO No. 12. Inducción SST.
- ANEXO No. 13. Inspecciones de seguridad.
- ANEXO No. 14. Inspección de vehículos.
- ANEXO No. 15. Inspecciones preoperacionales.
- ANEXO No. 16. Planillas de seguridad social.

1. INTRODUCCIÓN

La entidad contratante mediante el Proceso de Contratación LP-001-2024, el CONSORCIO PARQUES DP 2024, presento una propuesta para ejecutar el MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE PARQUES PÚBLICOS, CANCHAS DEPORTIVAS, ZONAS VERDES Y BOULEVARES EN DIFERENTES SECTORES DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA (FASE VII. LOTE 2 "CONSTRUCCIÓN DE LA UNIDAD DEPORTIVA LA MAGDALENA". Una vez adjudicado se celebró el contrato de obra No. **LP-001-2024 LOTE 2.**

El presente documento resume las actividades ejecutadas por parte del CONSORCIO PARQUES DOP 2024, en el periodo comprendido entre el 16 de abril al 22 de mayo de 2024; durante el desarrollo de las actividades contenidas en el contrato de obra mencionado anteriormente.

A través de este informe se presenta el proceso técnico, administrativo, y financiero, a cargo del CONSORCIO PARQUES DP 2024, con el fin de informar de las actividades contratadas y las eventualidades que se han presentado durante el desarrollo de la misma, siguiendo todas las especificaciones técnicas contempladas en el contrato y demás normas vigentes e inherentes al proyecto.

CONSORCIO PARQUES DP
2024 GRUPO VII
Nit. 901.817.334-0

2. CARACTERISTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

El proyecto consiste en la reconstrucción del Polideportivo La Magdalena, el cual se encuentra en un lote de 35,532 m2, el cual contendrá dos canchas de futbol en arena (una para Formación de prospectos y otra con medidas profesionales para la Practica), una pista de patinaje profesional, una cancha de Hockey, un ring de boxeo con su gimnasio de práctica, un área para gimnasio biosaludable y la reconstrucción completa del estadio de beisbol. Adjunto a estas áreas la dotación de las respectivas áreas de recreación pasiva y zonas verdes.

2.1. ANTECEDENTES DEL PROYECTO

Como es ya conocido, el Distrito de Barranquilla cuenta aproximadamente con 320 espacios entre parques, plazoletas, bulevares, zonas verdes que representan un total de 1.755.672 m2 de área, con aproximadamente un 60% de áreas duras; sin embargo cabe mencionar, lo cual ha impactado positivamente con respecto a años anteriores la vulnerabilidad antes el cambio climático, creando una red verde que permite la mejora en el medioambiente en el paisajismo que tienen los parques sino también que incentiva aspectos como la práctica del deporte, la integración de las familias y comunidades enteras.
Se hace necesario que se sigan construyendo e interviniendo esta clase de espacios para lograr fortalecer a Barranquilla como una ciudad amigable con el medio ambiente, alineándose con uno de los Objetivos de Desarrollo Sostenible que está propendiendo la Agenda Mundial 2030, especialmente en su Objetivo 3: Prevenir y reducir los efectos del cambio climático y mejorar la resiliencia. Busca implementar medidas en los territorios que minimicen los efectos del cambio climático de acuerdo con las necesidades propias.
El oportuno mantenimiento preventivo y correctivo de la infraestructura física de los escenarios deportivos, incide de manera directa en el nivel de satisfacción el usuario y en el bienestar de quienes los utilizan, así como en su vida útil, evitando daños innecesarios e inversión presupuestal en su solución.

En el diagnostico de los parques que la Agencia Distrital de Infraestructura -ADI- ha venido estructurando en estos últimos tiempos se encuentran dos grandes superficies, uno que es el que se denominará Malecón Suroriente De Rebolo y otro que es la Unidad Deportiva La Magdalena, además de otros parques que son importantes para las diferentes localidades del Distrito de Barranquilla.

Actualmente el Distrito cuenta con más de 30 espacios públicos cuya destinación de acuerdo con el Plan de Ordenamiento Territorial es de espacios recreo deportivos, dos de ellos son construcciones nuevas y otros tantos son reconstrucción de

infraestructura existentes, las cuales se encuentran en un estado de deterioro tal que no son aptos para el cometido de esta administración Distrital.

2.2. LOCALIZACIÓN

Localizado al Suroriente de la ciudad, se encuentra ubicada dentro de los siguientes límites: al norte con la carrera 38; al suroriente con el río Magdalena; al suroccidente con la acera este de la avenida Murillo, y al sur con los límites del municipio de Soledad.

El proyecto se encontrará ubicado entre la Carreras 6B y 7C, entre Calles 36B y 38B, Barrio La Magdalena.

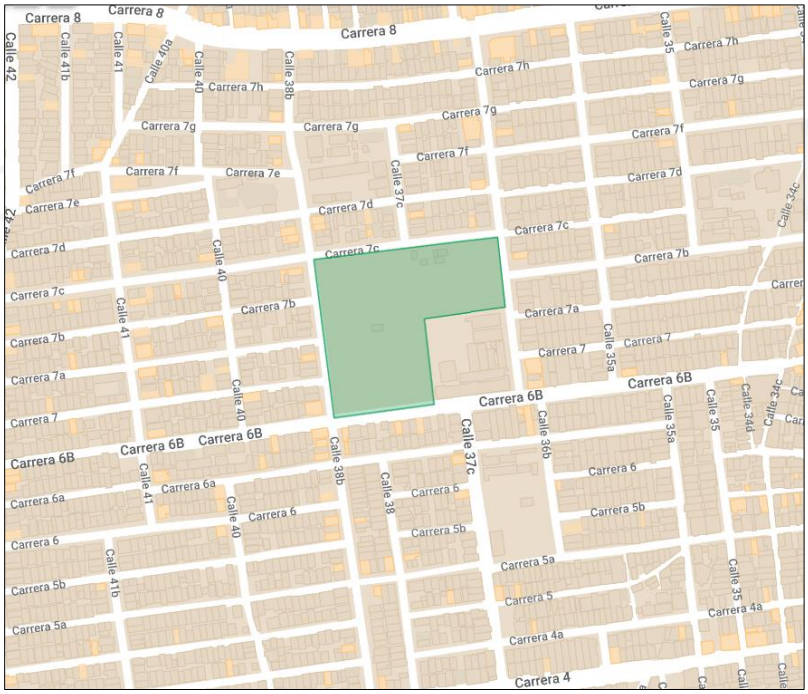


Ilustración 1. Detalle geográfico ubicación del Proyecto.

2.3. OBRAS CONTEMPLADAS EN EL PROYECTO

Dentro de las principales actividades a ejecutar en el alcance del contrato, se encuentran las siguientes:

- Obras preliminares – Movimientos de tierra.
- Estructura.
- Mampostería.
- Acabados.
- Equipamiento.
- Juegos infantiles.
- Instalaciones.
- Urbanismo.
- Provisiones.

3. ESTADO DEL CONTRATO DE OBRA

3.1. INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO

CONTRATO No:	LP – 001 - 2024
CONTRATANTE:	DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA.
CONTRATISTA:	CONSORCIO PARQUES DP 2024
NIT	901.817.334-0
INTERVENTORÍA:	EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA Y LA REGION CARIBE S.A - EDUBAR S.A.
OBJETO DEL CONTRATO:	MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DE PARQUES PUBLICOS, CANCHAS DEPORTIVAS, MALECONES, ZONAS VERDES Y BOULEVARES EN DIFERENTES SECTORES DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA (FASE VII). LOTE 2 "CONSTRUCCION DE LA UNIDAD DEPORTIVA LA MAGDALENA".
VALOR DEL CONTRATO:	VALOR DEL CONTRATO A EJECUTAR: CATORCE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MILLONES DOSCIENTOS VEINTINUEVE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS CON SESENTA Y UN CTVOS ML. ($14.858'229.465,61) Incluido A.I.U

FECHA DE INICIO:	22 DE ABRIL, 2024.
PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL:	253 DÍAS
FECHA DE TERMINACIÓN:	31 DE DICIEMBRE, 2024.

Tabla 1. Información general del contrato de obra.

POLIZA SEGÚN CONTRATO	
POLIZA DE CUMPLIMIENTO	85-44-101128365
POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL:	85-40-101058838
COMPAÑÍA ASEGURADORA:	SEGUROS DEL ESTADO S.A.
FECHA DE EXPEDICIÓN:	16/04/2024

Tabla 2. Resumen de las pólizas del contrato.

RIESGO	**VIGENCIAS**		**VALOR ASEGURADO**
	DESDE	**HASTA**	
POLIZA DE CUMPLIMIENTO	**10/04/2024**	**31/12/2029**	**$8,914,937,679.12**
POLIZA DE CUMPLIMIENTO	10/04/2024	30/06/2025	$1,485,822,946.52
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	10/04/2024	31/12/2027	$2,971,645,893.04
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	5 AÑOS, 0 MESES, 0 DÍAS*		$4,457,468,839.56
POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL	**10/04/2024**	**31/12/2024**	**$742,911,473.28**

Tabla 3. Vigencias de pólizas.

ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR EL CONTRATISTA

Durante el transcurso del período comprendido entre el 22 de mayo al 22 de junio de 2024, el Contratista ejecutó las siguientes actividades:

- Suministro e instalación de cerramiento en lámina de zinc, altura 2.00 metros.
- Demolición de plantilla en concreto y retiro de material.
- Demolición de vigas de cimentación.
- Demoliciones generales y retiro de material.
- Nivelación, replanteo y señalización.
- Descapote y limpieza a máquina y adecuación con compactación del terreno existente, incluye retiro de material e= 0.25.
- Demolición de muro bajo. Incluye retiro de material.
- Desmonte de marcos de portería de cancha deportiva.
- Desmonte de malla de cerramiento y retiro de material.
- Desmonte de cubierta en lámina de asbesto cemento incluye estructura.

A continuación, se presenta registro fotográfico de las actividades realizadas por el contratista durante este período.



Imagen 1. Cerramiento en lámina de zinc.



Imagen 2. Demolición de plantilla en concreto.




Imagen 3. Demolición de vigas de cimentación.





Imagen 4. Demoliciones generales.



Imagen 5. Nivelación y replanteo.



Imagen 6. Descapote y limpieza a máquina.



Imagen 7. Demolición de muro bajo.



Imagen 8. Desmonte de marcos de portería.




Imagen 9. Desmonte de malla de cerramiento.




Imagen 10. Desmonte de cubierta.

3.2. AVANCE Y ESTADO DE LAS OBRAS CONTRATO DE OBRA

A continuación, se presenta el resumen del avance parcial y acumulado de las obras ejecutadas:

- Avance del proyecto por capítulos.

CONDICIONES CONTRACTUALES ORIGINALES			AVANCE PARCIAL		AVANCE ACUMULADO	
ITEM	DESCRIPCION	VALOR TOTAL	VALOR TOTAL	% AVANCE	VALOR TOTAL	% AVANCE
1	CAPÍTULO - OBRAS PRELIMINARES - MOVIMIENTOS DE TIERRA	$ 2,167,281,338.98	125,719,515.30	5.80%	125,719,515.30	5.80%
2	CAPITULO - ESTRUCTURA	$ 4,201,173,618.00	-		-	
3	CAPITULO - MAMPOSTERIA	$ 1,006,614,495.00	-		-	
4	CAPITULO - ACABADOS	$ 1,033,721,702.27	-		-	
5	CAPITULO - EQUIPAMENTO	$ 322,380,686.00	-		-	
6	CAPITULO - JUEGOS INFANTILES	$ 1,215,198,455.00	-		-	
7	CAPITULO - GYM BIOSALUDABLE	$ 52,400,923.00	-		-	
8	CAPITULO - INSTALACIONES	$ 15,526,908.00	-		-	
9	CAPITULO - URBANISMO	$ 414,838,971.00	-		-	
10	CAPITULO - PROVISIONES	$ 1,000,270,184.00	-		-	
	COSTO DIRECTO	$ 11,429,407,281.24	$ 125,719,515.30		$ 125,719,515.30	
	COSTO INDIRECTO (AIU 30%)	$ 3,428,822,184.37	$ 37,715,854.59	1.10%	$ 37,715,854.59	1.10%
	TOTAL ACUMULADO	$ 14,858,229,465.61	$ 163,435,369.89		$ 163,435,369.89	

Tabla 4. Avance del proyecto por capítulos.

3.3. PERSONAL DE CONTRATISTA EN OBRA

El Contratista mantuvo en obra el siguiente personal promedio: 19 personas

- Personal Administrativo: 4 personas
- Personal operativo: 15 personas

3.4. EQUIPOS DEL CONTRATISTA EN OBRA

El Contratista mantuvo en obra el siguiente equipo en promedio:

- Minicargador – 1 unidad
- Retrocargador – 1 unidad
- Retroexcavadora – 1 unidad

3.5. DIFICULTADES PRESENCIADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO.

Durante el desarrollo del contrato el contratista se han presenciado las siguientes dificultades:

- **Entrega completa del lote.** A la fecha no tenemos posesión completa del predio, aunque, se han ido recibiendo algunas áreas parciales, seguimos pendientes del área correspondiente a la comisaría de familia, y cancha de futbol principal.

- **Entrega de diseños arquitectónicos ajustados.** El contratista se encuentra pendiente de los diseños arquitectónicos ajustados de acuerdo con la solicitud del señor alcalde Alejandro Char, diseños debieron ser entregados el jueves 20 de junio de acuerdo con el compromiso de la ADI.

- **Eventos climáticos.** La presencia constante de lluvia en el presente mes, especialmente en horas de la tarde, han reducido el ritmo de trabajo deseado para la ejecución de todas las actividades.

3.6. ASPECTOS SOCIOAMBIENTALES Y SST.

En este periodo solo se han ejecutado actividades preliminares como topografía y movimientos de tierra, estas actividades generaron aspectos ambientales, a lo que se le dio seguimiento para verificar la implementación de medidas de prevención, mitigación o compensación por parte del contratista.

CUMPLIMIENTO LEGAL Y CONTRACTUAL.

De acuerdo con la naturaleza del proyecto solo se requiere los siguientes permisos, los cuales fueron tramitados por el contratista de forma oportuna para la ejecución de las actividades, se relacionan los permisos ambientales aplicables y su estado:

PERMISO	ACTO ADMINISTRATIVO	AUTORIDAD	FECHA	ESTADO
AUTORIZACION TALA Y PODA DE ARBOLES	Rad. 1140817137	SUBDIRECCION DE GESTION AMBIENTAL BARRANQUILLA VERDE	12-06-2024	PENDIENTE

Tabla 5. Relación de permisos ambientales.

3.6.1. GESTIÓN SOCIAL.

El contratista cuenta con un profesional que lidera las actividades de gestión social del proyecto con las comunidades del área de influencia de los diferentes parques intervenidos, esta profesional cuenta con la formación y experiencia requerida para la implementación de plan de gestión social (PGS).
Para seguimiento y evaluación de este aspecto, se utiliza una lista de verificación de cumplimiento la cual se presenta en los anexos que hacen parte del presente informe.

En este ítem se presentan las actividades desarrolladas en cada uno de los programas que contempla el plan de gestión social aprobado durante el periodo de seguimiento:
Programa de información y divulgación a la comunidad.

Durante este periodo, el contratista con el acompañamiento de esta interventoría realizó actividades en el marco de este programa, con fin de contribuir a la viabilidad social del Proyecto mediante la implementación de estrategias de comunicación internas y externas de doble vía, que basadas en el diálogo y la información clara, veraz y oportuna, permitan promover la participación y la concertación, para establecer relaciones de confianza con los grupos de interés. Para lograr este objetivo se realizaron las siguientes actividades:

INFORMACION Y DIVULGACIÓN PARQUES DP CANCHA LA MAGDALENA				
FECHA	**ASUNTO**	**MECANISMOS DE DIVULGACIÓN**	**CANTIDAD**	**REGISTROS DEJADOS**
10-06-2024	Se han realizado varias socializaciones en lo que respecta, al diseño arquitectónico y funcionamiento del polideportivo. Debido a la visita del señor alcalde a la obra el día 10 de junio del 2024 por su propia iniciativa de tal manera que una vez la A**GENCIA DISTRITAL DE INFRAESTRUCTURA ADI** entre los planos ajustados con dichos cambios, se realizara una nueva socialización de actualización con un grupo de la comunidad y estos sirvan como factor multiplicador de los mismos. Posteriormente, en un trabajo articulado entre interventoría y el área social de la obra se determinará la metodología para recibir y responder PQRS y mantener a la comunidad informada	VERBAL	1	
20-04-2024	Evento colocación de la primera piedra	VERBAL	1	

Tabla 6. Información y divulgación.

Programa de atención a la comunidad.

En este periodo, no se presentaron PQRS, las inquietudes de la comunidad fueron atendidas en las reuniones de inicio de obra realizadas por el contratista.

3.6.2. MANEJO AMBIENTAL DE OBRAS.

En este ítem se describe las actividades realizadas por el contratista durante la implementación de las medidas de manejo ambiental en el periodo, igualmente se establece el cumplimiento de las metas y objetivos de los programas ambientales definidos en el Plan de Manejo Ambiental (PMA) de las actividades constructivas del proyecto.
El contratista hizo entrega del Plan de manejo ambiental (PMA), el cual debe ser ajustado a las observaciones realizadas por esta interventoría, con el fin de dar aval al documento y que sea radicado ante EPA BARRANQUILLA VERDE conforme a lo establecido en las obligaciones del contrato.

Manejo de residuos de construcción y demolición RCD.

El contratista cuenta con sitio aprobado para la disposición final de RCD, aprobados por EPA BARRANQUILLA VERDE, mediante Resolución 0000701 del 2021, localizada en Barranquilla.
El contratista realizó la inscripción como generador de RCD, mediante el radicado 11408-7137 ante Barranquilla Verde, de conformidad a lo dispuesto en la resolución 1257 de 2021.
Cuenta con un gestor transportador autorizado, mediante la Resolución 2864 de 2023, por la cual se autorizan los vehículos relacionados a continuación:

TIPO DE VEHÍCULO	PLACA
VOLQUETA	WGA-162
VOLQUETA	WXK-200
VOLQUETA	WPT-375
VOLQUETA	MPT-377
VOLQUETA	WGA-161

Tabla 7. Relación de volquetas.

En este periodo las actividades generadoras de RCD son producto de movimientos de tierras, descapote, excavaciones para nivelación de terreno y adecuaciones.

Los residuos de construcción y demolición RCD generados fueron retirados de manera parcial del punto de generación y dispuestos en el sitio autorizado. Se observan acopios en el área de trabajo.
Se presenta el consolidado de generación de RCD:

PERIODO	OBRA	TIPO DE RESIDUO	CANTIDAD GENERADA M3	REUTILIZADA M3	DISPUESTA EN SITIO AUTORIZADO* M3
JUNIO 08 AL 23 2024	CANCHA LA MAGDALENA	DEMOLICIÓN	728 M3		MAR ASEO S.A. E.S.P.
		EXCAVACION	728 M3		MAR ASEO S.A. E.S.P.
TOTAL					

Tabla 8. Consolidado de generación de RCD.

Manejo de residuos sólidos.

El contratista implementó un código de colores, según la resolución 2184 de 2019, para la segregación en la fuente. De la siguiente manera:

Color blanco: Para depositar los residuos aprovechables como plástico, vidrio, metales, papel y cartón.

Color negro: Para depositar residuos no aprovechables como el papel higiénico; servilletas, papeles y cartones contaminados con comida; papeles metalizados, entre otros.

Color verde: Para depositar residuos orgánicos aprovechables como los restos de comida, desechos agrícolas etc.

Los residuos aprovechables están siendo almacenados en obra hasta obtener un volumen considerable para su aprovechamiento y disposición. El resto de los residuos generados del campamento fueron dispuestos en las bolsas correspondientes y entregados a la empresa de servicio público de aseo Triple A S.A ESP.

Manejo de materiales

Acto administrativo	Proveedor	Vigencia
Resol. 0312 oct 2003	Canteras Munarriz	Vida útil

Tabla 9. Manejo de materiales.

Tipo de material	Abr	May	Jun	Jul	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic	Total, acumulado. m^3
Concreto (m^3)										
Triturado (m^3)										
Caliche (m^3)			728							**728 m3**
Arena (m3)			28							**28 m3**
Terraplén (m3)										
Polvillo (m3)										
Material de relleno										

Tabla 10. Relación de materiales.

Manejo de campamento e instalaciones temporales.

Se cuenta con campamento en la obra activa en el periodo, compuesto por 1 container para oficina, 1 container para almacén, adecuación de zona para punto ecológico, zona para vestier, comedor y lavado de manos.
Igualmente, se cuenta con equipos emergencia en buen estado y punto de hidratación.

Ubicación	No de baños portátiles	No. de puntos ecológicos	No. de botiquines	No. de extintores	No. de camillas	Observaciones
OBRA CANCHA LA MAGDALENA	1	1	1	1	1	
Total	1	1	1	1	1	

Tabla 11. Relación de instalaciones temporales.

Manejo de contaminantes atmosféricos y ruido.

En este periodo fue instalado el cerramiento, ya que se está realizando movimiento de tierra, nivelación y replanteo dentro del área, conforme a los diseños establecidos. Estas actividades pueden generar proliferación de material particulado, sin embargo, debido a la temporada de lluvias el material de corte se encuentra humectado minimizando así la afectación a la calidad del aire del área de influencia.
Durante el periodo evaluado no se realizaron actividades generadoras de ruido en horario nocturno que alteraran la tranquilidad del sector.

Manejo de aguas residuales.

En el periodo no se generaron vertimientos a ningún cuerpo de agua superficial ni al suelo. Se contó con unidades portátiles sanitarias, debido a que se dispuso de baños móviles, a los cuales se les realiza aseo 2 veces por semana, sin ninguna conexión a las redes de alcantarillado.

Los baños que se encuentran ubicados donde funcionara el campamento, están en proceso de adecuación para dar cumplimiento a la resolución 2400 /79, actualmente para suplir la necesidad del uso del servicio sanitario del personal en obra, se cuenta con la disponibilidad en un establecimiento comercial aledaño al parque Jorge Robledo.

PERIODO	No. Baños portátiles en obra					No. Aseos realizados por baño			Observaciones
6 meses	1					2			Días a la semana

Tabla 12. Relación de baños portátiles.

Manejo de maquinaria.

Este periodo contó con maquinaria y vehículos que pueden ser generadores de derrames accidentales durante el reabastecimiento o mantenimiento correctivo. Sin embargo, no se registran derrames de combustibles o aceites, causantes de generar contaminación hídrica.

A continuación, se relaciona la maquinaria disponible en el proyecto.

MAQUINARIA	MARCA	REFERENCIA	MODELO
1 MINICARGADOR	NEWHOLLAND	L223	2015
1 RETROEXACAVADORA ORUGA	CATERPILLAR	320-GC	2019
1 RETROCARGADOR	JHODEERE	310-SL	2019
3 VOLQUETA	KENWORTH	13- PLATON	2015 2015 2023

Tabla 13. Relación de maquinaria disponible en obra.

Los documentos de la maquinaria que fueron remitidos pueden ser vistos en los anexos del presente informe.

Manejo de vegetación.

Durante este período, no se llevaron a cabo intervenciones forestales en ninguno de los frentes de obra activos, se le solicitó al contratista la entrega del inventarió forestal de cada uno de los frentes a intervenir y la protección de individuos arbóreos existentes.

3.6.3. SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJO.

En el periodo se implementaron actividades tendientes a proporcionar condiciones de trabajo seguras para el personal, con el fin de minimizar los riesgos asociados a las actividades ejecutadas en las obras, para lo cual se contó con el acompañamiento permanente de la profesional SST, responsable de emitir los permisos, identificar los riesgos asociados e implementar acciones correctivas para controlarlos.
Como actividades del control de riesgo requeridas para evitar accidentes de trabajo, enfermedades profesionales y mejorar la productividad, se realizaron análisis de trabajo seguro (ATS) estableciendo los controles necesarios para minimizar el nivel de accidentalidad.

Análisis de seguridad en el trabajo			
Obra	**Fecha**	**Descripción de la tarea**	**Responsable**
CANCHA LA MAGDALENA	13 AL 15 /06/2024	Retiro de material manual y con volquetas Demolición de muros Levante de cerramiento y muros Desmonte de mallas	Karen Palacio
	17 AL 18/06/2024		
	19 AL 20/06/2024		
	21 AL 23/06/2024	Control y apoyo área administrativa	Karen Palacio

Tabla 14. Análisis de seguridad en el trabajo.

Todos los registros fueron remitidos en el informe mensual presentado a la interventoría, los cuales se anexan al presente informe.

Durante el período evaluado el contratista contó con un total de 19 trabajadores, 4 administrativos y 15 operativos, los cuales, se encuentran con cobertura al Sistema General de Seguridad Social, fueron remitidos los soportes de vinculación a cada una de las entidades, dando cumplimiento de manera integral a este requerimiento. El detalle del personal vinculado a las obras se encuentra relacionado en la lista de verificación Ambiental y SST que hace parte de los anexos del presente informe

En los anexos del informe se presentan los registros enviados en el período.

Inspecciones planeadas.

Para este periodo el contratista realizó las inspecciones planeadas de herramientas, equipos de emergencia, inspecciones de EPP y preoperacionales de maquinaria del frente activo.

Fecha	Inspección	Cantidad
20-06-2024	Botiquín y Extintor	1 c/u
21-06-2024	Minicargador	Semanal
17-06-2024	Retrocargador	Semanal

Tabla 15. Relación de inspecciones.

Los soportes de la seguridad social hacen parte de los anexos del presente informe.

Accidentalidad.

En este periodo no se presentaron accidentes en ninguno de los frentes de obra activos, manteniendo un buen indicador de accidentalidad.

PERÍODO	No DE ACCIDENTES	DESCRIPCIÓN
MAYO-JUNIO 2024	0	N.A

Tabla 16. Relación de accidentes.

Capacitaciones de SST

En este periodo se realizaron charlas al personal en temas de prevención y control de los riesgos asociados a las actividades, también charlas en temas sociales y ambientales.
Se evidenció la realización de pausas activas.

Las temáticas abordadas en las charlas y capacitaciones SST se relacionan a continuación:

Fecha			Tipo de actividad	Tema	No asistentes	Responsable
13	6	2024	Charla	Riesgo físico y EPP adecuado al peligro	11	Coordinadora SSTA
14	6	2024	Charla	Riesgo biológico y medidas para prevenir	10	Coordinadora SSTA

Fecha			Tipo de actividad	Tema	No asistentes	Responsable
15	6	2024	Charla	Riesgo biológico prevención de gripe por lluvias torrenciales	7	Coordinadora SSTA
17	6	2024	Charla	Condiciones de seguridad (orden y aseo)	9	Coordinadora SSTA
19	6	2024	Charla	Riesgos ligados a condiciones de seguridad	9	Coordinadora SSTA
20	6	2024	Charla	Riesgo Biomecánico (Medidas preventiva)	11	Coordinadora SSTA
21	6	2024	Charla	Riesgo Biomecánico (Movimiento repetitivo)	10	Coordinadora SSTA
22	6	2024	Charla	Riesgo Biomecánico (Malas posturas)	10	Coordinadora SSTA

Tabla 17. Relación de charlas.

CONSORCIO PARQUES DP
2024 GRUPO VII
Nit. 901.817.334-0
