1. DATOS DEL INFORME

INFORME PARCIAL [ ] INFORME FINAL [X]

ACTA PARCIAL [ ] NÚMERO_____ PERIODO: 31 de agosto al 30 de septiembre de 2024

2. ASPECTOS GENERALES DE CONTRATO/CONVENIO Y SU EJECUCIÓN

Contrato / Convenio No.	209 - 2024	*Fecha (dd/mm/aaaa):*	09/04/2024
Nombre completo del contratista:		Técnica y Proyectos de Ingeniería SAS	
Documento de identificación:		NIT 900773490-7	
Nombre del supervisor:		JORGE ARMANDO VALERO HERNANDEZ	
Unidad Administrativa:		Secretaría de Infraestructura y Equipamiento Municipal	

Objeto del contrato:

EL CONTRATISTA SE OBLIGA PARA CON EL MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO A REALIZAR INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL Y AMBIENTAL DEL CONTRATO CUYO OBJETIVO ES REALIZAR OBRAS DE MEJORAMIENTO DE LA CARRERA 11 ENTRE LA CALLE 9 SUR HACIA LOS GUABOS DEL BARRIO NARIÑO DEL MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO

3. INFORME JURÍDICO

Fecha de Inicio						Fecha terminación					
Día	17	Mes	06	Año	2024	Día	30	Mes	09	Año	2024

Modificación(es) al contrato: *Elegir (X / NA)*	*NA*							
Suspensión: *Elegir (X / NA)*	*NA*	Día		Mes		Año		
Reanudación: *Elegir (X / NA)*	*NA*	Día		Mes		Año		
Terminación anticipada: *Elegir (X / NA)*	*NA*	Día		Mes		Año		
Prórroga o Adición: *Elegir (X / NA)*	*NA*	Día		Mes		Año		

4. INFORME PRESUPUESTAL, CONTABLE Y FINANCIERO

4.1 Informe Presupuestal

Número de CDP: 2223	Fecha de CDP: 16/11/2023	Valor: $ 872.153.016
Número de RP: 1024	Fecha de RP: 09/05/2024	Valor: $ 40.864.005

Diligenciar en caso de Adición en el contrato (solo si aplica)

Número de CDP Adición:	Fecha de CDP Adición:	Valor:
Número de RP Adición:	Fecha de RP Adición:	Valor:

4.2 Informe Contable

Valor inicial del contrato: CUARENTA MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL CINCO PESOS M/CTE ($40.864.005).	$ 40.864.005
Adición:	$
Valor Total del contrato	$ 40.864.005

Información para Retención en la fuente:

Para efectos de disminución de la base de retención en la fuente, anexo copia legible de los siguientes documentos: (*marcar con X la selección correspondiente*)	SI	NO
• Recibo de consignación en mi cuenta de Apoyo al Fomento de la Construcción AFC del periodo de la cuota.		X
• Recibo de consignación en mi cuenta del Fondo de Pensiones voluntarias del periodo de la cuota.		X

4.3 Información financiera:

• Ejecución

N°	Valor Total del Contrato / Convenio (A)	Valor Cuota /acta parcial para pago	Valor Acumulado de ejecución (B)	Saldo por Ejecutar (C=A-B)
1	$ 40.864.005	$ 5.827.499	$ 5.827.499	$ 35.036.506
2	$ 40.864.005	$ 9.873.036	$ 15.700.545	$ 25.163.470
3	$ 40.864.005	$ 7.933.893	$ 23.634.428	$ 17.229.577
4	$ 40.864.005	$ 17.229.577	$ 40.864.005	$ 0

• Pagos

N°	Valor Cuota pagada	N° Comprobante de Egreso	Fecha de pago *(dd/mm/aaaa)*	Valor Acumulado de pagos (B)	Saldo por pagar (C=A-B)
1	$ 5.827.499	2024001981	05/08/2024	$ 5.827.499	$ 35.036.506
2	$ 9.873.046	2024002248	27/08/2024	$ 15.700.545	$ 25.163.470
3	$ 7.933.893	2024002696	04/10/2024	$ 23.634.428	$ 17.229.577
...					

Información del pago de seguridad social:

Obligación	Datos Certificación o Planilla de Pago		
Sistema de Salud, Sistema de Pensiones y Riesgos Laborales	N° PIN	Referencia	Autorización
	9475372587		
	Operador	Pago	N° Planilla
	APORTES EN LINEA	$ 1.040.100	9475372587
	Fecha de Pago	Período de pago de la seguridad social	
	15/10/2024	Septiembre 2024	

Observaciones al informe financiero y contable: se pondría este texto: El contratista acreditó el pago de los aportes a la Seguridad Social Integral correspondiente al mes de (septiembre) de (2024), último mes legalmente exigible al contratista para el trámite de la cuota del contrato, de conformidad con lo dispuesto en Ley 1995 de 2019. No obstante, en cumplimiento a lo señalado en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 que establece que: "Las Entidades públicas en el momento de liquidar los contratos deberán verificar y dejar constancia del cumplimiento de las obligaciones del contratista frente a los aportes mencionados durante toda su vigencia, estableciendo una correcta relación entre el monto cancelado y las sumas que debieron haber sido cotizadas", y teniendo en cuenta que a la luz del artículo 60 de la Ley 80 de 1993 la liquidación de los contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión no es obligatoria, el contratista deberá acreditar ante el Supervisor el pago de los aportes su seguridad social del mes de (septiembre) de (2024). En caso de que el contratista no cumpla con la obligación del pago de los aportes a la seguridad social, el Supervisor deberá reportar el eventual incumplimiento en el pago de aportes a la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP), con el fin que esta entidad adelante las acciones pertinentes a que haya lugar.

5. INFORME TÉCNICO

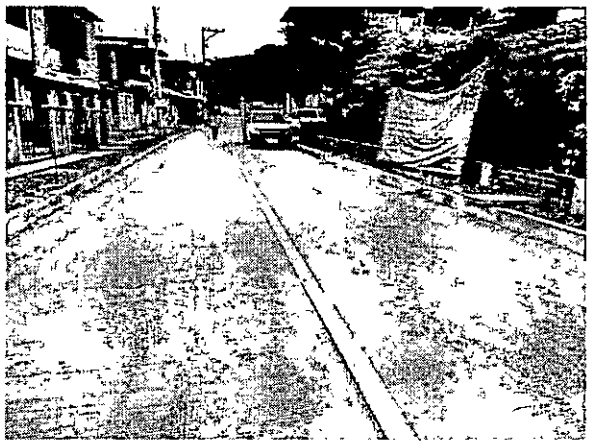


Imagen 1 Pavimentación terminada



Imagen 2 Recorrido de verificación de obra con contratista, interventoría, supervisión, veeduría y comunidad

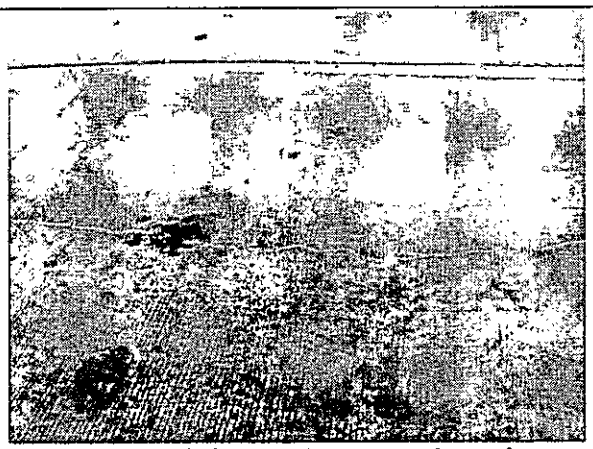


Imagen 3 Tratamiento de fisura según concepto técnico de especialista



Imagen 4 Tratamiento de fisura según concepto técnico de especialista



Imagen 5 Recorrido verificación de correcciones

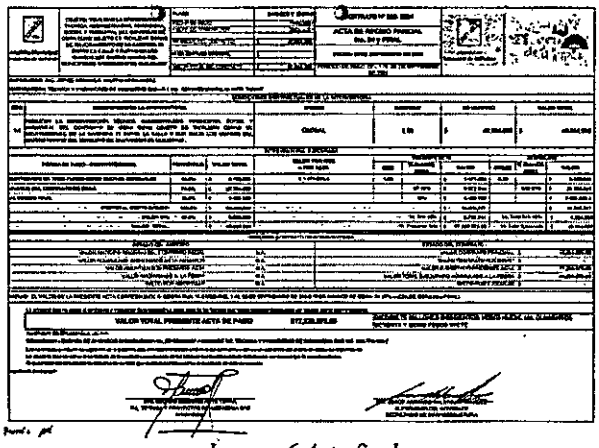


Imagen 6 Acta final

Ejecución de obra	100%
Ejecución de interventoría	100%

Recibo a Satisfacción de Servicios: *(aplica solo para el último informe a la finalización del contrato)* Con la firma del presente informe se deja constancia del recibo a satisfacción por parte del MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO CAUCA, de los servicios prestados pactados en el contrato N° 209 del 09 de abril de 2024.

Constancia de Paz y Salvo: *(aplica solo para el último informe a la finalización del contrato)* El Contratista la fecha del presente informe no posee a cargo elementos devolutivos a su cargo de propiedad del Municipio de Santander de Quilichao, Cauca entregados por este organismo para el desempeño de sus actividades. Así mismo se encuentra a paz y salvo con el archivo de gestión documental y el sistema de Gestión documental como consta en el formato F2-DL-PC4-1050 Formato de Paz y Salvo Documental

Observaciones al informe técnico:
Sin observaciones.

6. RECOMENDACIONES PARA EL CONTRATISTA

Sin recomendaciones.

7. FIRMAS RESPONSABLES

JORGE ARMANDO VALERO HERNÁNDEZ
Supervisor del contrato

Fecha de suscripción del informe de supervisión: Santander de Quilichao, Cauca, Noviembre 18 de 2024.
