Lunes 24/JUNIO/24
Dia Lluvioso
Personal Residente de Obra, profesional SISSO, cuadrilla civil
Equipo Vibrador de Concreto, Mezcladora
Actividad Debido a las lluvias intensas que se presentaron el fin de semana se vio afectada la compactacion realizada en la cancha, la cual debio ser replanteado y remover todo el material dañado por cuestion de las lluvias, se procedio a retirar este material, Se inicia labores de excavacion en el sendero ubicado en el sector occidental de la cancha donde se toman los respectivos niveles y se inicia excavacion, se continuan labores de excavacion en filtro frances pero se ve afectado por las inundaciones producto de las lluvias, se debe evacuar estas agua para continuar labores, y se continua tratando de mitigar las inundaciones en caso de reiterarse las lluvias. —

RESIDENTE DE OBRA

Martes 25/JUNIO/24
Dia Lluvioso.
Personal Residente de dora Profesional SISSO, cuadrilla civil
Equipo Mezcladora vibrador de concreto.
Actividad Se presentan lluvias intensas que imposibilitan el trabajo y el avance normal de obra, se realiza alistamiento de terreno con compactacion, se inicia fundicion de placa y se debe para por motivos de lluvia, se continua excavacion para filtro frances y se inicia excavacion para cercano teniendo en cuenta su respectiva inclinacion para manejo de aguas de escorrentias —

RESIDENTE DE OBRA

Miercoles 26 Junio/24
Dia Lluvioso
Personal: Residente de obra, profesional SISSO, cuadrilla civil
Equipo Mezcladora de concreto, vibrador de concreto
Actividad Se realiza compactación y arreglo de recebo afectado por lluvias y se procede a compactar, luego se hace instalacion de plastico de separacion y malla electrosoldado procurando su separacion con panela en concreto, se realiza fundicion de placa en concreto, se continua excavacion para filtro frances tomando niveles para manejo de agua, se continua excavación de carcamo, se pausan actividades por lluvias intensa con duracion de 3 horas desde el medio dia hasta pasadas las 3 de la tarde, Se presenta inundaciones en excavaciones que presentan retrasos y problemas en las ejecuciones de obra.

RESIDENTE DE OBRA

Jueves 27 Junio/24
Dia Lluvioso
Personal Residente de Obra, profesional SISSO, cuadrilla civil
Equipo Mezclodora de concreto, vibrador de concreto
Actividad Se hace terminación de filtro frances excavación y se procede a la instalación del geotextil 1600 por toda la trayectoria del mismo, se realiza instalacion de tuberia para filtro perforada y se hace la instalación de la gravilla, se finaliza cerrando geotextil y cociendo sus puntas, Se continua extraccion de material dañado por lluvias pero empieza a llover desde las 11am y se deben suspende laboores al no poder seguir por lluvias intensas

RESIDENTE DE OBRA

Viernes 28/Junio/24
Dia Lluvioso
Personal Residente de Obra, profesional SISSO, cuadrilla civil
Equipo Mezcladora de Concreto, vibrador de concreto
Actividad Se realiza excavación manual para colocación de tubería para filtro francés, se instala tubería y se procede a compactar terreno sobre tubería incluyendo colocación de camade arena, se procede a la extracción de agua empozada por las fuertes lluvias, se procede al retiro de material dañado por lluvias y la instalación de recebo para posterior fundición de placa, Se inicia corte figurado y amarre de acero para carcamo, se continua excavaciones para carcamo, Se vuelven a producir lluvias intensas que imposibilitan la continuación normal de los trabajos se procede al uso de plastico para intentar reducir el daño de trabajo por las lluvias.

EDUBAR S.A.

RESIDENTE DE OBRA

Sabado 29 Junio/24
Dia Lluvioso
Personal Residente de Obra, profesional SISSO, cuadrilla civil
Equipo Mezcladora, vibrador de concreto
Actividad Se realiza fundición de placa aprovechando buen clima en dias mañanero, se denota que las lluvias siempre se dan en horario de medio dia. Sin embargo por motivos de lluvia en han tenido retrasos importantes en el cronograma de obra, se realiza preparación de terreno para fundicion de placa en concreto, se realiza colocacion de acero figurado para cargamo.

EDUBAR SA.

RESIDENTE DE OBRA

Lunes 01/Julio/24 festivo
Dia Lluvios
Personal: No se realizaron actividades de obra por dia festivo

Martes: 02/Junio/24
Dia Lluvioso
Personal Residente de obra, profesional SISSO, cuadrilla civil
Equipo Mezcladora de concreto, vibrador de concreto
Actividad Se inicia fundición de placa en concreto cabiendo el respectivo plastico separador posterior frente la malla electrosoldada colocando paneles para separacion del paso y se finaliza con la aplicación de Antisol, Se realiza instalacion del amarre y figurado del acero para el carcamo, se colocan los respectivos paneles de separación y se inicia la fundicion del carcamo, se debe para la actividad por lluvias intensas que se producen a medio dia, se cubre con plastico para evitar el daño del trabajo realizado

EQUIPTAL SA.

RESIDENTE DE OBRA

Miercoles 03/JULIO/24
Dia Lluvioso
Personal Residente de obra, profesional SISSO, cuadrilla civil
Equipo Mezcladora de concreto, vibrador de concreto, mini cargador
Actividad Se inicia fundicion de placa con anterior alistamiento de terreno, se debio compactar con material nuevo debido al daño producido por las frecuentes lluvias, se instala plastico y las respectivas mallas electrosoldadas, procurando la colocacion de panales de separación y se funde, se continua fundición de carcamo, y se comienza con las excavaciones de senderos sin embargo comienzan lluvias sobre el medio dia y se deben detener todas las actividades

Se producen grandes acumulaciones de agua que impiden el avance normal y la ejecución de obras, se hace acodada a placa de concreto y cárcamo.

EDVSAR SA.

RESIDENTE DE OBRA

Jueves 04 Julio/24
Dia Lluvioso
Personal Residente de Obra, profesional SISSO, cuadrilla civil
Equipo Mezcladora de concreto, vibrador de concreto, minicargador
Actividad Se continua fundición de carcamo, incluyendo corte figurado y amarre de acero de refuerzo, se inicia excavación e instalación de geotextil 1600 para segundo tramo de filtro frances en zona oriente desde anden hacia cerramiento de concha el cual recogera las aguas acumuladas de este sector se continua excavaciones con minicargador sin embargo continuan las fuertes lluvias imposibilitando la ejecución normal de estos trabajos, se realiza la instalacion de la respectiva tuberia para manejo de aguas del filtro frances hacia la red de acueducto en su primer tramo junto a la concha

EDVSAR SA.

RESIDENTE DE OBRA

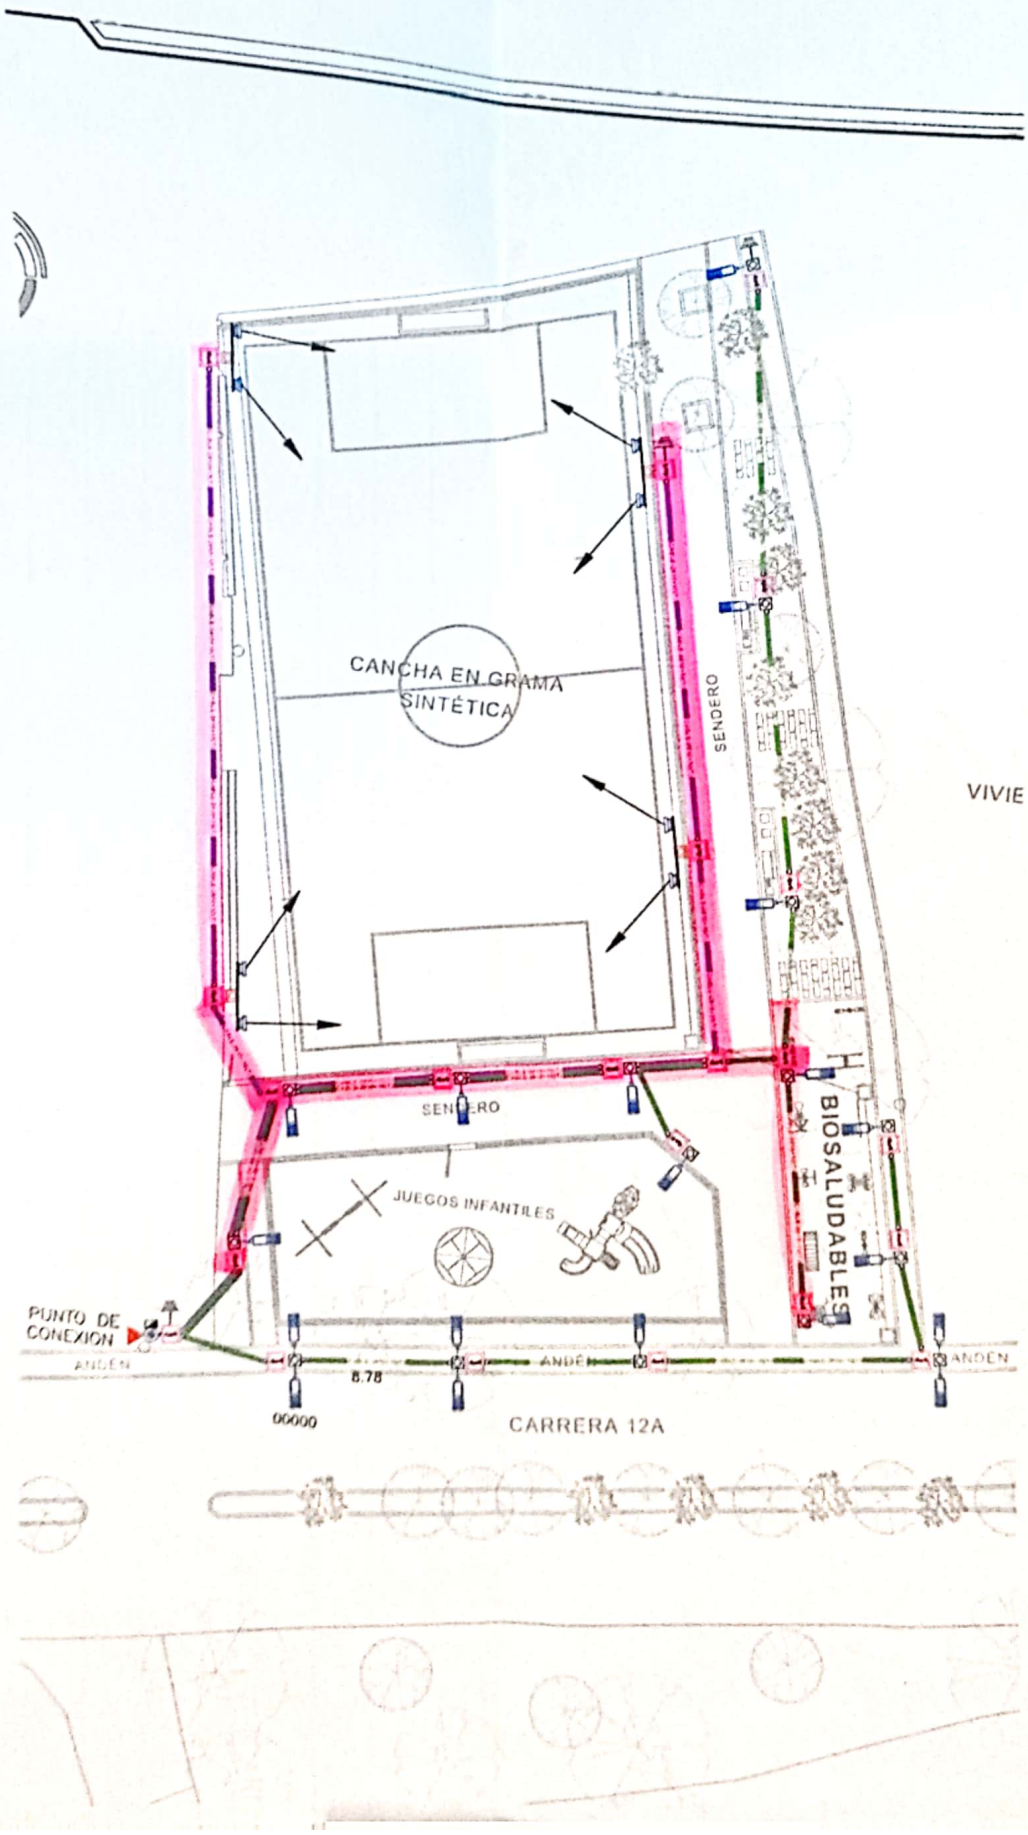
Viernes 05 Julio/24
Dia Lluvioso
Personal Residente de Obra, Profesional SISSO, cuadrilla civil
Equipo Mezcladora de concreto, vibrador de concreto, minicargador
Actividad Se presentan lluvias intensas desde las primeras horas de la mañana imposibilitando el trabajo en obra, se da tiempo

una espera sin embargo las lluvias no cesan, se realiza investigación a estaciones climatologicas via internet y estas aseguran que el dia sera de lluvias durante todo el dia, por ende se toma la desicion de suspender actividades por el dia de hoy.
Se realiza entrega del plano electrico del parque por parte de la entidad correspondiente y se estipula que el contratista se encargara de la instalacion solamente de la tuberia que estara dentro de la concha sintetica y dos puntos ubicados en plano, esta tuberia corresponde a un tubo conduit de 2 pulgadas.

RESIDENTE DE OBRA

ESSSA.

Sabado 05 Julio/24
Dia Nublado
Personal Residente de Obra, Profesional SISSO, cuadrilla civil
Equipo Mezcladora de concreto, vibrador de concreto
Actividad Debido a las fuertes lluvias producidas el dia viernes 4 se encontraron varios inconvenientes con inundaciones en varios sectores del lote, de igual forma se evidencian daños por socavacion en las excavaciones realizadas en dias ante-


CANCHA EN GRAMA SINTÉTICA
SENDERO
SENDERO
JUEGOS INFANTILES
BIOSALUDABLES
PUNTO DE CONEXION
ANDÉN
ANDÉN
ANDÉN
6.78
00000
CARRERA 12A

VIVIE

riores los wales presentan acumulación de agua. Se procede a terminar el ultimo tramo del carcamo occidental de la cancha junto con su caja de desague final. Se realiza corte figurado y armado ole acero de refuerzo para carcamo oriental.

RESIDENTE DE OBRA

Lunes 08 Julio/24
Dia Soleado
Personal Residente de Obra, profesional SISSO, cuadrilla civil
Equipo Minicargador, Mezcladora de concreto
Actividad Se continuan labores de corte figurado y armado de acero ole refuerzo para carcamo, se realiza fundicion ole concreto del primer tramo de carcamo oriental, Se continúan excavaciones para sendero lateral tomando niveles y dejando la respectiva indinacion para manejo de aguas ole escorrentia, Se inicia levantamiento de muro perimetral de cancha en costado Sur incluyendo fundicion de concreto en dovelas internas Se realiza entrega x parte de la alcaldia via whatsapp de la colorimetria que llevara el concreto estampado de los senderos dentro del parque de igual forma se define el estilo de estampado el cual corresponde al estilo abanico.



B/Quilla Arq Catalina Catalina

Ya inclusive lo deje en la pared plotteado

Si ese es

MUCHAS GRACIAS ARQ

OK ARQ, PERFECTO

ARQUI, Y EL TEMA DE LA COLORIMETRIA???

ALFIN QUE COLORES???

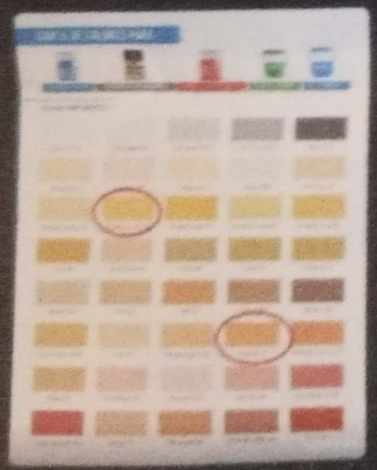
ARQUI ESTUVE REVISANDO Y SI, EFECTIVAMENTE YA ESTAN ESOS DETALLES Y COLORES

PERO COMO TAL NO DICE CUALES DE LOS COLORES VAN EN MI PARQUE

LOS DEBO ESCOGER YO ???

OK, VALE

GRACIAS!



Estampado abanico

Martes	09 Julio/24
Dia	Soleado
Personal	Residente de Obra, Profesional SISSO, cuadrilla civil
Equipo	Minicargador, Mezcladora de concreto, vibrador de concreto
Actividad	Se realiza excavaciones para alistar terreno de sendero occidental, se hace retiro de material sobrante y se realizo excavación para bordillo, Se continuo fundiendo de carcamo oriental y excavando progresivamente mientras se funde, Se realiza pañete en muro de reposicion en concreto 50R pañete impermeabilizado, se inicio corte figurado y armado de acero para refuerzo de bordillos en senderos. Se termina el primer tramo de muro de cerramiento de cancha en concreto 50R

CONSTRUCTORA SA.

RESIDENTE DE OBRA

CARTA DE COLORES PARA



CONCRETE COLOR



CONCRETE COLOR INDUSTRIAL



CONCRETE REVESTIMIENTO



DESMOL CONCRETE



SELLA CONCRETE

Tonos CONCRETCOL

Gris Claro 101	Gris Ágata 102	Gris Neutro 103	Gris Oscuro 104	Negro 105
Bisque 106	Coquina 107	Beige 108	Crema 109	Almendra 110
Amarillo Canton 111	Amarillo Claro 112	Amarillo Gold 113	Amarillo Colza 114	Amarillo Trigo 115
Ocre 116	Pardo Pálido 117	Pardo 118	Caqui 119	Ciprés 120
Madera 121	Tan 122	Café 123	Bronce 124	Tabaco 125
Ocre Oscuro 126	Skin 127	Naranja Aglow 128	Naranja 129	Naranja Oscuro 130
Siena 131	Rosa Posy 132	Rosa Mint 133	Salmon 134	Rojo Pardo A 135
Rojo Pardo B 136	Malva 137	Terracota 138	Terracota Ladrillo 139	Rojo 140

Miercoles 10 Julio/24
Dia Soleado
Personal Residente de obra Profesional SISSO, cuadrilla civil
Equipo Minicargador, Mezcladora concreto vibrador de concreto
Actividad Se realiza excavación en sendero del lado occidental donde se evidencia la existencia de colchones en varios sectores en los cuales se evidencio un mayor mejoramiento y se adecua para su correcta compactación, se continua el retiro del material sobrante, Se continua con la construcc del muro del cerramiento de cancha en costado SUR y se continua con el pañete impermeabilizado en el muro de reposición, Se continua con fundicion de carcamo en costado Oriental y corte, figurado y armado de acero de refuerzo para carcamo. —

ECOVIAL SA.

RESIDENTE DE OBRA

Jueves 11 Julio/24
Dia Soleado
Personal Residente de Obra cuadrilla civil
Equipo Minicargador Mezcladora, vibrador de concreto
Actividad Se continua excavacion y retiro de material sobrante se evidencia la existencia de suelo inestable y se debe ra hacer la compactación pertinente para solucionar este tema, se continua con la figuracion de acero de refuerzo para bordillo se comienza a testerear y alistamiento para fundición de bordillo. incluyendo la instalación de recebo en sub base, se continua la compactacion de recebo para alistamiento de terreno para fundición de placa en colur, Se continua y se finaliza la fundicion del carcamo oriental y se comienza con el alistamiento del sector de gradas.

Se realiza comite de obra con la presencia de supervision e interventoria y se aclaran y definen los siguientes puntos

- Acabado de panete de muros en pintura gris basalto tipo exterior
- Se establece que el contratista estara a cargo de las instalación de tubera PVC Condat 2" segun diseño electrico presentado y aprobado
- Se establece que se deben hacer los mejoramientos pertinentes en los sectores más afectados por lluvias
- Se establece un rediseño para el acceso de las viviendas colindantes hacia el parque
- Se debera entregar el diseño y estudio para la conexion de las aguas del filtro hacia el manual en la via cra 124
- Se define que el panete en muros debera ser impermeabilizado
- Se define que el sector Norte pasando la calle se debera replantear si se procede o se quita del alcance del proyecto
- Se debera hacer maleras en las especies arboreas que se encuentran dentro de los senderos, estas estaran hechas en bloque de arzobordad.

Se establecen estos puntos a seguir y se debera entregar los rediseños estudios y combos para aprobación y ejecución

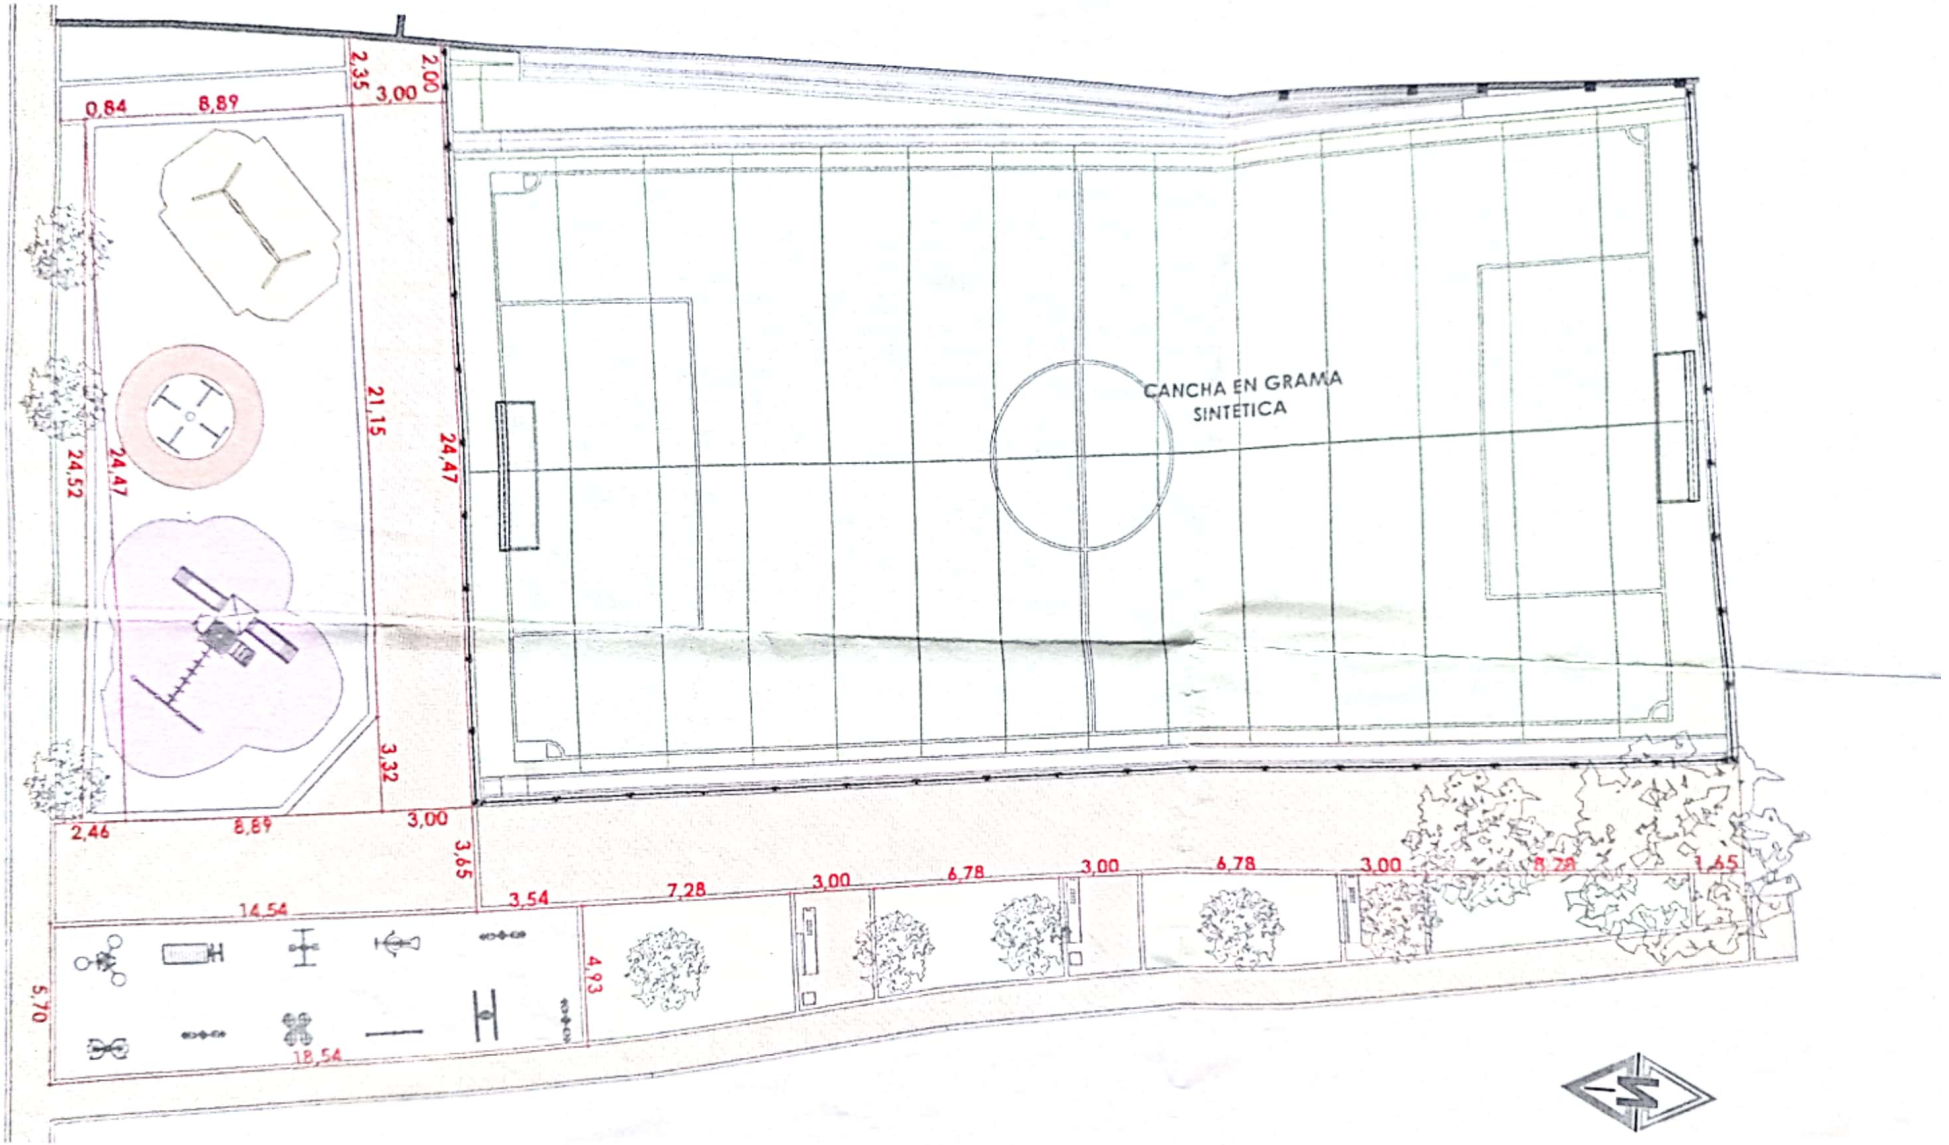
RESIDENTE DE OBRA

INTERVENTORIA

Viernes 12/Julio/24
Dia Soleado
Personal Residente de obra, Profesional SISSO cuadrilla civil
Equipo Minicargador, Motiladora de concreto, vibrador de concreto
Actividad Se realiza excavacion profunda para solucionar temas de colchones generados por el empozamiento de agua los cuales afectaron la estabilidad del terreno por ende se debo excatar para sacar todo el material danado y se procedio a rellenar con recebo granuso compactado en capas de 30cm, se realiza fundicion del primer tramo de bordillo de confinamiento instalando ~~de~~ acero figurado y sus respectivas panelas, se realiza compactacion de recebo en sendero occidental del lote, Se realiza excavación para instalacion de tuberia electrica,
Se recibe ultimo modificacion de planos arquitectonicos con modificaciones en zonas duros

RESIDENTE DE OBRA

CONSTRUCTORA SA


CANCHA EN GRAMA
SINTETICA
0,84
8,89
2,35
3,00
2,00
21,15
24,47
24,52
24,47
3,32
2,46
8,89
3,00
3,65
14,54
3,54
7,28
3,00
6,78
3,00
6,78
3,00
8,78
1,45
4,93
5,70
18,54

Sabado 13/Julio/24
Dia Soleado
Personal Residente de Obra, Profesional SISSO, cuadrilla civil
Equipo Minicargador, Mezcladora concreto, vibrador de concreto
Actividad Se realiza excavación profunda para extracción de material dañado por lluvias en la zona colindante con muro del colegio, se retira el material y se procede al mejoramiento con reeebo compactado en capas de 30cm, se continua excavacion y se procede a instalación de tubería eléctrica conduit 2" para instalaciones electricas, se continua corte figurado y armado de acero estructural y se continua encofrado para bordillo de compactacion.

RESIDENTE DE OBRA

Lunes 15 Julio/24
Dia Soleado
Personal Minicargadora, Mezcladora concreto, vibrador de concreto
Equipo Residente de Obra, Profesional SISSO, cuadrilla civil.
Actividad Se realiza el retiro del material de excavacion y se continuo excavación para instalacion de tubería electrica Se continuo el corte figurado y armado de acero de refuerzo para bordillo y se inicia fundición de bordillo de confinamiento, se continua instalación de tubería 2" en muro de colegio y se inicia mejoramiento de terreno

RESIDENTE DE OBRA

Martes 16 Julio /24
Dia Soleado
Personal Residente de Obra, Profesional SISSO, cuadrilla civil
Equipo Minicargado Mezcladora de Concreto, vibrador de concreto.
Actividad Se continua con el corte figurado y armado de acero de refuerzo para bordillos, se continua con el retiro del material sobrante, se inicia replanteo y acomodación de terreno para la zona de niños y se inicia excavacion para instalación de tuberia sanitaria 4" procedente del carcamo y el filtro, en dicha excavación se encuentra una caja de paso sanitaria en el anden perimetral la cual luego de retira sedimentos se evidencia que si es sanitaria por ende puede ser usada para la conexion de la tubera 4" procedente del filtro, se realiza registro fotografico y se envia hacia interventoria para aprobación de conexion, se hace revision de capacidad de caudal y se establece que esta cuenta con una conexion domiciliaria de 4" y una tuberia de la red de 6" la cual cuenta con la capacidad para soportar el caudal de filtro, se procede a hacer dicha conexion y se restaura la tapa para sellarla, Se aprueba finalmente la conexion. y la tuberia procedente del carcamo se conecta ala via. –

RESIDENTE DE OBRA

Se autoriza al Contratista realizar el Pañete interior CON SIKA 1 y hacer el realce de la Caja o Registro Sanitario encontrado; Construcción de Tapa e instalación —

INTERVENTOR SIA.

Miercoles 17 Julio/24
Dia
Personal
Equipo
Actividad

Miercoles 17 Julio/24
Dia Soleado
Personal Residente de Obra, Profesional SISSO, cuadrilla civil
Equipo Mezcladora de concreto, minicargador, vibrador de concreto
Actividad Se continua la extracion del material sobrante de excavaciones y se inicia excavaciones para viga de cimentacion de zona de nitos, Se continua el corte figurado y amarre de acero de refuerzo para viga de cimentación, Se continua fundicion de placa en sector de graderias en concha haciendo un mejoramiento de terreno en gravillo de bido al reforzamiento para la filtracion del fluido proveniente del muro, se realiza replanteo de senderos y se toman niveles para identificar y establecer niveles para manejo de aguas de escorrentia.-

EDOBARSA.-

Residente de OBRA

Jueves 18 Julio/24
Dia Nublado
Personal Residente de obra, Profesional SISSO, cuadrilla civil
Equipo Mezcladora de concreto, vibrado de concreto.
Actividad Se continua excavación para construccion de viga de cimentacion, se hace instalacion de acero de refuerzo y se comienza encofrado para alzamiento y posterior fundicion de concreto, se continua compactación de terreno en zona de placa de concha contra muro colindante, y se procede a fundicion de placa incluyendo instalacion de plastico y malla electrosoldada,

EDOBARSA

RESIDENTE DE OBRA

Viernes 19 Julio/24

Dia Lluvioso

Personal Equipo Residente de Obra, cuadrilla civil Profesional S.G.

Actividad Se continua excavacion para viga de cimentacion y se instala acero en sitio se toman niveles y se encuentra sin embargo se presentan fuertes Lluvias desde las 11 am las cuales obligan a parpner actividades y suspencion de trabajos. Se hace entrega de resultado de fallos de cilindros de concreto, viga de cimentacion y placas de concreto

RESIDENTE DE OBRA

ESCOMAR SA

Laboratorio SEOTEC S.A.S.

ENSAYO DE RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE PROBETAS CILÍNDRICAS DE CONCRETO

NORMA I.N.V. E-410

EMPRESA SOLICITANTE:	UNION TEMPORAL PARQUES REDEXCO	ENSAYADO EN :
OBRA:	UT PARQUE REDEXCO BARRANQUILLA	LABORATORIO DE OBRAS
DESCRIPCION :	CONCRETO 3000 PSI	FECHA DE ENTREGA
		jul-24

REF	RESISTENCIA DISEÑO. PSI	DESCRIPCION	FECHA DE FUNDIDA	FECHA DE ENSAYO	EDAD DIAS	RESISTENCIA		
						KN	PSI	%
17	3000	VIGA CIMIENTO T2	18/06/2024	25/06/2024	7	285,00	2345,55	78,2
18						288,00	2370,24	79,0
19				16/07/2024	28	403,00	3316,69	110,6
20						401,20	3301,88	110,1
21	3000	VIGA CIMIENTO T3	21/06/2024	28/06/2024	7	277,50	2283,83	76,1
22						279,10	2296,99	76,6
23				19/07/2024	28	399,20	3285,42	109,5
24						392,10	3226,98	107,6
25	*3000*	PLACA CANCHA	22/06/2024	29/06/2024	7	282,00	2320,86	77,4
26						278,40	2291,23	76,4
27				20/07/2024	28	414,90	3414,63	113,8
28						410,10	3375,12	112,5

BEIMER SANCHEZ A
LABORATORISTA

OBSERVACIONES

Sabado 20 Julio/24 ~~Festivo~~

Dia Nublado

Personal

Actividad No se realiza actividades por ser dia festivo

RESIDENTE DE OBRA

Laboratorio SEOTEC S.A.S.

ENSAYO DE RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE PROBETAS CILÍNDRICAS DE CONCRETO

NORMA I.N.V. E-410

EMPRESA SOLICITANTE:	UNION TEMPORAL PARQUES REDEXCO	ENSAYADO EN :
OBRA:	UT PARQUE REDEXCO BARRANQUILLA	LABORATORIO DE OBRAS
DESCRIPCION :	CONCRETO 3000 PSI	FECHA DE ENTREGA
		jul-24

REF	RESISTENCIA DISEÑO. PSI	DESCRIPCION	FECHA DE FUNDIDA	FECHA DE ENSAYO	EDAD DIAS	RESISTENCIA		
						KN	PSI	%
29	3000	PLACA CANCHA	26/06/2024	03/07/2024	7	277,40	2283,00	76,1
30						281,60	2317,57	77,3
31				24/07/2024	28	0,00	0,00	0,0
32						0,00	0,00	0,0
33	3000	CARCAMO	11/07/2024	18/07/2024	7	288,30	2372,71	79,1
34						285,80	2352,13	78,4
35				08/08/2024	28	0,00	0,00	0,0
36						0,00	0,00	0,0

BEIMER SANCHEZ A
LABORATORISTA

OBSERVACIONES

SEOTEC S.A.S.

ENSAYO DE RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE PROBETAS CILÍNDRICAS DE CONCRETO

NORMA I.N.V. E-410

EMPRESA SOLICITANTE:	UNION TEMPORAL PARQUES REDEXCO	ENSAYADO EN :
OBRA:	UT PARQUE REDEXCO BARRANQUILLA	LABORATORIO DE OBRAS
DESCRIPCION :	CONCRETO 3000 PSI	FECHA DE ENTREGA
		jun-24

REF	RESISTENCIA DISEÑO. PSI	DESCRIPCION	FECHA DE FUNDIDA	FECHA DE ENSAYO	EDAD DIAS	RESISTENCIA		
						KN	PSI	%
13	3000	PLACA CANCHA 6-8	07/06/2024	14/06/2024	7	291,00	2394,93	79,8
14						287,60	2366,95	78,9
15				05/07/2024	28	369,30	3039,34	101,3
16						371,40	3056,62	101,9

BEIMER SANCHEZ A
LABORATORISTA

OBSERVACIONES

Lunes 22 Julio/24
Dia Soleado
Personal Residente de Obra Profesional SSSO, cuadrilla civil
Equipo Mezcladora de concreto, vibrador de concreto,
Actividad: Se continua encofrado para viga de cimentacion de zona de niños, se continua instalación de acero de refuerzo para viga, se inicia fundicion de viga en concreto incluyendo la colocación de unos secciones de tubo para dejar el anclaje donde se instalara el cerramiento correspondiente, Se inicia demolicion de panete en muro colindante con colegio y realizacion de pañete impermeabilizado.

RESIDENTE DE OBRA

Martes 23 Julio/24
Dia Nublado
Personal Residente de obra, Profesional SSSO, cuadrilla civil
Equipo Mezcladora de Concreto, vibrador de concreto
Actividad Compactación de terreno para alistamiento y fundición de viga de cimentación se procede a la instalación del acero figurado y se procede a la fundicion de la viga instalando conjuntos los tubos 4" cada 2.53 para cerramiento de niños, Se prosigue con el mortero pañete en muro impermeabilizado y la demolicion de pañete dañado en muro colindante a Colegio Soma Ahumada.

RESIDENTE DE OBRA
