
23-ABRIL 2024 MARTES

DIA: SOLEADO

PERSONAL: DIRECTOR DE OBRA

ACTIVIDAD: RECIBO FISICO DEL ESPACIO A INTERVENIR.

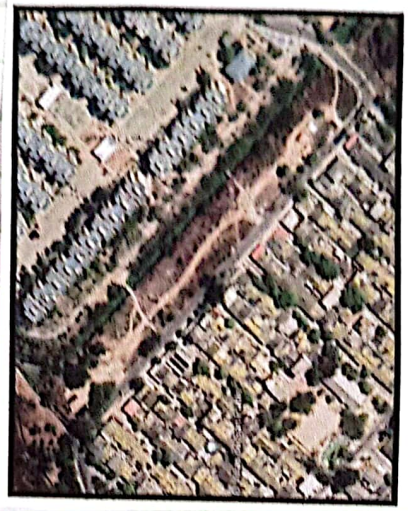

29 ABRIL: LUNES.

DIA: NUBLADO

PERSONAL: CUADRILLA TOPOGRAFICA

EQUIPO: ESTACIÓN TOPOGRAFICA, ESTACAS HERRAMIENTA MENOR

ACTIVIDAD: SE REALIZA TOMA DE NIVELES Y TOPOGRAFIA DEL PARQUE. DESDE LA CALLE 143 CON CARRERA 8 HASTA LA CARRERA 10ª SE REALIZAN MEDIDAS DE CANTIDADES EN OFICINA Y SE REALIZA (AD) LISTADO DE DUDAS PARA HACER SOLICITUD DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS..

ECOPETROL SA.







UBICACIÓN PUNTOS DELTA DE REFERENCIA EN ANDENES PARA TOMAR NIVELES

JUEVES 2 DE MAYO

DIA NUBLADO

PERSONAL: COMISIÓN TOPOGRÁFICA 1 OFICIAL 1 AYUDANTE

EQUIPO: ESTACIÓN TOPOGRÁFICA

ACTIVIDAD: SE REALIZA VERIFICACIÓN Y VISITA DE OBRA PARA TERMINAR LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO / SE CONTINUA EN OFICINA CON. MEMORIAS DE CANTIDADES EN. PLANOS. / SE REALIZA DOCUMENTACIÓN PARA SOCIALIZACIÓN DIA MARTES 7 DE MAYO EN EL SECTOR. CON VECINOS PARA ACTAS DE VECINDAD Y REUNIÓN LUNES 6 DE MAYO PARA SOCIALIZACIÓN Y PRESENTACIÓN PERSONAL A LA COMUNIDAD.

RESIDENTE OBRA

EDUBAR SA.

LUNES 6 DE MAYO

DIA SOLEADO

PERSONAL 1 DIRECTOR DE OBRA, 1 RESIDENTE OBRA, 1 COMUNICADORA SOCIAL. 1 PROFESIONAL SST.

EQUIPO: N/A

ACTIVIDAD: REUNIÓN SOCIALIZACIÓN DE PROYECTO Y PRESENTACIÓN PERSONAL ADMINISTRATIVO DE OBRA. A LA COMUNIDAD.

RESIDENTE OBRA

EDUBAR SA.



MARTES 7 DE MAYO




DIA NUBLADO

PERSONAL 1 DIRECTOR, 1 RESIDENTE, 1 TRABAJADORA SOCIAL

EQUIPO: N/A

ACTIVIDAD: SE DESARROLLA VISITAS DE LAS CASAS O CONSTRUCCIONES AL FRENTE DE LA OBRA PARA REALIZAR ACTAS DE VECINDAD QUEDANDO PENDIENTE LA IGLESIA POR NO ENCONTRARSE NADIE EN ÉSTE DIA.

RESIDENTE OBRA

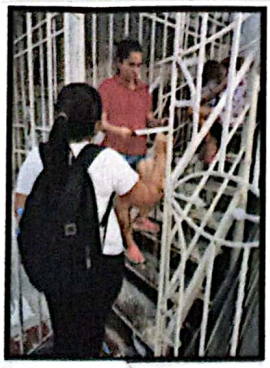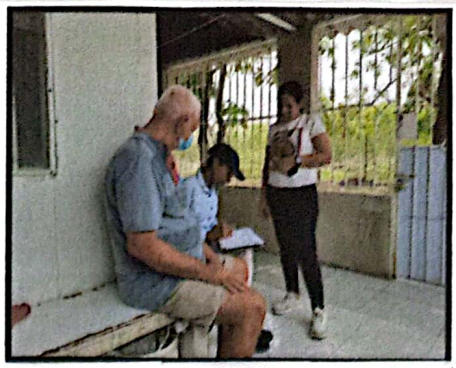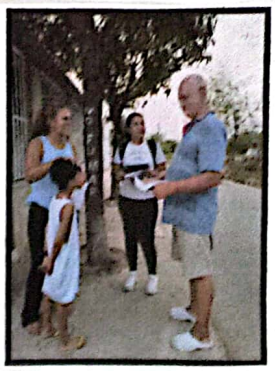MIERCOLES 8 DE MAYO

DIA NUBLADO

PERSONAL 1 DIRECTOR 1 RESIDENTE DE OBRA

EQUIPO: N/A

ACTIVIDAD: SE REALIZA VISITA DE OBRA PARA ENTREVISTAR MAESTROS CONSTRUCTORES PARA CONTRATAR MANO DE OBRA CALIFICADA Y SE BUSCA UN PREDIO O CASA PARA OFICINA Y BODEGA.

EDUBAR SA. RESIDENTE OBRA

JUEVES 9 DE MAYO


DIA LLUVIOSO

PERSONAL 1 RESIDENTE, 1 DIRECTOR DE OBRA


EQUIPO: N/A.


ACTIVIDAD: SE REALIZA VISITA O REUNIÓN PROGRAMADA EN LA ALCALDIA SEPTIMO PISO CON EDUBAR, SUPERVISOR, PARA TOCAR TEMAS RELACIONADOS AL PROYECTO

NIVEL ANDEN Y HUELLA

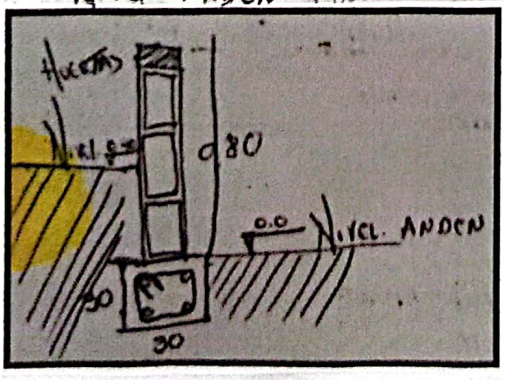

NIVEL BORDILLO

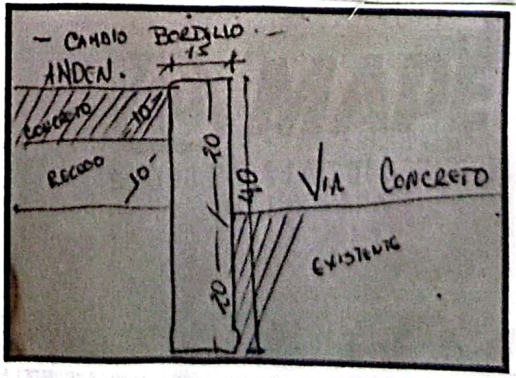

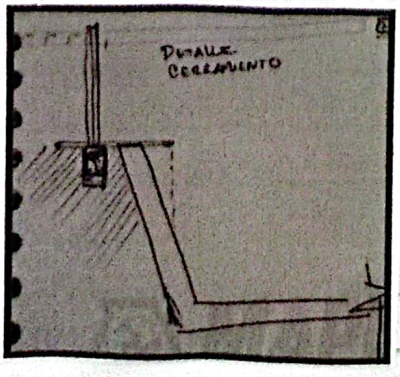

LOCALIZACION CERRAMIENTO A CANAL.

RESIDENTE OBRA

EDUBAR SA.

13 MAYO LUNES FESTIVO
DIA SOLEADO
PERSONAL 1 RESIDENTE, 1 OPERARIO MUNICIPALIDAD.
EQUIPO: BOBCAT
ACTIVIDAD SE DA INICIO CON DESCAPOTE MECANICO Y LIMPIEZA DE BASURA ACTIVIDAD SE GENERA DE 7:00AM A 1:00 PM

RESIDENTE OBRA

EDUBAR SA.

14 MAYO MARTES.
DIA SOLEADO
PERSONAL: 1 RESIDENTE, 1 TRABAJADORA SOCIAL, 1 OPERADOR BOBCAT, 1 [illegible]
EQUIPO: BOBCAT.
ACTIVIDAD: SE CONTINUA CON DESCAPOTE CAPA VEGETAL Y LIMPIEZA DEL PREDIO SE TRABAJO 2:30 HORAS DE BOBCAT. Y SE RETIRA 4 VIAJES DE MATERIAL.

RESIDENTE OBRA

EDUBAR SA.





15 DE MAYO MIERCOLES
DIA NUBLADO
PERSONAL 1 RESIDENTE, 1 DIRECTOR, 1 PERSONA TRABAJADORA SOCIAL, 1 OPERARIO BOBCAT
EQUIPO BOBCAT.
ACTIVIDAD: SE REALIZA LIMPIEZA Y DESCAPOTE EN LA PARTE POSTERIOR DEL PREDIO SOBRE CALLE 29 / SE RECIBE VISITA POR PARTE DE EDUBAR ARQ. JOSÉ HERNÁNDEZ ACOMPAÑADO DE ING AMBIENTAL Y SST. TOMAN REGISTRO CON DRON Y REALIZAN RECOMENDACIONES AMBIENTALES Y SEGURIDAD DEJANDO COMO OBSERVACIÓN NO TALAR 2 ARBOLES REPRESENTATIVOS LOS DEMAS SON MALEZA QUE SE PUEDE LIMPIAR. LLUEVE DOS HORAS EN LA TARDE POR TAL MOTIVO NO SE PUEDE CONTINUAR CON LA ACTIVIDAD.

RESIDENTE OBRA


EDUBAR SA









16 MAYO JUEVES
DIA NUBLADO
PERSONAL 1 RESIDENTE, 1 TRABAJADORA SOCIAL, 1 OPERADOR BOBCAT
1 MAESTRO, 4 AUXILIARES.
EQUIPO: BOBCAT, HERRAMIENTA MENOR
ACTIVIDAD: SE INICIA CON EXCAVACIÓN MECANICA Y SE TERMINA DESCAPOTE SOBRE LA CALLE 143 B SOBRE FRANJA DE 12 MTS PARA PRIORIZAR EJECUCIÓN OBRA DE ANDEN.

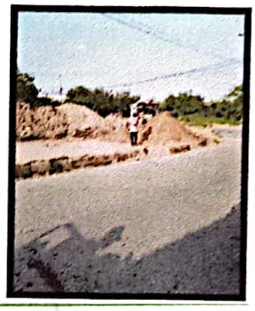

17. MAYO VIERNES
DIA SOLEADO
PERSONAL: 1 RESIDENTE, 1 TRABAJADORA SOCIAL, 1 OPERADOR BOBCAT.
1 MAESTRO, 4 AUXILIARES
EQUIPO BOBCAT Y HERRAMIENTA MENOR
ACTIVIDAD: SE CONTINUA EXCAVACIÓN EN FRENTE DE LA FERRETERIA Y SE CONTINUA CON LA INSTALACIÓN DE MADERA PARA ESTRUCTURA EN CERRAMIENTO COSTADO CANAL SE COMPLETA 80 M/L APROX



18. MAYO SABADO
DIA SOLEADO
PERSONAL 1 RESIDENTE, 1 TRABAJADORA SOCIAL, 1 OPERADOR BOBCAT
1 MAESTRO, 4 AUXILIARES
EQUIPO BOBCAT, HERRAMIENTA MENOR
ACTIVIDAD SE CONTINUA CON INSTALACIÓN ESTRUCTURA EN MADERA PARA CERRAMIENTO Y EXCAVACIÓN MECANICA PARA ANDEN. PROCESO SE REALIZA CORTE DE 0.40 CM DE PROFUNDIDAD

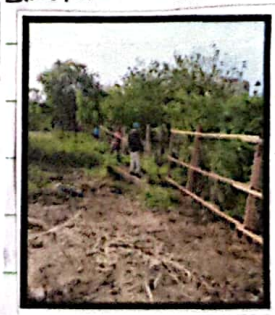19 MAYO DOMINGO

DIA SOLEADO

PERSONAL 1, RESIDENTE, 1 TRABAJADORA SOCIAL, 1 OPERADOR MAQUINA

EQUIPO BOBCAT: HERRAMIENTA MENOR

ACTIVIDAD SE CONTINUA CON UNA EXCAVACIÓN DE APROXIMADAMENTE 150M² EN PROFUNDIDAD DE 0,20 MTS SE TRABAJA DE 7:00AM A 3:00PM EN JORNADA CONTINUA.

[illegible] EDUARDO Y.
[illegible]NDEZ
RESIDENTE OBRA

20 MAYO LUNES

DIA SOLEADO

PERSONAL 1 RESIDENTE 1 TRABAJADORA SOCIAL, 1 OPERADOR MAQUINA 1 OFICIAL 4 AUXIL.

EQUIPO BOB CAT. - VOLQUETAS - HERRAMIENTA MENOR

ACTIVIDAD /SE REALIZA RETIRO DE 20 VIAJES DE VOLQUETAS 160 M3 APROX DE MATERIAL / SE CONTINUA APERTURA DE HUECOS, INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA MADERA PARA CERRAMIENTO E INSTALACIÓN DE TEJA ZINC. PODA DE ARBOLES NO APROVECHABLES Y NO REPRESENTATIVOS (MALEZA).

[illegible] EDUARDO
[illegible]NDEZ
RESIDENTE OBRA






21 MAYO MARTES

DIA LLUVIOSO

PERSONAL 1 RESIDENTE 1 TRABAJADORA SOCIAL, 1 OPERADOR MAQUINARIA BOBCAT 1 OFICIAL 4 AUXILIARES

EQUIPO BOB CAT. - HERRAMIENTA MENOR

ACTIVIDAD: CONTINUA LA EXCAVACIÓN Y NIVELACIÓN MECANICA 30 M3 PARA TOTAL DE 390 M3 DE EXCAVACIÓN. INSTALACIÓN DE MADERA PARA CERRAMIENTO 286 ML. / INSTALACIÓN DE LAMINA DE ZINC. 253 ML. Y PODA DE MALEZA RAMAS Y LIMPIEZA DE BASURA / SE REALIZA TRABAJO EN CONJUNTO CON CLARO PARA TOMAR NIVELES Y TAPAR TUBERIA EXPUESTA POR EXCAVACIÓN SIN NINGÚN CONTRATIEMPO

RESIDENTE DE OBRA [illegible] EDUAR.
[illegible]NDEZ

los NP incluyen el Volumen de Descapote (e=0.25).





22 DE MAYO MIERCOLES

DIA LLUVIOSO

PERSONAL: 1 RESIDENTE. 1 TRABAJADORA SOCIAL. 1 OPERADOR BOBCAT, 1 TRABAJADORA SST, 1 OFICIAL., 4 AUXILIARES.

EQUIPO: BOB. CAT HERRAMIENTA MENOR

ACTIVIDAD: SE CONTINUA EXCAVACIÓN MECANICA SEGUNDA CAPA 20cm ENTRE LA CARRERA 28B-28C. TOTAL 28 M3 APROX. / COLOCACIÓN ARMADO ESTRUCTURA MADERA PARA CERRAMIENTO E INSTALACIÓN TEJA DE ZINC TOTAL 286.39 ML. / SE REALIZA ACTIVIDAD EN CONJUNTO CON LA EMPRESA CLARO PARA CAMBIO DE TUBERIA Y EXCAVACIÓN PARA ENTERRAR TUBERIA EXPUESTA. SE LES INFORMA QUE EL NIVEL DEL ANDEN ESTA SOBRE LA VIA A 20CM Y ELLOS TIENEN CAJA DE INSPECCIÓN SOBRE 50cm SOBRE SALE DEL NIVEL DEL ANDEN., MANIFIESTA QUE SE DEBE PASAR SOLICITUD PARA MODIFICAR NIVEL DE CAJA EXISTENTE. X TAL MOTIVO SE SOCIALIZARA CON INTERVENTORIA PARA NO TENER INCONVENIENTES EN EJECUCIÓN DEL CONTRATO.

RESIDENTE

ECOLSAN SAS

23 DE MAYO JUEVES

DIA SOLEADO

PERSONAL 1 RESIDENTE, 1 TRABAJADORA SOCIAL, 1 OPERADOR BOBCAT, 1 MAESTRO, 4 AUXILIARES DE OBRA

EQUIPO: BOBCAT, HERRAMIENTA MENOR

ACTIVIDAD: RETIRO DE MATERIAL DE EXCAVACIÓN 33 VIAJES DE 8M3 CONTINUACIÓN EXCAVACION Y NIVELACIÓN CON MAQUINARIA h= 60 CMS CONSTRUCCION DE CAMPAMENTO PROVICIONAL PARA FIGURAR ACERO EN OBRA, SE CONTINUA CON PODA DE VEGETACIÓN PARA CONTINUAR LIMPIEZA DEL PREDIO/

RESIDENTE OBRA

ECOLSAN SAS

24 MAYO VIERNES

DIA SOLEADO

PERSONAL 1 RESIDENTE, 1 SEGURIDAD SST, 1 TRABAJADORA SOCIAL, 2 OPERADOR BOBCAT, 1 MAESTRO, 4 AUXILIARES

EQUIPO: BOBCAT HERRAMIENTA MENOR

ACTIVIDAD: SE CONTINUA CON LA EXCAVACIÓN PARA DAR NIVEL CON LA VIA Y SE REALIZA RETIRO DE MATERIAL EXCAVACIÓN SE EVIDENTE CAJA DE INSPECCIÓN PARA AGUA POTABLE SE REALIZARA CERRAMIENTO PARA QUE LA CAJA QUED POR DENTRO DEL CERRAMIENTO DEMOLICIÓN DE BORDILLO ENTERRADO.





25 MAYO SABADO

DIA SOLEADO

PERSONAL 1 RESIDENTE, 1 TRABAJADORA SOCIAL, 1 MAESTRO, 2 OPERADOS MAQUINARIA BOBCAT, 1 MAESTRO 4 AUXILIARES

EQUIPO 2 BOB CAT. HERRAMIENTA MENOR

ACTIVIDAD: CONTINUA DEMOLICIÓN DE BORDILLO Y EXCAVACIÓN DE TIERRA CON MAQUINA SE EVIDENCIA QUE NO HAY TUBERIA QUE AFECTE POR TAL MOTIVO SE CONTINUA EXCAVACIÓN CON LOS NIVELES ACORDADOS DE TRABAJO HASTA LAS 3:00 PM.






27 MAYO LUNES

DIA SOLEADO

PERSONAL: 1 RESIDENTE 1 DIRECTOR - 1 TRABAJADORA SOCIAL, 2 OPERADORES BOBCAT 1 MAESTRO 4 AUXILIARES

EQUIPO 2 BOBCAT / HERRAMIENTA MENOR

ACTIVIDAD: SE CONTINUA CON EXCAVACIÓN MECANICA Y SE ENCUENTRA PLACA EN CONCRETO DE 3.10 X 3.00 X 0,15 SE TOMAN MEDIDAS CON INTERVENTORIA ARQ JOSE HERNÁNDEZ Y ARQ EILIN Y AUTORIZAN DEMOLICIÓN Y QUE EN MENORIAS SE UBIQUE TODAS LAS DEMOLICIONES DE PLACAS EXISTENTES EN OBRA. / SE INICIA EXCAVACIÓN MANUAL AL INICIO DE OBRA ANCHO 15 CM Y PROFUNDIDAD DE 20 CM. PARA CONFORMACIÓN DE BORDILLO SE LE INFORMA A INTERVENTORIA SOBRE EL LUGAR DE INVASIÓN MANIFIESTO QUE EN EL COMITE DE MAÑANA TOCAMOS EL TEMA PARA DAR SOLUCIÓN. / LLEGA CANECA DE ANTISOL ROJO PARA PROTECCION DEL CONCRETO. / SE INICIA CORTE Y FIGURACION DE FLEJES PARA BORDILLO

RESIDENTE OBRA — E. EMMARSA.

28 MAYO MARTES

DIA SOLEADO


PERSONAL. 1 RESIDENTE, 1 DIRECTOR, 1 TRABAJADORA SOCIAL, 2 OPERADORES BOBCAT; 1 MAESTRO, 4 OFICIALES.

EQUIPO: 2 BOBCAT, HERRAMIENTA MENOR.

ACTIVIDAD: SE CONTINUA NIVELACIÓN Y DESCAPOTE SE HACE CORTE CAPA VEGETAL Y SE REALIZA ACOPIO DE RAMAS Y PASTO SE REALIZA CORTE DE VARILLA Y SE FIGURA HIERRO Y ARMADO DE VIGA PARA BORDILLO / VISITA DE OBRA POR PARTE DE INTERVENTORIA SE EVIDENCIA LA CANTIDAD DE MATERIAL QUE NO SE PUEDE CUANTIFICAR X EXCAVACIÓN PARA RECIBIR LA CUBICACIÓN SE REALIZARA POR VIAJES RETIRADOS DE 8 X 3. / SE REALIZA EXCAVACIÓN MANUAL PARA BORDILLO / DEMOLICIÓN DE BORDILLO EXISTENTE.

RESIDENTE OBRA — E. EMMARSA.

29 MAYO MIERCOLES:
DIA SOLEADO
PERSONAL 1 DIRECTOR, 1 RESIDENTE 1 TRABAJADORA SOCIAL, 1 MAESTRO, 4 AUXILIARES
& OPERARIOS BOBCAT
HERRAMIENTA: 2 BOBCAT HERRAMIENTA MANOR.
ACTIVIDAD: SE CONTINUA CON DESCAPOTE Y NIVELACIÓN PARTE HUERTAS.
SE RECIBE VISITA DE OBRA DE LA ALCALDIA LA ARQ CATALINA
Y LA ING GILIN [illegible] DE INTERVENTORIA GOUCAR.
SE TOMAN TENAS DE INVASIÓN DE 2 FAMILIAS EN EL PREDIO
CAJAS DE TIGO-CLARO PARA BAJO NIVEL
DISEÑO DE PUENTE / PODA ARBOLES Y MALEZA PARA RETIRO
DISEÑO DE CANAL DE ESCORRENTIA / ROCAMIX / DETALLE SUELO O PLACA
DE TANQUES TENAS QUE NOS DARAN RESPUESTA LA PROXIMA SEMANA.
[illegible]
RESIDENTE OBRA

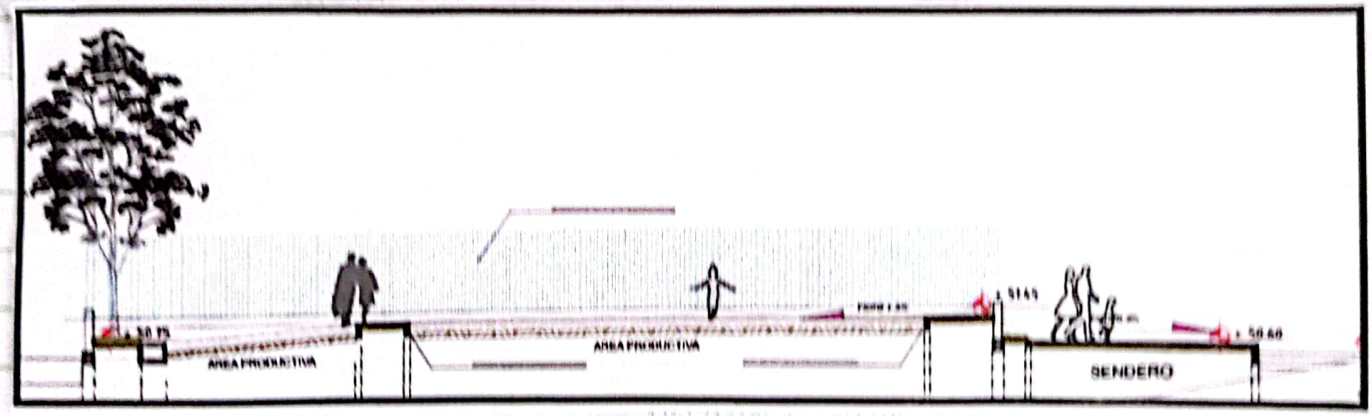


30 MAYO JUEVES
DIA NUBLADO
PERSONAL: 1 DIRECTOR OBRA, 1 RESIDENTE, 1 TRABAJADORA SOCIAL, 2
OPERADORES BOBCAT, 1 MAESTRO, 4 AUXILIARES
EQUIPO 2 MINICARGADOR BOBCAT / HERRAMIENTA MENOR
ACTIVIDAD SE CONTINUA NIVELACIÓN PARA ESPACIO HUERTA SECCIÓN 18 mts.
X 10 ANCHO DEL LOTE. SE RETIRA ARENA PERTENECIENTE A
LA PERRETERIA / SE REALIZA AMARRE Y FIGURADO DE VARILLA
DE 1/4" / SE PASAN NIVELES PARA TENER CONTROLADO
EL CORTE CON LA MAQUINA Y SE CONTINUA CON EXCAVACIÓN

MANUAL PARA BORDILLO TOTAL 120ML DE 20 CM DE PROFUNDIDAD X 15 DE ANCHO

RESIDENTE OBRA

FOTO

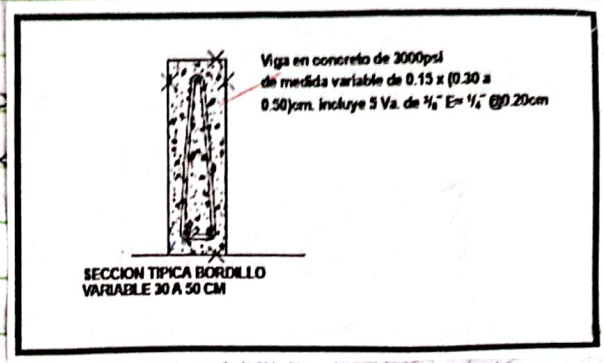

31-05-24 VIERNES

DIA LLUVIOSO

PERSONAL 1 RESIDENTE, 1 DIRECTOR, 1 TRABAJADORA SOCIAL., 2 OPERARIOS BOBCAT., 1 MAESTRO, 4 AUXILIARES

EQUIPO: 2 BOBCAT / HERRAMIENTA MAYOR MENOR.

ACTIVIDAD S= REALIZA ARREGLO DE ARBOLES EXISTENTES X PODA EVITAR CAIDA POR DISMINUCIÓN DE TIERRA EN RAICES / SE CONTINUA CORTE TERRENO 9,10 MTS X 20 = 182,0 M² / FIGURADO Y AMARRE PARA BORDILLO / EXCAVACIÓN MANUAL PARA BORDILLO 18ML. LA LLUVIA NO DEJÓ AVANZAR ACTIVIDADES PLANEADAS.

RESIDENTE OBRA

01-06-24 SABADO

DIA SOLEADO

PERSONAL 1 RESIDENTE, 1 TRABAJADORA SOCIAL, 2 OPERADORES MAQUINA, 1 MAESTRO, 4 AUXILIARES DE OBRA

EQUIPO: 2 BOBCAT; HERRAMIENTA MENOR.

ACTIVIDAD: SE CONTINUA EXCAVACIÓN MANUAL. PARA BORDILLO Y NIVELACIÓN CON MAQUINA CON 36.40 M². TRECIENTOS SESENTA Y CUATRO M². FRENTE OFICINA- BODEGA REDEXCO QUEDA PENDIENTE EL AREA DEL CAMPAMENTO PROVISIONAL.

03-06-24 LUNES

DIA SOLEADO

PERSONAL 1 RESIDENTE, 1 OPERADOR BOBCAT.

EQUIPO 1 MINICARGADOR BOBCAT

ACTIVIDAD: SE CONTINUA NIVELACIÓN Y DESCAPOTE SE LLEGA HASTA DESCOLE AREA 654 M².

04-05-2024 MARTES

DIA SOLEADO / LLUVIA HORAS DE LA MAÑANA

PERSONAL: 1 RESIDENTE OBRA, 1 TRABAJADORA SOCIAL, 1 OPERADOR BOBCAT. 1 MAESTRO, 4 AUXILIARES

EQUIPO: 1 BOBCAT / HERRAMIENTA MENOR.

ACTIVIDAD: SE REALIZA NIVELES EN ESPACIO DONDE EXISTE INVASIÓN Y SE PROCEDE A LIMPIEZA CORTE Y EXCAVACIÓN A LOS COSTADOS DE LA INVASIÓN, SE REALIZA MANUALMENTE EXCAVACIÓN PARA EXPONER TUBERIA DE CLARO Y TIGO SE REALIZARA EXCAVACIÓN PARA PROFUNDIZARLA. Y TAPARLA CON ARENA PARA FACIL EXCAVACIÓN A FUTURO / SE REALIZA EXCAVACIÓN PARA BORDILLO DE FORMA MANUAL / SE CONTINUA AMARRANDO ESTRUCTURA PARA BORDILLO TOTAL 42 UNIDADES 248 ML. SIN TRASLADO SE REALIZAN BALIZAS DE SENALIZACIÓN PAR SU INSTALACIÓN EN COSTADO VIA

RESIDENTE OBRA

05-06-2024 MIERCOLES

DIA SOLEADO

PERSONAL: 1 RESIDENTE OBRA, 1 TRABAJADORA SOCIAL, 1 OPERADOR BOBCAT. 1 MAESTRO OBRA, 4 AUXILIARES

EQUIPO: 1 BOBCAT S185 / HERRAMIENTA MENOR

ACTIVIDAD: SE REALIZA EXCAVACIÓN Y LOS ARBOLES SE INCLINARON AL DESCUBRIR LA BASE EN VISITA CON INTERVENTORIA SE DECIDIO QUE PARA EVITAR RIESGO DE CAIDA Y PELIGRO PARA TRANSEUNTES ES PERTINENTE RETIRARLOS / SE CONTINUA EXCAVACIÓN MANUAL ULTIMO TRAMO Y SE REALIZA EXCAVACIÓN Y TAPAR TUBERIA DE RED TIGO-CLARO INTERNET. INTERVENTORIA SOLICITA SI ES POSIBLE QUITAR LOS TRONCOS QUE ESTAN PARALELOS AL CERRAMIENTO YA QUE GENERAN INCONVENIENTES PARA EL DESARROLLO DEL MISMO Y DE LA CUNETA NUEVA. SE REALIZA / LLEGA 24 BULTOS DE 15x20 FALTA REFORZAMIENTO

RESIDENTE OBRA

06-06-2024 JUEVES

DIA LLUVIOSO

PERSONAL: 1 RESIDENTE OBRA, 1 TRABAJADORA SOCIAL. 1 OPERADOR DE BOBCAT, 1 MAESTRO, 4 AUXILIARES

EQUIPO: BOBCAT, HERRAMIENTA MENOR

ACTIVIDAD: EN LAS HORAS DE LA MAÑANA POR MOTIVO DE TORMENTA ELECTRICA NO SE PUDO EJECUTAR ACTIVIDADES DE TERRENO SE REALIZA AMARRE Y CORTE VARILLA PARA FIELES. EN HORAS DE LA TARDE SE INICIA CON CARGUE DE MATERIAL PROVENIENTE EXCAVACIÓN SE RETIRAN 12 VIAJES Y SE REALIZA ARMADO DE RIELES PARA CONSTRUCCIÓN DE BORDILLO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA EN VARILLA DE 3/8" Y FIELES DE 1/4" SEGÚN DISEÑO

RESIDENTE OBRA

EDUBAR SA.

07-06-2024 VIERNES

DIA LLUVIOSO

PERSONAL: 1 RESIDENTE OBRA, 1 TRABAJADORA SOCIAL, 1 MAESTRO, 4 AUXILIARES. 1 OPERADOR

EQUIPO HERRAMIENTA MENOR / BOBCAT.

ACTIVIDAD: SE REALIZA EXCAVACIÓN Y NIVELACIÓN EN PUNTOS ALTOS PARA REALIZAR PERFILACIÓN TERRENO, SE REALIZA ENCOFRADO Y FUNDIDA DE 24 ML DE BORDILLO CON ALTURA VARIABLE PARA DAR INICIO A ESTA ACTIVIDAD SE APLICA ANTISOL PARA MEJORAR EL FRAGUADO Y SE TERMINA INICIA REFORZAMIENTO DE PERFILES. METALICOS. Altura de bordillo = 0,40 mts

RESIDENTE OBRA

EDUBAR SA.

08-06-2024 SABADO

DIA SOLEADO

PERSONAL 1 RESIDENTE OBRA, 1 TRABAJADORA SOCIAL, 1 MAESTRO, 4 AUXILIARES

EQUIPO HERRAMIENTA MENOR

ACTIVIDAD SE REALIZA DESENCOFRADO Y AFINADO DE BORDILLO PARA DAR MEJOR TERMINADO / SE REALIZA CERRAMIENTO EN TEJA ZINC INCLUYE ESTRUCTURA METÁLICA SE CONTINUA REFUERZO MENTO DE ESTRUCTURA SIN RETRAZOS. ACTIVIDADES, CERRAMIENTO 24 ML

RESIDENTE OBRA

EDUBAR SA.

11-06-24 MARTES
DIA: SOLEADO
PERSONAL: 1 RESIDENTE, 1 MAESTRO, 7 AUXILIARES
EQUIPO HERRAMIENTA MENOR
ACTIVIDAD: SE INICIA LA JAIRO CON PROBLEMAS DE MOVILIDAD POR PARO DE TAXISTAS EN LA CIUDAD CON BLOQUEOS EN TODA LA CIUDAD.— SE REALIZA ENCOFRADO AMARRE Y FUNDIDA DE 24ML DE BORDILLO (VIGA VARIABLE) PROTEGIDO CON ARENA.

DANIADEL
RESIDENTE OBRA

12-06-24 MIERCOLES
DIA SOLEADO
PERSONAL: 1 RESIDENTE, 1 MAESTRO, 5 AUXILIARES, 1 PERSONA SST.
EQUIPO: HERRAMIENTA MENOR
ACTIVIDAD: SE CONTINUA CON OTRO TRAMO DE VIGA VARIABLE / DESENCOFRADO, LIMPIEZA FORMALETA, INSTALACIÓN AMARRE DE ACERO DE REFUERZO, FUNDIDA DE VIGA Y CORRAMIENTO 24 ML. VISITA DE OBRA DE SST TIZIANA PARA APOYAR CON LA PARTE DE SEGURIDAD APOYANDOSE CON ANDREINA TRABAJADORA SOCIAL PARA DESARROLLAR TODAS SUS ACTIVIDADES

DANIADEL
RESIDENTE OBRA

13-06-24 JUEVES
DIA SOLEADO.
PERSONAL: 1 RESIDENTE, 1 TRABAJADORA SOCIAL, 1 MAESTRO, 5 AUXILIARES
EQUIPO HERRAMIENTA MENOR
ACTIVIDAD: En virtud del cumplimiento de las clausulas estipuladas en el contrato, se solicita la presencia y permanencia de la profesional SST en la obra. Esto no es solo un requerimiento para el cumplimiento de la normativa legal vigente, sino también un pilar fundamental para garantizar la seguridad y el bienestar de todos los trabajadores de la obra.
Si se cuenta con dos obras activas en el proyecto la SST debe estar entre frentes y mantener la vigilancia

dirigir de la implementación del SG-SST.

Sandra Montes.
SST EDUBAR S.A.

SE CONTINUA CON LAS ACTIVIDADES DE FORMALETA, AMARRE Y FUNDIDA DE VIGA PARA BORDILLO CON AVANCE DE 16 MTS EN EL ACCESO CALLE 28 Y 5 MTS ENTRE CALLE 28-B - 28c. EDWIN HEDEZ RESIDENTE OBRA

14-06-24 VIERNES
DIA SOLEADO
PERSONAL: 1 RESIDENTE, 1 PROFESIONAL SST, 1 TRABAJADORA SOCIAL. 1 MAESTRO, 5 AUXILIARES
EQUIPO HERRAMIENTA MENOR
ACTIVIDAD: SE DESENCOFRO SE HACE LIMPIEZA Y SE CONTINUA ARMANDO HASTA LA HORA. SE TIENE 96 M/L DE VIGA SE CONTINUA LA ACTIVIDAD PARA FUNDIR. DESDE LA 1 PM. / SIENDO LAS 3 PM SE TERMINA FUNDIDA DE VIGA POR MOTIVO DE LLUVIA SE DEJA FUNDIDO 12 ML. APROX. SE REIQYARA MAÑANA SABADO HEDEZ RESIDENTE OBRA EDUBAR SA

15-06-24 SABADO
DIA LLUVIOSO
PERSONAL: 1 RESIDENTE OBRA
EQUIPO —
ACTIVIDAD: POR MOTIVO DE LLUVIA NO LLEGA EL PERSONAL A TRABAJAR POR TAL RAZÓN NO SE EJECUTA ACTIVIDADES. / SIENDO LAS 11 AM LLEGAN 2 AUXILIARES PARA RECOGER FORMALETA POR SEGURIDAD NO DEJARLA EN LA VIA. HEDEZ. RESIDENTE OBRA EDUBAR SA

16-06-24 DOMINGO DIA NO LABORAL.

17-06-24 LUNES
DIA NUBLADO
PERSONAL: 1 RESIDENTE, 1 TRABAJADORA SOCIAL, 1 PROFESIONAL SST. 1 MAESTRO, 2 AUXILIARES
EQUIPO: HERRAMIENTA MENOR
ACTIVIDAD: POR LLEGAR TAN POCO PERSONAL SE REALIZA AMARRE DE ACERO TOTAL 12 VIGAS 72 ML. Y SE REALIZA LIMPIEZA DE FORMALETA. Y ALISTAMIENTO DE PERFILES.
RESIDENTE OBRA

18-06-24 MARTES.
DIA NUBLADO
PERSONAL 1 RESIDENTE, 1 TRABAJADORA SOCIAL, 1 PROFESIONAL SST 1 MAESTRO, 5 AUXILIARES
EQUIPO: HERRAMIENTA MENOR, MEZCLADORA GASOLINA
ACTIVIDAD: SE FORMALETEA 48.50 ML DE VIGA CON ALTURA VARIABLE PARA FUNDIR / SE REALIZA CONCRETO Y SE FUNDE LA TOTALIDAD DE VIGA W8.50 ML.
RESIDENTE


19-06-24 MIERCOLES
DIA NUBLADO
PERSONAL. 1 RESIDENTE, 1 TRABAJADORA SOCIAL, 1 PROFESIONAL SST. 1 MAESTRO, 5 AUXILIARES
EQUIPO: MEZCLADORA GASOLINA / HERRAMIENTA MENOR
ACTIVIDAD: SE CONTINUA ACTIVIDAD DE VIGA CON ALTURA VARIABLE PARA BORDILLO Y CERRAMIENTO TEJA ZINC, LLEGA 100 BULTOS DE CEMENTO Y MADERA PARA TERMINAL CERRAMIENTO / SE REALIZA CORTE DE OBRA MARIO CERVANTES. Y 3 Y/H EQUIPOS PARA QUINCENA
RESIDENTE.

20-06-24 JUEVES
DIA SOLEADO
PERSONAL 1 RESIDENTE, 1 TRABAJADORA SOCIAL, 1 PROFESIONAL SST 1 MAESTRO, 5 AUXILIARES
EQUIPO HERRAMIENTA MENOR, MEZCLADORA A GASOLINA
ACTIVIDAD: SE DESENCOFRA CURVA Y SE INICIA CERRAMIENTO

CONTINUA CON VIGA PARA BORDILLO.
ENTREGA FUNDACION SD DOMINGO


21-06-24 VIERNES.
DIA NUBLADO
PERSONAL 1 RESIDENTE, 1 TRABAJADORA SOCIAL, 1 PROFESIONAL SST. 1 MAESTRO. 1 OFICIAL., SALVAMENTOS.
EQUIPO MEZCLADORA A GASOLINA Y HERRAMIENTA MENOR
ACTIVIDAD: SE CONTINUA FORMALETA INSTALACION, ARMADO DE VIGA. Y CONCRETO 3.000 PSI PARA VIGA DE ANDEN ALTURA VARIABLE / SE CONTINUA CON CERRAMIENTO TEJA DE ZINC. SE ORGANIZA BODEGA PARA ESPERAR ACERO DE REFUERZO. SE ENTREGA DETALLE AL MAESTRO SOBRE INGRESOS PEATONALES Y ACCESO VIA.

Modificar

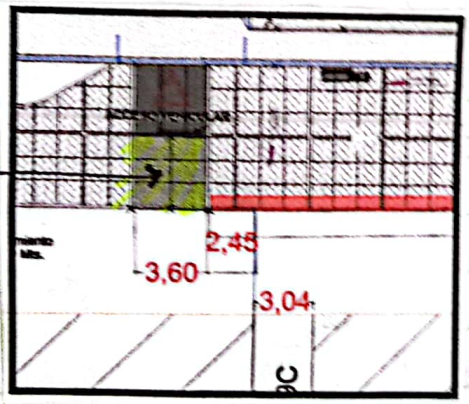

Plano Actual

REALIZANDO ANALISIS DE PROPUESTA NO ES VIABLE ESTE DETALLE SE MODIFICARA PARA DAR CONTINUIDAD AL ANDEN PEATONAL Y QUE FUNCIONE PARA POR ALTURA O CAMBIO NIVELES.

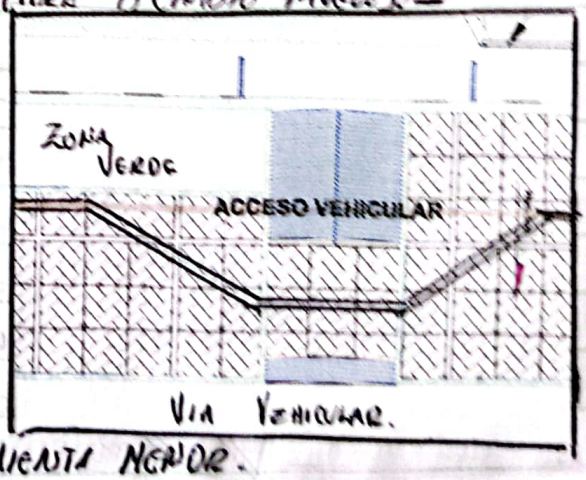

22-06-24 SABADO
DIA SOLEADO.
PERSONAL: 1 RESIDENTE
E
EQUIPO: MEZCLADORA A GASOLINA, HERRAMIENTA MENOR.
ACTIVIDAD: SE REALIZA DESENCOFRADO PARA ARREGLO BORDILLO Y SE CONTINUA CON CERRAMIENTO EN TEJA DE ZINC SE ORGANIZA TODA LA OBRA Y SE DEJAN LISTA LA FORMALETA PARA TERMINAR EL DIA LUNES DE FUNDIR.


RESIDENTE OBRA

23-06-24 DOMINGO
DIA NO LABORAL.

24-06-24 LUNES
DIA NUBLADO
PERSONAL 1 RESIDENTE 1 SST, 1 TS, 1 MAESTRO, 1 OFICIAL 5 AUXILIARES
EQUIPO MEZCLADORA A GASOLINA HERRAMIENTA MENOR
ACTIVIDAD: Se ha identificado una condición de riesgo en la cuneta a causa del cerramiento, se deben implementar las medidas necesarias para reducir el riesgo a la ocurrencia de un accidente de tráfico.
Se solicita la señalización adecuada reglamentaria, además el permiso de cargue y descargue realizado sobre la vía pública. Se recomienda por parte de la interventoría realizar el descargue de material dentro de la obra y así garantizar la seguridad de todos en general.

Sander Martínez.
SST EDUBAR SA

SE REALIZA VISITA EN SITIO Y SE DEFINE QUE PARA DAR PRONTA SOLUCIÓN SE REALICE UN CAMBIO Y RETROCESO DEL CERRAMIENTO

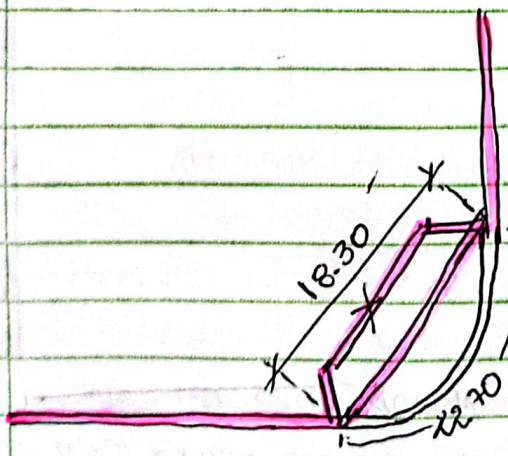

PARA AUMENTAR EL RANGO DE VISUAL SE REALIZA CHAFLAN EN LA CURVA
SE REALIZA PROPUESTA RESALTADA PARA REALIZAR ADECUACIÓN EN LA ESQUINA

SE CONTINUA CON BORDILLO 28 M/L Y CERRAMIENTO TEMPORAL DE ZINC

RESIDENTE DE OBRA — EDUBAR SA

25-06-24 Martes
DIA SOLEADO
PERSONAL: 1 RESIDENTE, 1 TS., 1 PSST, 1 MAESTRO, 1 OFICIAL, 5 AUX.
EQUIPO MEZCLADORA A GASOLINA, HERRAMIENTA MENOR
ACTIVIDAD: SE REALIZA ARREGLO DE TERRAMIENTO TEJA DE ZINC EN ESQUINA POR MOTIVO DE SEGURIDAD VIAL. SE REALIZARÁ COBRO DEL MISMO SEGÚN INTERVENTORIA YA QUE SE REALIZA CAMBIO ~~ZINC~~ POR NECESIDAD. DE DISMINUIR RIESGO DE ACCIDENTE VIAL PARA AUMENTAR VISUAL EN ESQUINA SE CONTINUA BORDILLO Y CERRAMIENTO EN ZINC. SE CONSULTA CON SANDRA MARTINEZ SOBRE SUMINISTRO DE BOTAS PANTANERAS QUE SI TIENEN QUE TENER PUNTERA ELLA MANIFIESTA QUE NO HAY NECESIDAD YA QUE SE UTILIZA PARA SOLO MEZCLAR Y EN MOMENTOS QUE EL SUELO ESTE MOJADO POR TAL MOTIVO NO SE SUMINISTRAN BOTAS PARA PERSONAL.

RESIDENTE OBRA

26-06-24 MIERCOLES
DIA NUBLADO
PERSONAL. 1 RESIDENTE, 1 TS, 1 PSST, 1 MAESTRO, 1 OFICIAL, 5 AUXILIARES
EQUIPO MEZCLADORA A GASOLINA / HERRAMIENTA MENOR
ACTIVIDAD: CERRAMIENTO ZINC / AMARRE Y FIGURADO DE ACERO DE 3/8 CON PIES DE 20x20 PARA VIGA CIMENTACIÓN DE 30x30 DESENCOFRE DE VIGA BORDILLO Y ARREGLO DE ESQUINA. SUR CON TEJA DE ZINC. SE ENVIA LOCALIZACION DE POSTES PARA EL ARQ. EDGAR. DE LA ALCALDIA PARA ACTUALIZAR DISEÑO / SE IMPRIME PLANO GRAL DE PROYECTO Y SE PEGA PARED OFICINA (BODEGA). PARA REALIZAR SEGUIMIENTO

RESIDENTE OBRA

27-06-24 JUEVES.
DIA SOLEADO
PERSONAL. 1 RESIDENTE, 1 TS. (GERENCIADORA SOCIAL) 1 PSST (PROFESIONAL. SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO) 1 MAESTRO, 1 OFICIAL, 5 AUXILIARES
EQUIPO: MEZCLADORA A GASOLINA 1 HERRAMIENTA MENOR

ACTIVIDAD: SE REALIZA CORTE DE VALVULA 3/8 DE 90cm PARA PIEZAS DE ACERO VIGA DE CIMENTACIÓN Y FIGURADO DE LOS MISMOS EXCAVACIÓN VIGA 30x30 Y EXCAVACIÓN ACCESO RAMPA COLOCADO SOLE SOLIENTAL SE HACE EXCAVACIÓN SE ACERCA REALIZAR VIGA ALTURA VARIABLE PARA CONFINAMIENTO RAMPAS DE ACCESO CON ARQ. JOSÉ HERNÁNDEZ DE INTEGRALTOLVA. ——

[illegible]

[illegible]
ING. RAS 505
RESIDENTE.

28-05-24 VIERNES
DIA NUBLADO
PERSONAL: 1 RESIDENTE, 1 SST, 1 TS, 1 MAESTRO, 5 AYUDANTES
EQUIPO MEZCLADORA A GASOLINA — HERRAMIENTA MENOR.
ACTIVIDAD: En el frente se excavación de Viga Cimentación frente a Campo apareció Viga Cimiento de L=8.60 mT x 0.30 x A=0.45, lo cual se requirió hacer la demolición de la misma. [illegible] SE CONTINUA EXCAVACIÓN Y FIGURACIÓN PARA VIGA SE DEJA ENCOFRADO PARA FUNDIR EL DIA SABADO Y SE INSTALA ESTRUCTURA MADERA PARA CERRAMIENTO [illegible]
RESIDENTE OBRA

29-05-24 SABADO
DIA SOLEADO
PERSONAL: 1 RESIDENTE; 1 SST 1, TS, 1 MAESTRO 5 AUXILIARES
EQUIPO MEZCLADORA A GASOLINA - HERRAMIENTA MENOR
ACTIVIDAD: SE REALIZA VIGA DE 30x30 13 ML CON PENDIENTE 1.2% CON RESPECTO AL BORDILLO SE RECIBEN 80 UNIDAS DE CONC PARA TERMINAR BORDILLO Y CERRAMIENTO [illegible] ——
[illegible]
RESIDENTE OBRA

30-05-24 DOMINGO DIA NO LABORAL.

01-06-24 LUNES FESTIVO
DIA SOLEADO
PERSONAL: 1 RESIDENTE, 1 MAESTRO, 5 AUXILIARES
EQUIPO: HERRAMIENTA MENOR

ACTIVIDAD: SE REALIZA CIERRE EN TEJA ZINC Y EXCAVACIÓN PARA VIGA DE 30x30 ML. 50 ML., FIGURADO Y AMARRE 36 ML SE ALISTA PARA FUNDIR DIA MARTES. EDGAR RESIDENTE OBRA

EDUVIAR SA.

02-07-24 MARTES.

DIA LLUVIOSO

PERSONAL: 1 RESIDENTE, 1 SST, 1 TS. 1 MAESTRO, 5 AUXILIARES.

ACTIVIDAD: SE INICIA A FUNDIR VIGA DE 30x30 SE REALIZO 8 ML. Y SE POSO A LLOVER HACIENDO PARAR LA ACTIVIDAD. SE TERMINA DE FUNDIR 24 ML DE VIGA SE LLAMA AL ING JOSE GOMEZ PARA CORDINAR DISEÑO DE ILUMINACIÓN PARA LA OBRA Y MANIFIESTA QUE NO TIENE PLANOS DEL LA OBRA POR TAL MOTIVO NO HAY DISEÑO QUE YA VA A SOLICITAR DISEÑO PARA INICIAR A CORDINAR./ SE LLAMA AL ARQ EDGAR MEJIA DE ADI PARA PREGUNTAR SOBRE ACTUALIZACIÓN DE PLANOS Y MANIFESTÓ QUE VA A TRABAJAR EN ELLO PARA PASAR PROPUESTA. EDGAR RESIDENTE OBRA

EDUVIAR SA.

03-07-24 MIERCOLES

DIA NUBLADO

PERSONAL: 1 RESIDENTE 1 SST, 1 TS, 1 MAESTRO, 5 AUXILIARES.

ACTIVIDAD: HERRAMIENTA MENOR / MEZCLADORA A GASOLINA

EQUIPO: SE REALIZA EXCAVACIÓN MANUAL. PARA VIGA DE CIMENTACIÓN DE 30x30 Y SE PROGRAMA HACER PUERTAS DE ACCESO SE REALIZO 28 ML. DE EXCAVACIÓN Y SE INICIA A FIGURAR Y AMARRAR EDGAR RESIDENTE

EDUVIAR SA.

04-07-24 JUEVES

DIA NUBLADO

PERSONAL: 1 RESIDENTE, 1 SST, 1 TS, 1 MAESTRO 5 AUXILIARES

EQUIPO MEZCLADORA A GASOLINA HERRAMIENTA MENOR.

ACTIVIDAD. SE REALIZA FUNDIDA DE VIGA TOTAL 58 ML. SE COMPLETA LA LLUVIA NO DEJA CONTINUAR CON EL TRABAJO SE REALIZA CORTES DE VARILLA PARA SEGUIR FIGURANDO EDGAR RESIDENTE

EDUVIAR SA.

05-07-24 VIERNES
DIA LLUVIOSO
PERSONAL 1 RESIDENTE 1 SST, 1 TS, 1 MAESTRO, 6 AUXILIARES
EQUIPO
ACTIVIDAD AMANECE LLOVIENDO SE REALIZA JORNADA DE FIGURADO Y AMARRE LLUEVE TODA LA MAÑANA Y PARTE DE LA TARDE [illegible].

06-07-24 SABADO
DIA SOLEADO
PERSONAL 1 RESIDENTE, 1 SST, 1 TS, 1 MAESTRO, 6 AUXILIARES
EQUIPO
ACTIVIDAD: EXCAVACIÓN PARA VIGA 30X30 25ML APROXIMADAMENTE. NIVELACIÓN DE ACCESO PEATONAL PARA VIVIENDA DE MAYORDOMO. [illegible]

07-07-24 DOMINGO
DIA NO LABORAL. [illegible]

08-07-24 LUNES.
DIA NUBLADO
PERSONAL 1 RESIDENTE, 1 SST, 1 TS, 1 MAESTRO, 7 AUXILIARES
EQUIPO MEZCLADORA DE GASOLINA Y HERRAMIENTA MENOR.
ACTIVIDAD SE REALIZA CONCRETO DE VIGA 30/30 FORMALETA, FUNDIDA DE 28KG/CM INSTALACIÓN DE VARILLA DE MEDIA SEGÚN ESPECIFICACIÓN DADA POR INTERVENTORIA Y GRAPAS DE 15x20 CMS EXCAVACIÓN PARA VIGA. Y RETROLLENADO PUERTA ENTRADA VOLQUETAS. SE RECIBE DINERO PAGO POR PARTE DE ARQ EDGAR MESA

09-07-24 MARTES
DIA SOLEADO
PERSONAL 1 RESIDENTE, 1 SST, 1 TS 1 MAESTRO, 7 AUXILIARES 1 DIRECTOR OBRA
EQUIPO MEZCLADORA Y HERRAMIENTA MENOR
ACTIVIDAD: SE REALIZA CONCRETO VIGA 30/30 SE FORMALETA

Y SE REALIZA EXCAVACION PARA VIGA EN PARTE POSTERIOR HACIENDO LIMPIEZA CON MACHETE EN MALEZA QUE ABUNDA / SE ENCUENTRA DESTAPONADO Y LIMPIEZA FORMALETA

10.07.24 MIERCOLES
DIA SOLEADO
PERSONAL 1 RESIDENTE, 1 SSI, 1 TS, 1 MAESTRO, 7 AUXILIARES 1 DIRECTOR
EQUIPO: 1 MEZCLADORA GASOLINA, HERRAMIENTA MENOR
ACTIVIDAD: SE REALIZA LIMPIEZA DE VEGETACION EXCAVACIÓN MANUAL PARA VIGA 30x30 TOTAL 50 ML SOBRE CANAL DE AGUAS / SE INSTALA FORMALETA EN 36 ML PARA DEJAR LISTO FUNDIDA DE VIGA SE REALIZA FIGUEADO Y ANILLO DE ACERO.

11.07.24 JUEVES
DIA SOLEADO
PERSONAL 1 DIRECTOR, 1 RESIDENTE, 1 TSS, 1 MAESTRO, 7 AUXILIARES
EQUIPO: MEZCLADORA GASOLINA, HERRAMIENTA MENOR.
ACTIVIDAD SE REALIZA CHARLA SEGURIDAD TEMA USO EPP (EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL) Y SE CONTINUA CON ACTIVIDAD DE ENCOFRADO E INSTALACIÓN DE ACERO DE REFUERZO EN EL COSTADO PARALELO AL ARROYO.
Se solicito en obra señalizacion preventiva, informativa y obligatoria, salidas de emergencia, punto de encuentro. La ubicacion del punto de lavado de la mezcladora con su respectiva señalizacion y proteccion de los puntos electricos.

Sander Martinez.
EDUBAR S.A.

SE INICIA FUNDIDA A LAS 9:30 AM Y SE TERMINA 4:30
SE REALIZA AMARRADO DE VIGA Y DISTRIBUCION DE VARILLA DE 1/2 PARA DOVELAS / SE RECIBE VISITA DE OBRA POR PARTE DE ALCALDIA, INTERVENTORIA Y PERSONAL DIH DE CONTRATISTA PARA TOCAR TEMAS DE OBRA SE LEVANTA ACTA POR PARTE DE EDUBAR. NOS ENVIAN ODM DE ACTA POR CORREO

12-07-24 VIERNES.
DIA SOLEADO
PERSONAL 1 DIRECTOR, 1 RESIDENTE, 1 SST, 1TS, 1 MAESTRO
6. AUXILIARES
EQUIPO: MEZCLADORA A GASOLINA / HERRAMIENTA MENOR
ACTIVIDAD: SE CONTINUA EXCAVACIÓN DE VIGA 30X30 / FIGURADO Y ARMADO ENCOFRADO Y ALISTAMIENTO PARA FUNDIR / SE ORGANIZA BODEGA PARA RECIBIR CEMENTO, SE RECIBE BLOQUE ESTRUC. TOTAL 15x20x40 cm CON UNA CARA ACANALADA ~~DIEGO HOYOS~~ RESIDENTE SE REALIZA JORNADA ASEO.

13-07-24 SABADO
DIA SOLEADO
PERSONAL 1 RESIDENTE, 1 SST, 1TS, 1 MAESTRO, 6 AUXILIARES
EQUIPO MEZCLADORA A GASOLINA / HERRAMIENTA MENOR.
ACTIVIDAD SE CONTINUA CON ADECUACIÓN DE FORMALETA Y EXCAVACIÓN SE FUNDE 14 ML DE VIGA 30x30 SE REALIZA JORNADA DE ASEO SEGÚN RECOMENDACIÓN SST- INTERVENTORIA SANDRA MARTINEZ SE REVISA PONTO ECOLOGICO Y SE HACE RECOGIDA DE BOLSAS DE CEMENTO. ~~DIEGO HOYOS~~ RESIDENTE OBRA

14-07-24 DOMINGO DIA NO TRABAJADO.

15-07-24 LUNES
DIA SOLEADO
PERSONAL 1 RESIDENTE. 1 SST, 1TS, 1 MAESTRO, 5 AUXILIARES
EQUIPO 1 MEZCLADORA A GASOLINA
ACTIVIDAD: EXCAVACIÓN DE VIGA 30x30, ENCOFRADO Y FUNDIDA DE 15ML 30x30 SOBRE CERRAMIENTO ARROYO DESCARGUE DE BLOQUE EN ARCILLA Y GRAVILLA 16 M3 1 VIAJE ENTRADA 1 VIAJE JUNTO DESCOLG. ARROYO SE REALIZA CORTE PARA FIGURADO ~~DIEGO HOYOS~~ RESIDENTE

16-07-24 MARTES
DIA SOLEADO
PERSONAL: 1 RESIDENTE, 1 SST, 1 TS, 1 MAESTRO, 7 AUXILIARES.
EQUIPO HERRAMIENTA MENOR
ACTIVIDAD: SE REALIZA EXCAVACION MANUAL PARA VIGA DE AMARRE SE HACE CORTE Y FIGURADO DE HIERRO, Y SE DEJA LISTO PARA FUNDIR / SE REALIZA DESENCOFRADO Y LIMPIEZA DE FORMALETA SE FUNDE PLACA PARA CAMINAMIENTO MEJORAR TRABAJO.
DIEGO HOZ
RESIDENTE OBRA
EDUBAR SA.

17-07-24 MIERCOLES.
DIA: SOLEADO
PERSONAL: 1 RESIDENTE, 1 SST, 1 TS, 1 MAESTRO, 7 AUXILIARES
EQUIPO MEZCLADORA / HERRAMIENTA MENOR
ACTIVIDAD: Se realiza Excavación, armado Hierro, encofrado y fundida de viga Cimiento, Colocación de dovelas. en ϕ ½. -
DIEGO HOZ
RESIDENTE.
EDUBAR SA.

18-07-24. JUEVES
DIA SOLEADO
PERSONAL 1 RESIDENTE, 1 TS, 1 SST, 1 MAESTRO, 7 AUXILIARES
EQUIPO: MEZCLADORA / HERRAMIENTA MENOR
ACTIVIDAD
18 de Julio de 2024 JUEVES.
Se solicita nuevamente la señalización de obra (informativa-obligatoria y reglamentaria) Deben tener los acopios de materiales señalizados y demarcados, con su respectiva señalización. El punto ecológico y el acopio de bultos de cemento deben estar protegidos del sol y el agua (lluvia) ya que se evidencia lo contrario.
Además se evidencia un punto eléctrico inseguro y a la intemperie, se deben implementar acciones correctivas de manera inmediata.
EDUBAR SA.
Sandra Martínez.
EDUBAR S.A.

SE CONTINUA CON ENCOFRADO Y FUNDIDA DE VIGA 30X30 PARALELO AL ARROYO 24 ML. [redacted] R
RESIDENTE OBRA

19-07-24 VIERNES

DIA SOLEADO

PERSONAL 1 RESIDENTE, 1 TS, 1 TSST, 1 MAESTRO, 7 AUXILIARES

EQUIPO : MEZCLADORA Y HERRAMIENTA MENOR

ACTIVIDAD: SE REALIZA ENCOFRADO, AMARRE DE VIGA., Y CONCRETO 3000 PSI PARA VIGA 19ML. EN HORAS DE LA TARDE INICIA A LLOVER SIN DEJAR CONTINUAR LA FUNDIDA. SE PROGRAMA CONTINUAR EL DIA LUNES. [redacted]
RESIDENTE OBRA

20-07-/24 SABADO FESTIVO NO SE TRABAJA

21-07/24 DOMINGO NO SE REALIZA TRABAJO

22-07/24 LUNES.

DIA SOLEADO

PERSONAL 1 TS, 1 MAESTRO, 7 AUXILIARES, 1 SST.

EQUIPO MEZCLADORA Y HERRAMIENTA MENOR

ACTIVIDAD. SE INICIA EXCAVACIÓN EN CIMENTACIÓN DE ADMINISTRACIÓN FIGURADO Y AMARRE DE PARRILLAS PARA VIGA 30x30. DESENCOFRADO Y LIMPIEZA FORMALETA METÁLICA [redacted].

23-07/24 MARTES.

DIA SOLEADO

PERSONAL. 1 RESIDENTE, 1 TS, 1 MAESTRO, 7 AUXILIARES

EQUIPO. MEZCLADORA / HERRAMIENTA MENOR

ACTIVIDAD: SE CONTINUA EXCAVACIÓN PARA AREA ADMINISTRATIVA SE INICIA EXCAVACION PARALELO A LA VIA CARRERA 28. PARA VIGA 30x30 / FIGURADO, CORTE Y AMARRE DE ACERO DE REFUERZO / REUNIÓN COMITE PARA REVISIÓN ACTA N°1 EN EDUBAR. EN HORAS DE LA TARDE / ENCOFRADO DE VIGA 30x30 [redacted]
RESIDENTE
