Que el proyecto de inversión NO se ejecutó según el siguiente balance financiero:

BALANCE FINANCIERO DEL PROYECTO

Que los recursos girados al proyecto se ejecutaron conforme al siguiente detalle:

	DESCRIPCION	Valor	% del Valor aprobado
1	Valor del proyecto	**1.130.471.440**	100,oo
1.1	Valor SGR- MUNICIPIO DE SUCRE	**1.130.471.440**	100,oo
2	Girado (fondos o transferencias)	0,00	0,oo
3	Contratado	1.129.956.924	99,95
4	Ejecutado (valor ejecutado y liquidado)	0,00	0,00
5	Pago a contratistas	0,00	0,00
6	Saldos no ejecutados a reintegrar	**1.130.471.440**	100,oo
7	Saldos no ejecutados reintegrados	**1.130.471.440**	100,oo

Que de conformidad con el Acta N°1 de Terminación Anticipada y liquidación por mutuo Acuerdo, de fecha 21 de mayo de 2024, del contratante como del contratista, del contrato de obra pública, en donde se exponen los motivos por los cuales no se puede ejecutar el proyecto en donde no existe un lote de terreno, que este a nombre del municipio de Sucre Cauca, como tampoco que el lote existente y destinado para la construcción del polideportivo, no se considera como un predio de uso común, o que la Junta de Acción Comunal de la Vereda de Mazamorras, tenga posesión del mismo.

Que según la información de ejecución de las actividades reportadas, el proyecto fue terminado con el siguiente avance físico y financiero:

Avance físico	Avance financiero
0.00	0.00

Que, el proyecto contempló las siguientes metas e indicadores de cumplimiento, los cuales se reportan en los siguientes productos:

Indicador de Producto	Año Inicial Meta	Año Final Meta	Valor Meta	Valor Ejecutado	% Ejecución
Polideportivos construidos y dotados	2023	2024	1,00	0,00	0,00

Que el proyecto de inversión NO, ha cumplido con los objetivos del proyecto aprobado.

Relación de contratos suscritos en la ejecución del proyecto de inversión BPIN No.2023197850031 **DENOMINADO**: **"CONSTRUCCIÓN ESCENARIO DEPORTIVO EN LA VEREDA MAZAMORRAS MUNICIPIO DE SUCRE"**.

Contrato	Fecha Suscripción Contrato	Tipo Contrato	Identificación Contratista	Valor Contrato Proyecto	Valor Pagado	Valor Liquidado
LP-405	16/11/23	Obra pública	901478783	1.029.273.999	0,00	0,00
CMA-412-2023	13/12/2023	Concurso de méritos abierto	Consorcio Interventoría Sucre	100.682.925	0,00	0,00
Valor Total Ejecución de Inversión				0,00	0,00	0,00
Valor Total Ejecutado de Interventoría				0,00	0,00	0,00
Valor Total ejecutado en el Proyecto				0,00	0,00	0,00

Que la entidad ejecutora del proyecto dio cumplimiento al registro de información en los aplicativos informáticos dispuestos por el DNP, al tenor de lo dispuesto en el artículo 2.2.4.2.1.4. del Decreto 1082 de 2015.

Que la información y documentación del proyecto, así como los soportes documentales del presente acto administrativo es verídica, fidedigna y cumple con los requisitos señalados en la Ley 2056 de 2020, Decreto 1082 de 2015, Acuerdo 045 de 2017 de la Comisión Rectora del SGR y demás normas complementarias y concordantes. En mérito de lo expuesto,

RESUELVE

Artículo 1. Cerrar el proyecto BPIN No 2023197850031, denominado "**CONSTRUCCIÓN ESCENARIO DEPORTIVO EN LA VEREDA MAZAMORRAS MUNICIPIO DE SUCRE**", financiado con recursos de "Asignación para la Inversión Local, según NBI y municipios de cuarta, quinta y sexta categoría" del Sistema General de Regalías-SGR, por decisión del representante legal del municipio de Sucre Cauca, en calidad de ejecutor designado, mediante acuerdo N° 162, de fecha 1 de septiembre de 2023.

Artículo 2. Declarar que, si existen saldos de recursos a reintegrar para el proyecto, por valor total de **MIL CIENTO TREINTA MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS CUARENTA PESOS M/ CTE ($ 1.130.471.440)**

Artículo 3. Remitir el presente acto administrativo, en cumplimiento del Artículo 2.2.4.2.6.1 del Decreto 1082 de 2015, a la Secretaria Técnica del municipio de Sucre Cauca/ Secretaria de Planeación é Infraestructura y al Sistema de Monitoreo, Seguimiento, Control y Evaluación – SMSCE del Sistema General de Regalías, a través del aplicativo GESPROY – SGR, dentro del mes siguiente a su expedición.

Artículo 4. La presente Resolución rige a partir de su publicación.

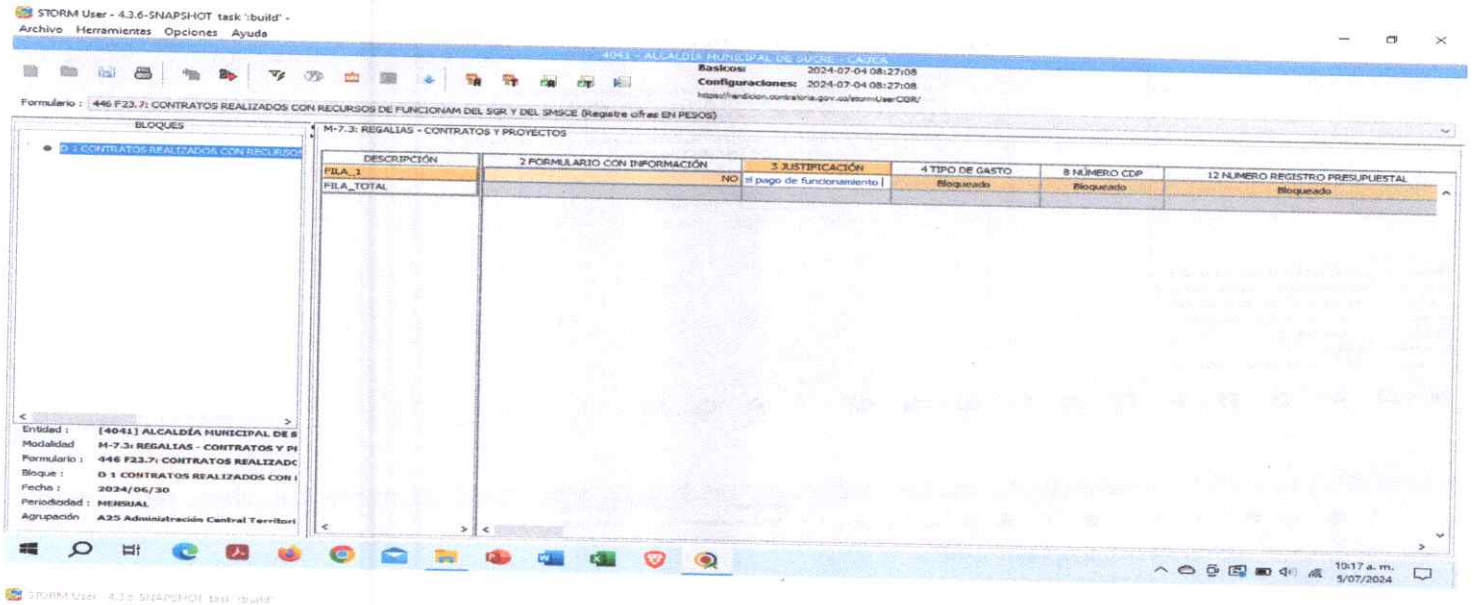
COMUNÍQUESE Y CUMPLASE

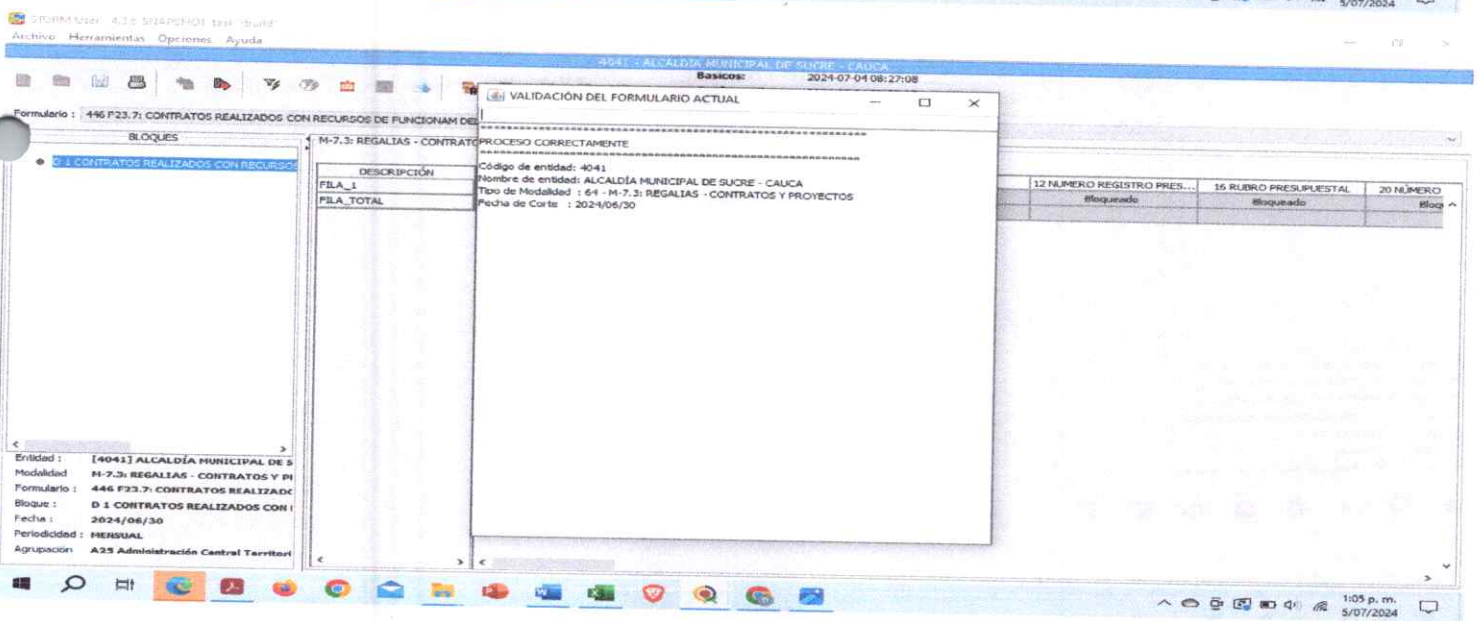
Dada en el municipio de Sucre Cauca a los veinticinco (25) días del mes de julio de dos mil veinticuatro - 2024

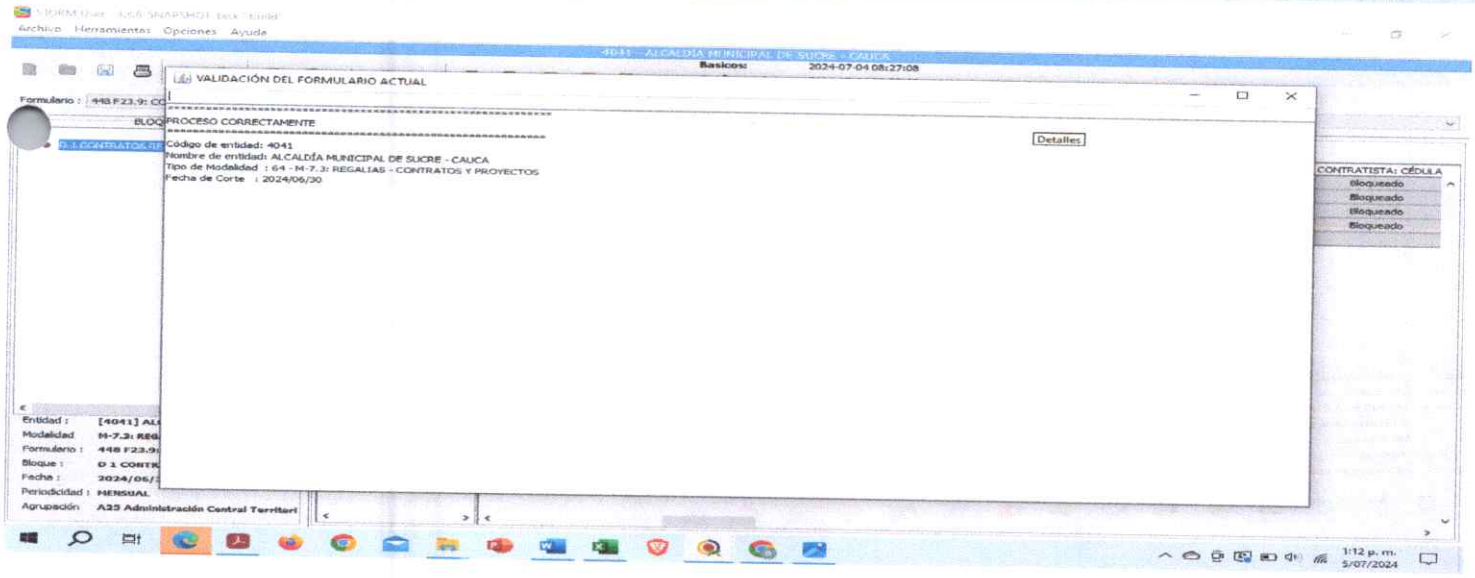
CARLOS RUBER MORA MORA
Alcalde Municipal
Sucre Cauca
Representante Legal, Entidad Ejecutora.

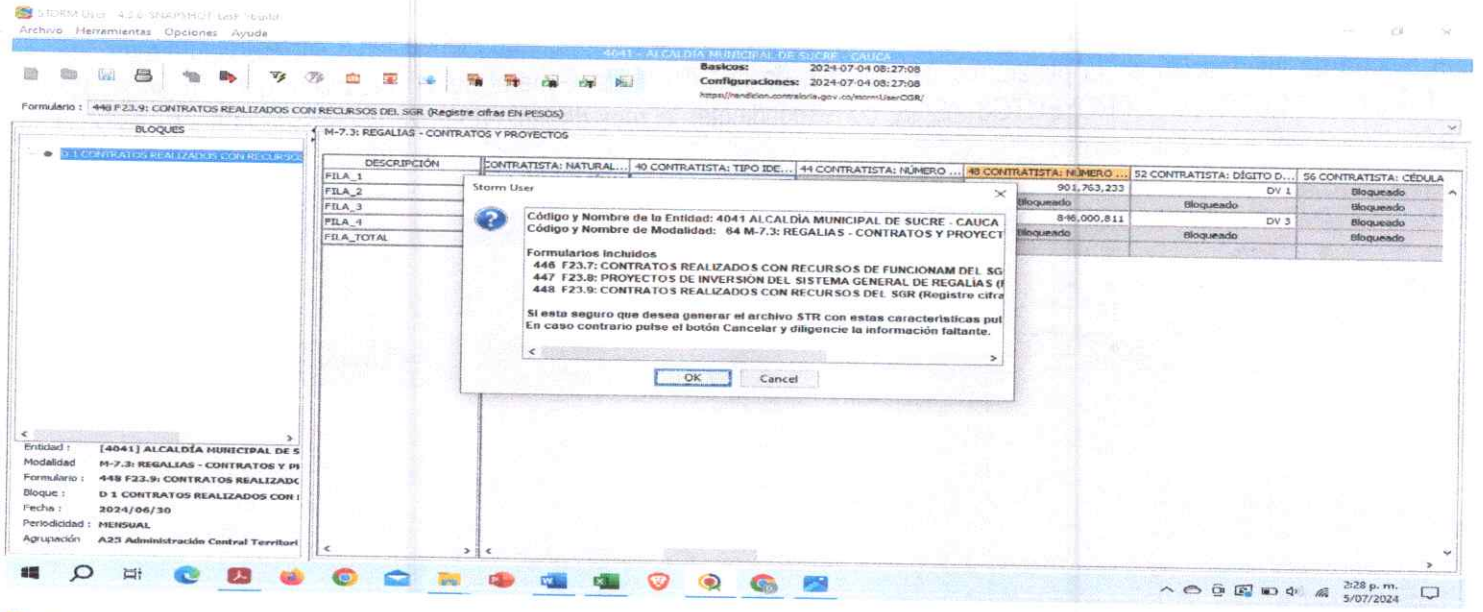
Revisó: Deyby Antonio Armero Cerón, Secretario de Planeación Municipal
Proyectó: Oscar Mayorga, apoyo a la Secretaria de Planeación Municipal

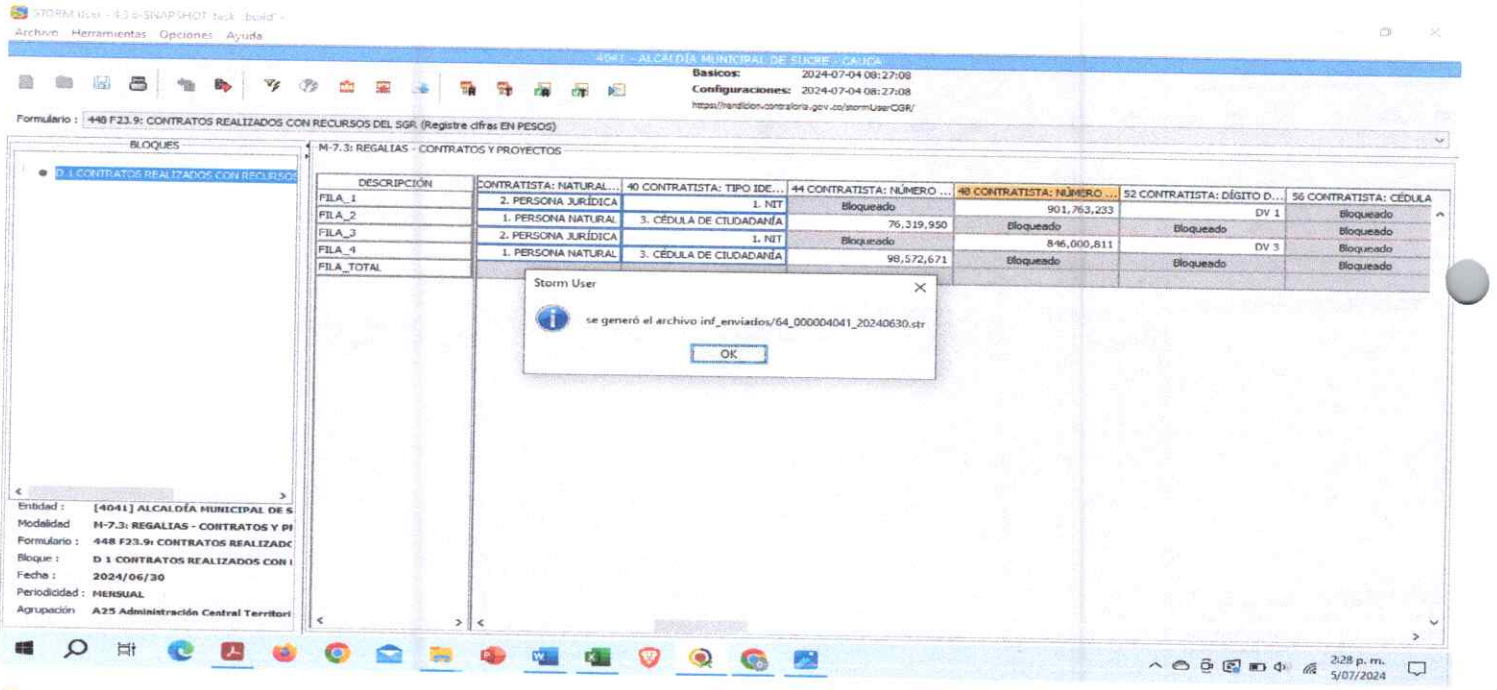
SOPORTE DE LAS ACTIVIDAD 2.1: Durante este periodo se apoyó a la Secretaria de Planeación e Infraestructura municipal, en el reporte de información en la plataforma del SIRECI, de la Contraloría General de la República, del formato 64-M7.3 – REGALIAS -CONTRTOS Y PROYECTOS - SGR, correspondientes al mes de junio de 2024, se reportó el 5 julio de 2024, se adjuntan evidencias a continuación.

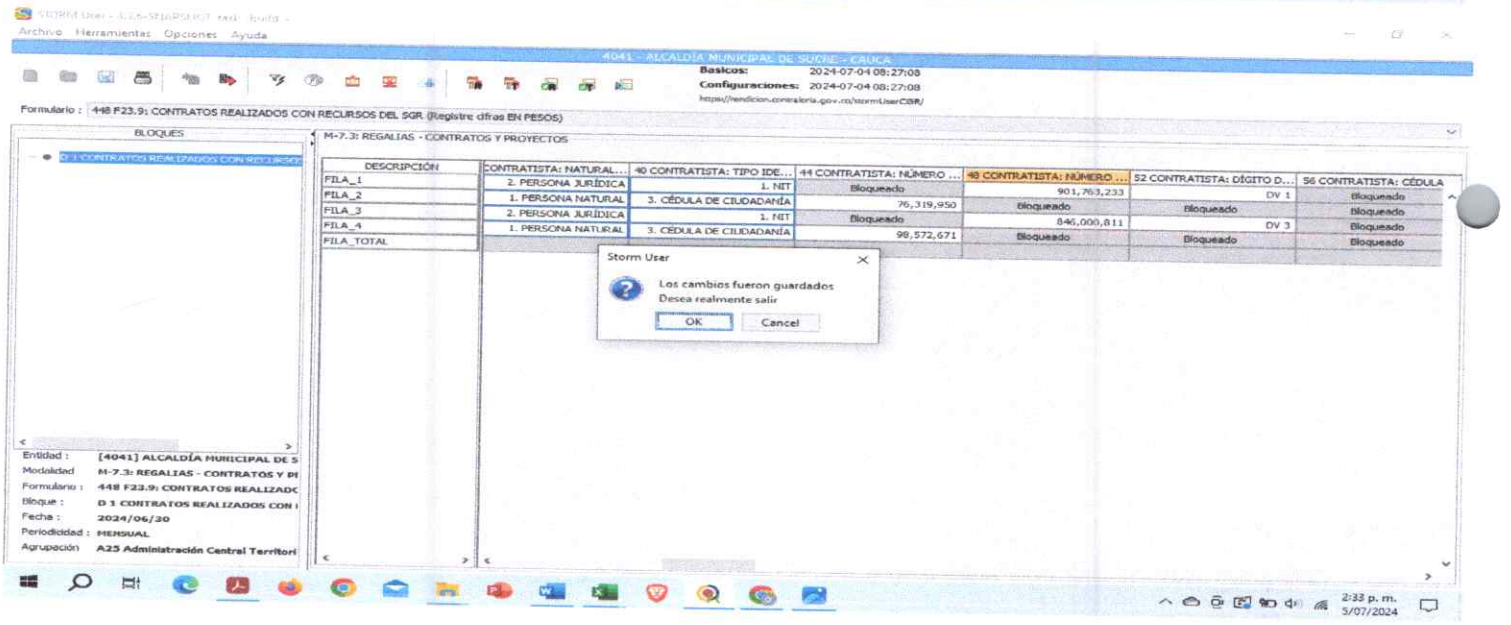


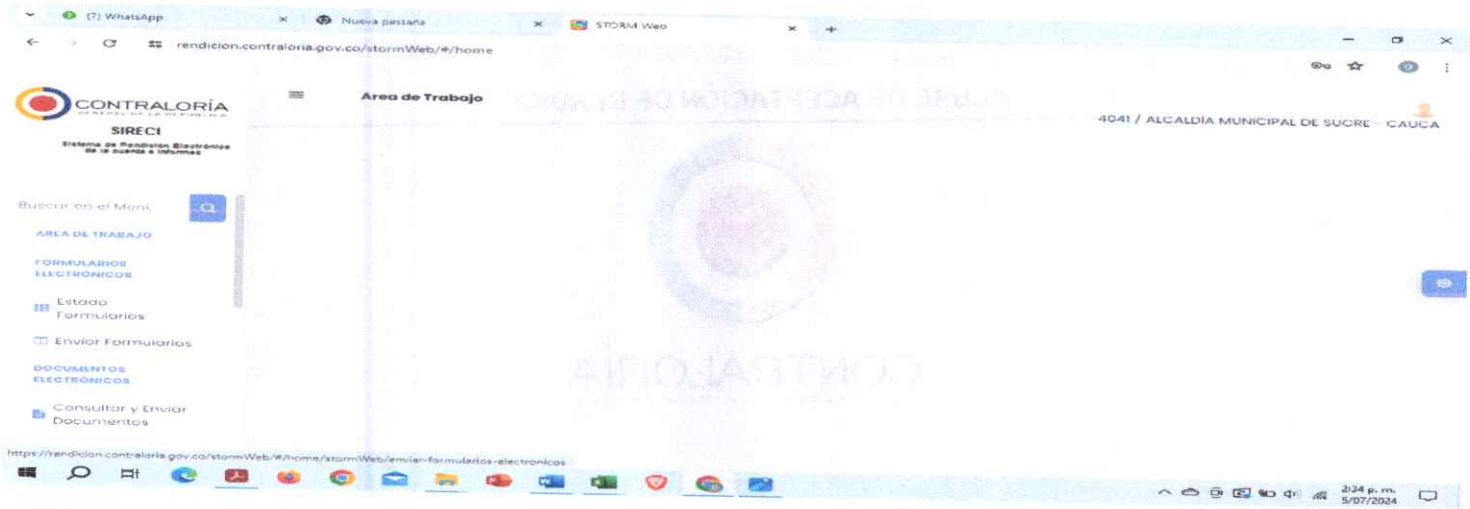


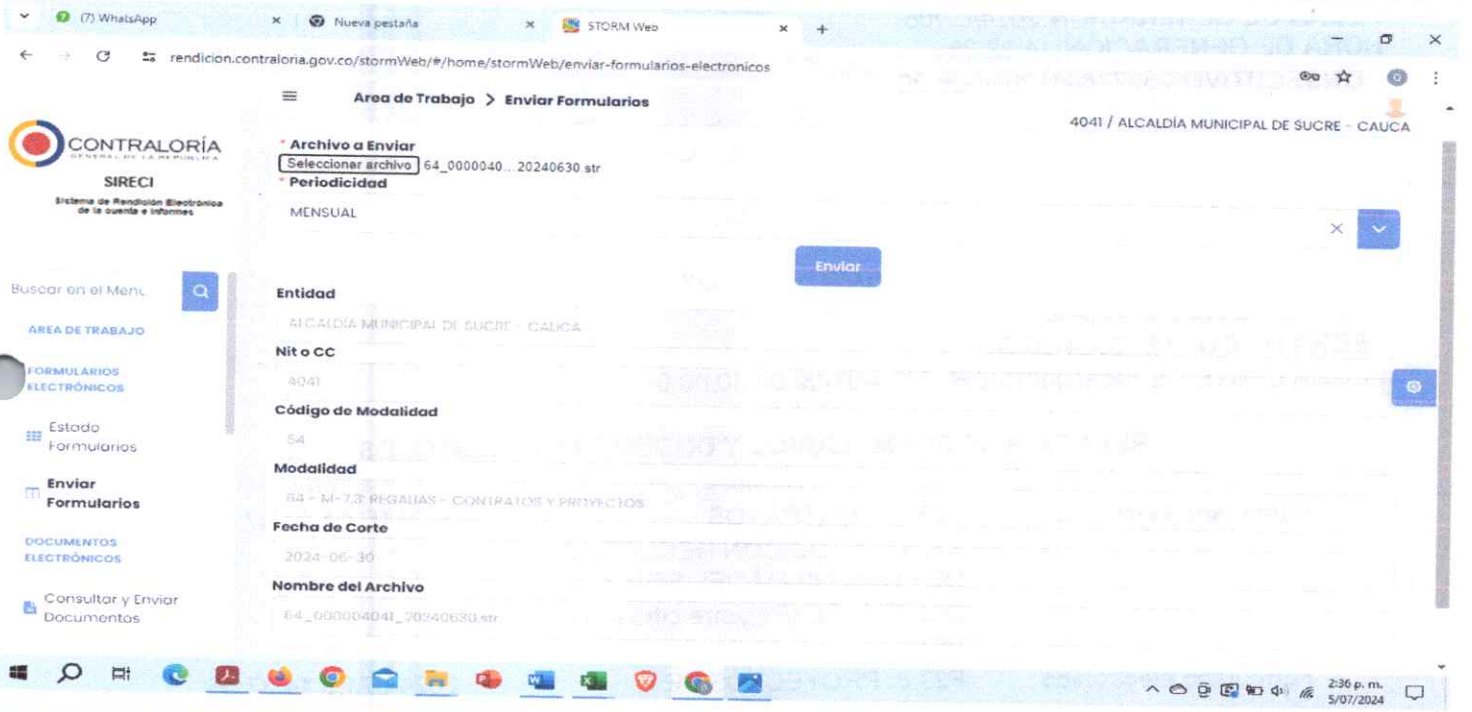


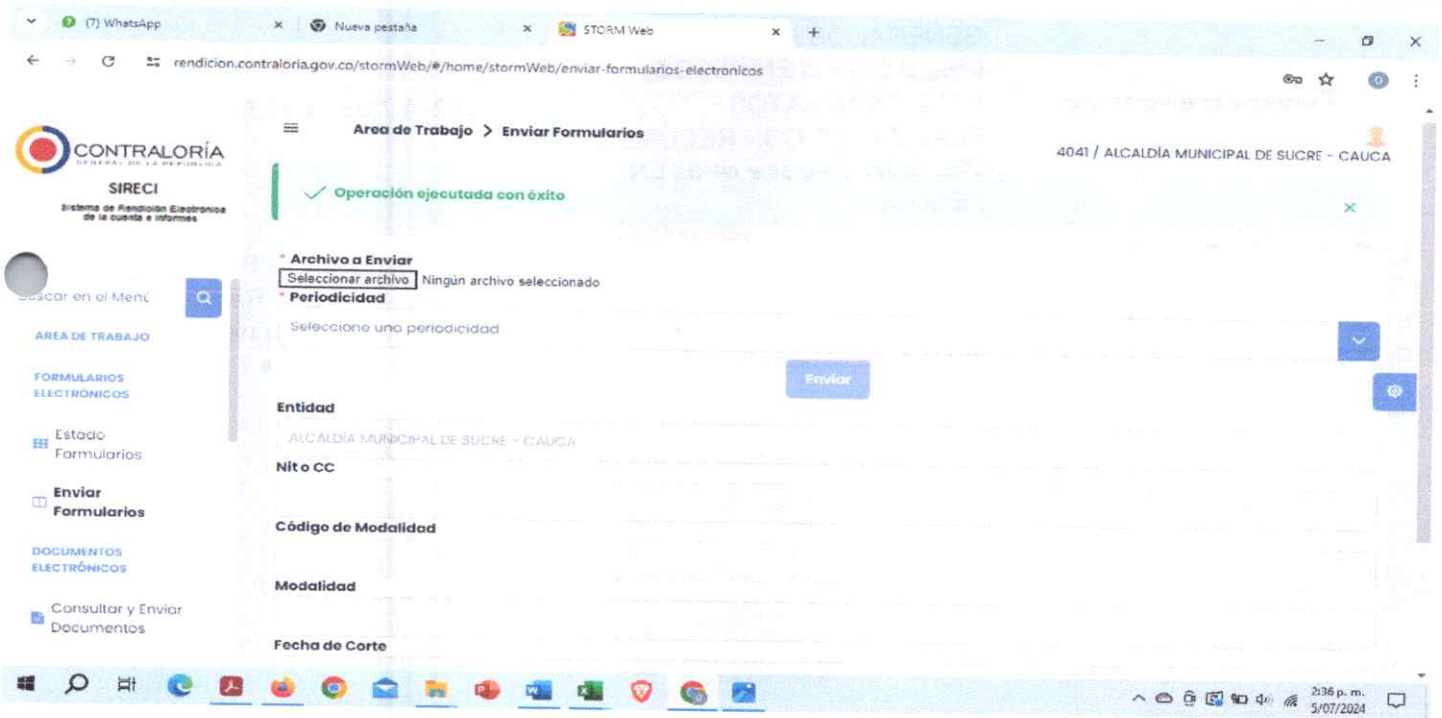

Archivo Herramientas Opciones Ayuda
4041 - ALCALDÍA MUNICIPAL DE SUCRE - CAUCA
Basicos: 2024-07-04 08:27:08
Configuraciones: 2024-07-04 08:27:08
Formulario : 448 F23.9: CONTRATOS REALIZADOS CON RECURSOS DEL SGR (Registre cifras EN PESOS)
BLOQUES
M-7.3: REGALIAS - CONTRATOS Y PROYECTOS
DESCRIPCIÓN
CONTRATISTA: NATURAL...
40 CONTRATISTA: TIPO IDE...
44 CONTRATISTA: NÚMERO ...
48 CONTRATISTA: NÚMERO ...
52 CONTRATISTA: DÍGITO D...
56 CONTRATISTA: CÉDULA
FILA_1
FILA_2
FILA_3
FILA_4
FILA_TOTAL
Storm User
Código y Nombre de la Entidad: 4041 ALCALDÍA MUNICIPAL DE SUCRE - CAUCA
Código y Nombre de Modalidad: 64 M-7.3: REGALIAS - CONTRATOS Y PROYECT
Formularios incluidos
448 F23.7: CONTRATOS REALIZADOS CON RECURSOS DE FUNCIONAM DEL SG
447 F23.8: PROYECTOS DE INVERSION DEL SISTEMA GENERAL DE REGALIAS (I
448 F23.9: CONTRATOS REALIZADOS CON RECURSOS DEL SGR (Registre cifra
Si esta seguro que desea generar el archivo STR con estas caracteristicas pul
En caso contrario pulse el botón Cancelar y diligencie la información faltante.
OK
Cancel
Entidad : [4041] ALCALDÍA MUNICIPAL DE S
Modalidad M-7.3: REGALIAS - CONTRATOS Y PI
Formulario : 448 F23.9: CONTRATOS REALIZADC
Bloque : D 1 CONTRATOS REALIZADOS CON
Fecha : 2024/06/30
Periodicidad : MENSUAL
Agrupación A25 Administración Central Territori
2:28 p. m.
5/07/2024


Archivo Herramientas Opciones Ayuda
4041 - ALCALDÍA MUNICIPAL DE SUCRE - CAUCA
Basicos: 2024-07-04 08:27:08
Configuraciones: 2024-07-04 08:27:08
Formulario : 448 F23.9: CONTRATOS REALIZADOS CON RECURSOS DEL SGR (Registre cifras EN PESOS)
BLOQUES
M-7.3: REGALIAS - CONTRATOS Y PROYECTOS
DESCRIPCIÓN
CONTRATISTA: NATURAL...
40 CONTRATISTA: TIPO IDE...
44 CONTRATISTA: NÚMERO ...
48 CONTRATISTA: NÚMERO ...
52 CONTRATISTA: DÍGITO D...
56 CONTRATISTA: CÉDULA
FILA_1 2. PERSONA JURÍDICA 1. NIT Bloqueado 901,763,233 DV 1 Bloqueado
FILA_2 1. PERSONA NATURAL 3. CÉDULA DE CIUDADANÍA 76,319,950 Bloqueado Bloqueado Bloqueado
FILA_3 2. PERSONA JURÍDICA 1. NIT Bloqueado 846,000,811 DV 3 Bloqueado
FILA_4 1. PERSONA NATURAL 3. CÉDULA DE CIUDADANÍA 98,572,671 Bloqueado Bloqueado Bloqueado
FILA_TOTAL
Storm User
se generó el archivo inf_enviados/64_000004041_20240630.str
OK
Entidad : [4041] ALCALDÍA MUNICIPAL DE S
Modalidad M-7.3: REGALIAS - CONTRATOS Y PI
Formulario : 448 F23.9: CONTRATOS REALIZADC
Bloque : D 1 CONTRATOS REALIZADOS CON
Fecha : 2024/06/30
Periodicidad : MENSUAL
Agrupación A25 Administración Central Territori
2:28 p. m.
5/07/2024


Archivo Herramientas Opciones Ayuda
4041 - ALCALDÍA MUNICIPAL DE SUCRE - CAUCA
Basicos: 2024-07-04 08:27:08
Configuraciones: 2024-07-04 08:27:08
Formulario : 448 F23.9: CONTRATOS REALIZADOS CON RECURSOS DEL SGR (Registre cifras EN PESOS)
BLOQUES
M-7.3: REGALIAS - CONTRATOS Y PROYECTOS
DESCRIPCIÓN
CONTRATISTA: NATURAL...
40 CONTRATISTA: TIPO IDE...
44 CONTRATISTA: NÚMERO ...
48 CONTRATISTA: NÚMERO ...
52 CONTRATISTA: DÍGITO D...
56 CONTRATISTA: CÉDULA
FILA_1 2. PERSONA JURÍDICA 1. NIT Bloqueado 901,763,233 DV 1 Bloqueado
FILA_2 1. PERSONA NATURAL 3. CÉDULA DE CIUDADANÍA 76,319,950 Bloqueado Bloqueado Bloqueado
FILA_3 2. PERSONA JURÍDICA 1. NIT Bloqueado 846,000,811 DV 3 Bloqueado
FILA_4 1. PERSONA NATURAL 3. CÉDULA DE CIUDADANÍA 98,572,671 Bloqueado Bloqueado Bloqueado
FILA_TOTAL
Storm User
Los cambios fueron guardados
Desea realmente salir
OK
Cancel
Entidad : [4041] ALCALDÍA MUNICIPAL DE S
Modalidad M-7.3: REGALIAS - CONTRATOS Y PI
Formulario : 448 F23.9: CONTRATOS REALIZADC
Bloque : D 1 CONTRATOS REALIZADOS CON
Fecha : 2024/06/30
Periodicidad : MENSUAL
Agrupación A25 Administración Central Territori
2:33 p. m.
5/07/2024


(7) WhatsApp
Nueva pestaña
STORM Web
rendicion.contraloria.gov.co/stormWeb/#/home
CONTRALORÍA
SIRECI
Area de Trabajo
4041 / ALCALDÍA MUNICIPAL DE SUCRE - CAUCA
Buscar en el Menú
AREA DE TRABAJO
FORMULARIOS ELECTRÓNICOS
Estado Formularios
Enviar Formularios
DOCUMENTOS ELECTRÓNICOS
Consultar y Enviar Documentos
https://rendicion.contraloria.gov.co/stormWeb/#/home/stormWeb/enviar-formularios-electronicos
2:24 p. m.
5/07/2024


(7) WhatsApp
Nueva pestaña
STORM Web
rendicion.contraloria.gov.co/stormWeb/#/home/stormWeb/enviar-formularios-electronicos
Area de Trabajo > Enviar Formularios
4041 / ALCALDÍA MUNICIPAL DE SUCRE - CAUCA
CONTRALORÍA
SIRECI
* Archivo a Enviar
Seleccionar archivo
64_0000040... 20240630.str
* Periodicidad
MENSUAL
Enviar
Entidad
ALCALDÍA MUNICIPAL DE SUCRE - CAUCA
Nit o CC
4041
Código de Modalidad
64
Modalidad
64 - M-7.3 REGALIAS - CONTRATOS Y PROYECTOS
Fecha de Corte
2024-06-30
Nombre del Archivo
64_0000040 41_20240630.str
Buscar en el Menú
AREA DE TRABAJO
FORMULARIOS ELECTRÓNICOS
Estado Formularios
Enviar Formularios
DOCUMENTOS ELECTRÓNICOS
Consultar y Enviar Documentos
2:36 p. m.
5/07/2024


(7) WhatsApp
Nueva pestaña
STORM Web
rendicion.contraloria.gov.co/stormWeb/#/home/stormWeb/enviar-formularios-electronicos
Area de Trabajo > Enviar Formularios
4041 / ALCALDÍA MUNICIPAL DE SUCRE - CAUCA
CONTRALORÍA
SIRECI
Operación ejecutada con éxito
* Archivo a Enviar
Seleccionar archivo
Ningún archivo seleccionado
* Periodicidad
Seleccione una periodicidad
Enviar
Entidad
ALCALDÍA MUNICIPAL DE SUCRE - CAUCA
Nit o CC
Código de Modalidad
Modalidad
Fecha de Corte
Buscar en el Menú
AREA DE TRABAJO
FORMULARIOS ELECTRÓNICOS
Estado Formularios
Enviar Formularios
DOCUMENTOS ELECTRÓNICOS
Consultar y Enviar Documentos
2:36 p. m.
5/07/2024

ACUSE DE ACEPTACIÓN DE RENDICIÓN

CONTRALORÍA
GENERAL DE LA REPÚBLICA

FECHA DE GENERACIÓN:2024/07/05
HORA DE GENERACIÓN:14:38:28
CONSECUTIVO:2527269612024-06-30

RAZÓN SOCIAL: ALCALDÍA MUNICIPAL DE SUCRE - CAUCA
NIT:817003440
NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL:CARLOS RUBER MORA MORA

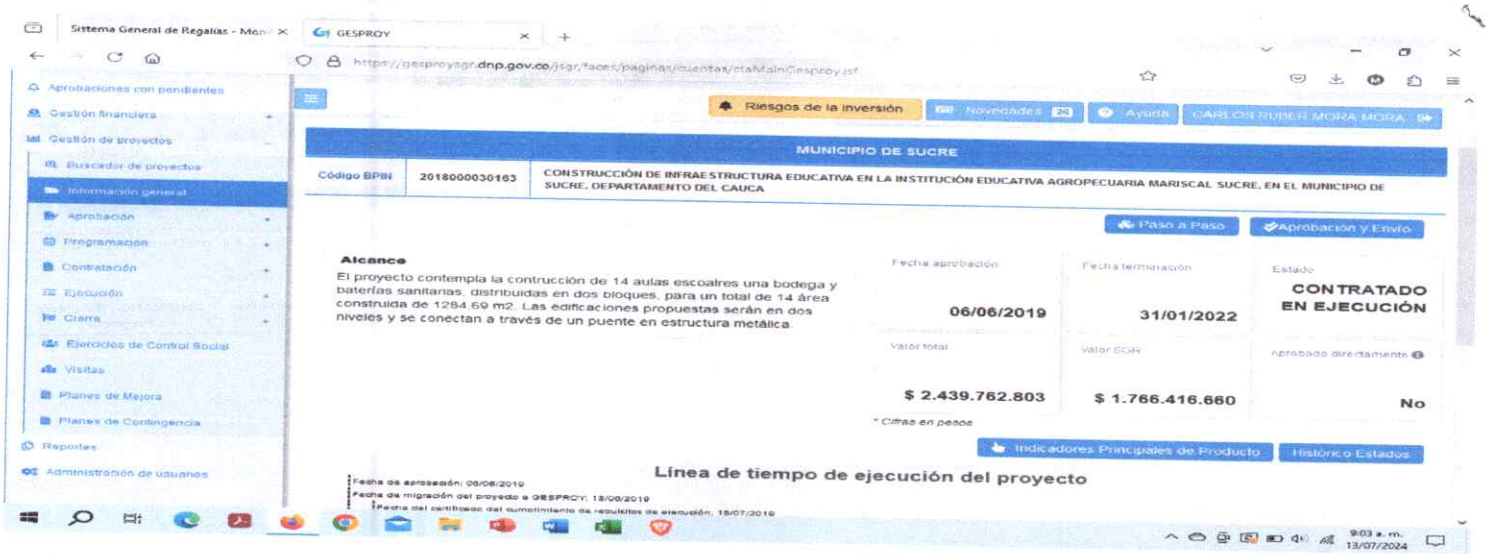
MODALIDAD:M-7.3: REGALIAS - CONTRATOS Y PROYECTOS
PERIODICIDAD:MENSUAL
FECHA DE CORTE: 2024-06-30
FECHA LIMÍTE DE TRANSMISIÓN: 2024-07-09 00:00:00.0

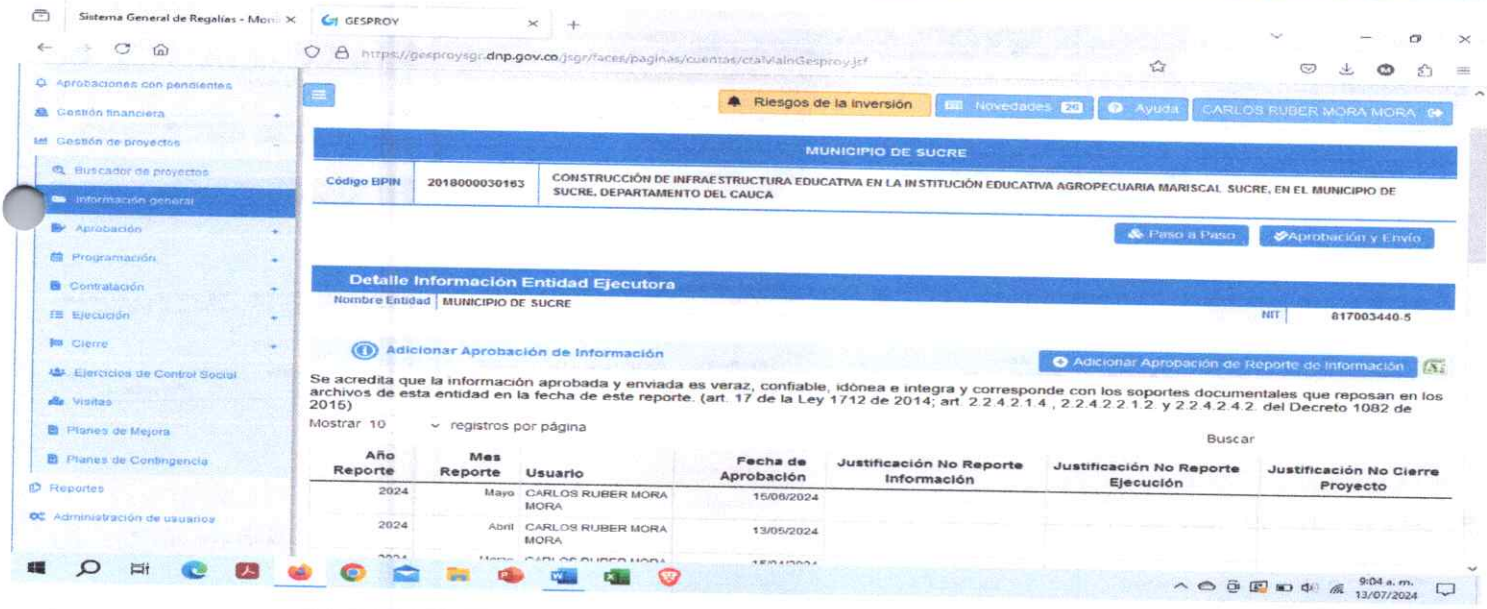
RELACIÓN DE FORMULARIOS Y DOCUMENTOS REMITIDOS

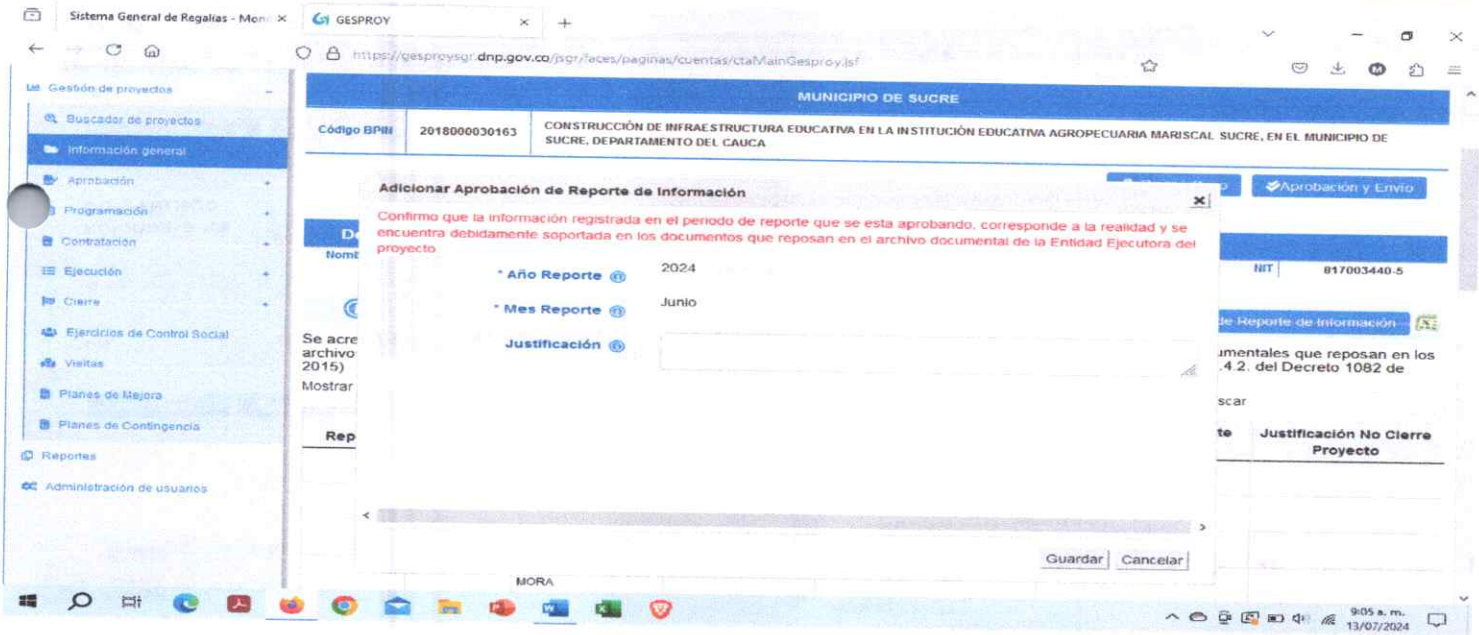
Tipo	Nombre	Fecha
Formulario electrónico	F23.7: CONTRATOS REALIZADOS CON RECURSOS DE FUNCIONAM DEL SGR Y DEL SMSCE (Registre cifras EN PESOS)	2024/07/05 14:37:55
Formulario electrónico	F23.8: PROYECTOS DE INVERSIÓN DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS (Registre cifras EN PESOS)	2024/07/05 14:37:55
Formulario electrónico	F23.9: CONTRATOS REALIZADOS CON RECURSOS DEL SGR (Registre cifras EN PESOS)	2024/07/05 14:37:55

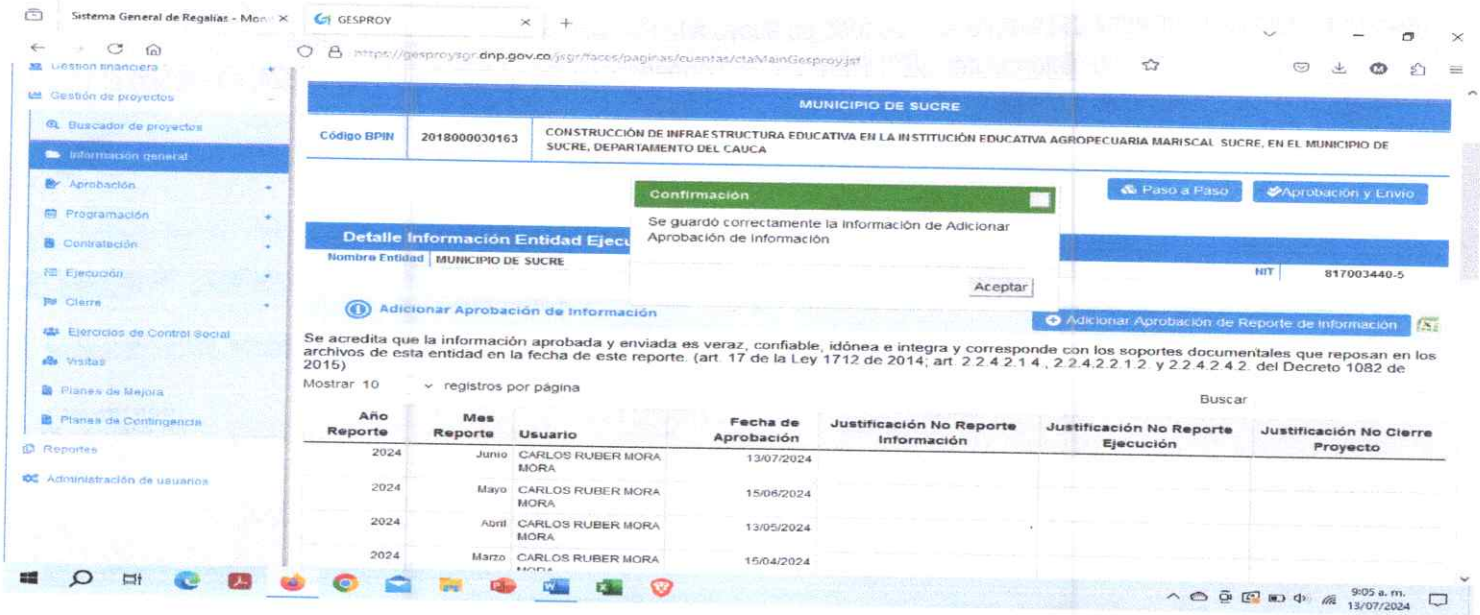
La Contraloría General de la República confirma el recibo de la información presentada por el Sujeto de Control Fiscal ALCALDÍA MUNICIPAL DE SUCRE - CAUCA, NIT 817003440, en el Sistema de Rendición Electrónica de la Cuenta e Informes – SIRECI –, conforme a lo establecido en los procedimientos y disposiciones legales que para tal efecto ha establecido la Contraloría General de la República.

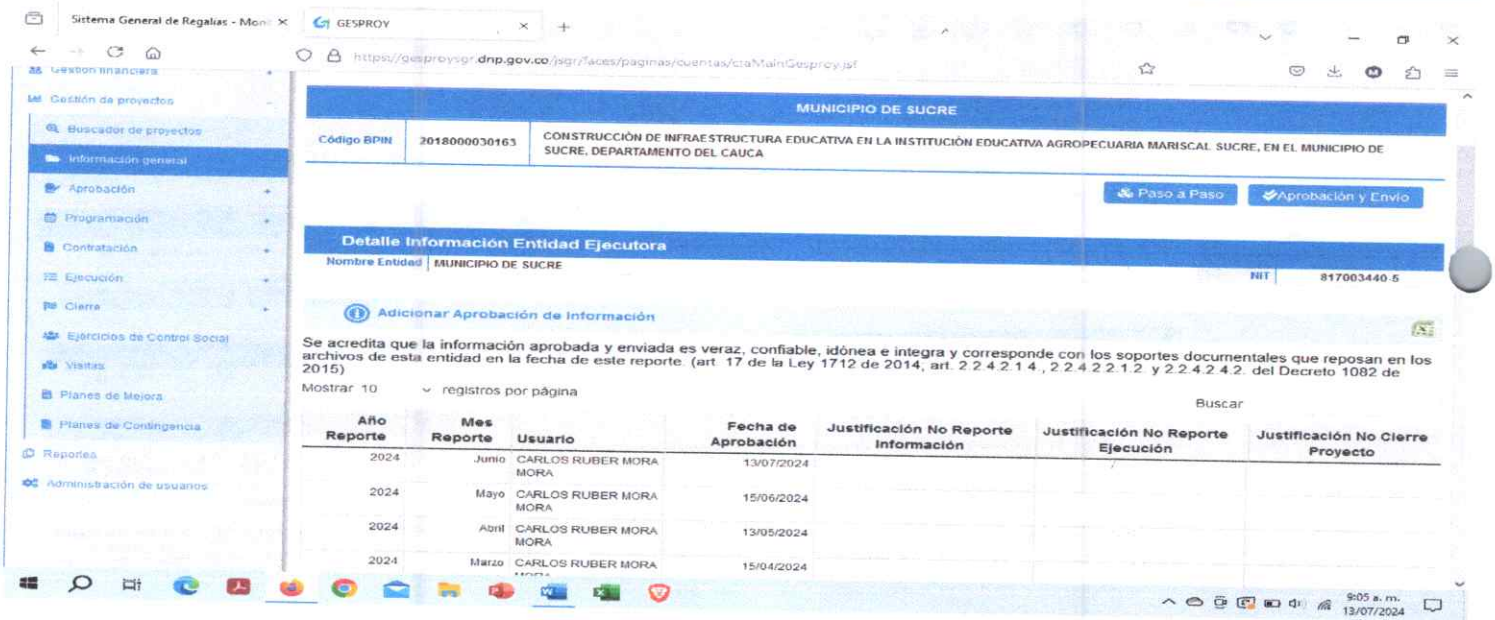
SOPORTE DE LAS ACTIVIDAD 2.2: Durante este periodo se apoyó a la Secretaria de Planeación e Infraestructura municipal, en el reporte de información en la plataforma del GESPROY - SGR, correspondientes al mes de junio de 2024, se reportó el 13 julio de 2024, se adjuntan evidencias a continuación

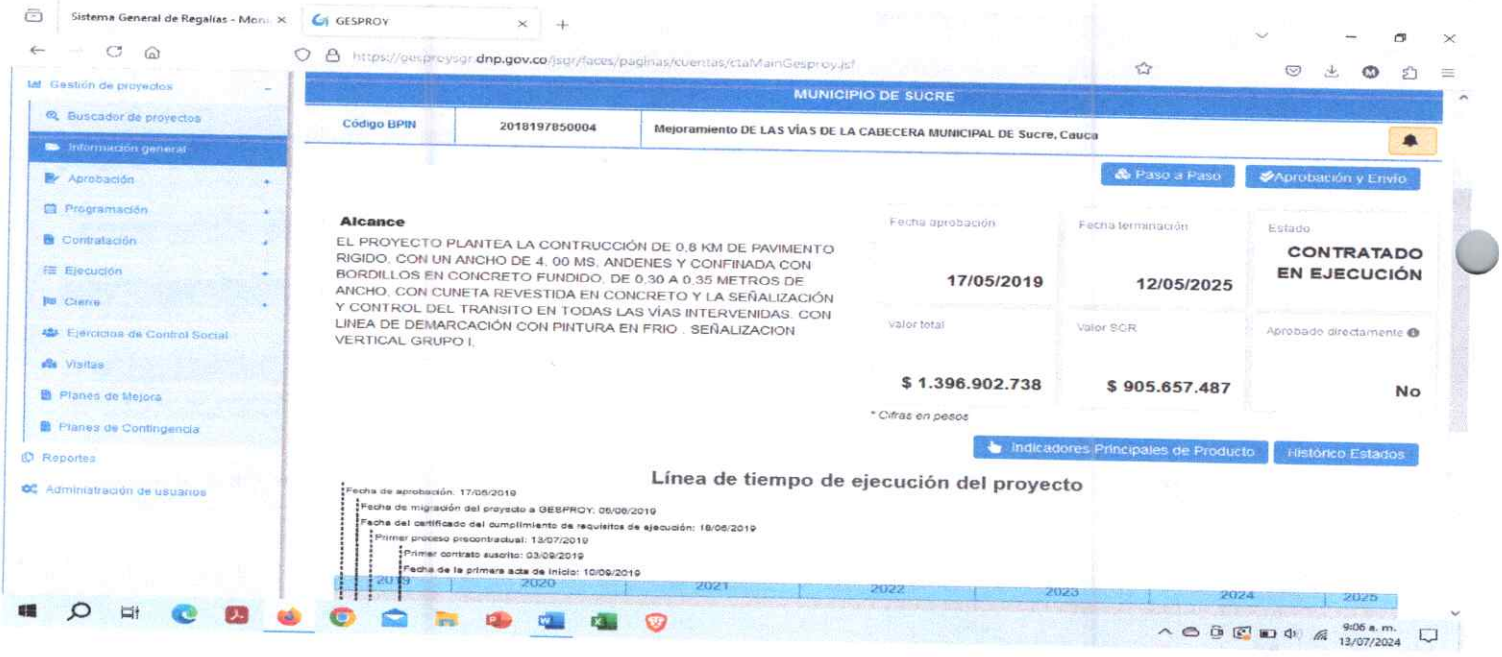


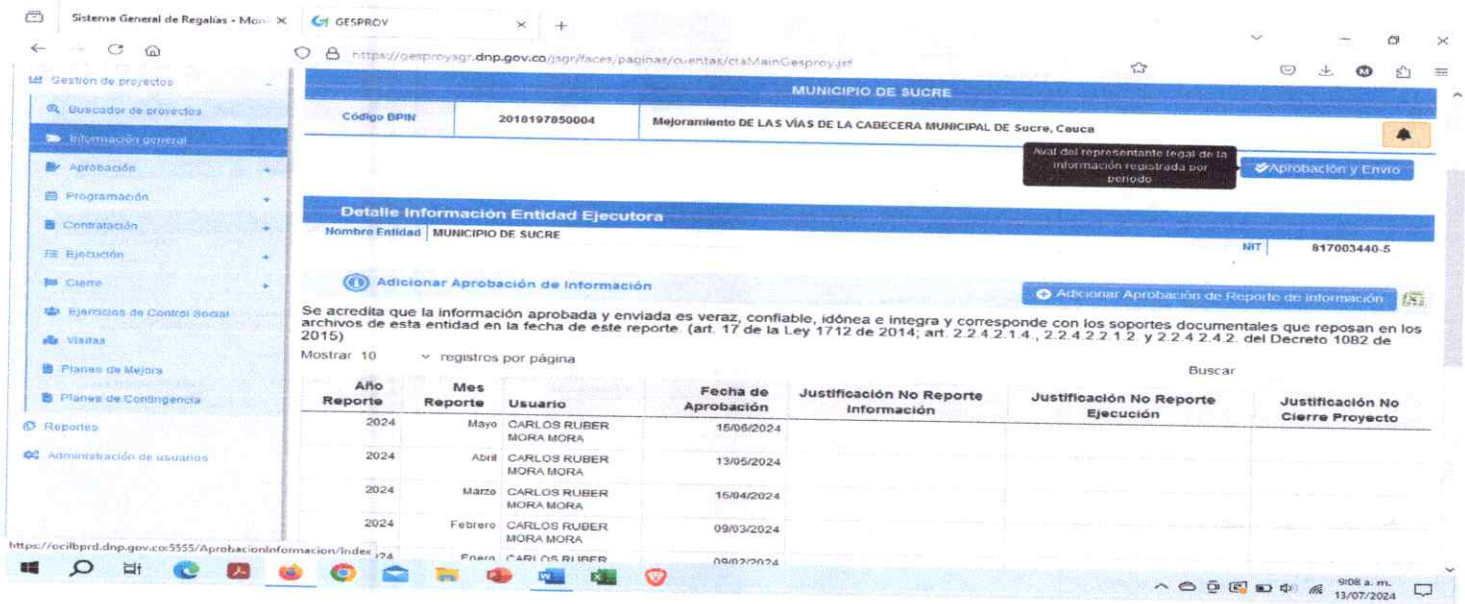


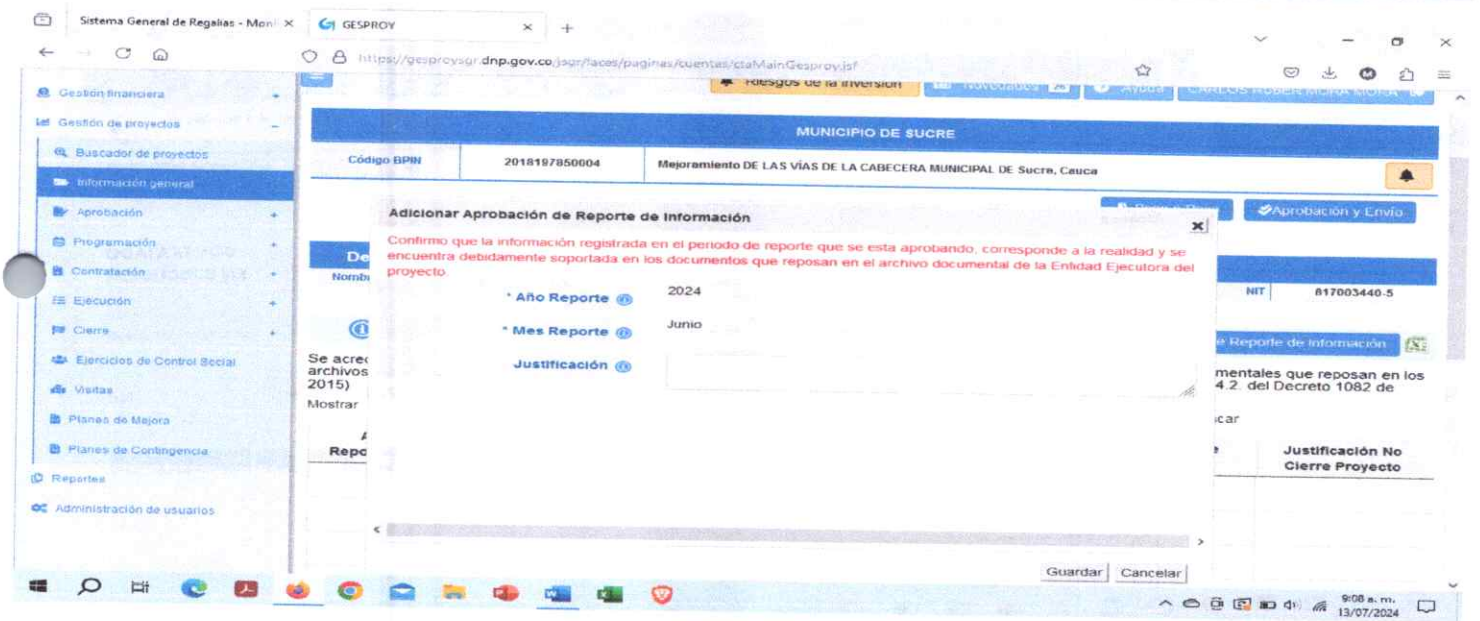


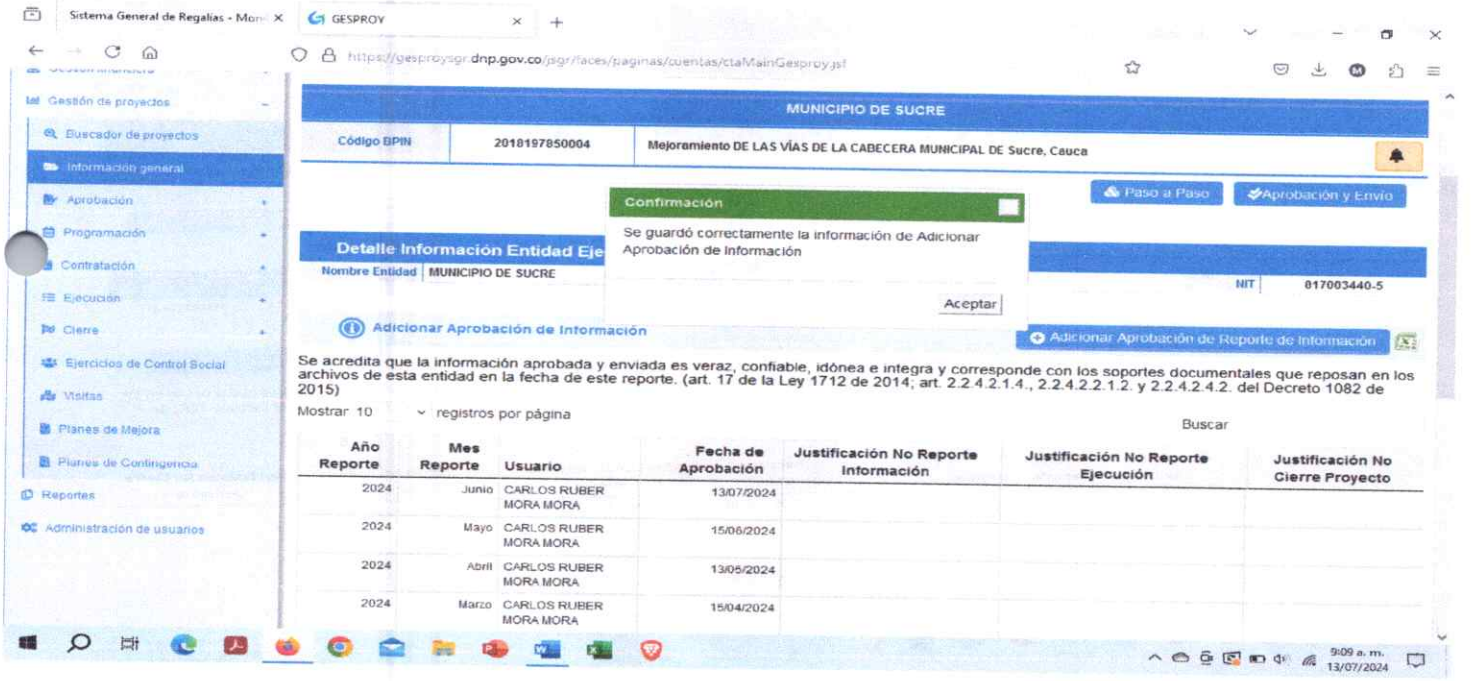

Sistema General de Regalías - Mon
GESPROY
https://gesproysgr.dnp.gov.co/jsgr/faces/paginas/cuentas/ctaMainGesproy.jsf
Gestión financiera
Gestión de proyectos
Buscador de proyectos
Información general
Aprobación
Programación
Contratación
Ejecución
Cierre
Ejercicios de Control Social
Visitas
Planes de Mejora
Planes de Contingencia
Reportes
Administración de usuarios
MUNICIPIO DE SUCRE
Código BPIN
2018000030163
CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA AGROPECUARIA MARISCAL SUCRE, EN EL MUNICIPIO DE SUCRE, DEPARTAMENTO DEL CAUCA
Paso a Paso
Aprobación y Envío
Confirmación
Se guardó correctamente la información de Adicionar Aprobación de Información
Aceptar
Detalle Información Entidad Ejecu
Nombre Entidad
MUNICIPIO DE SUCRE
NIT
817003440-5
Adicionar Aprobación de Información
Adicionar Aprobación de Reporte de Información
Se acredita que la información aprobada y enviada es veraz, confiable, idónea e integra y corresponde con los soportes documentales que reposan en los archivos de esta entidad en la fecha de este reporte. (art. 17 de la Ley 1712 de 2014; art. 2.2.4.2.1.4., 2.2.4.2.2.1.2. y 2.2.4.2.4.2. del Decreto 1082 de 2015)
Mostrar 10
registros por página
Buscar
Año Reporte
Mes Reporte
Usuario
Fecha de Aprobación
Justificación No Reporte Información
Justificación No Reporte Ejecución
Justificación No Cierre Proyecto
2024 Junio CARLOS RUBER MORA MORA 13/07/2024
2024 Mayo CARLOS RUBER MORA MORA 15/06/2024
2024 Abril CARLOS RUBER MORA MORA 13/05/2024
2024 Marzo CARLOS RUBER MORA 15/04/2024
9:05 a. m.
13/07/2024

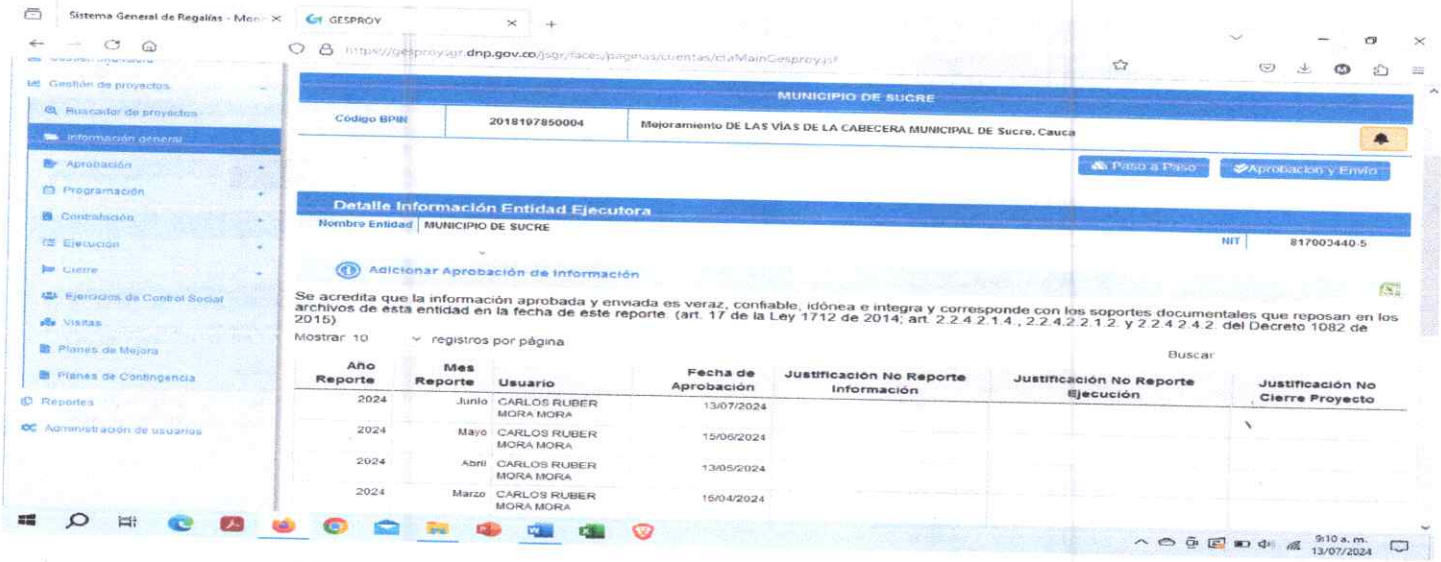

Sistema General de Regalías - Mon
GESPROY
https://gesproysgr.dnp.gov.co/jsgr/faces/paginas/cuentas/ctaMainGesproy.jsf
Gestión financiera
Gestión de proyectos
Buscador de proyectos
Información general
Aprobación
Programación
Contratación
Ejecución
Cierre
Ejercicios de Control Social
Visitas
Planes de Mejora
Planes de Contingencia
Reportes
Administración de usuarios
MUNICIPIO DE SUCRE
Código BPIN
2018000030163
CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA AGROPECUARIA MARISCAL SUCRE, EN EL MUNICIPIO DE SUCRE, DEPARTAMENTO DEL CAUCA
Paso a Paso
Aprobación y Envío
Detalle Información Entidad Ejecutora
Nombre Entidad
MUNICIPIO DE SUCRE
NIT
817003440-5
Adicionar Aprobación de Información
Se acredita que la información aprobada y enviada es veraz, confiable, idónea e integra y corresponde con los soportes documentales que reposan en los archivos de esta entidad en la fecha de este reporte. (art. 17 de la Ley 1712 de 2014; art. 2.2.4.2.1.4., 2.2.4.2.2.1.2. y 2.2.4.2.4.2. del Decreto 1082 de 2015)
Mostrar 10
registros por página
Buscar
Año Reporte
Mes Reporte
Usuario
Fecha de Aprobación
Justificación No Reporte Información
Justificación No Reporte Ejecución
Justificación No Cierre Proyecto
2024 Junio CARLOS RUBER MORA MORA 13/07/2024
2024 Mayo CARLOS RUBER MORA MORA 15/06/2024
2024 Abril CARLOS RUBER MORA MORA 13/05/2024
2024 Marzo CARLOS RUBER MORA 15/04/2024
9:05 a. m.
13/07/2024

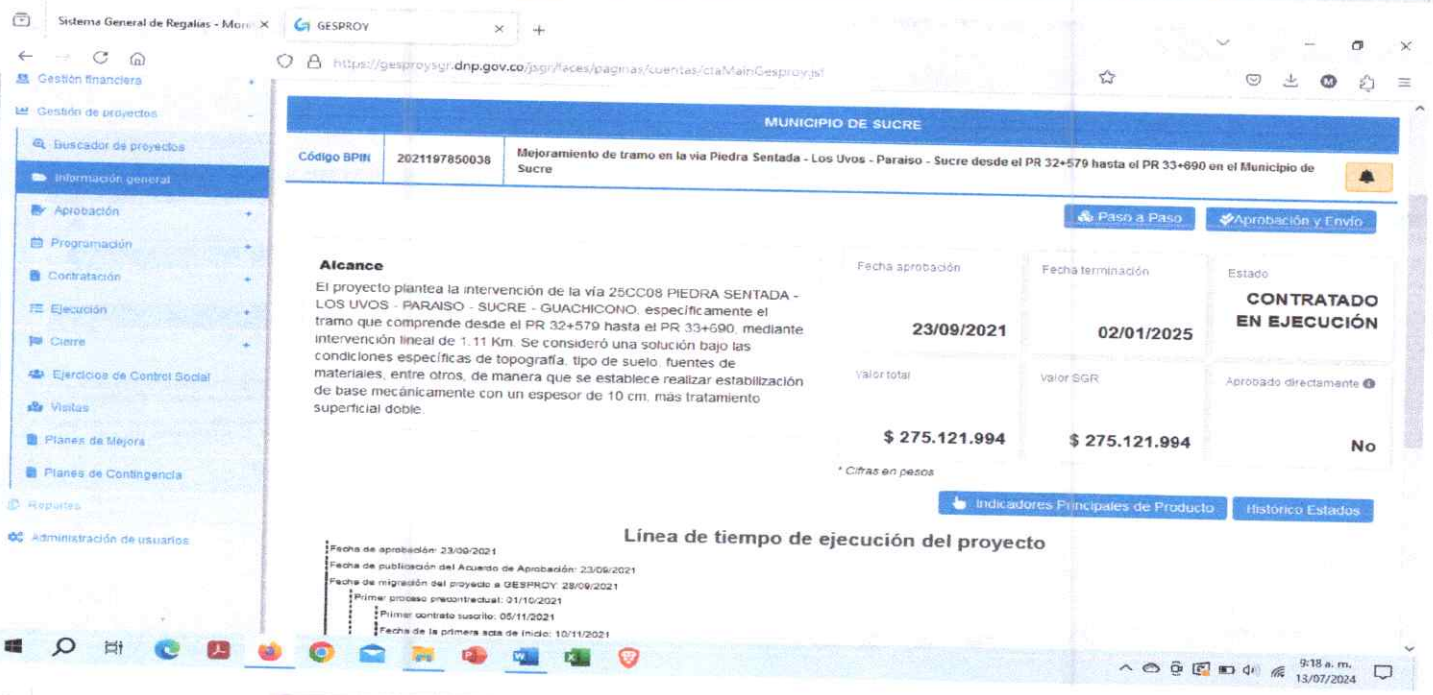

Sistema General de Regalías - Mon
GESPROY
https://gesproysgr.dnp.gov.co/jsgr/faces/paginas/cuentas/ctaMainGesproy.jsf
Gestión de proyectos
Buscador de proyectos
Información general
Aprobación
Programación
Contratación
Ejecución
Cierre
Ejercicios de Control Social
Visitas
Planes de Mejora
Planes de Contingencia
Reportes
Administración de usuarios
MUNICIPIO DE SUCRE
Código BPIN
2018197850004
Mejoramiento DE LAS VÍAS DE LA CABECERA MUNICIPAL DE Sucre, Cauca
Paso a Paso
Aprobación y Envío
Alcance
EL PROYECTO PLANTEA LA CONTRUCCIÓN DE 0,8 KM DE PAVIMENTO RIGIDO, CON UN ANCHO DE 4. 00 MS, ANDENES Y CONFINADA CON BORDILLOS EN CONCRETO FUNDIDO. DE 0,30 A 0,35 METROS DE ANCHO, CON CUNETA REVESTIDA EN CONCRETO Y LA SEÑALIZACIÓN Y CONTROL DEL TRANSITO EN TODAS LAS VÍAS INTERVENIDAS. CON LINEA DE DEMARCACIÓN CON PINTURA EN FRIO . SEÑALIZACION VERTICAL GRUPO I.
Fecha aprobación
17/05/2019
Fecha terminación
12/05/2025
Estado
CONTRATADO EN EJECUCIÓN
Valor total
$ 1.396.902.738
Valor SCR
$ 905.657.487
Aprobado directamente
No
* Cifras en pesos
Indicadores Principales de Producto
Histórico Estados
Línea de tiempo de ejecución del proyecto
Fecha de aprobación: 17/05/2019
Fecha de migración del proyecto a GESPROY: 05/06/2019
Fecha del certificado del cumplimiento de requisitos de ejecución: 18/06/2019
Primer proceso precontractual: 13/07/2019
Primer contrato suscrito: 03/09/2019
Fecha de la primera acta de inicio: 10/09/2019
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
9:06 a. m.
13/07/2024

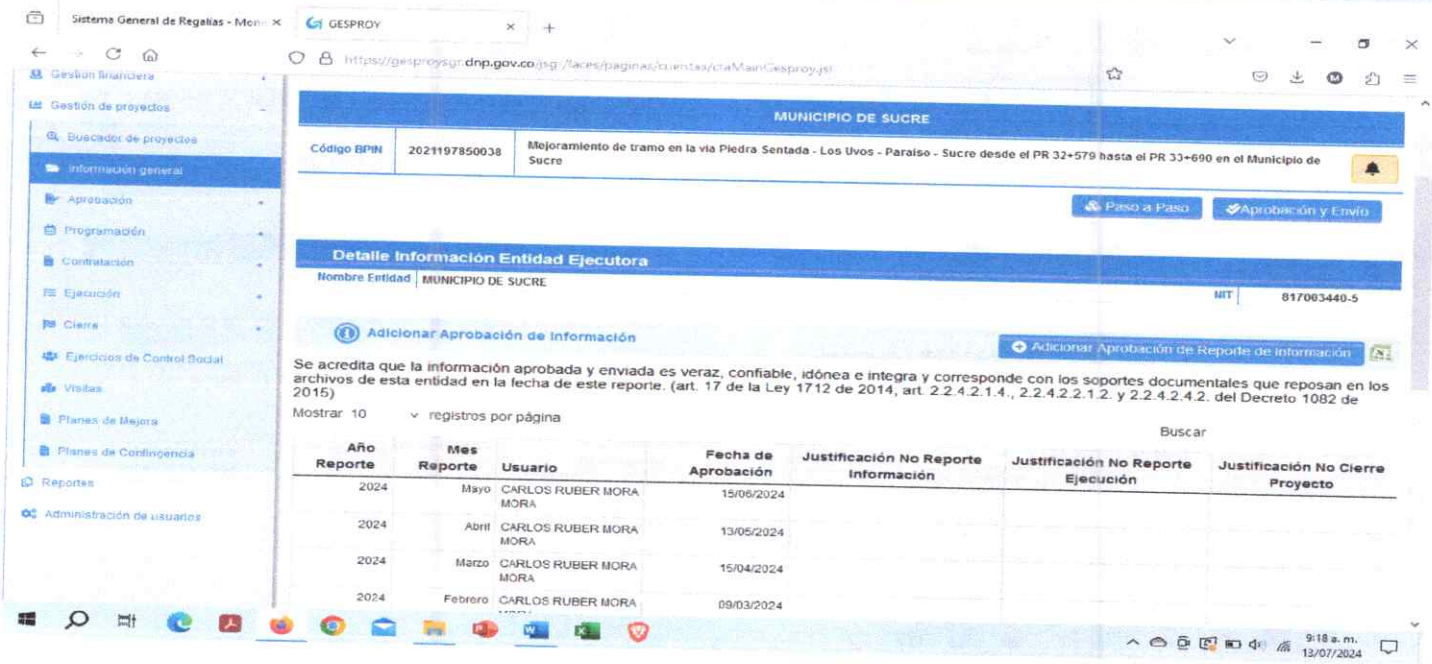

Sistema General de Regalías - Mon
GESPROY
https://gesproysgr.dnp.gov.co/jsgr/faces/paginas/cuentas/ctaMainGesproy.jsf
Gestión de proyectos
Buscador de proyectos
Información general
Aprobación
Programación
Contratación
Ejecución
Cierre
Ejercicios de Control Social
Visitas
Planes de Mejora
Planes de Contingencia
Reportes
Administración de usuarios
MUNICIPIO DE SUCRE
Código BPIN
2018197850004
Mejoramiento DE LAS VÍAS DE LA CABECERA MUNICIPAL DE Sucre, Cauca
Aval del representante legal de la información registrada por periodo
Aprobación y Envío
Detalle Información Entidad Ejecutora
Nombre Entidad
MUNICIPIO DE SUCRE
NIT
817003440-5
Adicionar Aprobación de Información
Adicionar Aprobación de Reporte de Información
Se acredita que la información aprobada y enviada es veraz, confiable, idónea e integra y corresponde con los soportes documentales que reposan en los archivos de esta entidad en la fecha de este reporte. (art. 17 de la Ley 1712 de 2014; art. 2.2.4.2.1.4., 2.2.4.2.2.1.2. y 2.2.4.2.4.2. del Decreto 1082 de 2015)
Mostrar 10 registros por página
Buscar
Año Reporte
Mes Reporte
Usuario
Fecha de Aprobación
Justificación No Reporte Información
Justificación No Reporte Ejecución
Justificación No Cierre Proyecto
2024 Mayo CARLOS RUBER MORA MORA 15/06/2024
2024 Abril CARLOS RUBER MORA MORA 13/05/2024
2024 Marzo CARLOS RUBER MORA MORA 15/04/2024
2024 Febrero CARLOS RUBER MORA MORA 09/03/2024
https://ocilbprd.dnp.gov.co:5555/AprobacionInformacion/index.jsf
9:08 a. m.
13/07/2024

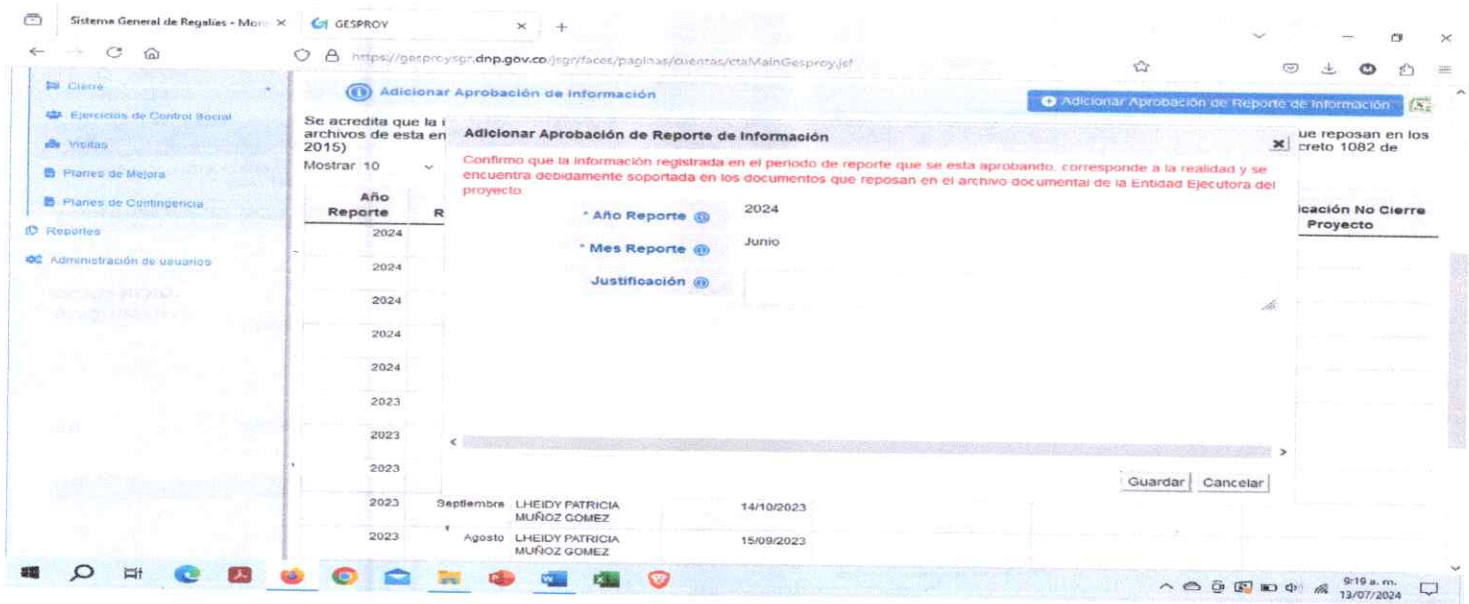

Sistema General de Regalías - Mon
GESPROY
https://gesproysgr.dnp.gov.co/jsgr/faces/paginas/cuentas/ctaMainGesproy.jsf
Gestión financiera
Gestión de proyectos
Buscador de proyectos
Información general
Aprobación
Programación
Contratación
Ejecución
Cierre
Ejercicios de Control Social
Visitas
Planes de Mejora
Planes de Contingencia
Reportes
Administración de usuarios
MUNICIPIO DE SUCRE
Código BPIN
2018197850004
Mejoramiento DE LAS VÍAS DE LA CABECERA MUNICIPAL DE Sucre, Cauca
Aprobación y Envío
NIT
817003440-5
Adicionar Aprobación de Reporte de Información
Justificación No Cierre Proyecto
Adicionar Aprobación de Reporte de Información
Confirmo que la información registrada en el periodo de reporte que se esta aprobando, corresponde a la realidad y se encuentra debidamente soportada en los documentos que reposan en el archivo documental de la Entidad Ejecutora del proyecto.
* Año Reporte
2024
* Mes Reporte
Junio
Justificación
Guardar
Cancelar
9:08 a. m.
13/07/2024

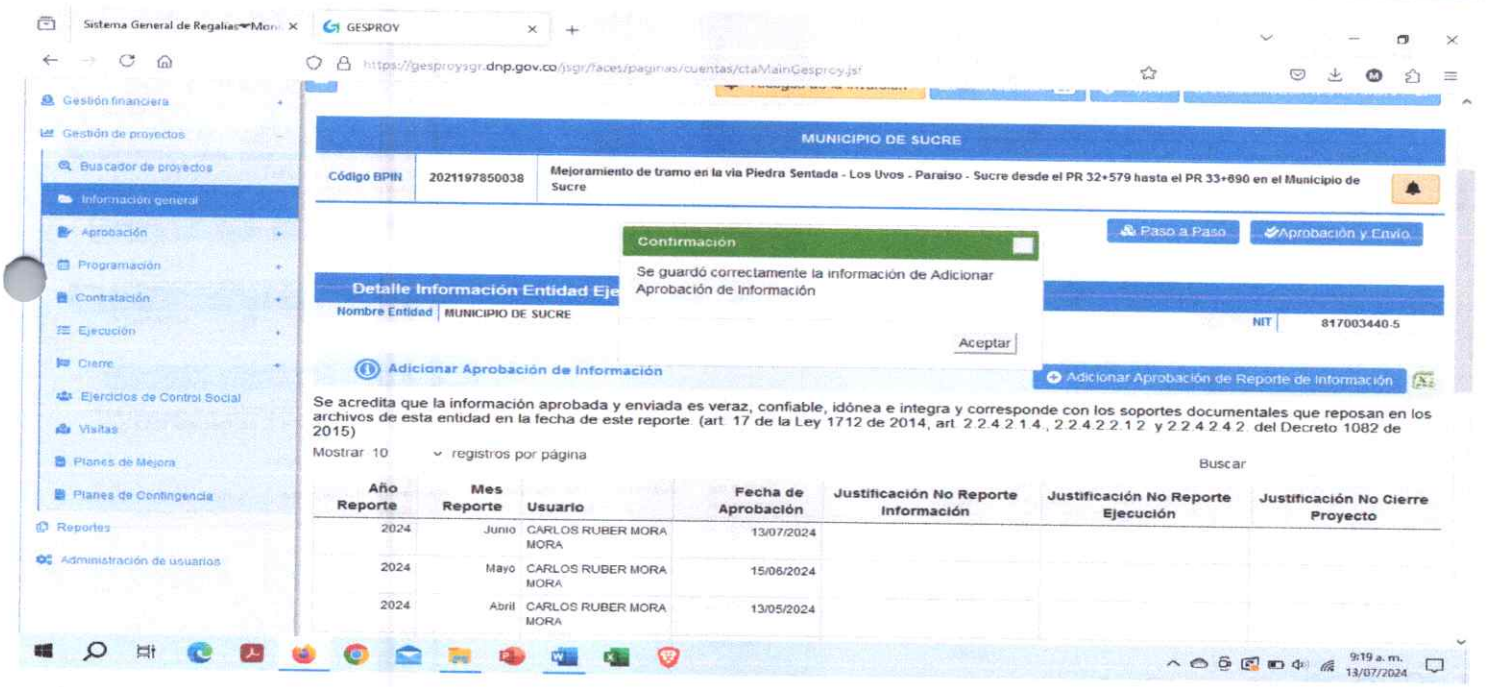

Sistema General de Regalías - Mon
GESPROY
https://gesproysgr.dnp.gov.co/jsgr/faces/paginas/cuentas/ctaMainGesproy.jsf
Gestión de proyectos
Buscador de proyectos
Información general
Aprobación
Programación
Contratación
Ejecución
Cierre
Ejercicios de Control Social
Visitas
Planes de Mejora
Planes de Contingencia
Reportes
Administración de usuarios
MUNICIPIO DE SUCRE
Código BPIN
2018197850004
Mejoramiento DE LAS VÍAS DE LA CABECERA MUNICIPAL DE Sucre, Cauca
Paso a Paso
Aprobación y Envío
Confirmación
Se guardó correctamente la información de Adicionar Aprobación de Información
Aceptar
Detalle Información Entidad Eje
Nombre Entidad
MUNICIPIO DE SUCRE
NIT
817003440-5
Adicionar Aprobación de Información
Adicionar Aprobación de Reporte de Información
Se acredita que la información aprobada y enviada es veraz, confiable, idónea e integra y corresponde con los soportes documentales que reposan en los archivos de esta entidad en la fecha de este reporte. (art. 17 de la Ley 1712 de 2014; art. 2.2.4.2.1.4., 2.2.4.2.2.1.2. y 2.2.4.2.4.2. del Decreto 1082 de 2015)
Mostrar 10 registros por página
Buscar
Año Reporte
Mes Reporte
Usuario
Fecha de Aprobación
Justificación No Reporte Información
Justificación No Reporte Ejecución
Justificación No Cierre Proyecto
2024 Junio CARLOS RUBER MORA MORA 13/07/2024
2024 Mayo CARLOS RUBER MORA MORA 15/06/2024
2024 Abril CARLOS RUBER MORA MORA 13/05/2024
2024 Marzo CARLOS RUBER MORA MORA 15/04/2024
9:09 a. m.
13/07/2024

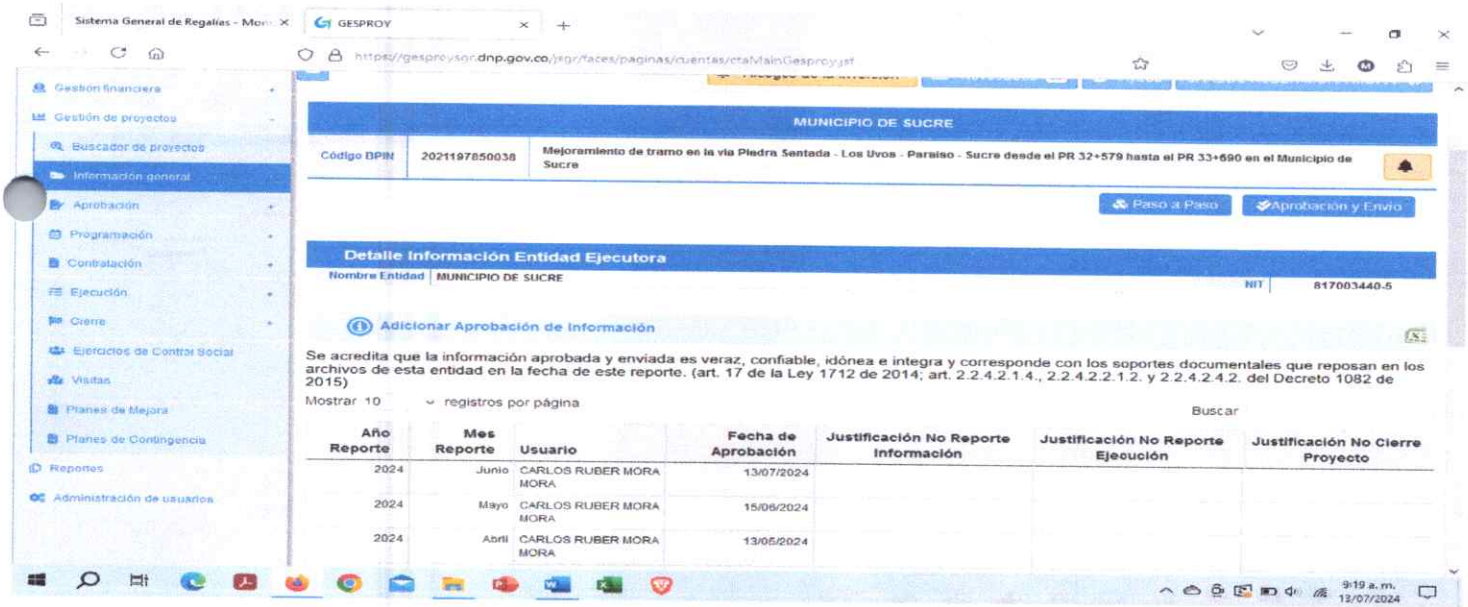

Sistema General de Regalías - Mon
GESPROY
https://gesproysgr.dnp.gov.co/jsgr/faces/paginas/cuentas/ctaMainGesproy.jsf
Gestión de proyectos
Buscador de proyectos
Información general
Aprobación
Programación
Contratación
Ejecución
Cierre
Ejercicios de Control Social
Visitas
Planes de Mejora
Planes de Contingencia
Reportes
Administración de usuarios
MUNICIPIO DE SUCRE
Código BPIN
2018197850004
Mejoramiento DE LAS VÍAS DE LA CABECERA MUNICIPAL DE Sucre, Cauca
Paso a Paso
Aprobación y Envío
Detalle Información Entidad Ejecutora
Nombre Entidad
MUNICIPIO DE SUCRE
NIT
817003440-5
Adicionar Aprobación de Información
Se acredita que la información aprobada y enviada es veraz, confiable, idónea e integra y corresponde con los soportes documentales que reposan en los archivos de esta entidad en la fecha de este reporte. (art. 17 de la Ley 1712 de 2014; art. 2.2.4.2.1.4., 2.2.4.2.2.1.2. y 2.2.4.2.4.2. del Decreto 1082 de 2015)
Mostrar 10
registros por página
Buscar
Año Reporte
Mes Reporte
Usuario
Fecha de Aprobación
Justificación No Reporte Información
Justificación No Reporte Ejecución
Justificación No Cierre Proyecto
2024 Junio CARLOS RUBER MORA MORA 13/07/2024
2024 Mayo CARLOS RUBER MORA MORA 15/06/2024
2024 Abril CARLOS RUBER MORA MORA 13/05/2024
2024 Marzo CARLOS RUBER MORA MORA 16/04/2024
9:10 a. m.
13/07/2024

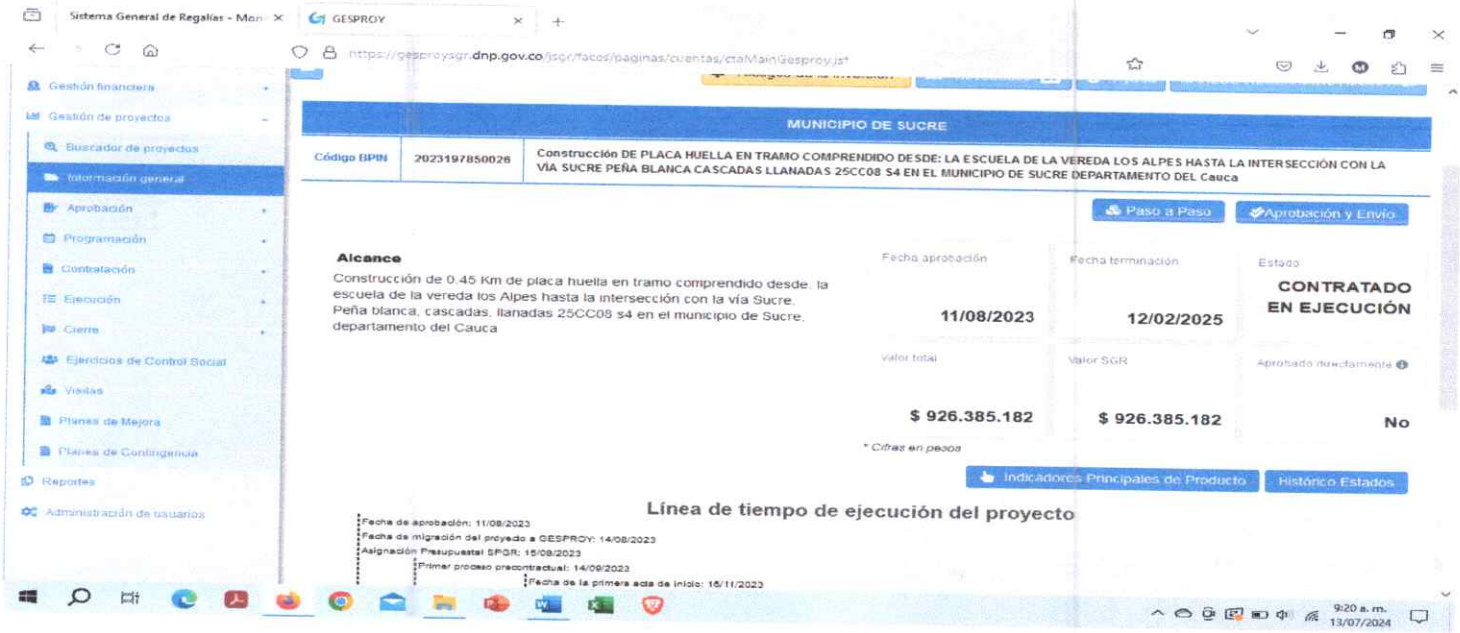

Sistema General de Regalías - Mon
GESPROY
https://gesproysgr.dnp.gov.co/jsgr/faces/paginas/cuentas/ctaMainGesproy.jsf
Gestión financiera
Gestión de proyectos
Buscador de proyectos
Información general
Aprobación
Programación
Contratación
Ejecución
Cierre
Ejercicios de Control Social
Visitas
Planes de Mejora
Planes de Contingencia
Reportes
Administración de usuarios
MUNICIPIO DE SUCRE
Código BPIN
2021197850038
Mejoramiento de tramo en la vía Piedra Sentada - Los Uvos - Paraíso - Sucre desde el PR 32+579 hasta el PR 33+690 en el Municipio de Sucre
Paso a Paso
Aprobación y Envío
Alcance
El proyecto plantea la intervención de la vía 25CC08 PIEDRA SENTADA - LOS UVOS - PARAISO - SUCRE - GUACHICONO, específicamente el tramo que comprende desde el PR 32+579 hasta el PR 33+690, mediante intervención lineal de 1.11 Km. Se consideró una solución bajo las condiciones específicas de topografía, tipo de suelo, fuentes de materiales, entre otros, de manera que se establece realizar estabilización de base mecánicamente con un espesor de 10 cm, más tratamiento superficial doble.
Fecha aprobación
23/09/2021
Fecha terminación
02/01/2025
Estado
CONTRATADO EN EJECUCIÓN
Valor total
$ 275.121.994
Valor SGR
$ 275.121.994
Aprobado directamente
No
* Cifras en pesos
Indicadores Principales de Producto
Histórico Estados
Línea de tiempo de ejecución del proyecto
Fecha de aprobación: 23/09/2021
Fecha de publicación del Acuerdo de Aprobación: 23/09/2021
Fecha de migración del proyecto a GESPROY: 28/09/2021
Primer proceso precontractual: 01/10/2021
Primer contrato suscrito: 05/11/2021
Fecha de la primera acta de inicio: 10/11/2021
9:18 a. m.
13/07/2024

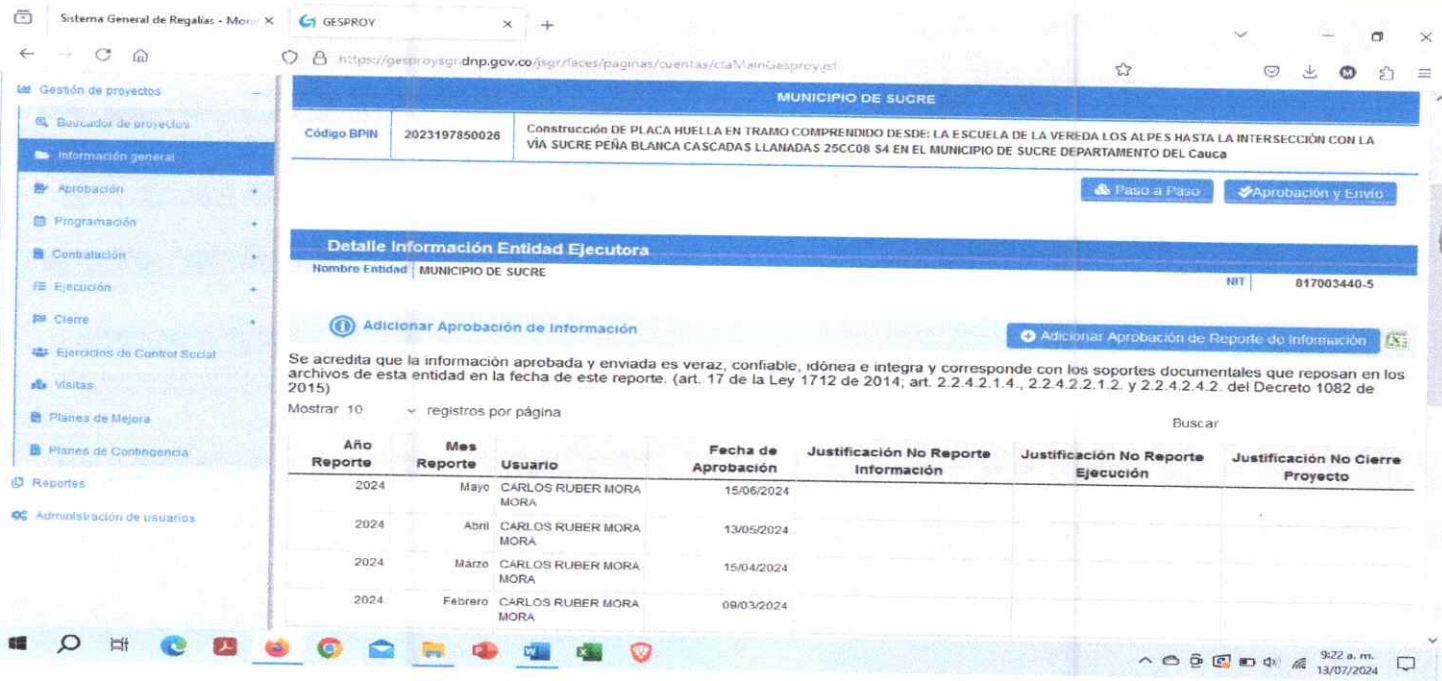

Sistema General de Regalías - Mon
GESPROY
https://gesproysgr.dnp.gov.co/jsgr/faces/paginas/cuentas/ctaMainGesproy.jsf
Gestión financiera
Gestión de proyectos
Buscador de proyectos
Información general
Aprobación
Programación
Contratación
Ejecución
Cierre
Ejercicios de Control Social
Visitas
Planes de Mejora
Planes de Contingencia
Reportes
Administración de usuarios
MUNICIPIO DE SUCRE
Código BPIN
2021197850038
Mejoramiento de tramo en la vía Piedra Sentada - Los Uvos - Paraíso - Sucre desde el PR 32+579 hasta el PR 33+690 en el Municipio de Sucre
Paso a Paso
Aprobación y Envío
Detalle Información Entidad Ejecutora
Nombre Entidad
MUNICIPIO DE SUCRE
NIT
817003440-5
Adicionar Aprobación de Información
Adicionar Aprobación de Reporte de información
Se acredita que la información aprobada y enviada es veraz, confiable, idónea e integra y corresponde con los soportes documentales que reposan en los archivos de esta entidad en la fecha de este reporte. (art. 17 de la Ley 1712 de 2014; art. 2.2.4.2.1.4., 2.2.4.2.2.1.2. y 2.2.4.2.4.2. del Decreto 1082 de 2015)
Mostrar 10
registros por página
Buscar
Año Reporte
Mes Reporte
Usuario
Fecha de Aprobación
Justificación No Reporte Información
Justificación No Reporte Ejecución
Justificación No Cierre Proyecto
2024 Mayo CARLOS RUBER MORA MORA 15/06/2024
2024 Abril CARLOS RUBER MORA MORA 13/05/2024
2024 Marzo CARLOS RUBER MORA MORA 15/04/2024
2024 Febrero CARLOS RUBER MORA 09/03/2024
9:18 a. m.
13/07/2024

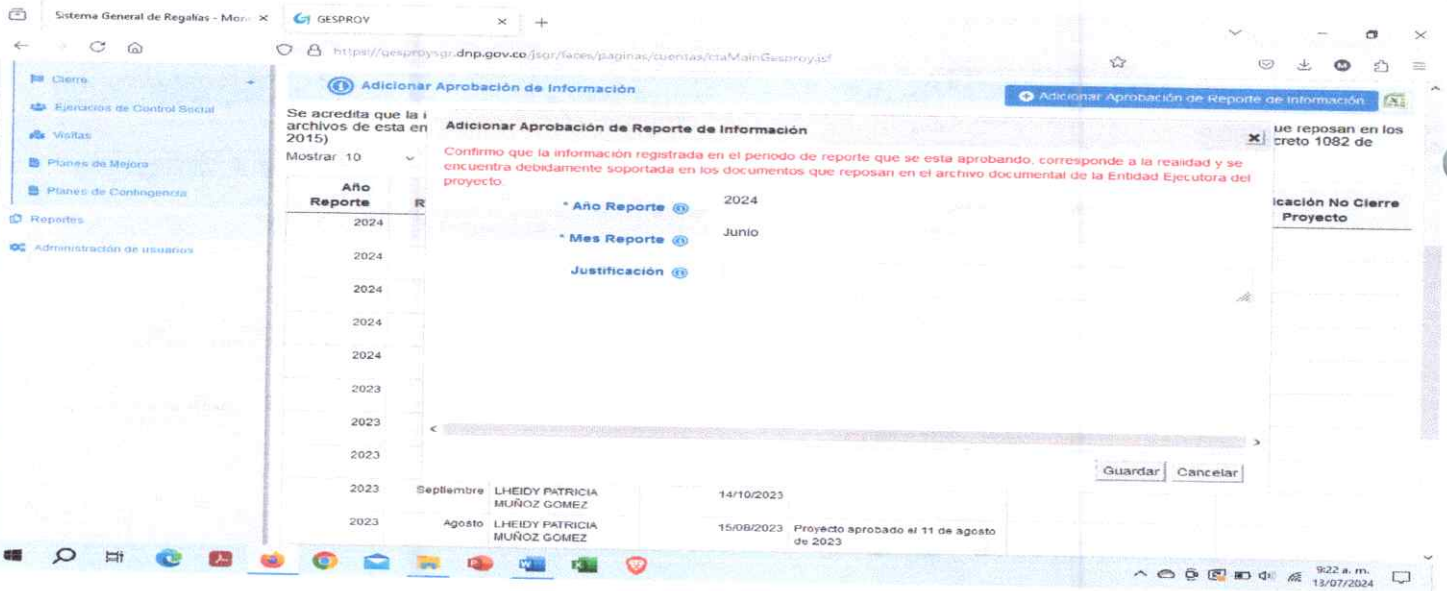

Sistema General de Regalías - Mon
GESPROY
https://gesproysgr.dnp.gov.co/jsgr/faces/paginas/cuentas/ctaMainGesproy.jsf
Cierre
Ejercicios de Control Social
Visitas
Planes de Mejora
Planes de Contingencia
Reportes
Administración de usuarios
Adicionar Aprobación de Información
Adicionar Aprobación de Reporte de Información
Se acredita que la i
archivos de esta en
2015)
Mostrar 10
Adicionar Aprobación de Reporte de Información
Confirmo que la información registrada en el periodo de reporte que se esta aprobando, corresponde a la realidad y se encuentra debidamente soportada en los documentos que reposan en el archivo documental de la Entidad Ejecutora del proyecto.
* Año Reporte
2024
* Mes Reporte
Junio
Justificación
Guardar
Cancelar
Año Reporte
2024
2024
2024
2024
2024
2024
2023
2023
2023
2023 Septiembre LHEIDY PATRICIA MUÑOZ GOMEZ 14/10/2023
2023 Agosto LHEIDY PATRICIA MUÑOZ GOMEZ 15/09/2023
9:19 a. m.
13/07/2024


Sistema General de Regalías - Mon
GESPROY
https://gesproysgr.dnp.gov.co/jsgr/faces/paginas/cuentas/ctaMainGesproy.jsf
Gestión financiera
Gestión de proyectos
Buscador de proyectos
Información general
Aprobación
Programación
Contratación
Ejecución
Cierre
Ejercicios de Control Social
Visitas
Planes de Mejora
Planes de Contingencia
Reportes
Administración de usuarios
MUNICIPIO DE SUCRE
Código BPIN 2021197850038
Mejoramiento de tramo en la via Piedra Sentada - Los Uvos - Paraiso - Sucre desde el PR 32+579 hasta el PR 33+690 en el Municipio de Sucre
Paso a Paso
Aprobación y Envío
Confirmación
Se guardó correctamente la información de Adicionar Aprobación de Información
Aceptar
Detalle Información Entidad Eje
Nombre Entidad MUNICIPIO DE SUCRE
NIT 817003440-5
Adicionar Aprobación de Información
Adicionar Aprobación de Reporte de Información
Se acredita que la información aprobada y enviada es veraz, confiable, idónea e integra y corresponde con los soportes documentales que reposan en los archivos de esta entidad en la fecha de este reporte. (art. 17 de la Ley 1712 de 2014, art. 2.2.4.2.1.4., 2.2.4.2.2.1.2. y 2.2.4.2.4.2. del Decreto 1082 de 2015)
Mostrar 10 registros por página
Buscar
Año Reporte | Mes Reporte | Usuario | Fecha de Aprobación | Justificación No Reporte Información | Justificación No Reporte Ejecución | Justificación No Cierre Proyecto
2024 Junio CARLOS RUBER MORA MORA 13/07/2024
2024 Mayo CARLOS RUBER MORA MORA 15/06/2024
2024 Abril CARLOS RUBER MORA MORA 13/05/2024
9:19 a. m.
13/07/2024


Sistema General de Regalías - Mon
GESPROY
https://gesproysgr.dnp.gov.co/jsgr/faces/paginas/cuentas/ctaMainGesproy.jsf
Gestión financiera
Gestión de proyectos
Buscador de proyectos
Información general
Aprobación
Programación
Contratación
Ejecución
Cierre
Ejercicios de Control Social
Visitas
Planes de Mejora
Planes de Contingencia
Reportes
Administración de usuarios
MUNICIPIO DE SUCRE
Código BPIN 2021197850038
Mejoramiento de tramo en la via Piedra Sentada - Los Uvos - Paraiso - Sucre desde el PR 32+579 hasta el PR 33+690 en el Municipio de Sucre
Paso a Paso
Aprobación y Envío
Detalle Información Entidad Ejecutora
Nombre Entidad MUNICIPIO DE SUCRE
NIT 817003440-5
Adicionar Aprobación de Información
Se acredita que la información aprobada y enviada es veraz, confiable, idónea e integra y corresponde con los soportes documentales que reposan en los archivos de esta entidad en la fecha de este reporte. (art. 17 de la Ley 1712 de 2014; art. 2.2.4.2.1.4., 2.2.4.2.2.1.2. y 2.2.4.2.4.2. del Decreto 1082 de 2015)
Mostrar 10 registros por página
Buscar
Año Reporte | Mes Reporte | Usuario | Fecha de Aprobación | Justificación No Reporte Información | Justificación No Reporte Ejecución | Justificación No Cierre Proyecto
2024 Junio CARLOS RUBER MORA MORA 13/07/2024
2024 Mayo CARLOS RUBER MORA MORA 15/06/2024
2024 Abril CARLOS RUBER MORA MORA 13/05/2024
9:19 a. m.
13/07/2024


Sistema General de Regalías - Mon
GESPROY
https://gesproysgr.dnp.gov.co/jsgr/faces/paginas/cuentas/ctaMainGesproy.jsf
Gestión financiera
Gestión de proyectos
Buscador de proyectos
Información general
Aprobación
Programación
Contratación
Ejecución
Cierre
Ejercicios de Control Social
Visitas
Planes de Mejora
Planes de Contingencia
Reportes
Administración de usuarios
MUNICIPIO DE SUCRE
Código BPIN
2023197850026
Construcción DE PLACA HUELLA EN TRAMO COMPRENDIDO DESDE: LA ESCUELA DE LA VEREDA LOS ALPES HASTA LA INTERSECCIÓN CON LA VÍA SUCRE PEÑA BLANCA CASCADAS LLANADAS 25CC08 S4 EN EL MUNICIPIO DE SUCRE DEPARTAMENTO DEL Cauca
Paso a Paso
Aprobación y Envío
Alcance
Construcción de 0.45 Km de placa huella en tramo comprendido desde: la escuela de la vereda los Alpes hasta la intersección con la vía Sucre. Peña blanca, cascadas, llanadas 25CC08 s4 en el municipio de Sucre, departamento del Cauca
Fecha aprobación
11/08/2023
Fecha terminación
12/02/2025
Estado
CONTRATADO EN EJECUCIÓN
Valor total
$ 926.385.182
Valor SGR
$ 926.385.182
Aprobado oficialmente
No
* Cifras en pesos
Indicadores Principales de Producto
Histórico Estados
Línea de tiempo de ejecución del proyecto
Fecha de aprobación: 11/08/2023
Fecha de migración del proyecto a GESPROY: 14/08/2023
Asignación Presupuestal SPGR: 15/08/2023
Primer proceso precontractual: 14/09/2023
Fecha de la primera acta de inicio: 16/11/2023
9:20 a. m.
13/07/2024


Sistema General de Regalías - Mon
GESPROY
https://gesproysgr.dnp.gov.co/jsgr/faces/paginas/cuentas/ctaMainGesproy.jsf
Gestión de proyectos
Buscador de proyectos
Información general
Aprobación
Programación
Contratación
Ejecución
Cierre
Ejercicios de Control Social
Visitas
Planes de Mejora
Planes de Contingencia
Reportes
Administración de usuarios
MUNICIPIO DE SUCRE
Código BPIN
2023197850026
Construcción DE PLACA HUELLA EN TRAMO COMPRENDIDO DESDE: LA ESCUELA DE LA VEREDA LOS ALPES HASTA LA INTERSECCIÓN CON LA VÍA SUCRE PEÑA BLANCA CASCADAS LLANADAS 25CC08 S4 EN EL MUNICIPIO DE SUCRE DEPARTAMENTO DEL Cauca
Paso a Paso
Aprobación y Envío
Detalle Información Entidad Ejecutora
Nombre Entidad
MUNICIPIO DE SUCRE
NIT
817003440-5
Adicionar Aprobación de Información
Adicionar Aprobación de Reporte de Información
Se acredita que la información aprobada y enviada es veraz, confiable, idónea e integra y corresponde con los soportes documentales que reposan en los archivos de esta entidad en la fecha de este reporte. (art. 17 de la Ley 1712 de 2014; art. 2.2.4.2.1.4., 2.2.4.2.2.1.2. y 2.2.4.2.4.2. del Decreto 1082 de 2015)
Mostrar 10 registros por página
Buscar
Año Reporte
Mes Reporte
Usuario
Fecha de Aprobación
Justificación No Reporte Información
Justificación No Reporte Ejecución
Justificación No Cierre Proyecto
2024 Mayo CARLOS RUBER MORA MORA 15/06/2024
2024 Abril CARLOS RUBER MORA MORA 13/05/2024
2024 Marzo CARLOS RUBER MORA MORA 15/04/2024
2024 Febrero CARLOS RUBER MORA MORA 09/03/2024
9:22 a. m.
13/07/2024


Sistema General de Regalías - Mon
GESPROY
Cierre
Ejercicios de Control Social
Visitas
Planes de Mejora
Planes de Contingencia
Reportes
Administración de usuarios
Adicionar Aprobación de Información
Adicionar Aprobación de Reporte de Información
Adicionar Aprobación de Reporte de Información
Confirmo que la información registrada en el periodo de reporte que se esta aprobando, corresponde a la realidad y se encuentra debidamente soportada en los documentos que reposan en el archivo documental de la Entidad Ejecutora del proyecto.
* Año Reporte
2024
* Mes Reporte
Junio
Justificación
Guardar
Cancelar
Año Reporte
Mes Reporte
Usuario
Fecha de Aprobación
Justificación No Cierre Proyecto
2023 Septiembre LHEIDY PATRICIA MUÑOZ GOMEZ 14/10/2023
2023 Agosto LHEIDY PATRICIA MUÑOZ GOMEZ 15/08/2023 Proyecto aprobado el 11 de agosto de 2023
9:22 a. m.
13/07/2024
