Comité Extraordinario / Proyecto "Implementación de servicios de Conectividad 3G/4G y zonas públicas WIFI en la Bogotá-Región del Sumapaz Bogotá"

ACTA No. 1-2024

FECHA: 25 de septiembre de 2024

HORA: 11:00 a. m.

LUGAR: Sala Barulé 3 -4 Alcaldía Mayor de Bogotá.

ORDEN DEL DIA:

1º. Verificación de Quórum
2º. Lectura, discusión y aprobación del Acta anterior
3º. Desarrollo
4º. Seguimiento Cronograma.
5°. Ejecución Presupuestal.
6°. Desempeño del proyecto.
7°. Línea de tiempo de ejecución del proyecto.
8°. Avances significativos por resaltar.
9°. Seguimiento Administrativo y Financiero a la ejecución de los recursos del proyecto.
10°. Actividades de control social a la ejecución del proyecto.
11°. Alertas.

DESARROLLO:

1º. Verificación de quórum.

Se efectuó la verificación del quórum, iniciando la reunión.

2º. Lectura, discusión y aprobación del Acta anterior

Se dio lectura al Acta anterior, la cual fue aprobada por unanimidad.

3º. Desarrollo.

Con el objeto de dar cumplimiento a la actividad **8. Ejecutar y hacer seguimiento al proyecto aprobado del Procedimiento 1210200-PR-306 Asesoría Técnica o formulación y ejecución de proyectos en el Distrito Capital,** nos reunimos los funcionarios relacionados en el presente documento, para conocer el avance y logros, así como los retrasos y dificultades de las actividades o hitos del proyecto "IMPLEMENTACIÓN DE SERVICIOS DE CONECTIVIDAD 3G4G Y ZONAS PÚBLICAS WIFI EN LA BOGOTÁ-REGIÓN DEL SUMAPAZ BOGOTÁ", identificado con código BPIN 2021011010005 y financiado con recursos del Sistema General de Regalías, presentados a la fecha.

Se inicia la sesión de seguimiento con el estado del proyecto con corte al mes de septiembre 2024, efectuando revisión a los compromisos pendientes por parte del operador respecto al cumplimiento de Hitos de las BTS:

BTS de San Juan: ETB confirmó que fue energizada el 11 de septiembre de 2024.

BTS de San Antonio: ETB confirmó fecha de energización el 04 de octubre de 2024.

Sandra Moreno (Interventoría), expresa que frente al tema documental pregunta ¿Cuándo se entregara lo pendiente al tema documental de San Antonio y San Juan?

Responde Alejandro Sánchez (ETB) La entrega de San Juan y San Antonio se le avisara el 25 de septiembre de 2024, cuando se entrega.

Sandra Moreno (Interventoría), Enfatiza que la información que debe entregar es la final.

Entrega SIM:

El equipo de apoyo a la supervisión del proyecto reporta un avance de entrega del 17% que equivale a 234 tarjetas entregadas.

Zonas WIFI:

El gerente del proyecto de la ETB menciona las estadísticas del portal cautivo de las zonas wifi de San Juan y San Antonio.

Se revisó las estadísticas de zona wifi Betania en cuanto a Usuarios Únicos Atendidos, Promedio de Usuarios, Número Máximo de usuarios y Mínimo y hora de conexión.

Falla en el AP de La Unión está en revisión por mantenimiento correctivo por parte del operador.

Jhonatan Cepeda (CDTIC), Menciona que para la zona de wifi tendría una ANS de tres (3) meses donde se aplicaría el 100% y sobre el AP de Centro de Conectividad Campesina no se ha recibido por parte de ETB la mejor solución.

Centros de Conectividad Campesina (CCC).

Por parte de ETB menciona el estado de operación de cada CCC en cuanto a los diferentes servicios que presta el CCC a la localidad de Sumapaz.

Interviene Ángel Martínez (CDTIC), pregunta sobre las capacitaciones de formación para la comunidad, por lo tanto, el gerente del proyecto menciona que se está trabajando con el líder de los guías TIC, los diferentes paquetes de formación.

El gerente del proyecto ETB, menciona sobre la afectación que ha tenido los componentes del proyecto frente al vandalismo que a sufrido la localidad.

Compromisos CCC:

- Arreglo de teclado en La Unión y Nueva Granada esta actividad programada para el 9 de octubre de 2024.

- Arreglo impresora La Unión esta actividad programada para el 11 de octubre de 2024.

- Verificación Audio de PC, esta actividad programada para el 02 de octubre de 2024.

Jhonatan Cepeda (CDTIC), Expresa a la ETB revisar el tema de almacenamiento de aseo y papelería para el CCC de La Unión.

Informes de gestión ETB:

- Informe Mayo 2024: Está en proceso para entrega ante de la CDTIC.

- Informe Junio 2024: Esta pendiente la revisión de los ANS.

- Informe Julio 2024: Revisión de las observaciones por parte de la CDTIC.

- Informe Agosto 2024: Revisión de las observaciones por parte de la Interventoría.

Alejandro Sánchez (ETB): Consulta respecto a la posibilidad de unificar las observaciones por parte de la Interventoría y de CDTIC, se responde que no es posible porque los componentes se abrieron.

Interviene Leonardo Vargas (CDTIC), menciona que la mesa de ayuda (Helpdesk) no está dando respuesta en la generación de los tickets, esto genera reproceso en el momento de realizar el análisis de los ANS.

Alejandro Sánchez (ETB); Menciona que es un tema de demanda masiva por el tema de vandalismo que se ha presentado.

Por último, Ángel Martínez (Interventoría) hace énfasis en la entrega de los informes pendientes por entregar y menciona sobre el tema del cierre de Bienio.

4º. Seguimiento Cronograma.



Fuente: ETB, fecha de corte, 25 de septiembre de 2024.

La información presentada corresponde al más reciente cronograma general de actividades presentado por el proveedor ETB, el cual plantea ajustes correspondientes a los tiempos de entrega de las actividades del proyecto referentes a la instalación y

puesta en operación de las estaciones radioeléctricas BTS. De manera consolidada, se presenta la siguiente relación del estado de los componentes del proyecto:

1. **Centros de Conectividad Campesina – CCC Existentes**: Los cinco CCC existentes, ubicados en las veredas de Betania, Nazareth, La Unión, San Juan y Nueva Granada, se encuentran activos y operativos sin novedad, de acuerdo con lo estipulado en el cronograma general del proyecto.

2. **Nuevos Centros de Conectividad Campesina – CCC**: Los cinco CCC nuevos, ubicados en las veredas de San Antonio, San José, Tunal Alto, Santo Domingo y Raizal, se encuentran activos y operativos sin novedad, de acuerdo con lo estipulado en el cronograma general del proyecto.

3. **Zonas WIFI:** El proveedor ETB reporta que las cinco zonas WIFI, ubicadas en las veredas de Las Auras, Betania, La Unión, San Antonio y San Juan, se encuentran activas y operan con normalidad, de acuerdo con lo planeado en el proyecto.

4. **Estaciones Radioeléctricas BTS:** A la fecha se cuenta con las cinco estaciones (Las Auras, Betania, La Unión, San Antonio y San Juan) izadas. Las estaciones BTS de Las Auras, Betania y La Unión se encuentran activas y funcionando y las estaciones de San Juan y San Antonio se encuentran con las infraestructuras tecnológicas instaladas y preparadas para operación, pero están pendientes de la instalación de las acometidas eléctricas finales por parte de ENEL Codensa. Se espera que la operación de energización culmine en el mes de octubre.

5. **Capacitaciones realizadas:** Con corte a septiembre, se reporta la realización de 65 capacitaciones, beneficiando a un total de 1.091 beneficiarios en las acciones de formación.

6. **Entrega SIM Cards:** Se programa inicio de entrega de 1.338 SIM Cards para la comunidad, a partir del 09 de septiembre de 2024. Con corte a la fecha, se cuenta con 234 entregas y se espera culminar con la totalidad de las tarjetas SIM restantes durante el mes de octubre de 2024.

5°. Ejecución Presupuestal.

Con corte a septiembre de 2024, se reporta la siguiente ejecución presupuestal:

a. Presupuesto general del proyecto:

Presupuesto aprobado:	$44.896.748.913
Presupuesto comprometido:	$43.784.394.066
Pagos a la fecha:	$13.203.740.948
Compromisos por pagar:	$30.580.653.118
Saldo por comprometer:	$1.112.354.847

b. Contrato ETB:

Valor contrato a la fecha:	$38.443.869.008
Valor pagado a la fecha:	$8.871.398.092
Pendiente por pagar:	$29.572.470.916
ANS identificados a la fecha:	$197.592.990

c. Contrato Interventoría

Valor contrato a la fecha:	$2.966.892.050
Valor pagado a la fecha:	$2.446.560.642
Pendiente por pagar:	$520.331.408


d. Contrato de Transporte

Valor contrato a la fecha:	$277.200.000
Valor pagado a la fecha:	$74.673.871
Pendiente por pagar:	$202.526.129

e. Contratos de prestación de servicios profesionales (Apoyo a la supervisión del proyecto

Valor contratos a la fecha:	$2.096.433.008
Valor pagado a la fecha:	$1.811.108.343
Pendiente por pagar:	$285.324.665

6°. Desempeño del proyecto.

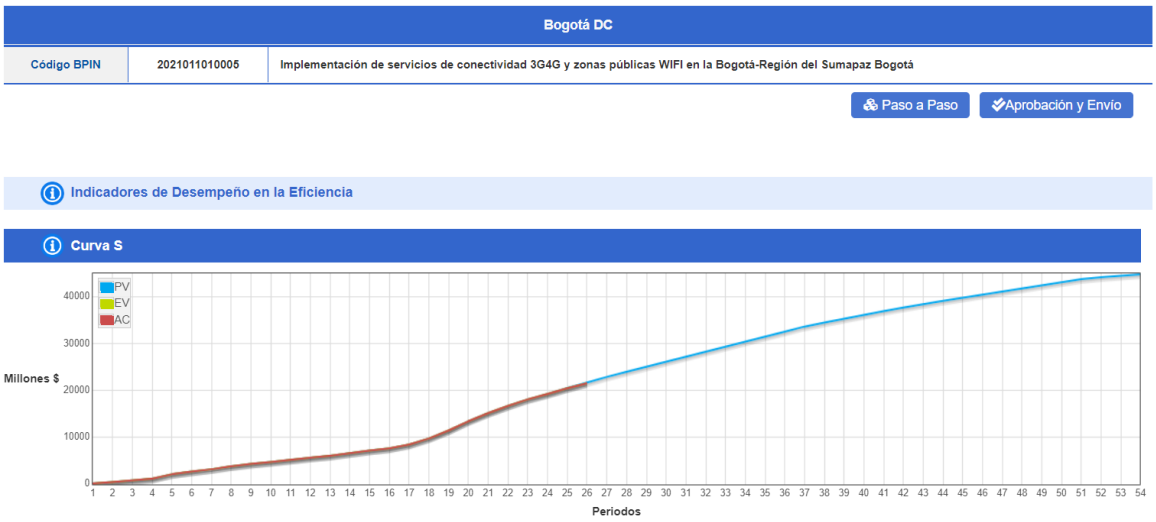

Curva "S" del proyecto. Fuente: Plataforma GESPROY SGR – DNP, fecha de corte 20/09/2024.

Reporte de avance físico y financiero – Plataforma Gesproy, con fecha de corte correspondiente al mes de Agosto de 2024 (Es pertinente indicar que la plataforma GESPROY SGR presenta la información con corte al mes inmediatamente anterior)**:**


Avance Físico (%) 48,21% **Avance Financiero (%) 21,09%**

Reprogramaciones: **No.**

Ajustes y/o Modificaciones: Sí, reprogramación del proyecto efectuada en el mes de junio de 2024, aprobada por DNP y SDP. Bajo esta reprogramación, se extiende la línea de tiempo de ejecución del proyecto, pasando de 39 a 54 meses, finalizando en diciembre de 2026.

7°. Línea de tiempo de ejecución del proyecto.

A continuación, se presenta la línea de tiempo de ejecución del proyecto, con corte al mes de agosto de 2024. Cabe mencionar que, al igual que con el reporte de ejecución, la plataforma GESPROY SGR presenta la información con corte al mes inmediatamente anterior.

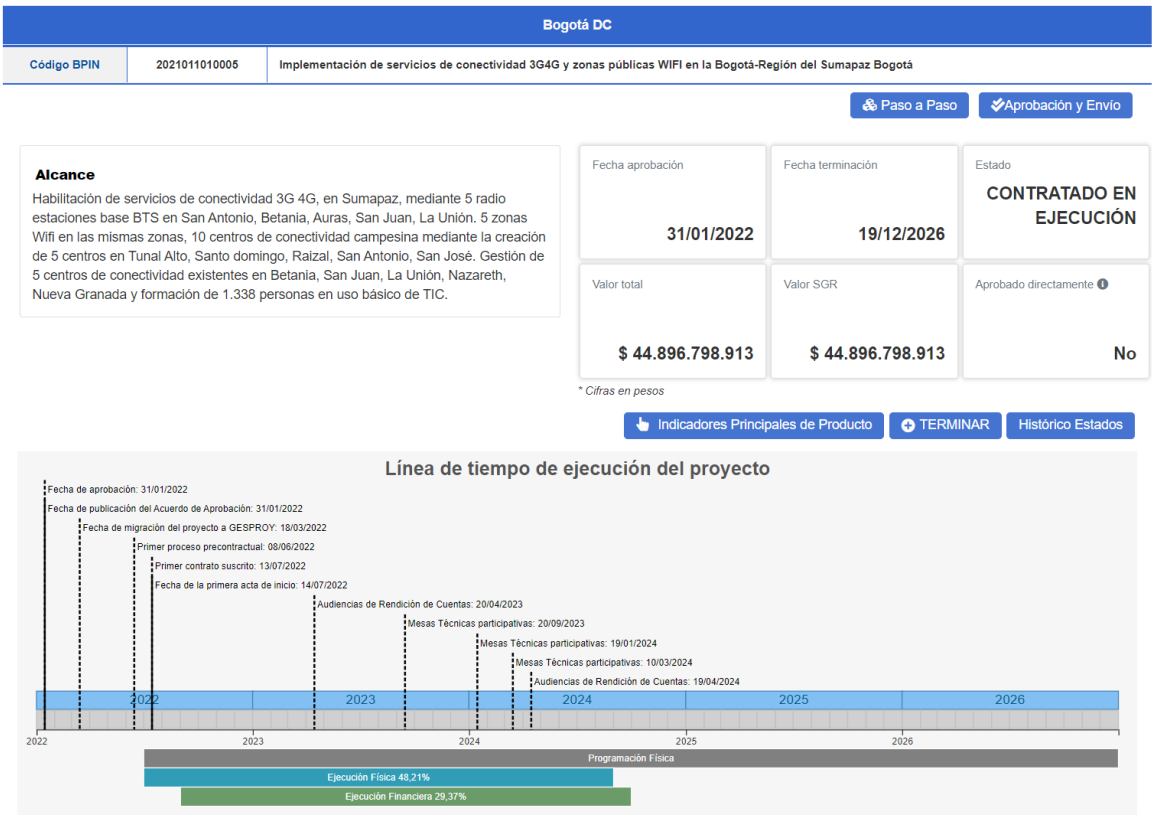

Línea de tiempo de ejecución del proyecto. Fuente: Plataforma GESPROY SGR – DNP, fecha de corte 20/09/2024.

8°. Avances significativos por resaltar:

- 5 zonas WiFi operando en los puntos de Betania, San Juan, La Unión, San Antonio y Auras, brindando señal de internet estable a la comunidad de la localidad.

- 10 Centros de Conectividad Campesina (5 nuevos y 5 existentes) activos y brindando servicios de acceso a tecnologías de información y comunicación a los usuarios de la localidad, de forma constante y sin dificultades.

- Se avanza en los procesos de capacitación a la comunidad beneficiaria de la localidad del Sumapaz, total de 64 capacitaciones con corte a septiembre, beneficiando a la fecha a 1.091 habitantes de la localidad. Al respecto, se espera concluir con las capacitaciones en el mes de octubre de 2024.

- Se cuenta con cinco estaciones radioeléctricas (BTS) izadas, 3 de ellas (Las Auras, Betania y La Unión) operativas y 2 de ellas (San Antonio y San Juan) en proceso de energización por parte de ENEL Codensa.

- Entrega a la fecha de 234 SIM Cards a la comunidad.

9°. Seguimiento Administrativo y Financiero a la ejecución de los recursos del proyecto:

Se ha trabajado de manera quincenal con el equipo de interventoría con el objetivo de evaluar los avances reportados por el proveedor ETB en el cumplimiento de las actividades propuestas en el marco de la ejecución general del proyecto, en términos físicos y financieros.

Se realizan mesas de seguimiento semanales, buscando revisar los tiempos de ejecución del nuevo cronograma planteado por el proveedor ETB, de tal manera que los retrasos surgidos en el marco de la ejecución del proyecto generen el menor impacto posible en términos de realización de las actividades pendientes.

Se elaboraron todos los informes y reportes mensuales correspondientes a la ejecución del proyecto, correspondientes a las actividades ejecutadas durante el tercer trimestre de 2024.

10°. Actividades de control social a la ejecución del proyecto:

Desde el componente social, se reporta la realización de actividades de socialización al proyecto, en el marco de la entrega de las SIM Cards durante el mes de septiembre de 2024.

Adicionalmente, se reporta mesa técnica participativa realizada el 11 de julio de 2024 en las instalaciones de la Secretaría Distrital de Gobierno, con la participación de los ediles de la localidad de Sumapaz, aclarando inquietudes referentes a la ejecución del proyecto.

11°. Alertas:

La principal alerta del proyecto corresponde a los tiempos que toma ENEL Codensa para efectuar el proceso de energización de las estaciones radioeléctricas de San

Antonio y San Juan. Estos tiempos generan retrasos en la puesta en operación de las BTS, lo que limita la cobertura de prestación de servicios de voz y datos en la zona.

5º. ACCIONES CLAVES ACORDADAS	RESPONSABLE	FECHA
Continuar con el proceso de entrega de SIM Cards, de acuerdo con lo planteado en el cronograma de entrega. Realizar monitoreo constante al proceso de energización de las estaciones radioeléctricas de San Antonio y San Juan.	Equipo de apoyo a la supervisión del proyecto.	Octubre – noviembre 2024. Octubre 2024.

6º. PLAN DE SEGUIMIENTO	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	ACTIVIDADES EJECUTADAS

FIRMAS



DIANA ROCÍO CELIS MORA
Consejera Distrital TIC

ÁNGEL LEONARDO MARTÍNEZ
Contratista – Director proyecto
Conectividad Sumapaz

Proyectó: Javier Leonardo Valero Sánchez, contratista
Revisó: Ángel Leonardo Martínez Martínez, contratista

