Informe ejecución - Junio

Prestación de servicios de adecuación e instalación del cableado estructurado, datos y eléctrico, normal y regulado

SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ

Junio 2024

Contenido

Contenido

1. Introducción 3
2. Actividades 3
2.1. Archivo Bogotá 3
2.1.1. Registro fotográfico 4
3. Conclusiones y recomendaciones 5
3.1 Archivo Bogotá 5

Calle 116 No. 70G - 56 / Bogotá D.C. Colombia
PBX. (+57) 323-5639112
www.dextera.com.co

CONFIDENCIAL © DEXTERA S.A.S.

1. Introducción

En el siguiente informe se documenta las labores generadas las siguientes sedes:

- Archivo Bogotá

Se indica lo realizado en dicha visita y/o recomendaciones realizadas según la finalizada la labor.

Mantenimientos realizados	
	Archivo Bogotá
Fecha	03/06/2024
Actividad	Instalación de dieciocho (17) puntos de datos - Un punto eléctrico regulado - Un punto eléctrico Normal

Tabla 1 Descripción de actividades

2. Actividades

2.1. Archivo Bogotá

Se realiza la instalación de diecisiete (17) puntos de datos sencillos de acuerdo a la distribución solicitada en sitio, esta instalación se ejecuta en el espacio rotulado como Oficinas se realiza la instalación por medio de canaleta existente y se hace uso de la bandeja porta cable existente en techo.

Adicionalmente se solicita para un televisor la instalación de un tomacorriente regulado y un tomacorriente normal los cuales serán instalados por medio de tubería EMT a la vista y se hace la toma de energía a un circuito existente.

CONFIDENCIAL © DEXTERA S.A.S.

2.1.1. Registro fotográfico



Ilustración 1 Punto de Datos Tubería



Ilustración 2 Punto de Datos Canaleta

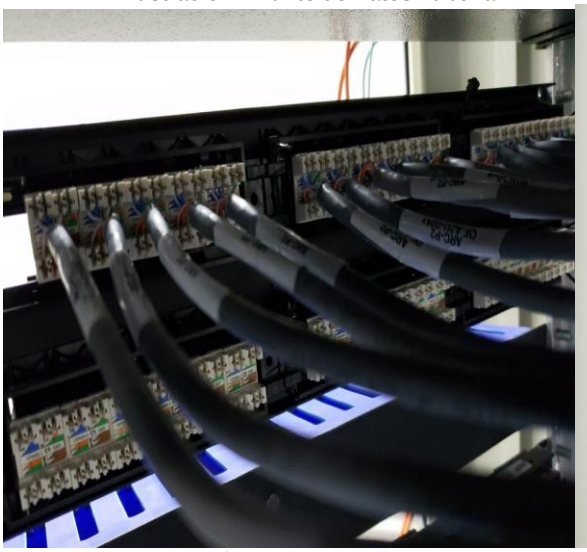


Ilustración 3 Respaldo Patch Panel



Ilustración 4 Frontal Rack

CONFIDENCIAL © DEXTERA S.A.S.



Ilustración 5 Tomacorriente Regulado



lustración 6 Tomacorriente Normal



Ilustración 7 Panorámica



lustración 8 Panorámica



Ilustración 9 Punto Datos Sencillo



lustración 10 Punto Datos Sencillo

CONFIDENCIAL © DEXTERA S.A.S.

3. Conclusiones y recomendaciones

3.1 Archivo Bogotá

Luego de las actividades descritas anteriormente para esta sede y las pruebas de validación de funcionamiento se realizan mediciones de tensión y se validan los niveles de tensión adecuados y dentro del rango de operación.

LINKWARE™ PC
CABLE TEST MANAGEMENT SOFTWARE

ID. Cable	Sumario	Límite de prueba	Longitud	Paso Libre	Fecha / Hora
ARC-P3-D241	PASA	TIA Cat 6 Channel	74.1 m	4.2 dB (NEXT)	06/02/2024 10:11 AM
ARC-P3-D242	PASA	TIA Cat 6 Channel	77.0 m	5.4 dB (NEXT)	06/02/2024 10:11 AM
ARC-P3-D243	PASA	TIA Cat 6 Channel	73.4 m	5.9 dB (NEXT)	06/02/2024 10:11 AM
ARC-P3-D244	PASA	TIA Cat 6 Channel	87.5 m	6.5 dB (NEXT)	06/02/2024 10:11 AM
ARC-P3-D245	PASA	TIA Cat 6 Channel	87.5 m	6.0 dB (NEXT)	06/02/2024 10:11 AM
ARC-P3-D246	PASA	TIA Cat 6 Channel	84.4 m	3.8 dB (NEXT)	06/02/2024 10:11 AM
ARC-P3-D247	PASA	TIA Cat 6 Channel	83.8 m	6.7 dB (NEXT)	06/02/2024 10:11 AM
ARC-P3-D248	PASA	TIA Cat 6 Channel	81.5 m	6.6 dB (NEXT)	06/02/2024 10:11 AM
ARC-P3-D249	PASA	TIA Cat 6 Channel	76.7 m	4.0 dB (NEXT)	06/02/2024 10:11 AM
ARC-P3-D250	PASA	TIA Cat 6 Channel	73.8 m	6.8 dB (NEXT)	06/02/2024 10:11 AM
ARC-P3-D251	PASA	TIA Cat 6 Channel	25.7 m	3.6 dB (NEXT)	06/02/2024 10:11 AM
ARC-P3-D252	PASA	TIA Cat 6 Channel	30.4 m	1.9 dB (NEXT)	06/02/2024 10:11 AM
ARC-P3-D253	PASA	TIA Cat 6 Channel	43.9 m	1.6 dB (NEXT)	06/02/2024 10:11 AM
ARC-P3-D254	PASA	TIA Cat 6 Channel	43.9 m	2.5 dB (NEXT)	06/02/2024 10:11 AM
ARC-P3-D255	PASA	TIA Cat 6 Channel	32.1 m	2.9 dB (NEXT)	06/02/2024 10:11 AM
ARC-P3-D256	PASA	TIA Cat 6 Channel	33.5 m	4.2 dB (NEXT)	06/02/2024 10:11 AM
ARC-P3-D257	PASA	TIA Cat 6 Channel	33.3 m	4.5 dB (NEXT)	06/02/2024 10:11 AM

Ilustración 15 Especificaciones de cumplimiento

CONFIDENCIAL © DEXTERA S.A.S.

Dxt
