AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT. 900220547-5

HOJA CONTROL DOCUMENTAL

131-GDC-FR-001-V04
09/09/2024

SERIE:	120-10
SUBSERIE:	120-10-05
No. CARPETA:	2-6
DESCRIPCIÓN CARPETA:	**CONSORCIO VIAL CONEXIÓN ORINOQUIA** MEJORAMIENTO DE LOS CORREDORES VIALES PARA LA CONEXIÓN PACÍFICO – ORINOQUÍA – VÍA URIBE – CRUCE VERSALLES – PAPAMENE – ALTO DE LAS CRUCES EN EL MUNICIPIO DE LA URIBE DEPARTAMENTO DEL META" **CONTRATO N° 779 22 PY 031-22 PARCIAL N°1 C2-7 C**

ITEM	DESCRIPCIÓN TIPO DOCUMENTAL	FOLIOS
6.	INFORME DE OBRA - INFORME DE COMPONENTE TECNICO	27730-27762
7.	INFORME GENERAL DE EQUIPOS	27763-27764
8.	INFORME GENERAL DEL ESTADO DEL TIEMPO	27765-27766
9.	REGISTRO FOTOGRAFICO	27767-27773
10.	INFORME COMPONENTE SOCIAL	27774-27919
11.	INFORME COMPONENTE AMBIENTAL	27920-27930

Fecha de Elaboración :		Nombre del Archivo en el SIGA	779 22 PY 031-22 PARCIAL N°1 C2-7 C

Firma		Firma	
Nombre:	**FERNANDO VERA BARRERA**	Nombre:	**DAGOBERTO CABRALES CONTRERAS**
Cargo:	DIRECTOR DE OBRA	Cargo:	DIRECTOR DE INTERVENTORIA

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1 - Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT. 900 220 547-5

INFORME DE OBRA

112-ECP-FR-013-V04
02/10/2023

INFORME ACTA DE PAGO No. 1

CONTRATO N°	779 DE 2022	PROYECTO N°	2022005500031

PROGRAMAS APROBADOS	NO	ACTIVIDAD PROPUESTA PARA EL MANEJO AMBIENTAL	INDICADORES	AVANCE DE LA ACTIVIDAD A LA FECHA
				CONCESIÓN DE AGUAS SUPERFICIALES- CORMACARENA emite AUTO No. PS-GJ.1.2.64.24.0072 del 15 febrero de 2024 asignando EXP. PM-GA.3.37.2.8.024.001; el cual da inicio al trámite de permiso de concesión. El día 24 de abril del 2024 se solicita fijar aviso en lugar público y visible durante un tiempo de (10) días con el objeto de que las personas que se crean con derecho a intervenir puedan hacerlo. Esto con el fin que el día 10 de mayo, fecha que se programa visita ocular por la subdirección de la gestión ambiental de la fuente hídrica "La Lagartija". **APROVECHAMIENTO FORESTAL Y OCUPACION DE CAUCE-** Estos permisos son gestionados por el AIM radicados el día 16 feb 2024 con No rad. 4000. AUTO No. PS-GJ.1.2.64.24.0165 DEL 01 DE MARZO DE 2024 - EXPEDIENTE PM-GA.3.37.3.024.007 Se recibe visita de entidad ambiental CORMACARENA el día 26-04-2024 para evaluación del permiso.
			Paz y salvos generados/predios intervenidos	Los predios aún no han sido intervenidos cuentan con permisos voluntarios y actas de vecindad; una vez inicie la etapa constructiva se generará la paz y salvos pertinentes al cierre por la intervención. Actualmente se cuenta con los documentos correspondientes del predio La Florida (campamento)
			Eficiencia de las temáticas ambientales/ acciones de protección de RN por parte de personal obrero y operadores de frentes de obra	Se evidencia eficacia y eficiencia en la aplicación de las charlas y capacitaciones al personal operario.
2. Programa Actividades constructivas	2.1	Manejo integral de materiales de construcción.	No. de medidas implementadas en el periodo/No. de medidas que debía ejecutar	Durante el periodo no se realizaron actividades en campo. No hubo actividades en el sitio durante el periodo.

DEPARTAMENTO DEL META

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT. 900 220 547-5

INFORME DE OBRA

112-ECP-FR-013-V04
02/10/2023

INFORME ACTA DE PAGO No. 1

CONTRATO N°	779 DE 2022	PROYECTO N°	2022005500031

PROGRAMAS APROBADOS	NO	ACTIVIDAD PROPUESTA PARA EL MANEJO AMBIENTAL	INDICADORES	AVANCE DE LA ACTIVIDAD A LA FECHA
PAC 3. Programa Gestión Hídrica y Atmosférica PGH	2.3	Señalización para el manejo ambiental en frentes de obra y sitios temporales.	No. de medidas implementadas en el sitio de acopio/ No. de medidas de la lista de chequeo	
			No. de señales requeridas/No. de señales implementadas	Durante el periodo se mantiene la señalización instalada y se realiza mantenimiento de esta continuamente
	2.4	Manejo integral de los residuos generados en las actividades de construcción y demolición (RCD) y lodos.	Estado y mantenimiento de señalización en el frente de obra/labores de cambio y mantenimiento de las señales existentes en los frentes de obra	Durante el periodo no se instala la valla requerida, teniendo en cuenta la Resolución No. 2023304005285 del 20 de junio 2023 "Por la cual se establece la distribución diseño y parámetros de las vallas y demás elementos de información de las obras y proyectos de infraestructura de transporte que contrate el instituto nacional de vías INVIAS, la agencia nacional de infraestructura - ANI y la unidad administrativa especial de aeronáutica civil – AEROCIVIL" se tiene estipulado instalar valla informativa referente al objeto del proyecto.
			No de vallas requeridas/ No. de vallas instaladas	Durante el periodo, el área SST realiza recorrido diario realizando inspección de los frentes de trabajo y señalización, cuando se requiere se realiza cambio de cintas y levantamiento de señales caídas.
			No. de sitios cerrados/No. de sitios utilizados	El predio La Floresta, cuenta con permiso voluntario y todo lo correspondiente para su uso. El acta de compromiso se relaciona de cómo se debe hacer entrega del predio una vez finalicen las actividades allí.
	2.5	Manejo integral de residuos sólidos convencionales y especiales.	No. de requerimientos de las autoridades ambientales/No. de requerimientos resueltos	21. No intervenir árbol alguno, ni que llegue afectar algún individuo arbóreo como consecuencia de la actividad relleno. 22. Compactar el relleno a fin de que, por causa de la lluvia, se desplace este diluido en agua. 23. Una vez terminada la labor de relleno, sembrar al menos 10 árboles dispersos en el terreno intervenido. 24. Respetar las áreas forestales protectoras (fuentes de agua, nacimientos, terrenos con pendientes superiores a 45º). 25. Conservar zonas de reservas de la sociedad civil. 26. Conservar zonas de humedales. 27. Conservar zonas para recarga de acuíferos. 28. Conservar zonas para la conservación de suelos, la cobertura vegetal y el recurso hídrico.

DEPARTAMENTO DEL META

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT. 900 220 547-5

INFORME DE OBRA

112-ECP-FR-013-V04
02/10/2023

INFORME ACTA DE PAGO No. 1

CONTRATO N°	779 DE 2022	PROYECTO N°	2022005500031

PROGRAMAS APROBADOS	NO	ACTIVIDAD PROPUESTA PARA EL MANEJO AMBIENTAL	INDICADORES	AVANCE DE LA ACTIVIDAD A LA FECHA
				29. Preservar zona de ronda hídrica. 30. Contar con el programa de manejo RCD, de acuerdo con los artículos 12,13 y 14 de la resolución 0472 del 2017. 31. Inscribirse ante la autoridad ambiental del desarrollo de sus actividades de acuerdo con el artículo 16 de la resolución 0472 del 2017. Durante el periodo no se realizó ninguna actividad en predio el paraíso, zona de depósito de materiales de excavación y demolición.
			Cantidad de m3 identificados en campo provenientes de excavación y derrumbes/cantidad de m3 de material de derrumbes y excavación debidamente dispuestos	32. No hubo actividades de mantenimiento vial por el corredor vial
			No de medidas técnicas ambientales requeridas en zonas de depósito/No. de medidas técnicas y ambientales implementadas	Durante el periodo no se hace uso del predio dispuesto para materiales de construcción y demolición.
			Cantidad de material aprovechado o donado/cantidad de material generado	Durante el periodo no se hace uso del predio dispuesto para materiales de construcción y demolición.
			Residuos no aprovechables generados en frentes de obra/cantidad de residuos no aprovechables dispuestos con gestor ambiental	Se realiza jornadas de aseo y limpieza en los diferentes frentes de obra y oficinas. Durante el periodo los residuos generados son almacenados temporalmente para posteriormente el próximo periodo sean transportados hasta el relleno sanitario la Guaratara, ubicado en el municipio de Granada.
	3.1	Manejo de aguas superficiales.	Residuos especiales y/o RESPEL generados en frentes de obra/cantidad de residuos especiales y/o RESPEL dispuestos en frentes de obra	Los filtros y aceites usados reposan en sitio de almacenamiento temporal construido en campamento la Lagartija, aislados y cubiertos. Estos residuos serán entregados la empresa **ECOLCIN S.A.S**
			Residuos aprovechables generados en frentes de obra/cantidad de residuos aprovechables dispuesto con gestor ambiental	Durante el periodo los residuos generados son almacenados temporalmente para posteriormente el próximo periodo sean transportados hasta el relleno sanitario la Guaratara, ubicado en el municipio de Granada.

DEPARTAMENTO DEL META

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT. 900 220 547-5

INFORME DE OBRA

112-ECP-FR-013-V04
02/10/2023

INFORME ACTA DE PAGO No. 1

CONTRATO N°	779 DE 2022	PROYECTO N°	2022005500031

PROGRAMAS APROBADOS	NO	ACTIVIDAD PROPUESTA PARA EL MANEJO AMBIENTAL	INDICADORES	AVANCE DE LA ACTIVIDAD A LA FECHA
			Puntos ecológicos requeridos en frentes de obra con cumplimiento ambiental/puntos ecológicos implementados con manejo ambiental	Se cuenta con dos (2) punto ecológico móvil, en el frente de trabajo y campamento. En oficina se cuenta con punto ecológico a las afueras de las instalaciones, dentro de la locación, se cuenta con canecas en cada cubículo.
			Cantidad de medidas ambientales y técnicas requeridas en pasos de fuentes superficiales/cantidad de medidas implementadas en pasos de las fuentes superficiales existentes.	Durante el periodo no se realizaron actividades representativas en el corredor vial, sin embargo, se capacita al personal diariamente para no afectar fuentes de aguas superficiales.
4. Programa de Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos PBSE	3.2	Manejo de residuos líquidos, domésticos e industriales.	Cantidad de m3 de agua empleada en el periodo/cantidad de m3 de agua registrada y soportada en el periodo	Durante el periodo se suministró 7.000 L de agua tipo industrial. en sitio autorizado (Res. No. PS-GJ 1.2.6.22 0483 del 17 de mayo del 2022) del Rio Duda)
			Cantidad de aspectos ambientales relacionadas con la contaminación de fuentes superficiales/cantidad de medidas establecidas para protección de fuentes superficiales	Durante el periodo no se evidencio ni se registraron eventos de contaminación a fuentes hídricas.
			No de medidas ambientales requeridas/No de medidas ambientales implementadas	Durante el periodo no se presentó actividades en campo, por tanto, no se tiene instalado baño portátil USP
	4.1	Manejo del descapote y cobertura vegetal.	Cantidad de m3 de aguas residuales domesticas tratadas/ cantidad de m3 de aguas residuales domesticas generadas.	Durante el periodo se generaron 4.000 litros de agua residual, estos corresponden a la limpieza y tratamiento de pozo séptico del área administrativa, los cuales la misma cantidad fue tratada por gestor autorizado **Bamacol.**
			Cantidad de fuentes hídricas afectadas por vertimientos y/o sedimentos derivados de las actividades/Cantidad de fuentes hídricas protegidas con medidas ambientales.	Durante el periodo no se afectaron fuentes hídricas producto de las actividades que se vienen adelantando. No se generan, ni se disponen residuos líquidos, convencionales en cuerpos de agua.

DEPARTAMENTO DEL META

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT. 900 220 547-5

INFORME DE OBRA

112-ECP-FR-013-V04
02/10/2023

INFORME ACTA DE PAGO No. 1

CONTRATO N°	779 DE 2022	PROYECTO N°	2022005500031

PROGRAMAS APROBADOS	NO	ACTIVIDAD PROPUESTA PARA EL MANEJO AMBIENTAL	INDICADORES	AVANCE DE LA ACTIVIDAD A LA FECHA
			No de medidas implementadas /No de medidas proyectadas	En el periodo no se realizaron actividades de descapote y de aprovechamiento forestal.
5.Programa Manejo de Instalaciones temporales de Maquinaria y Equipos PMIT	4.5	Protección de la fauna en vías.	Área (ha) de terreno descapotada/ área (ha) de terreno prevista para descapote.	En el periodo no se realizaron actividades de descapote y de aprovechamiento forestal.
			No. de individuos forestales identificados/No. de individuos forestales aprovechados con permiso	En el periodo no se realizaron actividades de descapote y de aprovechamiento forestal.
			No. de individuos afectados No de individuos rescatados/ No de individuos relocalizados.	Durante el periodo no se presenta fauna representativa para realizar ahuyentamiento.
	5.1	Instalación, funcionamiento y desmantelamiento de campamentos y sitios de acopio temporal.	No. de capacitaciones o charlas realizadas/No de capacitaciones o charlas programadas No de ahuyentamiento programados de acuerdo actividad de rocería/cantidad de ahuyentamiento implementados en el periodo	Durante el periodo no se realiza actividades al respecto, de acuerdo a lo programado Durante el periodo no se realiza actividad de rocería, corte de árboles, por tanto, no se realiza ahuyentamiento.
			No. de actividades ejecutadas/No de actividades programadas	Se construye caseta para acopio de residuos convencionales, RESPEL y líquidos. Se realiza instalación de señalización y demás actividades correspondientes al campamento y que fueron propuestas dentro del PAGA
			No de sitios cerrados/No de sitios utilizados	No se han cerrado ni se ha realizado intervención de predios, debido a que la etapa constructiva no ha iniciado.
	5.3	Manejo de maquinaria, equipos y vehículos.	No de medidas ambientales requeridas en campamento/No de medidas ambientales implementadas en proyecto No de mantenimientos preventivos programados/ No de mantenimientos preventivos realizados.	Se tienen implementadas las medidas propuestas en el PAGA Los operadores de la maquinaria y equipo realizaron el diligenciamiento de listas de chequeo, previniendo a tiempo las fallas mecánicas. De esta manera se previno eficazmente accidentes de trabajo, accidentes de tránsito y daños a la propiedad.

DEPARTAMENTO DEL META

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

INFORME ACTA DE PAGO No. 1

CONTRATO N°	779 DE 2022	PROYECTO N°	2022005500031

PROGRAMAS APROBADOS	NO	ACTIVIDAD PROPUESTA PARA EL MANEJO AMBIENTAL	INDICADORES	AVANCE DE LA ACTIVIDAD A LA FECHA
			No de mantenimientos correctivos programados/ No de mantenimientos correctivos realizados	Durante el periodo no se programaron mantenimientos correctivos, sin embargo, se realizaron.
			No de accidentes asociados al proceso constructivos/No de accidentes ocurridos en el periodo	No se presentaron accidentes ni incidentes
			No de medidas ambientales implementadas en el campamento/ No de solicitudes de corrección a problemáticas ambientales identificadas en campamento	Se realiza medidas propuestas en PAGA referente al actual indicador.
			No de campañas de orden y aseo empleadas en el campamento/No de campañas de orden y aseo empleadas solicitadas en inspecciones	Se realiza medidas propuestas en PAGA referente al actual indicador.

4.10. Periodo del 1/05/2024 al 31/05/2024

PROGRAMAS APROBADOS	NO	ACTIVIDAD PROPUESTA PARA EL MANEJO AMBIENTAL	INDICADORES	AVANCE DE LA ACTIVIDAD A LA FECHA
1. Programa Seguimiento y control a la gestión administrativa y Cumplimiento de la normatividad ambiental DAGA	1.1	Conformación del grupo de gestión ambiental y social.	No de profesionales contratados /No. profesionales propuestos	De acuerdo con el pliego de condiciones y el anexo técnico 1, el cual hace parte integral del contrato, a la fecha se cumple con el personal mínimo requerido.
			No de informes requeridos/No de informes con soportes presentados	Se hace entrega a interventoría el informe No 11 componente ambiental, para revisión y aprobación/ Se entrega soporte de la gestión realizada durante el periodo.
			No. de inspecciones programadas con interventoría/visitas	El día 09-05-2024 se programó inspección a lo que corresponde a tramo (1) verificando las áreas de

DEPARTAMENTO DEL META

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

INFORME ACTA DE PAGO No. 1

CONTRATO N°	779 DE 2022	PROYECTO N°	2022005500031

PROGRAMAS APROBADOS	NO	ACTIVIDAD PROPUESTA PARA EL MANEJO AMBIENTAL	INDICADORES	AVANCE DE LA ACTIVIDAD A LA FECHA
			realizadas en compañía de interventoría	aprovechamiento forestal y ocupación de cauce, con el propósito de dar liberación de las zonas que no están expuestas a permisos o solicitudes para los procesos constructivos. Esta visita se realizó junto con el área técnica de obra e interventoría.
			No. de trámites requeridos/No. de permisos otorgados	RCD – La gestión del permiso para nivelación de terreno con material de excavación se actualiza el día 09 de mayo del 2024, por planeación municipal emitiendo requerimientos. Teniendo en cuenta el concepto de CORMACARENA PM.GA3.24.4492 del 07-05-24, el secretario de planeación ratifica su viabilidad emitiendo actualización del documento. CONCESIÓN DE AGUAS SUPERFICIALES- CORMACARENA emite AUTO No. PS-GJ.1.2.64.24.0072 del 15 febrero de 2024 asignando EXP. PM-GA.3.37.2.8.024.001; el cual da inicio al trámite de permiso de concesión. El día 24 de abril del 2024 se solicita fijar aviso en lugar público y visible durante un tiempo de (10) días con el objeto de que las personas que se crean con derecho a intervenir puedan hacerlo. Esto con el fin que el día 10 de mayo, fecha que se programa visita ocular por la subdirección de la gestión ambiental de la fuente hídrica "La Lagartija". (Se anexa aviso de fijación) El día 10 de mayo del 2024 se recibe visita de evaluación al permiso de concesión de aguas. No se realiza medición de caudal o aforo debido a las altas precipitaciones que se estaban presentando. (Se adjunta como anexo acta de visita) APROVECHAMIENTO FORESTAL Y OCUPACION DE CAUCE-

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT. 900 220 547-5

INFORME DE OBRA

112-ECP-FR-013-V04
02/10/2023

INFORME ACTA DE PAGO No. 1

CONTRATO N°	779 DE 2022	PROYECTO N°	2022005500031

PROGRAMAS APROBADOS	NO	ACTIVIDAD PROPUESTA PARA EL MANEJO AMBIENTAL	INDICADORES	AVANCE DE LA ACTIVIDAD A LA FECHA
				Estos permisos son gestionados por el AIM radicados el día 16 feb 2024 con No rad. 4000. AUTO No. PS-GJ.1.2.64.24.0165 DEL 01 DE MARZO DE 2024 - EXPEDIENTE PM-GA.3.37.3.024.007 El día 21 de mayo, el AIM radica a CORMACARENA ajuste del documento del plan de aprovechamiento forestal debido a modificaciones en el inventario forestal, de acuerdo con los cambios en el diseño inicial del trazado para el proyecto. Adicional se adjunta a esta radicación tira predial y respectivos permisos voluntarios. (Se adjunta como anexo al presente informe)
	1.2	Capacitación y concienciación del personal de obra.	No de inducciones realizadas/No personal ingresado en el periodo	Durante el periodo, se realiza la vinculación de diez (10) personas, contando cada una de ellas con inducción en los diferentes componentes (Ambiental, social y SST). Ver Anexo No. 1 – Registro de inducción.
			No. de capacitaciones ejecutadas/ No. de capacitaciones programadas	Durante el periodo no se realiza capacitaciones. Se realiza actividad (taller) para celebrar el día mundial del reciclaje 17-05-2024-
			No. de charlas ejecutadas/ No. de charlas programadas	Durante el periodo se dio cumplimiento al cronograma, dictando en total cuatro (4) charlas del componente ambiental. (Ver Anexo 2)
	1.3	Cumplimiento requerimientos legales.	No. de permisos obtenidos / No. de permisos requeridos	RCD – La gestión del permiso para nivelación de terreno con material de excavación se actualiza el día 09 de mayo del 2024, por planeación municipal emitiendo requerimientos. Teniendo en cuenta el concepto de CORMACARENA PM.GA3.24.4492 del 07-05-24, el secretario de planeación ratifica su viabilidad emitiendo actualización del documento. CONCESIÓN DE AGUAS SUPERFICIALES- CORMACARENA emite AUTO No. PS-GJ.1.2.64.24.0072 del 15 febrero de 2024 asignando EXP. PM-

DEPARTAMENTO DEL META

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

INFORME ACTA DE PAGO No. 1

CONTRATO N°	779 DE 2022	PROYECTO N°	2022005500031

PROGRAMAS APROBADOS	NO	ACTIVIDAD PROPUESTA PARA EL MANEJO AMBIENTAL	INDICADORES	AVANCE DE LA ACTIVIDAD A LA FECHA
				GA.3.37.2.8.024.001; el cual da inicio al trámite de permiso de concesión. El día 24 de abril del 2024 se solicita fijar aviso en lugar público y visible durante un tiempo de (10) días con el objeto de que las personas que se crean con derecho a intervenir puedan hacerlo. Esto con el fin que el día 10 de mayo, fecha que se programa visita ocular por la subdirección de la gestión ambiental de la fuente hídrica "La Lagartija". (Se anexa aviso de fijación) El día 10 de mayo del 2024 se recibe visita de evaluación al permiso de concesión de aguas. No se realiza medición de caudal o aforo debido a las altas precipitaciones que se estaban presentando. (Se adjunta como anexo acta de visita) APROVECHAMIENTO FORESTAL Y OCUPACION DE CAUCE- Estos permisos son gestionados por el AIM radicados el día 16 feb 2024 con No rad. 4000. AUTO No. PS-GJ.1.2.64.24.0165 DEL 01 DE MARZO DE 2024 - EXPEDIENTE PM-GA.3.37.3.024.007 El día 21 de mayo, el AIM radica a CORMACARENA ajuste del documento del plan de aprovechamiento forestal debido a modificaciones en el inventario forestal, de acuerdo con los cambios en el diseño inicial del trazado para el proyecto. Adicional se adjunta a esta radicación tira predial y respectivos permisos voluntarios. (Se adjunta como anexo al presente informe)
			Paz y salvos generados/predios intervenidos	Los predios aún no han sido intervenidos cuentan con permisos voluntarios y actas de vecindad; una vez inicie la etapa constructiva se generará paz y salvos pertinentes al cierre por la intervención. Actualmente se cuenta con los documentos correspondientes del predio La Florida (campamento)

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT. 900 220 547-5

INFORME DE OBRA

112-ECP-FR-013-V04
02/10/2023

INFORME ACTA DE PAGO No. 1

CONTRATO N°	779 DE 2022	PROYECTO N°	2022005500031

PROGRAMAS APROBADOS	NO	ACTIVIDAD PROPUESTA PARA EL MANEJO AMBIENTAL	INDICADORES	AVANCE DE LA ACTIVIDAD A LA FECHA
			Eficiencia de las temáticas ambientales/ acciones de protección de RN por parte de personal obrero y operadores de frentes de obra	Se evidencia eficacia y eficiencia en la aplicación de las charlas y capacitaciones al personal operario.
2. Programa Actividades constructivas PAC	2.1	Manejo integral de materiales de construcción.	No. de medidas implementadas en el periodo/No. de medidas que debía ejecutar	Se instala señalización delimitando áreas y centros de acopio.
			No. de medidas implementadas en el sitio de acopio/ No. de medidas de la lista de chequeo	Se instala señalización delimitando áreas y centros de acopio.
	2.3	Señalización para el manejo ambiental en frentes de obra y sitios temporales.	No. de señales requeridas/No. de señales implementadas	Durante el periodo se mantiene la señalización instalada y se realiza mantenimiento de esta continuamente
			Estado y mantenimiento de señalización en el frente de obra/labores de cambio y mantenimiento de las señales existentes en los frentes de obra	Durante el periodo se instala la valla requerida, teniendo en cuenta la Resolución No. 2023304005285 del 20 de junio 2023 "Por la cual se establece la distribución diseño y parámetros de las vallas y demás elementos de información de las obras y proyectos de infraestructura de transporte que contrate el instituto nacional de vías INVIAS, la agencia nacional de infraestructura - ANI y la unidad administrativa especial de aeronáutica civil – AEROCIVIL" se tiene estipulado instalar valla informativa referente al objeto del proyecto.
			No de vallas requeridas/ No. de vallas instaladas	Durante el periodo, el área SST realiza recorrido diario realizando inspección de los frentes de trabajo y señalización, cuando se requiere se realiza cambio de cintas y levantamiento de señales caídas. Se instalan señales nuevas en cada uno de los frentes de obra habilitados.
	2.4	Manejo integral de los residuos generados en las actividades de construcción y demolición (RCD) y lodos.	No. de sitios cerrados/No. de sitios utilizados	El predio La Floresta, cuenta con permiso voluntario y todo lo correspondiente para su uso. El acta de compromiso se relaciona de cómo se debe hacer entrega del predio una vez finalicen las actividades allí.
			No. de requerimientos de las autoridades	13. No intervenir árbol alguno, ni que llegue afectar algún individuo arbóreo

DEPARTAMENTO DEL META

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

INFORME ACTA DE PAGO No. 1

CONTRATO N°	779 DE 2022	PROYECTO N°	2022005500031

PROGRAMAS APROBADOS	NO	ACTIVIDAD PROPUESTA PARA EL MANEJO AMBIENTAL	INDICADORES	AVANCE DE LA ACTIVIDAD A LA FECHA
			ambientales/No. de requerimientos resueltos	como consecuencia de la actividad relleno. 14. Compactar el relleno a fin de que, por causa de la lluvia, se desplace este diluido en agua. 15. Una vez terminada la labor de relleno, sembrar al menos 10 árboles dispersos en el terreno intervenido. 16. Respetar las áreas forestales protectoras (fuentes de agua, nacimientos, terrenos con pendientes superiores a 45º). 17. Conservar zonas de reservas de la sociedad civil. 18. Conservar zonas de humedales. 19. Conservar zonas para recarga de acuíferos. 20. Conservar zonas para la conservación de suelos, la cobertura vegetal y el recurso hídrico. 21. Preservar zona de ronda hídrica.
			Cantidad de m3 identificados en campo provenientes de excavación y derrumbes/cantidad de m3 de material de derrumbes y excavación debidamente dispuestos	Durante el periodo no se realiza remoción de derrumbes
			No de medidas técnicas ambientales requeridas en zonas de depósito/No. de medidas técnicas y ambientales implementadas	Se inicia hacer uso del predio el paraíso para disposición de materiales de excavación. Cumpliendo con todas las medidas ambientales requeridas y emitidas por la entidad que otorga el permiso. Importante mencionar que de acuerdo al concepto geotécnico e hidráulico se harán obras para manejo de aguas y estabilidad del terreno.
			Cantidad de material aprovechado o donado/cantidad de material generado	De acuerdo con los registros de transporte, se han dispuesto 6.369 m3 de material de excavación. Este material se dispone, se extiende y se compacta, contando siempre con un Bulldozer y Vibrocompactador garantizando la estabilidad del terreno.
	2.5	Manejo integral de residuos sólidos convencionales y especiales.	Residuos no aprovechables generados en frentes de obra/cantidad de residuos no aprovechables	Se realiza jornadas de aseo y limpieza en los diferentes frentes de obra y oficinas. Durante el periodo los residuos generados de las jornadas de limpieza en

DEPARTAMENTO DEL META

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

INFORME ACTA DE PAGO No. 1

CONTRATO N°	779 DE 2022	PROYECTO N°	2022005500031

PROGRAMAS APROBADOS	NO	ACTIVIDAD PROPUESTA PARA EL MANEJO AMBIENTAL	INDICADORES	AVANCE DE LA ACTIVIDAD A LA FECHA
			dispuestos con gestor ambiental	frentes de obra y oficina son almacenados temporalmente hasta tener una cantidad considerable y dirigirlos hasta el relleno sanitario La Guaratara en el municipio de Granada. Este almacenamiento se realiza en acopio temporal de residuos ubicado en campamento.
			Residuos especiales y/o RESPEL generados en frentes de obra/cantidad de residuos especiales y/o RESPEL dispuestos en frentes de obra	Los filtros y aceites usados reposan en sitio de almacenamiento temporal construido en campamento la Lagartija, aislados y cubiertos. Estos residuos serán entregados la empresa ECOLCIN S.A.S
			Residuos aprovechables generados en frentes de obra/cantidad de residuos aprovechables dispuesto con gestor ambiental	Durante el periodo los residuos generados de las jornadas de limpieza en frentes de obra y oficina son almacenados temporalmente en acopio temporal de residuos ubicado en campamento hasta tener una cantidad considerable y dirigirlos hasta el relleno sanitario La Guaratara en el municipio de Granada.
			Puntos ecológicos requeridos en frentes de obra con cumplimiento ambiental/puntos ecológicos implementados con manejo ambiental	Se cuenta con dos (2) punto ecológico móvil, en el frente de trabajo y campamento. En oficina se cuenta con punto ecológico a las afueras de las instalaciones, dentro de la locación, se cuenta con canecas en cada cubículo.
3. Programa Gestión Hídrica y Atmosférica PGH	3.1	Manejo de aguas superficiales.	Cantidad de medidas ambientales y técnicas requeridas en pasos de fuentes superficiales/cantidad de medidas implementadas en pasos de las fuentes superficiales existentes.	Durante el periodo no se realizaron actividades representativas en el corredor vial, sin embargo, se capacita al personal diariamente para no afectar fuentes de aguas superficiales.
			Cantidad de m3 de agua empleada en el periodo/cantidad de m3 de agua registrada y soportada en el periodo	Durante el periodo se suministró 7.000 Lts de agua tipo industrial. en sitio autorizado (Res. No. PS-GJ 1.2.6.22 0483 del 17 de mayo del 2022) del Rio Duda)
			Cantidad de aspectos ambientales relacionadas con la contaminación de fuentes superficiales/cantidad de medidas establecidas	Durante el periodo no se evidencio ni se registraron eventos de contaminación a fuentes hídricas.

DEPARTAMENTO DEL META

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT. 900 220 547-5

INFORME DE OBRA
112-ECP-FR-013-V04
02/10/2023

INFORME ACTA DE PAGO No. 1

CONTRATO N°	779 DE 2022	PROYECTO N°	2022005500031

PROGRAMAS APROBADOS	NO	ACTIVIDAD PROPUESTA PARA EL MANEJO AMBIENTAL	INDICADORES	AVANCE DE LA ACTIVIDAD A LA FECHA
			para protección de fuentes superficiales	
	3.2	Manejo de residuos líquidos, domésticos e industriales.	No de medidas ambientales requeridas/No de medidas ambientales implementadas	De acuerdo con la Res. 2400 del 1979, se hace instalación de unidad sanitaria portátil. Adicional el dia 29 de mayo se realiza la solicitud para la instalación de (2) unidades USP
			Cantidad de m3 de aguas residuales domesticas tratadas/ cantidad de m3 de aguas residuales domesticas generadas.	Durante el periodo se generaron 180 litros de agua residual, estos corresponden a la limpieza y tratamiento de pozo séptico del área administrativa, los cuales la misma cantidad fue tratada por gestor autorizado Bamacol.
			Cantidad de fuentes hídricas afectadas por vertimientos y/o sedimentos derivados de las actividades/Cantidad de fuentes hídricas protegidas con medidas ambientales.	Durante el periodo no se afectaron fuentes hídricas producto de las actividades que se vienen adelantando. No se generan, ni se disponen residuos líquidos, convencionales en cuerpos de agua.
4. Programa de Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos PBSE	4.1	Manejo del descapote y cobertura vegetal.	No de medidas implementadas /No de medidas proyectadas	En el periodo no se realizaron actividades de descapote y de aprovechamiento forestal.
			Área (ha) de terreno descapotada/ área (ha) de terreno prevista para descapote.	Se realiza descapote en área ubicada en el predio el paraíso, donde se va a disponer material de excavación.
			No. de individuos forestales identificados/No. de individuos forestales aprovechados con permiso	En el periodo no se realizaron actividades de descapote y de aprovechamiento forestal.
	4.5	Protección de la fauna en vías.	No. de individuos afectados No de individuos rescatados/ No de individuos relocalizados.	Durante el periodo no se presenta fauna representativa para realizar ahuyamiento.
			No. de capacitaciones o charlas realizadas/No de capacitaciones o charlas programadas	El dia 20 de mayo se realiza charla sobre el dia mundial de las abejas. Temas tratados: Importancia y relación con la vida humana, numero de especies, conservación.

DEPARTAMENTO DEL META

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

INFORME ACTA DE PAGO No. 1

CONTRATO N°	779 DE 2022	PROYECTO N°	2022005500031

PROGRAMAS APROBADOS	NO	ACTIVIDAD PROPUESTA PARA EL MANEJO AMBIENTAL	INDICADORES	AVANCE DE LA ACTIVIDAD A LA FECHA
			No de ahuyentamiento programados de acuerdo actividad de rocería/cantidad de ahuyentamiento implementados en el periodo	Durante el periodo no se realiza actividad de rocería, corte de árboles, por tanto, no se realiza ahuyentamiento.
5.Programa Manejo de Instalaciones temporales de Maquinaria y Equipos PMIT	5.1	Instalación, funcionamiento y desmantelamiento de campamentos y sitios de acopio temporal.	No. de actividades ejecutadas/No de actividades programadas	Se construye caseta para acopio de residuos convencionales, RESPEL y líquidos. Se realiza instalación de señalización y demás actividades correspondientes al campamento y que fueron propuestas dentro del PAGA
			No de sitios cerrados/No de sitios utilizados	No se han cerrado ni se ha realizado intervención de predios, debido a que la etapa constructiva no ha iniciado.
			No de medidas ambientales requeridas en campamento/No de medidas ambientales implementadas en proyecto	Se tienen implementadas las medidas propuestas en el PAGA
	5.3	Manejo de maquinaria, equipos y vehículos.	No de mantenimientos preventivos programados/ No de mantenimientos preventivos realizados.	Los operadores de la maquinaria y equipo realizaron el diligenciamiento de listas de chequeo, previniendo a tiempo las fallas mecánicas. De esta manera se previno eficazmente accidentes de trabajo, accidentes de tránsito y daños a la propiedad.
			No de mantenimientos correctivos programados/ No de mantenimientos correctivos realizados	Durante el periodo no se programaron mantenimientos correctivos, sin embargo, se realizaron.
			No de accidentes asociados al proceso constructivos/No de accidentes ocurridos en el periodo	No se presentaron accidentes ni incidentes
			No de medidas ambientales implementadas en el campamento/ No de solicitudes de corrección a problemáticas ambientales identificadas en campamento	Se realiza medidas propuestas en PAGA referente al actual indicador.
			No de campañas de orden y aseo empleadas en el	Se realiza medidas propuestas en PAGA referente al actual indicador.

DEPARTAMENTO DEL META

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

INFORME ACTA DE PAGO No. 1

CONTRATO N°	779 DE 2022	PROYECTO N°	2022005500031

PROGRAMAS APROBADOS	NO	ACTIVIDAD PROPUESTA PARA EL MANEJO AMBIENTAL	INDICADORES	AVANCE DE LA ACTIVIDAD A LA FECHA
			campamento/No de campañas de orden y aseo empleadas solicitadas en inspecciones	

4.11. Periodo del 1/06/2024 al 30/06/2024

ACTIVIDAD PROPUESTA PARA EL MANEJO AMBIENTAL	AVANCE DE LA ACTIVIDAD A LA FECHA	OBSERVACIÓN / ACCIÓN
Conformación del grupo de gestión ambiental y social.	Vinculación= (profesionales vinculados/equipo mínimo requerido) *100	Vinculados al Grupo de Gestión Ambiental la especialista ambiental, Residente Ambiental, profesional social y supervisor SST por parte del contratista. De acuerdo con el pliego de condiciones y el anexo técnico 1, el cual hace parte integral del contrato, a la fecha se cumple con el personal mínimo requerido.
	N° de obligaciones cumplidas durante el periodo/N° de obligaciones debe cumplir en el periodo	Durante el periodo se da respuesta a dos (2) oficios de interventoría. Pendiente por respuesta los oficios CCP-OP-1060-2022-0120 y CCP-OP-1060-2022-0124.
	N° de informes requeridos/ N° de informes con soportes presentados	Se hace entrega a interventoría el informe No 12 componente ambiental, para revisión y aprobación/ Se entrega soporte de la gestión realizada durante el periodo.
	No. de inspecciones programadas con interventoría/visitas realizadas en compañía de interventoría	Durante el periodo no se realizó visita o inspección a obra, en conjunto con interventoría.
Capacitación y concienciación del personal de obra	N° de personas ingresadas/N° personas con inducción	Durante el periodo, se realiza la vinculación de diez (10) personas, contando cada una de ellas con inducción en los diferentes componentes (Ambiental, social y SST). Ver Anexo No. 2 – Registro de inducción.
	No. de capacitaciones programadas/ No. de capacitaciones realizadas	Durante el periodo no se realiza capacitaciones.
	No. de charlas ejecutadas/ No. de charlas programadas	Durante el periodo se dio cumplimiento al cronograma, dictando en total tres (3) charlas del componente ambiental. (Ver Anexo 3)
	N° de personas vinculadas/N° de personas capacitadas	Durante el periodo reportado se cuenta con la vinculación de cincuenta y dos (52) personas entre mano de obra calificada y no calificada; de los cuales los asistentes a charlas son cincuenta (50).

DEPARTAMENTO DEL META

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

INFORME ACTA DE PAGO No. 1

CONTRATO N°	779 DE 2022	PROYECTO N°	2022005500031

ACTIVIDAD PROPUESTA PARA EL MANEJO AMBIENTAL	AVANCE DE LA ACTIVIDAD A LA FECHA	OBSERVACIÓN / ACCIÓN
Cumplimiento requerimientos legales	No. de permisos obtenidos / No. de permisos requeridos	A la fecha de corte del presente informe no hay actualización del estado de los permisos ambientales.
	Nº de obligaciones cumplidas de acuerdo con los permisos/Nº de obligaciones que debe cumplir en el periodo respecto a los permisos.	De acuerdo con el permiso otorgado en el permiso para nivelación del terreno en predio el Paraíso se cuentan con las siguientes obligaciones: 1. No intervenir árbol alguno, ni que llegue afectar algún individuo arbóreo como consecuencia de la actividad relleno. 2. Compactar el relleno a fin de que, por causa de la lluvia, se desplace este diluido en agua. 3. Una vez terminada la labor de relleno, sembrar al menos 10 árboles dispersos en el terreno intervenido. 4. Respetar las áreas forestales protectoras (fuentes de agua, nacimientos, terrenos con pendientes superiores a 45º). 5. Conservar zonas de reservas de la sociedad civil. 6. Conservar zonas de humedales. 7. Conservar zonas para recarga de acuíferos. 8. Conservar zonas para la conservación de suelos, la cobertura vegetal y el recurso hídrico. 9. Preservar zona de ronda hídrica. 10. Contar con el programa de manejo ambiental RCD, de acuerdo con el artículo 12, 13 y 14 de la Res. 0472 del 2017 (Radicar ante la secretaria de planeación y ambiente municipal)
Manejo integral de materiales de construcción	Volumen de material de fuentes autorizadas/volumen total de materiales usados	Durante el periodo Triturados San José SAS, suministro 2.362 m3 de material de crudo de rio. La empresa cuenta con los permisos ambientales requeridos para explotación y comercialización de materiales fluviales.
	Cantidad de acopios temporales autorizados/cantidad de acopios en frente de obra	Se cuenta con acopio aprobado en campamento la lagartija ubicada en el Km 2+850
	Mezcla de concreto en zona aislada/mezclas realizadas en el periodo	Durante el periodo no se realizaron actividades con mezcla de concreto.
Señalización para el manejo ambiental en frentes de obra y sitios temporales	No. de frentes de obra señalizados/número de frentes de obra	Durante el periodo se mantiene la señalización instalada y se realiza mantenimiento de esta continuamente
	Número de accidentes de tránsito en la vía	Durante el periodo no hubo reporte de accidentes del personal involucrado con la empresa, ni usuarios de la via.

DEPARTAMENTO DEL META

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT. 900 220 547-5

INFORME DE OBRA

112-ECP-FR-013-V04
02/10/2023

INFORME ACTA DE PAGO No. 1

CONTRATO N°	779 DE 2022	PROYECTO N°	2022005500031

ACTIVIDAD PROPUESTA PARA EL MANEJO AMBIENTAL	AVANCE DE LA ACTIVIDAD A LA FECHA	OBSERVACIÓN / ACCIÓN
Manejo integral de los residuos generados en las actividades de construcción y demolición (RCD) y lodos.	Autorizaciones RCD tramitados en el periodo/autorizaciones RCD requeridos en el periodo	El predio La Floresta, cuenta con permiso voluntario y todo lo correspondiente para su uso. El acta de compromiso se relaciona de cómo se debe hacer entrega del predio una vez finalicen las actividades allí.
Manejo integral de residuos sólidos convencionales y especiales.	AE RESPEL= Generación RESPEL en periodo/empresas autorizadas RESPEL en el periodo	*Empresas autorizadas* - Ecobrent SAS - soluciones ecológicas globales SAS - Soluciones Integrales del Tillava SAS - Servicios ambientales del Meta SAS
	PRRR= Personas que asisten a capacitación/total de personas x 100	Se realizan constantes charlas sobre manejo, separación y disposición final de residuos, de los cuales asisten las 52 personas vinculadas al proyecto.
	Volumen de residuos sólidos separados/volumen de residuos generados	Se realiza jornadas de aseo y limpieza en los diferentes frentes de obra y oficinas. Durante el periodo los residuos generados de las jornadas de limpieza en frentes de obra y oficina se transportaron y se dispusieron al relleno sanitario La Guaratara en el municipio de Granada. En total de acuerdo al peso, se dispusieron 1.210 kg.
Manejo de aguas superficiales	N° de permisos necesarios para el desarrollo del proyecto/N° de permisos obtenidos para el desarrollo del proyecto	La solicitud del permiso ocupación de cauce y concesión de aguas se encuentran en tramite
	No. de actividades ejecutadas/N° de actividades programadas	Durante el periodo no se realizaron actividades representativas para el consumo en obra, sin embargo, se capacita al personal diariamente para no afectar fuentes de aguas superficiales.
Manejo de residuos líquidos, domésticos e industriales	No de actividades ejecutadas/N° de actividades programadas	De acuerdo con la Res. 2400 del 1979, se hace instalación de dos (2) unidades sanitarias portátiles. Durante el periodo se generaron 225 litros de agua residual, estos corresponden a la limpieza y tratamiento de pozo séptico del área administrativa, los cuales la misma cantidad fue tratada por gestor autorizado Bamacol.
Manejo del descapote y cobertura vegetal.	(No de actividades ejecutadas/No de actividades programas) *100	En el periodo no se realizaron actividades de descapote y de aprovechamiento forestal.
	(N° de árboles con permiso de tala/ No de árboles a talar) *100	Aun no se cuenta con permiso de aprovechamiento forestal, por tanto, no se ha hecho aprovechamiento de especies arbóreas

DEPARTAMENTO DEL META

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT. 900 220 547-5

INFORME DE OBRA
112-ECP-FR-013-V04
02/10/2023

INFORME ACTA DE PAGO No. 1

CONTRATO N°	779 DE 2022	PROYECTO N°	2022005500031

ACTIVIDAD PROPUESTA PARA EL MANEJO AMBIENTAL	AVANCE DE LA ACTIVIDAD A LA FECHA	OBSERVACIÓN / ACCIÓN
	(Vol. De material proveniente del descapote/Vol. de material dispuesto o utilizado) *100	Se realiza descapote en área ubicada en el predio el paraíso, donde se va a disponer material de excavación.
Recuperación de áreas afectadas	Empradización= (áreas empradizadas sobreviviente/áreas empradizadas realizada) * 100	Durante el periodo no se reportan actividades referentes al presente subprograma
	Restauración= (Áreas restauradas/áreas afectadas) *100	Durante el periodo no se reportan actividades referentes al presente subprograma
	Restauración= (áreas restauradas/áreas ocupadas) *100	Durante el periodo no se reportan actividades referentes al presente subprograma
Protección de ecosistemas estratégicos o sensibles	CSA = (Trabajadores que asisten a capacitación/Total de trabajadores) *100	Durante el periodo no se programa capacitación referente al tema de ecosistemas estratégicos o sensibles
	Area sensible= (área sensible delimitada/ área sensible identificada) *100	No hubo reporte durante el periodo
	Ecosistemas= (Ecosistemas afectados/ecosistemas identificados) *100	No hubo reporte durante el periodo
	CEE= (Area de ecosistemas estratégicos conectados /Áreas de ecosistemas estratégicos afectados) *100	No hubo reporte durante el periodo
Protocolos de fauna en obra	(Fadultos) = Fauna adulta liberada/ fauna adulta rescatado) *100	Durante el periodo no se presentó evento fortuito para activar el indicador
	(Polluelos) = (Polluelos juveniles liberados/ polluelos o juveniles rescatados) *100	Durante el periodo no se presento evento fortuito para activar el indicador
	A Enfermos= (Animales entregados/Animales heridos rescatados) *100	Durante el periodo no se presentó evento fortuito para activar el indicador
Protección de la fauna en vías.	Atropellamientos de fauna al mes = Numero de atropellamientos registrados	Durante el periodo no se presentan estos eventos
	SAI= (Atropellamientos repetitivos en un sitio/atropellamientos totales en la vía) *100	Durante el periodo no se presentan estos eventos
	BFI= (Area de barrera implementada en el sitio/Area priorizada para el paso de fauna) * 100	Durante el periodo no se presentan estos eventos
Compensación ambiental	PC = (Plan de compensación autorizado/ plan de compensación requerido)	No hay autorización para corte de árboles, por tanto, la presente ficha no se ha activado.

DEPARTAMENTO DEL META

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT. 900 220 547-5

INFORME DE OBRA
112-ECP-FR-013-V04
02/10/2023

INFORME ACTA DE PAGO No. 1

CONTRATO N°	779 DE 2022	PROYECTO N°	2022005500031

ACTIVIDAD PROPUESTA PARA EL MANEJO AMBIENTAL	AVANCE DE LA ACTIVIDAD A LA FECHA	OBSERVACIÓN / ACCIÓN
	Restauración = (Area restaurada/ área total compensación) *100	No hay autorización para corte de árboles, por tanto, la presente ficha no se ha activado.
Instalación, funcionamiento y desmantelamiento de campamentos y sitios de acopio temporal.	Resdomest= (Generaciòn de residuo domestico e industrial/ empresas autorizadas recolección en el periodo) *100	Se construye caseta para acopio de residuos convencionales, RESPEL y líquidos. Se realiza instalación de señalización y demás actividades correspondientes al campamento y que fueron propuestas dentro del PAGA
	PuntosEco = Puntos ecológicos operativos/ puntos ecológicos instalados) *100	Se cuenta con tres (3) puntos ecológicos instalados.
Manejo de maquinaria, equipos y vehículos.	Mantenimientos = (No. de mantenimientos realizados/ No. de mantenimientos requeridos) *100	Los operadores de la maquinaria y equipo realizaron el diligenciamiento de listas de chequeo, previniendo a tiempo las fallas me cánicas. De esta manera se previno eficazmente accidentes de trabajo, accidentes de tránsito y daños a la propiedad.
	Traslados = (No. de traslados cumplimiento de requisitos/ No. de traslados realizados) *100	Durante el periodo no se realizaron traslados

Anexo: Formato 112-ECP-FR-016-INFORME IMPLEMENTACIÓN DEL PMA

DEPARTAMENTO DEL META

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT. 900 220 547-5

INFORME DE OBRA
112-ECP-FR-013-V04
02/10/2023

INFORME ACTA DE PAGO No. 1

CONTRATO N°	779 DE 2022	PROYECTO N°	2022005500031

C. INFORME ADMINISTRATIVO

1. PERSONAL ACTUAL PROFESIONAL VIGENTE

NOMBRE	CARGO	% DEDICACION PERSONA- MES
Fernando Vera Barrera	Director de obra	100%
Juan Carlos Isaza Calderón	Residente	100%
Uriel Javier Arias Campos	Residente	100%
Andrea Camila Vera Hernández	Residente auxiliar	100%
Andrea Catalina Granados Numpaque	Residente auxiliar	100%
Erika Tatiana Méndez Ramos	Profesional ambiental	100%
Editson Ricardo Reyes Ospina	Supervisor SST	100%
Nayarith Rengifo Murillo	Profesional social	100%

PERSONAL PRESENTE EN OBRA

NOMBRE	CARGO	% DEDICACION PERSONA- MES
Juan Carlos Isaza	Residente de obra	100%
Jose Otoniel Osorio Ramírez	Topógrafo	100%
Macedonio Manrique	Mecánico	100%
Arialdo González Ascencio	inspector de obra	100%
Idelfonso Vargas	Operador. motoniveladora	100%
Oscar Fabian Polo	Operador. motoniveladora	100%
Carlos Fernando Echeverry	Operador de vibro	100%
Luis Jesús Maldonado Gualdron	Operador de vibrocompactador	100%
Fernando Poloche	Conductor de volqueta	100%
Luis Rodríguez	Conductor volqueta	100%
Edwin Avilez	Conductor volqueta	100%
Marco Tulio Gámez Barreto	Conductor de volqueta	100%
Jaime Alexander Rincón	Conductor volqueta	100%
Jose Ricardo Cárdenas	Conductor volqueta	100%
David Santiago Ruiz	Conductor de volqueta	100%
Esneider Bedoya Beltrán	Conductor	100%
David Junior Torres Rincón	Conductor camioneta	100%
Elver Sanabria	Operador de bulldozer	100%
Arsitis Basilio Salas	Operador de retrocargador	100%
Jose Alexander Aguiar	Operador retro cargador	100%
Cristian Camilo García Rivera	Operador de excavadora	100%

DEPARTAMENTO DEL META

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

INFORME ACTA DE PAGO No. 1

CONTRATO N°	779 DE 2022	PROYECTO N°	2022005500031

Johansson González Olivera	Operador excavadora	100%
Robinson Aley Cuchimba	Cadenero 1	100%
Gelmeider Jose García Valencia	Cadenero	100%
Yolianny Cristina Carrillo Duran	Controlador vial	100%
Elicenia Mesa Triana	Controladora vial	100%
Stefanía Cardoso Vargas	Controladora vial	100%
Sandra Milena Olaya	Controladora vial	100%
Fabian Segura Moya	Ayudante de obra	100%
José Manuel Ricardo	Ayudante de obra	100%
Brayan Stiven Castañeda	Ayudante de obra	100%
Alexander Calderón Mesa	Ayudante de obra	100%
Jhon Jairo Torres Regalado	Ayudante de obra	100%
Sandra Milena Rincón	Servicios generales	100%

Anexo: Formato: 112-ECP-FR-008-V01-ACTA RELACION DE PERSONAL OBRA

2. APORTES DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

Se presenta planilla de pago N°:
- 9469519897 – Consorcio Vial Conexión Orinoquía
- 9469120660 – Meyan S.A
- 9468408861 - Triturados San José SAS
- 9468500298 – Constructora la Porciúncula

Anexo: Formato 112-ECP-FR-021-V01-ACTA CONTROL Y SEGUIMIENTO DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCAL OBRA

3. GESTIÓN SOCIAL

EMPLEO	CANTIDAD
Total empleos generados:	39
Empleos directos generados:	16
Empleos indirectos generados:	23

DEPARTAMENTO DEL META

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

INFORME ACTA DE PAGO No. 1

CONTRATO N°	779 DE 2022	PROYECTO N°	2022005500031

4. CLASIFICACIÓN DEMOGRAFICA DE LOS EMPLEOS GENERADOS

CLASIFICACIÓN	DETALLE	CANTIDAD
Etaria (Edad)	15 a 19 años	0
Etaria (Edad)	20 a 59 años	39
Etaria (Edad)	Mayor de 60 años	0
Grupos étnicos	Población Indígena	0
Grupos étnicos	Población Afrocolombiana	0
Grupos étnicos	Población Raizal	0
Género	Masculino	30
Género	Femenino	9
Población Vulnerable	Desplazados	0
Población Vulnerable	Discapacitados	1
Población Vulnerable	Víctimas	5
Total		

INFORME ACTA DE PAGO No. 1

CONTRATO N°	779 DE 2022	PROYECTO N°	2022005500031

D. INFORME GESTIÓN CONTRACTUAL Y JURIDICA DEL PROYECTO

1. ACTOS ADMINISTRATIVOS CELEBRADOS

PRORROGAS, SUSPENSIONES, AMPLIACIONES DE SUSPENSION Y REINICIO			
ACTA N° Y FECHA	TIEMPO (MESES / DIAS)	JUSTIFICACIÓN	FOLIO N°
N/A	N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A	N/A

ADICIÓN			
CONTRATO ADICIONAL N° Y FECHA	VALOR ($)	JUSTIFICACIÓN	FOLIO N°
N/A	N/A	N/A	N/A

MODIFICACIÓN			
ACTA N° Y FECHA	VALOR ACTUALIZADO ($)	JUSTIFICACIÓN	FOLIO N°
Acta 1 – 12/07/2023	0	División del corredor en tres tramos para realizar entrega de estudios y diseños de forma parcial e iniciar la etapa de mejoramiento.	
Acta 2 – 09/04/2024	0	Modificación de la amortización del anticipo	

DEPARTAMENTO DEL META

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

INFORME ACTA DE PAGO No. 1

CONTRATO N°	779 DE 2022	PROYECTO N°	2022005500031

2. GARANTIAS:

PÓLIZAS ACTA DE INICIO

POLIZA DE CUMPLIMIENTO N°	400054560
ANEXO N°	0
POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL DERIVADO DE CUMPLIMIENTO N°	400054559
ANEXO N°	0
FECHA DE APROBACIÓN POR PARTE DE LA ENTIDAD CONTRATANTE	20/01/2023
COMPAÑÍA DE SEGUROS	Nacional de seguros

GARANTIAS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
Cumplimiento del contrato	15/03/2024	30/04/2029	23.702.164.432
Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	15/03/2024	30/12/2031	23.702.164.432
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	15/03/2024	30/04/2029	44.380.150.026
Calidad de los estudios	30/12/2028	30/12/2033	23.702.164.432

POLIZA DE CUMPLIMIENTO N°	400046003
ANEXO N°	1
POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL DERIVADO DE CUMPLIMIENTO N°	400046004
ANEXO N°	1
FECHA DE APROBACIÓN POR PARTE DE LA ENTIDAD CONTRATANTE	28/02/2023
COMPAÑÍA DE SEGUROS	Nacional de seguros

GARANTIAS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
Cumplimiento del contrato	19/04/2023	15/04/2024	1.123.966.994,80
Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	19/04/2023	15/04/2026	1.123.966.994,80
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	19/04/2023	15/04/2024	5.619.834.974,00
Calidad de los estudios	15/12/2023	15/02/2028	3.371.900.984,40

POLIZA DE CUMPLIMIENTO N°	400046003
ANEXO N°	2
POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL DERIVADO DE CUMPLIMIENTO N°	400046004
ANEXO N°	2

DEPARTAMENTO DEL META

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT. 900 220 547-5

INFORME DE OBRA

112-ECP-FR-013-V04
02/10/2023

INFORME ACTA DE PAGO No. 1

CONTRATO N°	779 DE 2022	PROYECTO N°	2022005500031

FECHA DE APROBACIÓN POR PARTE DE LA ENTIDAD CONTRATANTE	20/06/2023
COMPAÑÍA DE SEGUROS	Nacional de seguros

GARANTIAS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
Cumplimiento del contrato	19/04/2023	15/04/2024	1.123.966.994,80
Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	19/04/2023	15/12/2026	1.123.966.994,80
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	19/04/2023	15/04/2024	5.619.849.974,00
Calidad de los estudios	15/12/2023	15/12/2028	3.371.900.984,40
Predios labores y operaciones -PLO	19/04/2023	15/12/2023	561.983.498,00

POLIZA DE CUMPLIMIENTO N°	400046003
ANEXO N°	3
POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL DERIVADO DE CUMPLIMIENTO N°	400046004
ANEXO N°	3
FECHA DE APROBACIÓN POR PARTE DE LA ENTIDAD CONTRATANTE	22/03/2024
COMPAÑÍA DE SEGUROS	Nacional de seguros

GARANTIAS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
Cumplimiento del contrato	27/12/2022	15/07/2024	1.123.966.994,80
Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	27/12/2022	15/03/2027	1.123.966.994,80
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	27/12/2022	15/07/2024	5.619.849.974,00
Calidad de los estudios	24/08/2023	15/03/2029	3.371.900.984,40

PÓLIZAS ACTUALIZADAS ETAPA CONSTRUCTIVA

POLIZA DE CUMPLIMIENTO N°	400054560
ANEXO N°	2
POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL DERIVADO DE CUMPLIMIENTO N°	400054559
ANEXO N°	2
FECHA DE APROBACIÓN POR PARTE DE LA ENTIDAD CONTRATANTE	28/05/2024
COMPAÑÍA DE SEGUROS	Nacional de seguros

DEPARTAMENTO DEL META

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

INFORME ACTA DE PAGO No. 1

CONTRATO N°	779 DE 2022	PROYECTO N°	2022005500031

GARANTIAS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
Cumplimiento del contrato	14/03/2024	29/04/2029	23.702.164.432,00
Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	14/03/2024	29/12/2031	23.702.164.432,00
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	14/03/2024	29/04/2029	44.380.150.026,00
Estabilidad de la obra	15/12/2023	15/12/2028	23.702.164.432,00
Predios labores y operaciones -PLO	19/04/2023	15/12/2023	11.851.082.216,00

E. INFORME FINANCIERO

1. PAGOS REALIZADOS

ACTA No.	EGRESO No.	FECHA	% EJECUCION	VALOR PAGO	VALOR AMORTIZADO	VALOR DESCUENTO	VALOR ACUMULADO
ANTICIPO	1170	6/07/2023	100%	5.619.849.974,00	5.338.857.474,55	280.992.498,70	5.338.857.474,55
ANTICIPO	714	19/06/2024	0%	44.380.150.026,00		2.219.007.501,30	
TOTALES							

PERIODO QUE COMPRENDE EL INFORME FINANCIERO: *01/06/2024 AL 30/06/2024*

Avance físico ejecutado 3.22% y avance financiero ejecutado 0%

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT. 900 220 547-5

INFORME DE OBRA
112-ECP-FR-013-V04
02/10/2023

INFORME ACTA DE PAGO No. 1

CONTRATO N°	779 DE 2022	PROYECTO N°	2022005500031

F. REGISTRO FOTOGRÁFICO

ITEMS	ACTIVIDAD	CANTIDAD	
1	EXPLANACIONES Y REPLANTEO	EJECUTADO	%
1.1	Localización, trazado y replanteo topográfico vías (Km)	3	19.35





OBSERVACIONES: Se realiza la actividad desde el PR0+000 hasta el PR3+000

DEPARTAMENTO DEL META

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT. 900 220 547-5

INFORME DE OBRA


112-ECP-FR-013-V04
02/10/2023

INFORME ACTA DE PAGO No. 1

CONTRATO N°	779 DE 2022	PROYECTO N°	2022005500031

TEMS	ACTIVIDAD	CANTIDAD	
2	EXCAVACIONES	EJECUTADO	%
2.2	Excavación en material común de la explanación y canales (m^3)	11492.50	3.72



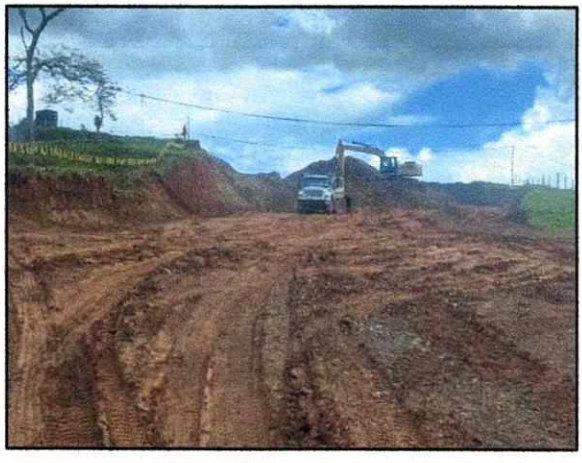

OBSERVACIONES Se ejecuta la actividad desde el K0 + 190 al K0 + 359.96 y desde el K2 + 890 AL K3 + 169.97

ITEMS	ACTIVIDAD	CANTIDAD	
2	EXCAVACIONES	EJECUTADO	%

DEPARTAMENTO DEL META

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

INFORME ACTA DE PAGO No. 1

CONTRATO N°	779 DE 2022	PROYECTO N°	2022005500031

2.3	**Transporte disposición final de escombros y sobrantes (m^3/Km)**	**37,176.80**	**0.48**





OBSERVACIONES: Se realiza la actividad desde los puntos de excavación hasta el PR3+500, lugar donde se encuentra el predio el Paraíso (zona de nivelación).

DEPARTAMENTO DEL META

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT. 900 220 547-5

INFORME DE OBRA

112-ECP-FR-013-V04
02/10/2023

INFORME ACTA DE PAGO No. 1

CONTRATO N°	779 DE 2022	PROYECTO N°	2022005500031

ITEMS	ACTIVIDAD	CANTIDAD	
2	EXCAVACIONES	EJECUTADO	%
2.4	Terraplenes con material mixto de rio sin procesar (m^3)	7279.3	7.811





OBSERVACIONES: Se realiza la actividad desde K2 + 710 AL K2 + 829.94 y desde el K2 + 890 AL K3 + 162.09.

DEPARTAMENTO DEL META

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT. 900 220 547-5

INFORME DE OBRA

112-ECP-FR-013-V04
02/10/2023

INFORME ACTA DE PAGO No. 1

CONTRATO N°	779 DE 2022	PROYECTO N°	2022005500031

ITEMS	ACTIVIDAD	CANTIDAD	
2	EXCAVACIONES	EJECUTADO	%
2.5	Transporte de materiales granulares (m^3/Km)	58,609.6	1.239





OBSERVACIONES: El transporte de material granular se realiza desde Triturados San José (proveedor) hasta cada uno de los puntos donde se construye el terraplén.

DEPARTAMENTO DEL META

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT. 900 220 547-5

INFORME DE OBRA
112-ECP-FR-013-V04
02/10/2023

INFORME ACTA DE PAGO No. 1

CONTRATO N°	779 DE 2022	PROYECTO N°	2022005500031

G. COMENTARIOS, CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES GENERALES

- Se reporta un avance correspondiente a 3.22% ejecutado con respecto al programado que es de 0.160%.
- Durante el presente periodo se generó avance las siguientes actividades: Excavación de material común de la explanación y canales, transporte disposición final de escombros y sobrantes, terraplenes con material mixto de rio sin procesar t max 3" y transporte de material granular y se continúa con la implementación del PMT y PMA.
- Es importante realizar recorridos constantes para verificar el estado de la señalización y la transitabilidad del corredor.
- Es necesario inspeccionar, comprobar la funcionalidad de las cunetas y mantenerlas despejadas para así direccionar las aguas de escorrentía y evitar deterioro en la vía.
- Es preciso tener presente que por los fuertes vientos se presenta caída de árboles sobre el corredor, lo que afecta la transitabilidad de los usuarios, por lo tanto, se recomienda realizar limpieza y despeje de estos sectores en el menor tiempo posible.

DEPARTAMENTO DEL META

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT. 900 220 547-5

INFORME DE OBRA
112-ECP-FR-013-V04
02/10/2023

INFORME ACTA DE PAGO No. 1

CONTRATO N°	779 DE 2022	PROYECTO N°	2022005500031

H. ANEXOS

El informe debe contener como mínimo los siguientes soportes documentales:

- Registro fotográfico detallado
- Copia de la bitácora de la obra o de las actividades desarrolladas.
- Correspondencia generada entre el contratista – Interventor – supervisor – entidad contratante.
- Control de Seguridad Industrial.
- Control de equipos.
- Estado del tiempo
- Manejo Ambiental
- Actas de comité técnico.
- Copia afiliaciones del personal y pagos de seguridad social.
- Copia de los ensayos de laboratorio, certificados de calidad de los materiales, y demás documentos que soporten el control de calidad.

Para constancia de lo anterior, se firma el presente informe bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen, a los 2 días del mes de julio del 2024.

Firma

Nombre: Fernando Vera Barrera
DIRECTOR DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 25202087420CND

Firma

Nombre: Juan Carlos Isaza Calderón
RESIDENTE DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 2520255760 CND

Nota: El informe y sus anexos, deben ser cargados a la plataforma para la gestión de archivos SIGA, una vez sea presentado a la entidad.

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

DEPARTAMENTO DEL META

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

27763 822

28052

	INFORME ACTA PARCIAL	
	PERIODO ACTA PARCIAL 1	

INFORME GENERAL DE EQUIPOS

INFORME GENERAL DE EQUIPOS
LA URIBE - META

EQUIPO	PLACA Y/O MARCA	MES: 01 - 30 DE JUNIO DEL 2024																												
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
MOTONIVELADORA	CATERPILLAR 120K-04	I			I	R	R	R	R			A	A	A	A	A		A	A	A	A	A	A		A	A	A	A	A	A	
BULLDOZER	D5M-02	A			A	A	A	A	A			A	A	A	A	A		A	A	A	A	A	A		A	A	A	A	A	A	
VIBROCOMPACTADOR	DYNAPAC CA 250-04	A			A	A	A	A	A			A	A	A	A	A		A	A	A	A	A	A		A	A	A	A	A	A	
VIBROCOMPACTADOR	ATLAS CA 250-07	I			I	I	R	R	R			R	R	R	R	R		R	R	R	R	R	R		R	R	R	R	R	R	
VOLQUETA DOBLETROQUE	WLL 455	A			A	A	A	A	A			A	A	A	I	A		A	A	A	A	A	A		A	A	I	I	I	A	
VOLQUETA DOBLETROQUE	WLL 456	A			I	I	A	A	A			A	A	A	A	A		A	A	A	A	A	A		A	A	A	A	A	A	
VOLQUETA DOBLETROQUE	TRG 326	I			I	I	I	I	I			I	I	I	I	I		I	I	I	I	I	I		I	I	I	I	I	A	
VOLQUETA DOBLETROQUE	TRG 327	A			A	A	A	I	I			A	A	A	A	A		A	A	A	A	A	A		A	A	A	A	A	A	
VOLQUETA DOBLETROQUE	WLL 457	A			A	A	A	A	I			A	A	A	A	A		A	A	A	A	I	I		A	I	I	A	A	A	
VOLQUETA DOBLETROQUE	SRL 787	I			I	I	I	I	I			I	I	I	I	I		I	A	I	A	A	A		A	A	A	A	A	A	
VOLQUETA DUMPER	CAT -725-04	I			I	I	I	I	I			I	I	I	I	I		I	I	I	I	I	I		I	I	I	I	I	I	
EXCAVADORA	CATERPILLAR 320GC	R			R	R	R	R	A			A	A	A	A	A		A	A	A	A	A	A		A	A	A	A	A	I	
EXCAVADORA	CATERPILLAR 323GX	A			A	A	A	A	I			A	A	A	A	A		A	A	A	A	A	A		A	A	A	A	A	A	
MOTONIVELADORA	CHAMPIONS 710A	A			I	I	A	A	A			A	A	A	A	A		I	I	A	A	A	A		A	A	A	A	A	A	
RETROCARGADOR	CATERPILLAR 416	A			A	A	A	A	A			A	A	A	A	A		A	A	A	A	A	A		A	A	A	A	A	A	
RETROCARGADOR	CATERPILLAR 416C	I			I	I	I	I	I			I	I	I	I	I		I	I	I	I	I	I		I	I	I	I	I	I	
VIBROCOMPACTADOR	DYNAPAC CS533E	A			I	A	A	I	I			R	R	R	A	A		A	A	A	A	A	A		A	A	A	A	A	A	
VIBROCOMPACTADOR	INGERSOLLRAND	I			I	I	I	I	I			I	I	I	I	I		I	I	I	I	I	I		I	I	I	I	I	I	
VOLQUETA DOBLETROQUE	STO 330	A			A	A	A	A	A			A	A	A	A	A		A	A	A	A	A	A		A	A	A	A	A	A	
VOLQUETA DOBLETROQUE	UPS 884	A			A	A	A	A	A			A	A	A	A	A		A	A	A	A	A	A		A	A	A	I	I	I	
VOLQUETA DOBLETROQUE	DBB 425	I			A	A	I	I	I			I	A	I	I	I		I	A	A	A	A	A		A	A	A	A	I	I	
VOLQUETA SENCILLA	OLA 658	I			I	I	I	I	I			I	I	I	A	A		A	I	I	I	I	I		I	I	I	I	I	I	
CAMIONETA FOTON	PLACA NFV 362	A			A	A	A	A	A			A	A	A	A	A		A	A	A	A	A	A		A	A	A	A	A	A	
CAMIONETA FOTON	PLACA LVX 597	A			A	A	A	A	A			A	A	A	A	A		A	A	A	A	A	M		M	M	M	A	A	A	
CAMION FORLAND	LZO 560	A			A	A	A	A	A			A	A	A	A	A		A	A	A	A	A	A		A	A	A	A	A	A	

R = REPARACIÓN
V = VARADO
I = INACTIVO
A = ACTIVO
M = MANTENIMIENTO

VoBo ING RESIDENTE _____

VoBo INTERVENTOR _____

2276A

28053

27765 2 04

28057

	INFORME ACTA PARCIAL	
	PERIODO ACTA PARCIAL 1	

INFORME GENERAL DEL ESTADO DEL TIEMPO

CONSORCIO VIAL CONEXIÓN ORINOQUIA

INFORME DIARIO ESTADO DEL TIEMPO

CODIGO: FOR-EP-51	
REVISION: 1	
FECHA: 25-04-2015	
HOJA 1 DE 1	

PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LOS CORREDORES VIALES PARA LA CONEXIÓN PACÍFICO – ORONOQUÍA – VÍA URIBE – CRUCE VERSALLES – PAPAMENE – ALTO LAS CRUCES EN EL MUNICIPIO DE LA URIBE DEPARTAMENTO DEL META

UBICACIÓN: URIBE - META

MES: JUNIO

AÑO: 2024

INTERVENTORIA: CONSORCIO CONEXIÓN PACÍFICO

CONTRATO: 779 DE 2022

	HORA	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
A.M.	12:00-1:00								LL						LL				LL	LL							LL	LL				
	1:00-2:00								LL						LL				LL	LL							LL	LL				
	2:00-3:00								LL						LL				LL	LLVZ							LL	LL				
	3:00-4:00								LLVZ						LL				LLVZ	LLVZ		LLVZ					LL	LL	N			
	4:00-5:00	N	N	N	LL	LLVZ	N	N	LLVZ	N	N	LLVZ	N	N	LLVZ	N	N	N	LLVZ	N	LLVZ	LLVZ	N	N	N	N	LL	LLVZ	LLVZ	N	N	
	5:00-6:00	N	N	N	LL	LLVZ	N	N	LLVZ	N	N	LLVZ	N	N	LLVZ	LLVZ	N	N	N	N	LLVZ	LLVZ	N	N	N	N	LL	LLVZ	LLVZ	N	N	
	6:00-7:00	LLVZ	N	N	LLVZ	LL	N	N	LLVZ	N	N	N	N	N	LLVZ	LLVZ	LLVZ	S	N	N	N	LLVZ	N	N	N	N	LL	N	N	S	LLVZ	
	7:00-8:00	N	N	N	LLVZ	LL	N	N	N	N	S	N	S	S	LL	N	N	S	N	N	N	N	N	S	N	S	LL	N	N	S	LLVZ	
	8:00-9:00	N	N	N	LLVZ	LL	N	LLVZ	N	N	S	N	S	S	LLVZ	N	N	S	S	N	N	N	N	S	N	S	LL	N	N	S	LL	
	9:00-10:00	LLVZ	N	N	LL	LLVZ	LLVZ	LLVZ	N	LLVZ	S	LLVZ	S	N	N	N	LL	S	S	N	N	N	LLVZ	S	N	S	LLVZ	N	N	S	LL	
	10:00-11:00	LLVZ	N	S	LL	N	LLVZ	N	N	LLVZ	N	LLVZ	S	N	N	N	LL	S	S	LL	N	N	LL	S	N	S	LLVZ	N	N	S	N	
	11:00-12:00	N	S	S	LLVZ	N	N	LL	N	LLVZ	N	LL	S	LLVZ	N	N	LLVZ	S	N	LL	N	N	LL	LLVZ	S	LLVZ	S	N	LLVZ	N	N	
P.M.	12:00-1:00	N	S	S	LLVZ	LLVZ	N	LLVZ	N	LLVZ	LLVZ	LL	S	LL	N	N	N	N	N	LLVZ	N	LLVZ	N	S	LL	S	N	LLVZ	S	S	N	
	1:00-2:00	N	S	N	LLVZ	LL	N	LL	N	LL	LLVZ	LL	N	LL	N	N	LLVZ	N	LLVZ	N	N	LL	N	S	LLVZ	S	N	LLVZ	S	S	N	
	2:00-3:00	N	N	N	LLVZ	LL	S	LL	N	LLVZ	LLVZ	LLVZ	N	LL	N	LLVZ	LL	N	LL	N	N	LLVZ	S	LLVZ	N	LLVZ	S	N	N	S	S	
	3:00-4:00	N	N	N	LL	LL	S	LLVZ	LLVZ	N	LLVZ	LLVZ	N	LL	LL	LL	LLVZ	N	LL	N	LLVZ	N	S	LL	N	N	S	S	N	N	S	
	4:00-5:00	N	N	N	LL	LL	S	N	LLVZ	N	N	N	S	LLVZ	LL	LL	N	N	LLVZ	N	LLVZ	N	N	LL	N	S	S	S	N	N	S	
	5:00-6:00	N	N	N	LL	LL	N	N	N	N	N	N	N	N	LLVZ	LL	S	N	N	N	N	N	N	LLVZ	N	S	S	S	N	N	N	
	6:00-7:00	N	N	N	LLVZ	LLVZ	N	N	N	N	N	N	N	N	LLVZ	LL	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	
	7:00-8:00	N	N	N	LLVZ	LLVZ		LLVZ	N	N	N	N	N	N	LL	LLVZ	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	
	8:00-9:00							LLVZ						LLVZ	LL	LLVZ		LLVZ	LLVZ	N	LLVZ	LLVZ	N	N	N	N	N	N	N		
	9:00-10:00							LL						LLVZ	LL	LLVZ		LL	LL	LLVZ	LLVZ	N									
	10:00-11:00							LL						LLVZ		LL		LL	LL	LLVZ	LL	LL									
	11:00-12:00							LL						LL		LL		LL	LL	LLVZ	LL	LLVZ									

ELABORÓ: Arialda González A

VoBo ING. RESIDENTE

VoBo INTERVENTOR

ESTADO DEL TIEMPO

LLVZ	LLOVIZNA	N	NUBLADO
D.N	DESPEJADO NOCHE		
LL	LLUVIA	S	SOL

09726

28055

27767 236

28856

	INFORME ACTA PARCIAL	
	PERIODO ACTA PARCIAL 1	

REGISTRO FOTOGRÁFICO

27768

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT. 900 220 547-5

REGISTRO FOTOGRÁFICO DETALLADO


CONTRATO N°	**779 DE 2022**	**PROYECTO N°**	**2022005500031**
OBJETO DEL CONTRATO	MEJORAMIENTO DE LOS CORREDORES VIALES PARA LA CONEXIÓN PACÍFICO – ORINOQUÍA – VÍA URIBE – CRUCE VERSALLES – PAPAMENE – ALTO LAS CRUCES EN EL MUNICIPIO DE LA URIBE DEPARTAMENTO DEL META		
OBJETO DEL PROYECTO	MEJORAMIENTO DE LOS CORREDORES VIALES PARA LA CONEXIÓN PACÍFICO – ORINOQUÍA – VÍA URIBE – CRUCE VERSALLES – PAPAMENE – ALTO LAS CRUCES EN EL MUNICIPIO DE LA URIBE DEPARTAMENTO DEL META		
CONTRATISTA	CONSORCIO VIAL CONEXIÓN ORINOQUÍA		
NIT	901.667.284-6		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	1060 DE 2022		
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO CONEXIÓN PACÍFICO		

REUBICACIÓN DE CERCAS







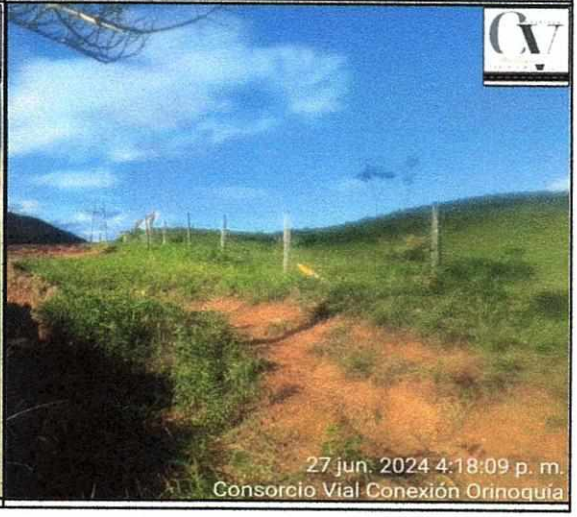

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT. 900 220 547-5

REGISTRO FOTOGRÁFICO DETALLADO

CONTRATO N°	**779 DE 2022**	**PROYECTO N°**	**2022005500031**
OBJETO DEL CONTRATO	MEJORAMIENTO DE LOS CORREDORES VIALES PARA LA CONEXIÓN PACÍFICO – ORINOQUÍA – VÍA URIBE – CRUCE VERSALLES – PAPAMENE – ALTO LAS CRUCES EN EL MUNICIPIO DE LA URIBE DEPARTAMENTO DEL META		
OBJETO DEL PROYECTO	MEJORAMIENTO DE LOS CORREDORES VIALES PARA LA CONEXIÓN PACÍFICO – ORINOQUÍA – VÍA URIBE – CRUCE VERSALLES – PAPAMENE – ALTO LAS CRUCES EN EL MUNICIPIO DE LA URIBE DEPARTAMENTO DEL META		
CONTRATISTA	CONSORCIO VIAL CONEXIÓN ORINOQUÍA		
NIT	901.667.284-6		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	1060 DE 2022		
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO CONEXIÓN PACÍFICO		





EXCAVACIÓN EN MATERIAL COMUN DE LA EXPLANACION Y CANALES






AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT. 900 220 547-5

REGISTRO FOTOGRÁFICO DETALLADO

CONTRATO N°	**779 DE 2022**	**PROYECTO N°**	**2022005500031**
OBJETO DEL CONTRATO	MEJORAMIENTO DE LOS CORREDORES VIALES PARA LA CONEXIÓN PACÍFICO – ORINOQUÍA – VÍA URIBE – CRUCE VERSALLES – PAPAMENE – ALTO LAS CRUCES EN EL MUNICIPIO DE LA URIBE DEPARTAMENTO DEL META		
OBJETO DEL PROYECTO	MEJORAMIENTO DE LOS CORREDORES VIALES PARA LA CONEXIÓN PACÍFICO – ORINOQUÍA – VÍA URIBE – CRUCE VERSALLES – PAPAMENE – ALTO LAS CRUCES EN EL MUNICIPIO DE LA URIBE DEPARTAMENTO DEL META		
CONTRATISTA	CONSORCIO VIAL CONEXIÓN ORINOQUÍA		
NIT	901.667.284-6		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	1060 DE 2022		
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO CONEXIÓN PACÍFICO		



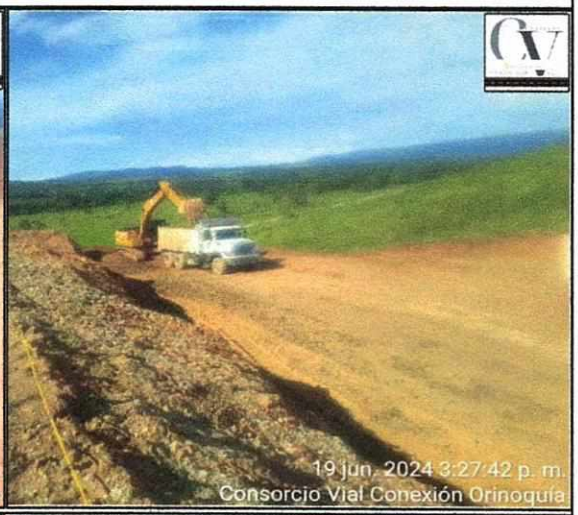





AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT. 900 220 547-5

REGISTRO FOTOGRÁFICO DETALLADO

CONTRATO N°	**779 DE 2022**	**PROYECTO N°**	**2022005500031**
OBJETO DEL CONTRATO	MEJORAMIENTO DE LOS CORREDORES VIALES PARA LA CONEXIÓN PACÍFICO – ORINOQUÍA – VÍA URIBE – CRUCE VERSALLES – PAPAMENE – ALTO LAS CRUCES EN EL MUNICIPIO DE LA URIBE DEPARTAMENTO DEL META		
OBJETO DEL PROYECTO	MEJORAMIENTO DE LOS CORREDORES VIALES PARA LA CONEXIÓN PACÍFICO – ORINOQUÍA – VÍA URIBE – CRUCE VERSALLES – PAPAMENE – ALTO LAS CRUCES EN EL MUNICIPIO DE LA URIBE DEPARTAMENTO DEL META		
CONTRATISTA	CONSORCIO VIAL CONEXIÓN ORINOQUÍA		
NIT	901.667.284-6		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	1060 DE 2022		
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO CONEXIÓN PACÍFICO		









AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT. 900 220 547-5

REGISTRO FOTOGRÁFICO DETALLADO

CONTRATO N°	779 DE 2022	PROYECTO N°	2022005500031
OBJETO DEL CONTRATO	MEJORAMIENTO DE LOS CORREDORES VIALES PARA LA CONEXIÓN PACÍFICO – ORINOQUÍA – VÍA URIBE – CRUCE VERSALLES – PAPAMENE – ALTO LAS CRUCES EN EL MUNICIPIO DE LA URIBE DEPARTAMENTO DEL META		
OBJETO DEL PROYECTO	MEJORAMIENTO DE LOS CORREDORES VIALES PARA LA CONEXIÓN PACÍFICO – ORINOQUÍA – VÍA URIBE – CRUCE VERSALLES – PAPAMENE – ALTO LAS CRUCES EN EL MUNICIPIO DE LA URIBE DEPARTAMENTO DEL META		
CONTRATISTA	CONSORCIO VIAL CONEXIÓN ORINOQUÍA		
NIT	901.667.284-6		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	1060 DE 2022		
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO CONEXIÓN PACÍFICO		

TERRAPLENES CON MATERIAL MIXTO DE RIO SIN PROCESAR









AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT. 900 220 547-5

REGISTRO FOTOGRÁFICO DETALLADO

CONTRATO N°	**779 DE 2022**	**PROYECTO N°**	**2022005500031**
OBJETO DEL CONTRATO	MEJORAMIENTO DE LOS CORREDORES VIALES PARA LA CONEXIÓN PACÍFICO – ORINOQUÍA – VÍA URIBE – CRUCE VERSALLES – PAPAMENE – ALTO LAS CRUCES EN EL MUNICIPIO DE LA URIBE DEPARTAMENTO DEL META		
OBJETO DEL PROYECTO	MEJORAMIENTO DE LOS CORREDORES VIALES PARA LA CONEXIÓN PACÍFICO – ORINOQUÍA – VÍA URIBE – CRUCE VERSALLES – PAPAMENE – ALTO LAS CRUCES EN EL MUNICIPIO DE LA URIBE DEPARTAMENTO DEL META		
CONTRATISTA	CONSORCIO VIAL CONEXIÓN ORINOQUÍA		
NIT	901.667.284-6		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	1060 DE 2022		
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO CONEXIÓN PACÍFICO		









27774 243

	INFORME ACTA PARCIAL	
	PERIODO ACTA PARCIAL 1	

INFORME COMPONENTE SOCIAL

	CONSORCIO VIAL CONEXIÓN ORINOQUIA	CÓDIGO: 01
		VERSIÓN: 01
	INFORME SOCIAL	Fecha: ABRIL 2023

INFORME SOCIAL DE OBRA
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA N°779 - 2022

"MEJORAMIENTO DE LOS CORREDORES VIALES PARA LA CONEXIÓN PACÍFICO – ORONOQUÍA – VÍA URIBE – CRUCE VERSALLES – PAPAMENE – ALTO LAS CRUCES EN EL MUNICIPIO DE LA URIBE DEPARTAMENTO DEL META"




ENTIDAD CONTRATANTE: AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META (AIM)
CONTRATISTA: CONSORCIO VIAL CONEXIÓN ORINOQUIA

INFORME MENSUAL DE CONSTRUCTOR N° 9
PERIODO COMPRENDIDO DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2024

27776

	CONSORCIO VIAL CONEXIÓN ORINOQUIA	CÓDIGO: 01
		VERSIÓN: 01
	INFORME SOCIAL	Fecha: ABRIL 2023

REVISIÓN Y APROBACIÓN

GENERALIDADES			
Objeto del Contrato	"MEJORAMIENTO DE LOS CORREDORES VIALES PARA LA CONEXIÓN PACÍFICO – ORONOQUÍA – VÍA URIBE – CRUCE VERSALLES – PAPAMENE – ALTO LAS CRUCES EN EL MUNICIPIO DE LA URIBE DEPARTAMENTO DEL META"		
Título de Documento	Informe De Obra		
Documento No.	INF-9		
APROBACIÓN			
CONSORCIO VIAL CONEXIÓN ORINOQUIA	Nombre	:	NAYARITH RENGIFO MURILLO
CARGO		:	PROFESIONAL SOCIAL DE OBRA
Responsable por la Revisión de Obra:	Firma	:	
	Fecha	:	30/04/2024

	CONSORCIO VIAL CONEXIÓN ORINOQUIA	CÓDIGO: 01
		VERSIÓN: 01
	INFORME SOCIAL	Fecha: ABRIL 2023

28066

TABLA DE CONTENIDO

REVISIÓN Y APROBACIÓN 2
1. INTRUDUCCIÓN: 6
2. LOCALIZACIÓN DE INTERVENCIÓN DEL PROYECTO 7
3. ALCANCE 9
4. INFORMACIÓN PAGA Y PLAN DE GESTIÓN SOCIAL 9
5. PLAN DE GESTIÓN SOCIAL – ACTIVIDADES REALIZADOS EN EL PERIODO REPORTADO. 9
8. CONCLUSIONES 29
9. REGISTRO FOTOGRÁFICO 30
10. ANEXOS 44

LISTADO DE TABLAS

Tabla 1. Capacitación e inducción 10

Tabla 2. Indicador del subprograma 1.2. Capacitación y concienciación del personal de obra 11

Tabla 3. Actividades desarrolladas durante el periodo reportado. 12

Tabla 4.Consolidado personal contratista vinculado al proyecto 2023. 12

Tabla 5.Consolidado personal contratista vinculado al proyecto 2024. 13

Tabla 6. Indicadores Subprograma 6.1 seguimiento y control a la mano de obra contratada con enfoque de género, derechos y diferencial. 13

Tabla 7. Información de actividades realizadas durante el periodo reportado 15

Tabla 8. Indicador del subprograma 8.1 Subprograma seguimiento y control a la infraestructura de predios y servicios públicos 15

Tabla 9. Información de actividades realizadas en el periodo reportado 16

Tabla 10. Indicador del subprograma 8.2 Subprograma seguimiento y control al apoyo y orientación para a la gestión interinstitucional en la recuperación del derecho de vías 16

Tabla 11. Estado actual de las PQRS del proyecto 18

Tabla 12. Seguimiento PQRS del proyecto. 18

Tabla 13. Indicador del subprograma 10.1 Subprograma seguimiento y control a la atención a la comunidad. 21

Tabla 14. Actividades realizadas durante el periodo reportado. 22

Tabla 15. Indicador del subprograma 10.2 Subprograma seguimiento y control a la información y divulgación 23

Tabla 16. Actividades realizadas Seguimiento y control a la cultura vial y participación comunitaria 25

Tabla 17. Indicador del subprograma 10.3 Subprograma seguimiento y control a la cultura vial y participación comunitaria 25

Tabla 18. Correspondencia recibida en el periodo reportado 27

Tabla 19. Correspondencia enviada en el periodo reportado 28

LISTA DE FOTOGRAFIAS

Fotografía 1 Inducción al personal desde el componente social. 30

Fotografía 2 capacitación al personal desde el componente social. 31

Fotografía 3 verificación del personal vinculado en las bases sociales del municipio. 31

Fotografías 4 diligenciamiento permisos de intervención voluntaria en predios. ... 32

Fotografía 5 Atención a comunidad 33

Fotografía 6 Cartelera informativa SAU 34

Fotografía 7 Aviso SAU 34

Fotografía 8 Instalación de punto móvil 35

Fotografía 9 Piezas divulgativas. 36

Fotografía 10 Socialización inicio fase constructiva del proyecto. 38

Fotografía 11 Participación en Consejo Política Social – Donde se genera compromiso con la institucionalidad en realizar actividades de cultura vial. 03.04.2024 39

Fotografías 12 Se socializan actividades para proyectar con alcaldía municipal en seguridad vial. 8.04.2024 39

Fotografías 13 Se realiza recepción de hojas de vida, para la construcción del banco de hojas de vida. Abril 40

Fotografías 14 campaña de seguridad vial en el marco de la celebración de la niñez 26.04.2024 40

Fotografía 15 Participación en MIAF 02.04.2024 43

Fotografías 16 Participación en reunión con el Ministerio Del Interior, como seguimiento a la solicitud realizada a la procedencia o no procedencia de consulta previa. 8.04.2024 43

1. INTRUDUCCIÓN:

El presente informe da cuenta de las actividades ejecutadas y programadas en cumplimiento a los lineamientos establecidos desde el área social del contrato de obra pública número N° 779 2022, que tiene como objeto "**MEJORAMIENTO DE LOS CORREDORES VIALES PARA LA CONEXIÓN PACÍFICO – ORONOQUÍA – VÍA URIBE – CRUCE VERSALLES – PAPAMENE – ALTO LAS CRUCES EN EL MUNICIPIO DE LA URIBE DEPARTAMENTO DEL META**". Logrando que la comunidad a través de la gestión social y acompañamiento tenga acceso a la información sobre la ejecución del proyecto, pueda manifestar sus peticiones, quejas, reclamos, solicitudes e inquietudes, logre participar activamente durante la ejecución de la obra y ejerza control social sobre la misma, minimizar los impactos que puedan generarse con la intervención del proyecto y garantizar que las condiciones al finalizar la obra, sean iguales o mejores a las encontradas, la comunidad ha manifestado y demostrado el agradecimiento e interés por la obra que está en proceso de ejecución.

El presente informe, contempla los aspectos relacionados con la Gestión Social del proyecto, en concordancia con la ley aplicable y el contrato, teniendo como referencia la Guía de manejo ambiental de proyectos de infraestructura modo carretero de Invias.

2. LOCALIZACIÓN DE INTERVENCIÓN DEL PROYECTO

Localización: Municipio de La Uribe, Meta.

Objeto: MEJORAMIENTO DE LOS CORREDORES VIALES PARA LA CONEXIÓN PACÍFICO – ORINOQUÍA – VÍA URIBE – CRUCE VERSALLES – PAPAMENE – ALTO LAS CRUCES EN EL MUNICIPIO DE LA URIBE DEPARTAMENTO DEL META

Plazo: Hasta el 30 de diciembre de 2028

Contratista: Consorcio Conexión Vial Orinoquía

El proyecto se enmarca dentro del programa "Colombia Rural"

El proyecto contempla el mejoramiento de 15 km de vía del corredor comprendido entre la Vía Uribe – Cruce Versalles – Papamene – Alto Las Cruces.

La ejecución del proyecto se divide en dos grandes etapas: Estudios y Diseños y Ejecución física de la obra.

Localización Geográfica Del Proyecto

El Municipio de Uribe – Meta es un Municipio colombiano situado en la región de los llanos orientales.
Vía Uribe – Cruce Versalles – Papamene – Alto Las Cruces en el Municipio de La Uribe, Departamento del Meta.
Km 1 vía Uribe Colombia Margen izquierda Puente sobre río Duda

Población: 8180 habitantes

Densidad poblacional: 1,3 hab/km²

Extensión: 630700 hectáreas

Altura: 685 metros sobre el nivel del mar

Etnias: el 2.2% de la población residente en La Uribe se autorreconoce como Indígena.

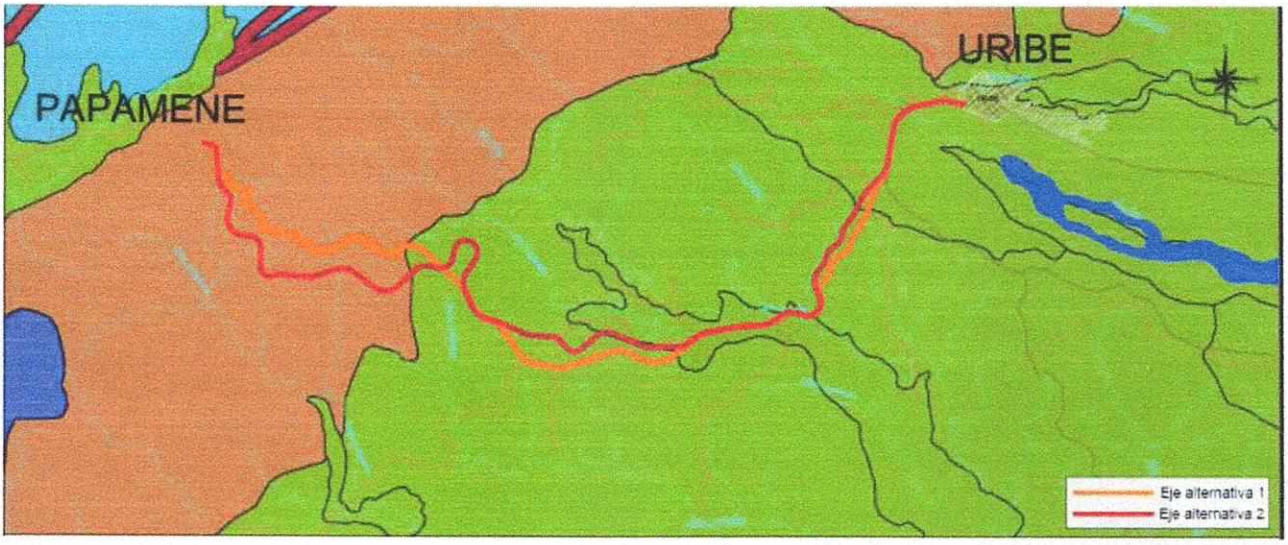


Ilustración 1 Localización del Proyecto

Área de influencia:

1. Vereda Papamene
2. Vereda Santander
3. Vereda Yavia

3. ALCANCE

3.1 Contrato de obra N° 779 DE 2022

El objeto del contrato se enmarca en el mejoramiento de los corredores viales para la conexión pacífico – Orinoquía – vía Uribe – cruce Versalles – Papamene – alto las cruces en el municipio de la Uribe departamento del meta, centrando las labores en los primeros quince kilómetros entre La Uribe y Papamene.

4. INFORMACIÓN PAGA Y PLAN DE GESTIÓN SOCIAL

Para el periodo reportado, se cuenta con Plan de Gestión Social, el cual fue aprobado por interventoría mediante oficio CE-01-042-016-2023 y PAGA aprobado por interventoría el 7 de septiembre con el oficio 01-042-0165-2023.

5. PLAN DE GESTIÓN SOCIAL – ACTIVIDADES REALIZADOS EN EL PERIODO REPORTADO.

De acuerdo con el documento PAGA y Plan de Gestión Social se cuentan con los siguientes programas y subprogramas sociales a desarrollar durante la etapa de pre-construcción:

PROGRAMA 1: SEGUIMIENTO Y CONTROL A LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD AMBIENTAL.

- Subprograma 1.2: capacitación y concienciación del personal de obra.

PROGRAMA 6: DESARROLLO LOCAL

- Subprograma 6.1: Seguimiento y control a la mano de obra contratada con enfoque de género.

PROGRAMA 8: GESTIÓN SOCIAL DE INFRAESTRUCTURA, PREDIOS Y SERVICIOS PÚBLICOS.

- Subprograma 8.1: Seguimiento y control a la infraestructura de predios y servicios públicos.

- Subprograma 8.2: Seguimiento y control de apoyo y orientación para la gestión interinstitucional en la recuperación del derecho de vía.

PROGRAMA 10: PARTICIPACIÓN, GOBERNANZA E INCLUSIÓN SOCIAL

- Subprograma 10.1 Seguimiento y control a la atención a la comunidad.
- Subprograma 10.2 Seguimiento y control a la información y divulgación.
- Subprograma 10.3 Seguimiento y control a la cultura vial y participación comunitaria.

5.1 PROGRAMA 1: SEGUIMIENTO Y CONTROL A LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD AMBIENTAL.

El programa presenta tres (3) proyectos orientados al seguimiento y control de todas las actividades de manejo ambiental y social necesarias para la ejecución de las obras en el marco del cumplimiento de las normas contractuales y normatividad ambiental y social vigente, para el área social y sus obligaciones contractuales solo se estableció como parte del plan de gestión social el subprograma 1.2 capacitación y concienciación del personal de obra, el cual se relaciona a continuación.

5.1.1 Subprograma 1.2: capacitación y concienciación del personal de obra.

Objetivo del subprograma:

Realizar el control y seguimiento a las acciones de capacitación e inducción del personal asociado a las actividades constructivas durante el desarrollo del proyecto desde el componente social.

Durante este periodo se han realizado las siguientes actividades correspondientes a este subprograma.

Tabla 1. Capacitación e inducción

FECHA	TEMA
1. 30/04/2024 Cadenero 2. 30/04/2024 Conductor	Inducción al personal desde el componente social – Temática Plan de gestión social y Paga, buen trato y respeto a la comunidad. **ANEXO 1.2 PLANILLA INDUCCIÓN.**

FECHA	TEMA
25/04/2024	Capacitación al personal en trabajo en equipo. **ANEXO 1.2 CAPACITACION PERSONAL - Asistentes 2 personas.**

Tabla 2. Indicador del subprograma 1.2. Capacitación y concienciación del personal de obra

DESCRIPCION DEL INDICADOR	INDICADOR OBTENIDO	UNIDAD DE MEDICIÓN	VALOR MÍNIMO DE ACEPTACIÓN	TIEMPO MÁXIMO DE CORRECIÓN	ANALISIS DEL INDICADOR
N.º personal capacitado / N° inducciones realizadas* 100	2/2*100=100%	100%	100%	1 mes	Se da cumplimiento del 100% del indicador.
N.º de personal capacitado / N° de personal vinculado al proyecto* 100	28/37*100=76%	100%	50%	1 mes	Se da cumplimiento del indicador con el 76%.

5.2 PROGRAMA 6: DESARROLLO LOCAL.

En el programa de desarrollo local se formulan actividades para el control y seguimiento a la implementación de las medidas de manejo propuestas para la prevención, minimización, compensación y/o corrección de los impactos causados por los proyectos de infraestructura vial en las comunidades del área de influencia, a través de la promoción del desarrollo local en términos de empleabilidad, obras con participación comunitaria, con el fin de incorporar buenas prácticas ambientales, sociales y económicas, que contribuyan a la conservación del ambiente y el desarrollo socioeconómico del territorio.

5.2.1 Subprograma 6.1: Seguimiento y control a la mano de obra contratada con enfoque de género.

Objetivo del subprograma:

Verificar la inclusión de mano de obra territorial de hombres y mujeres en igualdad de condiciones que hagan parte de grupos vulnerables, como mujeres y/o personas con discapacidad, o con identidades diversas de género.

Tabla 3. Actividades desarrolladas durante el periodo reportado.

FECHA	LUGAR	INSTUCIÓN / DEPENDECIA	ACTIVIDAD
1 al 30 de abril 2024	Oficina CVCO – Oficina Alcaldía	Consorcio Vial Conexión Orinoquia / Alcaldía	Se realizo publicación de recepción de hojas de vida en el municipio de Uribe.
1 al 30 de abril 2024	Oficina CVCO – Oficina Alcaldía	Consorcio Vial Conexión Orinoquia / Alcaldía	Se realizo vinculación laboral de 2 personas (2 hombres).

A continuación, se relaciona la información del personal vinculado actualmente al proyecto, para el periodo reportado:

Tabla 4.Consolidado personal contratista vinculado al proyecto 2023.

MES – AÑO	TRABAJADORES VINCULADOS AL PROYECTO			ORIGEN		GENERO		MIEMBROS PROGRAMA ARN	CATEGORÍA	
	TOTAL, PERSONAL VINCULADO	DIRECTOS (D)	INDIRECTOS (I)	ÁREA DE INFLUENCIA DIRECTA (AID)	ÁREA DE INFLUENCIA INDIRECTA (AII)	M	F		MANO DE OBRA CALIFICADA (M.O.C)	MANO DE OBRA NO CALIFICADA (M.O.N.C)
Abril	3	3	0	2	1	1	2	0	3	0
Mayo	4	4	0	2	2	1	3	0	4	0
Junio	4	4	0	2	2	1	3	0	4	0
Julio	4	4	0	2	2	1	3	0	4	0
Agosto	21	6	15	4	11	13	8	0	18	3
Septiembre	39	12	27	16	23	30	9	0	33	6
Octubre	43	15	28	19	24	35	8	0	36	7
Noviembre	50	16	34	18	32	41	9	1	42	8
Diciembre	41	14	27	16	25	34	7	1	36	5

Tabla 5.Consolidado personal contratista vinculado al proyecto 2024.

MES – AÑO	TRABAJADORES VINCULADOS AL PROYECTO			ORIGEN		GENERO		MIEMBROS PROGRAMA ARN	CATEGORÍA	
	TOTAL, PERSONAL VINCULADO	DIRECTOS (D)	INDIRECTOS (I)	ÁREA DE INFLUENCIA DIRECTA (AID)	ÁREA DE INFLUENCIA INDIRECTA (AII)	M	F		MANO DE OBRA CALIFICADA (M.O.C)	MANO DE OBRA NO CALIFICADA (M.O.N.C)
Enero	42	17	25	20	22	33	9	1	36	6
Febrero	35	14	21	10	25	27	8	1	31	4
Marzo	35	14	21	10	25	27	8	1	31	4
Abril	37	16	21	10	27	9	28	1	33	4

ANEXO 6.1 ACTA Y CUADRO RELACION DEL PERSONAL.

Durante el periodo se dio el ingreso del siguiente personal:

- Cadenero
- Conductor

Para el período, se reportó la vinculación de mano de obra al proyecto, por parte del contratista de 16 colaboradores directos y 21 colaboradores con vinculación indirecta, de los cuales 10 pertenecen al Área de Influencia directa del proyecto, vinculación de 9 mujeres, 1 persona está vinculada a la ARN como firmante del acuerdo de paz, 1 personas con primer empleo, vinculación de 3 personas menores de 28 años, 2 mujeres vinculada al programa familias en acción y 5 personas inscritas en el registro único de víctimas.

ANEXO 6.2 CERTIFICADOS BASES SOCIALES.

Durante el periodo reportado se garantiza la afiliación al personal a la ARL, EPS, Pensión y Caja de Compensación Familiar.

Tabla 6. Indicadores Subprograma 6.1 seguimiento y control a la mano de obra contratada con enfoque de género, derechos y diferencial.

DESCRIPCION DEL INDICADOR	INDICADOR OBTENIDO	VALOR MÍNIMO DE ACEPTACIÓN	TIEMPO MÁXIMO DE CORRECIÓN	ANALISIS DEL INDICADOR
N.º de personas vinculadas de las	7/16*100=44%	60%	1 mes	No se da cumplimiento al

zonas / N° total de empleos *100				60% del indicador, debido a que el proyecto se encuentra en la fase pre-constructiva y no se requiere una amplia vinculación laboral.
Mano de obra perteneciente a grupos vulnerables / N° total de empleos *100	8/16*100=59%	50%	1 mes	Se da cumplimiento al indicador donde se cuenta con un indicador del 50% de cumplimiento

5.3 PROGRAMA 8: GESTIÓN SOCIAL DE INFRAESTRUCTURA, PREDIOS Y SERVICIOS PÚBLICOS.

Objetivo del programa:

En el seguimiento y control para el Programa de Gestión social de infraestructura, predios y servicios públicos se formulan actividades para el control y seguimiento a la implementación de las medidas de manejo propuestas para la prevención, minimización, compensación y/o corrección de los impactos causados por los proyectos de infraestructura vial en las comunidades del área de influencia, a través del establecimiento de los lineamientos para el acompañamiento desde la gestión social a las acciones técnicas necesarias a realizarse en predios, redes de servicios públicos y el adecuado uso del derecho de vía, para el desarrollo de las actividades constructivas de los proyectos liderados por INVÍAS y AIM.

5.3.1 Subprograma 8.1: Seguimiento y control a la infraestructura de predios y servicios públicos.

Objetivo del subprograma:

Verificar el registro del estado físico de las construcciones e infraestructura existente (cercas, servicios públicos y comunitarios, entre otros) aledaña a las áreas de

intervención de la obra, infraestructura de uso temporal del contratista y en el derecho de vía, previo al inicio de cualquier actividad técnica del proyecto

Tabla 7. Información de actividades realizadas durante el periodo reportado

FECHA	LUGAR	INSTUCIÓN / DEPENDECIA	ACTIVIDAD
1 al 15 de abril	Vereda Yavia	Contratista Comunidad	Se realizo el diligenciamiento permisos de intervención voluntaria en predios, los cuales corresponden al tramo 2 del corredor vial, levantamiento acta de compromiso para correr cercas. **VER ANEXO 8.1 PERMISOS DE INTERVENCION EN PREDIOS.**

No se presentan afectaciones en infraestructura ni en predios, No aplican actividades para el periodo reportado.

Tabla 8. Indicador del subprograma 8.1 Subprograma seguimiento y control a la infraestructura de predios y servicios públicos

DESCRIPCION DEL INDICADOR	INDICADOR OBTENIDO	UNIDAD DE MEDICIÓN	VALOR MÍNIMO DE ACEPTACIÓN	TIEMPO MÁXIMO DE CORRECIÓN	ANALISIS DEL INDICADOR
N.º de actas de vecindad realizadas / N° total de actas de vecindad construcciones aledañas *100	28/28*100=100%	100%	100%	1 mes	Se da cumplimiento al 100% del indicador.
N° afectaciones subsanadas / N° afectaciones presentadas	0/0*100=0%	0%	60%	1 mes	No se presentan afectaciones en la infraestructura.

5.3.2 Subprograma 8.2: Seguimiento y control de apoyo y orientación para la gestión interinstitucional en la recuperación del derecho de vía.

Objetivo del subprograma:

Verificar la generación y/o formulación de estrategias de apoyo interinstitucional con autoridades locales y otras entidades de relevancia en el área de influencia del proyecto, orientadas a promover la recuperación del derecho de vía de las carreteras a intervenir.

Tabla 9. Información de actividades realizadas en el periodo reportado

FECHA	LUGAR	INSTUCIÓN / DEPENDECIA	ACTIVIDAD
12 marzo del 2024	Casco Urbano	Alcaldía	En el área de influencia no se cuentan con unidades económicas ubicadas en la franja vial. De igual forma el 12 de marzo se radico oficio CCV-ALC-402-779-2023, solicitando articulación para realizar socialización de la ley 1228 y la recuperación del espacio público con actores sociales en el área de influencia del proyecto. A la fecha no se cuenta con respuesta por parte de la administración, 30 abril 2024.

Tabla 10. Indicador del subprograma 8.2 Subprograma seguimiento y control al apoyo y orientación para a la gestión interinstitucional en la recuperación del derecho de vías

DESCRIPCION DEL INDICADOR	INDICADOR OBTENIDO	VALOR MÍNIMO DE ACEPTACIÓN	TIEMPO MÁXIMO DE CORRECIÓN	ANALISIS DEL INDICADOR
Base de datos actualizada	1/1*100=100%	1	1 mes	Se da cumplimiento al 100% del indicador. Frecuencia de medición anual.
N° de asistentes a reunión / N° de	2/2*100=0%	100%	1 mes	Se da cumplimiento al 100% del indicador.

reuniones programadas				Frecuencia de medición trimestral.
N° actas de compromiso elaboradas / N° actas de compromiso ejecutadas	0/0*100=0%	100%	1 mes	Para el periodo reportado no se realizan actas de compromiso.

5.4 PROGRAMA 10: PARTICIPACIÓN, GOBERNANZA E INCLUSIÓN SOCIAL

Objetivo del programa:

En el seguimiento y control para el programa de participación, gobernanza e inclusión social se formulan actividades para el control y seguimiento a la implementación de las medidas de manejo propuestas para la prevención, minimización, compensación y/o corrección de los impactos causados por los proyectos de infraestructura vial en las comunidades del área de influencia, a través de la garantía de la ejecución de procesos de información, participación y promoción de la organización comunitaria en torno a los proyectos de infraestructura vial. Además, se estipulan los enfoques de género, de derechos y diferencial como ejes transversales de la gestión socio ambiental de los proyectos.

5.4.1 Subprograma 10.1 Seguimiento y control a la atención a la comunidad.

Objetivo del subprograma:

Verificar el funcionamiento del sistema de atención y respuesta oportuna y eficaz a las manifestaciones (quejas, solicitudes, reclamos, peticiones, sugerencias, denuncias, etc.), interpuestas por comunidades y autoridades mediante los medios dispuestos para esto (correo electrónico, llamada telefónica, personalmente, entre otros).

5.4.1.1 ESTADO ACTUAL DE LAS PQRS DEL PROYECTO.

Durante el periodo reportado no se reciben PQRS.

Tabla 11. Estado actual de las PQRS del proyecto

ESTADO ACTUAL DE LAS PQRS DEL PROYECTO			
MES /AÑO	**PRESENTADAS**	**ABIERTAS**	**CERRADAS**
Mayo 2023	0	0	0
Junio 2023	1	1	0
Julio 2023	0	0	0
Agosto 2023	0	0	0
Septiembre 2023	0	0	0
Octubre 2023	2	1	1
Noviembre 2023	3	2	1
Diciembre 2023	1	2	1
Enero 2024	0	1	0
Febrero 2024	0	1	0
Marzo 2024	0	1	0
Abril 2024	0	1	0

Tabla 12. Seguimiento PQRS del proyecto.

N° PQRS	FECHA INGRESO	NOMBRE DEL USUARIO	TIPO	SEGUIMIENTO	ESTADO	
					A	C
1	23/05/2023	JAC Vereda Papamene	Solicitud	El 20 de junio, el contratista envió respuesta a comunidad mediante oficio CVC-JAC 057-2023. Para el mes de julio, se realizó recorrido con la comunidad de la vereda Papamene para la identificación de los puntos críticos a intervenir, respondiendo a su solicitud.	X	
2	1/10/2023	Carlos Gómez	Solicitud	El señor Carlos Gómez Realiza solicitud de relleno en el predio con material de excavación de la obra, a lo cual se realizó respuesta mediante oficio CVC-JAC 271-779-2023.		X

N° PQRS	FECHA INGRESO	NOMBRE DEL USUARIO	TIPO	SEGUIMIENTO	ESTADO	
					A	C
3	6/10/2023	JAC Vereda Santander	Solicitud	El presidente de la JAC solicita MANTENIMIENTO DE LA VÍA LA LAGARTIJA ESCUELA SANTANDER Y LA YE DE SANTANDER ALTO, a lo cual se realizó respuesta mediante oficio CVC-JAC 270-779-2023.		X
4	3/11/2023	Angela Chavarriaga Alcaldía	Solicitud	Asunto: Apoyo a celebración del día comunal para el día 19 de noviembre. El consorcio no realiza apoyo en la actividad, debido a que el contrato no cuenta con recursos para el desarrollo de estas actividades.		X
5	21/11/2023	JAC Vereda Papamene	Solicitud	Asunto: invitación a reunión con la directiva de la vereda Papamene. El miércoles 22 de noviembre se participó en reunión programada donde se acordó realizar campaña de seguridad vial con los niños y niñas de la vereda en el mes de diciembre.		X
6	29/11/2023	Geily Lorena Machuca Alcaldía	Solicitud	Asunto: invitación y solicitud de apoyo logístico al festival de la paz y la confraternidad Uribense 2023. El Consorcio acordó con la administración municipal apoyar la Travesía Ciclista MTB 45 K el día domingo 3 de diciembre, en la ruta Cabecera Municipal – vereda Papamene – cabecera municipal en lo siguiente 1. Conductor: Esneider Bedoya Beltrán Cedula: 1.134.434.496 de Mapiripan. Celular número: 3124635830 2. Camión tipo turbo, placa LZO560. Disponible desde las 6 am, el cual contara con camilla y botiquín. 3. Punto de hidratación, que cuenta con carpa, botiquín de primeros auxilios, camilla, residente social quien realizara campaña - sensibilización en seguridad vial y apoyo en la hidratación 5. Personal del consorcio participara en la travesía. El 3 de diciembre se realizó cierre a la PQRS.		X

	CONSORCIO VIAL CONEXIÓN ORINOQUIA INFORME SOCIAL	CÓDIGO: 01 VERSIÓN: 01 Fecha: ABRIL 2023

N° PQRS	FECHA INGRESO	NOMBRE DEL USUARIO	TIPO	SEGUIMIENTO	ESTADO	
					A	C
7	19/12/2023	JAC Vereda Versalles	Solicitud	Solicitud incentivo navideño a los niños y niñas de la vereda		X

FECHA	LUGAR	INSTUCIÓN / DEPENDECIA	ACTIVIDAD
Abril 2024	Oficina contratista	Comunidad Interventoría Contratista	Se realizo conversación con el señor Jairo Campiño, presidente de la JAC de la vereda Papamene como seguimiento al mantenimiento realizado en la vía. Se concluye que en el mes de abril se continua con mantenimiento, debido a los daños ocasionados por las lluvias a las actividades realizadas.
Abril 2024	Vereda Papamene	Contratista, Interventoría y comunidad	Se cuenta con punto móvil en la escuela de la vereda Papamene, donde se relacionó información propia del contrato (número del contrato, objeto, proceso de recepción de hojas de vida, actividades realizadas en la fase pre-cronstructiva y constructiva).
Abril 2024	Vereda Santander	Contratista, Interventoría y comunidad	Se cuenta con punto móvil en la escuela de la vereda Santander, donde se relacionó información propia del contrato (número del contrato, objeto, proceso de recepción de hojas de vida, actividades realizadas en la fase pre-cronstructiva y constructiva).
Abril 2024	Vereda Yavia	Contratista, Interventoría y comunidad	Se cuenta con punto móvil en la escuela de la vereda Yavia, donde se relacionó información propia del contrato (número del contrato, objeto, proceso de recepción de hojas de vida, actividades realizadas en la fase pre-cronstructiva - constructiva).
Abril 2024	Alcaldía	Contratista, Interventoría y comunidad	Se cuenta con punto móvil en la alcaldia, donde se relacionó información propia del contrato (número del contrato, objeto, proceso de recepción de hojas de vida, actividades realizadas en la fase pre-cronstructiva - constructiva).

FECHA	LUGAR	INSTUCIÓN / DEPENDECIA	ACTIVIDAD
Abril 2024	Oficina Consorcio Vial Conexión Orinoquia.	Contratista, Interventoría y	Se cuenta con oficina de servicio de atención al usuario (SAU), ubicada en la dirección KM 0+900 vía Uribe la Julia – Puente Rio Duda. La cual fue aprobada por interventoría mediante oficio 01-042-0254-2023 basada en la visita que realizo la profesional social de interventoría al SAU el día 25/10/2023.

Durante el periodo reportado no se reciben PQRS.

Tabla 13. Indicador del subprograma 10.1 Subprograma seguimiento y control a la atención a la comunidad.

DESCRIPCION DEL INDICADOR	INDICADOR OBTENIDO	VALOR MÍNIMO DE ACEPTACIÓN	TIEMPO MÁXIMO DE CORRECIÓN	ANALISIS DEL INDICADOR
# de PQRS recepcionadas / # de PQRS presentadas en el periodo * 100	0/0*100=100%	0	1 mes	Se da cumplimiento al 100% del indicador. Durante el periodo reportado no se recepcionaron PQRS, se realizó trámite de cierre de una PQRS del mantenimiento del corredor vial solicitado por la JAC de la vereda Papame.
# de PQRS contestadas dentro del término legal/ # de PQRS presentadas en el periodo * 100	0/0*100=100%	0	1 mes	Se da cumplimiento al 100% del indicador. Durante el periodo reportado no se recibieron PQRS, se realizó trámite de cierre de una PQRS
N° de oficinas fijas propuestas/ N° de oficinas fijas	1/1*100=100%	100%	1 mes	Se da cumplimiento al 100% del indicador, ya que se cuenta con SAU fija, la cual fue

implementadas X 100				aprobada por interventoría mediante oficio 01-042-0254-2023.
N° puntos móviles de atención al usuario propuestas/ N° puntos móviles de atención al usuario implementadas X 100%	4/4*100=100%	100%	1 mes	Se da cumplimiento al 100% del indicador, ya que se tienen oficina móvil instalada en la vereda Yavia, Papamene, Santander e instalaciones de la Alcaldía.

5.4.2 Subprograma 10.2 Seguimiento y control a la información y divulgación.

Objetivo del subprograma:

Verificar la implementación de la estrategia pública de divulgación para brindar información oportuna, clara, veraz y actualizada a los actores sociales e institucionales sobre las actividades ejecutadas en el marco del contrato

Tabla 14. Actividades realizadas durante el periodo reportado.

FECHA	LUGAR	INSTUCIÓN / DEPENDECIA	ACTIVIDAD
Abril 2024	Whatsapp	Comunidad Contratista	Se comparten piezas divulgativas en el grupo de Whatsapp, convocatorias laborales información del estado del proyecto: En abril se continúa divulgando la siguiente información Si eres técnico, tecnólogo, profesional, auxiliar, guarda de seguridad o tienes otro desempeño, ayúdanos a fortalecer la base de datos del nivel académico del Uribe, Meta. Ingresa al siguiente formulario y responde: https://forms.gle/FGbT21KEdZ6j5D9y5 

FECHA	LUGAR	INSTUCIÓN / DEPENDECIA	ACTIVIDAD
Abril 2024	Whatsapp	Comunidad Contratista	Se comparte piezas informativas con la ubicación del SAU y fase del contrato.
Abril 2024	Whatsapp	Comunidad Contratista	Se comparten piezas comunicativas de actividades realizadas en el corredor vial.
Abril 2024	Whatsapp	Comunidad Contratista	Se comparten piezas comunicativas de la realización del banco de hojas de vida de personas ubicadas en el área de influencia del proyecto.
Abril 2024	Whatsapp y físicas	Comunidad Contratista	Se comparten piezas divulgativas de seguridad y cultura vial.
8/04/2024	Casco urbano	Contratista Alcaldía	Se socializan actividades para proyectar con alcaldía municipal en seguridad vial.
19/04/2024	Escuela vereda Yavia	Comunidad Contratista Interventoría AIM INVIAS	Se realizo socialización de inicio de la fase constructiva del proyecto, donde se contó con la participación de comunidad de las veredas Yavia, vereda Santander, vereda Papamene, representante de la asociación de mujeres, alcaldía, INVIAS, AIM, concejo municipal e interventoría. 10.2 Acta socialización inicio fase constructiva

Tabla 15. Indicador del subprograma 10.2 Subprograma seguimiento y control a la información y divulgación

DESCRIPCION DEL INDICADOR	INDICADOR OBTENIDO	VALOR MÍNIMO DE ACEPTACIÓN	TIEMPO MÁXIMO DE CORRECIÓN	ANALISIS DEL INDICADOR
N° de reuniones de inicio ejecutadas/ N° de reuniones programadas X 100	3/3*100=100%	100%	1 mes	Se da cumplimiento al 100% del indicador El 19 de abril se realizo socialización de inicio de actividades constructivas donde participaron las 3

				veredas del área de influencia.
N° de reuniones de seguimiento ejecutadas/ N° de reuniones programadas X 100	0/3*100=0%	100%	1 mes	No aplica para el periodo, se proyecta para cuando el proyecto lleve el 50% de ejecución.
N° de reuniones de finalización ejecutadas/ N° de reuniones programadas X 100	0/3*100=0%	100%	1 mes	No aplica para el periodo reportado
N° de reuniones extraordinarias ejecutadas/ N° de reuniones solicitadas X 100	0/0*100=100%	100%	1 mes	Para el periodo, no se recibieron solicitudes de reuniones extraordinarias.
N° de videos programados/N° de videos presentes en la página web	0/1*100=0%	1	1 mes	Se entrega anualmente, a la fecha no aplica debido a que no se cumple el año.
N° de infografías entregadas/ N° propuestos	0/1*100=0%	1	1 mes	Se entrega anualmente, a la fecha no aplica debido a que no se cumple el año.
N° de piezas informativas y de divulgación / N° de piezas informativas y de divulgación propuestas X 100	4/4*100=100%	100%	1 mes	Se realizo entrega de 4 piezas de información y divulgación.

5.4.3 Subprograma 10.3 Seguimiento y control a la cultura vial y participación comunitaria.

Objetivo del programa:

Verificar las estrategias de apropiación del proyecto a través de procesos de educación y concienciación con las comunidades educativas, líderes, comité de

participación comunitaria y población en general. Validar los espacios para la participación y control social.

Tabla 16. Actividades realizadas Seguimiento y control a la cultura vial y participación comunitaria.

FECHA	LUGAR	INSTUCIÓN / DEPENDECIA	ACTIVIDAD
Abril	Vereda Yavia	Contratista, comunidad	Se publicaron piezas en carteleras y redes, donde se promociona la seguridad vial se entregaron recomendaciones a los usuarios de la vía, se explicó que es la seguridad vial y como pueden aportar a disminuir riesgos de siniestros viales.
03/04/2024	Corredor vial	Contratista, comunidad	Se participo en Consejo De Político Social, donde se acordó realizar actividades para mitigar accidentalidad en las vías del municipio y promocionar la cultura y seguridad vial.
26/04/2024	Casco Urbano Uribe	Contratista Comunidad Alcaldía Hogar Infantil Institución Educativa Rafael Uribe Uribe	En el marco de la celebración del día de la niñez se realizo campaña de seguridad vial, donde se entregaron recomendación y se realizaron actividades en promoción de la cultura vial. Se entregaron detalles con mensajes en seguridad vial.

Tabla 17. Indicador del subprograma 10.3 Subprograma seguimiento y control a la cultura vial y participación comunitaria

DESCRIPCION DEL INDICADOR	INDICADOR OBTENIDO	VALOR MÍNIMO DE ACEPTACIÓN	TIEMPO MÁXIMO DE CORRECIÓN	ANALISIS DEL INDICADOR
N° de actividades de sensibilización ejecutadas/ N° de actividades programadas X 100	2/2*100=100%	100%	1 mes	Se da cumplimiento al indicador, donde se programó y ejecuto una actividad, entregando infografías de seguridad vial a la comunidad mediante redes sociales.
N° de talleres de capacitación realizados/ N° de talleres programados X 100	1/1*100=0%	100%	1 mes	Se realizo campaña en seguridad vial con los niños y niñas estudiantes de la escuela, hogar infantil en articulación con administración

				municipal. En casco urbano el 26.04.2024
N° de campañas de seguridad vial realizadas/ N° campañas requeridas X 100	1/1*100=100%	100%	1 mes	Se realizo campaña en seguridad vial con los niños y niñas estudiantes de la escuela, hogar infantil en articulación con administración municipal. En casco urbano el 26.04.2024
N° bases de datos lideres realizadas/ N° de base de datos requeridas	1/1*100=100%	1	1 mes	Se da cumplimiento a cabalidad de este indicador.
N° de comités de participación programados/ N° de comités de participación programados ejecutados X 100	3/3*100=0%	2	1 mes	Se realizo actividad con el comité de participación de cada una de las veredas, en el marco de la socialización de inicio de la fase constructiva: 1. Papamene el día 16/04/2024 2. Yavia el día 16/04/2024 3. Santander el día 16/04/2024 Para el mes de mayo del 2024 se realizará acta de conformación y actividad.
N° de reuniones programadas con veeduria / N° de reuniones ejecutadas X 100	0/1*100=0%	1	1 mes	Los integrantes de la veeduría no programan reunión, se les informa que el consorcio está a disposición para dichas actividades, pero no realizan actividad. La frecuencia de medición es trimestral.

6. OTRAS ACTIVIDADES DE LA GESTIÓN SOCIAL

- ✓ Se programan actividades de gestión social, con comunidad e instituciones, desde cada uno de los programas para el mes de abril y mayo del 2024.
- ✓ Se realizaron mesas de trabajo con la profesional social de interventoría.
- ✓ 2 abril 2024, Participación primera sesión ordinaria de la MIAF, invitación realizada por la alcaldía municipal.
- ✓ 3 abril 2024, Participación en primera sesión ordinaria del COMPOS vigencia 2024, invitación realizada por la alcaldía municipal.
- ✓ 8 abril 2024, Participación en reunión con el Ministerio Del Interior, como seguimiento a la solicitud realizada a la procedencia o no procedencia de consulta previa.
- ✓ 9, 10 y 11 abril 2024, Se verifica información a presentar en el acta de inicio de actividades de la AIM - lista de chequeo contrato de obra.
- ✓ 11 abril 2024. Mesa de trabajo virtual con Maria Efigenia, donde se trataron temas del plan de gestión social versión 2.
- ✓ 29 abril 2024, Se han establecido mesas de trabajo entre el equipo de gestión social, las cuales han sido significativas para el cumplimiento de las obligaciones contractuales y mitigaciones de situaciones presentadas.
- ✓ 4 y 30 de abril, verificación del personal vinculado al consorcio en bases sociales del municipio.
- ✓ 25 abril 2023, Articulación con Plan Territorial De salud, donde se realizó actividad de sensibilización para la prevención y atención de todo tipo de violencias y acoso basados en el género (socialización de rutas de atención del municipio). Actividad realizada con el personal vinculado el 25 de abril 2024.
- ✓ 26 abril 2024, se participo en la celebración de la niñez brújula 2024, donde el consorcio entrego detalles a los niños y niñas. Se acompaño actividad.

7. RELACIÓN DE CORRESPONDENCIA

Tabla 18. Correspondencia recibida en el periodo reportado

FECHA	RADICADO	REMITE	ASUNTO
01/04/2024	NO relaciona	Alcaldía	Respuesta a solicitud con radicado interno 0-0384 del 20 marzo del 2024

22/04/2024	OF-GOB-0120-2024	Alcaldía	Vinculación celebración día de la niñez
25/04/2024	CCP-OC-1060-2022-027	Interventoría Consorcio Conexión Pacifico	Aprobación informe mensual social enero de 2024 – respuesta a oficio CCV-INT-439-779-2023

Tabla 19. Correspondencia enviada en el periodo reportado

FECHA	RADICADO	DESTINATARIO	ASUNTO
4/04/2024	CCV-INT-406-779-2023	Interventoría	Radicado informe marzo
13/04/2024	CCV-INT-415-779-2023	Interventoría	Respuesta a observaciones informe marzo
16/04/2024	CCV-ALC-417-779-2023	Alcaldía municipal	Invitación socialización de inicio fase constructiva del contrato 779 de 2022.
16/04/2024	CCV-INT-418-779-2023	Interventoría	Invitación socialización de inicio fase constructiva del contrato 779 de 2022.
16/04/2024	CCV-JAC-419-779-2023	JAC Vereda Yavia	Invitación socialización de inicio fase constructiva del contrato 779 de 2022.
16/04/2024	CCV-JAC-420-779-2023	JAC Vereda Papamene	Invitación socialización de inicio fase constructiva del contrato 779 de 2022.
16/04/2024	CCV-JAC-421-779-2023	JAC Vereda Santander	Invitación socialización de inicio fase constructiva del contrato 779 de 2022.
16/04/2024	CCV-JAC-422-779-2023	JAC Vereda Versalles	Invitación socialización de inicio fase constructiva del contrato 779 de 2022.
16/04/2024	CCV-JAC-423-779-2023	Comunidad Uribense	Invitación socialización de inicio fase constructiva del contrato 779 de 2022.
16/04/2024	CCV-MDM-424-779-2023	Mesa de mujeres	Invitación socialización de inicio fase constructiva del contrato 779 de 2022.

16/04/2024	CCV-CMU-425-779-2023	Concejo Municipal	Invitación socialización de inicio fase constructiva del contrato 779 de 2022.
16/04/2024	CCV-PMU-426-779-2023	Personería	Invitación socialización de inicio fase constructiva del contrato 779 de 2022.
16/04/2024	CCV-IER-427-779-2023	Institución Educativa Rafael Uribe Uribe	Invitación socialización de inicio fase constructiva del contrato 779 de 2022.
16/04/2024	CCV-IER-432-779-2023	Institución Educativa Rafael Uribe Uribe	Solicitud préstamo
16/04/2024	CCV-ALC-433-779-2023	Alcaldía	Solicitud préstamo y apoyo
30/04/2024	CCV-INT-439-779-2023	Interventoría	Respuesta a observaciones informe marzo

ANEXO 11. CORRESPONDENCIA


8. CONCLUSIONES


- Se continúan realizando acciones para el cumplimiento de las obligaciones sociales contractuales.
- Se tomo como base la guía de manejo ambiental para proyectos de infraestructura modo carretero versión 2022, INVIAS.
- Se brindo atención al usuario desde el SAU a la comunidad.
- Se estableció y se mantiene buena articulación con la institucionalidad del municipio, interventoría y con comunidad.
- Se programaron actividades para el mes de abril del 2024.

9. REGISTRO FOTOGRÁFICO

Subprograma 1.2 Capacitación y concienciación del personal de obra.

Fotografía 1 Inducción al personal desde el componente social.

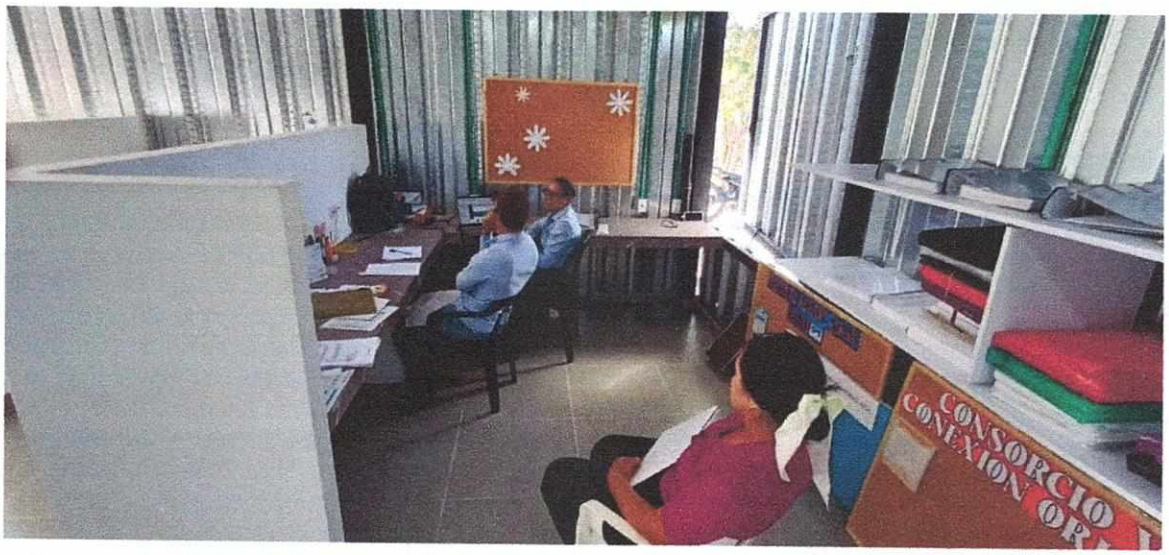

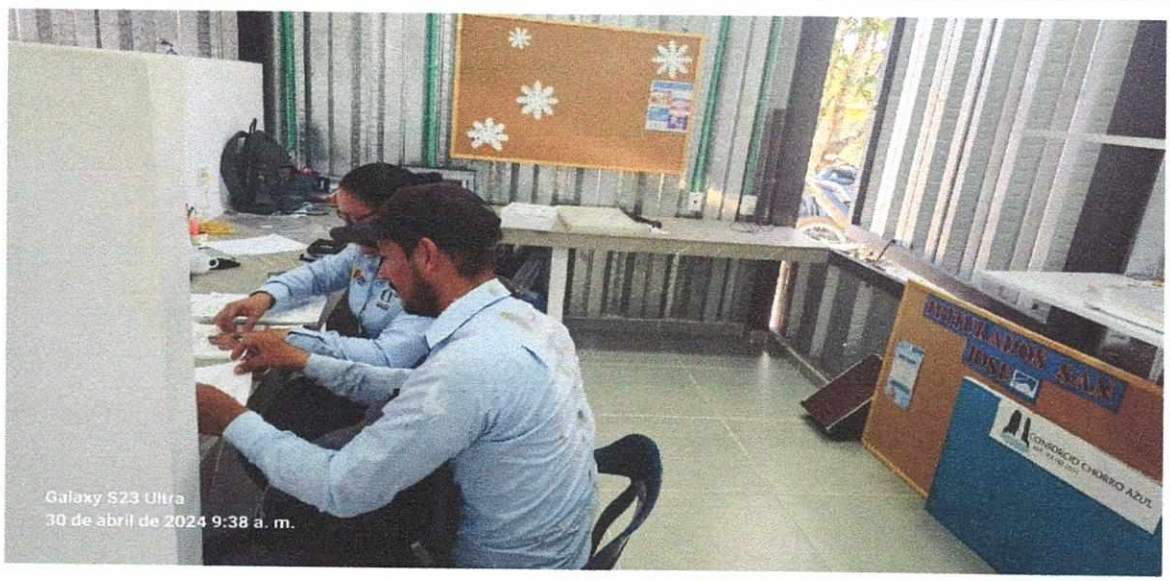

Fotografía 2 capacitación al personal desde el componente social.





Fotografía 3 verificación del personal vinculado en las bases sociales del municipio.



Subprograma 8.1: Seguimiento y control a la infraestructura de predios y servicios públicos.

Fotografías 4 diligenciamiento permisos de intervención voluntaria en predios.

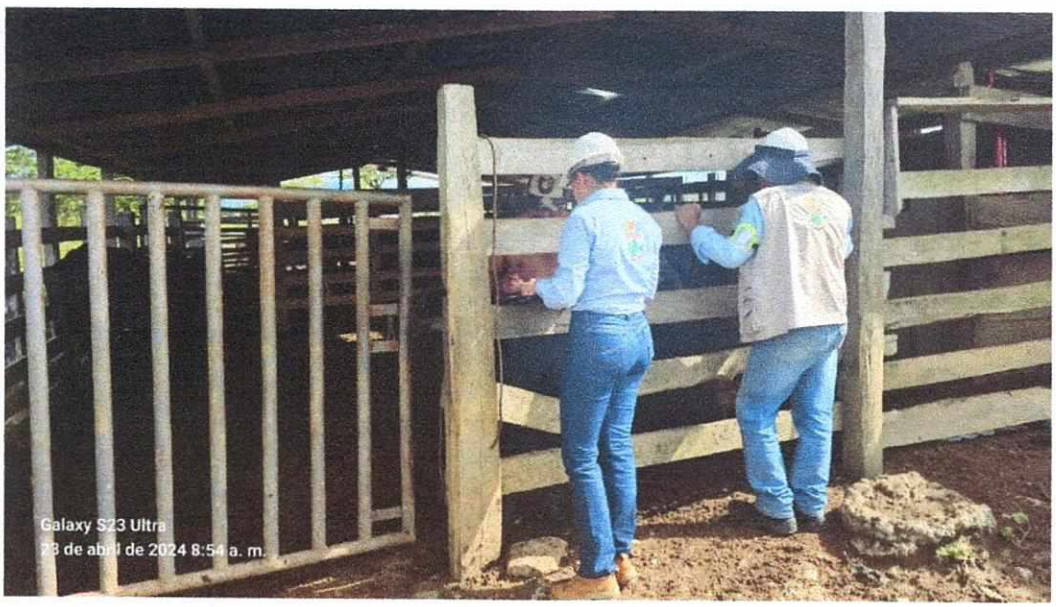

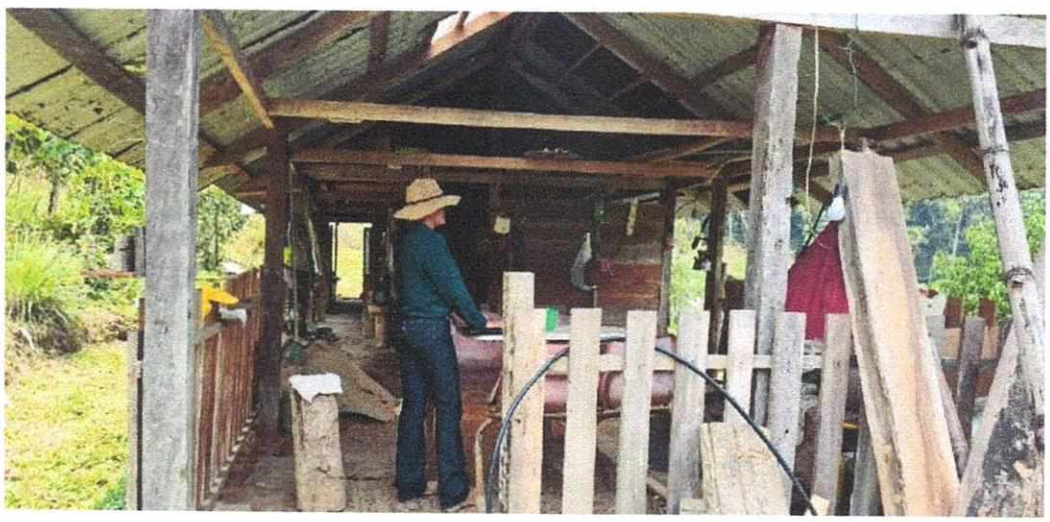

Subprograma 10.1 Seguimiento y control a la atención a la comunidad.

Fotografía 5 Atención a comunidad





Fotografía 6 Cartelera informativa SAU





Fotografía 8 Instalación de punto móvil





Subprograma 10.2 Seguimiento y control a la información y divulgación.

Fotografía 9 Piezas divulgativas.











#InformaciónAComunidad
Enterate:
Desde el día 5 de marzo del 2024, la Comisión de topográfica del Consorcio Vial Conexión Orinoquia estará realizando actividades de localización del corredor vial Yavia Papamene, contrato 779 del 2023. Iniciando desde el K0+70 (conocido como la Ye de Eduardo en la vereda Versalles).
Para más información comunicarse al 3204296834
CORREDOR VIAL YAVIA - PAPAMENE, URIBE META


Contrato 779 - Via P...
realiza pieza informativa de seguridad vial, como una de las estrategias del programa de cultura vial. Para prevenir accidentes en el corredor vial. Usuarios de la vía reduerde que:
EN CASA ALGUIEN LOS Y LAS ESPERA
REQUISITOS PARA RECEPCIÓN HOJAS DE VIDA
El Consorcio Vial Conexión Orinoquia, comparte imformación para la recepción de hojas de vida.
Mensaje


Contrato 779 - Via P...
información.
5 de marzo de 2024
#InformaciónAComunidad
Enterate:
Buena tarde para todos y tadas. Les escribo para informarles que nuevamente los estare acompañando desde el contrato 779 del 2023, como residente social vinculada con el Consorcio Vial Conexión Orinoquia.
Mensaje


Mujeres Unbenses
LAS ESPERA
#Encarrilate
Programe sus desplazamientos con anterioridad, respete la señalización instalada y evite exceder los limites de velocidad. Son unas de las recomendaciones que entregamos a los y las usuarias del corredor en nuestras campañas de cultura vial.
#Encarrilate.
En nuestras campañas de cultura vial, concientizamos a los usuarios de la vía, para prevenir siniestros viales. #ConsorcioVialConexión Orinoquia
Mensaje


Contrato 779 - Via P...
SEGURIDAD VIAL
El Consorcio Vial Conexión Orinoquia realiza pieza informativa de seguridad vial, como una de las estrategias del programa de cultura vial. Para prevenir accidentes en el corredor vial. Usuarios de la vía reduerde que:
EN CASA ALGUIEN LOS
LAS ESPERA
Mensaje

Fotografía 10 Socialización inicio fase constructiva del proyecto.





Subprograma 10.3 Seguimiento y control a la cultura vial y participación comunitaria.

Fotografía 11 Participación en Consejo Política Social – Donde se genera compromiso con la institucionalidad en realizar actividades de cultura vial. 03.04.2024



Fotografías 12 Se socializan actividades para proyectar con alcaldía municipal en seguridad vial. 8.04.2024



Fotografías 13 Se realiza recepción de hojas de vida, para la construcción del banco de hojas de vida. Abril



Fotografías 14 campaña de seguridad vial en el marco de la celebración de la niñez 26.04.2024




Galaxy S23 Ultra
26 de abril de 2024 9:40 a. m.


BRUJULA
2024
TENGO
Derecho
a SALUD


Galaxy S23 Ultra
26 de abril de 2024 9:40 a. m.


Galaxy S23 Ultra
26 de abril de 2024 12:16 p. m.


	CONSORCIO VIAL CONEXIÓN ORINOQUIA	CÓDIGO: 01
		VERSIÓN: 01
	INFORME SOCIAL	Fecha: ABRIL 2023

Otras actividades.

Fotografía 15 Participación en MIAF 02.04.2024



Fotografías 16 Participación en reunión con el Ministerio Del Interior, como seguimiento a la solicitud realizada a la procedencia o no procedencia de consulta previa. 8.04.2024

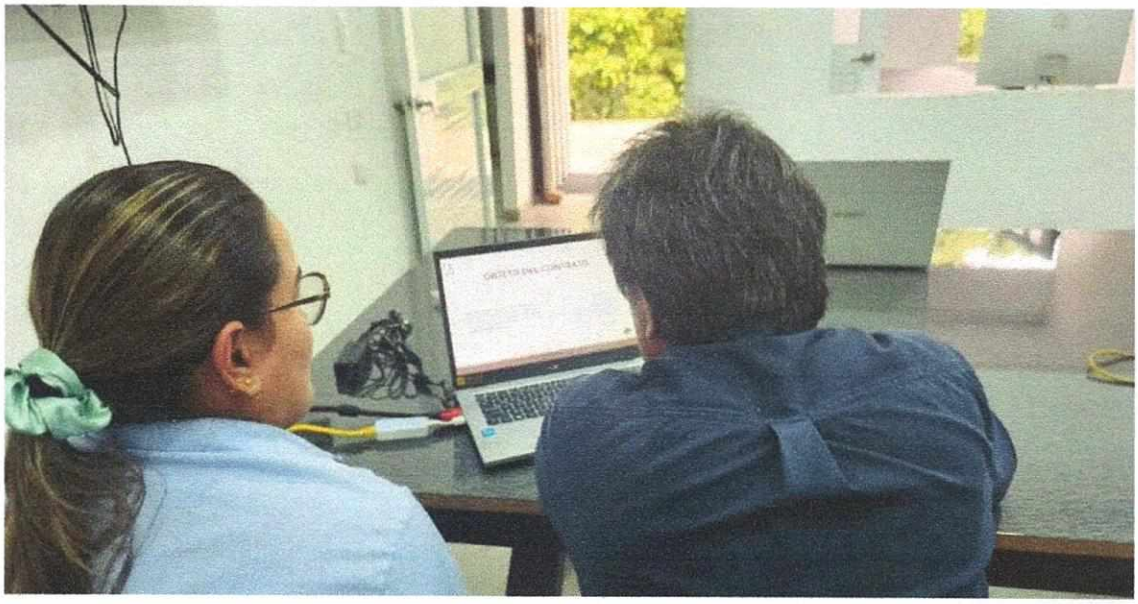

27818

	CONSORCIO VIAL CONEXIÓN ORINOQUIA	CÓDIGO: 01
		VERSIÓN: 01
	INFORME SOCIAL	Fecha: ABRIL 2023

INFORME SOCIAL DE OBRA
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA N°779 - 2022

"MEJORAMIENTO DE LOS CORREDORES VIALES PARA LA CONEXIÓN PACÍFICO – ORONOQUÍA – VÍA URIBE – CRUCE VERSALLES – PAPAMENE – ALTO LAS CRUCES EN EL MUNICIPIO DE LA URIBE DEPARTAMENTO DEL META"



ENTIDAD CONTRATANTE: AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META (AIM)
CONTRATISTA: CONSORCIO VIAL CONEXIÓN ORINOQUIA

INFORME MENSUAL DE CONSTRUCTOR N° 9
PERIODO COMPRENDIDO DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2024

27819 288

	CONSORCIO VIAL CONEXIÓN ORINOQUIA	**CÓDIGO: 01**
		VERSIÓN: 01
	INFORME SOCIAL	**Fecha: ABRIL 2023**

REVISIÓN Y APROBACIÓN

GENERALIDADES			
Objeto del Contrato			**"MEJORAMIENTO DE LOS CORREDORES VIALES PARA LA CONEXIÓN PACÍFICO – ORONOQUÍA – VÍA URIBE – CRUCE VERSALLES – PAPAMENE – ALTO LAS CRUCES EN EL MUNICIPIO DE LA URIBE DEPARTAMENTO DEL META"**
Título de Documento			**Informe De Obra**
Documento No.			**INF-10**
APROBACIÓN			
CONSORCIO VIAL CONEXIÓN ORINOQUIA	Nombre	:	**NAYARITH RENGIFO MURILLO**
CARGO		:	**PROFESIONAL SOCIAL DE OBRA**
Responsable por la Revisión de Obra:	Firma	:	
	Fecha	**:**	**31/05/2024**

27820

	CONSORCIO VIAL CONEXIÓN ORINOQUIA	CÓDIGO: 01
		VERSIÓN: 01
	INFORME SOCIAL	Fecha: ABRIL 2023

TABLA DE CONTENIDO

REVISIÓN Y APROBACIÓN 2

1. INTRUDUCCIÓN: 6
2. LOCALIZACIÓN DE INTERVENCIÓN DEL PROYECTO 7
3. ALCANCE 9
4. INFORMACIÓN PAGA Y PLAN DE GESTIÓN SOCIAL 9
5. PLAN DE GESTIÓN SOCIAL – ACTIVIDADES REALIZADOS EN EL PERIODO REPORTADO. 9
8. CONCLUSIONES 28
9. REGISTRO FOTOGRÁFICO 29
10. ANEXOS 48

LISTADO DE TABLAS

Tabla 1. Capacitación e inducción 10
Tabla 2. Indicador del subprograma 1.2. Capacitación y concienciación del personal de obra 11
Tabla 3. Actividades desarrolladas durante el periodo reportado 12
Tabla 4.Consolidado personal contratista vinculado al proyecto 2023. 12
Tabla 5.Consolidado personal contratista vinculado al proyecto 2024. 13
Tabla 6. Indicadores Subprograma 6.1 seguimiento y control a la mano de obra contratada con enfoque de género, derechos y diferencial. 13
Tabla 7. Información de actividades realizadas durante el periodo reportado 15
Tabla 8. Indicador del subprograma 8.1 Subprograma seguimiento y control a la infraestructura de predios y servicios públicos 16
Tabla 9. Información de actividades realizadas en el periodo reportado 16
Tabla 10. Indicador del subprograma 8.2 Subprograma seguimiento y control al apoyo y orientación para a la gestión interinstitucional en la recuperación del derecho de vías 17
Tabla 11. Estado actual de las PQRS del proyecto 18
Tabla 12. Seguimiento PQRS del proyecto. 19
Tabla 13. Indicador del subprograma 10.1 Subprograma seguimiento y control a la atención a la comunidad. 21
Tabla 14. Actividades realizadas durante el periodo reportado. 22
Tabla 15. Indicador del subprograma 10.2 Subprograma seguimiento y control a la información y divulgación 23
Tabla 16. Actividades realizadas Seguimiento y control a la cultura vial y participación comunitaria. 25
Tabla 17. Indicador del subprograma 10.3 Subprograma seguimiento y control a la cultura vial y participación comunitaria 25
Tabla 18. Correspondencia recibida en el periodo reportado 27
Tabla 19. Correspondencia enviada en el periodo reportado 27

LISTA DE FOTOGRAFIAS

Fotografía 1 Inducción al personal desde el componente social. 29

Fotografía 2 capacitación al personal desde el componente social. 29

Fotografía 3 verificación del personal vinculado en las bases sociales del municipio. 29

Fotografías 4 diligenciamiento permisos de intervención voluntaria en predios. ... 30

Fotografía 5 Atención a comunidad 35

Fotografía 6 Cartelera informativa SAU 39

Fotografía 7 Aviso SAU 39

Fotografía 8 Instalación de punto móvil 40

Fotografía 9 Piezas divulgativas 42

Fotografía 10 Participación en comité de convivencia escolar – Donde se genera compromiso con la institucionalidad en realizar actividades de cultura vial. 24.05.2024 44

Fotografías 11 Se socializan actividades con casa de la cultura en seguridad vial. 29.05.2024 44

Fotografías 12 Se realiza recepción de hojas de vida, para la construcción del banco de hojas de vida. mayo 45

Fotografías 13 instalación de señalización en el corredor vial que conecta a la escuela de la vereda Versalles 45

Fotografía 14 Participación en comité técnico 47

Fotografías 15 mesas de trabajo con el equipo de gestión social, para verificación y seguimiento. 47

1. INTRUDUCCIÓN:

El presente informe da cuenta de las actividades ejecutadas y programadas en cumplimiento a los lineamientos establecidos desde el área social del contrato de obra pública número N° 779 2022, que tiene como objeto "**MEJORAMIENTO DE LOS CORREDORES VIALES PARA LA CONEXIÓN PACÍFICO – ORONOQUÍA – VÍA URIBE – CRUCE VERSALLES – PAPAMENE – ALTO LAS CRUCES EN EL MUNICIPIO DE LA URIBE DEPARTAMENTO DEL META**". Logrando que la comunidad a través de la gestión social y acompañamiento tenga acceso a la información sobre la ejecución del proyecto, pueda manifestar sus peticiones, quejas, reclamos, solicitudes e inquietudes, logre participar activamente durante la ejecución de la obra y ejerza control social sobre la misma, minimizar los impactos que puedan generarse con la intervención del proyecto y garantizar que las condiciones al finalizar la obra, sean iguales o mejores a las encontradas, la comunidad ha manifestado y demostrado el agradecimiento e interés por la obra que está en proceso de ejecución.

El presente informe, contempla los aspectos relacionados con la Gestión Social del proyecto, en concordancia con la ley aplicable y el contrato, teniendo como referencia la Guía de manejo ambiental de proyectos de infraestructura modo carretero de Invias.

2. LOCALIZACIÓN DE INTERVENCIÓN DEL PROYECTO

Localización: Municipio de La Uribe, Meta.

Objeto: MEJORAMIENTO DE LOS CORREDORES VIALES PARA LA CONEXIÓN PACÍFICO – ORINOQUÍA – VÍA URIBE – CRUCE VERSALLES – PAPAMENE – ALTO LAS CRUCES EN EL MUNICIPIO DE LA URIBE DEPARTAMENTO DEL META

Plazo: Hasta el 30 de diciembre de 2028

Contratista: Consorcio Conexión Vial Orinoquía

El proyecto se enmarca dentro del programa "Colombia Rural"

El proyecto contempla el mejoramiento de 15 km de vía del corredor comprendido entre la Vía Uribe – Cruce Versalles – Papamene – Alto Las Cruces.

La ejecución del proyecto se divide en dos grandes etapas: Estudios y Diseños y Ejecución física de la obra.

Localización Geográfica Del Proyecto

El Municipio de Uribe – Meta es un Municipio colombiano situado en la región de los llanos orientales.
Vía Uribe – Cruce Versalles – Papamene – Alto Las Cruces en el Municipio de La Uribe, Departamento del Meta.
Km 1 vía Uribe Colombia Margen izquierda Puente sobre río Duda

Población: 8180 habitantes

Densidad poblacional: 1,3 hab/km²

Extensión: 630700 hectáreas

Altura: 685 metros sobre el nivel del mar

Etnias: el 2.2% de la población residente en La Uribe se autorreconoce como Indígena.

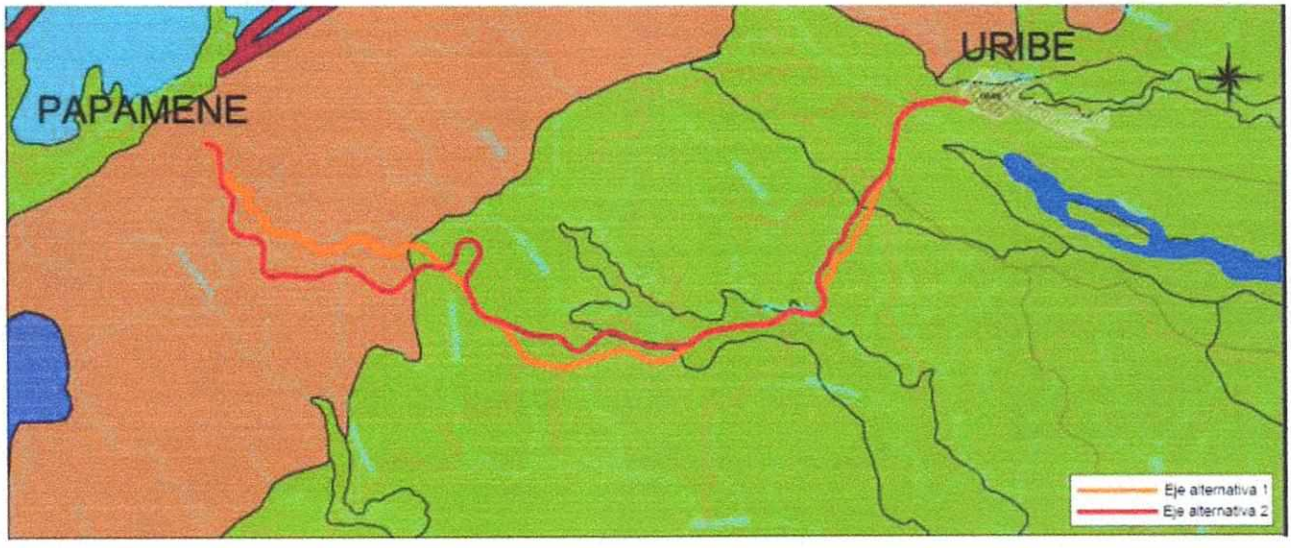


Ilustración 1 Localización del Proyecto

Área de influencia:

1. Vereda Papamene
2. Vereda Santander
3. Vereda Yavia

3. ALCANCE

3.1 Contrato de obra N° 779 DE 2022

El objeto del contrato se enmarca en el mejoramiento de los corredores viales para la conexión pacífico – Orinoquía – vía Uribe – cruce Versalles – Papamene – alto las cruces en el municipio de la Uribe departamento del meta, centrando las labores en los primeros quince kilómetros entre La Uribe y Papamene.

4. INFORMACIÓN PAGA Y PLAN DE GESTIÓN SOCIAL

Para el periodo reportado, se cuenta con Plan de Gestión Social, el cual fue aprobado por interventoría mediante oficio CE-01-042-016-2023 y PAGA aprobado por interventoría el 7 de septiembre con el oficio 01-042-0165-2023.

5. PLAN DE GESTIÓN SOCIAL – ACTIVIDADES REALIZADOS EN EL PERIODO REPORTADO.

De acuerdo con el documento PAGA y Plan de Gestión Social se cuentan con los siguientes programas y subprogramas sociales a desarrollar durante la etapa de pre-construcción:

PROGRAMA 1: SEGUIMIENTO Y CONTROL A LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD AMBIENTAL.

- Subprograma 1.2: capacitación y concienciación del personal de obra.

PROGRAMA 6: DESARROLLO LOCAL

- Subprograma 6.1: Seguimiento y control a la mano de obra contratada con enfoque de género.

PROGRAMA 8: GESTIÓN SOCIAL DE INFRAESTRUCTURA, PREDIOS Y SERVICIOS PÚBLICOS.

- Subprograma 8.1: Seguimiento y control a la infraestructura de predios y servicios públicos.
- Subprograma 8.2: Seguimiento y control de apoyo y orientación para la gestión interinstitucional en la recuperación del derecho de vía.

PROGRAMA 10: PARTICIPACIÓN, GOBERNANZA E INCLUSIÓN SOCIAL

- Subprograma 10.1 Seguimiento y control a la atención a la comunidad.
- Subprograma 10.2 Seguimiento y control a la información y divulgación.
- Subprograma 10.3 Seguimiento y control a la cultura vial y participación comunitaria.

5.1 PROGRAMA 1: SEGUIMIENTO Y CONTROL A LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD AMBIENTAL.

El programa presenta tres (3) proyectos orientados al seguimiento y control de todas las actividades de manejo ambiental y social necesarias para la ejecución de las obras en el marco del cumplimiento de las normas contractuales y normatividad ambiental y social vigente, para el área social y sus obligaciones contractuales solo se estableció como parte del plan de gestión social el subprograma 1.2 capacitación y concienciación del personal de obra, el cual se relaciona a continuación.

5.1.1 Subprograma 1.2: capacitación y concienciación del personal de obra.

Objetivo del subprograma:

Realizar el control y seguimiento a las acciones de capacitación e inducción del personal asociado a las actividades constructivas durante el desarrollo del proyecto desde el componente social. Durante este periodo se han realizado las siguientes actividades correspondientes a este subprograma.

Tabla 1. Capacitación e inducción

FECHA	TEMA
• **15/05/2024** 3 controladoras 1 ayudante de obra 1 ingeniero Residente • **17/05/2024** 2 ayudantes de obra	Inducción a las 8 personas que ingresaron desde el componente social, buen trato y respeto a la comunidad. **ANEXO 1.2 PLANILLA INDUCCIÓN.**

1 ayudante de obra	

FECHA	TEMA
27/05/2024	Capacitación al personal en comunicación asertiva, prevención de la violencia de genero. **ANEXO 1.2 CAPACITACION PERSONAL - Asistentes 32 personas.**

Tabla 2. Indicador del subprograma 1.2. Capacitación y concienciación del personal de obra

DESCRIPCION DEL INDICADOR	INDICADOR OBTENIDO	UNIDAD DE MEDICIÓN	VALOR MÍNIMO DE ACEPTACIÓN	TIEMPO MÁXIMO DE CORRECIÓN	ANALISIS DEL INDICADOR
N.º personal capacitado / N° inducciones realizadas* 100	8/8*100=100%	100%	100%	1 mes	Se da cumplimiento del 100% del indicador.
N.º de personal capacitado / N° de personal vinculado al proyecto* 100	32/39*100=82%	100%	50%	1 mes	Se da cumplimiento del indicador con el 82%.

5.2 PROGRAMA 6: DESARROLLO LOCAL.

En el programa de desarrollo local se formulan actividades para el control y seguimiento a la implementación de las medidas de manejo propuestas para la prevención, minimización, compensación y/o corrección de los impactos causados por los proyectos de infraestructura vial en las comunidades del área de influencia, a través de la promoción del desarrollo local en términos de empleabilidad, obras con participación comunitaria, con el fin de incorporar buenas prácticas ambientales, sociales y económicas, que contribuyan a la conservación del ambiente y el desarrollo socioeconómico del territorio.

5.2.1 Subprograma 6.1: Seguimiento y control a la mano de obra contratada con enfoque de género.

Objetivo del subprograma:

Verificar la inclusión de mano de obra territorial de hombres y mujeres en igualdad de condiciones que hagan parte de grupos vulnerables, como mujeres y/o personas con discapacidad, o con identidades diversas de género.

Tabla 3. Actividades desarrolladas durante el periodo reportado.

FECHA	LUGAR	INSTUCIÓN / DEPENDECIA	ACTIVIDAD
1 al 31 de mayo 2024	Oficina CVCO – Oficina Alcaldía	Consorcio Vial Conexión Orinoquia / Alcaldía	Se realizo publicación de recepción de hojas de vida en el municipio de Uribe.
1 al 31 de mayo 2024	Oficina CVCO – Oficina Alcaldía	Consorcio Vial Conexión Orinoquia / Alcaldía	Se realizo vinculación laboral de 8 personas (3 mujeres y 5 hombres).

A continuación, se relaciona la información del personal vinculado actualmente al proyecto, para el periodo reportado:

Tabla 4.Consolidado personal contratista vinculado al proyecto 2023.

MES – AÑO	TRABAJADORES VINCULADOS AL PROYECTO			ORIGEN		GENERO		MIEMBROS PROGRAMA ARN	CATEGORÍA	
	TOTAL, PERSONAL VINCULADO	DIRECTOS (D)	INDIRECTOS (I)	ÁREA DE INFLUENCIA DIRECTA (AID)	ÁREA DE INFLUENCIA INDIRECTA (AII)	M	F		MANO DE OBRA CALIFICADA (M.O.C)	MANO DE OBRA NO CALIFICADA (M.O.N.C)
Abril	3	3	0	2	1	1	2	0	3	0
Mayo	4	4	0	2	2	1	3	0	4	0
Junio	4	4	0	2	2	1	3	0	4	0
Julio	4	4	0	2	2	1	3	0	4	0
Agosto	21	6	15	4	11	13	8	0	18	3
Septiembre	39	12	27	16	23	30	9	0	33	6
Octubre	43	15	28	19	24	35	8	0	36	7
Noviembre	50	16	34	18	32	41	9	1	42	8
Diciembre	41	14	27	16	25	34	7	1	36	5

Tabla 5.Consolidado personal contratista vinculado al proyecto 2024.

MES – AÑO	TRABAJADORES VINCULADOS AL PROYECTO			ORIGEN		GENERO		MIEMBROS PROGRAMA ARN	CATEGORÍA	
	TOTAL, PERSONAL VINCULADO	DIRECTOS (D)	INDIRECTOS (I)	ÁREA DE INFLUENCIA DIRECTA (AID)	ÁREA DE INFLUENCIA INDIRECTA (AII)	M	F		MANO DE OBRA CALIFICADA (M.O.C)	MANO DE OBRA NO CALIFICADA (M.O.N.C)
Enero	42	17	25	20	22	33	9	1	36	6
Febrero	35	14	21	10	25	27	8	1	31	4
Marzo	35	14	21	10	25	27	8	1	31	4
Abril	37	16	21	10	27	9	28	1	33	4
Mayo	39	16	23	16	23	30	9	1	35	4

ANEXO 6.1 ACTA Y CUADRO RELACION DEL PERSONAL.

Durante el periodo se realizaron 8 ingresos, del siguiente personal:

- 1 cadenero
- 1 ingeniero residente
- 3 ayudante de obra
- 3 controladoras viales

Para el período, se reportó la vinculación de mano de obra al proyecto, por parte del contratista de 16 colaboradores directos y 23 colaboradores con vinculación indirecta, de los cuales 16 pertenecen al Área de Influencia directa del proyecto, vinculación de 9 mujeres, 1 persona está vinculada a la ARN como firmante del acuerdo de paz, 1 personas con primer empleo, vinculación de 3 personas menores de 28 años, 3 mujeres vinculada al programa familias en acción y 5 personas inscritas en el registro único de víctimas.

ANEXO 6.2 CERTIFICADOS BASES SOCIALES.

Durante el periodo reportado se garantiza la afiliación al personal a la ARL, EPS, Pensión y Caja de Compensación Familiar.

Tabla 6. Indicadores Subprograma 6.1 seguimiento y control a la mano de obra contratada con enfoque de género, derechos y diferencial.

DESCRIPCION DEL INDICADOR	INDICADOR OBTENIDO	VALOR MÍNIMO DE ACEPTACIÓN	TIEMPO MÁXIMO DE CORRECIÓN	ANALISIS DEL INDICADOR
N.º de personas vinculadas de las zonas / N° total de empleos *100	8/16*100=50%	60%	1 mes	No se da cumplimiento al 60% del indicador, debido a que el proyecto se encuentra iniciando la fase constructiva y no se requiere una amplia vinculación laboral.
Mano de obra perteneciente a grupos vulnerables / N° total de empleos *100	8/16*100=50%	50%	1 mes	Se da cumplimiento al indicador donde se cuenta con un indicador del 50% de cumplimiento

5.3 PROGRAMA 8: GESTIÓN SOCIAL DE INFRAESTRUCTURA, PREDIOS Y SERVICIOS PÚBLICOS.

Objetivo del programa:

En el seguimiento y control para el Programa de Gestión social de infraestructura, predios y servicios públicos se formulan actividades para el control y seguimiento a la implementación de las medidas de manejo propuestas para la prevención, minimización, compensación y/o corrección de los impactos causados por los proyectos de infraestructura vial en las comunidades del área de influencia, a través del establecimiento de los lineamientos para el acompañamiento desde la gestión social a las acciones técnicas necesarias a realizarse en predios, redes de servicios públicos y el adecuado uso del derecho de vía, para el desarrollo de las actividades constructivas de los proyectos liderados por INVÍAS y AIM.

5.3.1 Subprograma 8.1: Seguimiento y control a la infraestructura de predios y servicios públicos.

Objetivo del subprograma:

Verificar el registro del estado físico de las construcciones e infraestructura existente (cercas, servicios públicos y comunitarios, entre otros) aledaña a las áreas de intervención de la obra, infraestructura de uso temporal del contratista y en el derecho de vía, previo al inicio de cualquier actividad técnica del proyecto

Tabla 7. Información de actividades realizadas durante el periodo reportado

FECHA	LUGAR	INSTUCIÓN / DEPENDECIA	ACTIVIDAD
4,5,11,16,17,22 y 27 de mayo del 2024	Vereda Yavia	Contratista Comunidad	Se realizo el diligenciamiento permisos de intervención voluntaria en predios, los cuales corresponden al tramo 2 del corredor vial, levantamiento acta de compromiso para correr cercas. El consorcio adelanta actividades en predios ubicados entre el K0+00 al k2+00 donde se realiza reubicación temporal de cercas.
7 de mayo del 2024	Vereda Yavia	Contratista Comunidad	El consorcio radica oficio a los presidentes de junta para realizar identificación de la red de acueducto de las veredas Yavia, Esperanza y Versalles.
9 de mayo del 2024	Vereda Yavia	Contratista Comunidad Interventoría	Se realizo recorrido de identificación con los presidentes de junta de la vereda Esperanza y Versalles, donde se identifico la red de acueducto veredal para mitigar afectaciones en el mismo.
25, 27 y 28 de mayo del 2024	Vereda Yavia	Contratista Propietarios predios JAC - Alcaldía	Se tramitaron certificación de sana posesión con los propietarios, presidente de JAC y alcaldía, de los predios ubicados sobre el tramo número 1. **VER ANEXO 8.1 PERMISOS DE INTERVENCION EN PREDIOS Y CERTIFICADOS SANA POSESION.**

No se presentan afectaciones en infraestructura ni en predios, No aplican actividades para el periodo reportado.

Tabla 8. Indicador del subprograma 8.1 Subprograma seguimiento y control a la infraestructura de predios y servicios públicos

DESCRIPCION DEL INDICADOR	INDICADOR OBTENIDO	UNIDAD DE MEDICIÓN	VALOR MÍNIMO DE ACEPTACIÓN	TIEMPO MÁXIMO DE CORRECIÓN	ANALISIS DEL INDICADOR
N.º de actas de vecindad realizadas / N° total de actas de vecindad construcciones aledañas *100	28/28*100=100%	100%	100%	1 mes	Se da cumplimiento al 100% del indicador.
N° afectaciones subsanadas / N° afectaciones presentadas	0/0*100=0%	0%	60%	1 mes	No se presentan afectaciones en la infraestructura.

5.3.2 Subprograma 8.2: Seguimiento y control de apoyo y orientación para la gestión interinstitucional en la recuperación del derecho de vía.

Objetivo del subprograma:

Verificar la generación y/o formulación de estrategias de apoyo interinstitucional con autoridades locales y otras entidades de relevancia en el área de influencia del proyecto, orientadas a promover la recuperación del derecho de vía de las carreteras a intervenir.

Tabla 9. Información de actividades realizadas en el periodo reportado

FECHA	LUGAR	INSTUCIÓN / DEPENDECIA	ACTIVIDAD
12 marzo del 2024	Casco Urbano	Alcaldía	En el área de influencia no se cuentan con unidades económicas ubicadas en la franja vial. De igual forma el 12 de marzo se radico oficio CCV-ALC-402-779-2023, solicitando articulación para realizar socialización de la ley 1228 y la recuperación del espacio público con actores sociales en el área de influencia del proyecto. A la fecha no se cuenta con respuesta por parte de la administración, 31 mayo 2024.

Tabla 10. Indicador del subprograma 8.2 Subprograma seguimiento y control al apoyo y orientación para a la gestión interinstitucional en la recuperación del derecho de vías

DESCRIPCION DEL INDICADOR	INDICADOR OBTENIDO	VALOR MÍNIMO DE ACEPTACIÓN	TIEMPO MÁXIMO DE CORRECIÓN	ANALISIS DEL INDICADOR
Base de datos actualizada	1/1*100=100%	1	1 mes	Se da cumplimiento al 100% del indicador. Frecuencia de medición anual.
N° de asistentes a reunión / N° de reuniones programadas	2/2*100=100%	100%	1 mes	Se da cumplimiento al 100% del indicador. Frecuencia de medición trimestral.
N° actas de compromiso elaboradas / N° actas de compromiso ejecutadas	0/0*100=0%	100%	1 mes	Para el periodo reportado no se realizan actas de compromiso.

5.4 PROGRAMA 10: PARTICIPACIÓN, GOBERNANZA E INCLUSIÓN SOCIAL

Objetivo del programa:

En el seguimiento y control para el programa de participación, gobernanza e inclusión social se formulan actividades para el control y seguimiento a la implementación de las medidas de manejo propuestas para la prevención, minimización, compensación y/o corrección de los impactos causados por los proyectos de infraestructura vial en las comunidades del área de influencia, a través de la garantía de la ejecución de procesos de información, participación y promoción de la organización comunitaria en torno a los proyectos de infraestructura vial. Además, se estipulan los enfoques de género, de derechos y diferencial como ejes transversales de la gestión socio ambiental de los proyectos.

5.4.1 Subprograma 10.1 Seguimiento y control a la atención a la comunidad.

Objetivo del subprograma:

Verificar el funcionamiento del sistema de atención y respuesta oportuna y eficaz a las manifestaciones (quejas, solicitudes, reclamos, peticiones, sugerencias, denuncias, etc.), interpuestas por comunidades y autoridades mediante los medios dispuestos para esto (correo electrónico, llamada telefónica, personalmente, entre otros).

5.4.1.1 ESTADO ACTUAL DE LAS PQRS DEL PROYECTO.

Durante el periodo reportado se recibe 1 PQRS de solicitud la cual se encuentra abierta

Tabla 11. Estado actual de las PQRS del proyecto

ESTADO ACTUAL DE LAS PQRS DEL PROYECTO			
MES /AÑO	**PRESENTADAS**	**ABIERTAS**	**CERRADAS**
Mayo 2023	0	0	0
Junio 2023	1	1	0
Julio 2023	0	0	0
Agosto 2023	0	0	0
Septiembre 2023	0	0	0
Octubre 2023	2	1	1
Noviembre 2023	3	2	1
Diciembre 2023	1	2	1
Enero 2024	0	1	0
Febrero 2024	0	1	0
Marzo 2024	0	1	0
Abril 2024	0	1	0
Mayo 2024	1	1	0

Tabla 12. Seguimiento PQRS del proyecto.

N° PQRS	FECHA INGRESO	NOMBRE DEL USUARIO	TIPO	SEGUIMIENTO	ESTADO	
					A	C
1	23/05/2023	JAC Vereda Papamene	Solicitud	El 20 de junio, el contratista envió respuesta a comunidad mediante oficio CVC-JAC 057-2023. Para el mes de julio, se realizó recorrido con la comunidad de la vereda Papamene para la identificación de los puntos críticos a intervenir, respondiendo a su solicitud.	X	
2	1/10/2023	Carlos Gómez	Solicitud	El señor Carlos Gómez Realiza solicitud de relleno en el predio con material de excavación de la obra, a lo cual se realizó respuesta mediante oficio CVC-JAC 271-779-2023.		X
3	6/10/2023	JAC Vereda Santander	Solicitud	El presidente de la JAC solicita MANTENIMIENTO DE LA VÍA LA LAGARTIJA ESCUELA SANTANDER Y LA YE DE SANTANDER ALTO, a lo cual se realizó respuesta mediante oficio CVC-JAC 270-779-2023.		X
4	3/11/2023	Angela Chavarriaga Alcaldía	Solicitud	Asunto: Apoyo a celebración del día comunal para el día 19 de noviembre. El consorcio no realiza apoyo en la actividad, debido a que el contrato no cuenta con recursos para el desarrollo de estas actividades.		X
5	21/11/2023	JAC Vereda Papamene	Solicitud	Asunto: invitación a reunión con la directiva de la vereda Papamene. El miércoles 22 de noviembre se participó en reunión programada donde se acordó realizar campaña de seguridad vial con los niños y niñas de la vereda en el mes de diciembre.		X
6	29/11/2023	Geily Lorena Machuca Alcaldía	Solicitud	Asunto: invitación y solicitud de apoyo logístico al festival de la paz y la confraternidad Uribense 2023. El Consorcio acordó con la administración municipal apoyar la Travesía Ciclista MTB 45 K el día domingo 3 de diciembre, en la ruta Cabecera Municipal – vereda Papamene – cabecera municipal en lo siguiente		X

N° PQRS	FECHA INGRESO	NOMBRE DEL USUARIO	TIPO	SEGUIMIENTO	ESTADO	
					A	C
				1. Conductor: Esneider Bedoya Beltrán Cedula: 1.134.434.496 de Mapiripan. Celular número: 3124635830 2. Camión tipo turbo, placa LZO560. Disponible desde las 6 am, el cual contara con camilla y botiquín. 3. Punto de hidratación, que cuenta con carpa, botiquín de primeros auxilios, camilla, residente social quien realizara campaña - sensibilización en seguridad vial y apoyo en la hidratación 5. Personal del consorcio participara en la travesía. El 3 de diciembre se realizó cierre a la PQRS.		
7	19/12/2023	JAC Vereda Versalles	Solicitud	Solicitud incentivo navideño a los niños y niñas de la vereda		X
8	20/05/2024	JAC Vereda Papamene	Solicitud	Solicitud de mantenimiento en los puntos críticos del corredor vial de Papamene, las afectaciones en la vía se han presentado a causa de las fuertes lluvias, el mismo día se realiza notificación de afectaciones en la vía para tramitar solicitud de la comunidad. **VER ANEXO 10.1 SOLICITUD PQRS**	X	

FECHA	LUGAR	INSTUCIÓN / DEPENDECIA	ACTIVIDAD
Mayol 2024	Oficina contratista	Comunidad Interventoría Contratista	Se realizo conversación con el señor Jairo Campiño, presidente de la JAC de la vereda Papamene como seguimiento al mantenimiento realizado en la vía y solicitud realizada por la comunidad el día 20.05.2024
Mayol 2024	Vereda Papamene	Contratista, Interventoría y comunidad	Se cuenta con punto móvil en la escuela de la vereda Papamene, donde se relacionó información propia del contrato (número del contrato, objeto, proceso de recepción de hojas de vida, actividades realizadas en la fase pre-cronstructiva y constructiva).

FECHA	LUGAR	INSTUCIÓN / DEPENDECIA	ACTIVIDAD
Mayol 2024	Vereda Santander	Contratista, Interventoría y comunidad	Se cuenta con punto móvil en la escuela de la vereda Santander, donde se relacionó información propia del contrato (número del contrato, objeto, proceso de recepción de hojas de vida, actividades realizadas en la fase pre-cronstructiva y constructiva).
Mayol 2024	Vereda Yavia	Contratista, Interventoría y comunidad	Se cuenta con punto móvil en la escuela de la vereda Yavia, donde se relacionó información propia del contrato (número del contrato, objeto, proceso de recepción de hojas de vida, actividades realizadas en la fase pre-cronstructiva - constructiva).
Mayol 2024	Alcaldía	Contratista, Interventoría y comunidad	Se cuenta con punto móvil en la alcaldia, donde se relacionó información propia del contrato (número del contrato, objeto, proceso de recepción de hojas de vida, actividades realizadas en la fase pre-cronstructiva - constructiva).
Mayol 2024	Oficina Consorcio Vial Conexión Orinoquia.	Contratista, Interventoría y	Se cuenta con oficina de servicio de atención al usuario (SAU), ubicada en la dirección KM 0+900 vía Uribe la Julia – Puente Rio Duda. La cual fue aprobada por interventoría mediante oficio 01-042-0254-2023 basada en la visita que realizo la profesional social de interventoría al SAU el día 25/10/2023.

Durante el periodo reportado se recibió 1 solicitud la cual se encuentra en proceso PQRS.

Tabla 13. Indicador del subprograma 10.1 Subprograma seguimiento y control a la atención a la comunidad.

DESCRIPCION DEL INDICADOR	INDICADOR OBTENIDO	VALOR MÍNIMO DE ACEPTACIÓN	TIEMPO MÁXIMO DE CORRECIÓN	ANALISIS DEL INDICADOR
# de PQRS recepcionadas / # de PQRS presentadas en el periodo * 100	1/1*100=100%	0	1 mes	Se da cumplimiento al 100% del indicador. Durante el periodo reportado se recepcióno 1

				PQRS, se realiza tramite PQRS, la cual se encuentra en proceso.
# de PQRS contestadas dentro del término legal/ # de PQRS presentadas en el periodo * 100	0/0*100=100%	0	1 mes	Se da cumplimiento al 100% del indicador. Durante el periodo reportado se presenta una PQRS la cual esta en proceso y se encuentra dentro del término legal.
N° de oficinas fijas propuestas/ N° de oficinas fijas implementadas X 100	1/1*100=100%	100%	1 mes	Se da cumplimiento al 100% del indicador, ya que se cuenta con SAU fija, la cual fue aprobada por interventoría mediante oficio 01-042-0254-2023.
N° puntos móviles de atención al usuario propuestas/ N° puntos móviles de atención al usuario implementadas X 100%	4/4*100=100%	100%	1 mes	Se da cumplimiento al 100% del indicador, ya que se tienen oficina móvil instalada en la vereda Yavia, Papamene, Santander e instalaciones de la Alcaldía.

5.4.2 Subprograma 10.2 Seguimiento y control a la información y divulgación.

Objetivo del subprograma:

Verificar la implementación de la estrategia pública de divulgación para brindar información oportuna, clara, veraz y actualizada a los actores sociales e institucionales sobre las actividades ejecutadas en el marco del contrato

Tabla 14. Actividades realizadas durante el periodo reportado.

FECHA	LUGAR	INSTUCIÓN / DEPENDECIA	ACTIVIDAD
Mayo 2024	Whatsapp	Comunidad Contratista	Se comparten piezas divulgativas en el grupo de Whatsapp, convocatorias laborales información del estado del proyecto: En mayo se continúa divulgando la siguiente información Si eres técnico, tecnólogo, profesional, auxiliar, guarda de seguridad o tienes otro desempeño, ayúdanos a fortalecer la base de datos del nivel académico del Uribe, Meta. Ingresa al siguiente formulario y responde: https://forms.gle/FGbT21KEdZ6j5D9y5 
Mayo 2024	Whatsapp	Comunidad Contratista	Se comparte piezas informativas con la ubicación del SAU y fase del contrato.
Mayo 2024	Whatsapp	Comunidad Contratista	Se comparten piezas comunicativas de actividades realizadas en el corredor vial.
Mayo 2024	Whatsapp	Comunidad Contratista	Se comparten piezas comunicativas de la realización del banco de hojas de vida de personas ubicadas en el área de influencia del proyecto.
Mayo 2024	Whatsapp y físicas	Comunidad Contratista	Se comparten piezas divulgativas de seguridad y cultura vial.

Tabla 15. Indicador del subprograma 10.2 Subprograma seguimiento y control a la información y divulgación

DESCRIPCION DEL INDICADOR	INDICADOR OBTENIDO	VALOR MÍNIMO DE ACEPTACIÓN	TIEMPO MÁXIMO DE CORRECIÓN	ANALISIS DEL INDICADOR
N° de reuniones de inicio ejecutadas/ N° de reuniones programadas X 100	3/3*100=100%	100%	1 mes	Se da cumplimiento al 100% del indicador El 19 de abril se realizó socialización

				de inicio de actividades constructivas donde participaron las 3 veredas del área de influencia.
N° de reuniones de seguimiento ejecutadas/ N° de reuniones programadas X 100	0/3*100=0%	100%	1 mes	No aplica para el periodo, se proyecta para cuando el proyecto lleve el 50% de ejecución.
N° de reuniones de finalización ejecutadas/ N° de reuniones programadas X 100	0/3*100=0%	100%	1 mes	No aplica para el periodo reportado
N° de reuniones extraordinarias ejecutadas/ N° de reuniones solicitadas X 100	0/0*100=100%	100%	1 mes	Para el periodo, no se recibieron solicitudes de reuniones extraordinarias.
N° de videos programados/N° de videos presentes en la página web	0/1*100=0%	1	1 mes	Se entrega anualmente, a la fecha no aplica debido a que no se cumple el año.
N° de infografías entregadas/ N° propuestos	0/1*100=0%	1	1 mes	Se entrega anualmente, a la fecha no aplica debido a que no se cumple el año.
N° de piezas informativas y de divulgación / N° de piezas informativas y de divulgación propuestas X 100	4/4*100=100%	100%	1 mes	Se realizo entrega de 4 piezas de información y divulgación.

5.4.3 Subprograma 10.3 Seguimiento y control a la cultura vial y participación comunitaria.

Objetivo del programa:

Verificar las estrategias de apropiación del proyecto a través de procesos de educación y concienciación con las comunidades educativas, líderes, comité de participación comunitaria y población en general. Validar los espacios para la participación y control social.

Tabla 16. Actividades realizadas Seguimiento y control a la cultura vial y participación comunitaria.

FECHA	LUGAR	INSTUCIÓN / DEPENDECIA	ACTIVIDAD
Mato	Punto satélite – Alcaldía municipal	Contratista, comunidad	Se publicaron piezas en carteleras y redes, donde se promociona la seguridad vial se entregaron recomendaciones a los usuarios de la vía, se explicó que es la seguridad vial y como pueden aportar a disminuir riesgos de siniestros viales.
29/04/2024	Alcaldía	Contratista, comunidad	Se participo en mesa de trabajo con el comité de convivencia escolar, donde se acordó realizar actividades para mitigar accidentalidad en las vías del municipio y promocionar la cultura y seguridad vial.
27 mayo 2024	Vereda Versalles	Contratista Escuela Versalles	Se planea actividad con la docente de la escuela Versalles, la cual se realizará el día 12 de junio del 2024.
Mayo 2024	Vereda Versalles	Contratista Escuela Versalles	Se instalo señalización en la vía que conduce a la escuela Versalles, para mitigar posibles accidentes.

Tabla 17. Indicador del subprograma 10.3 Subprograma seguimiento y control a la cultura vial y participación comunitaria

DESCRIPCION DEL INDICADOR	INDICADOR OBTENIDO	VALOR MÍNIMO DE ACEPTACIÓN	TIEMPO MÁXIMO DE CORRECIÓN	ANALISIS DEL INDICADOR
N° de actividades de sensibilización ejecutadas/ N° de actividades programadas X 100	2/2*100=100%	100%	1 mes	Se da cumplimiento al indicador, donde se programó y ejecuto una actividad, entregando infografías de seguridad vial a la comunidad mediante redes sociales.

N° de talleres de capacitación realizados/ N° de talleres programados X 100	1/1*100=0%	100%	1 mes	Se realizo campaña en seguridad vial con los niños y niñas estudiantes de la escuela, hogar infantil en articulación con administración municipal. En casco urbano el 26.04.2024
N° de campañas de seguridad vial realizadas/ N° campañas requeridas X 100	1/1*100=100%	100%	1 mes	Se realizo campaña en seguridad vial con los niños y niñas estudiantes de la escuela, hogar infantil en articulación con administración municipal. En casco urbano el 26.04.2024
N° bases de datos lideres realizadas/ N° de base de datos requeridas	1/1*100=100%	1	1 mes	Se da cumplimiento a cabalidad de este indicador.
N° de comités de participación programados/ N° de comités de participación programados ejecutados X 100	3/3*100=0%	2	1 mes	Se realizo actividad con el comité de participación de cada una de las veredas, en el marco de la socialización de inicio de la fase constructiva: 1. Papamene el día 16/04/2024 2. Yavia el día 16/04/2024 3. Santander el día 16/04/2024 Para el mes de mayo del 2024 se realizará acta de conformación y actividad.
N° de reuniones programadas con veeduria / N° de	0/1*100=0%	1	1 mes	Los integrantes de la veeduría no programan reunión, se les informa que el consorcio está a

reuniones ejecutadas X 100				disposición para dichas actividades, pero no realizan actividad. La frecuencia de medición es trimestral.

6. OTRAS ACTIVIDADES DE LA GESTIÓN SOCIAL

- ✓ Se programan actividades de gestión social, con comunidad e instituciones, desde cada uno de los programas para el mes de mayo y junio del 2024.
- ✓ Se realizaron mesas de trabajo con la profesional social de interventoría.
- ✓ 14 mayo 2024, Se han establecido mesas de trabajo entre el equipo de gestión social, las cuales han sido significativas para el cumplimiento de las obligaciones contractuales y mitigaciones de situaciones presentadas.
- ✓ 23 de mayo, verificación del personal vinculado al consorcio en bases sociales del municipio.
- ✓ 28 mayo 2024 participación en mesa de inclusión social, para generar estrategias de participación de enfoque diferencial.
- ✓ Se realiza construcción del plan de gestión social v2, fase constructiva, la construcción de este documento fue realizada junto al equipo de gestión social de interventoría. **VER ANEXO 11 PLAN DE GESTION SOCIAL**

7. RELACIÓN DE CORRESPONDENCIA

Tabla 18. Correspondencia recibida en el periodo reportado

FECHA	RADICADO	REMITE	ASUNTO
16/05/2024	NO relaciona	Interventoría Consorcio Conexión Pacifico	Aprobación informe mensual social abril de 2024.
30/05/2024	CCP-OP-1060-2022-094	Interventoría Consorcio Conexión Pacifico	Solicitud de entrega del Plan de Gestión Social.

Tabla 19. Correspondencia enviada en el periodo reportado

FECHA	RADICADO	DESTINATARIO	ASUNTO
4/05/2024	CCV-INT-443-779-2023	Interventoría	Radicado informe abril

4/05/2024	CCV-INT-445-779-2023	JAC vereda Versalles	Identificación acueducto vereda Versalles. .
4/05/2024	CCV-ALC-446-779-2023	JAC vereda Esperanza	Identificación acueducto vereda Esperanza. .
4/05/2024	CCV-INT-447-779-2023	JAC Vereda Yavia	Identificación acueducto vereda Yavia
20/05/2024	CCV-JAC-467-779-2023	Interventoría	Entrega permisos intervención en predios tramo 2
31/05/2024	CCV-INT-410-779-2023	Interventoría	Respuesta a oficio número CCP-OP-1060-2022-094, que tiene como asunto "solicitud entrega del Plan de Gestión Social".

ANEXO 12. CORRESPONDENCIA

8. CONCLUSIONES


- Se continúan realizando acciones para el cumplimiento de las obligaciones sociales contractuales.
- Se tomo como base la guía de manejo ambiental para proyectos de infraestructura modo carretero versión 2022, INVIAS.
- Se brindo atención al usuario desde el SAU a la comunidad.
- Se estableció y se mantiene buena articulación con la institucionalidad del municipio, interventoría y con comunidad.
- Se programaron actividades para el mes de mayo y junio del 2024.
- Se participa en comités semanales
- Se han establecido mesas de trabajo entre el equipo de gestión social, las cuales han sido significativas para el cumplimiento de las obligaciones contractuales.
- Se han establecido mesas de trabajo entre el equipo de gestión social, las cuales han sido significativas para el cumplimiento de las obligaciones contractuales y mitigaciones de situaciones presentadas.
- Se realiza construcción del plan de gestión social V2 – fase constructiva.

9. REGISTRO FOTOGRÁFICO

Subprograma 1.2 Capacitación y concienciación del personal de obra.

Fotografía 1 Inducción al personal desde el componente social.



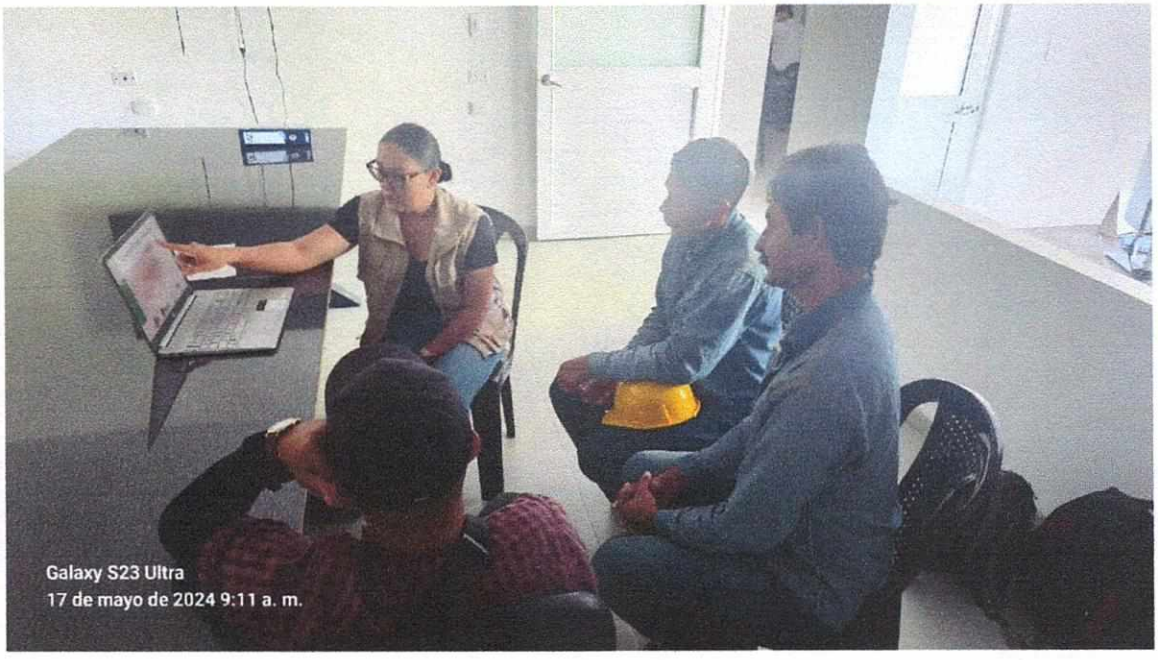

Fotografía 2 capacitación al personal desde el componente social.

Fotografía 3 verificación del personal vinculado en las bases sociales del municipio.



Subprograma 8.1: Seguimiento y control a la infraestructura de predios y servicios públicos.


Fotografías 4 diligenciamiento permisos de intervención voluntaria en predios.



	CONSORCIO VIAL CONEXIÓN ORINOQUIA	CÓDIGO: 01
		VERSIÓN: 01
	INFORME SOCIAL	Fecha: ABRIL 2023





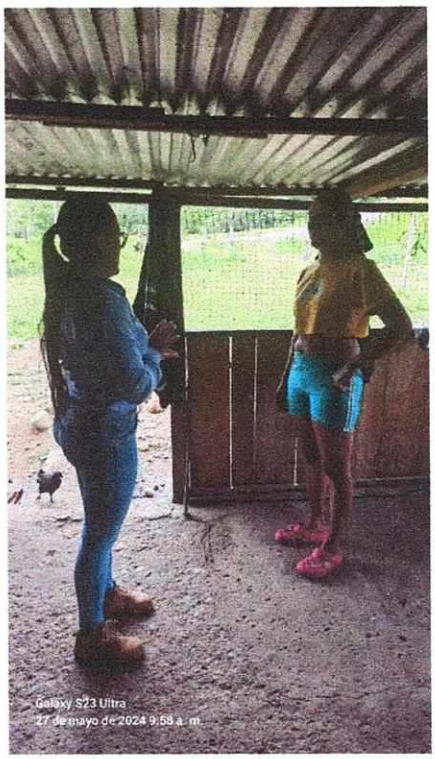




Galaxy S23 Ultra
24 de mayo de 2023 12:47 a. m.


Galaxy S23 Ultra
23 de mayo de 2023 9:32 a. m.


Galaxy S23 Ultra
23 de mayo de 2024 9:31 a. m.


Galaxy S23 Ultra
22 de mayo de 2024 10:07 a. m.


Galaxy S23 Ultra
22 de mayo de 2024 10:03 a. m.


Galaxy S23 Ultra
27 de mayo de 2024 10:16 a. m.


Subprograma 10.1 Seguimiento y control a la atención a la comunidad.

Fotografía 5 Atención a comunidad






Galaxy S23 Ultra
22 de mayo de 2024 2:52 p. m.

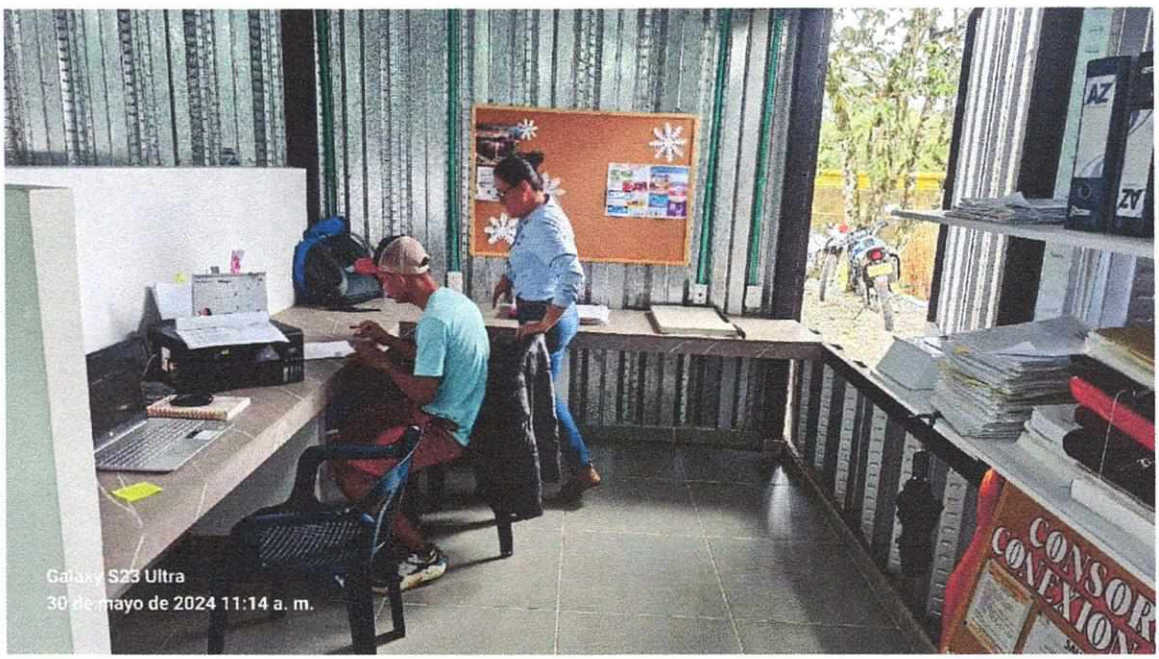
Galaxy S23 Ultra
30 de mayo de 2024 11:14 a. m.


Galaxy S23 Ultra
30 de mayo de 2024 4:21 p. m.


Galaxy S23 Ultra
30 de mayo de 2024 3:44 p. m.


Galaxy S23 Ultra
28 de mayo de 2024 8:25 a. m.


Galaxy S23 Ultra
09 de mayo de 2024 9:34 a. m.

Fotografía 6 Cartelera informativa SAU



Fotografía 7 Aviso SAU



Fotografía 8 Instalación de punto móvil






CONSORCIO VIAL
CONEXION ORINOQUIA
BUZÓN
SAU
RESPONSABLE DE AREA




CONSORCIO VIAL
ONEXIÓN ORINOQUIA
BUZÓN
Galaxy S23 Ultra
31 de mayo de 2024 10:22 a. m.

Subprograma 10.2 Seguimiento y control a la información y divulgación.

Fotografía 9 Piezas divulgativas.












Contrato 779 - Via P...
realiza pieza informativa de seguridad vial, como una de las estrategias del programa de cultura vial. Para prevenir accidentes en el corredor vial. Usuarios de la vía reduerde que:
EN CASA ALGUIEN LOS Y LAS ESPERA
REQUISITOS PARA RECEPCIÓN HOJAS DE VIDA
El Consorcio Vial Conexión Orinoquia, comparte imformación para la recepción de hojas de vida.
Mensaje


Mujeres Unbenses
EN CASA ALGUIEN LOS Y LAS ESPERA
#Encarrílate
Programe sus desplazamientos con anterioridad, respete la señalización instalada y evite exceder los límites de velocidad. Son unas de las recomendaciones que entregamos a los y las usuarias del corredor en nuestras campañas de cultura vial.
#Encarrílate.
En nuestras campañas de cultura vial, concientizamos a los usuarios de la vía, para prevenir siniestros viales. #ConsorcioVialConexión Orinoquia
Mensaje

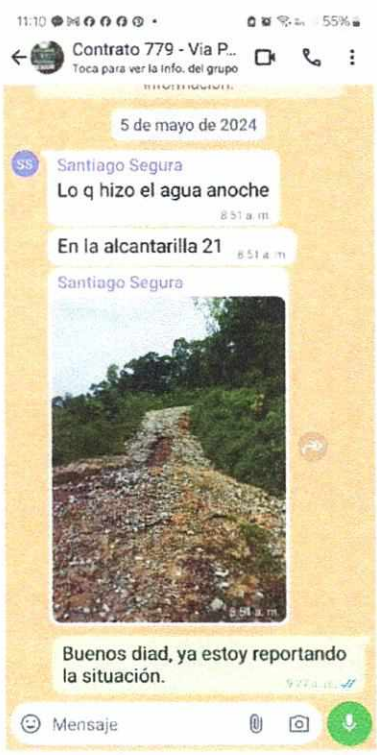
Contrato 779 - Via P...
Toca para ver la info. del grupo
5 de mayo de 2024
Santiago Segura
Lo q hizo el agua anoche
En la alcantarilla 21
Santiago Segura
Buenos diad, ya estoy reportando la situación.
Mensaje


jose miguel polo uri...
14 de mayo de 2024
REQUISITOS PARA RECEPCIÓN HOJAS DE VIDA
El Consorcio Vial Conexión Orinoquia, comparte imformación para la recepción de hojas de vida.
22 de mayo de 2024
HV_CONDUCTOR_ A2.B2.C2_JEISON MESA_...
Mensaje

Subprograma 10.3 Seguimiento y control a la cultura vial y participación comunitaria.

Fotografía 10 Participación en comité de convivencia escolar – Donde se genera compromiso con la institucionalidad en realizar actividades de cultura vial. 24.05.2024



Fotografías 11 Se socializan actividades con casa de la cultura en seguridad vial. 29.05.2024



Fotografías 12 Se realiza recepción de hojas de vida, para la construcción del banco de hojas de vida. mayo



Fotografías 13 instalación de señalización en el corredor vial que conecta a la escuela de la vereda Versalles.





ENTRADA Y SALIDA
DE VOLQUETAS


21/05/2024, 4:24:20 p. m.



22/05/2024, 4:04:32 p. m.

Otras actividades.

Fotografía 14 Participación en comité técnico

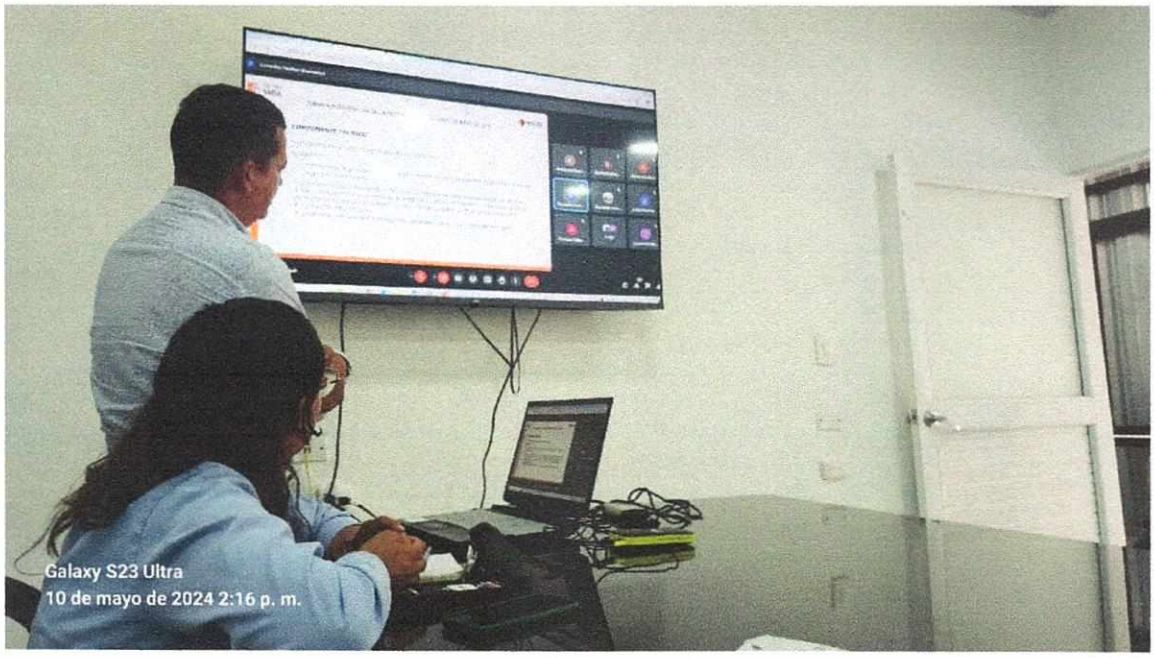

Fotografías 15 mesas de trabajo con el equipo de gestión social, para verificación y seguimiento.

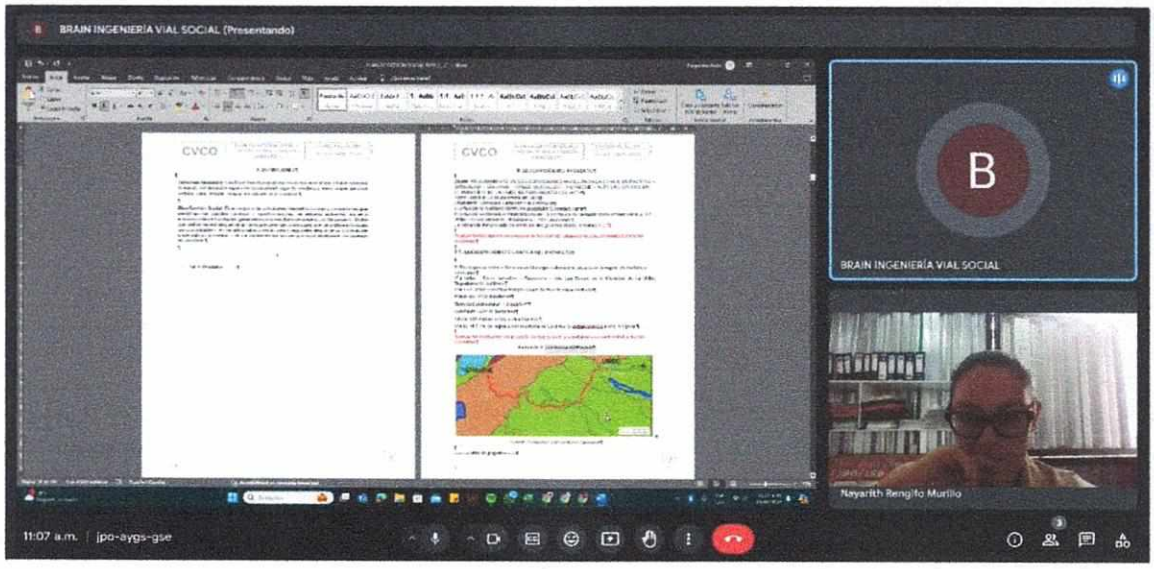

INFORME SOCIAL DE OBRA
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA N°779 - 2022

"MEJORAMIENTO DE LOS CORREDORES VIALES PARA LA CONEXIÓN PACÍFICO – ORONOQUÍA – VÍA URIBE – CRUCE VERSALLES – PAPAMENE – ALTO LAS CRUCES EN EL MUNICIPIO DE LA URIBE DEPARTAMENTO DEL META"



ENTIDAD CONTRATANTE: AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META (AIM)
CONTRATISTA: CONSORCIO VIAL CONEXIÓN ORINOQUIA

INFORME MENSUAL DE CONSTRUCTOR N° 11
PERIODO COMPRENDIDO DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2024

REVISIÓN Y APROBACIÓN

GENERALIDADES			
Objeto del Contrato	"MEJORAMIENTO DE LOS CORREDORES VIALES PARA LA CONEXIÓN PACÍFICO – ORONOQUÍA – VÍA URIBE – CRUCE VERSALLES – PAPAMENE – ALTO LAS CRUCES EN EL MUNICIPIO DE LA URIBE DEPARTAMENTO DEL META"		
Título de Documento	Informe De Obra		
Documento No.	INF-11		
APROBACIÓN			
CONSORCIO VIAL CONEXIÓN ORINOQUIA	Nombre	:	NAYARITH RENGIFO MURILLO
CARGO		:	PROFESIONAL SOCIAL DE OBRA
Responsable por la Revisión de Obra:	Firma	:	
	Fecha	:	30/06/2024

	CONSORCIO VIAL CONEXIÓN ORINOQUIA	CÓDIGO: 01
		VERSIÓN: 01
	INFORME SOCIAL	Fecha: ABRIL 2023

TABLA DE CONTENIDO

REVISIÓN Y APROBACIÓN 2

1. INTRUDUCCIÓN: 6
2. LOCALIZACIÓN DE INTERVENCIÓN DEL PROYECTO 7
3. ALCANCE 9
4. INFORMACIÓN PAGA Y PLAN DE GESTIÓN SOCIAL 9
5. PLAN DE GESTIÓN SOCIAL – ACTIVIDADES REALIZADOS EN EL PERIODO REPORTADO. 9
8. CONCLUSIONES 31
9. REGISTRO FOTOGRÁFICO 32
10. ANEXOS 56

LISTADO DE TABLAS

Tabla 1. inducción 10
Tabla 2. Retiros Junio 11
Tabla 3. Capacitación 11
Tabla 4. Indicador del subprograma 1.2. Capacitación y concienciación del personal de obra 11
Tabla 5. Actividades desarrolladas durante el periodo reportado. 12
Tabla 6.Consolidado personal contratista vinculado al proyecto 2023. 13
Tabla 7.Consolidado personal contratista vinculado al proyecto 2024. 13
- Tabla 8.Ingresos personal junio. 14
Tabla 9. Indicadores Subprograma 6.1 seguimiento y control a la mano de obra contratada con enfoque de género, derechos y diferencial. 15
Tabla 10. Información de actividades realizadas durante el periodo reportado 16
Tabla 11. Indicador del subprograma 8.1 Subprograma seguimiento y control a la infraestructura de predios y servicios públicos 17
Tabla 12. Información de actividades realizadas en el periodo reportado 18
Tabla 13. Indicador del subprograma 8.2 Subprograma seguimiento y control al apoyo y orientación para a la gestión interinstitucional en la recuperación del derecho de vías 18
Tabla 14. Estado actual de las PQRS del proyecto 19
Tabla 15. Seguimiento PQRS del proyecto. 20
Tabla 16. Indicador del subprograma 10.1 Subprograma seguimiento y control a la atención a la comunidad. 23
Tabla 17. Actividades realizadas durante el periodo reportado. 24
Tabla 18. Indicador del subprograma 10.2 Subprograma seguimiento y control a la información y divulgación 25
Tabla 19. Actividades realizadas Seguimiento y control a la cultura vial y participación comunitaria. 26
Tabla 20. Indicador del subprograma 10.3 Subprograma seguimiento y control a la cultura vial y participación comunitaria 27
Tabla 21. Correspondencia recibida en el periodo reportado 29

Tabla 22. Correspondencia enviada en el periodo reportado 30

LISTA DE FOTOGRAFIAS

Fotografía 1 Inducción al personal desde el componente social. 32
Fotografía 2 capacitación al personal desde el componente social. 33
Fotografía 3 verificación del personal vinculado en las bases sociales del municipio. 33
Fotografías 4 diligenciamiento permisos de intervención voluntaria en predios. 33
Fotografía 5 Atención a comunidad 40
Fotografía 6 Cartelera informativa SAU 44
Fotografía 7 Aviso SAU 44
Fotografía 8 Instalación de punto móvil y apertura buzón 45
Fotografía 9 Piezas divulgativas. 49
Fotografía 10 Se realizo recorrido en la vereda Versalles para verificar señalización al ingreso de la escuela Versalles 4.06.2024 50
Fotografías 11 Participación actividad "Celebración dia de la familia en Yavia" donde se abordó actividad en seguridad vial y prevención de violencias. 8.06.2024 51
Fotografías 12 Actividad de seguridad vial con niños y niñas ciclistas y patinadores que usan parte del corredor vial para entrenar.12.06.2024 51
Fotografías 13 Se realizo taller en seguridad vial con niños y niñas patinadoras que entrenan en el corredor vial donde se entregó souvenir. 28.06.2024 52
Fotografías 14 Se realiza recepción de hojas de vida, para la construcción del banco de hojas de vida. 54
Fotografía 15 Participación audiencia de NNAJ IE Rafael Uribe Uirbe 24.06.2024 54
Fotografías 16 presentación con la nueva docente de la escuela vereda Santander. 55

1. INTRUDUCCIÓN:

El presente informe da cuenta de las actividades ejecutadas y programadas en cumplimiento a los lineamientos establecidos desde el área social del contrato de obra pública número N° 779 2022, que tiene como objeto "**MEJORAMIENTO DE LOS CORREDORES VIALES PARA LA CONEXIÓN PACÍFICO – ORONOQUÍA – VÍA URIBE – CRUCE VERSALLES – PAPAMENE – ALTO LAS CRUCES EN EL MUNICIPIO DE LA URIBE DEPARTAMENTO DEL META**". Logrando que la comunidad a través de la gestión social y acompañamiento tenga acceso a la información sobre la ejecución del proyecto, pueda manifestar sus peticiones, quejas, reclamos, solicitudes e inquietudes, logre participar activamente durante la ejecución de la obra y ejerza control social sobre la misma, minimizar los impactos que puedan generarse con la intervención del proyecto y garantizar que las condiciones al finalizar la obra, sean iguales o mejores a las encontradas, la comunidad ha manifestado y demostrado el agradecimiento e interés por la obra que está en proceso de ejecución.

El presente informe, contempla los aspectos relacionados con la Gestión Social del proyecto, en concordancia con la ley aplicable y el contrato, teniendo como referencia la Guía de manejo ambiental de proyectos de infraestructura modo carretero de Invias.

2. LOCALIZACIÓN DE INTERVENCIÓN DEL PROYECTO

Localización: Municipio de La Uribe, Meta.

Objeto: MEJORAMIENTO DE LOS CORREDORES VIALES PARA LA CONEXIÓN PACÍFICO – ORINOQUÍA – VÍA URIBE – CRUCE VERSALLES – PAPAMENE – ALTO LAS CRUCES EN EL MUNICIPIO DE LA URIBE DEPARTAMENTO DEL META

Plazo: Hasta el 30 de diciembre de 2028

Contratista: Consorcio Conexión Vial Orinoquía

El proyecto se enmarca dentro del programa "Colombia Rural"

El proyecto contempla el mejoramiento de 15 km de vía del corredor comprendido entre la Vía Uribe – Cruce Versalles – Papamene – Alto Las Cruces.

La ejecución del proyecto se divide en dos grandes etapas: Estudios y Diseños y Ejecución física de la obra.

Localización Geográfica Del Proyecto

El Municipio de Uribe – Meta es un Municipio colombiano situado en la región de los llanos orientales.
Vía Uribe – Cruce Versalles – Papamene – Alto Las Cruces en el Municipio de La Uribe, Departamento del Meta.
Km 1 vía Uribe Colombia Margen izquierda Puente sobre río Duda

Población: 8180 habitantes

Densidad poblacional: 1,3 hab/km²

Extensión: 630700 hectáreas

Altura: 685 metros sobre el nivel del mar

Etnias: el 2.2% de la población residente en La Uribe se autorreconoce como Indígena.

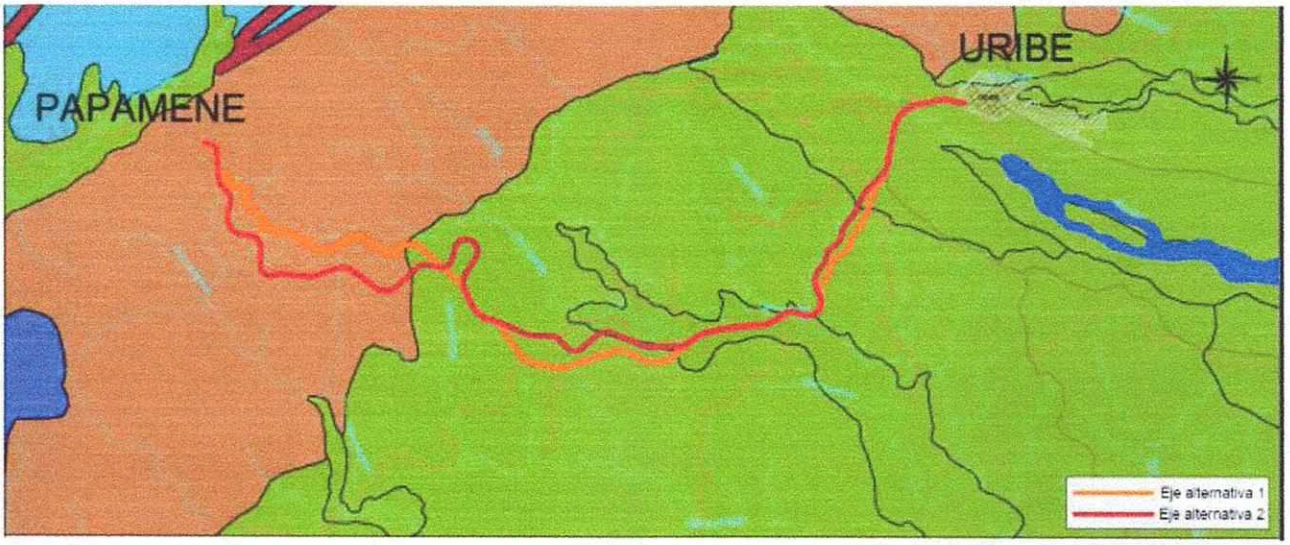


Ilustración 1 Localización del Proyecto

Área de influencia:

1. Vereda Papamene
2. Vereda Santander
3. Vereda Yavia

4. ALCANCE

4.1 Contrato de obra N° 779 DE 2022

El objeto del contrato se enmarca en el mejoramiento de los corredores viales para la conexión pacífico – Orinoquía – vía Uribe – cruce Versalles – Papamene – alto las cruces en el municipio de la Uribe departamento del meta, centrando las labores en los primeros quince kilómetros entre La Uribe y Papamene.

5. INFORMACIÓN PAGA Y PLAN DE GESTIÓN SOCIAL

Para el periodo reportado, se cuenta con Plan de Gestión Social, el cual fue aprobado por interventoría mediante oficio CE-01-042-016-2023 y PAGA aprobado por interventoría el 7 de septiembre con el oficio 01-042-0165-2023.

6. PLAN DE GESTIÓN SOCIAL – ACTIVIDADES REALIZADOS EN EL PERIODO REPORTADO.

De acuerdo con el documento PAGA y Plan de Gestión Social se cuentan con los siguientes programas y subprogramas sociales a desarrollar durante la etapa de pre-construcción:

PROGRAMA 1: SEGUIMIENTO Y CONTROL A LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD AMBIENTAL.

- Subprograma 1.2: capacitación y concienciación del personal de obra.

PROGRAMA 6: DESARROLLO LOCAL

- Subprograma 6.1: Seguimiento y control a la mano de obra contratada con enfoque de género.

PROGRAMA 8: GESTIÓN SOCIAL DE INFRAESTRUCTURA, PREDIOS Y SERVICIOS PÚBLICOS.

- Subprograma 8.1: Seguimiento y control a la infraestructura de predios y servicios públicos.

- Subprograma 8.2: Seguimiento y control de apoyo y orientación para la gestión interinstitucional en la recuperación del derecho de vía.

PROGRAMA 10: PARTICIPACIÓN, GOBERNANZA E INCLUSIÓN SOCIAL

- Subprograma 10.1 Seguimiento y control a la atención a la comunidad.
- Subprograma 10.2 Seguimiento y control a la información y divulgación.
- Subprograma 10.3 Seguimiento y control a la cultura vial y participación comunitaria.

6.1 PROGRAMA 1: SEGUIMIENTO Y CONTROL A LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD AMBIENTAL.

El programa presenta tres (3) proyectos orientados al seguimiento y control de todas las actividades de manejo ambiental y social necesarias para la ejecución de las obras en el marco del cumplimiento de las normas contractuales y normatividad ambiental y social vigente, para el área social y sus obligaciones contractuales solo se estableció como parte del plan de gestión social el subprograma 1.2 capacitación y concienciación del personal de obra, el cual se relaciona a continuación.

6.1.1 Subprograma 1.2: capacitación y concienciación del personal de obra.

Objetivo del subprograma:

Realizar el control y seguimiento a las acciones de capacitación e inducción del personal asociado a las actividades constructivas durante el desarrollo del proyecto desde el componente social. Durante este periodo se han realizado las siguientes actividades correspondientes a este subprograma.

Tabla 1. inducción

FECHA INDUCCIÓN	TEMA INDUCCION
• **11/06/2024** 1 conductor • **26/06/2024** 1 conductor de camioneta • **27/06/2024**	Inducción a las 10 personas que ingresaron desde el componente social, buen trato y respeto a la comunidad. **ANEXO 1.2 PLANILLA INDUCCIÓN.** Se presentaron 10 ingresos de los cuales 3 son personal con vinculación directa y 7 personas con vinculación indirecta.

1 conductor de camioneta. 1 mecánico 6 operadores	Se presentaron 6 retiros.

Tabla 2. Retiros Junio

RELACION DE PERSONAL EN OBRA RETIROS JUNIO						
ITEM	**NOMBRES Y APELLIDOS**	**CARGO Y/O OFICIO**	**CEDULA**	**EMPRESA**	**FECHA DE INGRESO**	**FECHA DE RETIRO**
1	EDWIN AVILEZ	CONDUCTOR	1.012.420.267	TRITURADOS SAN JOSE	28/09/2023	14/06/2024
2	DAVID JUNIOR TORRES RINCON	CONDUCTOR CAMIONETA	1.074.134.357	CVCO	10/01/2024	11/06/2024
3	ALEXANDER CALDERON MESA	AYUDANTE DE OBRA	14.605.841	CVCO	17/05/2024	4/06/2024
4	WILDER GUZMAN PEREZ	AUXILIAR OPERATIVO	17.287.752	TRITURADOS SAN JOSE	15/04/2024	15/06/2024
5	JUAN FELIPE TORRES REY	INGENIERO AUXILIAR	1.121.912.850	CVCO	26/09/2023	31/05/2024
6	WILDER GUZMAN PEREZ	AUXILIAR OPERATIVO	17.287.752	PORCIUNCULA S.A.S	15/04/2024	31/05/2024

Tabla 3. Capacitación

FECHA CAPACITACIÓN	TEMA
29/06/2024	Capacitación al personal en trabajo en equipo y buen trato. **ANEXO 1.2 CAPACITACION PERSONAL - Asistentes 39 personas.**

Tabla 4. Indicador del subprograma 1.2. Capacitación y concienciación del personal de obra

DESCRIPCION DEL INDICADOR	INDICADOR OBTENIDO	UNIDAD DE MEDICIÓN	VALOR MÍNIMO DE ACEPTACIÓN	TIEMPO MÁXIMO DE CORRECIÓN	ANALISIS DEL INDICADOR
N.º personal capacitado / N° inducciones realizadas* 100	10/10*100=100%	100%	100%	1 mes	Se da cumplimiento del 100% del indicador.
N.º de personal capacitado / N° de personal vinculado al proyecto* 100	39/53*100=74%	100%	50%	1 mes	Se da cumplimiento del indicador con el 74% (39 personas), que participaron del proceso de capacitación desde

					el área social en la temática de buen trato y trabajo en equipo. El 26% (14 personas) faltantes equivale a personal que se encuentra laborando fuera del área de influencia.

6.2 PROGRAMA 6: DESARROLLO LOCAL.

En el programa de desarrollo local se formulan actividades para el control y seguimiento a la implementación de las medidas de manejo propuestas para la prevención, minimización, compensación y/o corrección de los impactos causados por los proyectos de infraestructura vial en las comunidades del área de influencia, a través de la promoción del desarrollo local en términos de empleabilidad, obras con participación comunitaria, con el fin de incorporar buenas prácticas ambientales, sociales y económicas, que contribuyan a la conservación del ambiente y el desarrollo socioeconómico del territorio.

6.2.1 Subprograma 6.1: Seguimiento y control a la mano de obra contratada con enfoque de género.

Objetivo del subprograma:

Verificar la inclusión de mano de obra territorial de hombres y mujeres en igualdad de condiciones que hagan parte de grupos vulnerables, como mujeres y/o personas con discapacidad, o con identidades diversas de género.

Tabla 5. Actividades desarrolladas durante el periodo reportado.

FECHA	LUGAR	INSTUCIÓN / DEPENDECIA	ACTIVIDAD
1 al 30 de junio 2024	Oficina CVCO – Oficina Alcaldía	Consorcio Vial Conexión Orinoquia / Alcaldía	Se realizo publicación de recepción de hojas de vida en el municipio de Uribe.

FECHA	LUGAR	INSTUCIÓN / DEPENDECIA	ACTIVIDAD
1 al 30 de junio 2024	Oficina CVCO – Oficina Alcaldía	Consorcio Vial Conexión Orinoquia / Alcaldía	Se realizo vinculación laboral de 10 personas (10 hombres, de los cuales 2 se encuentran en las bases sociales de primer empleo).

A continuación, se relaciona la información del personal vinculado actualmente al proyecto, para el periodo reportado:

Tabla 6.Consolidado personal contratista vinculado al proyecto 2023.

MES – AÑO	TRABAJADORES VINCULADOS AL PROYECTO			ORIGEN		GENERO		MIEMBROS PROGRAMA ARN	CATEGORÍA	
	TOTAL, PERSONAL VINCULADO	DIRECTOS (D)	INDIRECTOS (I)	ÁREA DE INFLUENCIA DIRECTA (AID)	ÁREA DE INFLUENCIA INDIRECTA (AII)	M	F		MANO DE OBRA CALIFICADA (M.O.C)	MANO DE OBRA NO CALIFICADA (M.O.N.C)
Abril	3	3	0	2	1	1	2	0	3	0
Mayo	4	4	0	2	2	1	3	0	4	0
Junio	4	4	0	2	2	1	3	0	4	0
Julio	4	4	0	2	2	1	3	0	4	0
Agosto	21	6	15	4	11	13	8	0	18	3
Septiembre	39	12	27	16	23	30	9	0	33	6
Octubre	43	15	28	19	24	35	8	0	36	7
Noviembre	50	16	34	18	32	41	9	1	42	8
Diciembre	41	14	27	16	25	34	7	1	36	5

Tabla 7.Consolidado personal contratista vinculado al proyecto 2024.

MES – AÑO	TRABAJADORES VINCULADOS AL PROYECTO			ORIGEN		GENERO		MIEMBROS PROGRAMA ARN	CATEGORÍA	
	TOTAL, PERSONAL VINCULADO	DIRECTOS (D)	INDIRECTOS (I)	ÁREA DE INFLUENCIA DIRECTA (AID)	ÁREA DE INFLUENCIA INDIRECTA (AII)	M	F		MANO DE OBRA CALIFICADA (M.O.C)	MANO DE OBRA NO CALIFICADA (M.O.N.C)
Enero	42	17	25	20	22	33	9	1	36	6
Febrero	35	14	21	10	25	27	8	1	31	4
Marzo	35	14	21	10	25	27	8	1	31	4
Abril	37	16	21	10	27	9	28	1	33	4

MES – AÑO	TRABAJADORES VINCULADOS AL PROYECTO			ORIGEN		GENERO		MIEMBROS PROGRAMA ARN	CATEGORÍA	
	TOTAL, PERSONAL VINCULADO	DIRECTOS (D)	INDIRECTOS (I)	ÁREA DE INFLUENCIA DIRECTA (AID)	ÁREA DE INFLUENCIA INDIRECTA (AII)	M	F		MANO DE OBRA CALIFICADA (M.O.C)	MANO DE OBRA NO CALIFICADA (M.O.N.C)
Mayo	39	16	23	16	23	30	9	1	35	4
Junio	53	26	27	29	24	44	9	1	40	13

ANEXO 6.1 ACTA Y CUADRO RELACION DEL PERSONAL.

Durante el periodo se realizaron 10 ingresos, del siguiente personal:

- 1 mecánico
- 3 conductores de camioneta
- 4 conductores de volqueta
- 1 operador múltiple
- 1 operador de vibrocompactador
-

- *Tabla 8.Ingresos personal junio.*

RELACION DE PERSONAL EN OBRA INGRESOS JUNIO						
ITEM	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO Y/O OFICIO	CEDULA	EMPRESA	FECHA DE INGRESO	FECHA DE RETIRO
1	PASCUAL GALINDO	CONDUCTOR DE VOLQUETA	9.654.593	MEYAN S.A.S	5/06/2024	
1	JAIME RINCON	CONDUCTOR DE VOLQUETA	7.223.445	MEYAN S.A.S	5/06/2024	
3	LUIS ALBERTO VALLEJO TORO	CONDUCTOR CAMIONETA	79.639.574	CVCO	5/06/2024	
4	CUSTODIO TOVAR	OPERADOR MULTIPLE	19.410.958	MEYAN S.A.S	5/06/2024	
5	DIEGO ARMANDO MACIAS DIAZ	MECANICO	1.118.539.450	MEYAN S.A.S	5/06/2024	
6	EDWIN CONDE	CONDCUTOR CAMIONETA		CVCO	11/06/2024	
7	ALEX DAVID ROJAS BELTRAN	O.P VIBROCOMPACTADOR	1.127.140.363	PORCIUNCULA S.A.S	17/06/2024	
8	JEFERSON LEANDRO GUIZA FUERTES	CONDUCTOR DE VOLQUETA	1.127.140.363	PORCIUNCULA S.A.S	24/06/2024	
9	LUIS ALFREDO MONTEJO	CONDUCTOR DE VOLQUETA	80.192.807	MEYAN S.A.S	27/06/2024	
10	DANIEL ANTONIO BARRERA MOLINA	CONDUCTOR CAMIONETA	1.121.924.398	CVCO	27/06/2024	

Para el período, se reportó la vinculación de mano de obra al proyecto, por parte del contratista de 26 colaboradores directos y 27 colaboradores con vinculación

indirecta, de los cuales 29 pertenecen al área de Influencia directa del proyecto, 24 son del área de influencia indirecta del proyecto (foráneos) vinculación de 9 mujeres, 1 persona está vinculada a la ARN como firmante del acuerdo de paz, 4 personas con primer empleo, vinculación de 5 personas menores de 28 años, 3 mujeres vinculada al programa familias en acción y 8 personas inscritas en el registro único de víctimas.

ANEXO 6.2 CERTIFICADOS BASES SOCIALES.

Durante el periodo reportado se garantiza la afiliación al personal a la ARL, EPS, Pensión y Caja de Compensación Familiar.

Tabla 9. Indicadores Subprograma 6.1 seguimiento y control a la mano de obra contratada con enfoque de género, derechos y diferencial.

DESCRIPCION DEL INDICADOR	INDICADOR OBTENIDO	VALOR MÍNIMO DE ACEPTACIÓN	TIEMPO MÁXIMO DE CORRECIÓN	ANALISIS DEL INDICADOR
N.º de personas vinculadas de las zonas / N° total de empleos *100	29/53*100=55%	60%	1 mes	No se da cumplimiento al 60% del indicador, debido a que el proyecto se encuentra iniciando la fase constructiva y no se requiere una amplia vinculación laboral. 55% del personal son personas de la zona de influencia.
Mano de obra perteneciente a grupos vulnerables / N° total de empleos *100	39/53*100=74%	50%	1 mes	Se da cumplimiento al indicador donde se cuenta con un indicador del 74% de cumplimiento

6.3 PROGRAMA 8: GESTIÓN SOCIAL DE INFRAESTRUCTURA, PREDIOS Y SERVICIOS PÚBLICOS.

Objetivo del programa:

En el seguimiento y control para el Programa de Gestión social de infraestructura, predios y servicios públicos se formulan actividades para el control y seguimiento a la implementación de las medidas de manejo propuestas para la prevención, minimización, compensación y/o corrección de los impactos causados por los proyectos de infraestructura vial en las comunidades del área de influencia, a través del establecimiento de los lineamientos para el acompañamiento desde la gestión social a las acciones técnicas necesarias a realizarse en predios, redes de servicios públicos y el adecuado uso del derecho de vía, para el desarrollo de las actividades constructivas de los proyectos liderados por INVÍAS y AIM.

6.3.1 Subprograma 8.1: Seguimiento y control a la infraestructura de predios y servicios públicos.

Objetivo del subprograma:

Verificar el registro del estado físico de las construcciones e infraestructura existente (cercas, servicios públicos y comunitarios, entre otros) aledaña a las áreas de intervención de la obra, infraestructura de uso temporal del contratista y en el derecho de vía, previo al inicio de cualquier actividad técnica del proyecto

Tabla 10. Información de actividades realizadas durante el periodo reportado

FECHA	LUGAR	INSTUCIÓN / DEPENDECIA	ACTIVIDAD
11, 12, 20, 21, 24 de junio del 2024	Vereda Yavia	Contratista Comunidad	Se realizo verificación de permisos de intervención voluntaria en predios, los cuales corresponden al tramo 2 del corredor vial, levantamiento acta de compromiso para correr cercas. El consorcio adelanta actividades en predios ubicados entre el K0+00 al k2+00 donde se realiza reubicación temporal de cercas.
24, 26 y 27 de junio del 2024	Vereda Yavia	Contratista Propietarios predios JAC - Alcaldía	Se tramitaron certificación de sana posesión con los propietarios, presidente de JAC y alcaldía, de los 3 predios autorizados por alcaldía para donación de material, a los cuales se les realizo acta de compromiso, visita a cada predio y toma de registro fotográfico VER **ANEXO 8.1 DOCUMENTOS DE PREDIOS.**

FECHA	LUGAR	INSTUCIÓN / DEPENDECIA	ACTIVIDAD
1/06/2024	Casco Urbano	Alcaldía	Se realizo solicitud de certificados de sana posesión a la administración municipal de los predios ubicados en el tramo 1 y 2 que no cuentan con documento legal de propiedad del predio. La administración municipal entrega certificados de sana posesión de los predios relacionados. **VER ANEXO 8.1 OFICIO Y CERTIFICADOS DE SANA POSESIÓN** –

No se presentan afectaciones en infraestructura ni en predios, No aplican actividades para el periodo reportado.

Tabla 11. Indicador del subprograma 8.1 Subprograma seguimiento y control a la infraestructura de predios y servicios públicos

DESCRIPCION DEL INDICADOR	INDICADOR OBTENIDO	UNIDAD DE MEDICIÓN	VALOR MÍNIMO DE ACEPTACIÓN	TIEMPO MÁXIMO DE CORRECIÓN	ANALISIS DEL INDICADOR
N.º de actas de vecindad realizadas / N° total de actas de vecindad construcciones aledañas *100	28/28*100=100%	100%	100%	1 mes	Se da cumplimiento al 100% del indicador.
N° afectaciones subsanadas / N° afectaciones presentadas	0/0*100=0%	0%	60%	1 mes	No se presentan afectaciones en la infraestructura.

6.3.2 Subprograma 8.2: Seguimiento y control de apoyo y orientación para la gestión interinstitucional en la recuperación del derecho de vía.

Objetivo del subprograma:

Verificar la generación y/o formulación de estrategias de apoyo interinstitucional con autoridades locales y otras entidades de relevancia en el área de influencia del proyecto, orientadas a promover la recuperación del derecho de vía de las carreteras a intervenir.

Tabla 12. Información de actividades realizadas en el periodo reportado

FECHA	LUGAR	INSTUCIÓN / DEPENDECIA	ACTIVIDAD
12 marzo del 2024	Casco Urbano	Alcaldía	En el área de influencia no se cuentan con unidades económicas ubicadas en la franja vial. De igual forma el 12 de marzo se radico oficio CCV-ALC-402-779-2023, solicitando articulación para realizar socialización de la ley 1228 y la recuperación del espacio público con actores sociales en el área de influencia del proyecto. A la fecha no se cuenta con respuesta por parte de la administración, 30 junio 2024.

Tabla 13. Indicador del subprograma 8.2 Subprograma seguimiento y control al apoyo y orientación para a la gestión interinstitucional en la recuperación del derecho de vías

DESCRIPCION DEL INDICADOR	INDICADOR OBTENIDO	VALOR MÍNIMO DE ACEPTACIÓN	TIEMPO MÁXIMO DE CORRECIÓN	ANALISIS DEL INDICADOR
Base de datos actualizada	1/1*100=100%	1	1 mes	Se da cumplimiento al 100% del indicador. Frecuencia de medición anual.
N° de asistentes a reunión / N° de reuniones programadas	2/2*100=100%	100%	1 mes	Se da cumplimiento al 100% del indicador. Frecuencia de medición trimestral.
N° actas de compromiso elaboradas / N° actas de compromiso ejecutadas	0/0*100=0%	100%	1 mes	Para el periodo reportado no se realizan actas de compromiso.

6.4 PROGRAMA 10: PARTICIPACIÓN, GOBERNANZA E INCLUSIÓN SOCIAL

Objetivo del programa:

En el seguimiento y control para el programa de participación, gobernanza e inclusión social se formulan actividades para el control y seguimiento a la implementación de las medidas de manejo propuestas para la prevención, minimización, compensación y/o corrección de los impactos causados por los proyectos de infraestructura vial en las comunidades del área de influencia, a través de la garantía de la ejecución de procesos de información, participación y promoción de la organización comunitaria en torno a los proyectos de infraestructura vial. Además, se estipulan los enfoques de género, de derechos y diferencial como ejes transversales de la gestión socio ambiental de los proyectos.

6.4.1 Subprograma 10.1 Seguimiento y control a la atención a la comunidad.

Objetivo del subprograma:

Verificar el funcionamiento del sistema de atención y respuesta oportuna y eficaz a las manifestaciones (quejas, solicitudes, reclamos, peticiones, sugerencias, denuncias, etc.), interpuestas por comunidades y autoridades mediante los medios dispuestos para esto (correo electrónico, llamada telefónica, personalmente, entre otros).

6.4.1.1 ESTADO ACTUAL DE LAS PQRS DEL PROYECTO.

Durante el periodo reportado no se recibe PQRS, pero se tiene abierta 1 PQRS del mes de mayo la cual está a espera de aprobación por interventoría (mantenimiento en la vía de la vereda Papamene solicitado por la JAC de la vereda Papamene)

Tabla 14. Estado actual de las PQRS del proyecto

ESTADO ACTUAL DE LAS PQRS DEL PROYECTO			
MES /AÑO	**PRESENTADAS**	**ABIERTAS**	**CERRADAS**
Mayo 2023	0	0	0
Junio 2023	1	1	0
Julio 2023	0	0	0

Agosto 2023	0	0	0
Septiembre 2023	0	0	0
Octubre 2023	2	1	1
Noviembre 2023	3	2	1
Diciembre 2023	1	2	1
Enero 2024	0	1	0
Febrero 2024	0	1	0
Marzo 2024	0	1	0
Abril 2024	0	1	0
Mayo 2024	1	1	0
Junio 2024	0	1	0

Tabla 15. Seguimiento PQRS del proyecto.

N° PQRS	FECHA INGRESO	NOMBRE DEL USUARIO	TIPO	SEGUIMIENTO	ESTADO	
					A	C
1	23/05/2023	JAC Vereda Papamene	Solicitud	El 20 de junio, el contratista envió respuesta a comunidad mediante oficio CVC-JAC 057-2023. Para el mes de julio, se realizó recorrido con la comunidad de la vereda Papamene para la identificación de los puntos críticos a intervenir, respondiendo a su solicitud.		X
2	1/10/2023	Carlos Gómez	Solicitud	El señor Carlos Gómez Realiza solicitud de relleno en el predio con material de excavación de la obra, a lo cual se realizó respuesta mediante oficio CVC-JAC 271-779-2023.		X
3	6/10/2023	JAC Vereda Santander	Solicitud	El presidente de la JAC solicita MANTENIMIENTO DE LA VÍA LA LAGARTIJA ESCUELA SANTANDER Y LA YE DE SANTANDER ALTO, a lo cual se realizó respuesta mediante oficio CVC-JAC 270-779-2023.		X

N° PQRS	FECHA INGRESO	NOMBRE DEL USUARIO	TIPO	SEGUIMIENTO	ESTADO	
					A	C
4	3/11/2023	Angela Chavarriaga Alcaldía	Solicitud	Asunto: Apoyo a celebración del día comunal para el día 19 de noviembre. El consorcio no realiza apoyo en la actividad, debido a que el contrato no cuenta con recursos para el desarrollo de estas actividades.		X
5	21/11/2023	JAC Vereda Papamene	Solicitud	Asunto: invitación a reunión con la directiva de la vereda Papamene. El miércoles 22 de noviembre se participó en reunión programada donde se acordó realizar campaña de seguridad vial con los niños y niñas de la vereda en el mes de diciembre.		X
6	29/11/2023	Geily Lorena Machuca Alcaldía	Solicitud	Asunto: invitación y solicitud de apoyo logístico al festival de la paz y la confraternidad Uribense 2023. El Consorcio acordó con la administración municipal apoyar la Travesía Ciclista MTB 45 K el día domingo 3 de diciembre, en la ruta Cabecera Municipal – vereda Papamene – cabecera municipal en lo siguiente 1. Conductor: Esneider Bedoya Beltrán Cedula: 1.134.434.496 de Mapiripan. Celular número: 3124635830 2. Camión tipo turbo, placa LZO560. Disponible desde las 6 am, el cual contara con camilla y botiquín. 3. Punto de hidratación, que cuenta con carpa, botiquín de primeros auxilios, camilla, residente social quien realizara campaña - sensibilización en seguridad vial y apoyo en la hidratación 5. Personal del consorcio participara en la travesía. El 3 de diciembre se realizó cierre a la PQRS.		X
7	19/12/2023	JAC Vereda Versalles	Solicitud	Solicitud incentivo navideño a los niños y niñas de la vereda		X
8	20/05/2024	JAC Vereda Papamene	Solicitud	Solicitud de mantenimiento en los puntos críticos del corredor vial de Papamene, las afectaciones en la vía se han presentado	X	

N° PQRS	FECHA INGRESO	NOMBRE DEL USUARIO	TIPO	SEGUIMIENTO	ESTADO	
					A	C
				a causa de las fuertes lluvias, el mismo día se realiza notificación de afectaciones en la vía para tramitar solicitud de la comunidad. **VER ANEXO 10.1 SOLICITUD PQRS**		

FECHA	LUGAR	INSTUCIÓN / DEPENDECIA	ACTIVIDAD
Junio 2024	Oficina contratista	Comunidad Interventoría Contratista	Se realizo conversación con el señor Jairo Campiño, presidente de la JAC de la vereda Papamene como seguimiento al mantenimiento realizado en la vía y solicitud realizada por la comunidad el día 20.05.2024
Junio 2024	Vereda Papamene	Contratista, Interventoría y comunidad	Se cuenta con punto móvil en la escuela de la vereda Papamene, donde se relacionó información propia del contrato (número del contrato, objeto, proceso de recepción de hojas de vida, actividades realizadas en la fase pre-cronstructiva y constructiva).
Junio 2024	Vereda Santander	Contratista, Interventoría y comunidad	Se cuenta con punto móvil en la escuela de la vereda Santander, donde se relacionó información propia del contrato (número del contrato, objeto, proceso de recepción de hojas de vida, actividades realizadas en la fase pre-cronstructiva y constructiva).
Junio 2024	Vereda Yavia	Contratista, Interventoría y comunidad	Se cuenta con punto móvil en la escuela de la vereda Yavia, donde se relacionó información propia del contrato (número del contrato, objeto, proceso de recepción de hojas de vida, actividades realizadas en la fase pre-cronstructiva - constructiva).
Junio 2024	Alcaldía	Contratista, Interventoría y comunidad	Se cuenta con punto móvil en la alcaldia, donde se relacionó información propia del contrato (número del contrato, objeto, proceso de recepción de hojas de vida, actividades realizadas en la fase pre-cronstructiva - constructiva).
Junio 2024	Oficina Consorcio Vial	Contratista, Interventoría y	Se cuenta con oficina de servicio de atención al usuario (SAU), ubicada en la dirección KM 0+900 vía Uribe la Julia – Puente Rio Duda. La cual fue aprobada por interventoría

FECHA	LUGAR	INSTUCIÓN / DEPENDECIA	ACTIVIDAD
	Conexión Orinoquia.		mediante oficio 01-042-0254-2023 basada en la visita que realizo la profesional social de interventoría al SAU el día 25/10/2023.

Durante el periodo reportado no se recibió PQRS

Tabla 16. Indicador del subprograma 10.1 Subprograma seguimiento y control a la atención a la comunidad.

DESCRIPCION DEL INDICADOR	INDICADOR OBTENIDO	VALOR MÍNIMO DE ACEPTACIÓN	TIEMPO MÁXIMO DE CORRECIÓN	ANALISIS DEL INDICADOR
# de PQRS recepcionadas / # de PQRS presentadas en el periodo * 100	0/0*100=100%	0	1 mes	Se da cumplimiento al 100% del indicador. Durante el periodo reportado no se recepciónaron PQRS, se realiza tramite de 1 PQRS, la cual se encuentra en proceso desde el mes de mayo.
# de PQRS contestadas dentro del término legal/ # de PQRS presentadas en el periodo * 100	0/0*100=100%	0	1 mes	Se da cumplimiento al 100% del indicador. Durante el periodo reportado se presenta una PQRS la cual está en proceso y se encuentra dentro del término legal.
N° de oficinas fijas propuestas/ N° de oficinas fijas implementadas X 100	1/1*100=100%	100%	1 mes	Se da cumplimiento al 100% del indicador, ya que se cuenta con SAU fija, la cual fue aprobada por interventoría mediante oficio 01-042-0254-2023.

N° puntos móviles de atención al usuario propuestas/ N° puntos móviles de atención al usuario implementadas X 100%	4/4*100=100%	100%	1 mes	Se da cumplimiento al 100% del indicador, ya que se tienen oficina móvil instalada en la vereda Yavia, Papamene, Santander e instalaciones de la Alcaldía.

6.4.2 Subprograma 10.2 Seguimiento y control a la información y divulgación.

Objetivo del subprograma:

Verificar la implementación de la estrategia pública de divulgación para brindar información oportuna, clara, veraz y actualizada a los actores sociales e institucionales sobre las actividades ejecutadas en el marco del contrato

Tabla 17. Actividades realizadas durante el periodo reportado.

FECHA	LUGAR	INSTUCIÓN / DEPENDECIA	ACTIVIDAD
Junio 2024	Whatsapp	Comunidad Contratista	Se comparten piezas divulgativas en el grupo de Whatsapp, convocatorias laborales información del estado del proyecto: En junio se continúa divulgando la siguiente información Si eres técnico, tecnólogo, profesional, auxiliar, guarda de seguridad o tienes otro desempeño, ayúdanos a fortalecer la base de datos del nivel académico del Uribe, Meta. Ingresa al siguiente formulario y responde: https://forms.gle/FGbT21KEdZ6j5D9y5 
Junio 2024	Whatsapp	Comunidad Contratista	Se comparte piezas informativas con la ubicación del SAU y fase del contrato.

FECHA	LUGAR	INSTUCIÓN / DEPENDECIA	ACTIVIDAD
Junio 2024	Whatsapp	Comunidad Contratista	Se comparten piezas comunicativas de actividades realizadas en el corredor vial.
Junio 2024	Whatsapp	Comunidad Contratista	Se comparten piezas comunicativas de la realización del banco de hojas de vida de personas ubicadas en el área de influencia del proyecto.
Junio 2024	Whatsapp y físicas	Comunidad Contratista	Se comparten piezas divulgativas de seguridad y cultura vial.

Tabla 18. Indicador del subprograma 10.2 Subprograma seguimiento y control a la información y divulgación

DESCRIPCION DEL INDICADOR	INDICADOR OBTENIDO	VALOR MÍNIMO DE ACEPTACIÓN	TIEMPO MÁXIMO DE CORRECIÓN	ANALISIS DEL INDICADOR
N° de reuniones de inicio ejecutadas/ N° de reuniones programadas X 100	3/3*100=100%	100%	1 mes	Se da cumplimiento al 100% del indicador El 19 de abril se realizó socialización de inicio de actividades constructivas donde participaron las 3 veredas del área de influencia.
N° de reuniones de seguimiento ejecutadas/ N° de reuniones programadas X 100	0/3*100=0%	100%	1 mes	No aplica para el periodo, se proyecta para cuando el proyecto lleve el 50% de ejecución.
N° de reuniones de finalización ejecutadas/ N° de reuniones programadas X 100	0/3*100=0%	100%	1 mes	No aplica para el periodo reportado
N° de reuniones extraordinarias	0/0*100=100%	100%	1 mes	Para el periodo, no se recibieron

ejecutadas/ N° de reuniones solicitadas X 100				solicitudes de reuniones extraordinarias.
N° de videos programados/N° de videos presentes en la página web	0/1*100=0%	1	1 mes	Se entrega anualmente, a la fecha no aplica debido a que no se cumple el año.
N° de infografías entregadas/ N° propuestos	0/1*100=0%	1	1 mes	Se entrega anualmente, a la fecha no aplica debido a que no se cumple el año.
N° de piezas informativas y de divulgación / N° de piezas informativas y de divulgación propuestas X 100	3/3*100=100%	100%	1 mes	Se realizo entrega de 3 piezas de información y divulgación.

6.4.3 Subprograma 10.3 Seguimiento y control a la cultura vial y participación comunitaria.

Objetivo del programa:

Verificar las estrategias de apropiación del proyecto a través de procesos de educación y concienciación con las comunidades educativas, líderes, comité de participación comunitaria y población en general. Validar los espacios para la participación y control social.

Tabla 19. Actividades realizadas Seguimiento y control a la cultura vial y participación comunitaria.

FECHA	LUGAR	INSTUCIÓN / DEPENDECIA	ACTIVIDAD
Junio	Punto satélite – Alcaldía municipal	Contratista, comunidad	Se publicaron piezas en carteleras y redes, donde se promociona la seguridad vial se entregaron recomendaciones a los usuarios de la vía, se explicó que es la seguridad vial y como pueden aportar a disminuir riesgos de siniestros viales.
Junio	Alcaldía	Contratista, comunidad	Se tenía programado realizar actividad de seguridad vial con la escuela de la vereda Yavia, Versalles y Papamene, no se logra realizar actividad debido al paro nacional que

			realizaron los colegios públicos acogiendo estas escuelas, al terminar el paro iniciaron vacaciones de junio. Por lo cual se proyecta actividad para el mes de julio.
4 junio 2024	Vereda Versalles	Contratista Escuela Versalles	Se realizo recorrido en la vereda Versalles para verificar señalización al ingreso de la escuela Versalles
8 junio 2024	Vereda Versalles	Contratista Escuela Versalles	Participación actividad "Celebración día de la familia en Yavia" donde se abordó actividad en seguridad vial y prevención de violencias.
12 junio 2024	Corredor Vial	Uribe Skating Club y Consorcio Vial Conexión Orinoquia	Actividad de seguridad vial con niños y niñas ciclistas y patinadores que usan parte del corredor vial para entrenar. Los deportistas pertenecen al club de patinaje Uribe Skating Club.
28 junio 2024	Casco urbano	Uribe Skating Club y Consorcio Vial Conexión Orinoquia	Se realizo taller en seguridad vial con niños y niñas patinadoras que entrenan en el corredor vial donde se entregó souvenir.

Tabla 20. Indicador del subprograma 10.3 Subprograma seguimiento y control a la cultura vial y participación comunitaria

DESCRIPCION DEL INDICADOR	INDICADOR OBTENIDO	VALOR MÍNIMO DE ACEPTACIÓN	TIEMPO MÁXIMO DE CORRECIÓN	ANALISIS DEL INDICADOR
N° de actividades de sensibilización ejecutadas/ N° de actividades programadas X 100	2/2*100=100%	100%	1 mes	Se da cumplimiento al indicador, donde se programó y ejecuto una actividad, entregando infografías de seguridad vial a la comunidad mediante redes sociales y Recorrido en la vereda Versalles para verificar señalización al ingreso de la escuela Versalles
N° de talleres de capacitación realizados/ N° de talleres	1/1*100=0%	100%	1 mes	Se realizo campaña en seguridad vial con los niños y niñas estudiantes de la escuela, hogar infantil en articulación con

programados X 100				administración municipal. En casco urbano el 08.06.2024
N° de campañas de seguridad vial realizadas/ N° campañas requeridas X 100	1/1*100=100%	100%	1 mes	Se realizo campaña en seguridad vial con los niños y niñas estudiantes de la escuela, hogar infantil en articulación con administración municipal. En casco urbano el 12.06.2024
N° bases de datos lideres realizadas/ N° de base de datos requeridas	1/1*100=100%	1	1 mes	Se da cumplimiento a cabalidad de este indicador.
N° de comités de participación programados/ N° de comités de participación programados ejecutados X 100	3/3*100=0%	2	1 mes	Se realizo actividad con el comité de participación de cada una de las veredas, en el marco de la socialización de inicio de la fase constructiva: 1. Papamene el día 16/04/2024 2. Yavia el día 16/04/2024 3. Santander el día 16/04/2024 Para el mes de mayo del 2024 se realizará acta de conformación y actividad.
N° de reuniones programadas con veeduria / N° de reuniones ejecutadas X 100	0/1*100=0%	1	1 mes	Los integrantes de la veeduría no programan reunión, se les informa que el consorcio está a disposición para dichas actividades, pero no realizan actividad. La

				frecuencia de medición es trimestral.

7. OTRAS ACTIVIDADES DE LA GESTIÓN SOCIAL

- ✓ Se programan actividades de gestión social, con comunidad e instituciones, desde cada uno de los programas para el mes de junio y julio del 2024.
- ✓ Se realizaron mesas de trabajo con la profesional social de interventoría.
- ✓ 12 junio 2024 se realizó presentación del contrato, consorcio de obra e interventoría, a la nueva docente de la vereda Santander.
- ✓ 13 y 18 junio 2024, Se han establecido mesas de trabajo entre el equipo de gestión social, las cuales han sido significativas para el cumplimiento de las obligaciones contractuales y mitigaciones de situaciones presentadas.
- ✓ 21 de junio, verificación del personal vinculado al consorcio en bases sociales del municipio.
- ✓ Junio 2024 Se realiza recepción de hojas de vida, construyendo el banco de hojas de vida.
- ✓ 24 junio 2024 participación en audiencia pública de NNAJ en la institución educativa, invitación realizada con el Institución Rafael Uribe Uribe.
- ✓ Se realizan ajustes del plan de gestión social v2, fase constructiva, la construcción de este documento fue realizada junto al equipo de gestión social de interventoría. **VER ANEXO 11 PLAN DE GESTION SOCIAL**

8. RELACIÓN DE CORRESPONDENCIA

Tabla 21. Correspondencia recibida en el periodo reportado

FECHA	RADICADO	REMITE	ASUNTO
13/06/2024	OFISPA. 120. 0-018-2024	Alcaldía municipal	Autorización al Consorcio Vial Conexión Orinoquia para la donación de material de excavación en el lote ubicado en la finca La Caracola en la vereda Yavia
13/06/2024	OFISPA. 120. 0-016-2024	Alcaldía municipal	Autorización al Consorcio Vial Conexión Orinoquia para la donación de material de excavación en el predio de la asociación ACUME, ubicado en la vereda Versalles
13/06/2024	OFISPA. 120. 0-017-2024	Alcaldía municipal	Autorización al Consorcio Vial Conexión Orinoquia para la donación de material de excavación en el lote ubicado en la finca La gran Vía en la vereda Versalles

18/06/2024	CCP-OP-1060-2022-0123	Interventoría Consorcio Conexión Pacifico	Respuesta a oficio CCV-INT-505-779-2023. Donación de material de excavación.
19/06/2024	CCP-OP-1060-2022-0128	Interventoría Consorcio Conexión Pacifico	Remisión observaciones informe mensual mayo 2024
20/06/2024	CCP-OP-1060-2022-0126	Interventoría Consorcio Conexión Pacífico	Aprobación del Volumen X Gestión Ambiental y Social desde el Componente Social para Tramo No.2 (K3+000 al K10+000)

Tabla 22. Correspondencia enviada en el periodo reportado

FECHA	RADICADO	DESTINATARIO	ASUNTO
1/06/2024	CCV-INT-410-779-2023	Interventoría Consorcio Conexión Pacífico	Respuesta a oficio número CCP-OP-1060-2022-094, que tiene como asunto "solicitud entrega del Plan de Gesti6n Social".
1/06/2024	CCV-ALC-483-779-2023	Alcaldía	Solicitud certificados de sana posesión
6/06/2024	CCV-INT-490-779-2023	Interventoría Consorcio Conexión Pacífico	Radicado informe mayo
17/06/2024	CCV-INT-505-779-2023.	Interventoría Consorcio Conexión Pacífico	Donación de material de excavación.
20/06/2024	CCV-INT-517-779-2023	Interventoría Consorcio Conexión Pacífico	Entrega permisos de intervención voluntaria en predios firmado por poseedores y/o propietarios de tramo 2, actas de entorno y actas de vecindad correspondientes al tramo 1, 2 y 3.
28/06/2024	CCV-INT-528-779-2023	Interventoría	Respuesta a oficio CCP-OP-1060-2022-0123, que tiene como asunto respuesta a oficio CCV-INT-505-779-2023. Donación de material de excavación.

ANEXO 12. CORRESPONDENCIA

9. CONCLUSIONES

- Se continúan realizando acciones para el cumplimiento de las obligaciones sociales contractuales.
- Se tomo como base la guía de manejo ambiental para proyectos de infraestructura modo carretero versión 2022, INVIAS.
- Se brindo atención al usuario desde el SAU a la comunidad.
- Se estableció y se mantiene buena articulación con la institucionalidad del municipio, interventoría y con comunidad.
- Se programaron actividades para el mes de junio y julio del 2024.
- Se participa en comités semanales
- Se han establecido mesas de trabajo entre el equipo de gestión social, las cuales han sido significativas para el cumplimiento de las obligaciones contractuales.
- Se han establecido mesas de trabajo entre el equipo de gestión social, las cuales han sido significativas para el cumplimiento de las obligaciones contractuales y mitigaciones de situaciones presentadas.
- Se realizan ajustes del plan de gestión social V2 – fase constructiva.
- Se establecieron compromisos con propietarios de los predios intervenidos.
- Se realizaron actividades de seguridad vial con niños y niñas patinadoras que entrenan en el corredor vial que conduce a las veredas Yavia y Papamene.
- Se realizo apertura a los buzones, no se recibieron PQRS, se tiene una solicitud abierta desde el mes de mayo la cual está en proceso de aprobación por interventoría (Solicitud de mantenimiento realizado por la junta de acción comunal de la vereda Papamene).
- Se brindo atención en el SAU.
- Se recepcionaron hojas de vida.
- Se dio cumplimiento a las actividades propuestas para el mes.
- Se tramitaron documentos para el proceso de donación de material de excavación autorizado por la alcaldía municipal.

10. REGISTRO FOTOGRÁFICO


Subprograma 1.2 Capacitación y concienciación del personal de obra.

Fotografía 1 Inducción al personal desde el componente social.





Fotografía 2 capacitación al personal desde el componente social.

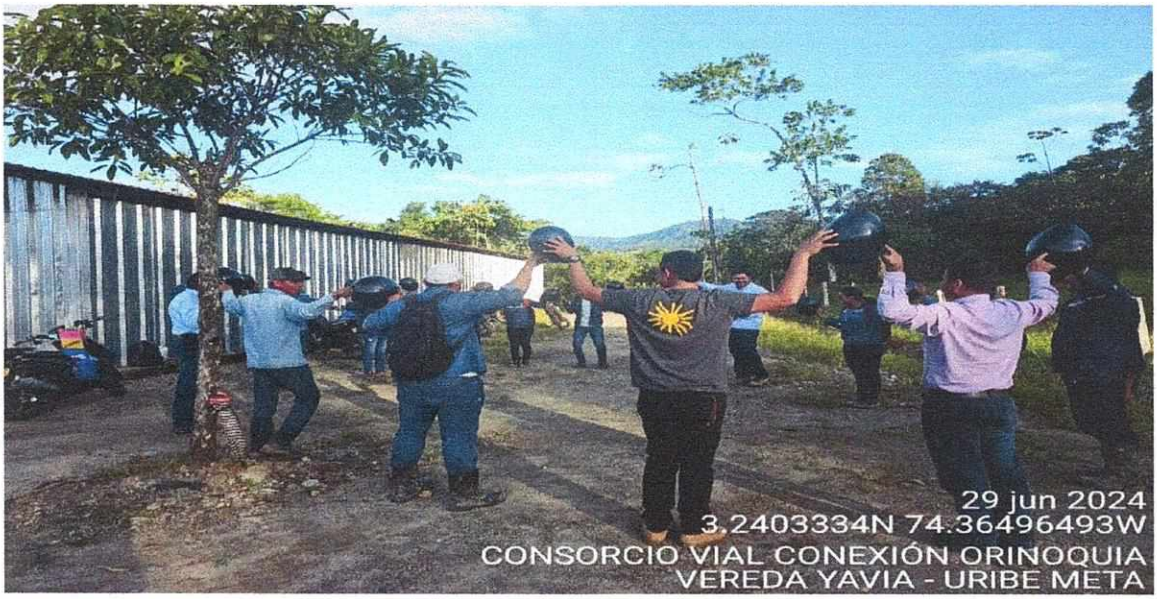

Fotografía 3 verificación del personal vinculado en las bases sociales del municipio.

Subprograma 8.1: Seguimiento y control a la infraestructura de predios y servicios públicos.

Fotografías 4 diligenciamiento permisos de intervención voluntaria en predios.



	CONSORCIO VIAL CONEXIÓN ORINOQUIA	CÓDIGO: 01
		VERSIÓN: 01
	INFORME SOCIAL	Fecha: ABRIL 2023






Galaxy S23 Ultra
15 de junio de 2024 9:59 a. m.


Galaxy S23 Ultra
15 de junio de 2024 9:58 a. m.



Galaxy S23 Ultra
15 de junio de 2024 9:48 a. m.



Galaxy S23 Ultra
15 de junio de 2024 9:29 a. m.


VIDA
Cambio
Galaxy S23 Ultra
15 de junio de 2024 8:51 a. m.



Galaxy S23 Ultra
15 de junio de 2024 8:45 a. m.


Galaxy S23 Ultra
15 de junio de 2024 8:18 a. m.

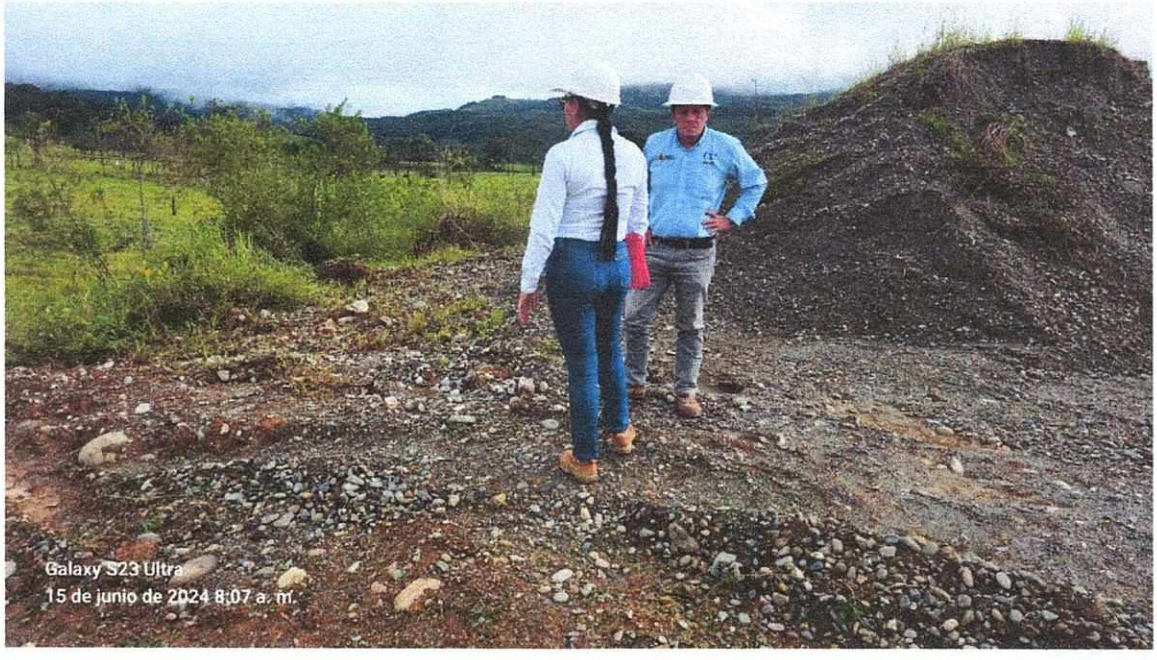
Galaxy S23 Ultra
15 de junio de 2024 8:07 a. m.

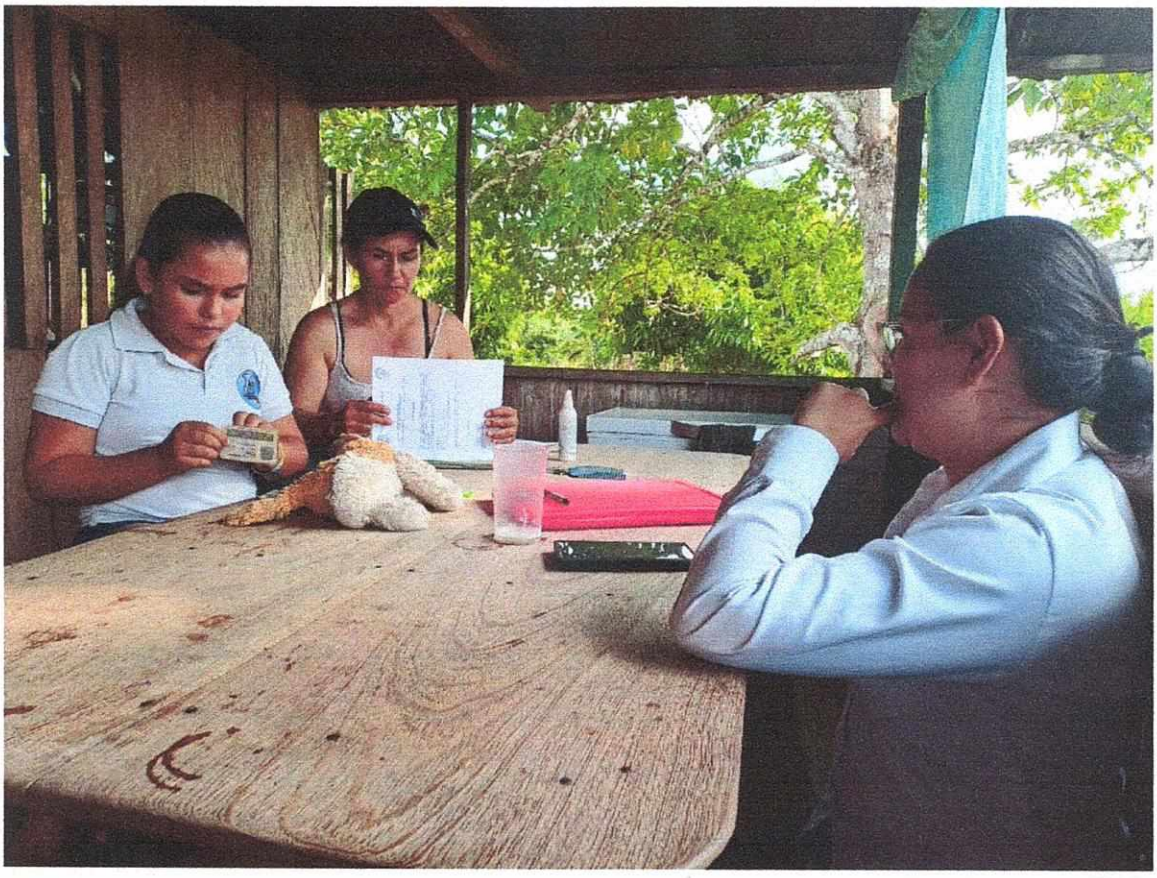



Galaxy S23 Ultra
27 de junio de 2024 3:02 p. m.

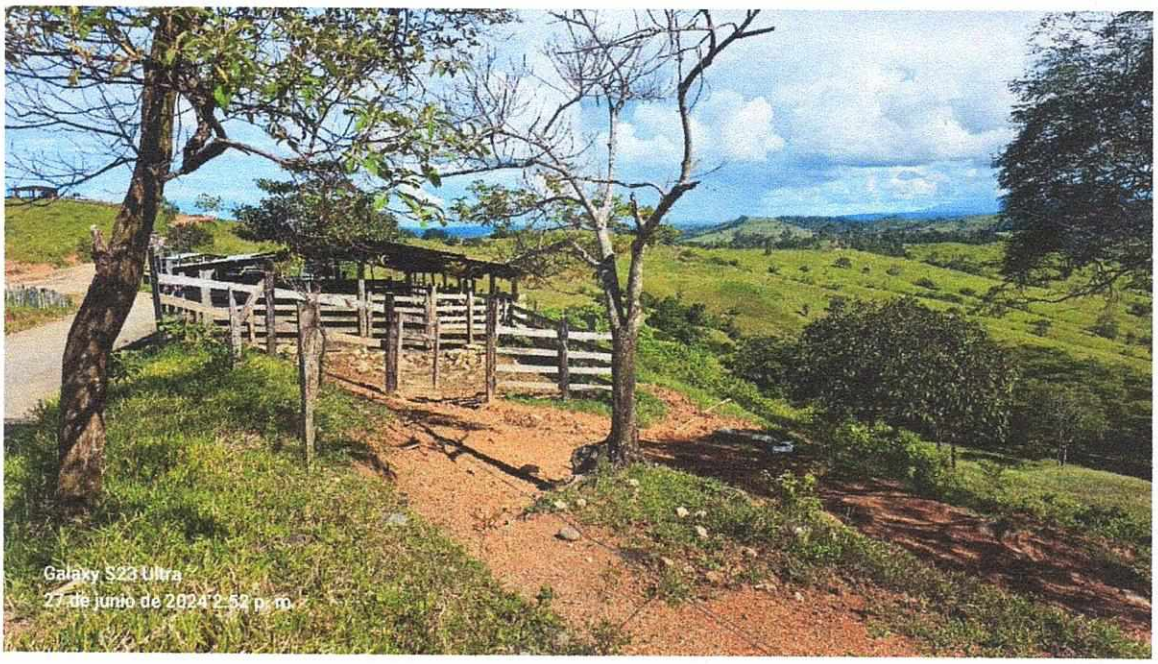



Subprograma 10.1 Seguimiento y control a la atención a la comunidad.

Fotografía 5 Atención a comunidad

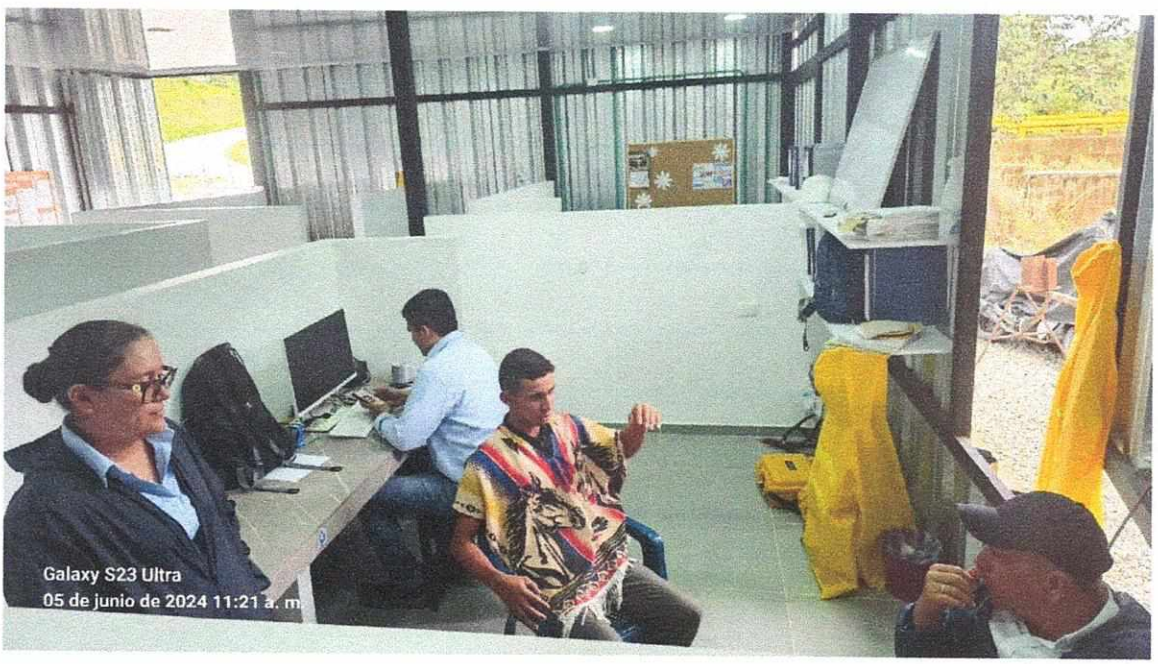



Galaxy S23 Ultra
04 de junio de 2024 3:47 p. m.

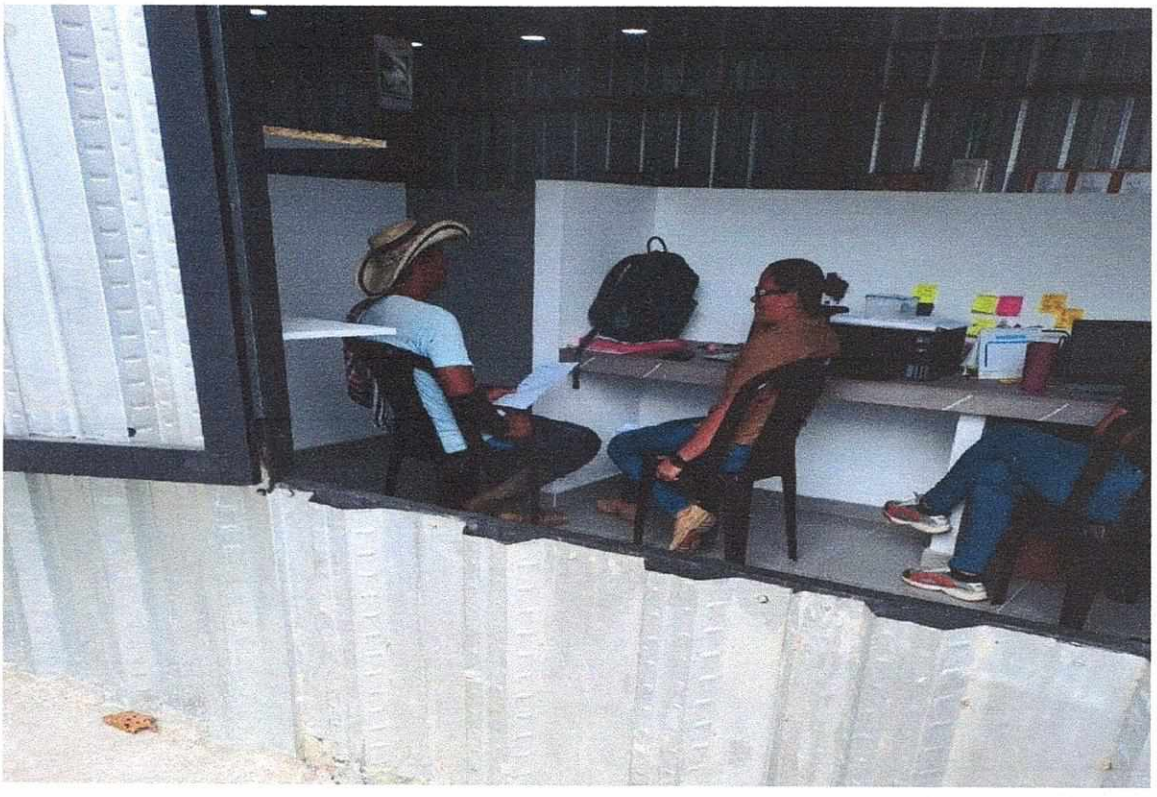

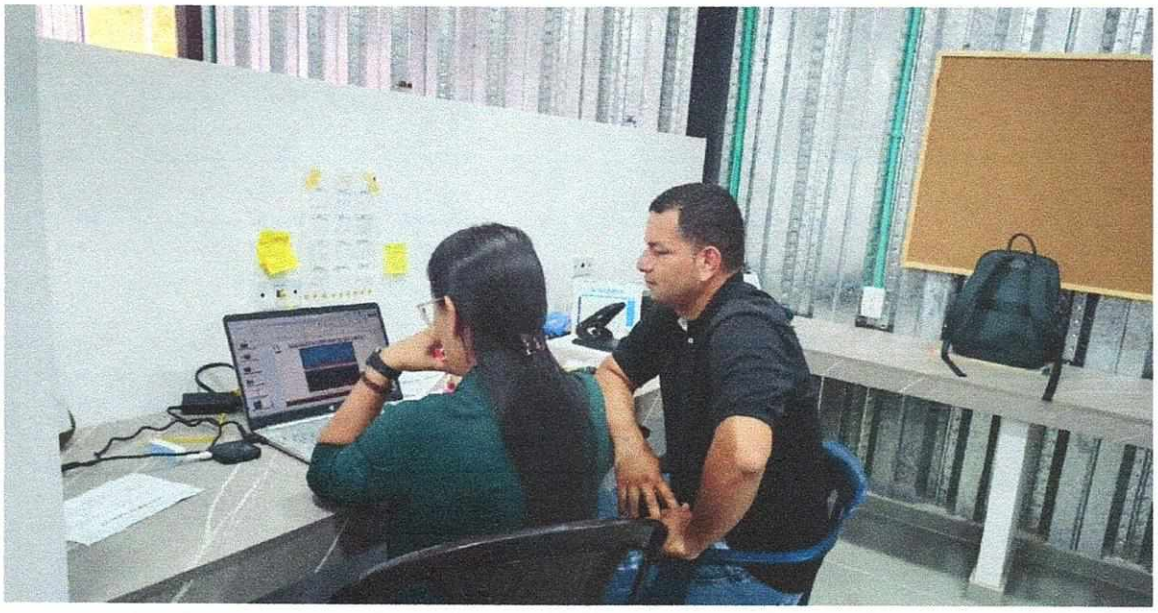


Galaxy S23 Ultra
28 de junio de 2024 4:50 p. m.


Galaxy S23 Ultra
28 de junio de 2024 3:44 p. m.

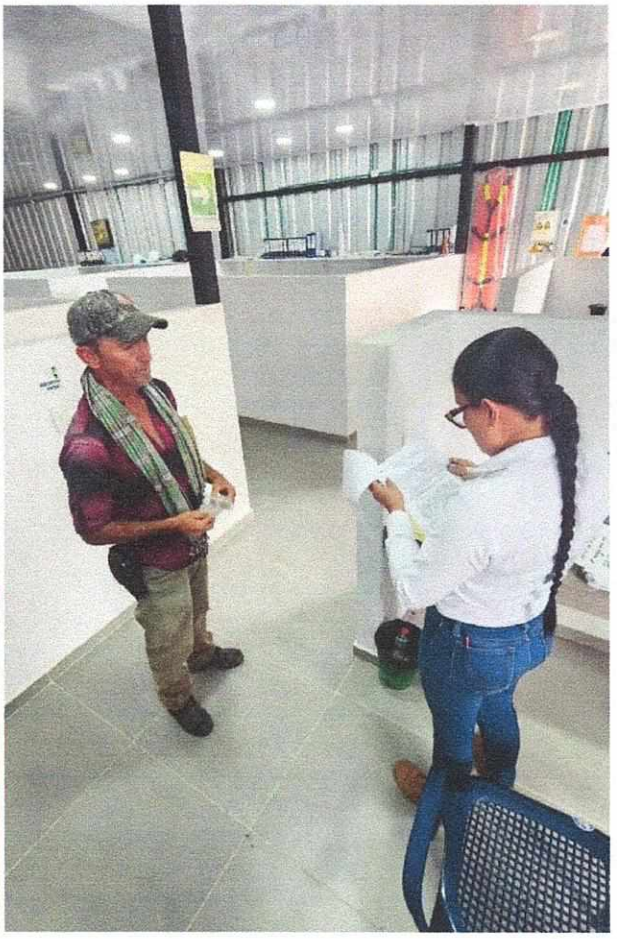




Fotografía 6 Cartelera informativa SAU






Fotografía 8 Instalación de punto móvil y apertura buzón

Vereda Santander

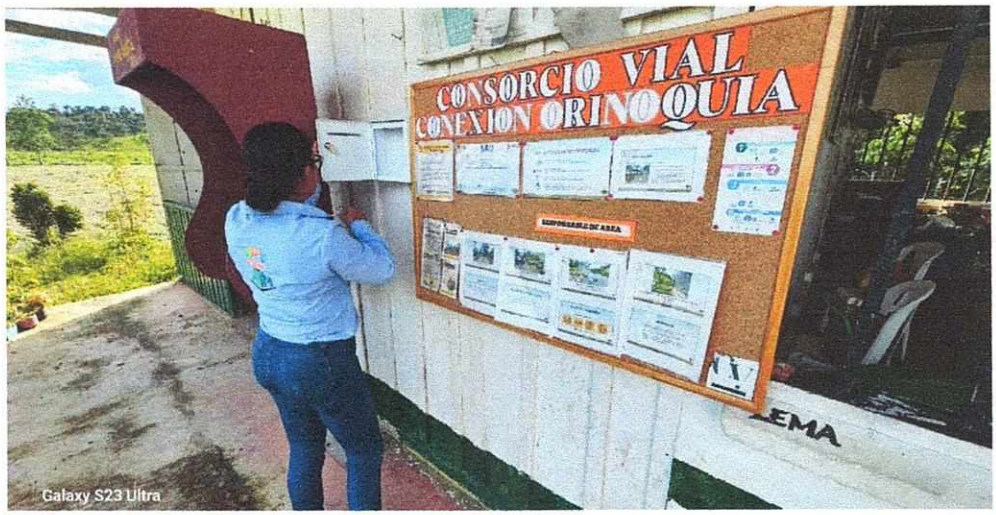



Vereda Yavia

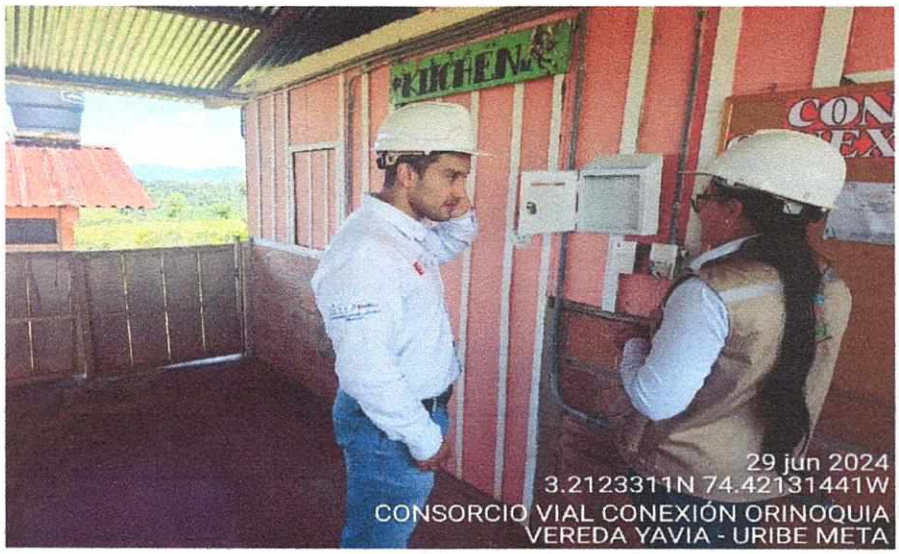



Vereda Papamene





Punto Atencion Alcaldia





Subprograma 10.2 Seguimiento y control a la información y divulgación.


Fotografía 9 Piezas divulgativas.













Subprograma 10.3 Seguimiento y control a la cultura vial y participación comunitaria.

Fotografía 10 Se realizo recorrido en la vereda Versalles para verificar señalización al ingreso de la escuela Versalles 4.06.2024



Fotografías 11 Participación actividad "Celebración dia de la familia en Yavia" donde se abordó actividad en seguridad vial y prevención de violencias. 8.06.2024



Fotografías 12 Actividad de seguridad vial con niños y niñas ciclistas y patinadores que usan parte del corredor vial para entrenar.12.06.2024



Fotografías 13 Se realizo taller en seguridad vial con niños y niñas patinadoras que entrenan en el corredor vial donde se entregó souvenir. 28.06.2024







Otras actividades.

Fotografías 14 Se realiza recepción de hojas de vida, para la construcción del banco de hojas de vida.



Fotografía 15 Participación audiencia de NNAJ IE Rafael Uribe Uirbe 24.06.2024



Fotografías 16 presentación con la nueva docente de la escuela vereda Santander.






27920 270

	INFORME ACTA PARCIAL	
	PERIODO ACTA PARCIAL 1	

INFORME COMPONENTE AMBIENTAL

	INFORME MENSUAL DE COMPONENTE AMBIENTAL	
	Periodo abril de 2024	

INFORME MENSUAL DE GESTION AMBIENTAL CONTRATO No 779 DEL 2022

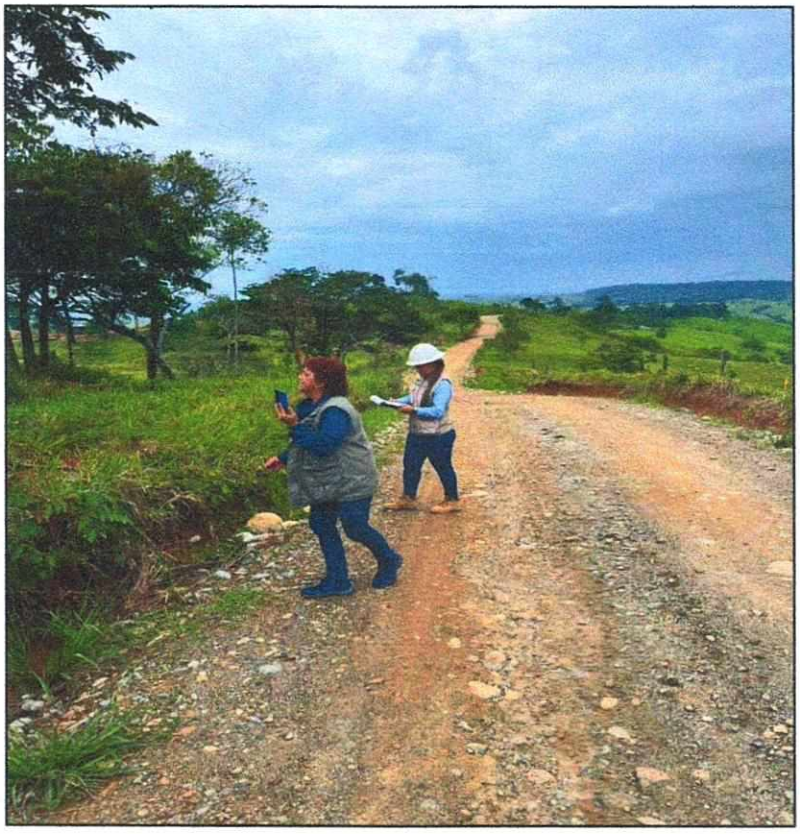

LA URIBE – META, abril 2024

	INFORME MENSUAL DE COMPONENTE AMBIENTAL Periodo abril de 2024	

INFORME MENSUAL No 10 - GESTION AMBIENTAL Y CUMPLIMIENTO AL PAGA - CONTRATO No. 779 DEL 2022

PERIODO: Del 1 al 30 de abril 2024

Documento:	**INFORME MENSUAL NO. 10**
Elaborado por:	Nombre: Erika Tatiana Méndez Ramos Ingeniera Ambiental
	Firma:
Revisado por:	Firma: Fernando Vera Barrera Director de Obra
Fecha:	Abril, 2024

Contenido

INTRODUCCIÓN 6

1. OBJETIVO 7

1.1 Objetivo general 7

2. LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO 7

3. GENERALIDADES CONTRACTUALES 8

3.1 Contrato de Obra 8

3.2 Contrato de Interventoría 9

4. CUMPLIMIENTO DE LOS PROGRAMAS DE ADAPTACION DE LA GUIA AMBIENTAL – PAGA GESTION AMBIENTAL 9

4.1 PROGRAMA 1. SEGUIMIENTO Y CONTROL A LA GESTION ADMINISTRATIVA 10

5.1.1 Subprograma 1.1: Conformación del grupo de gestión ambiental y social 10

5.1.2 Subprograma 1.2: Capacitación y concientización del personal de obra. 14

5.1.3 Subprograma 1.3: Cumplimiento de requerimientos legales. 18

4.2 PROGRAMA 2. ACTIVIDADES CONTRUCTIVAS 25

4.2.1 Subprograma 2.1: Manejo integral de materiales de construcción 25

4.2.2 Subprograma 2.3: Señalización para el manejo ambiental en frentes de obra y sitios temporales. 27

4.2.3 Subprograma 2.4: Manejo integral de residuos generados en las actividades de construcción y demolición (RCD) y lodos 31

4.2.4 Subprograma 2.5: Manejo integral de los residuos sólidos convencionales y especiales 35

4.3 PROGRAMA 3. GESTION HIDRICA Y ATMOSFERICA 40

4.3.1 Subprograma 3.1: Manejo de aguas superficiales 40

4.3.2 Subprograma 3.2: Manejo de residuos líquidos, domésticos e industriales 42

4.3.3 Subprograma 4.1: Manejo de descapote y cobertura vegetal 44

4.3.4 Subprograma 4.5: Protección de fauna en vías 51

4.4 PROGRAMA 5. MANEJO DE INSTALACIONES TEMPORALES DE MAQUINARIA Y EQUIPOS 52

4.4.1 Subprograma 5.1: Instalación, funcionamiento y desmantelamiento de campamentos y sitios de acopio temporal 52

4.4.2 Subprograma 5.3: Manejo de maquinaria, equipos y vehículos 54

5. ATENCION A CORRESPONDENCIA AMBIENTAL 59

6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 61

Índice de Tablas

Tabla 1. Generalidades contrato de obra 8
Tabla 2. Generalidades contrato interventoría 9
Tabla 3. Programas y códigos del Adaptación a la guía ambiental – PAGA 10
Tabla 4. Análisis de indicadores DAGA-1.1-01 12
Tabla 5. Relación personal contractual de gestión socio ambiental 13
Tabla 6. Análisis de indicadores DAGA-1.2-02 15
Tabla 7. Relación de personal con inducción 16
Tabla 8. Charlas ambientales 17
Tabla 9. Capacitaciones ambientales 18
Tabla 10. Análisis de indicadores DAGA -1.3-03 20
Tabla 11. Relación de permisos ambientales 23
Tabla 12. Análisis indicadores PAC-2.1-04 25
Tabla 13. Análisis indicadores PAC-2.3-06 28
Tabla 14. Lista de chequeo Programa señalización 30
Tabla 15. Análisis indicadores PAC-2.4-07 33
Tabla 16. Análisis de indicadores PAC- 2.5-08 37
Tabla 17. Lista de chequeo de manejo de residuos 38
Tabla 18. Análisis de indicadores PGH-3.1-10 40
Tabla 19. Análisis de indicador PGH-3.2-11 43
Tabla 20. Análisis indicador PBSE-4.1-12 44
Tabla 21. Analisis de indicador PBSE-4.5-16 51
Tabla 22. Análisis de indicador PMIT -5.1-18 53
Tabla 23. Análisis de indicador PMIT -5.2-19 55
Tabla 24. Relación de maquinaria activa 57
Tabla 25. Promedio de análisis de cada programa 57
Tabla 26. Relación de correspondencia .....

INTRODUCCIÓN

La gobernación del Meta suscribió a través de la agencia de infraestructura del Meta el Contrato No. 779 del 2022 que tiene como objeto "Mejoramiento de los corredores viales para la conexión Pacifico Orinoquia – vía La Uribe -cruce Versalles – Papamene – Alto de las cruces en el municipio de la Uribe Departamento del Meta".

De acuerdo con los compromisos contractuales y teniendo en cuenta que el proyecto no requiere licencia ambiental, según las pautas y orientaciones establecidas por la agencia de infraestructura del Meta en los términos de referencia para este corredor vial. El CONSORCIO VIAL CONEXIÓN ORINOQUIA, se obliga al cumplimiento de las normas ambientales vigentes, al desarrollo de las buenas prácticas de ingeniería para la ejecución de las obras que respeten el entorno natural y social del área de influencia en el cual se desarrollan; para el efecto dará estricto cumplimiento al PAGA (Plan de Adaptación de la Guía de Manejo Ambiental Modo Carretero 2022- INVIAS).

La gestión ambiental en este proyecto desarrolla las acciones necesarias para preservar las condiciones ambientales con el fin de mitigar y compensar los impactos durante la ejecución del proyecto.

En desarrollo del contrato No. 779 del 2022 se realizó el presente informe cuyo alcance comprende el avance de obra del 01 al 30 de abril 2024. En el periodo se realizaron actividades de gestión ambiental como: Atención a observaciones de interventoría, radicación de documentos a CORMACARENA para nivelación de terreno en predio el paraíso, recibimiento visita de evaluación a los permisos de ocupación de cauce y aprovechamiento forestal, recolección de residuos, charlas y capacitación.

1. OBJETIVO

1.1 Objetivo general

Evidenciar el cumplimiento de las labores realizadas en el periodo correspondiente del 1 al 30 de abril 2024, en cuanto al componente Ambiental del contrato No. 779 de 2022, cuyo objeto es "Mejoramiento de los corredores viales para la conexión Pacifico Orinoquia – vía Uribe -cruce Versalles – Papamene – Alto las cruces en el municipio de la Uribe Departamento del Meta".

2. LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO

El municipio de Uribe se encuentra ubicado al occidente del Departamento en el pie de monte llanero a 222 Km de Villavicencio. Uribe es reconocido como uno de los pueblos más antiguos del Departamento junto con San Martin y San Juan de Arama. La población se remonta a 1886 y elevado a municipio en 1924. El territorio pertenece a su totalidad a la cuenca del rio Guayabero.

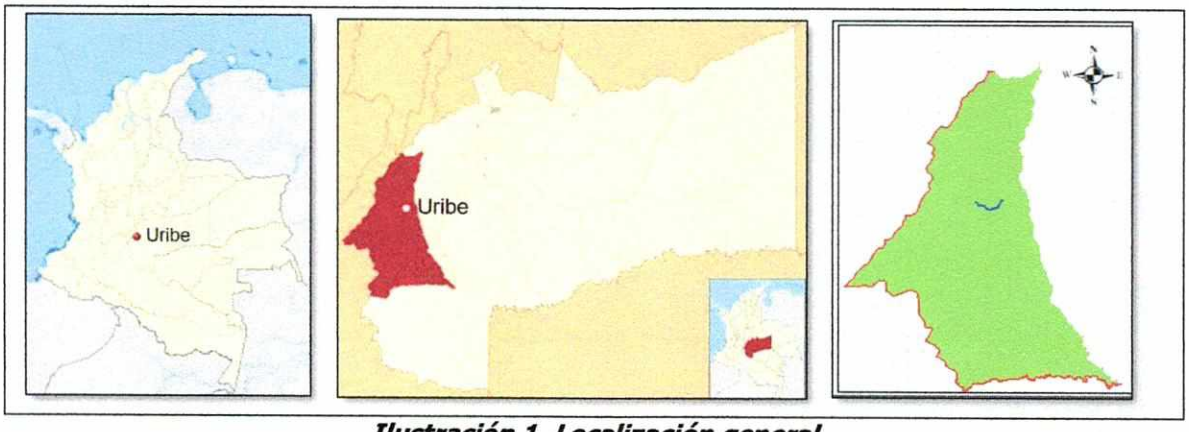


Ilustración 1. Localización general

La intervención de las obras de mejoramiento se plantea a lo largo del corredor vial existente entre El cruce Versalles hasta caserío Papamene el cual corresponde a una vía terciaria[1] del municipio de Uribe departamento del Meta. El tramo de carretera existente tiene una longitud de 16.97 km. La topografía de la zona en la primera parte, desde el cruce Versalles hasta el Km 11,64Km es montañosa y a partir de este

[1] Categoría de vía terciaría conforme el Mapa Vías Terciaras Municipio de Uribe-Meta, identificando la vía objeto de intervención temprana con el número 44 (YEE VERSALLES-YAVIA) y 41 (YAVIA-PAPAMENE). Ver anexo 2. Mapa vías terciarias Municipio de Uribe-Meta.

punto hasta el caserío Papamene las condiciones topográficas cambian con características de un terreno escarpado en una longitud aproximada de 5,33 km.

En la imagen adjunta se puede observar la ubicación específica de la vía que será objeto del proyecto de mejoramiento vial.



Ilustración 2. Localización Específica Cruce Versalles – Papamente Uribe (Meta)

3. GENERALIDADES CONTRACTUALES

3.1 Contrato de Obra

No. De contrato	779 DEL 28 DE DICIEMBRE 2022
Contratista	CONSORCIO VIAL CONEXIÓN ORINOQUIA
Representante Legal	JUAN GONZALO ANGEL JIMENEZ
Entidad	AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
Objeto	"MEJORAMIENTO DE LOS CORREDORES VIALES PARA LA CONEXIÓN PACÍFICO – ORONIQUÍA – VÍA URIBE – CRUCE VERSALLES – PAPAMENE – ALTO LAS CRUCES EN EL MUNICIPIO DE LA URIBE DEPARTAMENTO DEL META"
Valor del contrato	($241.542.000. 090.oo)
Plazo del contrato	5 años – 72 meses
Fecha de inicio	19 de abril 2023
Fecha de terminación	30 de diciembre 2028

Tabla 1. Generalidades contrato de obra

3.2 Contrato de Interventoría

No. De contrato	1060 DE 2022
Contratista	CONSORCIO CONEXIÓN PACIFICO
Representante Legal	MAURICIO FERNANDO PRIETO SÁNCHEZ
Entidad	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVIAS
Objeto	INTERVENTORÍA PARA LA ATENCIÓN DE VÍAS REGIONALES, COLOMBIA - LA URIBE, CONEXIÓN PACÍFICO - ORINOQUIA. HUILA, META. CON OBRAS DE MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN Y CONSTRUCCIÓN, EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA COLOMBIA RURAL. LOTE 1.
Valor del contrato	($31.306.043.117)
Plazo del contrato	5 años – 72 meses
Fecha de inicio	20 febrero 2023
Fecha de terminación	30 de diciembre 2028

Tabla 2. Generalidades contrato interventoría

4. CUMPLIMIENTO DE LOS PROGRAMAS DE ADAPTACION DE LA GUIA AMBIENTAL – PAGA GESTION AMBIENTAL

La gestión socio ambiental se desarrolló según los requerimientos de obra, con el fin de prevenir, mitigar, reducir y/o compensar los impactos ambientales que se hubieran podido generar. Por lo cual el periodo que se reporta de ejecución de la gestión ambiental va desde el 01 al 30 de abril del 2024 de acuerdo con las medidas de manejo ambiental establecidas en el PAGA, descritos a continuación:

NOMBRES Y CÓDIGOS DE LOS PROGRAMAS DE LA GUÍA				
PROGRAMA		**SUBPROGRAMA**	**CÓDIGO**	**APLICA/NO APLICA**
1. Programa Seguimiento y control a la gestión administrativa y Cumplimiento de la normatividad ambiental	1.1	Conformación del grupo de gestión ambiental y social.	DAGA-1.1-01	Aplica
	1.2	Capacitación y concienciación del personal de obra.	DAGA-1.2-02	Aplica
	1.3	Cumplimiento requerimientos legales.	DAGA-1.3-03	Aplica
	2.1	Manejo integral de materiales de construcción.	PAC-2.1-04	Aplica

2. Programa Actividades constructivas	2.3	Señalización para el manejo ambiental en frentes de obra y sitios temporales.	PAC-2.3-06	Aplica
	2.4	Manejo integral de los residuos generados en las actividades de construcción y demolición (RCD) y lodos.	PAC-2.4-07	Aplica
	2.5	Manejo integral de residuos sólidos convencionales y especiales.	PAC-2.5-08	Aplica
3. Programa Gestión Hídrica y Atmosférica	3.1	Manejo de aguas superficiales.	PGH-3.1-10	Aplica
	3.2	Manejo de residuos líquidos, domésticos e industriales.	PGH-3.2-11	Aplica
4. Programa de Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos	4.1	Manejo del descapote y cobertura vegetal.	PBSE-4.1-12	Aplica
	4.5	Protección de la fauna en vías.	PBSE-4.5-16	Aplica
5.Programa Manejo de Instalaciones temporales de Maquinaria y Equipos	5.1	Instalación, funcionamiento y desmantelamiento de campamentos y sitios de acopio temporal.	PMIT-5.1-18	Aplica
	5.3	Manejo de maquinaria, equipos y vehículos.	PMIT-5.3-20	Aplica

Tabla 3. Programas y códigos del Adaptación a la guía ambiental – PAGA

4.1 PROGRAMA 1. SEGUIMIENTO Y CONTROL A LA GESTION ADMINISTRATIVA

5.1.1 Subprograma 1.1: Conformación del grupo de gestión ambiental y social

Este programa hace referencia a los lineamientos generales para la elaboración del Programa de Adaptación de la Guía Ambiental, aspectos legales y capacitaciones a realizarse dentro del proceso constructivo.

Indicador de seguimiento:

Programa	Indicadores	%	Total	Calificación durante el periodo	Sumatoria	Análisis de cumplimiento
Conformación del grupo de gestión ambiental y social.	Profesionales vinculados /Equipo mínimo requerido	**25%**	100%	**25%**	**95 %**	De acuerdo con el pliego de condiciones y el anexo técnico 1, el cual hace parte integral del contrato, a la fecha se cumple con el personal mínimo requerido.
	No de informes requeridos/No de informes con soportes presentados	**25%**		**25%**		Se hace entrega a interventoría el informe No 10 componente ambiental, para revisión y
