
CRISTIAN A. RENDÓN L.
Ingeniero Civil

CONSTRUCCIÓN, INTERVENTORÍA, CONSULTORÍA
Y GERENCIA DE PROYECTOS INMOBILIARIOS
Y OBRAS CIVILES

INFORME AMBIENTAL #2

MANEJO Y ALMACENAMIENTO DE MATERIALES

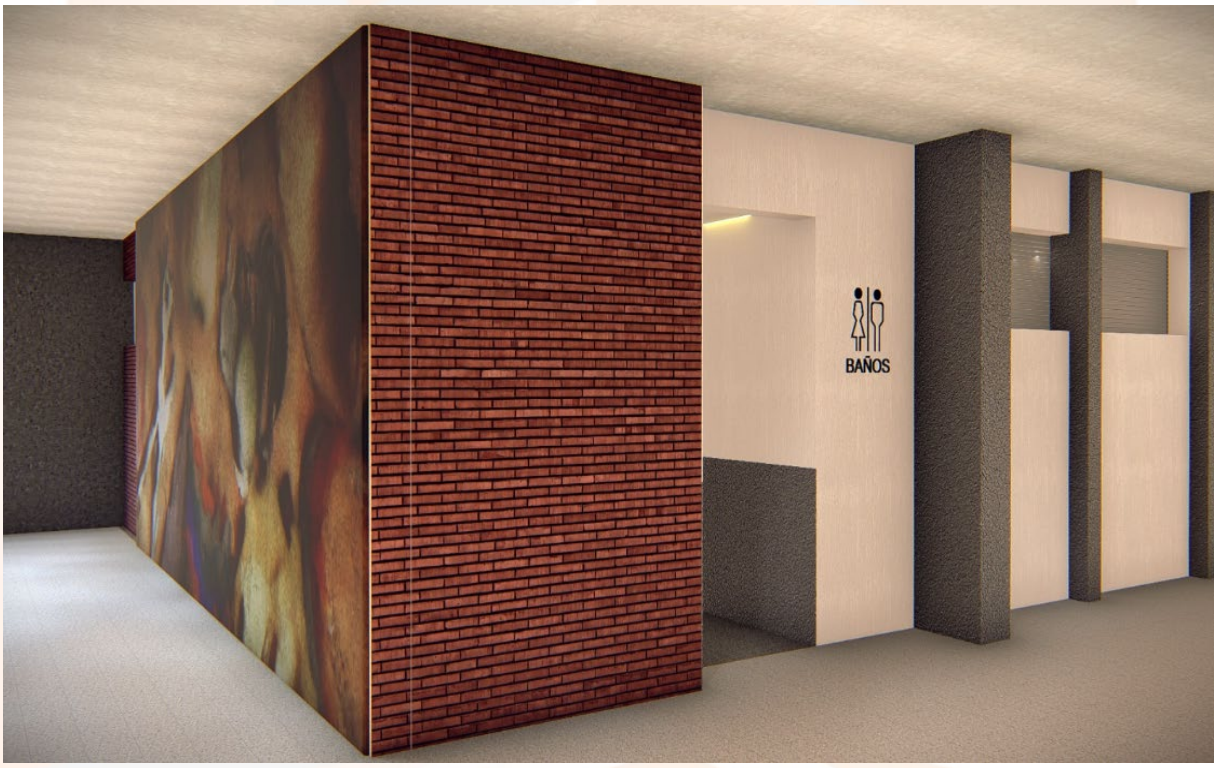

"5_9204_404 CONTRATAR MANTENIMIENTO DE UNIDADES SANITARIAS DEL CENTRO DE TECNOLOGÍA DE LA MANUFACTURA AVANZADA"

Teléfonos: 311 704 39 11 - 479 99 40
Carrera 61F No. 41 B 15 Vegas de La Calleja
Rionegro - Antioquia - Colombia
E-mail: cristianrendonl1978@gmail.com

"5_9204_404 CONTRATAR MANTENIMIENTO DE UNIDADES SANITARIAS DEL CENTRO DE TECNOLOGÍA DE LA MANUFACTURA AVANZADA"

INFORME AMBIENTAL N° 2.


MANEJO Y ALMACENAMIENTO DE MATERIALES

Desde el 09 de octubre hasta el 08 de noviembre de 2024

Supervisor:
VICTOR RAFAEL ATENSIA URUETA.

Contratista de obra:
CRISTIAN RENDON LOPERA

Realizó



ARINSON PALACIOS MORENO
Ing. Ambiental

NOVIEMBRE DE 2024

PROGRAMA USO Y ALMACENAMIENTO ADECUADO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN.

Las actividades que se realizaron durante el periodo comprendido entre el 09 de octubre y el 08 de noviembre son las siguientes:

- Todos los materiales pétreos y de cantera han sido suministrados por distribuidores que cuentan con los permisos ambientales requeridos por los entes de control.

- Se menciona que todos los materiales suministrados han sido depositados dentro del centro de acopio y/o bodega de almacenamiento adquirida durante la ejecución del proyecto. Y que en ningún momento han sido depositados en un sitio no indicado ni en vías públicas.

- Durante este periodo no se ha extraído material húmedo. Sin embargo, los vehículos utilizados para el cargue y transporte de RCD cuentan con contenedor en óptimas condiciones, con una estructura continua o que su contorno no contenga roturas ni abolladuras para evitar el escurrimiento de los materiales.

- Los vehículos transportadores (volquetas) cuentan con cubierta en carpa y/o lona resistente para evitar dispersión o emisiones de los materiales durante los recorridos.

- Como medida preventiva a emisiones fugitivas y escorrentías superficiales del material de playa acopiado en campo, se cubren completamente con plástico.

- El cemento que se encuentra en obra es acopiado sobre estivas de madera y cubierto con plástico.

- Cabe mencionar que se ha realizado un control de recibo y estado de suministros para posteriormente hacer el debido almacenamiento de los diferentes materiales usados para la obra civil.

- Se cuenta con un cerramiento perimetral de la zona de acopio de materiales

Teléfonos: 311 704 39 11 - 479 99 40
Carrera 61F No. 41 B 15 Vegas de La Calleja
Rionegro - Antioquia - Colombia
E-mail: cristianrendonl1978@gmail.com



Foto: Acopio de material de cantera



Foto: Acopio de cemento



Foto: Acopio de material de cantera



Foto: Acopio de material de cantera



Foto: Acopio de bloque

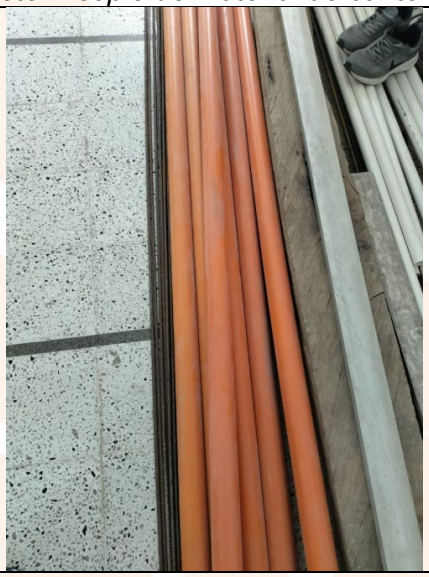


Foto: Acopio de tubería

Teléfonos: 311 704 39 11 - 479 99 40
Carrera 61F No. 41 B 15 Vegas de La Calleja
Rionegro - Antioquia - Colombia
E-mail: cristianrendonl1978@gmail.com

CRISTIAN A. RENDÓN L.
Ingeniero Civil

CONSTRUCCIÓN, INTERVENTORÍA, CONSULTORÍA
Y GERENCIA DE PROYECTOS INMOBILIARIOS
Y OBRAS CIVILES

Teléfonos: 311 704 39 11 - 479 99 40
Carrera 61F No. 41 B 15 Vegas de La Calleja
Rionegro - Antioquia - Colombia
E-mail: cristianrendonl1978@gmail.com
