24-07/24 MIERCOLES.

DIA SOLEADO

PERSONAL: 1 DIRECTOR, 1 RESIDENTE, 1 SST, 1 TS, 1 MAESTRO, 7 AUXILIARES

EQUIPO MEZCLADORA / HERRAMIENTA MENOR.

ACTIVIDAD: SE CONTINUA LA EXCAVACION Y SE TERMINA DE ENCOFRAR COSTADO CARRERA 28 SE FUNDE VIGA 30x30 Y SE APLICA ANTISOL & INSTALACION DE VARILLAS PARA DOVELA. INGRESA MAMPOSTERO Y SE INICIA CON ACTIVIDAD DE MURO ABUJARDADO PARA CERRAMIENTO / SE CONTINUA CON CORTE Y FIGURADO DE ACERO PARA VIGA 30x30. [illegible] RESIDENTE

[illegible] TECNARSA.

25-07/24. JUEVES


DIA SOLEADO

PERSONAL: 1 DIRECTOR, 1 RESIDENTE, 1 SST, 1TS., 3 OFICIALES 7. AUXILIARES

EQUIPO: MEZCLADORA / HERRAMIENTA MENOR.

ACTIVIDAD: SE CONTINUA CON MAMPOSTERIA. LLEGA OTRO OPICIAL. PARA ESTA LABOR. / SE REALIZA EXCAVACIÓN ENCOFRADO Y AMARRE DE ACERO. / LLEGA BOBCAT. PARA REALIZAR CORTE DE VIGA Y ACCESO PEATONAL AL PUENTE SOBRE CANAL.

TECNARSA

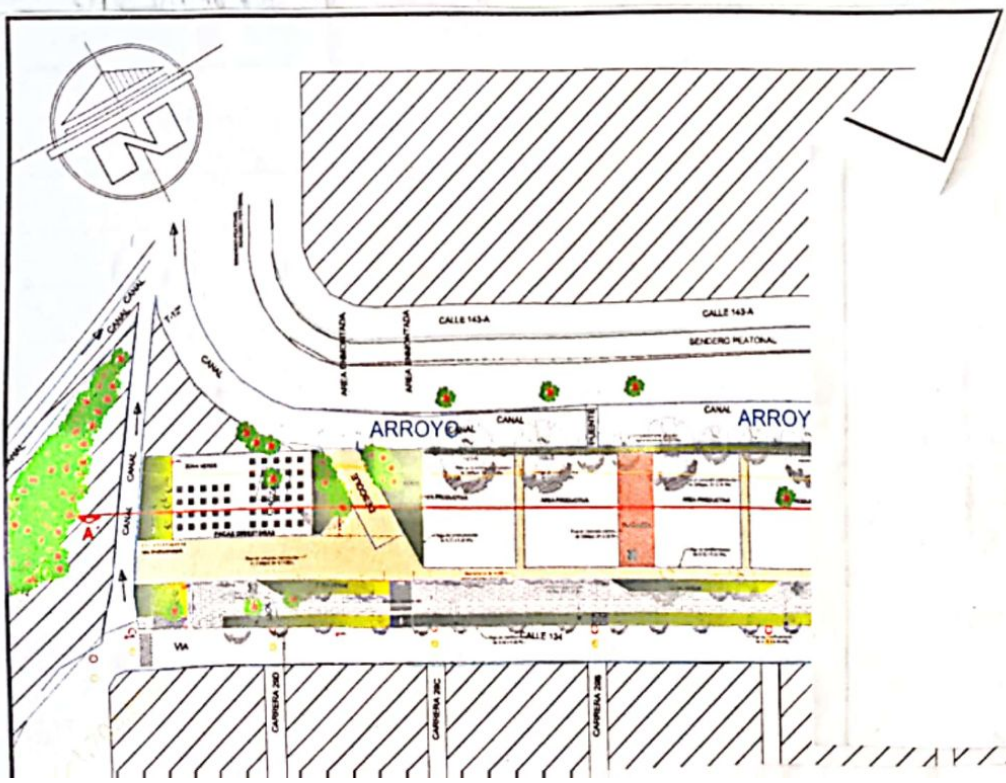


26-07/24 VIERNES

DIA NUBLADO

PERSONAL 1 DIRECTOR, 1 RESIDENTE, 1 SST, 1 TS, 1 MAESTRO, 2 OFICIALES, 7 AUXILIARES, 1 OPERARIO MAQUINA

EQUIPO BOB CAT, 1 MEZCLADORA A GASOLINA, 1 MEZCLADORA ELECTRICA HERRAMIENTA MENOR.

ACTIVIDAD SE ENCOFRA Y SE HACE FORMALETA, FIGUEADO Y AMARRE DE VIGA SE REALIZA EXCAVACIÓN 25 ML EN DOS ESCALAS

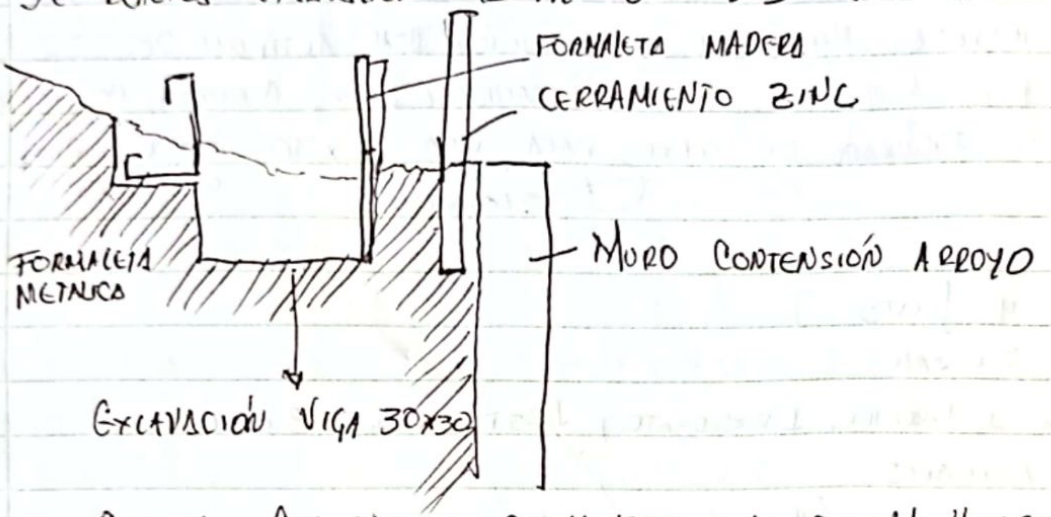

SE CONTINUA CON MODULOS DE MAMPOSTERIA DE 4 HILADAS 84 CMS DE ALTURA EN PROMEDIO X 2,30 MTS DE LARGOS VAN 24 MODULOS / SE CONTINUO CON CORTE CON MAQUINA BOB CAT ACCESO VEHICULAR PARA DESCOLE ARROYO Y ACCESO PEATONAL PARA ACCESO (PEATONAL) AL PUENTE.

RESIDENTE

27-07/24 SABADO

DIA SOLEADO

PERSONAL 1 RESIDENTE, 1 SST, 1 TS, 1 MAESTRO, 2 OFICIALES (MAMPOSTEROS) 7 AUXILIARES

EQUIPO 2 MEZCLADORAS / HERRAMIENTA MENOR BOB CAT

SE REALIZA FUNDIDA DE VIGA 30x30 20 ML Y SE CONTINUA MAMPOSTERIA 5 MODULOS DE 230 x 84 CMS SE REALIZA ORDEN Y ASEO A LA OBRA PARA ADECUAR ESPACIOS DE TRABAJO SE REALIZA EXCAVACIÓN EN BOB CAT ACCESO PEATONAL A PUENTE.

RESIDENTE OBRA

28/07/24 DOMINGO DIA NO LABORAL.


29/07/24 LUNES

DIA SOLEADO


PERSONAL: 1 RESIDENTE, 2 OFICIALES (MAMPOSTEROS) 7 AUXILIARES.

EQUIPO 2 MEZCLADORAS, BOBCAT, HERRAMIENTA MENOR.

ACTIVIDAD SE CONTINUA CON MAMPOSTERIA, EXCAVACIÓN MANUAL, PARA VIGA EXCAVACIÓN MECANICA EN PASO PEATONAL A TUCANTE NUEVO CORTE Y FIGURADO DE ACERO. // RELLENO Y COMPACTACIÓN DE TERRENO CAPAS DE 10CM PARA CIMENTACIÓN ZONA ADMINISTRATIVA. ←

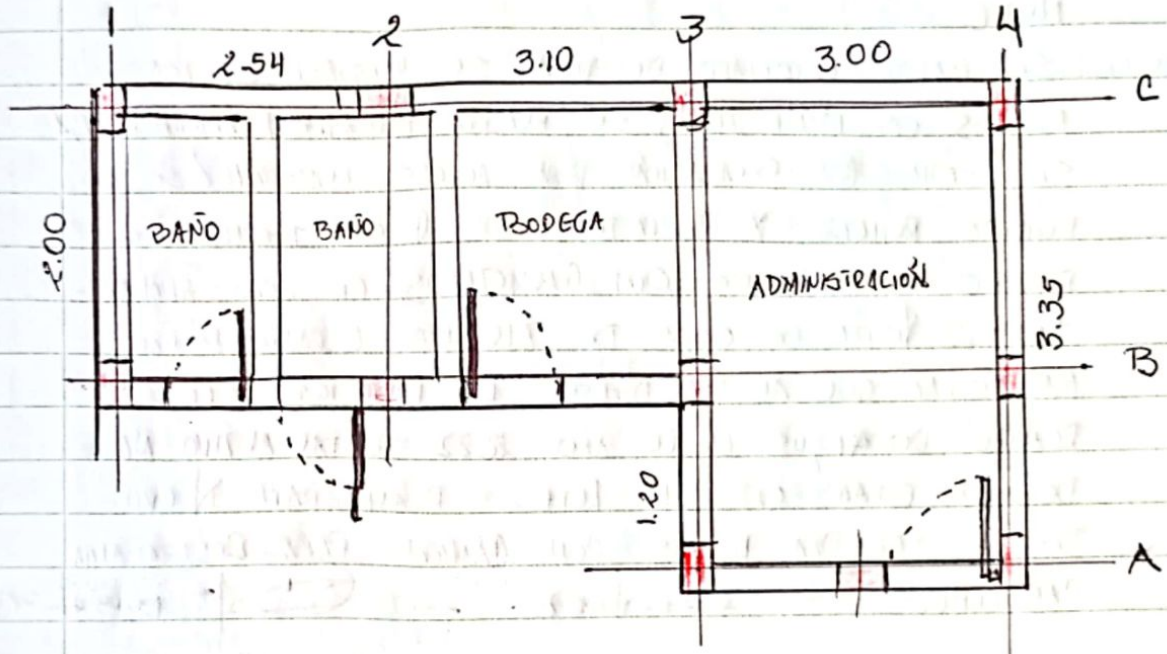

SE DEFINE CON INTERVENTORIA QUE EL MURO VA PAÑETADO POR LA CARA INTERNA E IMPERMEABILIZADO YA QUE VA EN CONTACTO DIRECTO CON EL TERRENO ←

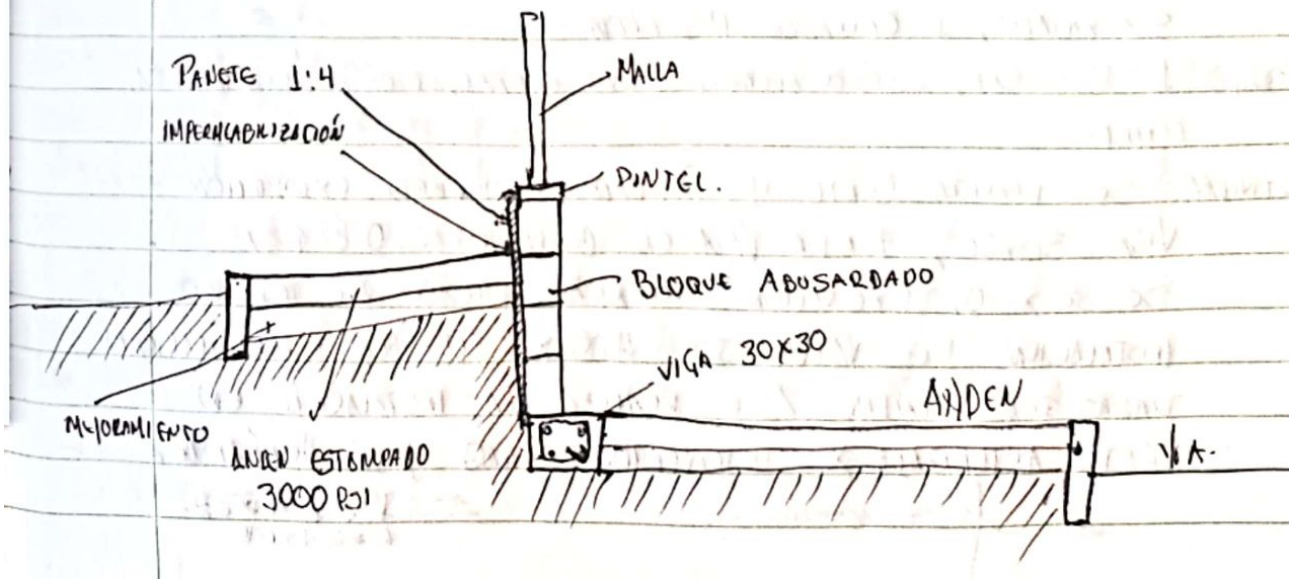

LLEGAN 1.000 BLOQUES A OBRA PARA TOTAL DE 2.000 UNIDADES / SE COMPLETAN 48 UNIDADES DE BLOQUE DE 2,30 x 0.84 = 1.932 x 48 92.73 M² DE BLOQUES EN TOTAL INSTALADOS 1.200 BLOQUES APROX. DIXNDEZ RESIDENTE. EDOBARSA.

30-07/24 MARTES

DIA SOLEADO

PERSONAL: 1 RESIDENTE, 1 TS, 1 SST, 1 MAESTRO, 2 MAMPOSTEROS, 8 AUXILIARES, 1 OPERADOR MAQUINARIA

EQUIPO BOBCAT, 2 MEZCLADORAS, RANA COMPACTACIÓN, HERRAMIENTA MENOR.

ACTIVIDAD: SE REALIZA ENCOFRADO DE VIGA., SE CONTINUA CON LOS MODULOS EN MAMPOSTERIA; SE REALIZA FIGURADO Y AMARRE DE VIGA SE CONTINUA CON EXCAVACIÓN PARA ACCESO PEATONAL / SE REALIZA RELLENO Y COMPACTACIÓN DE SUBRASANTE TERRENO CON RECEBO 2 CAPAS DE 10cm COMPACTADOS. EN ZONA ADMINISTRATIVA. VISITA DE OBRA DE ALCALDIA ESPACIO PÚBLICO MANIFIESTAN QUE AL SR. MANUEL DE INVASIÓN SE LE REALIZÓ DESALOJO EN EL AÑO 2022 POR TAL MOTIVO NO DEBERIA ESTAR EN EL LOTE, REALIZARAN NUEVO DESALOJO EL DIA JUEVES CON CAMION PARA DESPLAZAR CAMOUCHE. DIXNDEZ. EDOBARSA

31-07/24 MIERCOLES

DIA SOLEADO

PERSONAL 1 RESIDENTE, 1 TS, 1 SST, 2 MAESTRO, 2 MAMPOSTEROS. 8 AUXILIARES, 1 OPERADOR MAQUINARIA

EQUIPO 1 BOB CAT, 2 MEZCLADORAS, RANA COMPACTACIÓN, HERRAMIENTA MENOR.

ACTIVIDAD: SE REALIZA CORTE Y FIGURADO DE HIERRO, EXCAVACIÓN VIGA 30x30, FUNDIR VIGA EN CONCRETO 3.000 PSI DE 30x30, EXCAVACIÓN MECANICA Y CORTE DE TERRENO INSTALACIÓN DE VALLA DE 4.00 x 2.50 CON ESPECIFICACIONES DADAS POR ALCALDIA / SE REALIZA LA INSTALACIÓN EN PUNTO AUTORIZADO X INTERVENTORIA ARQ JOSÉ HERNANDEZ

EDOBARSA. DIXNDEZ RESIDENTE

1-08/2024. Jueves.
Día Soleado
Personal: 1 Residente, 1 TS, 1 SST, 1 maestro, 2 mamposteros, Auxiliares, 1 operador de maquinaria
Equipo: 1 Bobcat, 2 Mezcladoras, rana compactación, herramienta menor.
Actividad: Se realiza corte y figurado de hierro excavacion de viga 30x30, excavacion mecanica y corte de terreno profundidad 0.30 mts, pañete muro de cerramiento zona didactica infantil, excavacion mecanica zona plazoleta, Se realizó desalojo de cambuche por parte de personal de la alcaldia con apoyo de minicargador (Pedexco), se levanto acta de compromiso pedagogico No. 0812-2024, en horas de la tarde el Señor Manuel dueño del cambuche de invasión, en tono agresivo realizó reclamo al personal en oficina de obra argumentando tener perdidas de objetos personales durante el desalojo.-

Arq. Veronica Roman D.
Residente.

EDUVIAL SA.

2-08/2024 Viernes.
Día Soleado
Personal: 1 Residente, 1 TS, 1 SST, 1 maestro, 2 Mamposteros, (10) auxiliares, 1 operador de maquinaria.
Equipo: 1 bobcat, 2 Mezcladoras, rana de compactacion.
Actividad. Se realiza corte de terreno con minicargador prof. 0.20 en sendero junto al acceso vehicular, levante en bloque aparizado junto a canal zona noreste, pañete sobre muro cerramiento zona plazoleta, excavacion [manual]

Fundida de viga de cimiento junto a zona sendero plazoleta. (32,0 ml)

EDUBAR SA.

Verónica Romero
Residente.

3-08-2024/ Sabado
Dia Soleado.
Personal: 1 Residente, 1 TS, 1 SST, 1 maestro, 2 mamposteros, (10) auxiliares.,
Equipo: 2 Mezcladoras, rana de compactación.
Actividad: pañete sobre muro junto a arroyo zona noreste, riego y compactación de caliche para placa (zona para personas con movilidad reducida, figurado de hierro para refuerzo viga de cimentación, fundida de viga de 0.30 x 0.30 (21 ml), (zona de acceso vehicular).
El habitante de cambache ya desalojado por la Alcaldía continúa sin retirarse del predio.

EDUBAR SA.

Arq. Verónica Romero
227-35.394.

(5-08/2024)
Dia Soleado.
Personal: 1 Residente, 1 TS, 1 SST, 1 maestro, (2) mamposteros, (8) auxiliares.
Equipo: 2 (mezcladoras), rana de compactación
Actividad: Pañete 5 modulos de 2.40 x 0.08. (Zona productiva), Excavacion de viga 30 x 30 compactacion de placa caliche. Se esta en espera de salida definitiva de habitante de Acopio.

EDUBAR SA

Arq. Verónica Romero

6 Agosto de 2024.
Día soleado.
Personal: 1 Residente, 1 SST, 1 TS, 1 maestro, 2 mamposteros (10) auxiliares,
Equipo: 2 Mezcladoras, rana de compactación levante de muro zona productiva junto a arroyo, excavación viga 30x30, panete motolo 2.40x068, desmonte lamina de zinc para iniciar levante, trazado y nivelación de vigas de cimentación (ofic. admon).
Arq. Veronica Roman 22735394.

7 Agosto de 2024 (Día Festivo)
Día con lluvia en horas de la mañana.
Personal: 1 Residente, 1 SST, 1 TS, 1 maestro, 2 mamposteros, 10 (auxiliares). Equipo: 2 Mezcladoras, Rana de compactación, Figurado acero de refuerzo, excavación viga 30x30, se realiza encofrado de viga de cimentación zona plazoleta.

8 Agosto de 2024.
Día Soleado. Personal: 1 Residente, 1 SST, 1 TS, 1 maestro, 2 mamposteros 9 auxiliares; Equipo: 2 mezcladoras, Rana compactación. Actividad: excavación y fundida de viga cimentacion (22 ml.), se está realizando armado de vigas y figurado de columnas (zona admon).
Arq. Veronica Roman 22735.394.

9 de Agosto de 2024
Dia Soleado
Personal: 1 Residente, 1 SST, 1 TS, 1 maestro, 2 mamposteros, (9) auxiliares.
Equipo: 2 mezcladoras, rana de compactacion, nivelacion y armado de hierro de refuerzo para vigas de cimentacion y columnas (zona oficinas administrativa).
Fundida viga de cimentacion 0.30 x 0.30 zona de plazoleta, se pide a funcionarios de la alcaldía los detalles estructurales y de diseño (ofic. admon).

Powered by CamScanner

Continúa presencia de familiares y allegados al señor Manuel quien tomo posesión de un area del parque, (cambiadie), tiene objetos personales en un morrocito de basura.

10 Agosto (Sabado)
No se laboró este día. Debido a que se laboró miercoles festivo.

Arq. Veronica Roman D.
residente de Obra.
0933594.

11 Agosto (Domingo)

12 Agosto (Lunes).
Se solicita entregar al personal uniformes, ya que se evidencia parte de ellos sin su parte, además mantener en obra Stop de EPP para reposición de esto.
Por otra parte se evidencia acopios de sobrantes de excavación, estos deben ser dispuestos en el sitio autorizado y enviar los remisiones de los mismos y sus respectivos certificaciones.

EDUBARSA

Sandra Martinez.
SST EDUBARSA.

Día Soleado.
Personal: 1 Residente, 1 SST, 1 TS, 1 maestro, 2 mamposteros, (9) auxiliar,
Equipo: 2 mezcladoras, rana de compactación
Actividad: Se realiza nivelación con primera hilada de bloques en muro escalonado (bloque a bozar dado), excavación de viga de 0.30 x 0.30 en zona de descole junto a canal, el día de hoy se realizo un comite de seguimiento en la Alcaldía de Blanquilla en el que se expusieron requerimientos para el avance de la obra tales como: detalles constructivos y estructurales zona administración), acceso a canal de arroyo

debido a que en planos no se especifica si el cerramiento es en levante de muro o si se instalará alguna reja en esta zona, diseño de motobomba para estos 3 tanques de almacenamiento en zona de área productiva pues el tamaño y la distancia a recorrer por la tubería de abastecimiento es muy extenso.

EDUBAR

Arq. Verónica Romero
Residente de Obra.
22735394.

13 de Agosto—
Día soleado.
Personal: 1 Residente, 1 SST, 1 TS, 1 maestro, 2 mamposteros, (a) auxiliares.
Equipo: 2 mezcladoras, rana de compactación
Actividad: Se realiza excavación de viga de cimentación de 0.30 x 0.30 junto a canal (zona de descole), levante en bloque abozardado en zona de plazoleta), se realiza comité de seguimiento en oficinas de EDUBAR en la que se informa acerca de la utilización del material de acopios para relleno y nivelación de excavaciones, REDEXCO se compromete a entregar matriz de impacto social.


EDUBAR.

Arq. Verónica Romero
residente de obra
22735394.

14 de Agosto.
Día Soleado
Personal: 1 Residente, 1 SST, 1 TS, 1 maestro, 2 mamposteros, (a) auxiliares.
Equipo: 2 mezcladores, rana de compactación
Actividad: Se realiza excavación de viga de cimentación de 0.30 x 0.30 junto a canal (zona de descole), levante en bloque abozardado.

Powered by CamScanner

en zona de plazoleta, llegada a obra de 1000 bloques abozalados, se entrego dotacion al personal en obra.

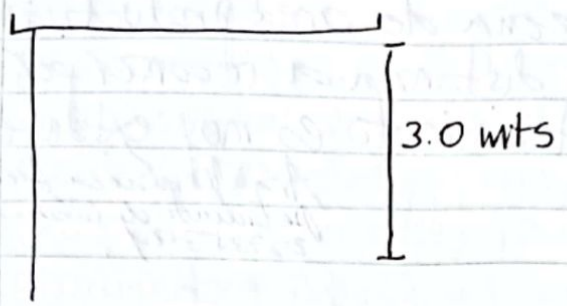

Se define con la interventoria y ADI la construccion de zona de estancia (zona dura 5.0 mL)., se define el acceso de encole segun detalle. Anden estampado con adoquin gris con cuine y topetes. (amarillo). ADI autoriza el desplazamiento del area administrativa dejando libre (2.50 ml).

Ing. EDESARSA.

ADI

Recibido.

Ninguna a.

15 de Agosto.
Dia soleado:
Personal: 1 Residente SST, 1 TS, 1 maestro, 2 mamposteros, 0 auxiliares.
Equipo: 2 mezcladoras, zona de compactacion
Actividad: Se realiza levante de muro en bloque abozalado (zona sendero area productiva junto a acceso desde); fundida de viga 0.30 x 0.30 paralelo a acceso a descole.

Arq. Veronica Romero
2235349.

16 de Agosto

En ocasión al accidente ocurrido el día de ayer 15de agosto, donde el trabajador Alexander Ospino Bello a pesar de contar con guante de seguridad tipo ingeniero, donde una lámina de zinc del cerramiento se cortó el tercer dedo de la mano derecho. Se solicito al contratista enviar los documentos correspondientes: FURAT (Formato único de accidente de trabajo) reporte oficial de las fechas, ATS de la actividad, inspección y entrega de EPP, además soporte de seguridad social.

Adicionalmente, deben cumplir con los requerimientos y obligaciones establecidas en la Resolución 1401 de 2007.

Sander Molina.
SST EDUBA S.A.

Dia Sabado.

Personal: 1 Residente, 1SST, 1TS, 1 maestro, 2 mamposteros, (8) auxiliares.

Equipo: 2 mezcladoras, vara de compactación,

Actividad: Secuencia levante de muro en bloque abozardado sendero cerca a deposito, fundida viga 0.30 x 030 sendero descole, el trabajador mencionado que fue lesionado por la lamina de zinc se encuentra siendo atendido por la ARL Sura en espera de cirugía de dedo.

Arq. Veronica Ramirez
22735396
Residente.

17 de Agosto.

Dia Sabado.

Personal 1 Residente, 1SST, 1TS, 1 maestro, 2 mamposteros, 8 auxiliares.

Equipo: 2 mezcladoras, vara de compactacion

Actividad: Se realiza levante en bloque alzardado sendero cerca a deacole, fundida de viga de amentacion borde de acceso a deacde.

Arq. Veronica Romero
27-35394

20 de Agosto.
Dia Soleado.
Personal: 1 Residente, 1SST, 1TS, 1 maestro, 2 mamposteros, 8 auxiliares.
Equipo: 2 mezcladores, rana de compactacion,
Actividad: Se realiza trazado de excavacion para bordillo jardineras y paradero de bus (2) adicionales, levante de muro de cerramiento en bloque alzardado. en zona de acceso a deacde, se esta en espera de llegada de formaleta y madera para amentacion (oficina administrativa).

Arq. Veronica Romero
27-35394

21 Agosto de 2024
Dia Soleado.
Personal: 1 Residente, 1SST, 1TS, 1 maestro, 2 mamposteros, 8 auxiliares.
Equipo: 2 mezcladoras, rana de compactacion,
Actividad: se realiza. Fundida bordillo 15x20 trazado y excavacion bordillo y area de paradero de buses.

Arq. Veronica Romero
27-35394

22 Agosto de 2024
Dia nublado
Personal: 1 Residente, 1SST, 1TS, 1 maestro, 2 mamposteros. 8 auxiliares.

Powered by CamScanner

LABORATORIO SEOTEC S.A.S.

ENSAYO DE RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE PROBETAS CILÍNDRICAS DE CONCRETO

NORMA I.N.V. E-410

EMPRESA SOLICITANTE:	UNION TEMPORAL PARQUES REDEXCO	ENSAYADO EN :
OBRA:	PARQUES HUERTAS URBNAS VILLAS DE SAN PABLO	LABORATORIO DE OBRAS
DESCRIPCION :	CONCRETO DE 3000 PSI	FECHA DE ENTREGA
		jul-24

REF	RESISTENCIA DISEÑO. PSI	DESCRIPCION	FECHA DE FUNDIDA	FECHA DE ENSAYO	EDAD DIAS	RESISTENCIA		
						KN	PSI	%
5	3000	VIGA	28/06/2024	05/07/2024	7	274,50	2259,14	75,3
6						283,10	2329,91	77,7
7				26/07/2024	28	399,10	3284,59	109,5
8						401,20	3301,88	110,1
9	3000	VIGA ARROYO	12/07/2024	19/07/2024	7	282,00	2320,86	77,4
10						280,10	2305,22	76,8
11				09/08/2024	28	400,00	3292,00	109,7
12						387,40	3188,30	106,3

Powered by CamScanner

Equipo: 2 mezcladoras, planta de computación.
Actividad: Se realiza excavación de bordillo de 15 x 20 (zona de sendero paradero de buses), parcheo sobre muro de cerramiento junto a zona de plazoleta y zona de acceso - descole, se realiza estudio de suelo con 9 muestras en zona de influencia de puente peatonal.





Laboratorio SEOTEC S.A.S.

ENSAYO DE

EMPRESA SOLICITANTE:	UNION TEMP
OBRA:	PARQUES HUERTAS URBA
DESCRIPCION :	

REF	RESISTENCIA DISEÑO. PSI	DESCRIPCIO
5		
6		
7		

Powered by CamScanner
