23-ABRIL 2024 MARTES

DIA: SOLEADO

PERSONAL: DIRECTOR DE OBRA

ACTIVIDAD: RECIBO FISICO DEL ESPACIO A INTERVENIR.



29 ABRIL: LUNES.

DIA: NUBLADO

PERSONAL: CUADRILLA TOPOGRAFICA

EQUIPO: ESTACIÓN TOPOGRAFICA, ESTACAS HERRAMIENTA MENOR

ACTIVIDAD: SE REALIZA TOMA DE NIVELES Y TOPOGRAFIA DEL PARQUE. DESDE LA CALLE 143 CON CARRERA 8 HASTA LA CARRERA 10ª SE REALIZAN MEMORIAS DE CANTIDADES EN OFICINA Y SE REALIZA (AD) LISTADO DE DUDAS PARA HACER SOLICITUD. DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS..

CONSTRUCTORA CONCONCRETAR SA.







UBICACIÓN PUNTOS DELTA DE REFERENCIA EN ANDENES PARA TOMAR NIVELES

Powered by CamScanner

JUEVES 2 DE MAYO

DIA NUBLADO

PERSONAL: COMISIÓN TOPOGRÁFICA 1 OFICIAL 1 AYUDANTE

EQUIPO: ESTACIÓN TOPOGRÁFICA

ACTIVIDAD: SE REALIZA VERIFICACIÓN Y VISITA DE OBRA PARA TERMINAR LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO / SE CONTINUA EN OFICINA CON MEMORIAS DE CANTIDADES EN PLANOS. / SE REALIZA DOCUMENTACIÓN PARA SOCIALIZACIÓN DIA MARTES 7 DE MAYO EN EL SECTOR. CON VECINOS PARA ACTAS DE VECINDAD Y REUNIÓN LUNES 6 DE MAYO PARA SOCIALIZACIÓN Y PRESENTACIÓN PERSONAL A LA COMUNIDAD.

RESIDENTE OBRA

EDUARDO.

LUNES 6 DE MAYO

DIA SOLEADO

PERSONAL 1 DIRECTOR DE OBRA, 1 RESIDENTE OBRA, 1 COMUNICADORA SOCIAL 1 PROFESIONAL SST.

EQUIPO: N/A

ACTIVIDAD: REUNIÓN SOCIALIZACIÓN DE PROYECTO Y PRESENTACIÓN PERSONAL ADMINISTRATIVO DE OBRA. A LA COMUNIDAD.

RESIDENTE OBRA



EDUARDO.

MARTES 7 DE MAYO

DIA NUBLADO

PERSONAL 1 DIRECTOR, 1 RESIDENTE, 1 TRABAJADORA SOCIAL

EQUIPO: N/A

ACTIVIDAD: SE DESARROLLA VISITAS DE LAS CASAS O CONSTRUCCIONES AL FRENTE DE LA OBRA PARA REALIZAR ACTAS DE VECINDAD QUEDANDO PENDIENTE LA IGLESIA POR NO ENCONTRARSE NADIE EN ÉSTE DIA.

RESIDENTE OBRA

Powered by CamScanner






MIERCOLES 8 DE MAYO

DIA NUBLADO

PERSONAL 1 DIRECTOR 1 RESIDENTE DE OBRA

EQUIPO: N/A

ACTIVIDAD: SE REALIZA VISITA DE OBRA PARA ENTREVISTAR MAESTROS CONSTRUCTORES PARA CONTRATAR MANO DE OBRA CALIFICADA Y SE BUSCA UN PREDIO O CASA PARA OFICINA Y BODEGA.

EDUBAR SA. [illegible] RESIDENTE OBRA

JUEVES 9 DE MAYO


DIA LLUVIOSO

PERSONAL 1 RESIDENTE, 1 DIRECTOR DE OBRA


EQUIPO: N/A.


ACTIVIDAD: SE REALIZA VISITA O REUNIÓN PROGRAMADA EN LA ALCALDIA SEPTIMO PISO CON EDUBAR, SUPERVISOR, PARA TOCAR TEMAS RELACIONADOS AL PROYECTO

NIVEL ANDEN Y HUELLA

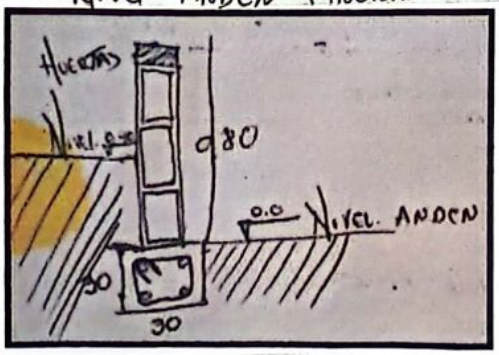


NIVEL BORDILLO

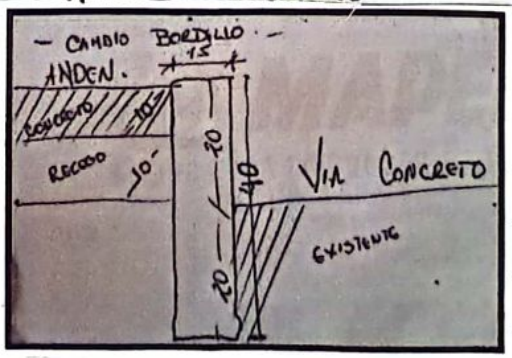

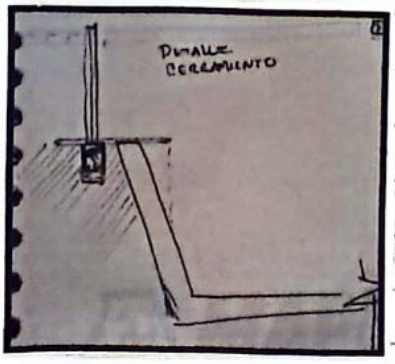
LOCALIZACION CERRAMIENTO A CANAL.

[illegible] RESIDENTE OBRA

EDUBAR SA.

13 MAYO LUNES FESTIVO

DIA SOLEADO

PERSONAL 1 RESIDENTE, 1 OPERARIO MINICARGADOR.

EQUIPO: BOBCAT.

ACTIVIDAD SE DA INICIO CON DESCAPOTE MECANICO Y LIMPIEZA DE BASURA ACTIVIDAD SE GENERA DE 7:00AM A 1:00 PM

RESIDENTE OBRA

EDUBAR SA.

14 MAYO MARTES.

DIA SOLEADO

PERSONAL: 1 RESIDENTE, 1 TRABAJADORA SOCIAL, 1 OPERADOR BOBCAT:, 1 [illegible]

EQUPO: BOBCAT.

ACTIVIDAD: SE CONTINUA CON DESCAPOTE CAPA VEGETAL Y LIMPIEZA DEL PREDIO SE TRABAJO 2:30 HORAS DE BOBCAT. Y SE RETIRA 4 VIAJES DE MATERIAL.

RESIDENTE OBRA

EDUBAR SA.





15 DE MAYO MIERCOLES

DIA NUBLADO

PERSONAL 1 RESIDENTE, 1 DIRECTOR, 1 PERSONA TRABAJADORA SOCIAL, 1 OPERARIO BOBCAT

EQUIPO BOBCAT.

ACTIVIDAD: SE REALIZA LIMPIEZA Y DESCAPOTE EN LA PARTE POSTERIOR DEL PREDIO SOBRE CALLE 29 / SE RECIBE VISITA POR PARTE DE EDUBAR ARQ. JOSÉ HERNÁNDEZ ACOMPAÑADO DE ING AMBIENTAL Y SST. TOMAN REGISTRO CON DRON Y REALIZAN RECOMENDACIONES AMBIENTALES Y SEGURIDAD DEJANDO COMO OBSERVACIÓN NO TALAR 2 ARBOLES REPRESENTATIVOS LOS DEMAS SON MALEZA QUE SE PUEDE LIMPIAR., LLUEVE DOS HORAS EN LA TARDE POR TAL MOTIVO NO SE PUEDE CONTINUAR CON LA ACTIVIDAD.

RESIDENTE OBRA

EDUBAR SA









Powered by CamScanner

16 MAYO JUEVES
DIA NUBLADO
PERSONAL 1 RESIDENTE, 1 TRABAJADORA SOCIAL, 1 OPERADOR BOBCAT
1 MAESTRO, 4 AUXILIARES.
EQUIPO: BOBCAT, HERRAMIENTA MENOR
ACTIVIDAD: SE INICIA CON EXCAVACIÓN MECANICA Y SE TERMINA DESCAPOTE SOBRE LA CALLE 143 B SOBRE FRANJA DE 12 MTS PARA PRIORIZAR EJECUCIÓN OBRA DE ANDEN.




17 MAYO VIERNES
DIA SOLEADO
PERSONAL 1 RESIDENTE, 1 TRABAJADORA SOCIAL, 1 OPERADOR BOBCAT.
1 MAESTRO, 4 AUXILIARES
EQUIPO BOBCAT Y HERRAMIENTA MENOR
ACTIVIDAD: SE CONTINUA EXCAVACIÓN EN FRENTE DE LA FERRETERIA Y SE CONTINUA CON LA INSTALACIÓN DE MADERA PARA ESTRUCTURA EN CERRAMIENTO COSTADO CANAL SE COMPLETA 80 M/L APROX.






18 MAYO SABADO
DIA SOLEADO
PERSONAL 1 RESIDENTE, 1 TRABAJADORA SOCIAL, 1 OPERADOR BOBCAT
1 MAESTRO, 4 AUXILIARES
EQUIPO BOBCAT, HERRAMIENTA MENOR.
ACTIVIDAD SE CONTINUA CON INSTALACIÓN ESTRUCTURA EN MADERA PARA CERRAMIENTO Y EXCAVACIÓN MECANICA PARA ANDEN. PROCESO SE REALIZA CORTE DE 0.40 CM DE PROFUNDIDAD

19 MAYO DOMINGO

DIA SOLEADO

PERSONAL 1 RESIDENTE, 1 TRABAJADORA SOCIAL, 1 OPERADOR MAQUINA

EQUIPO BOB CAT: HERRAMIENTA MENOR

ACTIVIDAD SE CONTINUA CON UNA EXCAVACIÓN DE APROXIMADAMENTE 150M² EN PROFUNDIDAD DE 0,20 MTS SE TRABAJA DE 7:00AM A 3:00PM EN JORNADA CONTINUA.

RESIDENTE OBRA

20 MAYO LUNES

DIA SOLEADO


PERSONAL 1 RESIDENTE 1 TRABAJADORA SOCIAL, 1 OPERADOR MAQUINA 1 OFICIAL 4 AUXIL.

EQUIPO BOB CAT. - VOLQUETAS - HERRAMIENTA MENOR

ACTIVIDAD /SE REALIZA RETIRO DE 20 VIAJES DE VOLQUETAS 160 M3 APROX DE MATERIAL / SE CONTINUA APERTURA DE HUECOS, INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA MADERA PARA CERRAMIENTO E INSTALACIÓN DE TEJA ZINC. PODA DE ARBOLES NO MADERABLES Y NO REPRESENTATIVOS (MALEZA).

RESIDENTE OBRA

21 MAYO MARTES



DIA LLUVIOSO

PERSONAL 1 RESIDENTE 1 TRABAJADORA SOCIAL, 1 OPERADOR MAQUINARIA BOBCAT 1 OFICIAL 4 AUXILIARES

EQUIPO BOB CAT. - HERRAMIENTA MENOR

ACTIVIDAD: CONTINUA LA EXCAVACIÓN Y NIVELACIÓN MECANICA 30 M3 PARA TOTAL DE 390 M3 DE EXCAVACIÓN. INSTALACIÓN DE MADERA PARA CERRAMIENTO 286 ML. / INSTALACIÓN DE LAMINA DE ZINC. 253 ML. Y PODA DE MALEZA RAMAS Y LIMPIEZA DE BASURA / SE REALIZA TRABAJO EN CONJUNTO CON CLARO PARA TOMAR NIVELES Y TAPAR TUBERIA EXPUESTA POR EXCAVACIÓN SIN NINGÚN CONTRATIEMPO

RESIDENTE DE OBRA

Powered by CamScanner

los M3 indiquen el Volumen de Descapote (e=0.25).






22 DE MAYO MIERCOLES

DIA LLUVIOSO

PERSONAL: 1 RESIDENTE · 1 TRABAJADORA SOCIAL · 1 OPERADOR BOBCAT, 1 TRABAJADORA SST, 1 OFICIAL, 4 AUXILIARES

EQUIPO: BOB-CAT HERRAMIENTA MENOR

ACTIVIDAD: SE CONTINUA EXCAVACIÓN MECANICA SEGUNDA CAPA 20cm ENTRE LA CABRERA 28D-28C. TOTAL 28 M3 APROX. / COLOCACIÓN ARMADO ESTRUCTURA MADERA PARA CERRAMIENTO E INSTALACIÓN TEJA DE ZINC TOTAL 286.39 ML / SE REALIZA ACTIVIDAD EN CONJUNTO CON LA EMPRESA CLARO PARA CAMBIO DE TUBERIA Y EXCAVACIÓN PARA ENTERRAR TUBERIA EXPUESTA. SE LES INFORMA QUE EL NIVEL DEL ANDEN ESTA SOBRE LA VIA A 20CM Y ELLOS TIENEN CAJA DE INSPECCIÓN SOBRE 50cm SOBRE SALE DEL NIVEL DEL ANDEN., MANIFIESTA QUE SE DEBE PASAR SOLICITUD PARA MODIFICAR NIVEL DE CAJA EXISTENTE. X TAL MOTIVO SE SOCIALIZARA CON INTERVENTORIA PARA NO TENER INCONVENIENTES EN EJECUCIÓN DEL CONTRATO. EDWIN PEREZ RESIDENTE — EQUIVIAL SA.

23 DE MAYO JUEVES

DIA SOLEADO

PERSONAL 1 RESIDENTE, 1 TRABAJADORA SOCIAL, 1 OPERADOR BOBCAT, 1 MAESTRO, 4 AUXILIARES DE OBRA

EQUIPO: 1 BOBCAT, HERRAMIENTA MENOR

ACTIVIDAD: RETIRO DE MATERIAL DE EXCAVACIÓN 33 VIAJES DE 8M3 CONTINUACIÓN EXCAVACION Y NIVELACIÓN CON MAQUINARIA h= 60 CMS CONSTRUCCIÓN DE CAMPAMENTO PROVICIONAL PARA FIGURAR ACERO EN OBRA, SE CONTINUA CON PODA DE VEGETACIÓN PARA CONTINUAR LIMPIEZA DEL PREDIO / EDWIN PEREZ RESIDENTE OBRA — EQUIVIAL SA

Powered by CamScanner

24 MAYO VIERNES



DIA SOLEADO

PERSONAL: 1 RESIDENTE, 1 SEGURIDAD SST, 1 TRABAJADORA SOCIAL, 1 OPERADOR BOBCAT, 1 MAESTRO, 4 AUXILIARES)

EQUIPO: 2 BOBCAT. HERRAMIENTA MENOR

ACTIVIDAD: SE CONTINUA CON LA EXCAVACIÓN PARA DAR NIVEL CON LA VIA Y SE REALIZA RETIRO DE MATERIAL EXCAVACIÓN SE ENCUENTRA CAJA DE INSPECCIÓN PARA AGUA POTABLE SE REALIZARA CERRAMIENTO PARA QUE LA CAJA QUED POR DENTRO DEL CERRAMIENTO DEMOLICIÓN DE BORDILLO ENTERRADO.

RESIDENTE OBRA

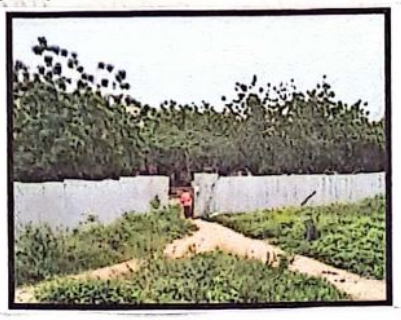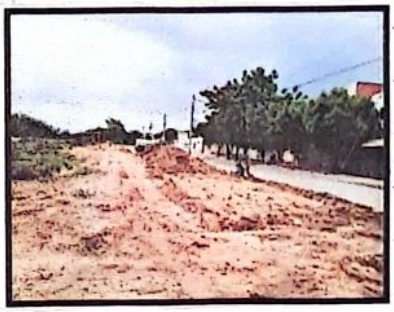25 MAYO SABADO

DIA SOLEADO

PERSONAL: 1 RESIDENTE, 1 TRABAJADORA SOCIAL, 1 MAESTRO, 2 OPERARIOS MAQUINARIA BOBCAT, 1 MAESTRO 4 AUXILIARES

EQUIPO 2 BOB CAT. HERRAMIENTA MENOR

ACTIVIDAD: CONTINUA DEMOLICIÓN DE BORDILLO Y EXCAVACIÓN DE TIERRA CON MAQUINA SE EVIDENCIA QUE NO HAY TUBERIA QUE AFECTE POR TAL MOTIVO SE CONTINUA EXCAVACIÓN CON LOS NIVELES ACORDADOS. SE TRABAJA HASTA LAS 3:00 PM.

RESIDENTE OBRA






Powered by CamScanner

27 MAYO LUNES

DIA SOLEADO

PERSONAL: 1 RESIDENTE 1 DIRECTOR - 1 TRABAJADORA SOCIAL, 2 OPERADORES BOBCAT. 1 MAESTRO 4 AUXILIARES

EQUIPO 2 BOBCAT. / HERRAMIENTA MENOR

ACTIVIDAD. SE CONTINUA CON EXCAVACIÓN MECANICA Y SE ENCUENTRA PLACA EN CONCRETO DE 3.10 X 3.00 X 0,15 SE TOMAN MEDIDAS CON INTERVENTORIA ARQ JOSE HERNÁNDEZ Y ARQ EILIN Y AUTORIZAN DEMOLICIÓN Y QUE EN MEMORIAS SE UBIQUE. TODAS LAS DEMOLICIONES DE PLACAS EXISTENTES EN OBRA. / SE INICIA EXCAVACIÓN MANUAL. AL INICIO DE OBRA ANCHO 15 cm Y PRO FUNDIDAD DE 20 CM. PARA CONFORMACIÓN DE BORDILLO SE LE INFORMA A INTERVENTORIA SOBRE EL LUGAR DE INVASIÓN MANIFIESTO QUE EN EL COMITE DE MAÑANA TOCAMOS EL TEMA PARA DAR SOLUCIÓN. / LLEGA CANECA DE ANTISOL ROJO PARA PROTECCION DEL CONCRETO. / SE INICIA CORTE Y FIGURACION DE FLEJES PARA BORDILLO

RESIDENTE OBRA — [illegible] EDIFICAR SA.

28 MAYO MARTES

DIA SOLEADO

PERSONAL. 1 RESIDENTE, 1 DIRECTOR, 1 TRABAJADORA SOCIAL, 2 OPERADORES BOBCAT; 1 MAESTRO, 4 OFICIALES.

EQUIPO: 2 BOBCAT, HERRAMIENTA MENOR.

ACTIVIDAD: SE CONTINUA NIVELACIÓN Y DESCAPOTE SE HACE CORTE CAPA VEGETAL. Y SE REALIZA ACOPIO DE RAMAS Y PASTO SE REALIZA CORTE DE VARILLA Y SE FIGURA HIERRO Y ARMADO DE VIGA PARA BORDILLO / VISITA DE OBRA POR PARTE DE INTERVENTORIA SE EVIDENCIA LA CANTIDAD DE MATERIAL QUE NO SE PUEDE CUANTIFICAR X EXCAVACIÓN PARA REALIZAR LA CUBICACIÓN SE REALIZARA POR VIAJES RETIRADOS DE 8 M3. / SE REALIZA EXCAVACIÓN MANUAL PARA BORDILLO / DEMOLICIÓN DE BORDILLO EXISTENTE.

RESIDENTE OBRA — [illegible] EDIFICAR SA.

Powered by CamScanner

29 MAYO MIERCOLES.


DIA SOLEADO

PERSONAL 1 DIRECTOR, 1 RESIDENTE 1 TRABAJADORA SOCIAL, 1 MAESTRO, 4 AUXILIARES 2 OPERADORES BOBCAT.

HERRAMIENTA: 2 BOBCAT HERRAMIENTA MENOR

ACTIVIDAD: SE CONTINUA CON DESCAPOTE Y NIVELACIÓN PARTE HUERTAS.
SE RECIBE VISITA DE OBRA DE LA ALCALDIA LA ARQ CATALINA Y LA ING ELLIN ~~TATES~~ DE INTERVENTORIA EDUCAR.
SE TOCAN TENAS DE INVASIÓN POR 2 FAMILIAS EN EL PREDIO
CAJAS DE TIGO-CLARO PARA BAJAR NIVEL
DISEÑO DE PUENTE / PODA ARBUSTOS Y MALEZA PARA RETIRO
DISEÑO DE CANAL DE ESCORRENTIA / ROCAMIX / DETALLE SUELO O PLACA DE TANQUES TENAS QUE NOS DARAN RESPUESTA LA PROXIMA SEMANA.

~~EDWARDO~~
RESIDENTE OBRA

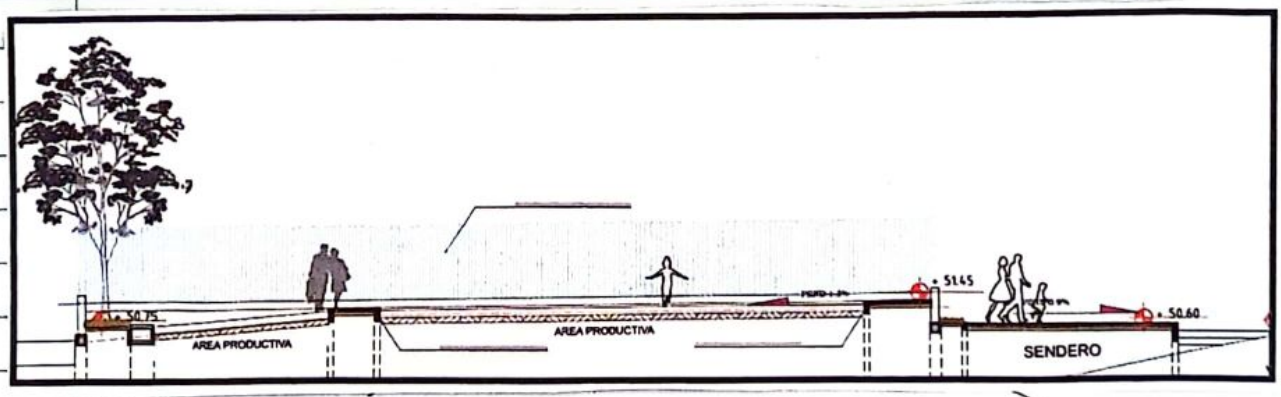


30 MAYO JUEVES

DIA NUBLADO


PERSONAL: 1 DIRECTOR OBRA, 1 RESIDENTE, 1 TRABAJADORA SOCIAL, 2 OPERADORES BOBCAT, 1 MAESTRO, 4 AUXILIARES

EQUIPO 2 MINICARGADOR BOBCAT / HERRAMIENTA MENOR

ACTIVIDAD SE CONTINUA NIVELACIÓN PARA ESPACIO HUERTA SECCIÓN 18 mts X LO ANCHO DEL LOTE. SE RETIRA ARENA PERTENECIENTE A LA FERRETERIA / SE REALIZA AMARRE Y FIGURADO DE VARILLA DE 1/4" / SE PASAN NIVELES PARA TENER CONTROLADO EL CORTE CON LA MAQUINA Y SE CONTINUA CON EXCAVACIÓN

Powered by CamScanner

MANUAL PARA BORDILLO TOTAL 120ML. DE 20 CM DE PROFUNDIDAD X 15 DE ANCHO

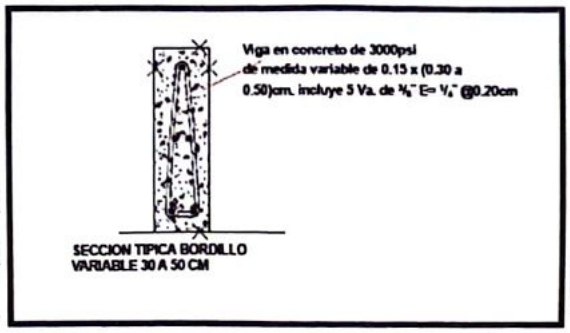


31-05-24 VIERNES

DIA LLUVIOSO

PERSONAL 1 RESIDENTE, 1 DIRECTOR, 1 TRABAJADORA SOCIAL., 2 OPERARIOS BOBCAT., 1 MAESTRO, 4 AUXILIARES

EQUIPO: 2 BOBCAT / HERRAMIENTA (MAYOR) MENOR.

ACTIVIDAD S= REALIZA ARREGLO DE ARBOLES EXISTENTES X PODA EVITAR CAIDA POR DISMINUCIÓN DE TIERRA EN RAICES / SE CONTINUA CORTE TERRENO 9,10 MTS X 20 = 182,0 M² / FIGURADO Y AMARRE PARA BORDILLO / EXCAVACIÓN MANUAL PARA BORDILLO 18ML. LA LLUVIA NO DEJÓ AVANZAR ACTIVIDADES PLANEADAS.

01-06-24 SABADO

DIA SOLEADO

PERSONAL 1 RESIDENTE, 1 TRABAJADORA SOCIAL, 2 OPERADORES MAQUINA, 1 MAESTRO, 4 AUXILIARES DE OBRA

EQUIPO: 2 BOBCAT; HERRAMIENTA MENOR.

ACTIVIDAD: SE CONTINUA EXCAVACIÓN MANUAL. PARA BORDILLO Y NIVELACIÓN CON MAQUINA CON 36.40 M². TRECIENTOS SESENTA Y CUATRO M². FRENTE OFICINA - BODEGA REDEXCO QUEDA PENDIENTE EL AREA DEL CAMPAMENTO PROVISIONAL.

03-06-24 LUNES

DIA SOLEADO

PERSONAL 1 RESIDENTE, 1 OPERADOR BOBCAT.

EQUIPO 1 MINICARGADOR BOBCAT

ACTIVIDAD: SE CONTINUA NIVELACIÓN Y DESCAPOTE SE LLEGA HASTA DESCOLE AREA 654 M²

04-05-2024 MARTES

DIA SOLEADO / LLUVIA HORAS DE LA MAÑANA

PERSONAL: 1 RESIDENTE OBRA, 1 TRABAJADORA SOCIAL, 1 OPERADOR BOBCAT. 1 MAESTRO, 4 AUXILIARES

EQUIPO: 1 BOBCAT / HERRAMIENTA MENOR.

ACTIVIDAD: SE REALIZA NIVELES EN ESPACIO DONDE EXISTE INVASIÓN Y SE PROCEDE A LIMPIEZA CORTE Y EXCAVACIÓN A LOS COSTADOS DE LA INVASIÓN, SE REALIZA MANUALMENTE EXCAVACIÓN PARA EXPONER TUBERIA DE CLARO Y TIGO SE REALIZARA EXCAVACIÓN PARA PROFUNDIZARLA Y TAPARLA CON ARENA PARA FACIL EXCAVACIÓN A FUTURO / SE REALIZA EXCAVACIÓN PARA BORDILLO DE FORMA MANUAL / SE CONTINUA AMARRANDO ESTRUCTURA PARA BORDILLO TOTAL 42 UNIDADES 248 ML. SIN TRASLADO SE REALIZAN BALIZAS DE SENALIZACIÓN PAR SU INSTALACIÓN EN COSTADO VIA EMPRESA.

RESIDENTE OBRA

05-06-2024 MIERCOLES

DIA SOLEADO

PERSONAL: 1 RESIDENTE OBRA, 1 TRABAJADORA SOCIAL, 1 OPERADOR BOBCAT. 1 MAESTRO OBRA, 4 AUXILIARES

EQUIPO: 1 BOBCAT S185 / HERRAMIENTA MENOR

ACTIVIDAD: SE REALIZA EXCAVACIÓN Y LOS ARBOLES SE INCLINARON AL DESCUBRIR LA BASE EN VISITA CON INTERVENTORIA SE DECIDIO QUE PARA EVITAR RIESGO DE CAIDA Y PELIGRO PARA TRANSEUNTES ES PERTINENTE RETIRARLOS / SE CONTINUA EXCAVACIÓN MANUAL ULTIMO TRAMO Y SE REALIZA EXCAVACIÓN Y TAPAR TUBERIA DE RED TIGO-CLARO INTERNET. INTERVENTORIA SOLICITA SI ES POSIBLE QUITAR LOS TRONCOS QUE ESTAN PARALELOS AL CERRAMIENTO YA QUE GENERAN INCONVENIENTES PARA EL DESARROLLO DEL MISMO Y DE LA CUNETA NUEVA. SE REALIZA / LLEGA 24 RIELES DE 15X20 FALTA REFORZAMIENTO

RESIDENTE OBRA

EMPRESA.

06-06-2024 JUEVES

DIA LLUVIOSO

PERSONAL: 1 RESIDENTE OBRA, 1 TRABAJADORA SOCIAL. 1 OPERADOR DE BOBCAT; 1 MAESTRO, 4 AUXILIARES

EQUIPO: BOBCAT, HERRAMIENTA MENOR

ACTIVIDAD: EN LAS HORAS DE LA MAÑANA POR MOTIVO DE TORMENTA ELECTRICA NO SE PUDO EJECUTAR ACTIVIDADES DE TERRENO SE REALIZA AMARRE Y OBRA VARILLA PARA FIELES. EN HORAS DE LA TARDE SE INICIA CON CARGUE DE MATERIAL PROVENIENTE EXCAVACIÓN SE RETIRAN 12 VIAJES Y SE REALIZA ARMADO DE FIELES PARA CONSTRUCCIÓN DE BORDILLO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA EN VARILLA DE 3/8" Y FIELES DE 1/4" SEGÚN DISEÑO

RESIDENTE OBRA

E. EDUAR SA.

07-06-2024 VIERNES

DIA LLUVIOSO

PERSONAL: 1 RESIDENTE OBRA, 1 TRABAJADORA SOCIAL, 1 MAESTRO, 4 AUXILIARES. 1 OPERADOR

EQUIPO HERRAMIENTA MENOR / BOBCAT.

ACTIVIDAD: SE REALIZA EXCAVACIÓN Y NIVELACIÓN EN PUNTOS ALTOS PARA REALIZAR PERFILACIÓN TERRENO, SE REALIZA ENCOFRADO Y FUNDIDA DE 24 ML DE BORDILLO CON ALTURA VARIABLE PARA DAR INICIO A ESTA ACTIVIDAD SE APLICA ANTISOL. PARA MEJORAR EL FRAGUADO Y SE TERMINA INICIA REFORZAMIENTO DE PERFILES. METALICOS.

Altura de bordillo = 0,40 mts

RESIDENTE OBRA

E. EDUAR SA.

08-06-2024 SABADO

DIA SOLEADO

PERSONAL 1 RESIDENTE OBRA, 1 TRABAJADORA SOCIAL, 1 MAESTRO, 4 AUXILIARES

EQUIPO HERRAMIENTA MENOR

ACTIVIDAD SE REALIZA DESENCOFRADO Y AFINADO DE BORDILLO PARA DAR MEJOR TERMINADO / SE REALIZA CERRAMIENTO EN TEJA ZINC INCLUYE ESTRUCTURA METÁLICA SE CONTINUA REFUERZAMIENTO DE ESTRUCTURA SIN RETRAZOS ACTIVIDADES, CERRAMIENTO 24 ML

RESIDENTE OBRA

E. EDUAR SA.

Powered by CamScanner

11-06-24 MARTES

DIA: SOLEADO

PERSONAL: 1 RESIDENTE, 1 MAESTRO, 3 AUXILIARES

EQUIPO HERRAMIENTA MENOR

ACTIVIDAD: SE INICIA LA JABOR CON PROBLEMAS DE MOVILIDAD POR PARO DE TAXISTAS EN LA CIUDAD CON BLOQUEOS EN TODA LA CIUDAD.— SE REALIZO ENCOFRADO AMARRE Y FUNDIDA DE 24ML DE BORDILLO (VIGA VARIABLE) PROTEGIDO CON ANTISOL.

DANIEL
RESIDENTE OBRAS

EDWIN ARIZA.

12-06-24 MIERCOLES

DIA SOLEADO

PERSONAL: 1 RESIDENTE, 1 MAESTRO, 5 AUXILIARES, 1 PERSONA SST.

EQUIPO: HERRAMIENTA MENOR

ACTIVIDAD: SE CONTINUA CON OTRO TRAMO DE VIGA VARIABLE / DESENCOFRADO, LIMPIEZA FORMALETA, INSTALACIÓN AMARRE DE ACERO DE REFUERZO, FUNDIDA DE VIGA Y CERRAMIENTO 24 ML. VISITA DE OBRA DE SST TIZIANA PARA APOYAR CON LA PARTE DE SEGURIDAD APOYANDOSE CON ANDREINA TRABAJADORA SOCIAL PARA DESARROLLAR TODAS SUS ACTIVIDADES DANIEL
RESIDENTE OBRA

EDWIN ARIZA.

13-06-24 JUEVES

DIA SOLEADO.

PERSONAL: 1 RESIDENTE, 1 TRABAJADORA SOCIAL, 1 MAESTRO, 5 AUXILIARES

EQUIPO HERRAMIENTA MENOR

ACTIVIDAD: En cuntud del cumplimiento de las clausulas estipuladas en el contrato, se solicito la presencia y permanencia de la profesional SST en la obra. Esto no es sólo un requerimiento por el cumplimiento de la normativa legal vigente, sino también un pilar fundamental para garantizar la seguridad y el bienestar de todos los trabajadores de la obra.

Si se cuenta con dos obras activas en el proyecto la SST debe cubrir ambos frentes y mantener los registros

disenos de la implementación del SG-SST.

Sandra Martínez.
SST EDUBAR S.A.

SE CONTINUA CON LAS ACTIVIDADES DE FORMALETA. AMARRE Y FUNDIDA DE VIGA PARA BORDILLO CON AVANCE DE 16 MTS EN EL ACCESO CALLE 28 Y 5 MTS ENTRE CALLE 28-B - 28c. EDWIN MEDEZ RESIDENTE OBRA

14-06-24 VIERNES
DIA SOLEADO
PERSONAL: 1 RESIDENTE, 1 PROFESIONAL SST, 1 TRABAJADORA SOCIAL. 1 MAESTRO, 5 AUXILIARES
EQUIPO HERRAMIENTA MENOR
ACTIVIDAD: SE DESENCOFRO SE HACE LIMPIEZA Y SE CONTINUA ARMANDO HASTA LA HORA. SE TIENE 96 M/L DE VIGA SE CONTINUA LA ACTIVIDAD PARA FUNDIR. DESDE LA 1 PM. / SIENDO LAS 3 PM SE TERMINA FUNDIDA DE VIGA POR MOTIVO DE LLUVIA SE DEJA FUNDIDO 12 ML. APROX. SE RETOMARA MAÑANA SABADO RESIDENTE OBRA

15-06-24 SABADO
DIA LLUVIOSO
PERSONAL: 1 RESIDENTE OBRA
EQUIPO —
ACTIVIDAD: POR MOTIVO DE LLUVIA NO LLEGA EL PERSONAL A TRABAJAR POR TAL RAZÓN NO SE EJECUTA ACTIVIDADES. / SIENDO LAS 11 AM LLEGAN 2 AUXILIARES PARA RECOGER FORMALETA POR SEGURIDAD NO DEJARLA EN LA VIA. RESIDENTE OBRA

16-06-24 DOMINGO DIA NO LABORAL.

Powered by CamScanner

17-06-24 LUNES

DIA NUBLADO

PERSONAL: 1 RESIDENTE, 1 TRABAJADORA SOCIAL, 1 PROFESIONAL SST. 1 MAESTRO, 2 AUXILIARES

EQUIPO: HERRAMIENTA MENOR

ACTIVIDAD: POR LLEGAR TAN POCO PERSONAL SE REALIZA AMARRE DE ACERO TOTAL 12 VIGAS 72 ML. Y SE REALIZA LIMPIEZA DE FORMALETA. Y ALISTAMIENTO DE PERFILES.

[redacted]
RESIDENTE OBRA

18-06-24 MARTES.

DIA NUBLADO

PERSONAL 1 RESIDENTE, 1 TRABAJADORA SOCIAL, 1 PROFESIONAL SST 1 MAESTRO, 5 AUXILIARES

EQUIPO: HERRAMIENTA MENOR, MEZCLADORA GASOLINA

ACTIVIDAD: SE FORMALETEA 48.50 ML DE VIGA CON ALTURA VARIABLE PARA FUNDIR / SE REALIZA CONCRETO Y SE FUNDE LA TOTALIDAD DE VIGA 48.50 ML. [redacted]
RESIDENTE

19-06-24 MIERCOLES

DIA NUBLADO

PERSONAL. 1 RESIDENTE, 1 TRABAJADORA SOCIAL, 1 PROFESIONAL SST. 1 MAESTRO, 5 AUXILIARES

EQUIPO: MEZCLADORA GASOLINA / HERRAMIENTA MENOR

ACTIVIDAD: SE CONTINUA ACTIVIDAD DE VIGA CON ALTURA VARIABLE PARA BORDILLO Y CERRAMIENTO TEJA ZINC, LLEGA 100 BULTOS DE CEMENTO Y MADERA PARA TERMINAL CERRAMIENTO / SE REALIZA CORTE DE OBRA MARIO CERVANTES. Y 3 Y/H EQUIPOS PARA QUINCENA [redacted]
RESIDENTE.

20-06-24 JUEVES

DIA SOLEADO

PERSONAL 1 RESIDENTE, 1 TRABAJADORA SOCIAL, 1 PROFESIONAL SST 1 MAESTRO, 5 AUXILIARES

EQUIPO HERRAMIENTA MENOR, MEZCLADORA A GASOLINA

ACTIVIDAD: SE DESENCOFRA CURVA Y SE INICIA CERRAMIENTO

Powered by CamScanner

CONTINUA CON VIGA PARA BORDILLO.
ENTREVISTAS FUNDACIÓN SD DOMINGO

21-06-24 VIERNES.

DIA NUBLADO


PERSONAL 1 RESIDENTE, 1 TRABAJADORA SOCIAL, 1 PROFESIONAL SST. 1 MAESTRO, 1 OPICAL., SAUXILIARES.

EQUIPO MEZCLADORA A GASOLINA Y HERRAMIENTA MENOR

ACTIVIDAD: SE CONTINUA FORMALETA INSTALACIÓN, AMARRE DE VIGA. Y CONCRETO 3.000 PSI PARA VIGA DE AMARRE ALTURA VARIABLE / SE CONTINUA CON CERRAMIENTO TEJA DE ZINC. SE ORGANIZA BODEGA PARA ESPERAR ACERO DE REFUERZO. SE ENTREGA DETALLE AL MAESTRO SOBRE INGRESOS PEATONALES Y ACCESO VIA.

Modificar

Plano Actual.

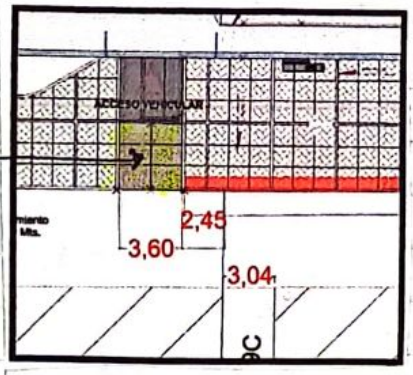


REALIZANDO ANALISIS DE PROPUESTA NO ES VIABLE ÉSTE DETALLE SE MODIFICARA PARA DAR CONTINUIDAD AL ANDEN PEATONAL Y QUE FUNCIONE RAMPA POR ALTURA O CAMBIO NIVELES.

22-06-24 SABADO

DIA SOLEADO.

PERSONAL: 1 RESIDENTE

E

EQUIPO: MEZCLADORA A GASOLINA, HERRAMIENTA MENOR.

ACTIVIDAD: SE REALIZA DESENCOFRADO PARA ARREGLO BORDILLO Y SE CONTINUA CON CERRAMIENTO EN TEJA DE ZINC SE ORGANIZA TODA LA OBRA Y SE DEJAN LISTA LA FORMALETA PARA TERMINAR EL DIA LUNES DE FUNDIR.

RESIDENTE OBRA

23-06-24 DOMINGO

DIA NO LABORAL.

Powered by CamScanner
