Gobernación de Norte de Santander

SECRETARÍA DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES

SDGR-025000

Para Cualquier Respuesta Cite este Radicado:
Rad No. 2024-25000-030130-3
2024-11-27 14:56 -RIESGO
Destino: 11400
cc:
Rcm/D: ADRIANA BOADA ARGUEL
Asunto: TRAMITE CUENTA DE CO
Folios: 61
Anexos: INFORME DE ACTIVIDADES

San José de Cúcuta,

Doctora

ADRIANA BOADA ARGUELLO

Profesional especializado, Grado 10

Área de Presupuesto

Secretaria de Hacienda Departamental

Gobernación de Norte de Santander

REFERENCIA: **TRAMITE DE PAGO**. **SECOP II**

Para dar cumplimiento a las disposiciones de la secretaria de Hacienda, estoy enviando los respectivos documentos para la cancelación del compromiso relacionado a continuación:

ALBEIRO SEPULVEDA AREVALO, se identifica con **C.C.: No. 8 8. 1 4 1. 5 4 7,** CONTRATISTA la suma de **DOCIENTOS CUARENTA Y DOS MILLONES QUINIENTOS VEINTI DOS MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS CON SIETE CENTAVOS MTC ($ 242,522,869,07),**POR CONCEPTO CONTRATO N° RE-SGRD-03405-2024, CUYO OBJETO ES MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y ATENCIÓN A PUNTOS CRITICOS EN LA VÍA QUE CONDUCE A LOS MUNICIPIOS DE TEORAMA - SAN CALIXTO - HACARÍ, DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER, EN EL MARCO DE LA DECLARATORIA DE CALAMIDAD PUBLICA REALIZADA MEDIANTE DECRETO 001287 DEL 06 DE JUNIO DE 2024

Cordialmente,

WILLIAM VERA ARIAS

Secretaria Departamental de Gestión de Riesgos

1

Espacio para
Logo Corporativo

ALBEIRO SEPULVEDA AREVALO
NIT 88.141.547-1
CALLE 7 26-34 BRR LLANADAS
Tel: 3136907332
Ocaña - Colombia
albeirosea@gmail.com

Factura electrÃ³nica de venta
No. FIAA 26

Señores	DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER		
NIT	800.103.927-7	**Teléfono**	(607) 0000000 - Ext. 000
Dirección	AV 5 CLL 13 Y 14	**Ciudad**	Cúcuta - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	20/11/2024, 15:26
Expedición	20/11/2024, 15:29
Vencimiento	20/11/2024

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y ATENCION A PUNTOS CRITICOS EN LA VIA QUE CONDUCE A LOS MUNICIPIOS DE TEORAMA - SAN CALIXTO - HACARI, DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER, EN EL MARCO DE LA DECLARATORIA DE CALAMIDAD PUBLICA REALIZADA MEDIANTE DECRETO 001287 DEL 06 DE JUNIO DE 2024	1.00	186,556,053.13	0 %	0.00	186,556,053.13
2	ADMINISTRACION 24%	1.00	44,773,452.75	0 %	0.00	44,773,452.75
3	IMPREVISTO 1%	1.00	1,865,560.53	0 %	0.00	1,865,560.53
4	UTILIDAD 5%	1.00	9,327,802.66	0 %	0.00	9,327,802.66

Total items: 4

Total Bruto	242,522,869.07
Total a Pagar	242,522,869.07

Valor en Letras: Doscientos cuarenta y dos millones quinientos veintidos mil ochocientos sesenta y nueve pesos m/cte con siete cent.

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:
Consignación bancaria - ConsignaciÃ³n $ 242,522,869.07

Observaciones:

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764075695925 aprobado en 20240724 prefijo FIAA desde el número 23 al 500 Vigencia: 6 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 7112 Actividades de ingeniería y otras actividades conexas de consultoría técnica Tarifa
CUFE: 1ca1734c279b372b9604e617c4519ade74749e6274c29a7405ba1f30173f77b71a7ede07d81f342e2b5ae167d7dbdfbc

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.046.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

DAVIVIENDA

Banco Davivienda S.A.

CERTIFICADO

OCANA, NORTE DE SANTANDER,
COLOMBIA,
A quién interese

25/09/2024

Por medio de la presente hacemos constar que **el señor ALBEIRO SEPULVEDA AREVALO** con **Cédula de Ciudadanía** número **88141547**

Posee en el banco Davivienda:

CUENTA DE AHORROS DAMAS

Número	**488423363958**
Fecha de apertura	**26/08/2021**

Cordialmente,

BANCO DAVIVIENDA

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 14969261186

(415)7707212489984(8020) 000001496926118 6

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
8 8 1 4 1 5 4 7	1	Impuestos de Cúcuta 7	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	27. Fecha expedición
Persona natural o sucesión ilíquida 2	Cédula de Ciudadanía 1 3	8 8 1 4 1 5 4 7	

Lugar de expedición / 28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Norte de Santander 5 4	Ocaña 4 9 8

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres
SEPULVEDA	AREVALO	ALBEIRO	

35. Razón social

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Norte de Santander 5 4	Ocaña 4 9 8

41. Dirección principal
CALLE 7 26-34 BRR LLANADAS

42. Correo electrónico albeirosea@gmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3 1 3 6 9 0 7 3 3 2	3 1 5 4 5 2 3 6 3 4

CLASIFICACIÓN

Actividad económica				Ocupación	
Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades				
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2	51. Código	52. Número establecimientos
7 1 1 2	2 0 0 5 1 2 0 6	4 2 9 0	2 0 0 4 0 1 0 1		4 1 1 1	4 1 1 2	2 1 4 2	

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	5	2	2	4	8	5	2																			

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
22- Obligado a cumplir deberes formales a
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico

Usuarios aduaneros										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54. Código										
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores					
55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2023 - 12 - 27 / 09 : 56: 30

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre SEPULVEDA AREVALO ALBEIRO
985. Cargo CONTRIBUYENTE

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

ACTA DE APROBACIÓN DE POLIZAS

GENERALIDADES				
CONTRATO / CONVENIO Nº Y FECHA:	RE-SGRD-03405-2024 del 1/NOVI/2024			
VALOR INICIAL (En números):	$ 498.136.747,00			
PLAZO:	**60 DIAS**			
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL:	No. 00 000095 de Fecha 16 septiembre de 2024			
GARANTÍAS:	**AMPAROS INICIALES:**	**(%)**	**AMPAROS NUEVOS (Si hay lugar a ello).**	**(%)**
Garantía de seriedad del ofrecimiento				
Buen manejo y correcta inversión del anticipo.				
Pago anticipado.				
Cumplimiento de las obligaciones surgidas del contrato estatal.	X	10		
Pago de salarios, prestaciones sociales, indemnizaciones y aportes parafiscales.	X	5		
Estabilidad de la obra.				
Calidad de los bienes y equipos suministrados.				
Correcto funcionamiento de los equipos.				
Calidad del servicio.	X	10		
Provisión de repuestos y accesorios.				
Pago de multas y cláusula penal pecuniaria, cuando se han pactado en el contrato.				
Responsabilidad civil extracontractual.	X			
Otros amparos.				
MODIFICATORIOS Y ADICIONALES (si hay lugar a ello y especificando si se trata de adicional de amparos, tiempo, dinero o ambos)				
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL DEL MODIFICATORIO O ADICIONAL (Si hay lugar a ello)				
VALOR DEL MODIFICATORIO O ADICIONAL (Si hay lugar a ello)				
TIEMPO DEL MODIFICATORIO O ADICIONAL (Si hay lugar a ello)				
VALOR TOTAL (En números):	$ 498.136.747,00			
ASEGURADORA:	**SEGUROS DEL ESTADO S.A.**			
-POLIZA DE GARANTIA Nº:	No. 56-44-101008829 Anexo No.0			
POLIZA RESPONSABILIDAD CIVIL N°:	No. 56-40-101003860 Anexo No.0			
VIGENCIA G. (dd/mm/aa):	DEL 01/11/2024 al 31/12/2027	**VIGENCIA RC. (dd/mm/aa):**	DEL 01/11/2024 al 31/12/2024	

En San José de Cúcuta, a los 6 días del mes de noviembre del año 2024, en La Secretaría para la Gestión del Riesgo de Desastre, se reunieron Los suscritos: **WILLIAM VERA ARIAS,** Ordenador del Gasto **ALBEIRO SEPULVEDA AREVALO C.C** 8 8. 1 4 1. 5 4 7, actuando como contratista para dar cumplimiento a la normatividad vigente.

En constancia firman, el 6 día noviembre de 2024.

POR EL DEPARTAMENTO

WILLIAM VERA ARIAS
Secretario para la Gestión del Riesgo de Desastres
Ordenador del Gasto - Supervisor

POR EL CONTRATISTA

ALBEIRO SEPULVEDA AREVALO
C.C. 8 8. 1 4 1. 5 4 7
Contratista

Gobernación de Norte de Santander	MACROPROCESO: SOPORTE	MS-CC-CS-14	
	PROCESO: GESTIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIÓN	FECHA 18/07/2012	VERSIÓN 1
	CONTROL Y SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL	Página 1 de 1	

DESIGNACIÓN DE SUPERVISOR

FECHA: **6 NOVIEMBRE 2024**

DE: WILLIAM VERA ARIAS
Secretaria para la Gestión del Riesgo de Desastres

PARA: WILLIAM VERA ARIAS
Secretaria para la Gestión del Riesgo de Desastres

Me permito manifestarle que ha sido designado como supervisor del Contrato de Obra N°. RE-SGRD-03405-2024 del 1 DE NOVIEMBRE celebrado con ALBEIRO SEPULVEDA AREVALO; cuyo objeto MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y ATENCIÓN A PUNTOS CRITICOS EN LA VÍA QUE CONDUCE A LOS MUNICIPIOS DE TEORAMA - SAN CALIXTO - HACARÍ, DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER, EN EL MARCO DE LA DECLARATORIA DE CALAMIDAD PUBLICA REALIZADA MEDIANTE DECRETO 001287 DEL 06 DE JUNIO DE 2024

- Copia del contrato
- Copia del Registro Presupuestal
- Copia de Garantías Constituidas
- Demás documentos necesarios para el inicio de la ejecución contractual según el contrato.

La función de supervisor deberá realizarse conforme a las disposiciones contenidas en el instructivo de supervisión e interventoría, documento que hace parte del procedimiento "Control y Seguimiento a la Ejecución Contractual", donde encontrará las obligaciones, prohibiciones y sanciones a las que se puede ver expuesto por el no cumplimiento cabal de esta labor.

Atentamente,

WILLIAM VERA ARIAS
Secretaria para la Gestión del Riesgo de Desastres

Gobernación de Norte de Santander	MACROPROCESO: SOPORTE	MS-CC-CS-01	
	GESTIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIÓN	FECHA 10/07/2017	VERSIÓN 1
	CONTROL Y SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL	Página 1 de 2	

ACTA DE INICIO A LA EJECUCIÓN DE CONTRATO

FECHA DEL ACTA	6 noviembre 2024

1. GENERALIDADES DEL CONTRATO	
CONTRATO No. - FECHA	RE-SGRD-03405-2024 del 1/NOVI/2024
TIPO DE CONTRATO	Obra
DEPENDENCIA CONTRATANTE	Secretaría para la Gestión del Riesgo de Desastres
CONTRATISTA	ALBEIRO SEPULVEDA AREVALO
C.C. o N.I.T.	8 8. 1 4 1. 5 4 7
REPRESENTANTE LEGAL	ALBEIRO SEPULVEDA AREVALO
C.C.	8 8. 1 4 1 .5 4 7
OBJETO DEL CONTRATO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y ATENCIÓN A PUNTOS CRITICOS EN LA VÍA QUE CONDUCE A LOS MUNICIPIOS DE TEORAMA - SAN CALIXTO - HACARÍ, DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER, EN EL MARCO DE LA DECLARATORIA DE CALAMIDAD PUBLICA REALIZADA MEDIANTE DECRETO 001287 DEL 06 DE JUNIO DE 2024
VALOR DEL CONTRATO	CUTROCIENTOS NOVENTA Y OCHO MILLONES CIENTO TREINTA Y SEIS MIL SETECIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS MTC ($ 498.136.747,00)
PLAZO O DURACIÓN	2 meses
FORMA DE PAGO	EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER, realizó los análisis de precios unitarios de las obras requeridas, fijándose como valor total para el contrato a ejecutar la suma de CUTROCIENTOS NOVENTA Y OCHO MILLONES CIENTO TREINTA Y SEIS MIL SETECIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS MTC ($ 498.136.747,00), Valor que será pagado por el DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER al CONTRATISTA mediante actas parciales, previa presentación por parte del Contratista del informe de ejecución de las actividades relacionadas con el objeto del contrato, certificación de cumplimiento a satisfacción expedida por el supervisor del contrato, y de la prestación de los respectivos soportes de pago de aportes al sistema de seguridad social en salud, pensión, y riesgos profesionales, de conformidad con lo establecido en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, en el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, y en la Ley 1562 de 2012, y demás normas vigentes. Ante el incumplimiento de estas obligaciones, el DEPARTAMENTO dará aviso de tal situación a las autoridades competentes.
LUGAR DE EJECUCIÓN	Departamento Norte de Santander
RUBRO	2.3.2.02.02.008 Servicios prestados a las empresas y servicios de producción
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	No. 00 000095 de Fecha 16 septiembre de 2024
SUPERVISOR (Acto administrativo y fecha Designación)	William Vera Arias, secretario para la Gestión del Riesgo de Desastres Mediante Memorando de Designación de Supervisión de Fecha 6 de noviembre de 2024
INTERVENTOR (Acto administrativo y fecha Designación)	No Aplica

Gobernación de Norte de Santander	MACROPROCESO: SOPORTE	MS-CC-CS-01	
	GESTIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIÓN	FECHA 10/07/2017	VERSIÓN 1
	CONTROL Y SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL	Página 2 de 2	

ACTA DE INICIO A LA EJECUCIÓN DE CONTRATO

2. VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO Y LEGALIZACIÓN PARA INICIO DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL	
2.1 REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO	
REQUISITO	**FECHA**
Fecha de suscripción	1 noviembre de 2024
Registro Presupuestal	No.00 000136 de Fecha 1 noviembre 2024

2.2 REQUISITOS DE LEGALIZACIÓN			
REQUISITO	**FECHA**		
Impuesto de timbre	No Aplica		
Publicación Gaceta	No Aplica		
Garantía Única. No. 56-44-101008829 Anexo No.0 Aseguradora: Seguros Del Estado S.A. Fecha de Expedición: 02/11/2024 Fecha de aprobación: 06/11/2024	Amparos	Valor asegurado	Vigencia
	Cumplimiento del Contrato	$ 49.813.674.70	01/11/2024 al 30/04/2025
	Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e Indemnizaciones Laborales	$24.906.837.35	01/11/2024 al 31/12/2027
	Estabilidad y calidad de obra	$ 149.441.024.10	1 AÑO
Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual No. 56-40-101003860 Anexo No.0 Aseguradora: Seguros Del Estado S.A. Fecha de Expedición: 02/11/2024 Fecha de aprobación: 06/11/2024	Amparos	Valor asegurado	Vigencia
			01/11/2024 hasta 31/12/2024
	Predios labores y operaciones	$ 260.000.000	
Otros (según el contrato):			

En San José de Cúcuta en las oficinas de la SECRETARÍA PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES, se reunieron los suscritos a saber: WILLIAM VERA ARIAS, Ordenador del Gasto - Supervisor, interventor Interno, NO APLICA Interventor Externo No Aplica y **ALBEIRO SEPULVEDA AREVALO C.C.** 8 8. 1 4 1. 5 4 7, en calidad de Contratista, con el fin de acordar el inicio del contrato en mención, a partir de la fecha de la presente acta.

OBSERVACIONES

Se firma la presente por los que en ella intervienen,

WILLIAM VERA ARIAS
Secretario para la Gestión del Riesgo de Desastres
Ordenador del Gasto - Supervisor

ALBEIRO SEPULVEDA AREVALO
C.C. 88.141.547
Contratista

Nota 1: *Si el contrato contempla la interventoría externa, tanto el Supervisor como el interventor deberán suscribir el presente documento.*
Nota 2: *Toda suspensión y reiniciación que afecte el contrato debe ser notificada a la compañía garante con el fin de que se extienda la vigencia de los amparos por el término de duración efectiva del mismo.*

Gobernación de Norte de Santander	MACROPROCESO: SOPORTE	MS-CC-CS-12	
	GESTIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIÓN	FECHA 24/10/2017	VERSIÓN 1
	CONTROL Y SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL	Página 1 de 12	

INFORME DE SUPERVISIÓN Y CUMPLIMIENTO CONTRATO DE OBRA

FECHA :	25 de noviembre 2024

1. GENERALIDADES DEL CONTRATO	
FECHA Y No DEL CONTRATO	RE-SGRD-03405-2024 del 1/NOVI/2024
TIPO DE CONTRATO	Obra
DEPENDENCIA CONTRATANTE	Secretaría para la Gestión del Riesgo de Desastres
CONTRATISTA	ALBEIRO SEPULVEDA AREVALO
C.C. o N.I.T.	8 8. 1 4 1. 5 4 7
REPRESENTANTE LEGAL	ALBEIRO SEPULVEDA AREVALO
N.I.T	8 8. 1 4 1 .5 4 7
OBJETO DEL CONTRATO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y ATENCIÓN A PUNTOS CRITICOS EN LA VÍA QUE CONDUCE A LOS MUNICIPIOS DE TEORAMA - SAN CALIXTO - HACARÍ, DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER, EN EL MARCO DE LA DECLARATORIA DE CALAMIDAD PUBLICA REALIZADA MEDIANTE DECRETO 001287 DEL 06 DE JUNIO DE 2024
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	CUTROCIENTOS NOVENTA Y OCHO MILLONES CIENTO TREINTA Y SEIS MIL SETECIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS MTC ($ 498.136.747,00)
VALOR ADICIONAL CONTRATO	No Aplica
LUGAR DE EJECUCIÓN	Departamento Norte de Santander
PLAZO INICIAL	60 Dias
FORMA DE PAGO	EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER, realizó los análisis de precios unitarios de las obras requeridas, fijándose como valor total para el contrato a ejecutar la suma de CUTROCIENTOS NOVENTA Y OCHO MILLONES CIENTO TREINTA Y SEIS MIL SETECIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS MTC ($ 498.136.747,00), Valor que será pagado por el DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER al CONTRATISTA mediante actas parciales, previa presentación por parte del Contratista del informe de ejecución de las actividades relacionadas con el objeto del contrato, certificación de cumplimiento a satisfacción expedida por el supervisor del contrato, y de la prestación de los respectivos soportes de pago de aportes al sistema de seguridad social en salud, pensión, y riesgos profesionales, de conformidad con lo establecido en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, en el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, y en la Ley 1562 de 2012, y demás normas vigentes. Ante el incumplimiento de estas obligaciones, el DEPARTAMENTO dará aviso de tal situación a las autoridades competentes.
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	No. 00 000095 de Fecha 16 septiembre de 2024
REGISTRO PRESUPUESTAL	No.00 000136 de Fecha 1 noviembre 2024
SUPERVISOR	William Vera Arias, secretario para la Gestión del Riesgo de Desastres Mediante Memorando de Designación de Supervisión de Fecha 6 de noviembre de 2024
INTERVENTOR EXTERNO	-
ACTA DE INICIO	6 de noviembre de 2024
ACTA DE SUSPENSIÓN	-
ACTA DE REINICIO	-

Gobernación de Norte de Santander	MACROPROCESO: SOPORTE	MS-CC-CS-12	
	GESTIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIÓN	FECHA 24/10/2017	VERSIÓN 1
	CONTROL Y SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL	Página 2 de 12	

INFORME DE SUPERVISIÓN Y CUMPLIMIENTO CONTRATO DE OBRA

ACTAS PARCIALES DE OBRAS ACTAS DE MODIFICACIÓN	-	**FECHA**
ACTAS DE MODIFICACIÓN ACTAS DE PRECIOS NO PREVISTOS	**NA**	**FECHA**
RELACIÓN DE GARANTÍAS		

Garantía Única. No. 56-44-101008829 Anexo No.0 Aseguradora: Seguros Del Estado S.A. Fecha de Expedición: 02/11/2024 Fecha de aprobación: 06/11/2024	Amparos	Valor asegurado	Vigencia
	Cumplimiento del Contrato	$ 49.813.674.70	01/11/2024 al 30/04/2025
	Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e Indemnizaciones Laborales	$24.906.837.35	01/11/2024 al 31/12/2027
	Estabilidad y calidad de obra	$ 149.441.024.10	1 AÑO
Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual No. 56-40-101003860 Anexo No.0 Aseguradora: Seguros Del Estado S.A. Fecha de Expedición: 02/11/2024 Fecha de aprobación: 06/11/2024	Valor asegurado		Vigencia
	$ 260.000.000		01/11/2024 hasta 31/12/2024

2. ESTADO FINANCIERO

CONCEPTO	FECHA	VALOR ACTA	COMPROBANTE DE EGRESO	VALOR PAGADO

VALOR INICIAL CONTRATADO	$ 498.136.747,00
ACTA PARCIAL 1	$242.522.869,07
SALDO POR EJECUTAR	$255.613.877,93

3. DESARROLLO DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO

Gobernación de Norte de Santander	MACROPROCESO: SOPORTE	MS-CC-CS-12	
	GESTIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIÓN	FECHA 24/10/2017	VERSIÓN 1
	CONTROL Y SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL	Página 3 de 12	

INFORME DE SUPERVISIÓN Y CUMPLIMIENTO CONTRATO DE OBRA

ANEXO REGISTRO FOTOGRAFICO SEGÚN ACTA PARCIAL DE OBRA DEL 25 NOVIEMBRE 2024

4. CERTIFICACIÓN AL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE PAGO DEL CONTRATO
Dando cumplimiento al Artículo 82 y 83 de lo establecido en la Ley 1474 de 2011 "Estatuto Anticorrupción", Yo WILLIAM ARIAS VERA con cedula de ciudadanía No. 88.158.521 de pamplona en mi condición de ordenador del gasto (a) del contrato de Obra RE-SGRD-03405-2024, **CERTIFICO** que:

ALBEIRO SEPULVEDA AREVALO, en calidad de Contratista, hizo entrega del informe de actividades relacionado con la de ejecución del (objeto contractual) durante el período comprendido del **6 NOVIEMBRE AL 25 DE NOVIEMBRE 2024 cuyo objeto es MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y ATENCIÓN A PUNTOS CRITICOS EN LA VÍA QUE CONDUCE A LOS MUNICIPIOS DE TEORAMA - SAN CALIXTO - HACARÍ, DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER, EN EL MARCO DE LA DECLARATORIA DE CALAMIDAD PUBLICA REALIZADA MEDIANTE DECRETO 001287 DEL 06 DE JUNIO DE 2024**
El valor a reconocer y pagar es la suma de **DOCIENTOS CUARENTA Y DOS MILLONES QUINIENTOS VEINTI DOS MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS CON SIETE CENTAVOS MTC ($ 242,522,869,07),** correspondiente al pago Acta Recibo PARCIAL 1 , del contrato en referencia.

De igual forma **CERTIFICO** que el contratista acredito los siguientes pagos en materia de seguridad social y prestaciones de ley (se anexa planillas de pago)

WILLIAM VERA ARIAS
Secretario para la Gestión del Riesgo de Desastres
Ordenador del Gasto - Supervisor

LUIS FERNANDO BARON ORTIZ
C.C. 1.090.455.569
Contratista apoyo supervisión

Trazabilidad	Nombre	Cargo	Firma / fecha
Proyectó:	**Luis Fernando Barón Ortiz**	**Contratista**	
Revisión jurídica:	**Marlym Jhoana Montoya**	**Asesora Jurídica Externa**	
Aprobación Jurídica:	**Marlym Jhoana Montoya**	**Asesora Jurídica Externa**	
Revisión área técnica:	**William Vera Arias**	**Secretario SGRD**	


Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes; y, por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para firma


INFORME DE SUPERVISIÓN Y CUMPLIMIENTO CONTRATO DE OBRA

REGISTRO FOTOGRAFICO


CORREDOR VIAL SAN CALIXTO - TEORAMA

1. ROCERIA Y LIMPIEZA DE MATERIAL VEGETAL

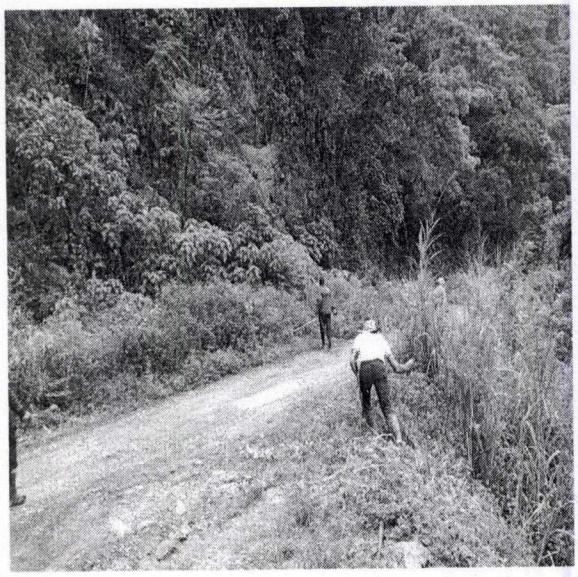

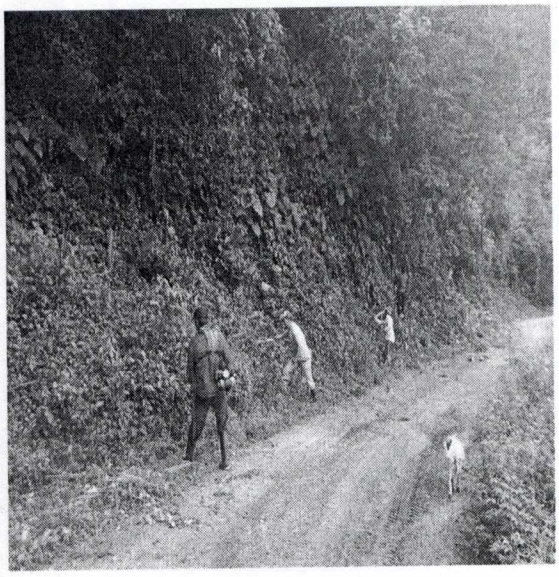





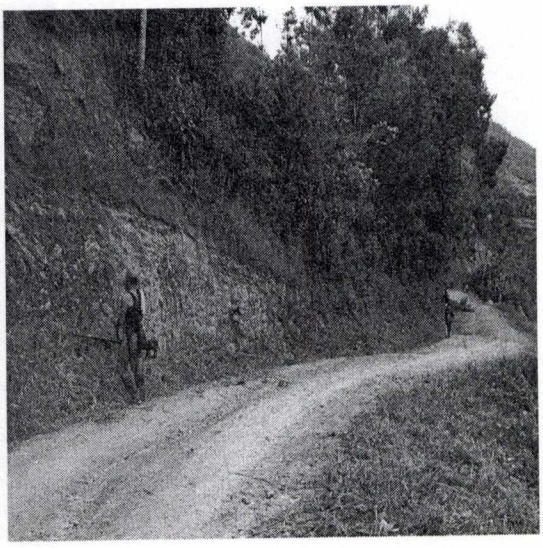

2. EXCAVACION MECANICA



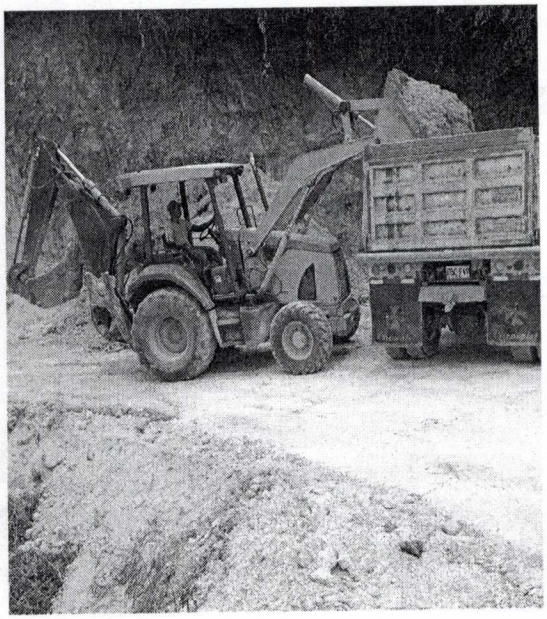

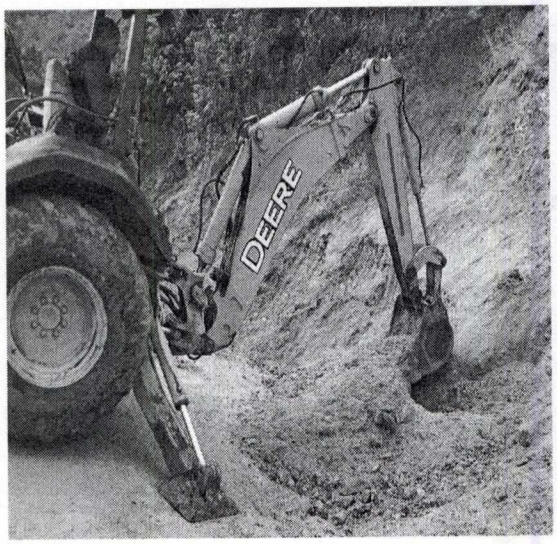





3. MEJORAMIENTO DE CALZADA AGREGANDO MATERIAL






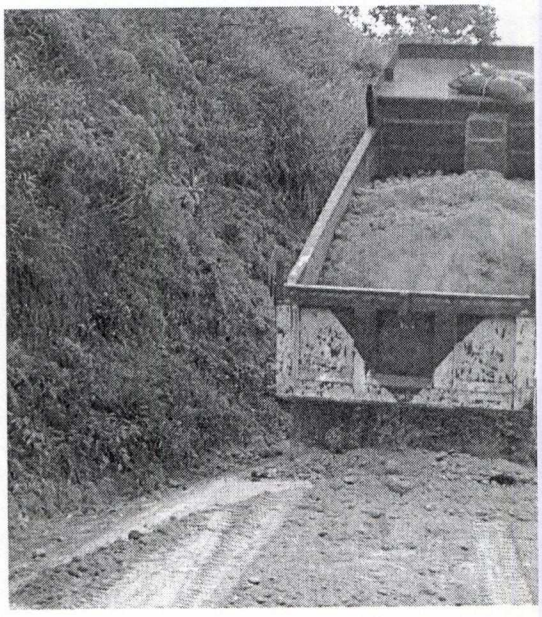


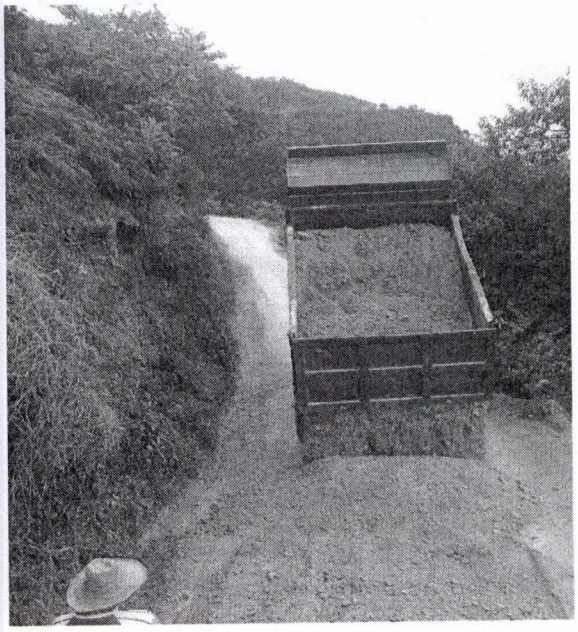

4. CONFORMACION DE CALZADA CON MOTONIVELADORA

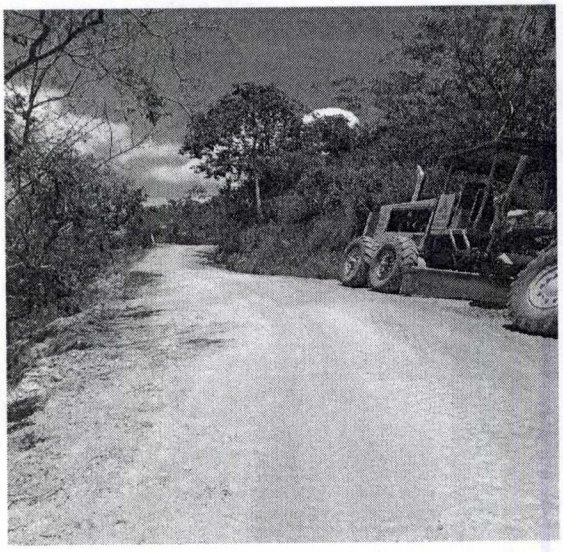




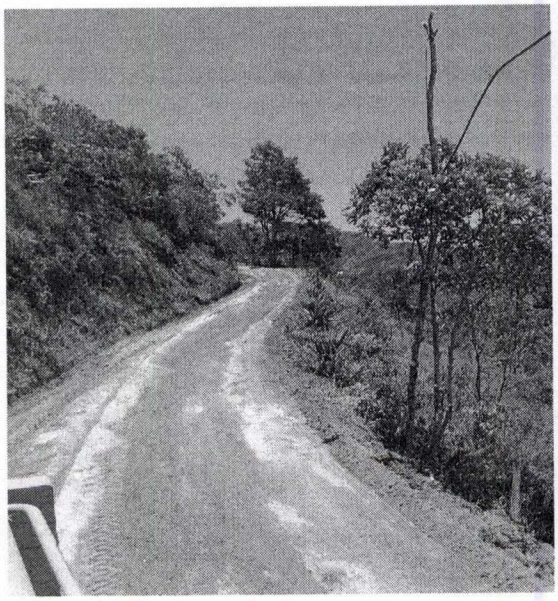




CORREDOR VIAL HACARI- SAN CALIXTO


1. ROCERIA Y LIMPIEZA DE MATERIAL VEGETAL

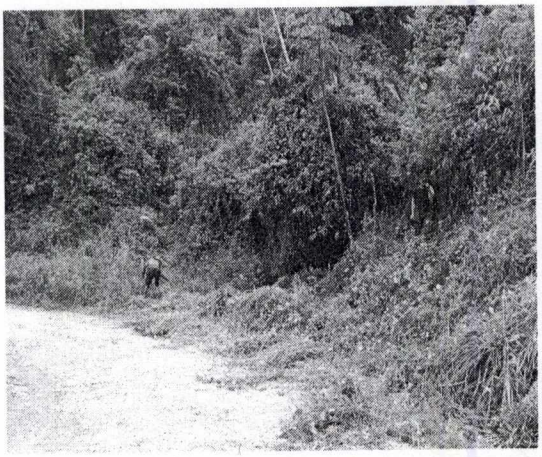




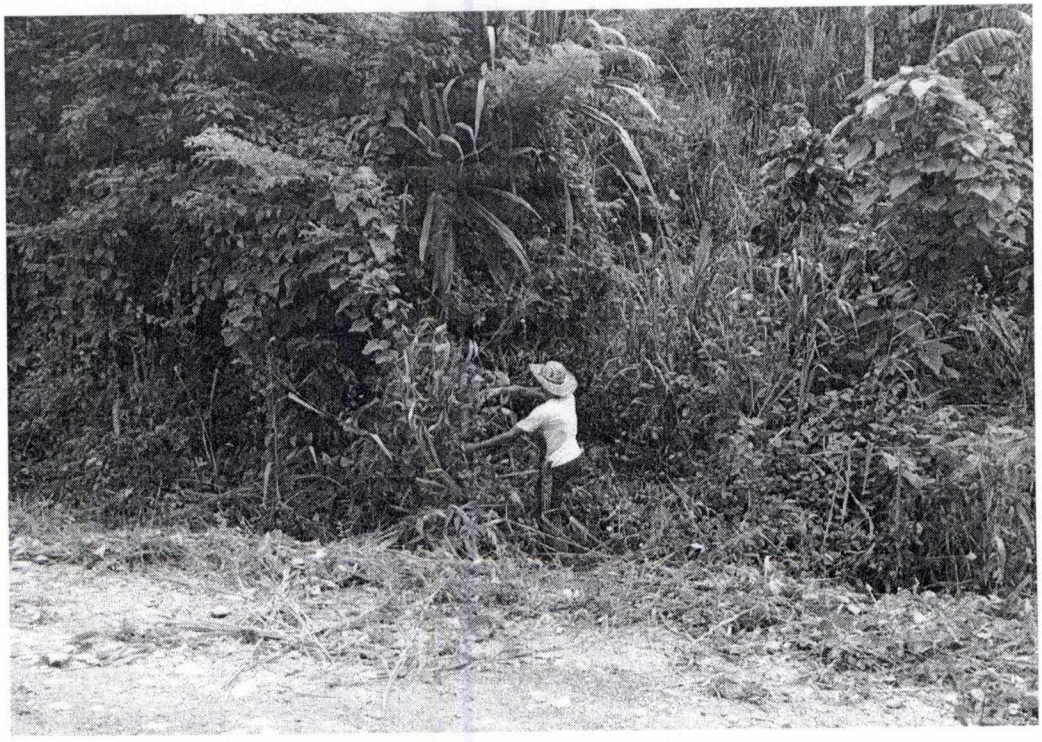


2. EXCAVACION MECANICA

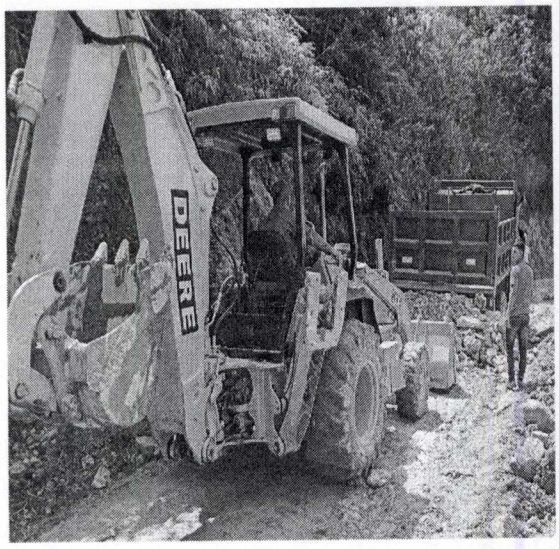


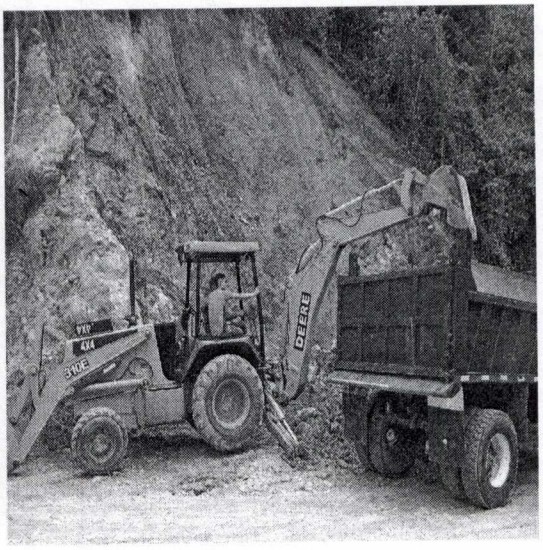





3. MEJORAMIENTO DE CALZADA AGREGANDO MATERIAL

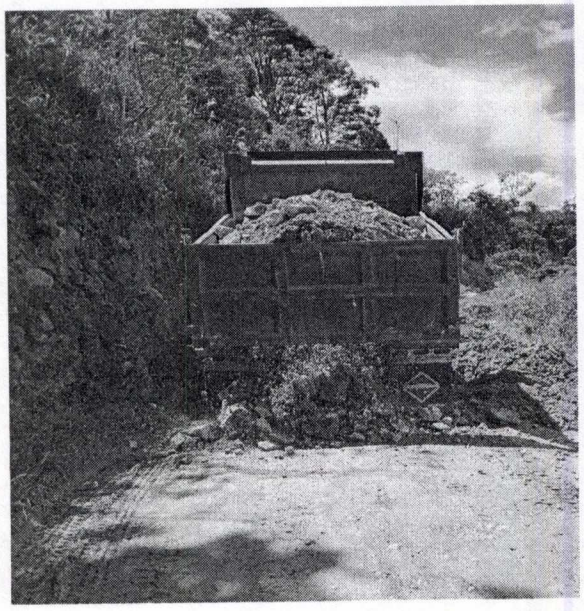

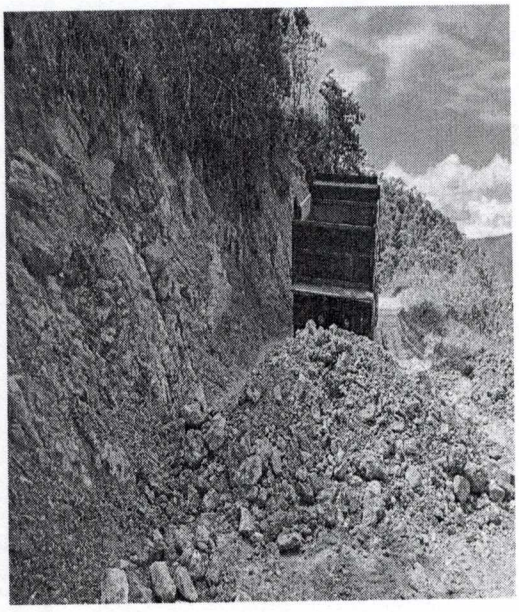

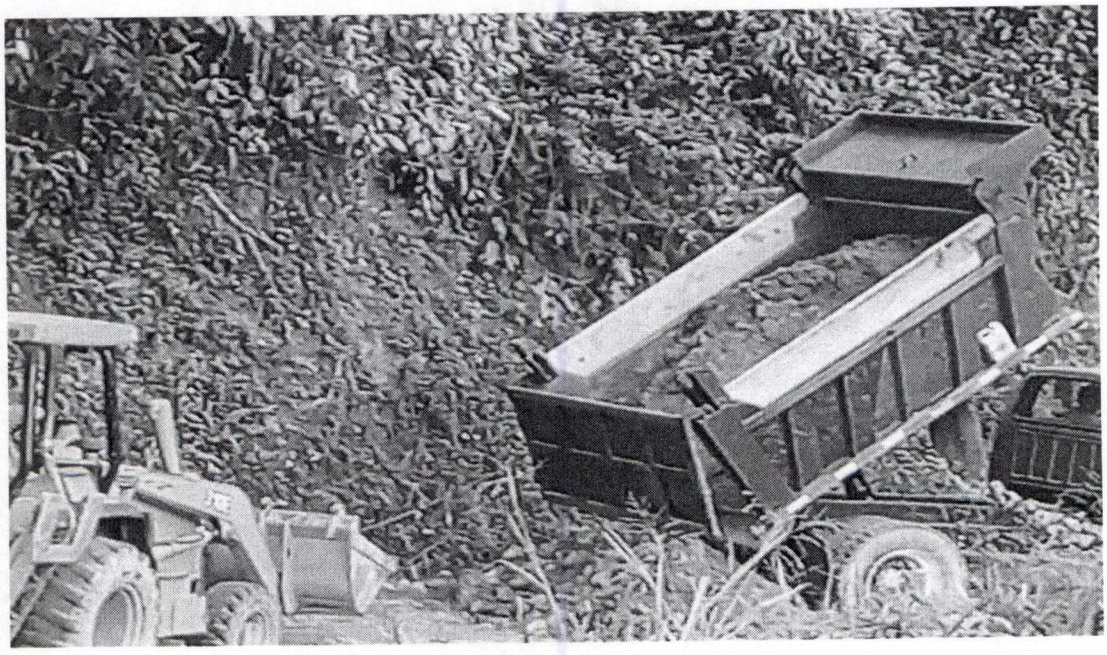

4. CONFORMACION DE CALZADA CON MOTNIVELADORA

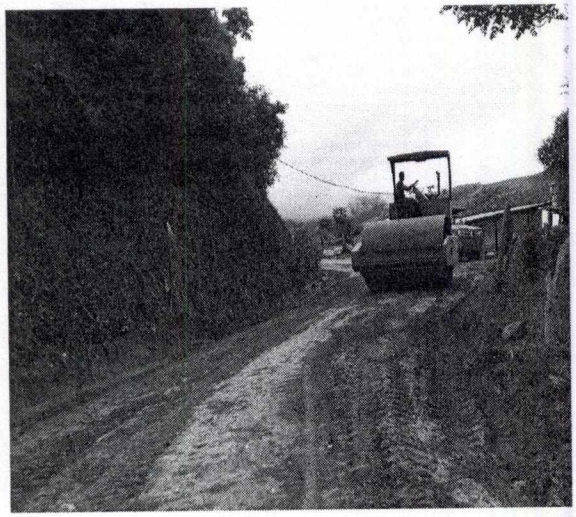







Gobernación de Norte de Santander	MACROPROCESO: SOPORTE	MS-CC-CS-12	
	GESTIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIÓN	FECHA 24/10/2017	VERSIÓN 1
	CONTROL Y SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL	Página 12 de 12	

INFORME DE SUPERVISIÓN Y CUMPLIMIENTO CONTRATO DE OBRA



INFORME DE SUPERVISIÓN Y CUMPLIMIENTO CONTRATO DE OBRA

OBSERVACIONES

De acuerdo a la visita realizada a campo se puede analizar de forma ocular que el avance de obra es significativo y que las actividades se vienen realizando según lo contemplado dentro del contrato. Es importante aclarar que durante el recorrido que se realizo en los 41 km que inician desde el municipio de Teorama pasando por el municipio de San Calixto y finalizando en el municipio de Hacarí, las obras de drenaje son muy escasas, lo que en varios puntos de la via esta generando acumulación de agua excedente de la lluvia y cárcavas de gran tamaño que dificultan el flujo vehicular con total normalidad.

Una de las mayores preocupaciones de los pobladores de las veredas circundantes al corredor vial secundario también se centra en la construcción de obras de arte, pues agradecen el mantenimiento a la vía pero manifiestan que por las lluvias que se vienen presentando estos trabajos tienden a no ser duraderas, todas estas recomendaciones fueron atendidas por el señor secretario William Vera Arias, y como quedo descrito en el comité de obra se realizara una visita por un equipo de profesionales adjuntos a la secretaria departamental de gestión de riesgo, para hacer un inventario de las obras de arte existentes y las zonas donde se requieren con mas urgencias ya sean alcantarillas, bateas u estructura necesaria.

ALBEIRO SEPÚLVEDA ARÉVALO
UNIVERSIDAD FRANCISCO DE PAULA SANTANDER
MP- 54202096245 NTS.

San José de Cúcuta, 25 noviembre de 2024

Señores
TESORERIA DEPARTAMENTAL
San José de Cúcuta

REFERENCIA: ° RE-SGRD-03405-2024 del 1 DEL NOVIEMBRE DE 2024, MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y ATENCIÓN A PUNTOS CRITICOS EN LA VÍA QUE CONDUCE A LOS MUNICIPIOS DE TEORAMA - SAN CALIXTO - HACARÍ, DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER, EN EL MARCO DE LA DECLARATORIA DE CALAMIDAD PUBLICA REALIZADA MEDIANTE DECRETO 001287 DEL 06 DE JUNIO DE 2024

Asunto: Autorización Descuento Estampilla

El presente tiene como fin autorizar por medio de esta notificación se descuente el porcentaje % correspondiente a las estampillas departamentales y descuentos de ley de la referencia a la factura de la referencia, por concepto Acta Parcial No. 01 de fecha 25 de noviembre 2024

Sin otro particular

ALBEIRO SEPULVEDA AREVALO
C.C. 8 8. 1 4 1. 5 4 7
CONTRATISTA

Calle 7 # 26 – 30 Barrio las Llanadas Ocaña N de S. Teléfono. 3136907332, albeirosea@gmail.com

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE							
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 88141547		SEPULVEDA AREVALO ALBEIRO	A - 200 O MAS COTIZANTES	SEDE PRINCIPAL	CALLE 10 14-01 CENTRO	OCAÑA-NORTE DE SANTANDER	5626728	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-11	2024-12	1000000863	9477957247	E	2024/12/11	2024/11/27	BANCO DE BOGOTA	0	$2,415,000

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																			PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: SEDE PRINCIPAL (6 Afiliados)																							$7,800,000	$1,248,000			$7,800,000	$312,000			$7,800,000	$312,000			$7,800,000		$543,000		$0	$0		$2,415,000
Centro de Trabajo: RIESGO 5 (6 Afiliados)																							$7,800,000	$1,248,000			$7,800,000	$312,000			$7,800,000	$312,000			$7,800,000		$543,000		$0	$0		$2,415,000
Ciudad: OCAÑA Depto: NORTE DE SANTANDER (6 Afiliados)																							$7,800,000	$1,248,000			$7,800,000	$312,000			$7,800,000	$312,000			$7,800,000		$543,000		$0	$0		$2,415,000
1	CC	1063618665	ALBA CARLOS		X																230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS037	30	$1,300,000	$52,000	CCF37	30	$1,300,000	$52,000	14-23	30	$1,300,000	6.960%	$90,500	30	$0	$0	Si	$402,500
2	CC	1003091979	ALBA EDGAR		X																230301	30	$1,300,000	$208,000	ESSC62	30	$1,300,000	$52,000	CCF37	30	$1,300,000	$52,000	14-23	30	$1,300,000	6.960%	$90,500	30	$0	$0	Si	$402,500
3	CC	4984369	ALDANA JUAN		X																25-14	30	$1,300,000	$208,000	EPS005	30	$1,300,000	$52,000	CCF37	30	$1,300,000	$52,000	14-23	30	$1,300,000	6.960%	$90,500	30	$0	$0	Si	$402,500
4	CC	77132934	ANGARITA RODOLFO		X																231001	30	$1,300,000	$208,000	EPS041	30	$1,300,000	$52,000	CCF37	30	$1,300,000	$52,000	14-23	30	$1,300,000	6.960%	$90,500	30	$0	$0	Si	$402,500
5	CC	1064840973	ARIAS WILSON		X																230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS037	30	$1,300,000	$52,000	CCF37	30	$1,300,000	$52,000	14-23	30	$1,300,000	6.960%	$90,500	30	$0	$0	Si	$402,500
6	CC	13175720	ASCANIO JESUS		X																230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS041	30	$1,300,000	$52,000	CCF37	30	$1,300,000	$52,000	14-23	30	$1,300,000	6.960%	$90,500	30	$0	$0	Si	$402,500
Total	**Afiliados(6)**																						$7,800,000	$1,248,000			$7,800,000	$312,000			$7,800,000	$312,000			$7,800,000		$543,000		$0	$0		$2,415,000

DATOS GENERALES DEL APORTANTE							
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 88141547		SEPULVEDA AREVALO ALBEIRO	A - 200 O MAS COTIZANTES	SEDE PRINCIPAL	CALLE 10 14-01 CENTRO	OCAÑA-NORTE DE SANTANDER	5626728	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-11	2024-12	1000000863	9477957247	E	2024/12/11	2024/11/27	BANCO DE BOGOTA	0	$2,415,000

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				6	$1,248,000	$0	$0	$1,248,000
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	$208,000	$0	$0	$208,000
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$208,000	$0	$0	$208,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	4	$832,000	$0	$0	$832,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				6	$543,000	$0	$0	$543,000
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	6	$543,000	$0	$0	$543,000
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				6	$312,000	$0	$0	$312,000
COMFANORTE	CCF37	890,500,516	3	6	$312,000	$0	$0	$312,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 4)				6	$312,000	$0	$0	$312,000
ASMET SALUD EPS SAS	ESSC62	900,935,126	7	1	$52,000	$0	$0	$52,000
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	2	$104,000	$0	$0	$104,000
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	2	$104,000	$0	$0	$104,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$52,000	$0	$0	$52,000
TOTAL				6	$2,415,000	$0	$0	$2,415,000

ACREDITACIÓN DE PAGO SEGURIDAD SOCIAL Y OBLIGACIONES PARAFISCALES

Cúcuta, noviembre 10 de 2024

Señores

Cúcuta –Norte de Santander, Información del Proceso: **MANTENIMIENTO Y ATENCIÓN A PUNTOS CRITICOS EN LA VIA QUE CONDUCE A LOS MUNICIPIOS DE TEORAMA-SAN CALIXTO-HACARI, DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER, EN EL MARCO DE LA DECLARATORIA DE CALAMIDAD PUBLICA REALIZADA MEDIANTE DECRETO 001287 DEL 06 DE JUNIO DE 2024.**

Respetados señores:

El suscrito Revisor Fiscal EDWARD PERDOMO BERMUDEZ, hace CONSTAR que Albeiro Sepúlveda Arévalo, con cédula de ciudadanía o NIT 88.141.547, se encuentra a la fecha de este documento, y durante los últimos seis (6) meses, al día con sus aportes al sistema de seguridad social integral, sírvase decir, salud, pensión y riesgos profesionales; y con el pago de sus obligaciones parafiscales para con: las Cajas de Compensación Familiar (CCF), el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y el Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA).

La anterior certificación se expide para efectos de dar cumplimiento al Artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Atentamente,

EDWARD PERDOMO BERMUDEZ
Cédula de ciudadanía No. 1.091.668.240 de Ocaña
Matricula Profesional No. **T.P. 309888- T**

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

F 4 6 4 D 2 B 0 8 6 9 B A 1 7 F

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **EDWARD PERDOMO BERMUDEZ** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1091668240 de OCAÑA (N. DE SANTANDER) Y Tarjeta Profesional No 309888-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *

25

República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

309888-T



EDWARD
PERDOMO BERMUDEZ
C.C. 1091668240
RES. INSCRIPCION 193 DEL 30/05/2023
UNIVERSIDAD FRANCISCO DE PAULA SANTANDER

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA
DIRECTOR GENERAL

359329 36320

F.E 18-11-2024

CERTIFICADO PARA FISCALES
NOV-2024
ABEIRO SEPULVEDA REVALO

20034 1/0522

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como Contador Público o Entidad Prestadora de Servicios Contables, según corresponda, de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990 y el Decreto 1340 de 1998. Es personal e intransferible.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX: (60)(1) 644 4450 o devolverla a la UAE – Junta Central de Contadores a la Carrera 16 No. 97- 46 Of.301 en Bogotá D.C.

FIRMA

F.E 18-11-2024



REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **1.091.668.240**

PERDOMO BERMUDEZ

APELLIDOS

EDWARD

NOMBRES

FIRMA



FECHA DE NACIMIENTO **25-JUL-1992**

CONVENCION
(NORTE DE SANTANDER)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.75 ESTATURA | **O+** G.S. RH | **M** SEXO

17-SEP-2010 OCAÑA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

INDICE DERECHO

A-2506100-00743843-M-1091668240-20150906 **00462**56126A 1 6983555216

Gobernación de Norte de Santander	MACROPROCESO: SOPORTE	MS-CC-CS-03	
	GESTIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIÓN	FECHA 27/07/10	VERSIÓN 1
	CONTROL Y SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL	Página 1 de 3	

ACTA PARCIAL DE OBRA No. 01

FECHA DEL ACTA	25/noviembre /2024

1. GENERALIDADES DEL CONTRATO	
CONTRATO No. – FECHA	RE-SGRD-03405-2024 del 1/NOVI/2024
TIPO DE CONTRATO	Obra
DEPENDENCIA CONTRATANTE	Secretaría para la Gestión del Riesgo de Desastres
CONTRATISTA	ALBEIRO SEPULVEDA AREVALO
NIT.	8 8. 1 4 1. 5 4 7
REPRESENTANTE LEGAL	ALBEIRO SEPULVEDA AREVALO
C.C. o N.I. T	8 8. 1 4 1 .5 4 7
OBJETO DEL CONTRATO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y ATENCIÓN A PUNTOS CRITICOS EN LA VÍA QUE CONDUCE A LOS MUNICIPIOS DE TEORAMA - SAN CALIXTO - HACARÍ, DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER, EN EL MARCO DE LA DECLARATORIA DE CALAMIDAD PUBLICA REALIZADA MEDIANTE DECRETO 001287 DEL 06 DE JUNIO DE 2024
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	No. 00 000095 de Fecha 16 septiembre de 2024
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	CUTROCIENTOS NOVENTA Y OCHO MILLONES CIENTO TREINTA Y SEIS MIL SETECIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS MTC ($ 498.136.747,00)
PLAZO O DURACIÓN	60 DIAS
SUPERVISOR (Acto administrativo y fecha de designación)	William Vera Arias, secretario para la Gestión del Riesgo de Desastres Mediante Memorando de Designación de Supervisión de Fecha 6 de noviembre de 2024
INTERVENTOR	NO APLICA
FECHA ACTA DE INICIO	6 NOVIEMBRE 2024
ACTAS DE SUSPENSIÓN	-

Gobernación de Norte de Santander	MACROPROCESO: SOPORTE	MS-CC-CS-03	
	GESTIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIÓN	FECHA 27/07/10	VERSIÓN 1
	CONTROL Y SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL	Página 2 de 3	

ACTA PARCIAL DE OBRA No. 01

ACTAS DE REINICIO	-		
FECHA DE TERMINACION	-		
Garantía Única. No. 56-44-101008829 Anexo No.0 Aseguradora: Seguros Del Estado S.A. Fecha de Expedición: 02/11/2024 Fecha de aprobación: 06/11/2024	Amparos	Valor asegurado	Vigencia
	Cumplimiento del Contrato	$ 49.813.674.70	01/11/2024 al 30/04/2025
	Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e Indemnizaciones Laborales	$24.906.837.35	01/11/2024 al 31/12/2027
	Estabilidad y calidad de obra	$ 149.441.024.10	1 AÑO
Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual No. 56-40-101003860 Anexo No.0 Aseguradora: Seguros Del Estado S.A. Fecha de Expedición: 02/11/2024 Fecha de aprobación: 06/11/2024	Valor asegurado		Vigencia
	$ 260.000.000		01/11/2024 hasta 31/12/2024
ACTAS DE APROBACIÓN DE PRECIOS UNITARIOS NO PREVISTOS	NO APLICA		
ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES	NO APLICA		
ACTAS DE RECIBO PREVIAS	NO APLICA		
% EJECUTADO SEGÚN PRESENTE ACTA	49 %		
% EJECUTADO ACUMULADO	49 %		
% DE TIEMPO TRANSCURRIDO	=19 Dias trabajados / 60 Total Días: 31.66 %		

En San José de Cúcuta el 25 días del mes de noviembre de 2024, en las oficinas de la Secretaria Departamental de Gestión de Riesgo, se reunieron los suscritos a saber: **William Vera Arias**, Ordenador del Gasto por delegación, interventor Interno, NO APLICA Interventor Externo NO APLICA, ALBEIRO SEPULVEDA AREVALO C.C. 8 8. 1 4 1. 5 4 7 Como contratista, con el fin de

ACTA PARCIAL DE OBRA No. 01

realizar **Acta Parcial de Obra No. 01** al contrato en referencia, atendiendo a las cantidades y precios establecidos en el mismo, de acuerdo al detalle consignado en el Anexo No. 01 que forma parte integral de la presente acta.

Se firma la presente por los que en ella intervienen,

WILLIAM VERA ARIAS
Secretario para la Gestión del Riesgo de Desastres
Ordenador del Gasto - Supervisor

ALBEIRO SEPULVEDA AREVALO
C.C. 88.141.547
Contratista

NGRD Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres - Colombia / Gobernación de Norte de Santander	UNIDAD NACIONAL PARA LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES	MS-CC-CS-03 (ANEXO)
	ANEXO No. 1 AL ACTA DE RECIBO No. 1	FECHA DEL ACTA: 25-nov-24
	CONTRATO DE OBRA N° RE-SGRD-03405-2024 del 1 DE NOVIEMBRE 2024	

CONDICIONES DEL CONTRATO INICIAL O MODIFICADO						ACTA PARCIAL No. 01		EJECUTADO ACUMULADO			POR EJECUTAR	
ITEM	DESCRIPCION	UNID.	CANT.	V/R. UNIT.	VR/PARC.	CANT.	VR/PARC.	CANT.	VALOR	%	CANT.	VALOR
1	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO											
1,0	ROCERIA Y LIMPIEZA	M2	22.156	$ 2.132,00	$ 47.235.783,76	8200,00	$ 17.482.400,00	8200,0	$ 17.482.400,00	37,01%	13955,62	$ 29.753.383,76
2,0	LIMPIEZA MANUAL DE ALCANTARILLAS	UND	18,00	$ 255.681,00	$ 4.602.258,00		$ -	0,0	$ -	0,00%	18,00	$ 4.602.258,00
3,0	EXCAVACION MECANICA	M3	248,83	$ 12.394,00	$ 3.084.009,81	248,83	$ 3.084.009,81	248,8	$ 3.084.010,00	100,00%	0,00	$ -
4,0	MEJORAMIENTO DE LA CALZADA ADICIONANDO MATERIAL DE AFIRMADO	M3	1.664,00	$ 58.952,00	$ 98.096.128,00	968,4	$ 57.088.350,22	968,4	$ 57.088.350,00	58,20%	695,61	$ 41.007.777,78
5,0	CONFORMACION DE LA CALZADA CON MOTONIVELADORA	M3	41,00	$ 3.769.970,00	$ 154.568.770,00	16,70	$ 62.973.353,13	16,7	$ 62.973.353,00	40,74%	24,30	$ 91.595.416,87
6,0	TRANSPORTE DE MATERIAL CON VOLQUETA	M3/KM	23.288,30	$ 2.757,00	$ 64.205.843,10	14593,14	$ 40.233.279,97	14593,1	$ 40.233.280,00	62,66%	8695,16	$ 23.972.563,13
7,0	TRANSPORTE CAMABAJA	KM	360,00	$ 31.637,00	$ 11.389.320,00	180,00	$ 5.694.660,00	180,0	$ 5.694.660,00	50,00%	180,00	$ 5.694.660,00
	COSTO DIRECTO				$ 383.182.112,67		$ 186.556.053,13		$ 186.556.053,13			$ 196.626.059,54
	ADMINISTRACION	24%			$ 91.963.707,00		$ 44.773.452,75		$ 44.773.453			$ 47.190.254
	IMPREVISTO	1%			$ 3.831.821,13		$ 1.865.560,53		$ 1.865.560,53			$ 1.966.261
	UTILIDAD	5%			$ 19.159.106,00		$ 9.327.802,66		$ 9.327.802,66			$ 9.831.303,0
	COSTO TOTAL AIU				$ 114.954.634		$ 55.966.815,94		$ 55.966.815,94			$ 58.987.818
	COSTO TOTAL				$ 498.136.747,0		$ 242.522.869,07		$ 242.522.869,07			$ 255.613.877,93
	VALOR A PAGAR SEGÚN ACTA PARCIAL DE OBRA N° 1 DE 19 NOVIEMBRE 2024					49%		49%			51%	

DOCIENTOS CUARENTA Y DOS MILLONES QUINIENTOS VEINTI DOS MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS CON SIETE CENTAVOS MTC ($ 242,522,869,07)

MTC

SE FIRMA POR LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON:


EDGEIRO SEPULVEDA AREVALO
CONTRATISTA DE OBRA

WILLIAM VERA ARIAS
Ordenador del gasto

Gobernación de Norte de Santander

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

SOPORTE DEL ACTA No.	ACTA PARCIAL N° 1	**PERIODO DEL ACTA CORRESPONDIENTE**	**25-nov-24**
OBJETO	OPERATIVIDAD DEL BANCO DE MAQUINARIA DE LA GOBERNACION PARA LA ATENCION DE PUNTOS CRITICOS REHABILITACION Y RECONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA AFECTADA POR LA OLA INVERNAL 2023, DE CONFORMIDAD CON EL RETORNO A LA NORMALIDAD ADOPTADO MEDIANTE EL DECRETO 002623 DEL 26 DE OCTUBRE DEL 2023 Y LA EJECUCION DEL PLAN DE ACCION ESPECIFICO APROBADO POR EL CONSEJO DEPARTAMENTAL DE GESTION DEL RIESGO.		
CONTRATO No.	CONTRATO DE OBRA N° RE-SGRD-03405-2024 del 1 DE NOVIEMBRE 2024	**SUPERVISOR DEL DEPARTAMENTO**	WILLIAM VERA ARIAS
CONTRATISTA	R/L ALBEIRO SEPULVEDA AREVALO		
ITEM 1,0	ROCERIA Y LIMPIEZA	**UNIDAD**	m2

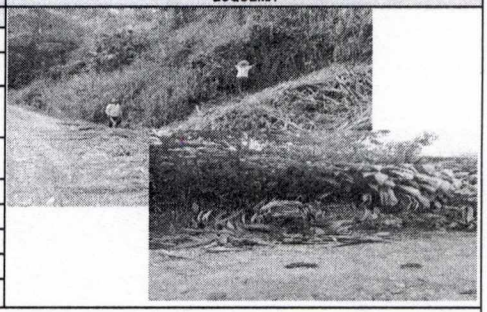LOCALIZACION	DESCRIPCION	DIMENSIONES			CANT	UND	TOTAL	ESQUEMA
		Long	Ancho	Altura			ACUMULADO	
corredor vial san calixto - hacari	labores de roceria y limpieza con una altura promedio de 2m	3000,00		2,00	6000,00	m2	6000,00	
corredor vial san calixto teorama	labores de roceria y limpieza con una altura promedio de 2m	1100,00		2,00	2200,00	M2	2200,00	
						TOTAL	8200,00	

Firma:

Nombre: R/L ALBEIRO SEPULVEDA AREVALO
CONTRATISTA DE OBRA


WILLIAM VERA ARIAS
SUPERVISOR

Gobernación de Norte de Santander

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

SOPORTE DEL ACTA No.	ACTA PARCIAL N° 1	**PERIODO DEL ACTA CORRESPONDIENTE**	**26-nov-24**
OBJETO	OPERATIVIDAD DEL BANCO DE MAQUINARIA DE LA GOBERNACION PARA LA ATENCION DE PUNTOS CRITICOS REHABILITACION Y RECONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA AFECTADA POR LA OLA INVERNAL 2023, DE CONFORMIDAD CON EL RETORNO A LA NORMALIDAD ADOPTADO MEDIANTE EL DECRETO 002623 DEL 26 DE OCTUBRE DEL 2023 Y LA EJECUCION DEL PLAN DE ACCION ESPECIFICO APROBADO POR EL CONSEJO DEPARTAMENTAL DE GESTION DEL RIESGO.		
CONTRATO No.	CONTRATO DE OBRA N° RE-SGRD-03405-2024 del 1 DE NOVIEMBRE 2024	**SUPERVISOR DEL DEPARTAMENTO**	WILLIAM VERA ARIAS
CONTRATISTA	R/L ALBEIRO SEPULVEDA AREVALO		
ITEM 3,0	EXCAVACION MECANICA	**UNIDAD**	M3

LOCALIZACION	DESCRIPCION	DIMENSIONES			CANT	UND	TOTAL ACUMULADO	ESQUEMA
		Long	Ancho	Altura				
corredor vial san calixto - hacari	la excavacion mecanica en zona de deposito de derrumbes sobre la via con promedios de altura de 1,4 ancho y 2,22 de alto	80,00	1,40	2,22			248,83	
						TOTAL	248,83	

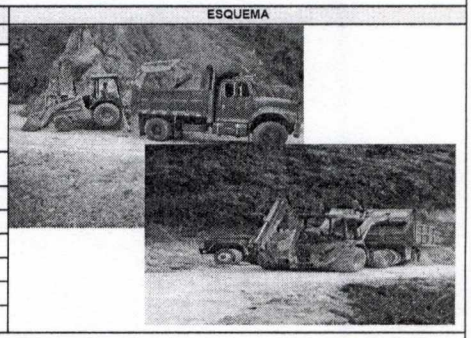

Elaboré
EL CONTRATISTA:

Firma:
Nombre: R/L ALBEIRO SEPULVEDA AREVALO
CONTRATISTA DE OBRA


WILLIAM VERA ARIAS
SUPERVISOR

Gobernación de Norte de Santander

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

SOPORTE DEL ACTA No.	ACTA PARCIAL N° 1	**PERIODO DEL ACTA CORRESPONDIENTE**	**25-nov-24**
OBJETO	OPERATIVIDAD DEL BANCO DE MAQUINARIA DE LA GOBERNACION PARA LA ATENCION DE PUNTOS CRITICOS REHABILITACION Y RECONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA AFECTADA POR LA OLA INVERNAL 2023. DE CONFORMIDAD CON EL RETORNO A LA NORMALIDAD ADOPTADO MEDIANTE EL DECRETO 002623 DEL 26 DE OCTUBRE DEL 2023 Y LA EJECUCION DEL PLAN DE ACCION ESPECIFICO APROBADO POR EL CONSEJO DEPARTAMENTAL DE GESTION DEL RIESGO.		
CONTRATO No.	CONTRATO DE OBRA N° RE-SGRD-03405-2024 del 1 DE NOVIEMBRE 2024	**SUPERVISOR DEL DEPARTAMENTO**	WILLIAM VERA ARIAS
CONTRATISTA	R/L ALBEIRO SEPULVEDA AREVALO		
ITEM	**4,0**	MEJORAMIENTO DE LA CALZADA ADICIONANDO MATERIAL DE AFIRMADO	**UNIDAD** M3/KM

LOCALIZACION	DESCRIPCION	DIMENSIONES			CANT	UND	TOTAL ACUMULADO	ESQUEMA
		Long	Ancho	Altura				
corredor vial san calixto - hacari	CONFORMACION CALZADA	1000,00	5,20	0,10		KM	520,00	
corredor vial san calixto teorama	CONFORMACION CALZADA	862,3	5,20	0,10		KM	448,40	
						TOTAL	968,40	

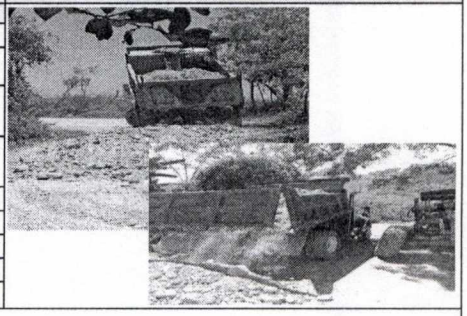

Firma:

Nombre: R/L ALBEIRO SEPULVEDA AREVALO
CONTRATISTA DE OBRA

WILLIAM VERA ARIAS
SUPERVISOR


Gobernación de Norte de Santander

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

SOPORTE DEL ACTA No.	ACTA PARCIAL N° 1	**PERIODO DEL ACTA CORRESPONDIENTE**	**26-nov-24**
OBJETO	OPERATIVIDAD DEL BANCO DE MAQUINARIA DE LA GOBERNACION PARA LA ATENCION DE PUNTOS CRITICOS REHABILITACION Y RECONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA AFECTADA POR LA OLA INVERNAL 2023. DE CONFORMIDAD CON EL RETORNO A LA NORMALIDAD ADOPTADO MEDIANTE EL DECRETO 002623 DEL 26 DE OCTUBRE DEL 2023 Y LA EJECUCION DEL PLAN DE ACCION ESPECIFICO APROBADO POR EL CONSEJO DEPARTAMENTAL DE GESTION DEL RIESGO.		
CONTRATO No.	CONTRATO DE OBRA N° RE-SGRD-03405-2024 del 1 DE NOVIEMBRE 2024	**SUPERVISOR DEL DEPARTAMENTO**	WILLIAM VERA ARIAS
CONTRATISTA	R/L ALBEIRO SEPULVEDA AREVALO		
ITEM 5,0	CONFORMACION DE LA CALZADA CON MOTONIVELADORA	**UNIDAD**	km

LOCALIZACION	DESCRIPCION	DIMENSIONES Long	expa		CANT	UND	TOTAL ACUMULADO
corredor vial san calixto - hacari	PERFILADO CUNETEO Y COMPACTADO	6,70				km	6,70
corredor vial san calixto teorama	PERFILADO CUNETEO Y COMPACTADO	10,00				km	10,00
						TOTAL	16,70

ESQUEMA

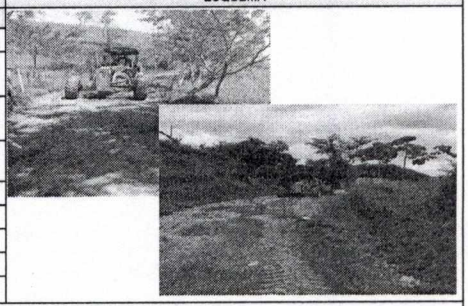

Elaboró
EL CONTRATISTA:

Firma:
Nombre: R/L ALBEIRO SEPULVEDA AREVALO
CONTRATISTA DE OBRA

WILLIAM VERA ARIAS
SUPERVISOR

Gobernación de Norte de Santander

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

SOPORTE DEL ACTA No.	ACTA PARCIAL N° 1	PERIODO DEL ACTA CORRESPONDIENTE	19-abr-24
OBJETO	OPERATIVIDAD DEL BANCO DE MAQUINARIA DE LA GOBERNACION PARA LA ATENCION DE PUNTOS CRITICOS REHABILITACION Y RECONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA AFECTADA POR LA OLA INVERNAL 2023, DE CONFORMIDAD CON EL RETORNO A LA NORMALIDAD ADOPTADO MEDIANTE EL DECRETO 002623 DEL 26 DE OCTUBRE DEL 2023 Y LA EJECUCION DEL PLAN DE ACCION ESPECIFICO APROBADO POR EL CONSEJO DEPARTAMENTAL DE GESTION DEL RIESGO		
CONTRATO No.	CONTRATO DE OBRA N° RE-SGRD-03405-2024 del 1 DE NOVIEMBRE	SUPERVISOR DEL DEPARTAMENTO	WILLIAM VERA ARIAS
CONTRATISTA	R/L ALBEIRO SEPULVEDA AREVALO		
ITEM 7,0	TRANSPORTE CAMABAJA	UNIDAD	KM

LOCALIZACION	DESCRIPCION	DIMENSIONES			CANT	UND	TOTAL ACUMULADO
		Long	Ancho	Altura			
san calixto	motoniveladora	30,00			2,00	KM	60,00
san calixto	pajarita	30,00			2,00		60,00
san calixto	vivrocompactador	30,00			2,00		60,00
					TOTAL		180,00

ESQUEMA



Firma:

Nombre: R/L ALBEIRO SEPULVEDA AREVALO
CONTRATISTA DE OBRA

WILLIAM VERA ARIAS
SUPERVISOR

Gobernación de Norte de Santander	MACROPROCESO ESTRATÉGICO	ME-IE-CI-03	
	PROCESO: GESTIÓN DE COMUNICACIONES INTERNAS Y EXTERNAS	FECHA 05/05/2009	VERSIÓN 1
	PROTOCOLO DE COMUNICACIONES INTERNAS	Página 1 de 8	

ACTA DE REUNIÓN

Fecha: 18 de noviembre de 2024	Hora de inicio: 9:00 AM	Hora de finalización: 12:00 AM
Lugar: presencial	Responsable de la reunión: SGRD	
Tipo de Reunión: comité de obra del contrato RE-SGRD-03405-2024		Acta No 01

TEMAS A TRATAR

1. Avance de la obra para el mantenimiento de corredor vial
2. Imprevistos presentados durante la ejecución

DESARROLLO COMITÉ DE OBRA

En el Municipio de san Calixto, Departamento Norte de Santander a los dieciocho (15) días del mes de noviembre de 2024, un equipo de profesionales acompañados por el secretario de riesgos departamental el ingeniero WILLIAM VERA ARIAS, se dirigió a inmediaciones del municipio de san Calixto para verificar el estado de la via que se estaba interviniendo y la calidad de los trabajos que se viene presentando durante los primeros días de ejecucion, en ella adema del secretario se conto con presencia del contratista ALBEIRO SEPULVEDA AREVALO identificado C.C. 8 8. 1 4 1. 5 4 7 y el ingeniero LUIS FERNANDO BARON ORTIZ, identificado con C.C. 1.090.455.569 apoyo a la secretaria de gestión del riesgo del departamento con C.C. 1.090.475.; para dejar constancia por medio de la presente acta de Comité de Obra, las actividades realizadas a la fecha y contempladas dentro del contrato en mención, cuyo objeto es "MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y ATENCIÓN A PUNTOS CRITICOS EN LA VÍA QUE CONDUCE A LOS MUNICIPIOS DE TEORAMA - SAN CALIXTO - HACARÍ, DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER, EN EL MARCO DE LA DECLARATORIA DE CALAMIDAD PUBLICA REALIZADA MEDIANTE DECRETO 001287 DEL 06 DE JUNIO DE 2024" por un valor económico de CUTROCIENTOS NOVENTA Y OCHO MILLONES CIENTO TREINTA Y SEIS MIL SETECIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS MTC ($ 498.136.747,00y un plazo de ejecución de 60 DIAS, lo anterior según lo descrito a continuación:

CONTRATO No. - FECHA	RE-SGRD-03405-2024
TIPO DE CONTRATO	Obra
DEPENDENCIA CONTRATANTE	Secretaría para la Gestión del Riesgo de Desastres

Gobernación de Norte de Santander	MACROPROCESO ESTRATÉGICO	ME-IE-CI-03	
	PROCESO: GESTIÓN DE COMUNICACIONES INTERNAS Y EXTERNAS	FECHA 05/05/2009	VERSIÓN 1
	PROTOCOLO DE COMUNICACIONES INTERNAS	Página 2 de 8	

ACTA DE REUNIÓN

CONTRATISTA	ALBEIRO SEPULVEDA AREVALO
C.C. o N.I.T.	88.141.547
REPRESENTANTE LEGAL	ALBEIRO SEPULVEDA AREVALO
C.C.	88.141.547
OBJETO DEL CONTRATO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y ATENCIÓN A PUNTOS CRITICOS EN LA VÍA QUE CONDUCE A LOS MUNICIPIOS DE TEORAMA - SAN CALIXTO - HACARÍ, DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER, EN EL MARCO DE LA DECLARATORIA DE CALAMIDAD PUBLICA REALIZADA MEDIANTE DECRETO 001287 DEL 06 DE JUNIO DE 2024
VALOR DEL CONTRATO	CUTROCIENTOS NOVENTA Y OCHO MILLONES CIENTO TREINTA Y SEIS MIL SETECIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS MTC ($ 498.136.747,00)
PLAZO O DURACIÓN	60 DIAS
FORMA DE PAGO	EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER, realizó los análisis de precios unitarios de las obras requeridas, fijándose como valor total para el contrato a ejecutar la suma de CUTROCIENTOS NOVENTA Y OCHO MILLONES CIENTO TREINTA Y SEIS MIL SETECIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS MTC ($ 498.136.747,00), Valor que será pagado por el DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER al CONTRATISTA mediante actas parciales, previa presentación por parte del Contratista del informe de ejecución de las actividades relacionadas con el objeto del contrato, certificación de cumplimiento a satisfacción expedida por el supervisor del contrato, y de la prestación de los respectivos soportes de pago de aportes al sistema de seguridad social en salud, pensión, y riesgos profesionales, de conformidad con lo establecido en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, en el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, y en la Ley 1562 de 2012, y demás normas vigentes. Ante el incumplimiento de estas obligaciones, el DEPARTAMENTO dará aviso de tal situación a las autoridades competentes.
LUGAR DE EJECUCIÓN	Departamento Norte de Santander

Gobernación de Norte de Santander	MACROPROCESO ESTRATÉGICO	ME-IE-CI-03	
	PROCESO: GESTIÓN DE COMUNICACIONES INTERNAS Y EXTERNAS	FECHA 05/05/2009	VERSIÓN 1
	PROTOCOLO DE COMUNICACIONES INTERNAS	Página 3 de 8	

ACTA DE REUNIÓN

RUBRO	2.3.2.02.02.008 Servicios prestados a las empresas y servicios de producción
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	No. 00 000095 de Fecha 16 septiembre de 2024
SUPERVISOR (Acto administrativo y fecha de designación)	William Vera Arias, secretario para la Gestión del Riesgo de Desastres Mediante Memorando de Designación de Supervisión de Fecha 5 de noviembre de 2024
INTERVENTOR (Acto administrativo y fecha de designación)	

1. VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO Y LEGALIZACIÓN PARA INICIO DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL

2.1 REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO

REQUISITO	FECHA
Fecha de suscripción	1 Noviembre de 2024
Registro Presupuestal	No.00 000136 de Fecha 1 noviembre 2024

2.2 REQUISITOS DE LEGALIZACIÓN

REQUISITO	FECHA		
Impuesto de timbre	No Aplica		
Publicación Gaceta	No Aplica		
Garantía Única. No. 56-44-101008829 Anexo No.0 Aseguradora: Seguros Del Estado S.A. Fecha de Expedición: 02/11/2024 Fecha de aprobación: 06/11/2024	Amparos	Valor asegurado	Vigencia
	Cumplimiento del Contrato	$ 49.813.674.70	01/11/2024 al 30/04/2025
	Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e Indemnizaciones Laborales	$24.906.837.35	01/11/2024 al 31/12/2027

ACTA DE REUNIÓN

	Estabilidad y calidad de obra	$74,295,552.70	5 AÑOS
Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual No. 56-40-101003860 Anexo No.0 Aseguradora: Seguros Del Estado S.A. Fecha de Expedición: 02/11/2024 Fecha de aprobación: 06/11/2024	Valor asegurado	Vigencia	
	$ 260.000.000	01/11/2024 hasta 01/01/2025	

El ingeniero ALBEIRO SEPULVEDA AREVALO toma la palabra para poner en conocimiento al secretario de gestión del riesgo de desastres acerca del avance en la ejecución del contrato en detalle, donde manifiesta que para aprovechar el buen clima que se viene presentando en los últimos días se adelantaron trabajos con dos frentes de trabajo, uno Hacarí- san Calixto, y el otro san Calixto teorama.

La vía que teorama-san Calixto presenta un alto grado de deterioro lo que dificultaba un poco el acceso en algunos puntos neurálgicos para este corredor vial, igual se habilito paso los primeros días ya que eso permitió ubicar maquinaria amarilla en el sector de san Calixto-Hacarí, para poder iniciar las labores en ese corredor vial. Por solicitud del alcalde de san Calixto se coordinó los trabajos de rocería con los pobladores de las veredas aledañas en donde se vienen adelantando acciones y durante reconocimiento del corredor vial no se cuenta con las suficientes obras de arte para el manejo apropiado de las aguas lo que producto de las precipitaciones generan cárcavas y deterioro de la vía.

Durante el recorrido que se realizó hace presencias miembros de la comunidad donde manifiestan preocupación por el estado de la vía, pero reconocen que los trabajos que se vienen realizando son un motor importante para garantizar la transitabilidad y mantener el comercio activo de la zona, de igual forma también manifiestan que se requieren la construcción de alcantarillas y seguir enviando maquinaria para mantener en buen estado este corredor vial.

Toma la palabra el ingeniero William Vera Arias y manifiesta que como gobernación vamos a realizar una inspección a detalle y a hacer un inventario de las obras de arte con las que cuenta la vía y las que se necesita para en un futuro buscar las formas de materializar a través de un proyecto la construcción de las mismas.

Gobernación de Norte de Santander	MACROPROCESO ESTRATÉGICO	ME-IE-CI-03	
	PROCESO: GESTIÓN DE COMUNICACIONES INTERNAS Y EXTERNAS	FECHA 05/05/2009	VERSIÓN 1
	PROTOCOLO DE COMUNICACIONES INTERNAS	Página 5 de 8	


ACTA DE REUNIÓN




El ingeniero Albeiro manifiesta que va a seguir laborando continuamente para ejecutar las actividades restantes y así minimizar el tiempo de ejecución y disminuyendo la inconformidad de los transportadores y usuarios de estsos corredores viales.

Gobernación de Norte de Santander	MACROPROCESO ESTRATÉGICO	ME-IE-CI-03	
	PROCESO: GESTIÓN DE COMUNICACIONES INTERNAS Y EXTERNAS	FECHA 05/05/2009	VERSIÓN 1
	PROTOCOLO DE COMUNICACIONES INTERNAS	Página 6 de 8	

ACTA DE REUNIÓN

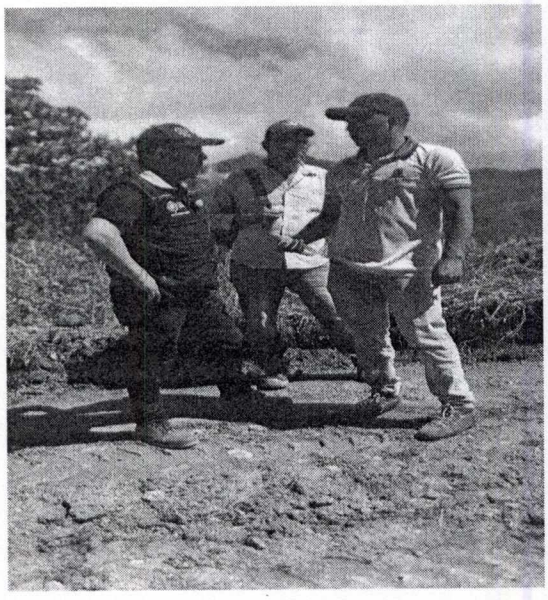

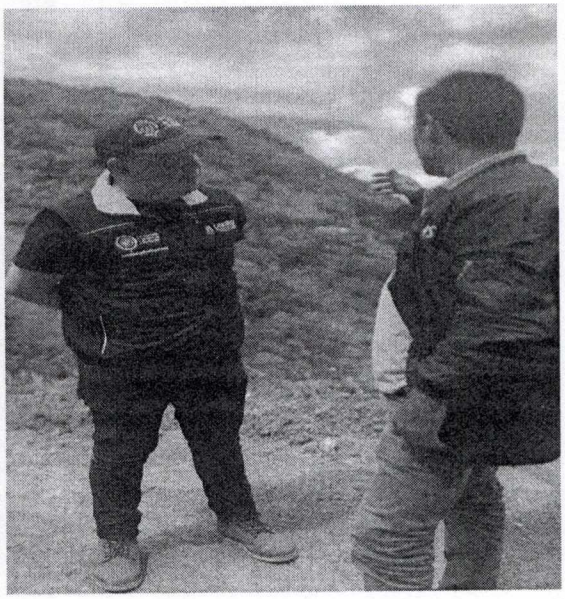







Gobernación de Norte de Santander	MACROPROCESO ESTRATÉGICO	ME-IE-CI-03	
	PROCESO: GESTIÓN DE COMUNICACIONES INTERNAS Y EXTERNAS	FECHA 05/05/2009	VERSIÓN 1
	PROTOCOLO DE COMUNICACIONES INTERNAS	Página 7 de 8	

ACTA DE REUNIÓN

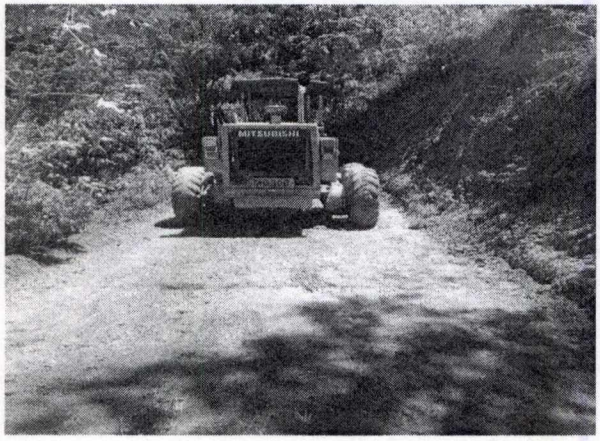

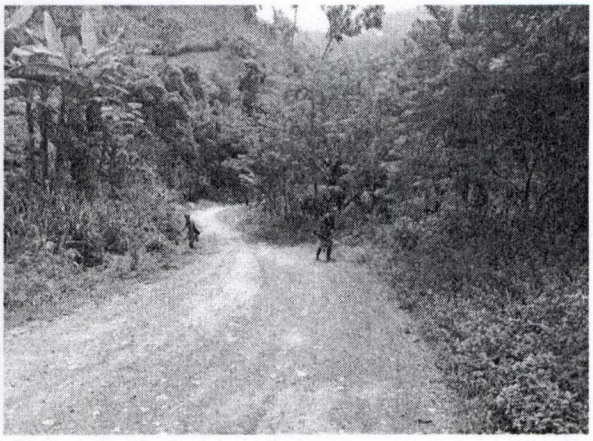

Para finalizar el ingeniero Albeiro deja claridad que en los últimos días se han presentado fuertes precipitaciones que han dificultado seguir realizando las actividades con total normalidad y que esto genera retrocesos en algunas de las actividades que se tienen contempladas en la programación de la obra.

WILLIAM VERA ARIAS

Secretario para la Gestión del Riesgo de Desastres

Ordenador del Gasto - Supervisor

ALBEIRO SEPULVEDA AREVALO

C.C. 88.141.547

Contratista

LUIS FERNANDO BARON ORTIZ

ING. APOYO SECRETARIA DEPARTAMENTAL GESTION DEL RIESGO

Gobernación de Norte de Santander	MACROPROCESO ESTRATÉGICO	ME-IE-CI-03	
	PROCESO: GESTIÓN DE COMUNICACIONES INTERNAS Y EXTERNAS	FECHA 05/05/2009	VERSIÓN 1
	PROTOCOLO DE COMUNICACIONES INTERNAS	Página 8 de 8	

ACTA DE REUNIÓN

ANEXOS SI (X) NO ( ) - Balance	*Fecha de aprobación del acta:*

Elaboró: Luis Fernando Baron Ortiz– Contratista	*Revisó:* ***William Vera Arias – Jefe de Oficina***	*Próxima Reunión:*

Una vez leída y aprobada la presente acta, se valida con quienes intervinieron:

ALBEIRO SEPÚLVEDA ARÉVALO
UNIVERSIDAD FRANCISCO DE PAULA SANTANDER
MP- 54202096245 NTS.

INFORME DE OBRA

FECHA 25 NOVIEMBRE DEL 2024

PERIODO: 6 DE NOVIEMBRE DEL 2024 AL 25 DE NOVIEMBRE DEL 2024

CONTRATO DE OBRA N°. RE-SGRD-03405-2024

OBJETO: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y ATENCIÓN A PUNTOS CRITICOS EN LA VÍA QUE CONDUCE A LOS MUNICIPIOS DE TEORAMA - SAN CALIXTO - HACARÍ, DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER, EN EL MARCO DE LA DECLARATORIA DE CALAMIDAD PUBLICA REALIZADA MEDIANTE DECRETO 001287 DEL 06 DE JUNIO DE 2024

CONTRATISTA: ALBEIRO SEPULVEDA AREVALO
NIT: 8 8. 1 4 1. 5 4 7

CONTRATANTE: GOBERNACION DE NORTE DE SANTANDER

SECRETARIA DEPARTAMENTAL PARA LA GESION DEL RIESGO DE DESASTRES

SAN JOSÉ DE CÚCUTA-NORTE DE SANTANDER

2024

Calle 7 # 26 – 30 Barrio las Llanadas Ocaña N de S. Teléfono. 3136907332, albeirosea@gmail.com

ALBEIRO SEPÚLVEDA ARÉVALO
UNIVERSIDAD FRANCISCO DE PAULA SANTANDER
MP- 54202096245 NTS.

CONDICIONES INICIALES DEL CONTRATO .

1. GENERALIDADES DEL CONTRATO	
CONTRATO No. - FECHA	RE-SGRD-03405-2024 del 1/NOVI/2024
TIPO DE CONTRATO	Obra
DEPENDENCIA CONTRATANTE	Secretaría para la Gestión del Riesgo de Desastres
CONTRATISTA	ALBEIRO SEPULVEDA AREVALO
C.C. o N.I.T.	88. 141. 547
REPRESENTANTE LEGAL	ALBEIRO SEPULVEDA AREVALO
C.C.	88. 141 .547
OBJETO DEL CONTRATO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y ATENCIÓN A PUNTOS CRITICOS EN LA VÍA QUE CONDUCE A LOS MUNICIPIOS DE TEORAMA - SAN CALIXTO - HACARÍ, DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER, EN EL MARCO DE LA DECLARATORIA DE CALAMIDAD PUBLICA REALIZADA MEDIANTE DECRETO 001287 DEL 06 DE JUNIO DE 2024
VALOR DEL CONTRATO	CUTROCIENTOS NOVENTA Y OCHO MILLONES CIENTO TREINTA Y SEIS MIL SETECIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS MTC ($ 498.136.747,00)
PLAZO O DURACIÓN	60 DIAS
FORMA DE PAGO	Se realizara mediante pagos parciales, previa presentación de acta de recibo parcial, memorias de cantidades, factura correspondiente y demás documentos requeridos.

GARANTIAS Y AMPAROS DEL CONTRATO.

	Amparos	Valor asegurado	Vigencia
Garantía Única. No. 56-44-101008829 Anexo No.0 Aseguradora: Seguros Del Estado S.A. Fecha de Expedición: 02/11/2024 Fecha de aprobación: 06/11/2024	Cumplimiento del Contrato	$ 49.813.674.70	01/11/2024 al 30/04/2025
	Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e Indemnizaciones Laborales	$24.906.837.35	01/11/2024 al 31/12/2027
	Estabilidad y calidad de obra	$ 149.441.024.10	1 AÑO
Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual No. 56-40-101003860 Anexo No.0 Aseguradora: Seguros Del Estado S.A. Fecha de Expedición: 02/11/2024 Fecha de aprobación: 06/11/2024	Amparos	Valor asegurado	Vigencia
			01/11/2024 hasta 31/12/2024
	Predios labores y operaciones	$ 260.000.000	

ALBEIRO SEPÚLVEDA ARÉVALO
UNIVERSIDAD FRANCISCO DE PAULA SANTANDER
MP- 54202096245 NTS.

DESCRIPCION DE AVANCE DE OBRA.

Desde el dia 6 de noviembre del 2024 se han adelantado atividades para el mantenimiento y atencion a puntos criticos del corredor vial que comprende los municipios de teorama-san calixto-hacari, en pro de atender la emergencia que se viene presentado alli, para ello se dispuso de dos frentes de trabajo buscando optimizar los tiempos de ejecucion y garantizando la calidad del mismo, teniendo encuenta que actualmente se esta atravesando por la segunda temporadas de lluvias. Por ende se han realizado labores continuas en dias soleados, para mostrar y obtener un avance considerable y estar dentro de los tiempos establecidos.

Las actividades realizadas durante el periodo comprendido del 6 de noviembre del 2024 al 25 noviembre son:

ITEM	DESCRIPCION	UNID.	CANT.
1	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO		
1,0	ROCERIA Y LIMPIEZA	M2	8200,00
2,0	LIMPIEZA MANUAL DE ALCANTARILLAS	UND	
3,0	EXCAVACION MECANICA	M3	248,83
4,0	MEJORAMIENTO DE LA CALZADA ADICIONANDO MATERIAL DE AFIRMADO	M3	968,4
5,0	CONFORMACION DE LA CALZADA CON MOTONIVELADORA	M3	16,70
6,0	TRANSPORTE DE MATERIAL CON VOLQUETA	M3/KM	14593,14
7,0	TRANSPORTE CAMABAJA	KM	180,00

Calle 7 # 26 – 30 Barrio las Llanadas Ocaña N de S. Teléfono. 3136907332, albeirosea@gmail.com

ALBEIRO SEPÚLVEDA ARÉVALO
UNIVERSIDAD FRANCISCO DE PAULA SANTANDER
MP- 54202096245 NTS.

Teniendo en cuenta las cantidades inicales con respecto a las presentadas actuamelte el porcentaje de avance general se encuetra en un 49% ejecutado durante un tiempo estimado de 19 dias sobre 60 lo que nos da un porcentaje 31.66%.

1. AVANCE DE TIEMPO

PLAZO DE EJECUCION: 60 DIAS

TIEMPO TOTAL TRANSCURRIDO: 19 dias / 60 dias


AVANCE PORCENTUAL: 31.66 %

Realizando una relación de avance de obra y tiempo de ejecución, nos encontramos dentro de los limites estableciodos dentro del contrato generando un avance considerable.

LAS ACTIVIDADES SE DESCRIBEN UNA A UNA EN LA SIGUIENTE TABLA

ACTIVIDAD	CANTIDAD	
	EJECUTADO	%
ROCERIA Y LIMPIEZA	8200,00	37.01




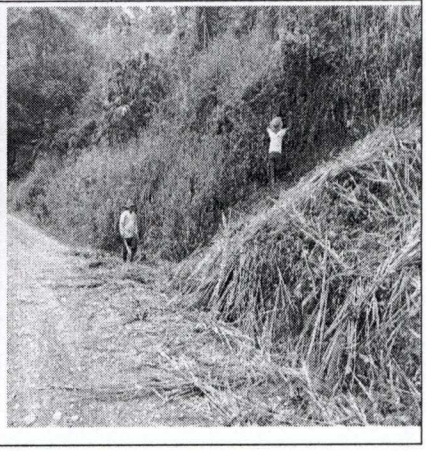

ACTIVIDAD	CANTIDAD	
	EJECUTADO	%
LIMPIEZA MANUAL DE ALCANTARILLA	0	0

ALBEIRO SEPÚLVEDA ARÉVALO
UNIVERSIDAD FRANCISCO DE PAULA SANTANDER
MP- 54202096245 NTS.


No se han realizado limpieza de alcantarillas en la zona se presentan muy pocas obras de arte y as existentes se encuentran en buen estado	N/A

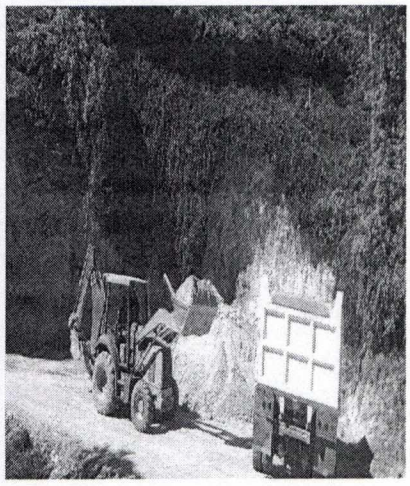ACTIVIDAD	CANTIDAD	
EXCAVACION MECANICA	EJECUTADO	%
	248,83	100
		


ACTIVIDAD	CANTIDAD	
CONFORMACION DE CALZADA CON MOTONIVELADORA	EJECUTADO	%
	16.70	40.74


ALBEIRO SEPÚLVEDA ARÉVALO
UNIVERSIDAD FRANCISCO DE PAULA SANTANDER
MP- 54202096245 NTS.



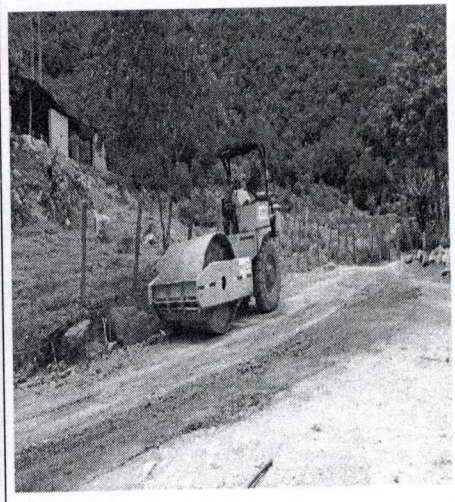

ACTIVIDAD	CANTIDAD	
MEJORAMIENTO DE LA CALZADA ADICIONANDO MATERIAL	EJECUTADO	%
	968 M3	58.20

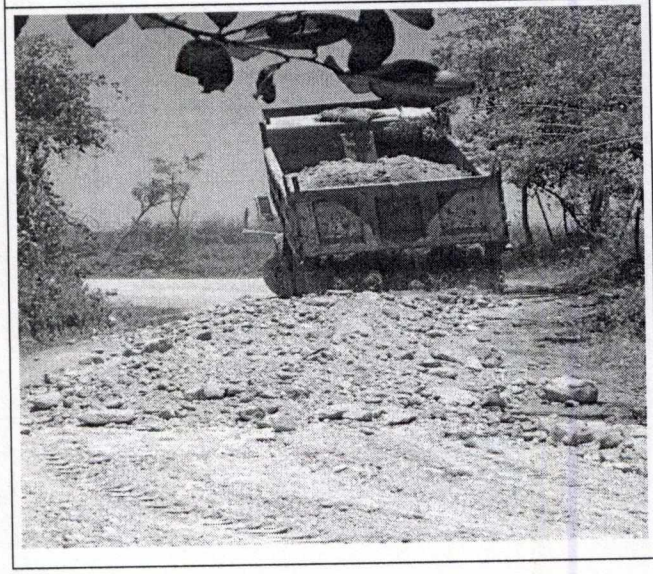


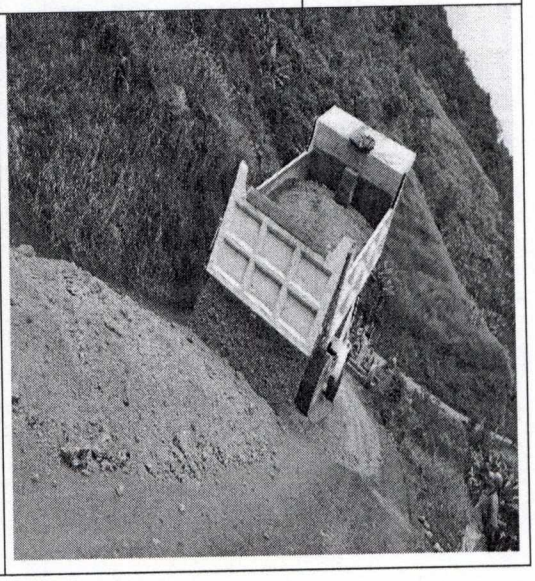


ACTIVIDAD	CANTIDAD	
	EJECUTADO	%

ALBEIRO SEPÚLVEDA ARÉVALO
UNIVERSIDAD FRANCISCO DE PAULA SANTANDER
MP- 54202096245 NTS.

TRANSPORTE DE MATERIAL CON VOLQUETA	14593.1	62.66

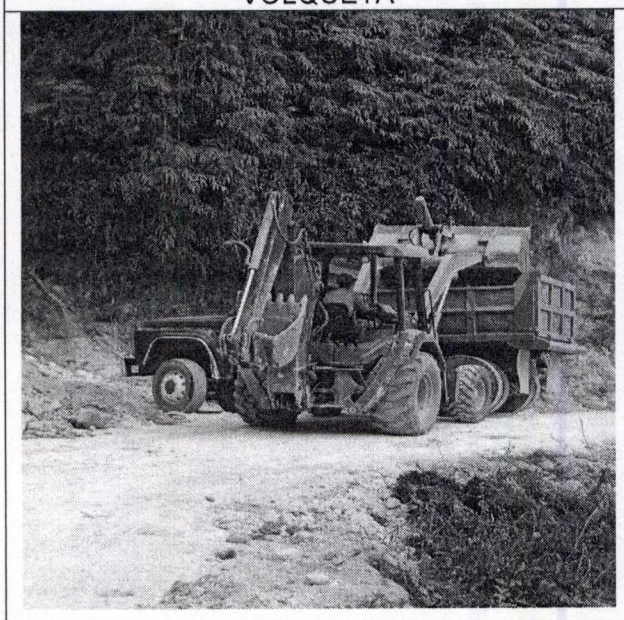

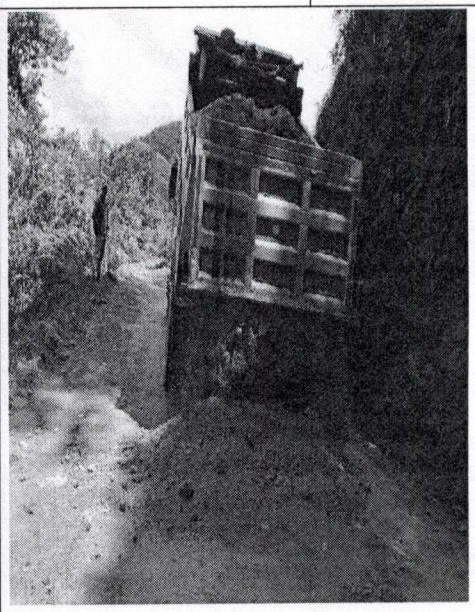

ACTIVIDAD	CANTIDAD	
	EJECUTADO	%
TRANSPORTE CAMA BAJA	180 KM	50



S

Descripción de trabajos realizados durante el periodo comprendido entre el 6 de noviembre al 25 noviembre 2024

- semana 1 que inicia el dia 6 de noviembre hasta el 9 de noviembre del 2024

ALBEIRO SEPÚLVEDA ARÉVALO
UNIVERSIDAD FRANCISCO DE PAULA SANTANDER
MP- 54202096245 NTS.

se procede a trasladar maquinaria amarilla hasta el municipio de teorama, para desde allí dar inicio al contrato de obra en mención realizando unos trabajos en unos puntos críticos ubicados cerca a la vereda el pompayo, donde el paso era restringido producto de erosion de talud y cárcavas de gran tamaño lo que impedían el flujo vehicular normal y colocaban en riesgo la transitabilidad de los pobladores del sector. Se procede a instalar valla informativa de los trabajos que se van a realizar.

- Semana 2 desde 11 noviembre al 16 noviembre 2024

Durante esta semana se logra coordinar con el señor alcalde del municipio de san Calixto para dar inicio con las labores de roceria y limpieza de la maleza que se ubica sobre las laderas de la via y que impiden la visibilidad de los condcutores en las curvas estrechas y parte de la via que comprende la conexión de las dos cabeceras municipales (san Calixto – teorama), de la misma forma se traslada la maquinaria amarilla vibrocompactador- motoniveladora- retroexcavadora sobre ruedas (pajarita), hacia la entrada del municipio de san Calixto para iniciar trabajos sentido san Calixto- teorama, desde el monumento la virgen hacia la vereda la quina, logrando un avance de conformación de de 5.2 km y retirando pequeños derrumbes depositados sobre la via. A mediado de la semana 2 se procede a colocar otro combo de maquinaria conformado por una retroexcavadora sobre ruedas una motoniveladora y se contrata asi mismo volquetas que se ubican sobre el municipio de hacari y que inica labores por eje vial secundario que comunica la cabecera municipal con la vereda la pelota.

- Semana3 desde el 18 de noviembre hasta el 23 noviembre 2024

Se continúan labores con la maquinaria ubicada en el corredor vial entre hacari- san Calixto, en los sectores de la travesía y la esperanza que colindan con parte de este eje vial y conduce hacia centro poblado la pelota, se inician labores de roceria con personal de la zona.
Se continúan las labores de confromacion (perfilado, cuneteo, compactación) de via agregando material para eliminar presencias de cárcavas y baches donde se acumulaba cantidades de agua lo que deterioraban el estado de la via e impedían el fácil acceso al municipio, de la misma forma se continúan con las labores de roceria y limpieza.
Durante esta semana se han presentado fuertes precipitaciones que ocasionaron retrocesos en los trabajos y debido a inestabilidad de los terrenos en algunos puntos sobre la via y a la no presencia de obras de arte necesarias para el manejo de las diferentes fuentes de agua que se generan por lluvias o nacimientos del sector. La actividad que ha tocado realizar nuevamente fue la de excavación mecánica y retiro de derrumbes ya que se había limitado el ancho del carril producto de lo descrito anteriormente.

ALBEIRO SEPÚLVEDA ARÉVALO
UNIVERSIDAD FRANCISCO DE PAULA SANTANDER
MP- 54202096245 NTS.

- Consolidado de las actividades ejecutadas vs actividades por ejecutar al corte de 25 noviembre 2024.

1,0	ROCERIA Y LIMPIEZA	8200,0	37,01%	13955,62
2,0	LIMPIEZA MANUAL DE ALCANTARILLAS	0,0	0,00%	18,00
3,0	EXCAVACION MECANICA	248,8	100,00%	0,00
4,0	MEJORAMIENTO DE LA CALZADA ADICIONANDO MATERIAL DE AFIRMADO	968,4	58,20%	695,61
5,0	CONFORMACION DE LA CALZADA CON MOTONIVELADORA	16,7	40,74%	24,30
6,0	TRANSPORTE DE MATERIAL CON VOLQUETA	14593,1	62,66%	8695,16
7,0	TRANSPORTE CAMABAJA	180,0	50,00%	180,00

2. ASPETOS HUMANOS

Para el presente contrato, se realizaron las correspondientes afiliaciones al sistema de seguridad social (riesgos laborales, salud y fondo de pensiones) del personal que participo en la ejecución de las actividades contractuales.
De igual manera, se superviso el uso de los elementos de protección personal de los trabajadores como mecanismo de prevención de eventos que pudiera afectar la integridad del talento humano que hace parte de la ejecución del contrato y se realizaron actividades periodicas de revisión de la maquinaria

Anexo. Planilla de Seguridad Social

ALBEIRO SEPÚLVEDA ARÉVALO
UNIVERSIDAD FRANCISCO DE PAULA SANTANDER
MP- 54202096245 NTS.

REGISTRO FOTOGRAFICO

1. VALLA INFORMATIVA DEL CONTRATO EN MENCION



ALBEIRO SEPÚLVEDA ARÉVALO
UNIVERSIDAD FRANCISCO DE PAULA SANTANDER
MP- 54202096245 NTS.

2. Roceria y limpieza






Calle 7 # 26 – 30 Barrio las Llanadas Ocaña N de S. Teléfono. 3136907332, albeirosea@gmail.com

ALBEIRO SEPÚLVEDA ARÉVALO
UNIVERSIDAD FRANCISCO DE PAULA SANTANDER
MP- 54202096245 NTS.



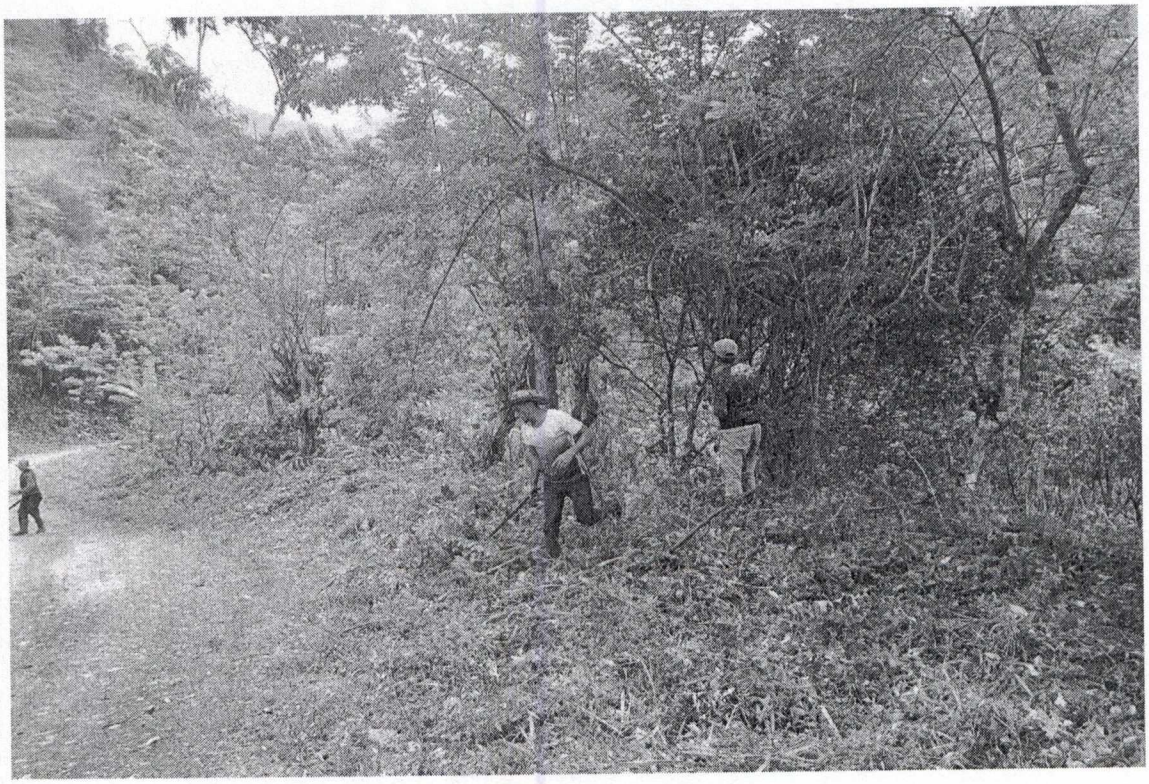

Calle 7 # 26 – 30 Barrio las Llanadas Ocaña N de S. Teléfono. 3136907332, albeirosea@gmail.com

ALBEIRO SEPÚLVEDA ARÉVALO
UNIVERSIDAD FRANCISCO DE PAULA SANTANDER
MP- 54202096245 NTS.

3. Excavacion mecanica






Calle 7 # 26 – 30 Barrio las Llanadas Ocaña N de S. Teléfono. 3136907332, albeirosea@gmail.com

ALBEIRO SEPÚLVEDA ARÉVALO
UNIVERSIDAD FRANCISCO DE PAULA SANTANDER
MP- 54202096245 NTS.

4. Mejoramiento de calzada agregando material de afirmado

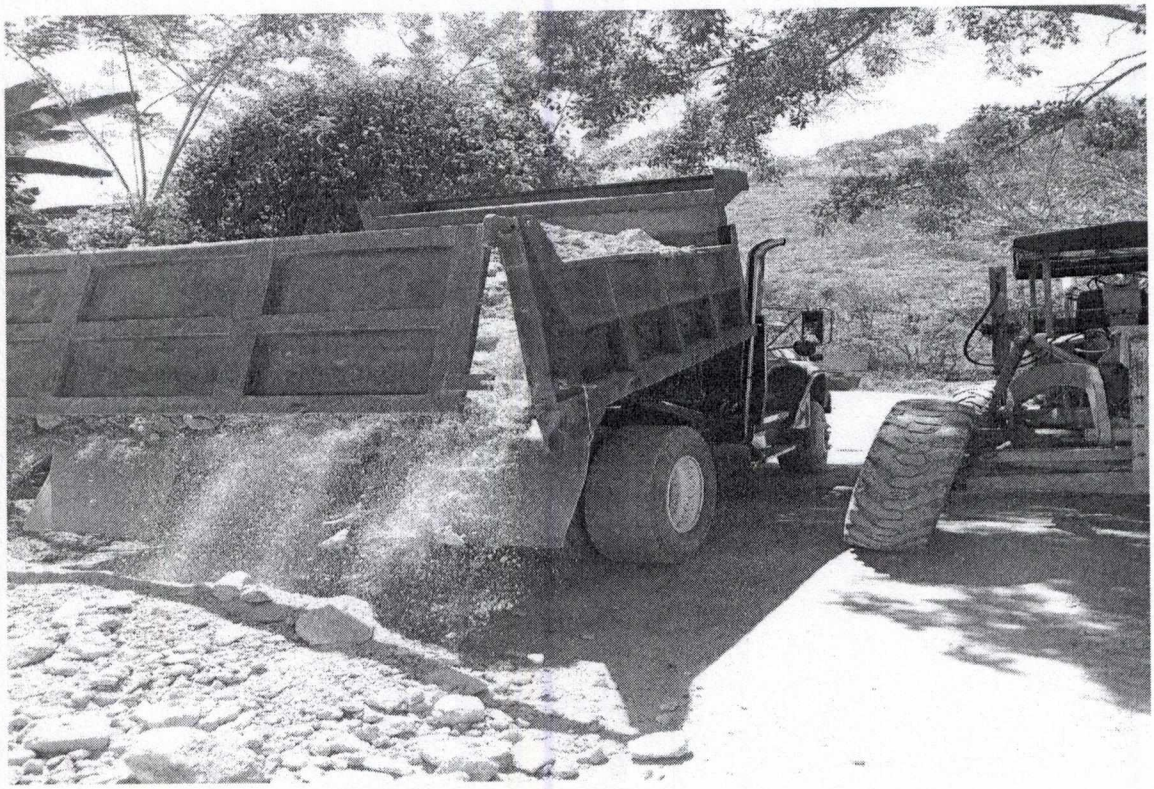





Calle 7 # 26 – 30 Barrio las Llanadas Ocaña N de S. Teléfono. 3136907332, albeirosea@gmail.com

ALBEIRO SEPÚLVEDA ARÉVALO
UNIVERSIDAD FRANCISCO DE PAULA SANTANDER
MP- 54202096245 NTS.

5. Conformación de calzada con motoniveladora y virbrocompatador

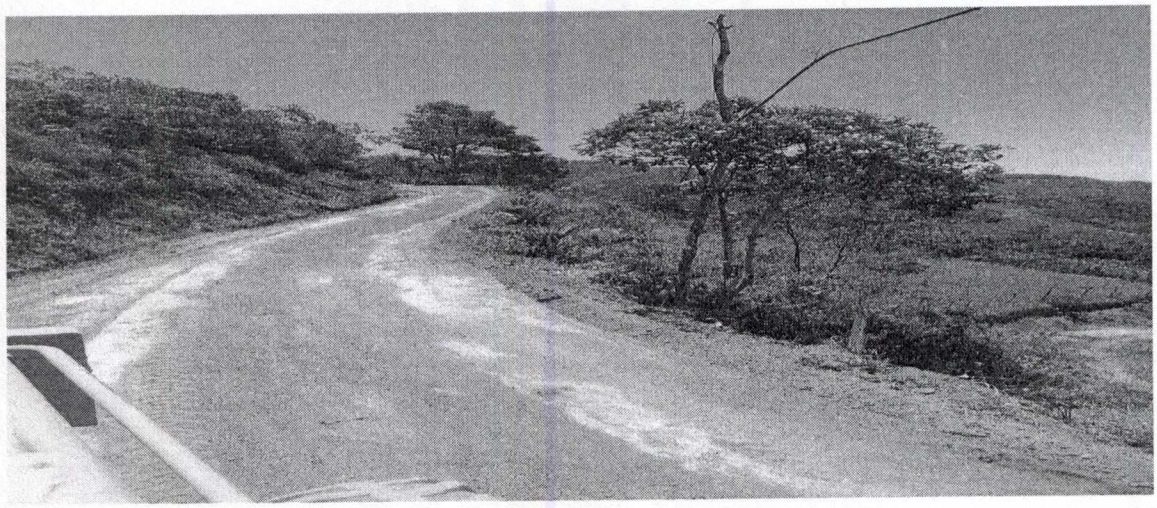

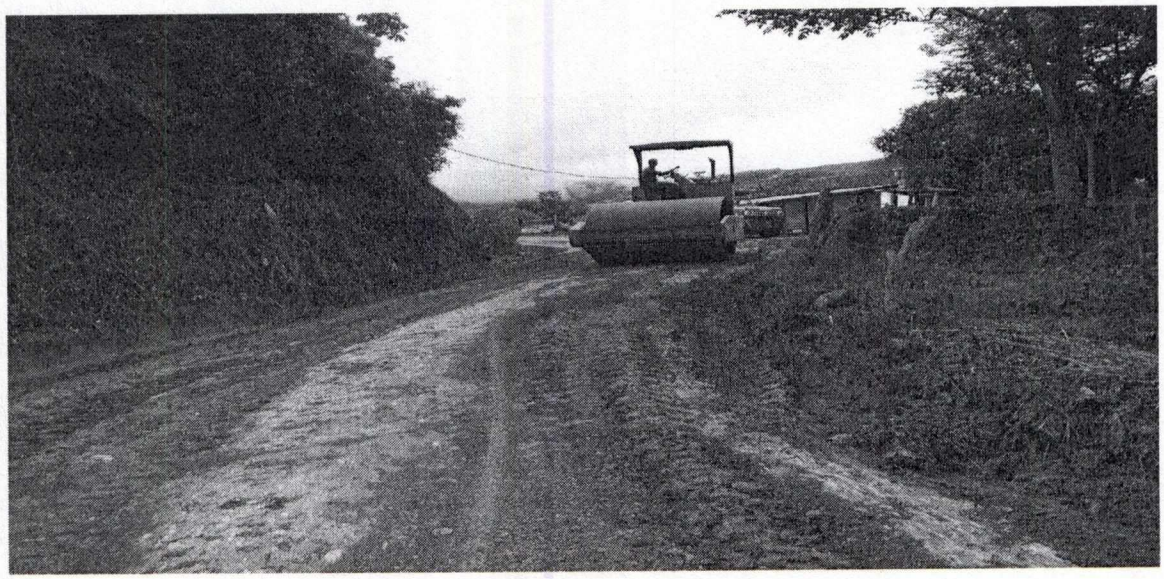

ALBEIRO SEPULVEDA AREVALO
C.C. 88.141.54
CONTRATISTA

ALBEIRO SEPÚLVEDA ARÉVALO
UNIVERSIDAD FRANCISCO DE PAULA SANTANDER
MP- 54202096245 NTS.

IMPREVISTOS

A continuación, se relaciona lo correspondiente al valor cobrado por imprevistos, y las actividades que se ejecutaron, ha de aclararse que estos no dan un mayor valor al contrato, pero que además de justificar lo cobrado se quiere dejar evidencia de lo realizado.

El ítem que se relaciona a continuación y que se encuentra consolidado en la tabla anexa a este documento, va debidamente soportado con su correspondiente análisis de precios unitarios APU, como con su memoria de cantidades. (aquellos que lo requieran).


Es de anotar que la actividad que se realizó es en pro del mejoramiento de la obra y de las zonas circundantes a ella, y se ha llevado a cabo con los mecanismos de seguridad necesarios y con información previa al secretario departamental de gestión del riesgos el ingeniero William Vera Arias y al ingeniero Fernando barón ingeniero apoyo a la secretaria departamental de gestión del riesgo durante su visita técnica al sitio de trabajo.


DESCRIPCION DE IMPREVISTOS.

Durante la ejecución de las actividades para mantenimiento y atencion a puntos críticos se han presentado fuertes precipitaciones en varios sectores de la via que comunica a los corredores viales de teorama- san Calixto- hacari, en los cuales generaron erosion de taludes y derrumbes que no se tenían inicialmente contemplados y que obstaculizaban y reducían el ancho de la via. Por ende se procede a realizar labores de remoción de derrumbes con retroexcavadora sobre ruedas (pajarita) y volqueta para llevarala a disposición final.



ALBEIRO SEPÚLVEDA ARÉVALO
UNIVERSIDAD FRANCISCO DE PAULA SANTANDER
MP- 54202096245 NTS.

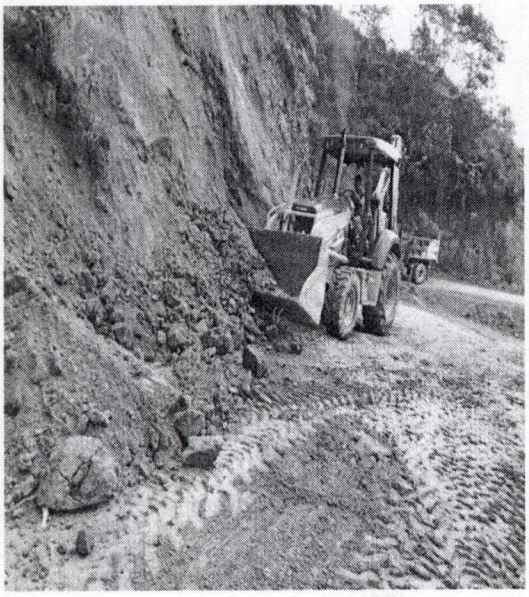

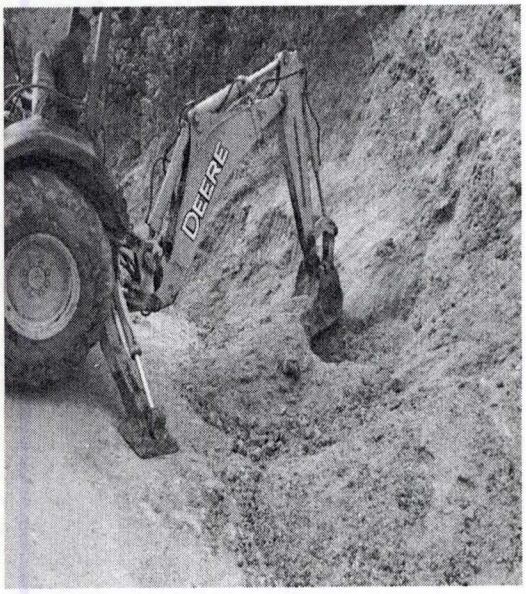



Calle 7 # 26 – 30 Barrio las Llanadas Ocaña N de S. Teléfono. 3136907332, albeirosea@gmail.com

ALBEIRO SEPÚLVEDA ARÉVALO
UNIVERSIDAD FRANCISCO DE PAULA SANTANDER
MP- 54202096245 NTS.

A continuación relaciono ítem y APU para retiro de derrumbes

Gobernación de Norte de Santander
SECRETARÍA DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES



MANTENIMIENTO E INTERVENSION DE VIAS DEL DEPARTAMENTO

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANTIDAD	VALOR UNI|	VA TOTAL
	RETIRO DE DERRUMBES CON RETROCARGADOR SOBRE LLANTAS	M3	182,2905	$ 10.234	$ 1.865.560,53

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

ITEM RETIRO DE DERRUMBES CON RETROCARGADOR SOBRE LLANTAS — **UNIDAD :** M3

I. EQUIPO

Descripción	Tipo	Tarifa/Hora	Rendimiento	Valor-Unit.	
COSTO DE OPERACIÓN RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 62 HP	Hora	78.000,00	50,00	1.560,00	
HERRAMIENTA MENOR (% S./M.O)			10,00	788,57	
				Sub-Total	2.348,57

II. MATERIALES EN OBRA

Descripción	Unidad	Precio-Unit.	Cantidad	Valor-Unit.	
				Sub-Total	

III. TRANSPORTES

Material	Vol. Peso ó Cant.	Distancia	M3-Km	Tarifa	Valor-Unit.	
					Sub-Total	

IV. MANO DE OBRA

Trabajador	Jornal	Prestaciones	Jornal Total	Rendimiento	Valor-Unit.	
1 Ayudante	$ 46.000,00	120,00%	55.200,00	7,00	7.885,71	
					Sub-Total	7.885,71
					Total Costo Directo	10.234,00

ALBEIRO SEPÚLVEDA AREVALO
C.C. 88.141.54

Calle 7 # 26 – 30 Barrio las Llanadas Ocaña N de S. Teléfono. 3136907332, albeirosea@gmail.com
