ARMADA DE COLOMBIA

#ElAzulQueNosUne

**INFORME DE SUPERVISIÓN No. 001 De 05 de octubre de 2024**

LAPSO del 16/09/2024 al 05/10/2024

| | | |
|---|---|---|
| CONTRATO/CONVENIO/ORDEN DE COMPRA/ | : | CONTRATO No. 031-ARC-CBNL04-2024 |
| CONTRATISTA | : | GRUPO EMPRESARIAL MACIAS S.A.S |
| OBJETO DEL CONTRATO | : | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LA CARPA HANGAR DEL ALMACÉN GENERAL EN LA BASE NAVAL ARC "SAN ANDRÉS" |
| PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL | : | 29 de noviembre 2024 |
| PLAZO DE EJECUCIÓN FINAL | : | 29 de noviembre 2024 |
| VALOR INICIAL | : | ($ 230.989.000,00), DOSCIENTOS TREINTA MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL PESOS M/CTE excluido de IVA e incluidas las demás erogaciones que correspondan. |
| ADICIÓN (S) | : | N/A |
| VALOR TOTAL CONTRATO | : | $ 230.989.000,00 |
| DESCRIPCIÓN E IDONEIDAD DEL SUPERVISOR | : | INGENIERO CIVIL |
| SUPERVISOR INICIAL | : | TKAICI ROLÓN CASTILLA LUIS GUILLERMO |

En la ciudad de San Andrés Isla, a los Cinco (05) días del mes de Octubre del dos mil veinticuatro (2024), en calidad de Supervisor del CONTRATO No. 031-ARC-CBNL04-2024 suscrito con la empresa GRUPO EMPRESARIAL MACIAS S.A.S NIT. 900.714.733-1, representada legalmente por ROGERS ALEXANDER MACIAS CRUZ y dando cumplimiento a las prescripciones de la Ley 80 de octubre 28 de 1993 [1] , artículos 4º, 5º, 11º, 12º , 26º, 50º, 51º, 52º, 53º [2] , 56º, Ley 1474 de 2011 [3] , entre otros los artículos 82º, 83º y 84º, la Resolución 6302 del 31 de julio de 2014 [4] , la Directiva 15 del 10 de marzo de 2015 [5] y la Resolución No. 4519 del 27 de mayo 2016 [6] , modificada por la Resolución No. 1417 del 08 de marzo de 2018, numeral 2.4 "*EJECUCIÓN*", en el presente informe deja constancia de las actividades desarrolladas por el contratista en el periodo descrito anteriormente, para lo cual se desagregan a continuación las obligaciones específicas establecidas en el contrato y se detallan las evidencias y soportes que corroboran la verificación del cumplimiento a satisfacción de lo propio:

---

[1] *Ley 80 de 1993, Por la cual se expide el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, artículos 4º "De los Derechos y Deberes de las Entidades Estatales", 5º "De los Derechos y Deberes de los Contratistas",11º "De la competencia para dirigir licitaciones o concursos y para celebrar contratos estatales", 12º "De la Delegación para Contratar", 26º "Del Principio de Responsabilidad", 50º "De la Responsabilidad de las Entidades Estatales", 51º "De la Responsabilidad de los Servidores Públicos", 52º "De la Responsabilidad de los Contratistas", 53º "De la Responsabilidad de los Consultores, Interventores y Asesores" 1 , 56º "De la Responsabilidad Penal de los Particulares que Intervienen en la Contratación Estatal".*

[2] *Modificado por el artículo 82 de la Ley 1474 de 2011, Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública.*

[3] *Ley 1474 de 2011, Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública, artículos 82º "Responsabilidad de los interventores", 83º "Supervisión e interventoría contractual" y 84º "Facultades y deberes de los supervisores y los interventores".*

[4] *Resolución 6302 del 31 de julio de 2014, "Por la cual se Adopta el Manual de Contratación del Ministerio de defensa Nacional, y sus Unidades Ejecutoras.*

[5] *Directiva 15 del 10 de marzo de 2015, por medio de las que se imparten las Políticas de Contratación Sector Defensa.*

[6] *Resolución No. 4519 del 27 de mayo 2016, Por la cual se delegan unas funciones y competencias relacionadas con la contratación de bienes y servicios con destino al Ministerio de Defensa Nacional, a las Fuerzas Militares y la Policía Nacional y se dictan otras disposiciones, modificada por la Resolución No. 1417 del 08 de marzo de 2018.*

## 1. OBJETO DEL CONTRATO/CONVENIO/ORDEN DE COMPRA:

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LA CARPA HANGAR DEL ALMACÉN GENERAL EN LA BASE NAVAL ARC "SAN ANDRÉS", de acuerdo con las especificaciones técnicas relacionadas en el Anexo Técnico – Económico (Anexo "A") del presente contrato.

## 2. CONTRATOS MODIFICATORIOS, ADICIONES, REDUCCIONES, PRORROGAS, SUSPENSIONES, REANUDACIONES, APALANCAMIENTO, RESERVA PRESUPUESTAL Y DEMAS.

| **Indique el tipo de actuación (modificación, adición, reducción, prorroga, suspensión, reanudación, apalancamiento, reserva presupuestal y demás) y numero del documento.** | **FECHA** | **OBJETO** | **MODIFICACIÓN ANEXO TÉCNICO-ECONÓMICO** | **VALOR ADICIÓN** |
|---|---|---|---|---|
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |

## 3. VALOR DEL CONTRATO/CONVENIO/ORDEN DE COMPRA:

$ 230.989.000,00, DOSCIENTOS TREINTA MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL PESOS M/CTE excluido de IVA e incluidas las demás erogaciones que correspondan.

| **NÚMERO DEL CONTRATO/CONVENIO/ORDEN DE COMPRA** | **VALOR UNITARIO** (Indicar tipo de moneda) | **VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA** (Indicar tipo de moneda) | **VALOR PAGO ANTICIPADO O ANTICIPO (SI APLICA)** | **VALOR GASTOS DE NACIONALIZACIÓN** (Si aplica, de lo contrario obviar) (Indicar tipo de moneda) | **VALOR TOTAL** (Indicar tipo de moneda) |
|---|---|---|---|---|---|
| 031-ARC-CBNL04-2024 | $ 230.989.000,00 COP | $ 230.989.000,00 COP | N/A | N/A | $ 230.989.000,00 COP |

## 4. GARANTIAS

| | |
|---|---|
| **GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO:**<br>**COMPAÑÍA ASEGURADORA:**<br>**FECHA DE APROBACIÓN:** | **No. 21-40-101239783 de fecha 17 de septiembre de 2024**<br>**No. 21-44-101451213 de fecha 17 de septiembre de 2024**<br>**SEGUROS DEL ESTADO**<br>**17 de septiembre de 2024** |

| **AMPAROS** (Según aplique contractualmente) | **APLICA** | **NO APLICA** | **INDIQUE FECHA DEL DOCUMENTO DE APROBACIÓN DE LA PÓLIZA POR EL DELEGATARIO** | **CUANDO HAYAN MODIFICACIONES AL CONTRATO, INDIQUE FECHA DEL DOCUMENTO DE APROBACIÓN DE LA MODIFICACIÓN DE LA PÓLIZA POR EL DELEGATARIO.** |
|---|---|---|---|---|
| **ANTICIPO O PAGO ANTICIPADO** (verificar la exigencia contractual) | | X | **N/A** | |
| **CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO** | X | | **17 de septiembre de 2024** | |
| **CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO** (De los bienes o servicios) | X | | **17 de septiembre de 2024** | |
| **SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES** | X | | **17 de septiembre de 2024** | |
| **RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL PREDIO LABORES Y OPERACIONES** | X | | **17 de septiembre de 2024** | |
| **TODO RIESGO** | | X | **N/A** | |

| GARANTIA TECNICA | VIGENCIA | TIPO DE CUBRIMIENTO |
|---|---|---|
| **SI** | **Por un lapso mínimo de UN (01) años. Lapso contado a partir de la expedición del acta de recibido a satisfacción de los mismos, por parte del supervisor.** | **Cantidades mínimas requeridas por la ARC** |

## 5. CUMPLIMIENTO FORMA DE PAGO PACTADO CONTRACTUALMENTE.

| CONTRATADO | | | PAGADO | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TIPO DE PAGO | VIGENCIA | VALOR | OBLIGACIÓN | | ORDEN DE PAGO | | VALOR TOTAL | VALOR PENDIENTE POR CANCELAR | % EJECUCION CONTRACTUAL |
| | | | No. | FECHA | No. | FECHA | | | |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |

| INCUMPLIMIENTO POR PARTE DEL CONTRATISTA | DESCRIPCIÓN |
|---|---|
| (mencionar si el contratista a estado sujeto a citaciones dentro del contrato por incumplimiento o fallas dentro del proceso) | N/A |

| CESIONES DEL CONTRATO | DESCRIPCIÓN |
|---|---|
| (mencionar si el contratista efectuó cesiones dentro del contrato y si se cuenta con la autorización por parte de la entidad y con el cumplimiento de los requisitos) | N/A |

## 6. RESUMEN DE DOCUMENTOS PRESUPUESTALES:

(Si celebraron adiciones detallar en cuadro separado los datos requeridos)

| CONCEPTO | VIGENCIA PRESUPUESTAL | CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL | | | VIGENCIAS FUTURAS | | CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | No. Y FECHA | VALOR CDP | VALOR GASTOS NACIONALIZACIÓN | AUTORIZACION MIN HACIENDA | AUTORIZACION DEPLAN | No. Y FECHA | VALOR CRP | VALOR GASTOS NACIONALIZACIÓN |
| 031-ARC-CBNL04-2024 | 2024 | CDP No. 8324 de fecha 30 de abril de 2024 | $ 480.000.000,00 | N/A | N/A | N/A | CRP No. 23124 del 17 de septiembre de 2024 | $ 230.989.000,00 | N/A |

| REDUCCIONES A LOS REGISTROS O VALOR FINALMENTE EJECUTADO | | | |
|---|---|---|---|
| DOCUMENTO SOPORTE | No. Y FECHA | VALOR | OBSERVACIONES / JUSTIFICACION |
| | | | |
| | | | |

## 7. RECEPCION DE BIENES ENTREGADOS/OBRAS EJECUTADAS/ SERVICIOS PRESTADOS A SATISFACCION (EJECUTADOS):

| ÍTEM | VIGENCIA PRESUPUESTAL | CONCEPTO | VALOR | FACTURAS | | ACTA DE RECEPCIÓN | | ENTRADA DE ALMACÉN | | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Nº Y FECHA | VALOR | Nº Y FECHA | VALOR | Nº Y FECHA | VALOR | |
| 01 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |

## 8. PRUEBA DE RECEPCION A SATISFACCION DE LOS BIENES/OBRAS/SERVICIOS:

Como prueba de recepción a satisfacción de los bienes/obras/servicios contratados el supervisor de conformidad con los artículos 83 "*Supervisión contractual*" y 84 "*FACULTADES Y DEBERES DE LOS SUPERVISORES Y LOS INTERVENTORES*" de la Ley 1474 de julio 12 de 2011 [1], que ordena el seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable, y jurídico que, sobre el cumplimiento del objeto del contrato, se relaciona la siguiente información y soportes:

Adjunto al presente informe se encuentra el control de correspondencia y las acciones realizadas con el fin de minimizar los retrasos y/o inconvenientes de tipo técnico/administrativo para el cumplimiento de la entrega de las actividades del contrato.

Se realizó la visita técnica el día 23 de septiembre de 2024 a las instalaciones de la Base Naval ARC "San Andrés" por parte del señor Rogers Macias, representante legal de la firma contratista, con el fin de verificar el área de trabajo disponible y analizar el procedimiento de desmonte y retiro de la carpa existente; así mismo, verificar medidas del diseño aportado con el fin de realizar un esquema para producción de la estructura metálica y de la lona de la carpa.

Se realizó el levantamiento del acta de inicio del contrato el día 25 de septiembre de 2024, por parte de esta supervisión en conjunto con el señor Rogers macias representante legal de la firma, con el fin de formalizar el inicio del contrato y atender una serie de precisiones en cuanto a las condiciones especiales de la isla para el transporte y manejo de materiales y residuos; así mismo, de los requerimientos de permisos de trabajos ante la OCCRE para el personal que se requiera para llevar a cabo las actividades contractuales.

## 9. PORCENTAJE AVANCE DE EJECUCION:

| ÍTEM | CUMPLIMIENTO ENTREGAS PACTADAS DENTRO DEL CONTRATO/CONVENIO/ORDEN DE COMPRA | % | AVANCE LOGRADO CUANTIFICACION /TASACION DE LO REALMENTE EJECUTADO |
|---|---|---|---|
| 01 | N/A | N/A | N/A |

## 10. NFORMACIÓN, NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO/CONVENIO/ORDEN DE COMPRA QUE INCIDEN EN EL CUMPLIMIENTO IDONEO Y OPORTUNO DEL OBJETO CONTRACTUAL:

El día 02 de octubre de 2024 se remitió por parte de la supervisión el Oficio No. 20240032540404761 al señor representante legal de la firma GRUPO EMPRESARIAL MACIAS S.A.S, mediante el cual se emiten observaciones al programa de obra recibido, aclarando que los pagos parciales serán tramitados conforme a la ejecución de los ítems del anexo técnico una vez sean recibidos los servicios por parte del supervisor. Aunado a ello dependiendo de la disponibilidad del Programa Anual Mensualizado de Caja (PAC) de la Armada de Colombia.

---

[1] *Ley 1474 de julio 12 de 2011, Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública, articulo 84 "FACULTADES Y DEBERES DE LOS SUPERVISORES Y LOS INTERVENTORES".*

Adicionalmente mediante el oficio se recaba dar cumplimiento a las obligaciones específicas del contrato referente al listado del personal que realizará los trabajos y el plan de calidad para la ejecución de las actividades; no obstante, a la fecha de elaboración del presente informe no se ha dado cumplimiento a la solicitud por parte del contratista.

Si bien lo anterior no es ruta crítica, teniendo en cuenta que de acuerdo el programa de ejecución de actividades, las mismas se llevaran a cabo a inicios del mes de noviembre de 2024, es importante contar con la información para ir adelantando los estudios de seguridad para ingreso a las instalaciones de la base naval.

**11. CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA RELACIONADAS CON EL PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y APORTES PARAFISCALES** (Artículos 23° de la Ley 1150 de 2007, 50° de la Ley 789 de 2002, 202° y 204° de la Ley 100 de 1993, 1° de la Ley 89 de 1988, 7° de la Ley 21 de 1982 y 2° y 3° de la Ley 27 de 1974, articulo 99 del Decreto 2106 de 2019 y demás normas concordantes).

Se verificó el cumplimiento de las obligaciones de la Empresa Contratista GRUPO EMPRESARIAL MACIAS S.A.S frente a los sistemas DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL EN SALUD, PENSIONES Y RIESGOS LABORALES, constatando en línea acuerdo obra en pantallazo/certificado adjunto, en los registros en la base de datos del Ministerio de Salud y Protección Social, tal como lo ordena el articulo 99 "*Prohibición de la exigencia de carné o certificado de afiliación al Sistema General de Seguridad Social en Salud*.", del Decreto 2106 del 22 de noviembre de 2019, encontrando que aportó la planilla o certificación de pago correspondiente al mes de septiembre de 2024.

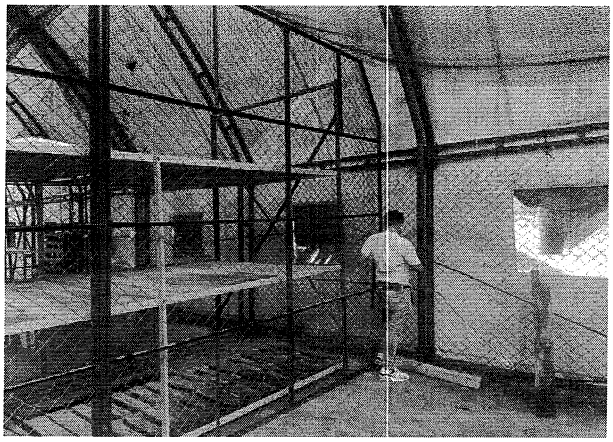
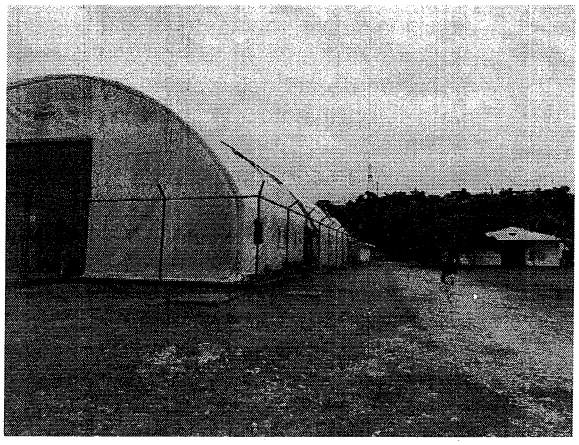
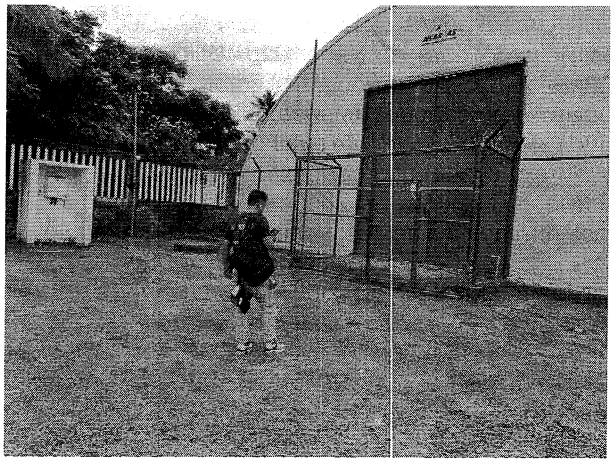
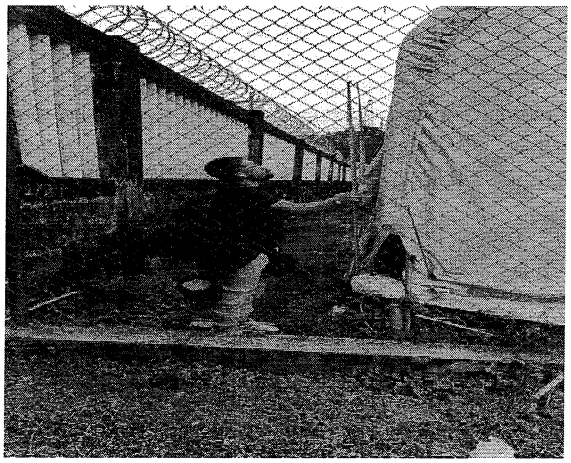
En tratandose de las obligaciones PARAFISCALES, conforme evidencia el oficio expedido el 02 de octubre de 2024, suscrito por el Representante Legal en el que certifica que se encuentra al día en sus pagos a fecha de la expedición de este informe, así como en la planilla/certificación de pago adjunta al mismo, correspondiente al periodo aquí relacionado, esta supervisión verifica y da fe de lo propio.

**12. ACTIVIDADES DE TRATAMIENTO Y MONITOREO A LA MATRIZ DE RIESGO DEL CONTRATO/CONVENIO/ORDEN DE COMPRA.**

Se ha realizado el monitoreo por parte de la Supervisión, de acuerdo con el tratamiento y control de los riesgos establecido en la matriz de los estudios previos del proceso de selección que soporta y hace parte contentiva del contrato/convenio/orden de compra, evidenciándose que no hay materialización de los mismos.

**13. REGISTRO FOTOGRÁFICO (RECEPCIÓN DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS A SATISFACCIÓN).**

A la fecha de elaboración del presente informe el contratista se encuentra realizando los diseños pertinentes de la estructura metálica, por cuanto no se tienen aún planos o esquemas de estos; no obstante, se anexan fotografías evidencia de la visita de obra y verificación de actividades por parte del contratista, así:

**14. RELACIONAR INFORME FINAL:**

- Factura No. _____ de fecha _____, por $_____ ( ) folios.
- Orden de Pago No. _____ de fecha _____, por $_____ ( ) folios.
- Entrada al Almacén No. _____ de fecha _____, por $_____( ) folios.
- Oficio de fecha _____, suscrito por _____ ( ) folios.

**15. REPORTE FINAL:**

- **OFFSET** presentar soportes de recepción de los bienes y/o servicios recibidos a satisfacción (cuando aplique).
- Señalar el tiempo periodo vigencia de las garantías, posteriores al termino de ejecución del contrato y hacerlas efectivas, si es el caso (cuando aplique).
- Fecha máxima liquidación contrato/convenio/orden de compra: Inicio 30/11/2024 Termino 30/03/2024
- Se ha cumplido en su totalidad con el objeto y alcance del contrato en un: 0%

Atentamente,


TKAICI. LUIS GUILLERMO ROLÓN CASTILLA
Supervisor Contrato No. 031-ARC-CBNL04-2024
Base Naval ARC "San Andrés"
Correo electrónico: luis.rolon.ca@armada.mil.co

aportes en línea

# Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

| Identificación | dv | Razon Social | Clase Aportante | Sucursal Principal | Direccion | Ciudad-Departamento | Teléfono | Exonerado SENA e ICBF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NIT 900714733 | 1 | GRUPO EMPRESARIAL MACIAS SAS | B - MENOS DE 200 COTIZANTES | COLSUBSIDIO | AV BOYACA N° 67 - 46 | BOGOTA-BOGOTA D.E. | 3115339911 | Si |

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

| Periodo | | Clave | | Tipo | Fecha | | Pago | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pensión | Salud | Pago | Planilla | Planilla | Limite | Pago | Banco | Dias Mora | Valor |
| 2024-09 | 2024-10 | 956735023 | 9474624813 | E | 2024/10/08 | 2024/10/03 | BANCO DAVIVIENDA | 0 | $3,504,900 |

**RESUMEN DE PAGO**

| RIESGO | CODIGO | NIT | DV | AFILIADOS | VALOR LIQUIDADO | INTERESES MORA | SALDOS E INCAPACIDADES | VALOR A PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AFP (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 9 | $1,872,000 | $0 | $0 | $1,872,000 |
| PORVENIR | 230301 | 800,224,808 | 8 | 9 | $1,872,000 | $0 | $0 | $1,872,000 |
| ARL (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 9 | $696,900 | $0 | $0 | $696,900 |
| POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS | 14-23 | 860,011,153 | 6 | 9 | $696,900 | $0 | $0 | $696,900 |
| CCF (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 9 | $468,000 | $0 | $0 | $468,000 |
| COLSUBSIDIO | CCF22 | 860,007,336 | 1 | 9 | $468,000 | $0 | $0 | $468,000 |
| EPS (ADMINISTRADORAS: 3) | | | | 9 | $468,000 | $0 | $0 | $468,000 |
| NUEVA E.P.S. | EPS037 | 900,156,264 | 2 | 1 | $52,000 | $0 | $0 | $52,000 |
| SALUD TOTAL | EPS002 | 800,130,907 | 4 | 2 | $104,000 | $0 | $0 | $104,000 |
| SANITAS | EPS005 | 800,251,440 | 6 | 6 | $312,000 | $0 | $0 | $312,000 |
| TOTAL | | | | 9 | $3,504,900 | $0 | $0 | $3,504,900 |

aportes en línea

# Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

| Identificación | dv | Razon Social | Clase Aportante | Sucursal Principal | Direccion | Ciudad-Departamento | Teléfono | Exonerado SENA e ICBF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NIT 900714733 | 1 | GRUPO EMPRESARIAL MACIAS SAS | B - MENOS DE 200 COTIZANTES | COLSUBSIDIO | AV BOYACA N° 67 - 46 | BOGOTA-BOGOTA D.E. | 3115339911 | SI |

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

| Periodo | | Clave | | Tipo | Fecha | | Pago | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pensión | Salud | Pago | Planilla | Planilla | Limite | Pago | Banco | Dias Mora | Valor |
| 2024-09 | 2024-10 | 956735023 | 9474624813 | E | 2024/10/08 | 2024/10/03 | BANCO DAVIVIENDA | 0 | $3,504,900 |

**LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES**

| EMPLEADO | | | | NOVEDADES | | | | | | | | | | | | | | | | PENSION | | SALUD | | CCF | | RIESGOS | | | PARAFISCALES | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Identificación | | Nombre | ing | ret | tde | tae | tdp | tap | vsp | cor | vst | sln | ige | lma | vac | avp | vct | irl | vip | Codigo | Días | Codigo | Días | Codigo | Días | Codigo | Días | Tarifa | Días | Exonerado SENA e ICBF |
| **SUCURSAL: COLSUBSIDIO (4 Afiliados)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Centro de Trabajo: ADMINISTRATIVOS (2 Afiliados)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (2 Afiliados) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | CC | 1015408867 | MOJICA PERALTA MARTHA LILIANA | | | | | | | | | | | | | | | | | 23030 1 | 30 | EPS005 | 30 | CCF22 | 30 | 14-23 | 30 | 2.436% | 30 | SI |
| 2 | CC | 1015393963 | SAAVEDRA GONZALEZ ZULMA PATRICIA | | | | | | | | | | | | | | | | | 23030 1 | 30 | EPS005 | 30 | CCF22 | 30 | 14-23 | 30 | 2.436% | 30 | SI |
| **Centro de Trabajo: GERENTE PROYECTOS (1 Afiliados)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | CC | 1015406951 | MACIAS CRUZ ROGERS ALEXANDER | | | | | | | | | | | | | | | | | 23030 1 | 30 | EPS005 | 30 | CCF22 | 30 | 14-23 | 30 | 6.960% | 30 | SI |
| **Centro de Trabajo: OPERARIOS (1 Afiliados)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | CC | 1048277209 | OSORIO AVILA HERNANDO | | | | | | | | | | | | | | | | | 23030 1 | 30 | EPS002 | 30 | CCF22 | 30 | 14-23 | 30 | 6.960% | 30 | SI |

**LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES**

| EMPLEADO | | | | NOVEDADES | | | | | | | | | | | | | | | | PENSION | | SALUD | | CCF | | RIESGOS | | | PARAFISCALES | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Identificación | | Nombre | ing | ret | tde | tae | tdp | tap | vsp | cor | vst | sln | ige | lma | vac | avp | vct | irl | vip | Codigo | Días | Codigo | Días | Codigo | Días | Codigo | Días | Tarifa | Días | Exonerado SENA e ICBF |
| **SUCURSAL: OPERARIO (5 Afiliados)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Centro de Trabajo: RIESGO 5 (5 Afiliados)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (5 Afiliados) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | CC | 1032409970 | AREVALO PINEDA NICOLAY | | | | | | | | | | | | | | | | | 23030 1 | 30 | EPS005 | 30 | CCF22 | 30 | 14-23 | 30 | 6.960% | 30 | SI |
| 6 | CC | 1000136662 | CANTOR SUSA ELKIN ESTEVEN | | | | | | | | | | | | | | | | | 23030 1 | 30 | EPS005 | 30 | CCF22 | 30 | 14-23 | 30 | 6.960% | 30 | SI |
| 7 | CC | 1030610644 | CEBALLOS CALDERON JOHAN SEBASTIAN | | | | | | | | | | | | | | | | | 23030 1 | 30 | EPS037 | 30 | CCF22 | 30 | 14-23 | 30 | 6.960% | 30 | SI |
| 8 | CC | 1032451284 | GUTIERREZ CAÑON MICHAEL STIVEN | | | | | | | | | | | | | | | | | 23030 1 | 30 | EPS005 | 30 | CCF22 | 30 | 14-23 | 30 | 6.960% | 30 | SI |
| 9 | CC | 72173700 | VILORIA HERNANDEZ HENRY | | | | | | | | | | | | | | | | | 23030 1 | 30 | EPS002 | 30 | CCF22 | 30 | 14-23 | 30 | 6.960% | 30 | SI |
| **Total** | | | **Afiliados( 9)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Carpas Macias
Todo en Cubrimientos.

GRUPO EMPRESARIAL MACIAS
NIT. 900.714.733-1
Av. Boyacá # 67-46 BOGOTÁ
TEL: 2248243 – 3504178873
WWW.CARPASMACIAS.COM.CO

**PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES LEGALES ARTICULO 50 LEY 789 DE 2022**

Bogotá D.C OCTUBRE 02 DE 2024

**Señores BASE NAVAL ARC "SAN ANDRES" ARMADA NACIONAL**

El suscrito Rogers Alexander Macias, portador del documento de identidad N° 1.015.406.951 actuando en mi calidad de represéntate legal y Jeimy Marín portadora del documento de identidad N° 1.015.412.532 y de la tarjeta profesional N° 173571T actuando en mi calidad de contadora, de la sociedad GRUPO EMPRESARIAL MACIAS S.A.S identificado con NIT 900.714.733-1, debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de Bogotá, luego de examinar de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia, los estados financieros de la compañía, certifico el pago de los aportes de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, (Articulo 65 Ley 1819 de 2016), pagados por la compañía durante los últimos seis (6) meses contados a partir de la fecha de cierre del presente proceso de selección. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002

Este certificado se expide en Bogotá D.C. el 02 de Octubre de 2024.

Rogers Macias Cruz
Representante Legal
CC 1.015.406.951

Jeimy Paola Marín
Contadora
TP 173571-T

ARMADA DE COLOMBIA
Protegemos el azul de la bandera

#ElAzulQueNosUne

No. 20240032540404761 / MDN-COGFM-COARC-SECAR-JEMAF-JOLAN-COLNA-CBNL04-OIARQ-15.2

San Andrés Isla, 02-10-2024

Señor
ROGERS ALEXANDER MACIAS CRUZ
Representante legal GRUPO EMPRESARIAL MACIAS S.A.S
AV BOYACA #67-46
BOGOTÁ D.C

Asunto: Observaciones programa de obra y documentos iniciales

Con toda tención me dirijo a representante legal de la firma GRUPO EMPRESARIAL MACIAS S.A.S, con el fin de confirmar la recepción del programa de obra para la ejecución de los hitos que conforman el suministro e instalación de la carpa tipo hangar del almacén de la BNL04, no obstante, me permito remitir las siguientes consideraciones, así:

1. Teniendo en cuenta las condiciones de pago pactadas en la minuta de contrato, los mismos serán tramitados conforme a la ejecución de los ítems del anexo técnico una vez sean recibidos los servicios por parte del supervisor. Aunado a ello dependiendo de la disponibilidad del Programa Anual Mensualizado de Caja (PAC) de la Armada de Colombia, el cual debe ser solicitado a la entidad el mes inmediatamente anterior al que se planea desembolsar los recursos. Por lo que esta supervisión no se compromete a realizar los desembolsos tal como se presentan en el programa de obra, dependerán del avance del anexo técnico.

2. Verificar con empresas de transporte marítimo de la isla de San Andrés, la disponibilidad y tiempos estimados de viaje del material hasta la isla, para ajustar y prever la llegada del material a la Base Naval ARC "San Andrés". Adicionalmente contemplar el tiempo estimado de transporte hasta el muelle de Cartagena.

Lo anterior con el fin de aclarar la forma de pago del contrato y establecer una proyección de ejecución acorde a las condiciones especiales de la isla de San Andrés.

Adicionalmente me permito informar que se debe dar cumplimiento a los demás requerimientos de las obligaciones específicas del contrato, así:

*(…) "**10.** El contratista una vez suscrito el contrato, en el término de cinco (05) días hábiles deberá entregará un ORGANIGRAMA DE LA EMPRESA O GRUPO DE TRABAJO con descripción de los cargos y las funciones. **11.** El contratista una vez suscrito el contrato, en el término de cinco (05) días hábiles deberá presentar el PLAN DE CALIDAD detallado para desarrollar los trabajos de mantenimiento objeto del proceso, incluyendo como mínimo aspectos del sistema de calidad, propósito, objetivos, definición del control de calidad de los procesos, calidad de materiales y mano de obra, documentos, compras, registro de calidad y auditoría interna. **13.** El Contratista una vez suscrito el contrato, en el término de cinco (5) días hábiles, deberá presentar el LISTADO DE TODO EL PERSONAL QUE REALIZARÁ LOS TRABAJOS, donde se detalle nombre completo, numero de cedula, cargo y permisos respectivo por parte de la OCCRE, el cual le será entregado al supervisor del contrato, con el fin de coordinar estudios de seguridad respectivos." (…)*

Lo anterior con el fin de efectuar los estudios se seguridad del personal que se requiera para adelantar labores dentro de las instalaciones de la Base Naval ARC "San Andrés".

Atentamente,

Teniente de Corbeta LUIS GUILLERMO ROLÓN CASTILLA
Supervisor Contrato No. 031-ARC-CBNL04-2024
