Gobernación de Nariño	GOBERNACIÓN DE NARIÑO SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y MINAS SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y VIAS FORMATO: INFORME DE SUPERVISION - PORTADA	Código.: SIVEYC.FTO 35-1 Versión: 0.0 Vig 23/05/2016

CONVENIO No.3423-2023:

OBJETO: AUNAR ESFUERZOS ADMINISTRATIVOS, TÉCNICOS, FINANCIEROS Y ADMINISTRATIVOS ENTRE EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO Y EL MUNICIPIO DE SAMANIEGO PARA CONTRIBUIR A LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO: "MEJORAMIENTO DE LA VIA 17NR09 TANAMÁ - CHUGULDI - EL DECIO, SECTOR TANAMÁ - CHUGULDI CON LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE DRENAJE Y DEFENSA EN EL MUNICIPIO DE SAMANIEGO, DEPARTAMENTO DE NARIÑO".

INFORME DE SUPERVISION No.6:

PERIODO: 05/07/2024 AL 31/07/2024

San Juan de Pasto, agosto de 2024

Powered by CamScanner

Gobernación de Nariño	GOBERNACIÓN DE NARIÑO SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y MINAS **SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y VIAS** **FORMATO: INFORME DE SUPERVISION - FICHA INFORMATIVA DE CONVENIO Y/O CONTRATO**	Código: SIVEYC FTO 35-2 Versión: 0 0 Vig. 23/05/2016

FECHA DE PRESETACION:	5/07/2024	CON CORTE:	31/07/2024

1. ASPECTOS ADMISTRATIVOS

PROCESO CONTRACTUAL:	GN3423-2023		
CDP No:	2023060414	FECHA:	14/06/2023
REGISTRO No:	2023061338	FECHA:	28/06/2023
OBJETO DEL CONTRATO:	AUNAR ESFUERZOS ADMINISTRATIVOS, TÉCNICOS, FINANCIEROS Y ADMINISTRATIVOS ENTRE EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO Y EL MUNICIPIO DE SAMANIEGO PARA CONTRIBUIR A LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO "MEJORAMIENTO DE LA VIA 17NR09 TANAMÁ - CHUGULDI - EL DECIO, SECTOR TANAMÁ - CHUGULDI CON LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE DRENAJE Y DEFENSA EN EL MUNICIPIO DE SAMANIEGO, DEPARTAMENTO DE NARIÑO".		
MODIFICACION No. 1	Del 22 de febrero de 2023	Detalle: prorroga al convenio hasta el dia 31 de mayo de 2024	
MODIFICACION No. 2	Del 30 de mayo de 2023	Detalle: prorroga al convenio hasta el dia 30 de septiembre de 2024	
CONTRATISTA DE OBRA:	Javier Francisco Enriquez Insuasty		
CONTRATISTA INTERVENTORIA	Jaiver Arley Rojas Mideros		
SUPERVISOR	Secretario de Infraestructura y Minas		
APOYO A LA SUPERVISION	Lizbeth Castillo		
META FISICA	obras de contención y drenaje		
VALOR DEL CONVENIO	631.418.012,14		
APORTTE DEPARTAMENTO	627.418.012,14		
APORTE MUNICIPIO	4.000.000,00		
FECHA DE INICIACION	miércoles, 23 de agosto de 2023		
PLAZO DEL CONTRATO	SEIS (6) MESES		
FECHA DE TERMINACION INICIAL:	jueves, 22 de febrero de 2024		
SUSPENSION	N/A		
REINICIO	N/A		
FECHA DE TERMINACION SEGUN MODIFICACIÓN No.1	viernes, 31 de mayo de 2024		
FECHA DE TERMINACION SEGUN MODIFICACIÓN No.2	lunes, 30 de septiembre de 2024		
PORCENTEJE ANTICIPO	40%		
TOTAL ANTICIPO	$		252.567.204,86
VALOR PAGADO ACTAS + ANTIC.	0,00		
GARANTIAS	CUMPLIMIENTO Y MANEJO DE ANTICIPO		
Póliza No.:	436 47 994000058904		
% AVANCE FISICO EN OBRA	% PROGRAMADO	84,36%	% EJECUTADO: 91,21%
% AVANCE FINANCIERO	% PROGRAMADO	40,00%	% EJECUTADO 40,00%
META FISICA A LA FECHA	PUNTOS ATENDIDOS	0	

Powered by CamScanner

	GOBERNACIÓN DE NARIÑO SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y MINAS SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y VIAS FORMATO: INFORME DE SUPERVISION - AVANCE DEL CONVENIO Y/O CONTRATO	Código: SIVEYC FTO 35-3 Versión: 0.0 Vig: 23/05/2016

2. DESCRIPCION AVANCE GENERAL DEL CONTRATO

""**ASPECTOS TECNICOS:** el convenio se suscribe con el municipio de Samaniego (N), quien es de acuerdo al anexo contractual el ente encargado de contratar tanto obra como interventoría. El convenio tiene como meta la construcción de 2 obras de contención y de alcantarillas.
El convenio inicia su ejecución desde el día 23 de agosto de 2023,teniendo un plazo inicial de ejecución hasta el día 22 de febrero de 2024.

El día 22 de febrero se suscribe el modificatorio 1, el cual realiza prorroga al convenio hasta el día 31 de mayo de 2024.
El día 30 de mayo de 2024, se suscribe el modificatorio 2, el cual realiza prórroga al convenio hasta el 30 de septiembre de 2024

El municipio cuenta con contratos de obra e interventoría adjudicados. El municipio de Samaniego contrata la LP2023003 MEJORAMIENTO DE LA VIA 17NR09 TANAMÁ - CHUGULDI - EL DECIO, SECTOR TANAMÁ - CHUGULDI CON LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE DRENAJE Y DEFENSA EN EL MUNICIPIO DE SAMANIEGO, DEPARTAMENTO DE NARIÑO y la interventoría CM2023005 "INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA AL MEJORAMIENTO DE LA VIA 17NR09 TANAMÁ - CHUGULDI - EL DECIO, SECTOR TANAMÁ - CHUGULDI CON LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE DRENAJE Y DEFENSA EN EL MUNICIPIO DE SAMANIEGO, DEPARTAMENTO DE NARIÑO".

El contrato de obra contaba con un plazo inicial hasta el día 22 de marzo de 2024, sin embargo de acuerdo con otro si del día 21 de marzo se prorroga el plazo de ejecución en 2 meses hasta el día 22 de mayo de 2024.
El día 5 de abril de 2024 se realizó el acta de suspensión No.1 al contrato de obra debido a los trámites para la legalización del desembolso del anticipo del proyecto y se reanudó la ejecución el día.

El día 14 de mayo de 2024 se firma acta de reinicio de actividades de ejecución de obras. El día 20 de mayo de 2024 por parte de la alcaldía se solita prórroga No. 2 por un periodo de 4 meses hasta el 30 de septiembre de 2024, el mismo se encuentra aprobado y legalizado el 4 de julio de 2024.

ASPECTOS FINANCIEROS : aunque el avance reportado corresponde al 91,21% no se han realizado por parte del municipio el tramite de cobros de pagos parciales. El Municipio ha adelantado el trámite de cobro del anticipo el cual correspinde al 40% del valor del convenio.

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS :
fecha de suscripción convenio: 28 de junio de 2023
fecha de inicio del convenio 23 de agosto de 2023
fecha de suscrición modificatorio 1: 22 de febrero de 2024
Fecha de suscripción Modificatorio 2: 30 de mayo de 2024

ASPECTOS LEGALES :
convenio inicial legalizado 9 de agosto de 2023.
el modificatorio 1 se encuentra legalizado el 8 de abril de 2024.
El Modificatorio 2 se encuentra legalizado el 4 de julio de 2024.

3.OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES
El convenio inicia su ejecución y actualmente el municipio cuenta con contrato de obra e interventoría adjudicados.
Se encuentra en ejecución la obra física, aun no se han tramitado pagos parciales.
El avace de la obra es del 91,21%

Lizbeth [illegible]
contratista de apoyo a la Supervisión- SIMD

Revisó: Luis Alberto Castillo Jojoa
Sub- Secretario de Infraestructura y Vías - SIMD
Gobernación de Nariño

Revisó: Gabriel Fernando Ojeda Aguirre.
Secretario de Infraestructura y Minas - SIMD
Gobernación de Nariño

Powered by CamScanner

Gobernación de Nariño	GOBERNACIÓN DE NARIÑO SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y MINAS **SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y VIAS** **FORMATO: INFORME DE SUPERVISION - REGISTRO FOTOGRAFICO**	Código.: SIVEYC FTO 35-4 Versión: 0.0 Vig: 23/05/2016

4. REGISTRO FOTOGRAFICO

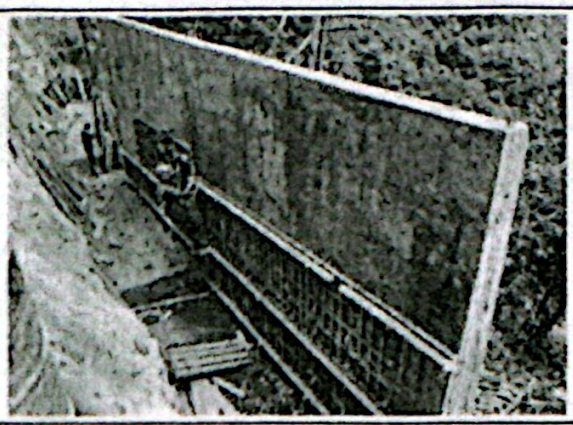


Foto1. Retiro de formaleta de muro de contención

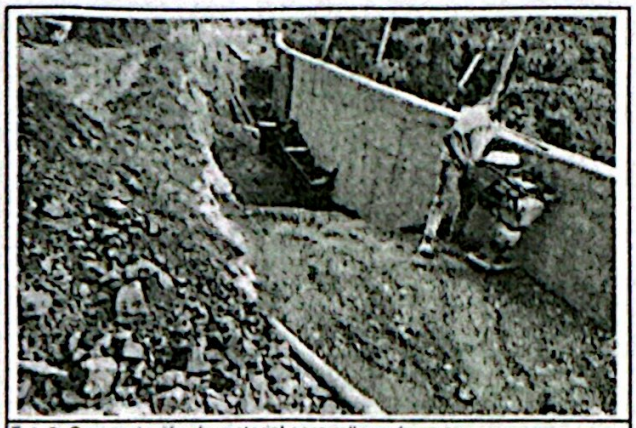


Foto2. Compactación de material para relleno de muro



Foto3. Compactación de subbase

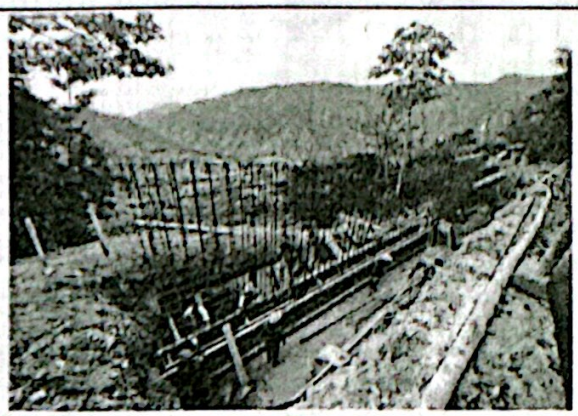


Foto4. Armado de acero para construcción de muro de contención

Powered by CamScanner

Gobernación de Nariño	GOBERNACIÓN DE NARIÑO SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y MINAS SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y VIAS FORMATO: SEGUIMIENTO CONTRATO Y/O CONVENIO - SEGUIMIENTO FINANCIERO	Codigo: SIVEYC FTO 38-5 Version: 0.0 Vig: 23/08/2018

5. INFORME FINANCIERO

CONVENIO No.:	3423-2023

ACTAS	FECHA	VR. TOTAL	ACUMULADO	AMORT. ANTICIPO	VR. NETO	VR EGRESO	TOTAL DESC	COM EGRESO	FECHA PAGO
ANTICIPO		$ 252.567.204,86		0		$ 0,00	$ 0,00		
TOTAL		$ 252.567.204,86		$ 0,00	$ -		$ 0,00		

AVANCE FISICO	91,21%
AVANCE FINANCIERO	40%

Powered by CamScanner

	GOBERNACIÓN DE NARIÑO SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y MINAS SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y VIAS FORMATO: SEGUIMIENTO CONTRATO Y/O CONVENIO - CONTROL POLIZAS	Código: SIVEYC FTO 35-6 Versión: 0 0 Vig: 23/05/2016

6. CONTROL POLIZAS

CONVENIO No 3423-2023

GARANTIAS:	Aseguradora Solidaria
Póliza No.:	436 47 994000058904

ANEXO 0	FECHA APROBACION	11/07/2023	FECHA EXPEDICION	30/06/2023

DETALLE	VALOR	%	FECHA INICIAL	FECHA FINAL	OBSERVACIONES	ALERTA
Cumplimiento	$ 63.141.801	10%	28-jun-23	28-jun-24	suscripcion inicial	(37)
Buen manejo de Anticipado	$ 250.967.205	40%	28-jun-23	28-jun-24	suscripcion inicial	(37)

ACTULIZACION POLIZAS - ANEXO 1 - ACTA DE INICIO	FECHA APROBACION	17/08/2023	FECHA EXPEDICION	17/08/2023

DETALLE	VALOR	%	FECHA INICIAL	FECHA FINAL	OBSERVACIONES	ALERTA
Cumplimiento	$ 63.141.801	10%	28-jun-23	23-ago-24	Actualización Acta Inicio	19
Buen manejo de Anticipado	$ 250.967.205	40%	28-jun-23	23-ago-24	Actualización Acta inicio	19

ACTULIZACION POLIZAS - modificatorio 1	FECHA APROBACION	8/04/2024	FECHA EXPEDICION	1/03/2024

DETALLE	VALOR	%	FECHA INICIAL	FECHA FINAL	OBSERVACIONES	ALERTA
Cumplimiento	$ 63.141.801,20	10%	23-ago-23	30-nov-24	Modificatorio No 1	118
Buen manejo de Anticipado	$ 250.967.205	40%	23-ago-23	30-nov-24	Modificatorio No 1	118

ACTULIZACION POLIZAS - modificatorio 2	FECHA APROBACION		FECHA EXPEDICION	

DETALLE	VALOR	%	FECHA INICIAL	FECHA FINAL	OBSERVACIONES	ALERTA
Cumplimiento	$ 63.141.801,20	10%	23-ago-23	31-mar-25	Modificatorio No 2	239
Buen manejo de Anticipado	$ 250.967.205	40%	23-ago-23	31-mar-25	Modificatorio No 2	239

Powered by CamScanner
