| | | |
|---|---|---|
| Gobernación de Nariño | GOBERNACIÓN DE NARIÑO<br>SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y MINAS<br>**SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y VIAS**<br>**FORMATO: INFORME DE SUPERVISION - PORTADA** | Código.: SIVEYC.FTO.35-1<br>Versión: 0.0<br>Vig: 23/05/2016 |

# CONVENIO No.3423-2023:

## OBJETO: AUNAR ESFUERZOS ADMINISTRATIVOS, TÉCNICOS, FINANCIEROS Y ADMINISTRATIVOS ENTRE EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO Y EL MUNICIPIO DE SAMANIEGO PARA CONTRIBUIR A LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO: "MEJORAMIENTO DE LA VIA 17NR09 TANAMÁ - CHUGULDI - EL DECIO, SECTOR TANAMÁ - CHUGULDI CON LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE DRENAJE Y DEFENSA EN EL MUNICIPIO DE SAMANIEGO, DEPARTAMENTO DE NARIÑO".

## INFORME DE SUPERVISION No.5:

**PERIODO: 01/06/2024 AL 4/07/2024**

**San Juan de Pasto, julio de 2024**

Powered by CamScanner

| | GOBERNACIÓN DE NARIÑO<br>SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y MINAS<br>**SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y VIAS**<br>**FORMATO: INFORME DE SUPERVISION - FICHA INFORMATIVA DE CONVENIO Y/O CONTRATO** | Código.: SIVEYC.FTO.35-2<br>Versión: 0.0<br>Vig: 23/05/2016 |
|---|---|---|

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| FECHA DE PRESETACION: | 5/07/2024 | | CON CORTE : | 30/06/2024 |

**1. ASPECTOS ADMISTRATIVOS**

| | | | |
|---|---|---|---|
| PROCESO CONTRACTUAL: | GN3423-2023 | | |
| CDP No.: | 2023060414 | FECHA: | 14/06/2023 |
| REGISTRO No: | 2023061338 | FECHA: | 28/06/2023 |
| OBJETO DEL CONTRATO: | AUNAR ESFUERZOS ADMINISTRATIVOS, TÉCNICOS, FINANCIEROS Y ADMINISTRATIVOS ENTRE EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO Y EL MUNICIPIO DE SAMANIEGO PARA CONTRIBUIR A LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO: "MEJORAMIENTO DE LA VIA 17NR09 TANAMÁ - CHUGULDI - EL DECIO, SECTOR TANAMÁ - CHUGULDI CON LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE DRENAJE Y DEFENSA EN EL MUNICIPIO DE SAMANIEGO, DEPARTAMENTO DE NARIÑO". | | |
| MODIFICACION No.: 1 | Del 22 de febrero de 2023 | Detalle: prorroga al convenio hasta el día 31 de mayo de 2024. | |
| MODIFICACION No.: 2 | Del 30 de mayo de 2023 | Detalle: prorroga al convenio hasta el día 30 de septiembre de 2024. | |
| CONTRATISTA DE OBRA: | Javier Francisco Enríquez Insuasty | | |
| CONTRATISTA INTERVENTORIA | Jaiver Arley Rojas Mideros | | |
| SUPERVISOR | Secretario de Infraestructura y Minas | | |
| APOYO A LA SUPERVISION | Lizbeth Castillo | | |
| META FISICA | obras de contención y drenaje | | |
| VALOR DEL CONVENIO: | 631.418.012,14 | | |
| APORTTE DEPARTAMENTO | 627.418.012,14 | | |
| APORTE MUNICIPIO | 4.000.000,00 | | |
| FECHA DE INICIACION: | miércoles, 23 de agosto de 2023 | | |
| PLAZO DEL CONTRATO: | SEIS (6) MESES | | |
| FECHA DE TERMINACION INICIAL: | jueves, 22 de febrero de 2024 | | |
| SUSPENSION | N/A | | |
| REINICIO | N/A | | |
| FECHA DE TERMINACIÓN SEGÚN MODIFICACIÓN No.1 | viernes, 31 de mayo de 2024 | | |
| FECHA DE TERMINACIÓN SEGUN MODIFICACIÓN No.2 | lunes, 30 de septiembre de 2024 | | |
| PORCENTEJE ANTICIPO | 40% | | |
| TOTAL ANTICIPO | $ | | 252.567.204,86 |
| VALOR PAGADO ACTAS + ANTIC. | 0,00 | | |
| GARANTIAS: | CUMPLIMIENTO Y MANEJO DE ANTICIPO | | |
| Póliza No.: | 436 47 994000058904 | | |
| % AVANCE FISICO EN OBRA | % PROGRAMADO | 94,83% | % EJECUTADO: 51,07% |
| % AVANCE FINANCIERO | % PROGRAMADO | 40,00% | % EJECUTADO 40,00% |
| META FISICA A LA FECHA | PUNTOS ATENDIDOS | 0 | |

Powered by CamScanner

| | GOBERNACIÓN DE NARIÑO<br>SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y MINAS<br>**SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y VIAS**<br>**FORMATO: INFORME DE SUPERVISION - AVANCE DEL CONVENIO Y/O CONTRATO** | Código.: SIVEYC.FTO.35-3<br>Versión: 0.0<br>Vig: 23/05/2016 |
|---|---|---|

**2. DESCRIPCION AVANCE GENERAL DEL CONTRATO**

""**ASPECTOS TECNICOS:** el convenio se suscribe con el municipio de Samaniego (N), quien es de acuerdo al anexo contractual el ente encargado de contratar tanto obra como interventoría El convenio tiene como meta la construcción de 2 obras de contención y de alcantarillas.
El convenio inicia su ejecución desde el día 23 de agosto de 2023,teniendo un plazo inicial de ejecución hasta el día 22 de febrero de 2024.

El día 22 de febrero se suscribe el modificatorio 1, el cual realiza prorroga al convenio hasta el día 31 de mayo de 2024.
El día 30 de mayo de 2024, se suscribe el modificatorio 2, el cual realiza prórroga al convenio hasta el 30 de septiembre de 2024

El municipio cuenta con contratos de obra e interventoría adjudicados. El municipio de Samaniego contrata la LP2023003 MEJORAMIENTO DE LA VIA 17NR09 TANAMÁ - CHUGULDI - EL DECIO, SECTOR TANAMÁ - CHUGULDI CON LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE DRENAJE Y DEFENSA EN EL MUNICIPIO DE SAMANIEGO, DEPARTAMENTO DE NARIÑO. y la interventoria CM2023005 "INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA AL MEJORAMIENTO DE LA VIA 17NR09 TANAMÁ - CHUGULDI - EL DECIO, SECTOR TANAMÁ - CHUGULDI CON LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE DRENAJE Y DEFENSA EN EL MUNICIPIO DE SAMANIEGO, DEPARTAMENTO DE NARIÑO".

El contrato de obra contaba con un plazo inicial hasta el día 22 de marzo de 2024, sin embargo de acuerdo con otro si del día 21 de marzo se prorroga el plazo de ejecución en 2 meses hasta el día 22 de mayo de 2024.
El día 5 de abril de 2024 se realizó el acta de suspensión No.1 al contrato de obra debido a los trámites para la legalización del desembolso del anticipo del proyecto y se reanudó la ejecución el día.

El día 14 de mayo de 2024 se firma acta de reinicio de actividades de ejecución de obras. El día 20 de mayo de 2024 por parte de la alcaldía se solita prórroga No. 2 por un periodo de 4 meses hasta el 30 de septiembre de 2024.

El Modificatorio No.2 se encuentra legalizado con fecha del 4 de julio de 2024

**ASPECTOS FINANCIEROS** : aunque el avance reportado corresponde al 32,88% no se han realizado por parte del municipio el tramite de cobros de pagos parciales. El Municipio hatramitado el anticipo por el 40% del valor total aportado por el Departamento de Nariño

**ASPECTOS ADMINISTRATIVOS :**
fecha de suscripción convenio: 28 de junio de 2023.
fecha de inicio del convenio 23 de agosto de 2023.
fecha de suscrición modificatorio 1: 22 de febrero de 2024.
Fecha de suscripción Modificatorio 2: 30 de mayo de 2024

**ASPECTOS LEGALES :**
convenio inicial legalizado 9 de agosto de 2023.
el modificatorio 1 se encuentra legalizado el 8 de abril de 2024.
El Modificatorio 2 se encuentra en legalizado el 4 de julio de 2024

**3.OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES**

El convenio inicia su ejecución y actualmente el municipio cuenta con contrato de obra e interventoría adjudicados.
Se encuentra en ejecución la obra física, aun no se han tramitado pagos parciales.

Lizbeth Cas
contratista de apoyo a la Supervisión- SIMD

Revisó: Luis Alberto Castillo Jojoa
Sub- Secretario de Infraestructura y Vias - SIMD
Gobernación de Nariño

Revisó: Gabriel Fernando Osejo Aguirre
Secretario de Infraestructura y Minas - SIMD
Gobernación de Nariño

Powered by CamScanner

## 4. REGISTRO FOTOGRAFICO



Foto1: Fundicion del modulo tres zarpa para el muro de contencion dos en la absisa k2+733

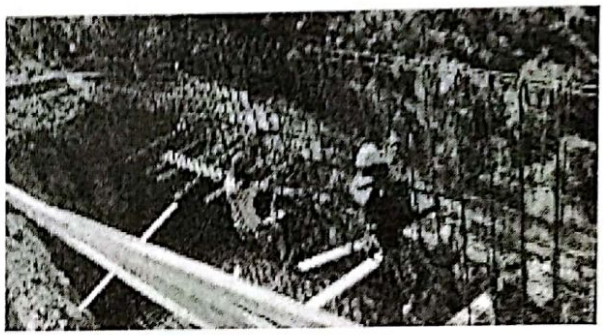


Foto2: Amarre de acero en el modulo tres pantalla, para el muro de contencion dos en la absisa k2+733

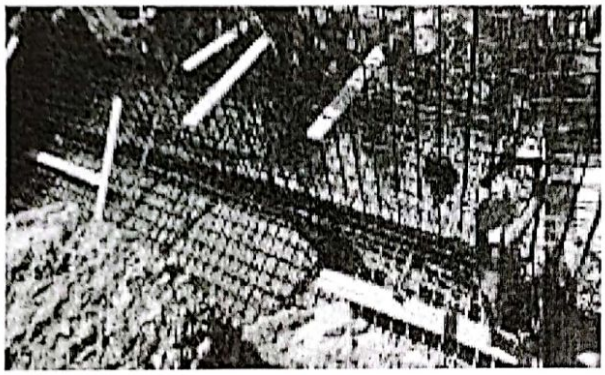


Foto3: Amarre de acero en el modulo tres pantalla, para el muro de contencion dos en la absisa k2+733

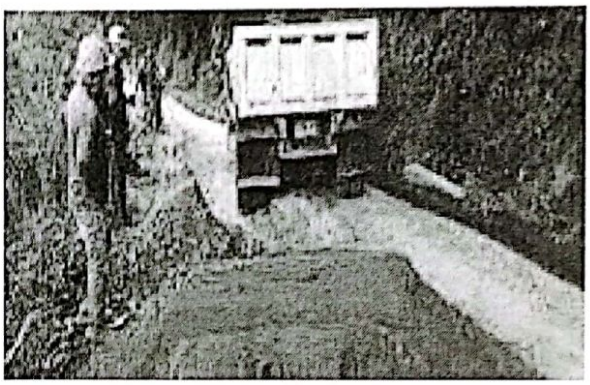


Foto4: Materiales petreos para fundicion de la zarpa, modulo tres para el muro de contecion dos en la absisa k2+733

Powered by CamScanner

| | | |
|---|---|---|
| Gobernación de Nariño | GOBERNACIÓN DE NARIÑO<br>SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y MINAS<br>**SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y VIAS**<br>**FORMATO: SEGUIMIENTO CONTRATO Y/O CONVENIO - SEGUIMIENTO FINANCIERO** | Código.: SIVEYC.FTO 35-5<br>Versión: 0.0<br>Vig: 23/05/2016 |

**5. INFORME FINANCIERO**

| | |
|---|---|
| **CONVENIO No.:** | **3423-2023** |

| ACTAS | FECHA | VR. TOTAL | ACUMULADO | AMORT. ANTICIPO | VR. NETO | VR EGRESO | TOTAL DESC | COM EGRESO | FECHA PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANTICIPO | | $ 252.567.204,86 | | 0 | | $ 0,00 | $ 0,00 | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| **TOTAL** | | **$ 252.567.204,86** | | **$ 0,00** | **$ -** | | **$ 0,00** | | |

| | |
|---|---|
| AVANCE FISICO | 51.07% |
| AVANCE FINANCIERO | 40% |

Powered by CamScanner

| | | |
|---|---|---|
| Gobernación de Nariño | GOBERNACIÓN DE NARIÑO<br>SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y MINAS<br>SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y VIAS<br>**FORMATO: SEGUIMIENTO CONTRATO Y/O CONVENIO - CONTROL POLIZAS** | Código.: SIVEYC.FTO.35-6<br>Versión: 0.0<br>Vig: 23/05/2016 |

## 6. CONTROL POLIZAS

CONVENIO No 3423-2023

| | |
|---|---|
| GARANTIAS: | Aseguradora Solidaria |
| Póliza No.: | 436 47 994000058904 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **ANEXO 0** | **FECHA APROBACION** | 11/07/2023 | FECHA EXPEDICION | 30/06/2023 | |

| DETALLE | VALOR | % | FECHA INICIAL | FECHA FINAL | OBSERVACIONES | ALERTA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cumplimiento | $ 63.141.801 | 10% | 28-jun-23 | 28-jun-24 | suscripcion inicial | (13) |
| Buen manejo de Anticipado | $ 250.967.205 | 40% | 28-jun-23 | 28-jun-24 | suscripcion inicial | (13) |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **ACTULIZACION POLIZAS - ANEXO 1 - ACTA DE INICIO** | **FECHA APROBACION** | 17/08/2023 | FECHA EXPEDICION | 17/08/2023 |

| DETALLE | VALOR | % | FECHA INICIAL | FECHA FINAL | OBSERVACIONES | ALERTA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cumplimiento | $ 63.141.801 | 10% | 28-jun-23 | 23-ago-24 | Actualización Acta Inicio | 43 |
| Buen manejo de Anticipado | $ 250.967.205 | 40% | 28-jun-23 | 23-ago-24 | Actualización Acta inicio | 43 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **ACTULIZACION POLIZAS - modificatorio 1** | **FECHA APROBACION** | 8/04/2024 | FECHA EXPEDICION | 1/03/2024 |

| DETALLE | VALOR | % | FECHA INICIAL | FECHA FINAL | OBSERVACIONES | ALERTA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cumplimiento | $ 63.141.801,20 | 10% | 23-ago-23 | 30-nov-24 | Modificatorio No.1 | 142 |
| Buen manejo de Anticipado | $ 250.967.205 | 40% | 23-ago-23 | 30-nov-24 | Modificatorio No.1 | 142 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **ACTULIZACION POLIZAS - modificatorio 2** | **FECHA APROBACION** | | FECHA EXPEDICION | |

| DETALLE | VALOR | % | FECHA INICIAL | FECHA FINAL | OBSERVACIONES | ALERTA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cumplimiento | $ 63.141.801,20 | 10% | 23-ago-23 | 31-mar-25 | Modificatorio No.2 | 263 |
| Buen manejo de Anticipado | $ 250.967.205 | 40% | 23-ago-23 | 31-mar-25 | Modificatorio No.2 | 263 |

Powered by CamScanner
