INGECO
INGENIERIA DE CONSTRUCCIONES S.A.S.

Bogotá D.C.; 21 de Octubre de 2024
CINP-BTA-044-0141-5339

Señores
ALCALDÍA MUNICIPAL DE LA CALERA
DIEGO PERALTA
Secretaría de Obras Públicas
Carrera 3 No. 6- 10
La Calera, Cundinamarca

REF: Contrato No. C.CON.235-2024; Interventoría técnica, administrativa, financiera y ambiental para la ejecución del contrato cuyo objeto es: pavimentación de vías urbanas en el Barrio Alto de la Virgen del Municipio de La Calera Cundinamarca.

ASUNTO: Informe semanal de interventoría No. 08.

Cordial saludo;

Para su informacion y fines pertinentes, adjunto a la presente nos permitimos remitir el informe semanal de interventoría No. 08. correspondiente al periodo comprendido entre el 14 de octubre de 2024 al 20 de octubre de 2024.

Cordialmente;

CARLOS MARIO ROLON AMAYA
Representante Legal

Elaboró: JCCU.
Revisó: DFCC.

Anexo: Lo enunciado en cuatro (04) folios.

ALCALDÍA DE LA CALERA / INGECO INGENIERIA DE CONSTRUCCIONES S.A.S.	**INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA**	
	VERSIÓN	1
	Fecha	22-ago-24

ALCALDIA MUNICIPAL DE LA CALERA
Secretaria de Obras Públicas

Semana No	**8**	**Del :**	14/10/2024	**AL:** 20/10/2024
Plazo Total	**210** días			
Plazo Transcurrido	**56** días			
Nombre del Supervisor :	**DIEGO PERALTA CORREDOR**			

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA

"PAVIMENTACION DE VIAS URBANAS EN EL BARRIO ALTO DE LA VIRGEN DEL MUNICIPIO DE LA CALERA - CUNDINAMARCA"

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

"INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTALPARA LA EJECUCION DEL CONTRATO CUYO OBJETO ES: PAVIMENTACION DE VIAS URBANAS EN EL BARRIO ALTO DE LA VIRGEN DEL MUNICIPIO DE LA CALERA - CUNDINAMARCA"

CONTROL DE LA PROGRAMACIÓN GENERAL

	Semanal	Acumulado		Semanal	Acumulado
(%) Programado	**3,00%**	**22,00%**	**(%) Ejecutado**	**0,51%**	**22,45%**
Valor programado ($)		**$ 223.022.162,04**	**Valor ejecutado ($)**		**$ 227.583.978,99**
			Evaluación	**0,45%**	**Avance/Atraso en la ejecución**

DATOS CONTRACTUALES

CONTRATO DE OBRA		**CONTRATO DE INTERVENTORÍA**	
Contratista:	CONSORCIO BARRIO ALTO	**Contratista:**	INGECO INGENIERIA DE CONSTRUCCIONES SAS
Contrato No:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA 234 DE 2024	**Contrato No:**	CONTRATO DE INTERVENTORIA 235 DE 2024
Valor del contrato:	$ 1.013.737.100	**Valor del contrato:**	$ 102.580.737,00
Plazo:	210 DIAS	**Plazo:**	210 DIAS
Fecha de iniciación:	26-ago-24	**Fecha de iniciación:**	26-ago-24
Fecha de terminación inicial:	25-mar-25	**Fecha de terminación inicial:**	25-mar-25
Fecha de suspensión Nº 1:	N/A	**Fecha de suspensión Nº 1:**	N/A
Fecha de reinicio Nº 1:	N/A	**Fecha de reinicio Nº 1:**	N/A
Prórroga Nº 1:	N/A	**Prórroga Nº 1:**	N/A
Adición No. 01:	N/A	**Adición No. 01:**	N/A
Plazo final:	210 DIAS	**Plazo final:**	210 DIAS
Fecha de terminación final:	25-mar-25	**Fecha de terminación final:**	25-mar-25
Valor total contrato	$ 1.013.737.100	**Valor total contrato**	$ 102.580.737

EJECUCIÓN SEMANAL POR FRENTES

No.	DESCRIPCION	% PROGRAMADO	% EJECUTADO	DESCRIPCION ACTIVIDADES	DESCRIPCIÓN PENDIENTES
1	**TRAMO 1_ CALLE 8 ENTRE CARRERAS 10 Y 12 (ENTRE ABSCISAS K0+000 Y K0+126,17)**	17,00%	25,28%	*RELLENOS PARA TUBERÍA A.P. *NIVELACIÓN DE RAJÓN	*INSTALACIÓN DE BASE *INSTALACIÓN DE SARDINELES *FUNDIDA DE PAVIMENTO *DEMARCACIÓN *INTERVENCIÓN DE ANDENES
1_1	**PRELIMINARES**	51,00%	81,00%		
1_1.1	EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	68,00%	100,00%	ABS. K0+000.0- K0+126.17	ACTIVIDAD TERMINADA
1_1.2	CONFORMACIÓN DE LA CALZADA EXISTENTE	52,00%	100,00%	ABS. K0+000.0- K0+126.17	ACTIVIDAD TERMINADA
1_1.3	NIVELACIÓN DE POZOS DE INSPECCIÓN Di=1.20M, E=0.25M, H=0,21M(INCLUYE PAÑETE INTERNO Y DEMOLICIÓN)	0,00%	0,00%		
1_1.4	TRANSPORTE DE MATERIALES PROV. DE EXPLANACIÓN, CANALES, PRESTAMOS, SOBREACARREOS Y DERRUMBES	68,00%	100,00%	ABS. K0+000.0- K0+126.17	ACTIVIDAD TERMINADA
1_1.5	CUBIERTA POZO D= 1.7M, E=0.20M C0NCRETO 3000 PSI CON REFUERZO (INCLUYE ARO Y TAPA HF)	0,00%	0,00%		
1_2	**ESTRUCTURA DE PAVIMENTO**	9,00%	40,00%		
1_2.1	RAJÓN PARA MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE	23,00%	100,00%	ABS. K0+000.0- K0+126.17	ACTIVIDAD TERMINADA
1_2.2	BASE GRANULAR	0,00%	0,00%		
1_2.3	CONCRETO PARA PAVIMENTO RÍGIDO MR-40, INCLUYE SELLADO DE JUNTAS Y ACERO DE TRANSFERENCIA Y UNIÓN	0,00%	0,00%		
1_2.4	SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO 60000 PSI	0,00%	0,00%		
1_3	**ANDENES, SARDINELES, RAMPAS DE ACCESO Y OTRAS OBRAS**	0,00%	8,00%		
1_3.1	DEMOLICIÓN CONCRETO SIMPLE (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA DE 5 KM)	0,00%	0,00%		
1_3.2	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN H=0.0-2.0 M (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	0,00%	57,00%	ABS. K0+000.0- K0+126.17	
1_3.3	SUBBASE GRANULAR	0,00%	30,00%	ABS. K0+000.0- K0+126.17	
1_3.4	MORTERO 1:3 ARENA LAVADA DE PEÑA	0,00%	0,00%		
1_3.5	SARDINEL PREFABRICADO A-10	0,00%	0,00%		
1_3.6	TABLETA PREFABRICADA A-20 (20X20CM)	0,00%	0,00%		
1_3.7	LOSETA PREFABRICADA A-57 (200x200x60mm) (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE 4 CM DE MORTERO 1:5 HECHO EN OBRA PARA BASE Y ARENA DE PEÑA PARA SELLO)	0,00%	0,00%		
1_3.8	LOSETA PREFABRICADA A-58 (200x200x60mm) (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE 4 CM DE MORTERO 1:5 HECHO EN OBRA PARA BASE Y ARENA DE PEÑA PARA SELLO)	0,00%	0,00%		
1_3.9	PIEZA DE REMATE A115 PARA RAMPA VEHICULAR TIPO B (600x400x450mm) (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE 3CM DE MORTERO 2000 PSI)	0,00%	0,00%		
1_3.10	BORDILLO PREFABRICADO A-80 (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE 3CM MORTERO DE NIVELACIÓN 2000 PSI)	0,00%	0,00%		
1_3.11	SARDINEL ESPECIAL A110 PARA RAMPA B (600x400x500mm) (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE 3CM DE MORTERO 2000 PSI)	0,00%	0,00%		
1_4	**SEÑALIZACIÓN**	0,00%	0,00%		
1_4.1	LÍNEAS DE DEMARCACIÓN CON PINTURA EN FRÍO	0,00%	0,00%		
1_4.2	MARCA VIAL CON PINTURA EN FRÍO	0,00%	0,00%		
2	**TRAMO 2_CALLE 9 ENTRE CARRERAS 11 Y 13 (ENTRE ABSCISAS K0+000 Y K0+158,57)**	19,00%	20,13%	*RELLENOS PARA TUBERIA A.P. *NIVELACIÓN DE RAJÓN	*EXCAVACIONES EN VÍA *RETIRO DE MATERIAL DE EXCAVACIÓN *CONFORMACIÓN DE CALZADA *INSTALACIÓN DE RAJÓN *INSTALACIÓN DE BASE *INSTALACIÓN DE SARDINELES *FUNDIDA DE PAVIMENTO *DEMARCACIÓN *INTERVENCIÓN DE ANDENES
2_1	**PRELIMINARES**	55,00%	62,00%		
2_1.1	DEMOLICIÓN CONCRETO ESTRUCTURAL (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA DE 5KM)	67,00%	0,00%		
2_1.2	EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	68,00%	97,00%	ABS. K0+000.0 - K0+158.57	LINEA FRANJA AGUA POTABLE
2_1.3	CONFORMACIÓN DE LA CALZADA EXISTENTE	52,00%	97,00%	ABS. K0+000.0 - K0+158.57	LINEA FRANJA AGUA POTABLE
2_1.4	NIVELACIÓN DE POZOS DE INSPECCIÓN Di=1.20M, E=0.25M, H=0,21M(INCLUYE PAÑETE INTERNO Y DEMOLICIÓN)	0,00%	0,00%		

		VERSIÓN	1
		Fecha	22-ago-24

ALCALDIA MUNICIPAL DE LA CALERA
Secretaria de Obras Públicas

Semana No **8** **Del :** 14/10/2024 **AL:** 20/10/2024
Plazo Total **210** días

2_1.5	TRANSPORTE DE MATERIALES PROV. DE EXPLANACIÓN, CANALES, PRESTAMOS, SOBREACARREOS Y DERRUMBES	68,00%	97,00%	ABS. K0+000.0 - K0+158.57	LINEA FRANJA AGUA POTABLE
2_1.6	CUBIERTA POZO D= 1.7M, E=0.20M C0NCRETO 3000 PSI CON REFUERZO (INCLUYE ARO Y TAPA HF)	0,00%	0,00%		
2_2	**ESTRUCTURA DE PAVIMENTO**	6,00%	25,00%		
2_2.1	RAJÓN PARA MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE	23,00%	97,00%	ABS. K0+000.0 - K0+158.57	LINEA FRANJA AGUA POTABLE
2_2.2	BASE GRANULAR	0,00%	0,00%		
2_2.3	CONCRETO PARA PAVIMENTO RÍGIDO MR-40, INCLUYE SELLADO DE JUNTAS Y ACERO DE TRANSFERENCIA Y UNIÓN	0,00%	0,00%		
2_2.4	SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO 60000 PSI	0,00%	0,00%		
2_3	**ANDENES, SARDINELES, RAMPAS DE ACCESO Y OTRAS OBRAS**	0,00%	1,00%		
2_3.1	DEMOLICIÓN CONCRETO SIMPLE (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA DE 5 KM)	0,00%	0,00%		
2_3.2	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN H=0.0-2.0 M (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	0,00%	9,00%	ABS. K0+130.0 - K0+158.57	
2_3.3	SUBBASE GRANULAR	0,00%	4,00%	ABS. K0+130.0 - K0+158.57	
2_3.4	MORTERO 1:3 ARENA LAVADA DE PEÑA	0,00%	0,00%		
2_3.5	SARDINEL PREFABRICADO A-10	0,00%	0,00%		
2_3.6	TABLETA PREFABRICADA A-20 (20X20CM)	0,00%	0,00%		
2_3.7	LOSETA PREFABRICADA A-57 (200x200x60mm) (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE 4 CM DE MORTERO 1:5 HECHO EN OBRA PARA BASE Y ARENA DE PEÑA PARA SELLO)	0,00%	0,00%		
2_3.8	LOSETA PREFABRICADA A-58 (200x200x60mm) (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE 4 CM DE MORTERO 1:5 HECHO EN OBRA PARA BASE Y ARENA DE PEÑA PARA SELLO)	0,00%	0,00%		
2_3.9	PIEZA DE REMATE A115 PARA RAMPA VEHICULAR TIPO B (600x400x450mm) (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE 3CM DE MORTERO 2000 PSI)	0,00%	0,00%		
2_3.10	BORDILLO PREFABRICADO A-80 (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE 3CM MORTERO DE NIVELACIÓN 2000 PSI)	0,00%	0,00%		
2_3.11	SARDINEL ESPECIAL A110 PARA RAMPA B (600x400x500mm) (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE 3CM DE MORTERO 2000 PSI)	0,00%	0,00%		
2_3.12	SARDINEL BAJO A85 - RAMPAS (800x200x350mm) (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE 3CM DE MORTERO 2000 PSI)	0,00%	0,00%		
2_3.13	SARDINEL ESPECIAL A100 PARA RAMPA TIPO A (600x200x500mm) (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE 3CM DE MORTERO 2000 PSI)	0,00%	0,00%		
2_4	**SEÑALIZACIÓN**	0,00%	0,00%		
2_4.1	LÍNEAS DE DEMARCACIÓN CON PINTURA EN FRÍO	0,00%	0,00%		
2_4.2	MARCA VIAL CON PINTURA EN FRÍO	0,00%	0,00%		

RESUMEN DE ACTIVIDADES DE ORDEN ADMINISTRATIVO DE LA INTERVENTORÍA:

Durante el periodo del presente informe la Interventoría desarrollo las siguientes actividades:

• Comité técnico del 16 de octubre de 2024.
• Acompañamiento y verificación de las actividades desarrolladas en campo.
• Verificación, concepto y tramite de los requerimientos y solicitudes de la Entidad y contratista.
• Elaboración informe semanal de interventoría No. 08.

REPORTE DE PERSONAL CONTRATISTA - INTERVENTORIA - EQUIPOS Y MAQUINARIA

PERSONAL OBRA

CARGO	CANTIDAD	DEDICACION / OBSERVACIONES
DIRECTOR DE OBRA	1	20%
RESIDENTE DE OBRA	1	100%
TOPOGRAFO	1	30%
INSPECTOR SISO	1	50%
CADENERO	1	100%
OFICAL DE OBRA	5	100%
AYUDANTE DE OBRA	8	100%
OPERADOR	4	100%
AUXILIAR DE TRAFICO	2	100%

PERSONAL INTERVENTORÍA

CARGO	CANTIDAD	DEDICACION / OBSERVACIONES
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	1	30%
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	1	100%
PROFESIONAL SST	1	50%
TOPOGRAFO	1	20%
CADENERO	1	20%

EQUIPOS Y MAQUINARIA DE OBRA

CARGO	CANTIDAD	DEDICACION / OBSERVACIONES
TROMPO 1 BULTO		
VIBRADOR PARA CONCRETO		
VIBRO-COMPACTADOR	1	100%
RETROEXCAVADORA	1	100%
MOTONIVELADORA		
VOLQUETA	3	20%
MINICARGADOR	2	100%

REPORTE DEL ESTADO DEL CLIMA

LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO
Sin lluvias	Sin lluvias	Sin lluvias	Sin lluvias	Sin lluvias	Sin lluvias	Sin lluvias

SEGUIMIENTO FINANCIERO

AVANCE FINANCIERO - CONTRATO DE OBRA

Acta Parcial de Obra No.	Periodo	Costo Total
1		
2		
3		
4		
Total Acumulado	**$**	**-**

AVANCE FINANCIERO
Valor Total Contrato Obra
$ 1.013.737.100,18
Valor facturado Contrato Obra
$ 0,00
% Avance facturado Acumulado
0,00%
Saldo por Facturar
$ 1.013.737.100,18

	VERSIÓN	1
	Fecha	22-ago-24

ALCALDIA MUNICIPAL DE LA CALERA
Secretaria de Obras Públicas


Semana No 8 **Del :** 14/10/2024 **AL:** 20/10/2024
Plazo Total 210 días

AVANCE FINANCIERO - CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Acta Parcial de Interventoría No.	Periodo	Costo Total
1		
2		
3		
4		
Total Acumulado	**$**	**-**

AVANCE FINANCIERO
Valor Total Contrato Interventoría
$ 102.580.737,00
Valor facturado Contrato Interventoría
$ 0,00
% Avance facturado Acumulado
0,00%
Saldo por Facturar
$ 102.580.737,00

INFORME GRAFICO

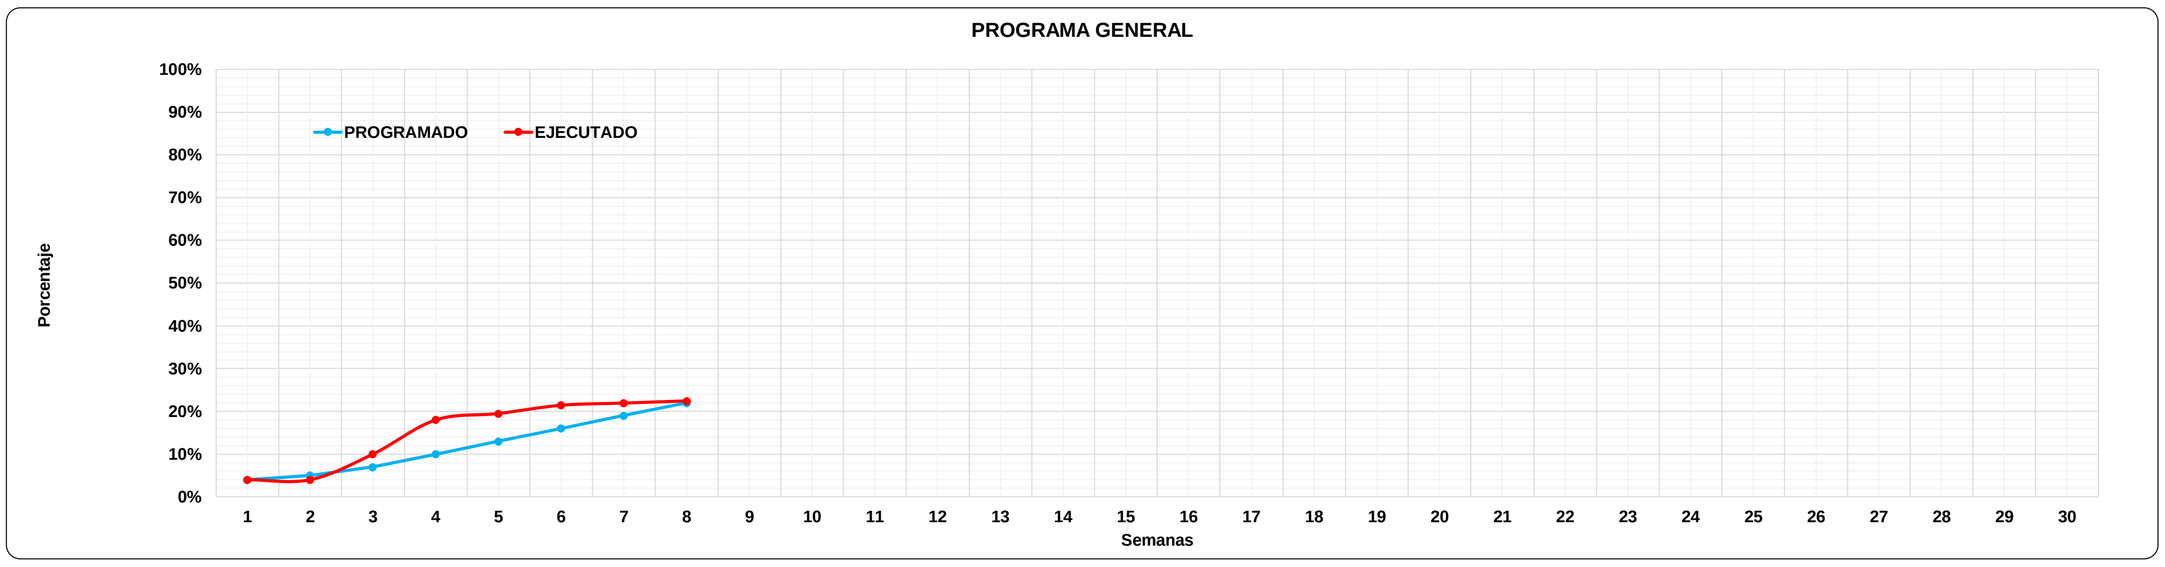

REGISTRO FOTOGRAFICO



FOTO 1. NIVELACION DE RAJON TRAMO 1 CALLE 8



FOTO 2. NIVELACION DE RAJON TRAMO 1 CALLE 8



FOTO 3. RELLENOS TUBERIA RED A.P. TRAMO 1 CALLE 8



FOTO 4. RELLENOS TUBERIA RED A.P. TRAMO 1 CALLE 8



FOTO 5. NIVELACION DE RAJON TRAMO 2 CALLE 9



FOTO 6. NIVELACION DE RAJON TRAMO 2 CALLE 9

	VERSIÓN	1
	Fecha	22-ago-24

ALCALDIA MUNICIPAL DE LA CALERA
Secretaria de Obras Públicas

Semana No	**8**		**Del :**	14/10/2024	**AL:** 20/10/2024
Plazo Total	**210** días				



FOTO 7. NIVELACION DE RAJON TRAMO 2 CALLE 9



FOTO 8. RELLENO TUBERIA RED A.P. TRAMO 2 CALLE 9

OBSERVACIONES Y COMPROMISOS

1. A la fecha se cuenta con un porcentaje de avance programado del 22.00% y un avance ejecutado del 22.45%, por lo el cual se presenta un avance a favor del 0.45%.

2. Se realiza seguimiento a las actividades de acuerdo a la programación contractual aprobada por la interventoría mediante comunicado CINP-BTA-044-0050-4614 del 06 de septiembre de 2024.

3. Durante el periodo del presente informe se registró bajo avance en ejecución de las obras de pavimentación teniendo en cuenta que se están adelantando los trabajos de traslado de las redes de agua potable por parte del prestador de servicios públicos ESPUCAL como se ha establecido mediante acta del día 1 de octubre y correo electrónico enviado por el Municipio el día 2 de octubre de 2024.

4. De acuerdo a los requerimientos realizados por el municipio, se realiza entrega del balance presupuestal y solicitud de adición mediante comunicado CINP-BTA-044-0140-5308 del 17 de octubre de 2024.

FIRMA DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
NOMBRE: DIEGO FERNANDO CLARO CARRASCAL
