UNIDAD EJECUTORA: MUNICIPIO DE POPAYÁN, SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA

CONTRATO DE OBRA No : 20231800029387 DEL 2023

OBJETO: "MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA MALLA VIAL EN EL MUNICIPIO DE POPAYÁN"

CONTRATISTA: CONSORCIO MANTENIMIENTO VIAL 2023

LOCALIZACIÓN (RUTA Y TRAMO): MUNICIPIO DE POPAYAN

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No : 20231800030567 DEL 2023

PLAZO INICIAL:	
FECHA DE INICIACION:	
SUSPENSION Nº 1:	
PRORROGA Nº 1 A LA SUSPENSIÓN Nº 1	
PRORROGA Nº 2 A LA SUSPENSIÓN Nº 1	
REINICIO Nº 1:	
PRORROGA No. 1:	
SUSPENSION Nº 2:	
PRORROGA Nº 1 A LA SUSPENSIÓN Nº 2	
REINICIO Nº 2:	
PRORROGA No. 2:	
SUSPENSION Nº 3:	
REINICIO Nº 3:	
PRORROGA No. 3:	
ADICIONAL Nº 1:	
PRORROGA Nº 4:	
PRORROGA Nº 5:	
PRORROGA Nº 6:	
ADICIONAL Nº 2:	
PRORROGA Nº 7:	
PRORROGA Nº 8:	
PRORROGA Nº 9:	
TERMINACION:	
VALOR INICIAL (incluido IVA) :	
VALOR ADICIONAL No.1 (incluido IVA) :	
VALOR ADICIONAL No.2 (incluido IVA) :	
VALOR TOTAL ACUMULADO:	

GRANDES PARTIDAS DE PAGO (1)	VALOR ORIGINAL (2) V ACTUALIZADO	% (3) SOBRE	% (4) EJECUTADO	% (5) EJECUTADO	2023					
	MILES DE PESOS	V. CONTRATO	SOBRE VALOR G.P.P.	SOBRE V. CONTRATO	MES UNO (03 OCT - 31 OCT)	MES DOS (01 NOV - 30 NOV)	MES TRES (01 DIC - DIC)	(24 ENE - 31 ENE) MES 4	(1 FEB - 28 FEB) MES 5	(1 MAR - 22 MA MES 6
					1,194%	6,536%	10,683%	0,517%	2,860%	2,937%
CAPITULO II - EXPLANACIONES	($ 1.333.629,05)	(8,42%)	0%	0,000%						
	($ 1.250.261,12)	(7,89%)			0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%
					9,466%	40,657%	23,062%	5,592%	29,817%	28,011%
CAPITULO III - AFIRMADOS, SUB-BASES, BASES Y PAVIMENTO	($ 9.135.945,25)	(57,68%)	0%	0,000%						
	($ 13.859.615,21)	(87,51%)			0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%
					0,000%	0,622%	0,622%	0,000%	0,066%	0,055%
CAPITULO VI - DRENAJE VIAL	($ 155.295,67)	(0,98%)	0%	0,000%						
	($ 66.694,15)	(0,42%)			0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%
					0,000%	0,000%	0,473%	0,000%	0,236%	0,236%
CAPITULO VII - SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD	($ 59.041,73)	(0,37%)	0%	0,000%						
	($ 59.041,73)	(0,37%)			0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%
					2,333%	5,976%	3,642%	0,173%	0,690%	0,509%
CAPITULO IX - TRANSPORTE DE MATERIALES	($ 1.491.973,68)	(9,42%)	0%	0,000%						
	($ 295.512,74)	(1,87%)			0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%
					0,493%	1,232%	0,739%	0,493%	0,739%	1,232%
PLAN GESTION AMBIENTAL	($ 307.469,26)	(1,94%)	0%	0,000%						
	($ 307.469,26)	(1,94%)			0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%
AJUSTE AL PESO	-($ 0,26)									
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	($ 15.838.593,93)	(100,00%)		0,000%						

SUSPENSION 01, 30 DICIEMBRE 2023 - 24 DE ENERO 2024

MODIFICATORIO 01, PRORROGA DOS MESES CALENDARIO (26 ENERO - 25

SUSPENSION 02, 22 MARZO - 03 DE ABRIL 2024

CONVENCIONES

PROGRAMADO BARRAS

EJECUTADO CURVAS

INVERSIÓN MENSUAL BÁSICA	%	PROGRAMADA	13,486%	53,828%	32,686%	6,774%	34,409%	30,463%
		EJECUTADA	7,604%	8,440%	10,309%	4,686%	16,704%	14,871%
	MILES DE PESOS	PROGRAMADA	1683526,16	6719547,763	4080280,703	845668,1835	4295347,291	4052479,537
		EJECUTADA	949275,54	1053645,975	1286938,105	585000	2085163,74	1856417,907
INVERSIÓN ACUMULADA BÁSICA	%	PROGRAMADA	13,486%	67,314%	100,000%	33,128%	67,537%	98,000%
		EJECUTADA	7,604%	16,045%	26,354%	31,040%	47,744%	62,615%
	MILES DE PESOS	PROGRAMADA	1.683.526,16	8.403.073,92	12.483.354,63	4.135.527,80	8.430.875,09	12.483.354,63
		EJECUTADA	949275,54	2002921,51	3289859,62	3874859,62	5960023,36	7816441,26

(1) Deben anotarse los codigos de los item agrupados G.P.P

(2) Valor original y actualizado de las G.P.P. vigentes (ver instructivo)


(3) Porcentaje de cada G.P.P. tomando como 100 % el valor total del contrato principal

(4)Porcentaje ejecutado acumulado de cada G.P.P. tomando como 100 % el valor vigente de cada G.P.P.

(5)Porcentaje ejecutado acumulado de cada G.P.P. tomando 100 % el valor total del contrato principal

MARCO ANTONIO LOPEZ RODRIGUEZ
REP. LEGAL
CONTRATISTA

HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
3 de octubre de 2023
30 de diciembre 2023 - 24 de enero 2024
9 de enero de 2024
15 de enero de 2024
24 de enero de 2024
26 DE ENERO DE 2024 - 2 MESES
22 DE MARZO DE 2024
01 DE ABRIL DE 2024
03 DE ABRIL DE 2024
05 DE ABRIL DE 2024 - 2 MESES
5 DE JUNIO DE 2024
12 DE JUNIO DE 2024
13 DE JUNIO DE 2024 - HASTA EL 28 DE JUNIO DE 2024
28 DE JUNIO DE 2024
HASTA EL 29 DE JULIO DE 2024
HASTA EL 13 DE AGOSTO DE 2024
HASTA EL 23 DE AGOSTO DE 2024
23 DE AGOSTO DE 2024
HASTA EL 15 DE OCTUBRE DE 2024
HASTA EL 15 DE NOVIEMBRE DE 2024
HASTA EL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024
30 de noviembre de 2024
($ 12.483.354.626,00)
($ 1.300.000.000,00)
($ 2.055.239.275,00)
($ 15.838.593.901,00)

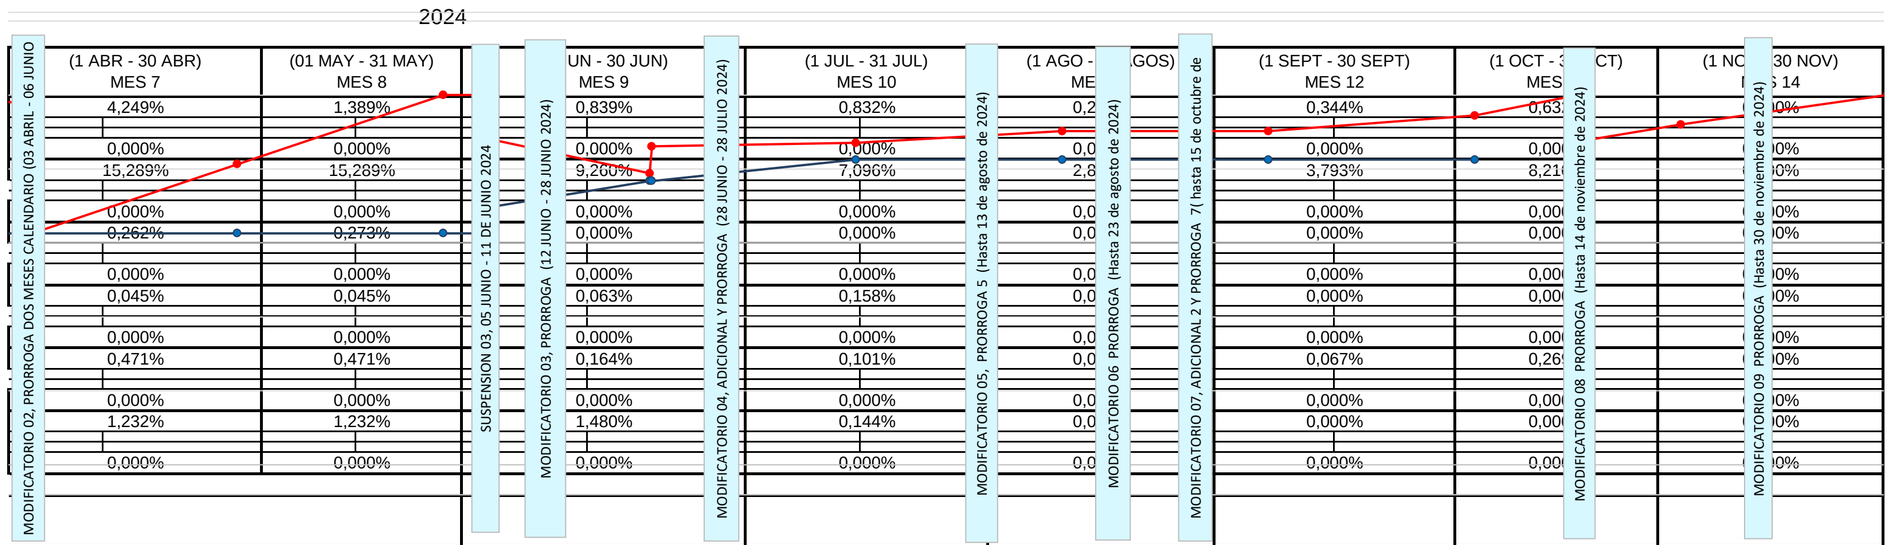

(1 ABR - 30 ABR) MES 7	(01 MAY - 31 MAY) MES 8	UN - 30 JUN) MES 9	(1 JUL - 31 JUL) MES 10	(1 AGO - GOS) ME	(1 SEPT - 30 SEPT) MES 12	(1 OCT - CT) MES	(1 NC 30 NOV) S 14
4,249%	1,389%	0,839%	0,832%	0,2	0,344%	0,63	0%
0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,0	0,000%	0,00	0%
15,289%	15,289%	9,260%	7,096%	2,8	3,793%	8,21	5%
0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,0	0,000%	0,00	0%
0,262%	0,273%	0,000%	0,000%	0,0	0,000%	0,00	0%
0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,0	0,000%	0,00	0%
0,045%	0,045%	0,063%	0,158%	0,0	0,000%	0,00	0%
0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,0	0,000%	0,00	0%
0,471%	0,471%	0,164%	0,101%	0,0	0,067%	0,26	0%
0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,0	0,000%	0,00	0%
1,232%	1,232%	1,480%	0,144%	0,0	0,000%	0,00	0%
0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,0	0,000%	0,00	0%
18,687%	18,698%	11,805%	9,200%	3,187%	4,204%	9,111%	7,996%
17,585%	7,995%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%
2332779,781	2334133,584	1473691,552	1148516,099	504854,3712	665776,702	1443103,38	1266404,35
2195166,54	998055,27	607.150,517	1.148.516,099	913.111,266	0,00	0,00	0,00
81,302%	100,000%	78,816%	86,067%	90,211%	82,893%	92,004%	100,000%
80,200%	88,195%	75,562%	83,443%	82,536%	82,536%	82,536%	82,536%
10.149.221,04	12.483.354,63	12.483.354,63	13.631.870,73	14.288.209,00	13.129.086,17	14.572.189,55	15.838.593,90
10011607,80	11009663,08	11.010.980,221	12.159.496,320	13.072.607,586	13.072.607,586	13.072.607,586	13.072.607,586

MIGUEL MORALES HERNANDEZ
REP. LEGAL
INTERVENTORIA
