17 de septiembre de 2024

Contrato 4181.010.26.1.141-2024

Inspección técnica para cambio de domicilio

El día 17 de septiembre de 2024 del corriente año se llevó a cabo la visita técnica de verificación de las Instalaciones del taller TPO REPUESTOS S.A.S ALMACEN Y TALLER DE SERVICIOS ubicado en la dirección Carrera 24 # 13-26 Parcelación la Y Municipio: Yumbo - Valle , se evidencio que las instalaciones son totalmente cerradas, cuentan con un área superior a los 2000 m2, los cuales están debidamente demarcados; contando con pasillos de exclusivos de tránsito del personal técnico y visitantes, el taller cuenta con toda la herramienta y equipo adecuado por cada mecánico.


El área operativa específicamente los puestos de trabajo para vehículos cuentan con las áreas de circulación, debidamente acondicionadas y que cuenta con todas las medidas de seguridad, tanto para el personal como para los vehículos.

Se evidencia que el taller en su nueva sede podrá atender más de diez (10) vehículos simultáneamente, pues cuenta con 11 elevadores ubicados todos en la sede visitada para mantenimiento de vehículos.

Se evidencia sitio de trabajo para motocicletas el cual cuenta con seis (6) puestos de trabajo y elevadores para motocicletas, es decir que cuenta con el servicio integral de vehículos y motos.


Se evidencio buenas prácticas de logística en almacén, con implementación de la metodología de las 5S, además el taller cuenta con capacidad instalada suficiente para almacenar vehículos que estén a la espera de algún repuesto importado u /o alguna autorización de reparación.

Registro fotográfico

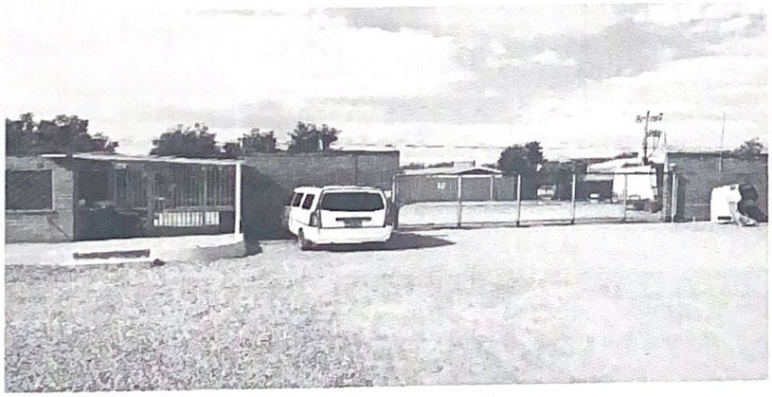


Cerramiento del taller y área superior a 2000 m^2



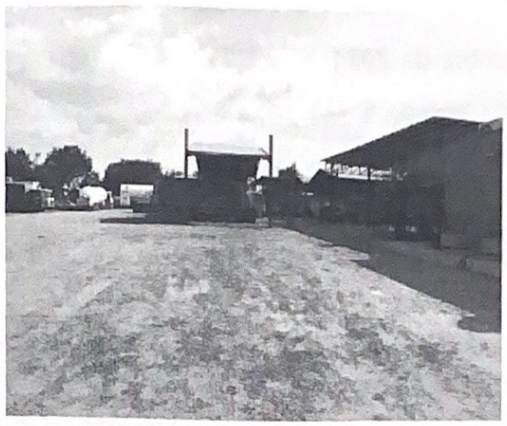

Maquinaria y equipos



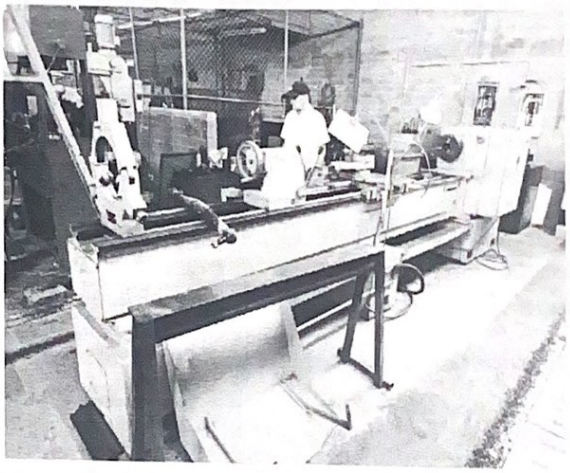


VERIFICACIÓN DE LOS EQUIPOS Y ELEMENTOS MÍNIMOS REQUERIDOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO A VEHÍCULOS:

PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO A VEHÍCULOS:

ITEM	CANT MIN.	EQUIPOS	OBSERVACIONES
1	1	Alineador de luces Reglioscopio o Alineador de luces normal certificado por la CIVAC.	En la visita al taller se evidenció este equipo con su respectiva certificación de calibración. **CUMPLE**
2	1	Almacén de repuestos	El taller cuenta con su almacén de repuestos multimarca **CUMPLE**
3	1	Balanceadora electrónica de llantas	El taller cuenta con este equipo en buenas condiciones. **CUMPLE**
4	2	Calibrador Pie de Rey.	El taller cuenta con este equipo en buenas condiciones. **CUMPLE**
5	1	Compresímetro	El taller cuenta con este equipo en buenas condiciones. **CUMPLE**
6	1	Compresor de Aire con capacidad mínima de 250 Lts	El taller presentó 2 compresores tipo convencional y tipo industrial **CUMPLE**
7	1	Contenedor para recolección de aceite usado	El taller cuenta con una zona específica donde se ubica el contenedor totalmente aislado. **CUMPLE**
8	1	Torquímetro con calibración vigente, certificado por la CIVAC.	En la visita al taller se evidenció este equipo con su respectiva certificación de calibración. **CUMPLE**
9	10	Elevadores de columna o centrales	El taller presentó 11 elevadores distribuidos en dos zonas específicas. **CUMPLE**
10	1	Engrasadora	El taller cuenta con este equipo en buenas condiciones. **CUMPLE**
11	1	Equipo de Soldadura Autógena	El taller cuenta con este equipo en buenas condiciones. **CUMPLE**
12	1	Equipo de Soldadura eléctrica	El taller cuenta con este equipo en buenas condiciones. **CUMPLE**
13	1	Equipo para carga de baterías	El taller cuenta con este equipo en buenas condiciones. **CUMPLE**
14	1	Equipo para lavado de inyectores con manómetro	El taller presenta equipo de lavado para tipo liviano y tipo pesado **CUMPLE**
15	2	Equipo scanner y software actualizado	El taller presenta varios tipos de Escaner con su respectiva calibración digital **CUMPLE**
16	2	Calibrador de profundidad de labrado (llantas) con calibración vigente	En la visita al taller se evidenció este equipo con su respectiva certificación de calibración. **CUMPLE**
17	2	Extractores de poleas y rodamientos	El taller presenta extractores para diferentes tipos de usos tipo pesado y liviano **CUMPLE**
18	3	Gatos hidráulicos de zorra	El taller cuenta con estos equipos en buenas condiciones para tipo liviano y tipo pesado **CUMPLE**
19	1	Juego completo de herramientas por cada mecánico de acuerdo el personal mínimo de trabajo	En la visita se pudo evidenciar diferentes kits de herramientas disponibles por sección o área de trabajo **CUMPLE**

Taller Motocicletas



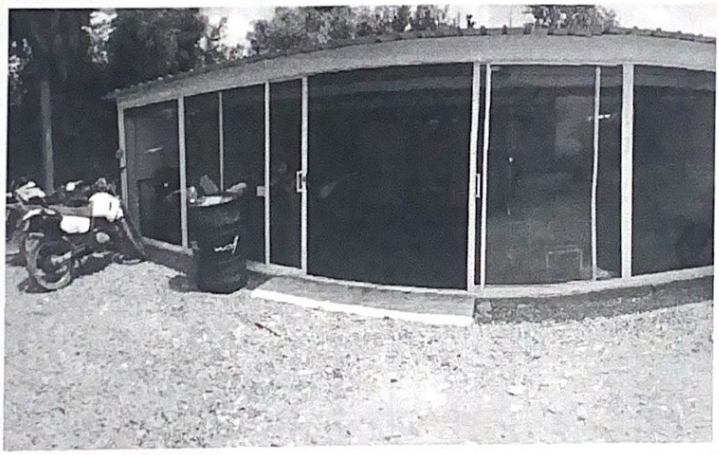

Puestos de trabajo con elevador





Almacén de repuestos



Multímetro




Scanner



Gato de zorra




Soldadura

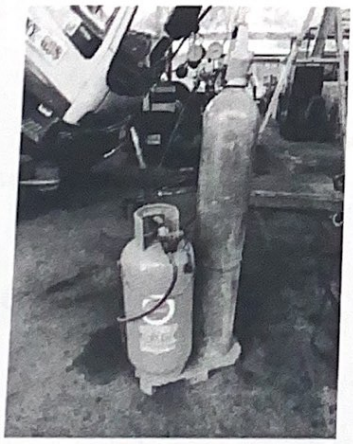

Prensa de banco



Soldador eléctrico

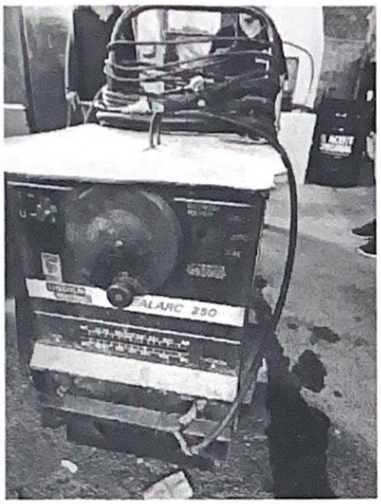


Kit de extractores




Calibrador pie de rey



Torquímetro

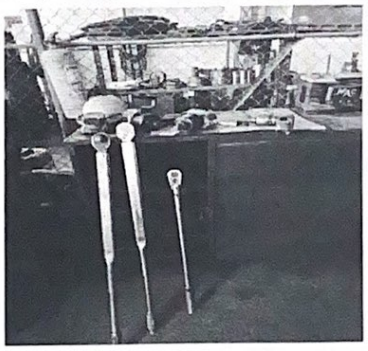


Pistolas neumáticas

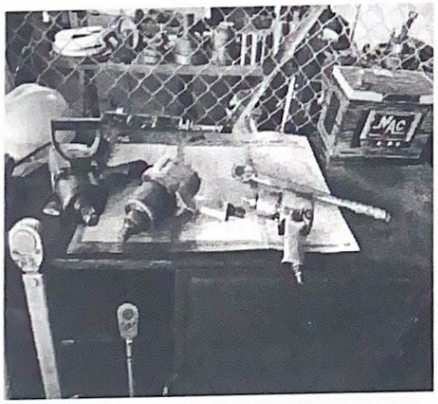

Cargador de baterías




Compresor principal línea neumática

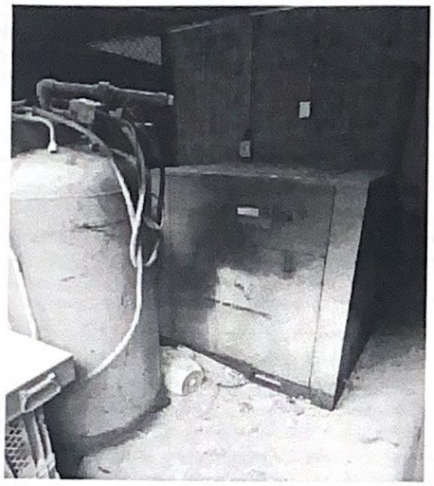

Kit de herramientas por operario



Contenedor de aceite aislado

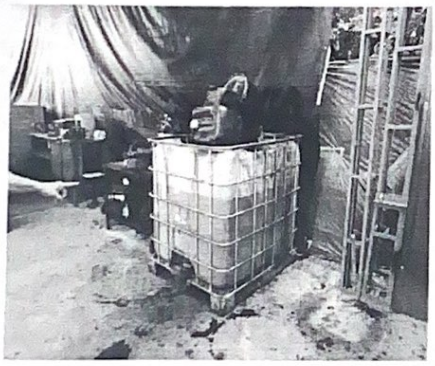

Circuito cerrado de vigilancia



Se anexa

-Lista de chequeo

-Acta de asistencia

Claudia Patricia Charria Rivera
Supervisor

Leder Wveimar Muñoz Solarte
Apoyo a la supervisión

370

N° CONTRATO: 418.010.26.1.141-2024
FECHA 09 DE SEPTIEMBRE DE 2024

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.		VERIFICADO		
El proponente en su oferta deberá manifestar que cuenta con la tecnología, maquinaria, herramienta y personal que permita obtener el mantenimiento preventivo y correctivo óptimo, por lo cual deberá certificar que dispone de una zona de trabajo que cumpla con los siguientes requisitos:		CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACION
1	Instalaciones debidamente cerradas y cubiertas con el fin de garantizar la seguridad e integridad de los vehiculos, sin utilizar el espacio público, respetando el código de policía, en especial el capítulo VI que trata sobre la protección del espacio público.	OK		
2	El área mínima útil de trabajo deberá corresponder a mínimo 2.000 m2 los cuales estarán debidamente demarcados; contando con toda la herramienta y equipo adecuado.	OK		8400 m²
3	Recibir y atender de forma prioritaria e inmediata, un mínimo de diez (10) carros simultáneamente, por lo cual el oferente deberá contar con mínimo 10 puestos de trabajo, con elevadores y/o cárcamos	OK		
4	El oferente se compromete que durante la ejecución del contrato, garantizará la seguridad de los vehículos que permanezcan en custodia durante el proceso de mantenimiento preventivo y correctivo, (por medio de personal y/o circuito cerrado de TV que ofrezca la grabación permanente), servicio que en todo caso debe ser prestado demanera permanente durante las 24 horas del día los siete días de la semana, lo anterior con el fin de brindar seguridad a los vehículos que se encuentren en el taller en horarios no laborales	OK		
5	El taller debe contar con pasillos que permitan la circulación de los operarios entre uno y otro vehículo. Los puestos de trabajo no pueden interferir entre ellos, con la intención de que la intervención de cada vehículo se pueda realizar integralmente. El área total deberá estar debidamente cerrada, cubierta, demarcada, señalizada, de acuerdo al área de intervención.	OK		
6	Alineador de luces Regloscopio o Alineador de luces normal certificado por la ONAC.			
7	Almacén de repuestos	✓		
8	Balanceadora electrónica de llantas			
9	Calibrador Pie de Rey.	✓		
10	Compresómetro	✓		
11	Compresor de Aire con capacidad mínima de 250 Lb.	✓		
12	Contenedor para recolección de aceite usado	✓		
13	Torquímetro con calibración vigente, certificado por la ONAC.	✓		
14	Elevadores de columna o centrales	✓		
15	Engrasadora	✓		
16	Equipo de Soldadura Autógena	✓		
17	Equipo de Soldadura eléctrica	✓		
18	Equipo para carga de baterías	✓		
19	Equipo para lavado de inyectores con manómetro	✓		
20	Equipo scanner y software actualizado	✓		
21	Calibrador de profundidad de labrado (llantas) con calibración vigente	✓		
22	Extractores de poleas y rodamientos	✓		
23	Gatos hidráulicos de zorra	✓		
24	Juego completo de herramientas por cada mecánico de acuerdo el personal mínimo de trabajo	✓		
25	Kit de EPP, seguridad y salud en el trabajo (extintores, careta, guantes, zapatos de seguridad y equipo de primeros auxilios)			
26	Medidor de vacío	✓		
27	Multímetros Automotrices	✓		
28	Pistolas estroboscópicas	✓		
29	Prensa Hidráulica.	✓		
30	Prensas de banco.	✓		

VICTOR CASTILLO

LEIDER WVEIMAR

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN TECNOLÓGICA Y DE LA INFORMACIÓN GESTIÓN DOCUMENTAL	MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG) LISTADO DE ASISTENCIA	MAGT04.03.P003.F007	
		VERSIÓN	002

ACTA DE REUNIÓN Nº

FECHA:	/ /
HORA INICIAL:	
HORA FINAL:	
LUGAR:	

OBJETIVO:

ASISTENTES

Nº	Nombre	Organismo/Entidad	Teléfono	Correo Electrónico	Firma
	Leder Wyerman Muñoz	UAEGBS	3114427410	leder.munoz@cali.gov.co	
	Victor Daniel Castillo	UAEGBS	3137495660	victor.castillo@cali.gov.co	
	José Hernando Benavides	TP Operativo	3113720771	jhbstransmipando@hotmail.com	

propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.
