ALCALDÍA DE ACACÍAS

JR

CONTRATO No 978 DE 2023	OBJETO DEL CONTRATO	FECHA DEL INFORME		
		1	11	2024
		D	M	A
TIPO CONTRATO	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA, AMBIENTAL Y SOCIAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR SOBRE EL CAÑO CHICHIMEME EN LA VEREDA QUEBRADITAS DEL MUNICIPIO DE ACACÍAS	CONTRATO DE OBRA 929 DE 2023		
INTERVENTORIA				
CONTRATISTA	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA ALCALDIA DE ACACIAS	CONTRATISTA		
JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA		CONSORCIO ACACIA R/L FRANCISCO MORA G.		



Fotografía 25: Verificacion topografica para toma de niveles para plataforma de operación y ejes de los pilotes.



Fotografía 26: Verificacion topografica para toma de niveles para plataforma de operación y ejes de los pilotes.



Fotografía 27; Replanteo topográfico para localizacion y marcación de ejes de los pilotes.



Fotografía 28 Replanteo topográfico para localizacion y marcación de ejes de los pilotes.

JIMMY ANDRES TORRES CASTRO
DIRECTOR DE INTERVENTORIA

JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA
RESIDENTE DE INTERVENTORIA

ALCALDÍA DE ACACÍAS

JR

CONTRATO No 978 DE 2023	OBJETO DEL CONTRATO	FECHA DEL INFORME		
		1	11	2024
		D	M	A
TIPO CONTRATO	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA, AMBIENTAL Y SOCIAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR SOBRE EL CAÑO CHICHIMEME EN LA VEREDA QUEBRADITAS DEL MUNICIPIO DE ACACÍAS	CONTRATO DE OBRA 929 DE 2023		
INTERVENTORIA				
CONTRATISTA	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA ALCALDIA DE ACACIAS	CONTRATISTA		
JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA		CONSORCIO ACACIA R/L FRANCISCO MORA G.		



Fotografía 29: Soldado de siguiente camisa para su instalacion.



Fotografía 30: Soldado de siguiente camisa para su instalacion.



Fotografía 31: Perforacion para pilotaje en costado Quebraditas.



Fotografía 32: Instalacion de la camisa iniciadora para pilotaje.

JIMMY ANDRES TORRES CASTRO
DIRECTOR DE INTERVENTORIA

JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA
RESIDENTE DE INTERVENTORIA

ALCALDÍA DE ACACÍAS

JR

CONTRATO No 978 DE 2023	OBJETO DEL CONTRATO	FECHA DEL INFORME 1 (D) 11 (M) 2024 (A)
TIPO CONTRATO INTERVENTORIA	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA, AMBIENTAL Y SOCIAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR SOBRE EL CAÑO CHICHIMEME EN LA VEREDA QUEBRADITAS DEL MUNICIPIO DE ACACÍAS	CONTRATO DE OBRA 929 DE 2023
CONTRATISTA JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA ALCALDIA DE ACACIAS	CONTRATISTA CONSORCIO ACACIA R/L FRANCISCO MORA G.



Fotografía 33: Comite de control de obra en la oficina de Infraestructura.



Fotografía 34: Comite de control de obra en la oficina de Infraestructura.



Fotografía 35: Comite de control de obra en la oficina de Infraestructura.



Fotografía 36: Comite de control de obra en la oficina de Infraestructura.

JIMMY ANDRES TORRES CASTRO
DIRECTOR DE INTERVENTORIA

JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA
RESIDENTE DE INTERVENTORIA

ALCALDÍA DE ACACÍAS

JR

CONTRATO No 978 DE 2023	OBJETO DEL CONTRATO	FECHA DEL INFORME		
		1	11	2024
		D	M	A
TIPO CONTRATO	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA, AMBIENTAL Y SOCIAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR SOBRE EL CAÑO CHICHIMEME EN LA VEREDA QUEBRADITAS DEL MUNICIPIO DE ACACÍAS	CONTRATO DE OBRA 929 DE 2023		
INTERVENTORIA				
CONTRATISTA	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA ALCALDIA DE ACACIAS	CONTRATISTA		
JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA		CONSORCIO ACACIA R/L FRANCISCO MORA G.		




Fotografía 37: Verificación Instalación Señalización vial.



Fotografía 38: Verificación Instalación Señalización vial.



Fotografía 39: Verificacion de control vial.

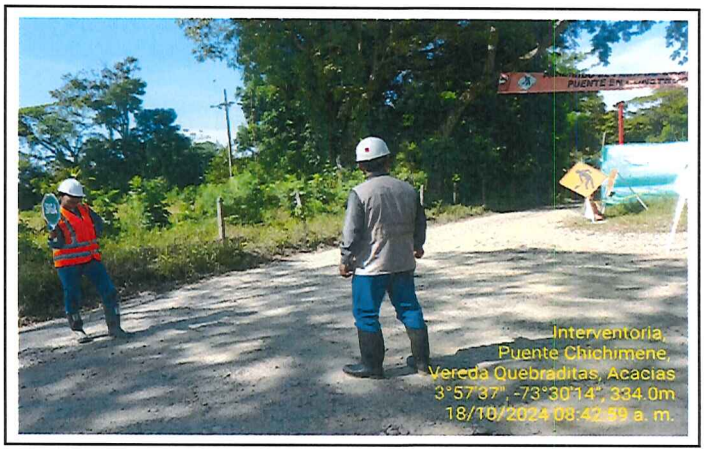

Fotografía 40: Verificacion de control vial.

JIMMY ANDRES TORRES CASTRO
DIRECTOR DE INTERVENTORIA

JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA
RESIDENTE DE INTERVENTORIA

ALCALDÍA DE ACACÍAS

JR

CONTRATO No 978 DE 2023	OBJETO DEL CONTRATO	FECHA DEL INFORME		
		1	11	2024
		D	M	A
TIPO CONTRATO	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA, AMBIENTAL Y SOCIAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR SOBRE EL CAÑO CHICHIMEME EN LA VEREDA QUEBRADITAS DEL MUNICIPIO DE ACACÍAS	CONTRATO DE OBRA 929 DE 2023		
INTERVENTORIA				
CONTRATISTA	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA ALCALDIA DE ACACIAS	CONTRATISTA		
JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA		CONSORCIO ACACIA R/L FRANCISCO MORA G.		




Fotografía 41:



Fotografía 42 Acopio de camisas perdidas para pilotaje.



Fotografía 43 Estado del puente existente en alto riesgo de colapso.

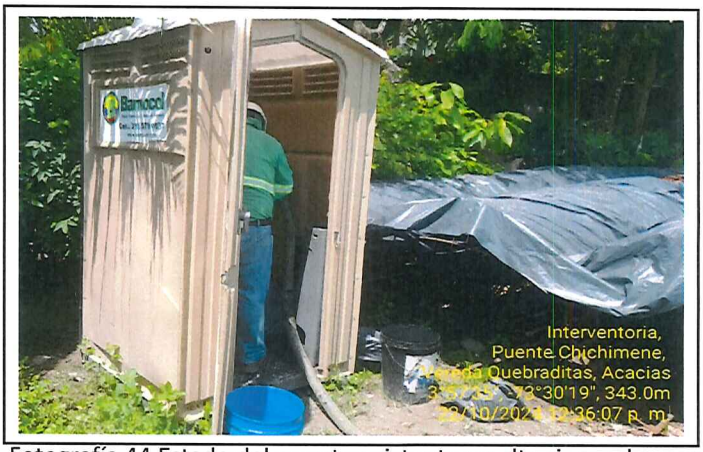

Fotografía 44 Estado del puente existente en alto riesgo de colapso.

JIMMY ANDRES TORRES CASTRO
DIRECTOR DE INTERVENTORIA

JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA
RESIDENTE DE INTERVENTORIA

CONTRATO No 978 DE 2023	OBJETO DEL CONTRATO	FECHA DEL INFORME		
		1	11	2024
		D	M	A
TIPO CONTRATO	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA, AMBIENTAL Y SOCIAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR SOBRE EL CAÑO CHICHIMEME EN LA VEREDA QUEBRADITAS DEL MUNICIPIO DE ACACÍAS	CONTRATO DE OBRA 929 DE 2023		
INTERVENTORIA				
CONTRATISTA	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA ALCALDIA DE ACACIAS	CONTRATISTA		
JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA		CONSORCIO ACACIA R/L FRANCISCO MORA G.		



Fotografía 45: Charla de seguridad previo al inicio de la jornada laboral.



Fotografía 46: Charla de seguridad previo al inicio de la jornada laboral.



Fotografía 47: Charla de seguridad previo al inicio de la jornada laboral.



Fotografía 48: Charla de seguridad previo al inicio de la jornada laboral.

JIMMY ANDRES TORRES CASTRO
DIRECTOR DE INTERVENTORIA

JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA
RESIDENTE DE INTERVENTORIA

ALCALDÍA DE ACACÍAS

JR


CONTRATO No 978 DE 2023	OBJETO DEL CONTRATO	FECHA DEL INFORME		
		1	11	2024
		D	M	A
TIPO CONTRATO	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA, AMBIENTAL Y SOCIAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR SOBRE EL CAÑO CHICHIMEME EN LA VEREDA QUEBRADITAS DEL MUNICIPIO DE ACACÍAS	CONTRATO DE OBRA 929 DE 2023		
INTERVENTORIA				
CONTRATISTA	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA ALCALDIA DE ACACIAS	CONTRATISTA		
JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA		CONSORCIO ACACIA R/L FRANCISCO MORA G.		



Fotografía 49: Instalacion valla informativa.



Fotografía 50: Instalacion valla informativa.

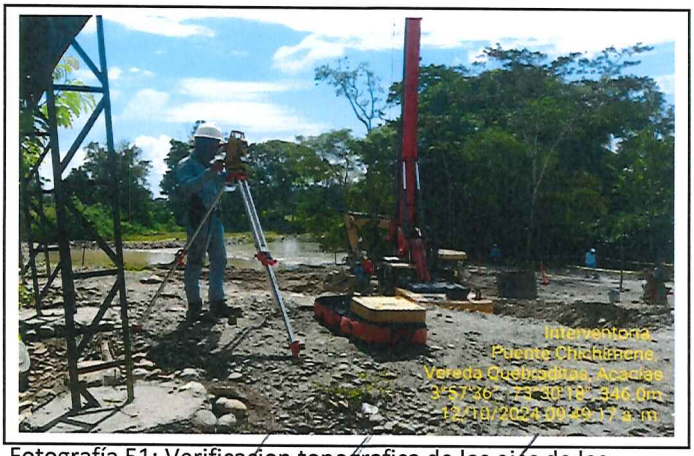

Fotografía 51: Verificacion topografica de los ejes de los pilotes.



Fotografía 52: Verificacion topografica de los ejes de los pilotes.

JIMMY ANDRES TORRES CASTRO
DIRECTOR DE INTERVENTORIA

JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA
RESIDENTE DE INTERVENTORIA

ALCALDÍA DE ACACÍAS

JR

CONTRATO No 978 DE 2023	OBJETO DEL CONTRATO	FECHA DEL INFORME		
		1	11	2024
		D	M	A
TIPO CONTRATO	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA, AMBIENTAL Y SOCIAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR SOBRE EL CAÑO CHICHIMEME EN LA VEREDA QUEBRADITAS DEL MUNICIPIO DE ACACÍAS	CONTRATO DE OBRA 929 DE 2023		
INTERVENTORIA				
CONTRATISTA	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA ALCALDIA DE ACACIAS	CONTRATISTA		
JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA		CONSORCIO ACACIA R/L FRANCISCO MORA G.		



Fotografía 53: Atencion a peticiones de la comunidad.



Fotografía 54: Atencion a peticiones de la comunidad.



Fotografía 55: Atencion a peticiones de la comunidad.



Fotografía 56: Atencion a peticiones de la comunidad.

JIMMY ANDRES TORRES CASTRO
DIRECTOR DE INTERVENTORIA

JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA
RESIDENTE DE INTERVENTORIA

ALCALDÍA DE ACACÍAS

JR

CONTRATO No 978 DE 2023	OBJETO DEL CONTRATO	FECHA DEL INFORME		
		1	11	2024
		D	M	A
TIPO CONTRATO	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA, AMBIENTAL Y SOCIAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR SOBRE EL CAÑO CHICHIMEME EN LA VEREDA QUEBRADITAS DEL MUNICIPIO DE ACACÍAS	CONTRATO DE OBRA 929 DE 2023		
INTERVENTORIA				
CONTRATISTA	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA ALCALDIA DE ACACIAS	CONTRATISTA		
JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA		CONSORCIO ACACIA R/L FRANCISCO MORA G.		



Fotografía 57: Manejo de aguas de la excavacion en los pilotes.



Fotografía 58: Manejo de aguas de la excavacion en los pilotes.



Fotografía 59: Manejo de aguas de la excavacion en los pilotes.



Fotografía 60: Manejo de aguas de la excavacion en los pilotes.

JIMMY ANDRES TORRES CASTRO
DIRECTOR DE INTERVENTORIA

JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA
RESIDENTE DE INTERVENTORIA

ALCALDÍA DE ACACÍAS

JR

CONTRATO No 978 DE 2023	OBJETO DEL CONTRATO	FECHA DEL INFORME		
		1	11	2024
		D	M	A
TIPO CONTRATO	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA, AMBIENTAL Y SOCIAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR SOBRE EL CAÑO CHICHIMEME EN LA VEREDA QUEBRADITAS DEL MUNICIPIO DE ACACÍAS	CONTRATO DE OBRA 929 DE 2023		
INTERVENTORIA				
CONTRATISTA	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA ALCALDIA DE ACACIAS	CONTRATISTA		
JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA		CONSORCIO ACACIA R/L FRANCISCO MORA G.		




Fotografía 61: Verificacion elementos y kit de emergiecias.



Fotografía 62: Verificacion elementos y kit de emergiecias.



Fotografía 63: Verificacion elementos y kit de emergiecias.

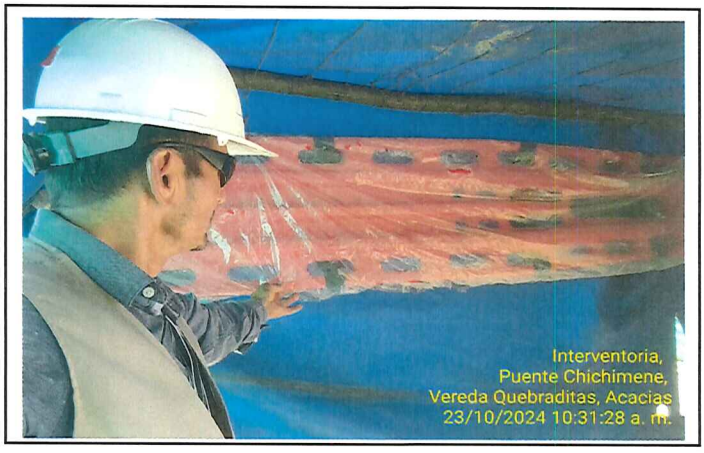

Fotografía 64: Verificacion elementos y kit de emergiecias.

JIMMY ANDRES TORRES CASTRO
DIRECTOR DE INTERVENTORIA

JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA
RESIDENTE DE INTERVENTORIA

ALCALDÍA DE ACACÍAS

JR


CONTRATO No 978 DE 2023	OBJETO DEL CONTRATO	FECHA DEL INFORME		
		1	11	2024
		D	M	A
TIPO CONTRATO	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA, AMBIENTAL Y SOCIAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR SOBRE EL CAÑO CHICHIMEME EN LA VEREDA QUEBRADITAS DEL MUNICIPIO DE ACACÍAS	CONTRATO DE OBRA 929 DE 2023		
INTERVENTORIA				
CONTRATISTA	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA ALCALDIA DE ACACIAS	CONTRATISTA		
JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA		CONSORCIO ACACIA R/L FRANCISCO MORA G.		



Fotografía 65: Verificacion vigencia de EPPs.



Fotografía 66: Verificacion entrega de EPPs.

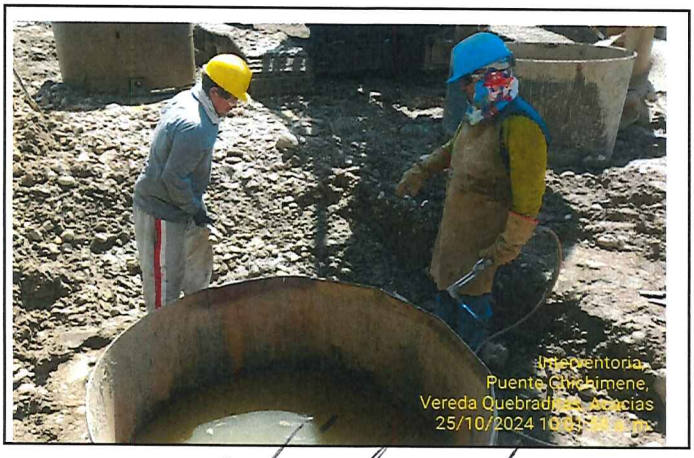

Fotografía 67: Verificacion uso de EPPs.



Fotografía 68: Verificacion uso de EPPs.

JIMMY ANDRES TORRES CASTRO
DIRECTOR DE INTERVENTORIA

JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA
RESIDENTE DE INTERVENTORIA

CONTRATO No 978 DE 2023	OBJETO DEL CONTRATO	FECHA DEL INFORME		
		1	11	2024
		D	M	A
TIPO CONTRATO	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA, AMBIENTAL Y SOCIAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR SOBRE EL CAÑO CHICHIMEME EN LA VEREDA QUEBRADITAS DEL MUNICIPIO DE ACACÍAS	CONTRATO DE OBRA 929 DE 2023		
INTERVENTORIA				
CONTRATISTA	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA ALCALDIA DE ACACIAS	CONTRATISTA		
JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA		CONSORCIO ACACIA R/L FRANCISCO MORA G.		



Fotografía 69: Verificacion kit derrames de maquinaria (Piloteadora).



Fotografía 70: Verificacion kit derrames de maquinaria (Piloteadora).



Fotografía 71: Verificacion kit derrames de maquinaria (Retroexcavadora).



Fotografía 72: Verificacion kit derrames de maquinaria (Retroexcavadora).

JIMMY ANDRES TORRES CASTRO
DIRECTOR DE INTERVENTORIA

JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA
RESIDENTE DE INTERVENTORIA

CONTRATO No 978 DE 2023	OBJETO DEL CONTRATO	FECHA DEL INFORME		
		1	11	2024
		D	M	A
TIPO CONTRATO	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA, AMBIENTAL Y SOCIAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR SOBRE EL CAÑO CHICHIMEME EN LA VEREDA QUEBRADITAS DEL MUNICIPIO DE ACACÍAS	CONTRATO DE OBRA 929 DE 2023		
INTERVENTORIA				
CONTRATISTA	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA ALCALDIA DE ACACIAS	CONTRATISTA		
JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA		CONSORCIO ACACIA R/L FRANCISCO MORA G.		



Fotografía 73: Cargue y retiro de material de la plataforma de operacion.



Fotografía 74: Cargue y retiro de material de la plataforma de operacion.



Fotografía 75: Limpieza del fonde de la excavacion.



Fotografía 76: Verificacion del estado de las camisas instaladas.

JIMMY ANDRES TORRES CASTRO
DIRECTOR DE INTERVENTORIA

JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA
RESIDENTE DE INTERVENTORIA


CONTRATO No 978 DE 2023	OBJETO DEL CONTRATO	FECHA DEL INFORME		
		1	11	2024
		D	M	A
TIPO CONTRATO	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA, AMBIENTAL Y SOCIAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR SOBRE EL CAÑO CHICHIMEME EN LA VEREDA QUEBRADITAS DEL MUNICIPIO DE ACACÍAS	CONTRATO DE OBRA 929 DE 2023		
INTERVENTORIA				
CONTRATISTA	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA ALCALDIA DE ACACIAS	CONTRATISTA		
JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA		CONSORCIO ACACIA R/L FRANCISCO MORA G.		



Fotografía 77: Verificacion profundidad de la excavacion.



Fotografía 78: Verificacion profundidad de la excavacion.

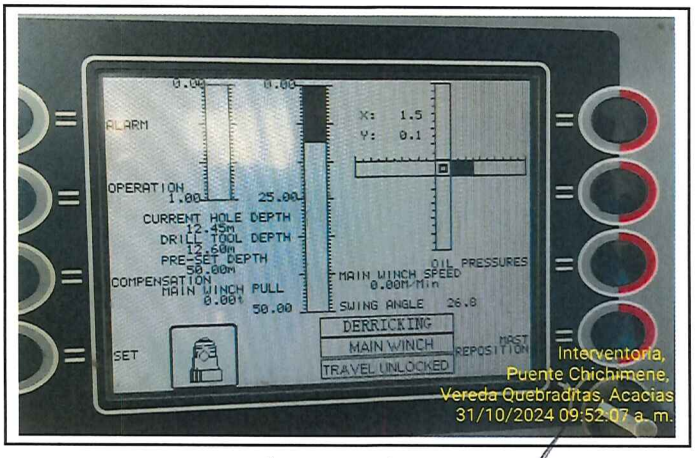

Fotografía 79: Verificacion de la verticalidad de la excavacion.



Fotografía 80: Verificacion de la verticalidad de la excavacion.


JIMMY ANDRES TORRES CASTRO
DIRECTOR DE INTERVENTORIA

JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA
RESIDENTE DE INTERVENTORIA

ALCALDÍA DE ACACÍAS

JR

CONTRATO No 978 DE 2023	OBJETO DEL CONTRATO	FECHA DEL INFORME		
		1	11	2024
		D	M	A
TIPO CONTRATO	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA, AMBIENTAL Y SOCIAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR SOBRE EL CAÑO CHICHIMEME EN LA VEREDA QUEBRADITAS DEL MUNICIPIO DE ACACÍAS	CONTRATO DE OBRA 929 DE 2023		
INTERVENTORIA				
CONTRATISTA	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA ALCALDIA DE ACACIAS	CONTRATISTA		
JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA		CONSORCIO ACACIA R/L FRANCISCO MORA G.		

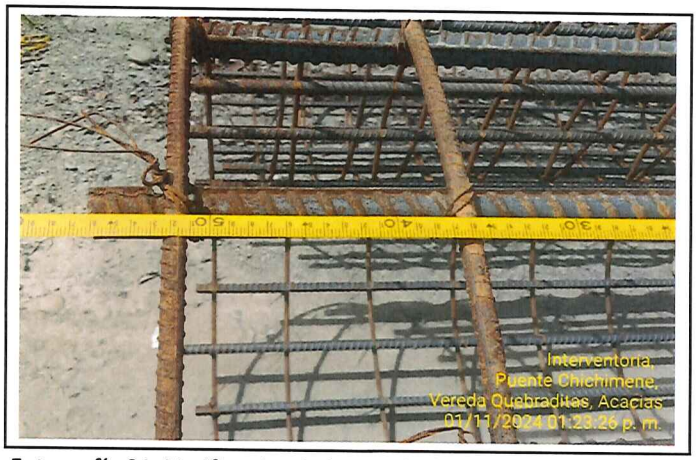

Fotografía 81: Verificacionde las medidad de la armadura de aceros.



Fotografía 82: Verificacionde las medidad de la armadura de aceros.



Fotografía 83: Colocacion de la armadura de refuerzo y su instalacion deltro de lal excavacion del pilote.



Fotografía 84: Verificacion de la isntalacion de separadores en la armadura para garantizar el recubrimiento del acero.

JIMMY ANDRES TORRES CASTRO
DIRECTOR DE INTERVENTORIA

JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA
RESIDENTE DE INTERVENTORIA

ALCALDÍA DE ACACÍAS

JR

CONTRATO No 978 DE 2023	OBJETO DEL CONTRATO	FECHA DEL INFORME		
		1	11	2024
		D	M	A
TIPO CONTRATO	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA, AMBIENTAL Y SOCIAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR SOBRE EL CAÑO CHICHIMEME EN LA VEREDA QUEBRADITAS DEL MUNICIPIO DE ACACÍAS	CONTRATO DE OBRA 929 DE 2023		
INTERVENTORIA				
CONTRATISTA	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA ALCALDIA DE ACACIAS	CONTRATISTA		
JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA		CONSORCIO ACACIA R/L FRANCISCO MORA G.		




Fotografía 85: Llegada de concreto a la obra.



Fotografía 86: Llegada de concreto a la obra.



Fotografía 87: Toma de acentamiento del concreto a la llegada del concreto a obra.

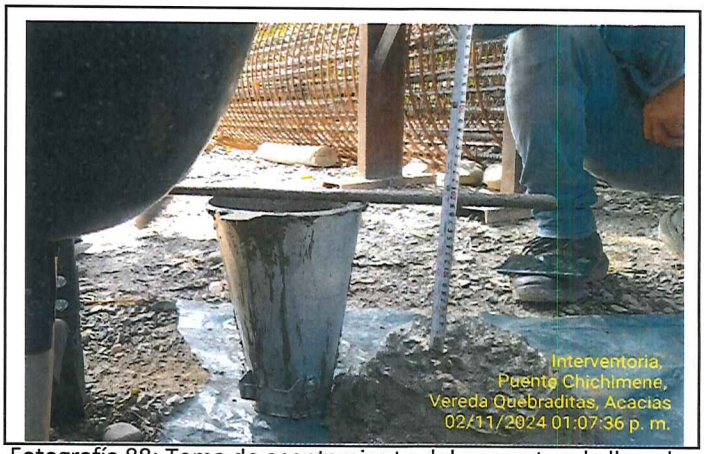

Fotografía 88: Toma de acentamiento del concreto a la llegada del concreto a obra.

JIMMY ANDRES TORRES CASTRO
DIRECTOR DE INTERVENTORIA

JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA
RESIDENTE DE INTERVENTORIA

ALCALDÍA DE ACACÍAS

JR

CONTRATO No 978 DE 2023	OBJETO DEL CONTRATO	FECHA DEL INFORME		
		1	11	2024
		D	M	A
TIPO CONTRATO	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA, AMBIENTAL Y SOCIAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR SOBRE EL CAÑO CHICHIMEME EN LA VEREDA QUEBRADITAS DEL MUNICIPIO DE ACACÍAS	CONTRATO DE OBRA 929 DE 2023		
INTERVENTORIA				
CONTRATISTA	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA ALCALDIA DE ACACIAS	CONTRATISTA		
JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA		CONSORCIO ACACIA R/L FRANCISCO MORA G.		



Fotografía 85: Vaciado de concreto en el pilote No.5



Fotografía 86: Vaciado de concreto en el pilote No.5



Fotografía 87: Vaciado de concreto en el pilote No.5



Fotografía 88: Vaciado de concreto en el pilote No.5

JIMMY ANDRES TORRES CASTRO
DIRECTOR DE INTERVENTORIA

JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA
RESIDENTE DE INTERVENTORIA

13.2 Acta de avance de cantidades

ACTA DE EJECUCION DE ACTIVIDADES
"CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR SOBRE EL CAÑO CHICHIMENE EN LA VEREDA QUEBRADITAS DEL MUNICIPIO DE ACACÍAS"

CONDICIONES CONTRACTUALES SEGÚN PROPUESTA ECONOMICA						EJECUTADO MES 6			EJECUTADO ACUMULADO MES 6		
Nº	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD EJECUTADA	VALOR EJECUTADO	% EECUTADO	CANTIDAD EJECUTADA	VALOR EJECUTADO	% EECUTADO
1. CONSTRUCCIÓN PUENTE VEHICULAR											
1.1 PRELIMINARES											
1	LOCALIZACIÓN, TRAZADO Y REPLANTEO TOPOGRÁFICO ZONA RURAL ÁREA ABIERTA. INCLUYE EQUIPO AUTOMÁTICO DE PRECISIÓN, CARTERA Y PLANOS	M2	2.060,60	$ 4.275,00	$ 8.809.065,00	350,00	$ 1.496.250,00	16,99%	700,00	$ 2.992.500,00	33,97%
2	DESCAPOTE MECÁNICO H= 0.20 M	M3	288,00	$ 17.366,00	$ 5.001.408,00	144,00	$ 2.500.704,00	50,00%	288,00	$ 5.001.408,00	100,00%
3	CANALIZACIÓN RIO (BULLDOZER TIPO D8K CAT)	HR	560,00	$ 414.964,00	$ 232.379.840,00	290,00	$ 120.339.560,00	51,79%	300,00	$ 124.489.200,00	53,57%
4	MANEJO AGUA CON MOTOBOMBA 6" AUTOCEBANTE DIESEL	DÍA	50,00	$ 269.223,00	$ 13.461.150,00	5,00	$ 1.346.115,00	10,00%	5,00	$ 1.346.115,00	10,00%
5	MANEJO AGUA CON MOTOBOMBA 4" 11 HP AUTOCEBANTE A GASOLINA	DÍA	70,00	$ 179.155,00	$ 12.540.850,00	5,00	$ 895.775,00	7,14%	5,00	$ 895.775,00	7,14%
	Subtotal				**$ 272.192.313,00**		**$ 126.578.404,00**	46,503%		**$ 134.724.998,00**	49,496%
1.2 EXCAVACIONES Y RELLENOS											
6	EXCAVACIÓN MECANICA EN CONGLOMERADO INCLUYE CARGUE	M3	595,48	$ 37.854,00	$ 22.541.300,00	370,00	$ 14.005.980,00	62,13%	587,00	$ 22.220.298,00	98,58%
7	RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE DE LA EXCAVACIÓN. COMPACTACIÓN MECÁNICA	M3	1.386,00	$ 27.836,00	$ 38.580.696,00	0,00	$ 0,00	0,00%	0,00	$ 0,00	0,00%
	Subtotal				**$ 61.121.996,00**		**$ 14.005.980,00**	22,915%		**$ 22.220.298,00**	36,354%
1.3 INFRAESTRUCTURA											
8	SOLADO, LIMPIEZA EN CONCRETO 13.8 MPa (2000 PSI)	M3	31,78	$ 630.500,00	$ 20.037.290,00	0,00	$ 0,00	0,00%	0,00	$ 0,00	0,00%
9	CONSTRUCCIÓN PILOTE PREEXCAVADO FUNDIDO IN SITU D= 1.50 M CONCRETO TREMIE 27.6 MPa - 4000 PSI. NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO	ML	192,00	$ 3.129.113,00	$ 600.789.696,00	12,00	$ 37.549.356,00	6,25%	12,00	$ 37.549.356,00	6,25%
10	CONCRETO CICLOPEO 3000 PSI - 20.7 MPa PIEDRA PROPORCIÓN 60C/40P MEZCLA EN OBRA	M3	18,72	$ 668.857,00	$ 12.521.003,00	0,00	$ 0,00	0,00%	0,00	$ 0,00	0,00%
11	ESTRIBOS EN CONCRETO 27.6 MPa (4000 PSI) SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	340,52	$ 1.416.306,00	$ 482.280.519,00	0,00	$ 0,00	0,00%	0,00	$ 0,00	0,00%
12	CONCRETO 27.6 MPA (4000 PSI) BOX, ALETAS, MUROS ARMADOS	M3	167,64	$ 1.163.835,00	$ 195.105.299,00	0,00	$ 0,00	0,00%	0,00	$ 0,00	0,00%
	Subtotal				**$ 1.310.733.807,00**		**$ 37.549.356,00**	2,865%		**$ 37.549.356,00**	2,865%
1.4 SUPERESTRUCTURA											
13	TABLERO EN CONCRETO 27.6 MPa (4000 PSI) SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	183,86	$ 1.527.851,00	$ 280.910.685,00	0,00	$ 0,00	0,00%	0,00	$ 0,00	0,00%
14	PLACAS DE ACCESO EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	14,86	$ 925.221,00	$ 13.748.784,00	0,00	$ 0,00	0,00%	0,00	$ 0,00	0,00%
15	BARRERA EN CONCRETO TIPO NEW JERSEY	M3	25,98	$ 966.055,00	$ 25.098.109,00	0,00	$ 0,00	0,00%	0,00	$ 0,00	0,00%
16	TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR PARA CONCRETOS	M3/KM	24.458,84	$ 1.841,00	$ 45.028.724,00	0,00	$ 0,00	0,00%	0,00	$ 0,00	0,00%
	Subtotal				**$ 364.786.302,00**		**$ 0,00**	0,000%		**$ 0,00**	0,000%
1.5 ACERO DE REFUERZO											
17	ACERO DE REFUERZO FY=4200 MPa (4200 KG/CM2, G60) INCLUYE SUMINISTRO, FIGURADO, ARMADO, COLOCACIÓN Y AMARRE	KG	82.229,44	$ 9.082,00	$ 746.807.774,00	9.000,00	$ 81.738.000,00	10,94%	25.000,00	$ 227.050.000,00	30,40%
18	ESTRUCTURAS EN ACERO ESTRUCTURAL TIPO ASTM A588 INCLUYE SUMINISTRO Y ENSAMBLAJE	KG	211.978,56	$ 21.086,00	$ 4.469.779.885,00	0,00	$ 0,00	0,00%	0,00	$ 0,00	0,00%
19	ACERO ESTRUCTURAL T ASTM A36	KG	57.123,14	$ 25.087,00	$ 1.433.048.261,00	4.800,00	$ 120.417.600,00	8,40%	36.720,00	$ 921.194.640,00	64,28%
20	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAMINA METALDECK 2" CAL 20 (NO INCLUYE CONCRETO)	M2	458,20	$ 63.814,00	$ 29.239.575,00	0,00	$ 0,00	0,00%	0,00	$ 0,00	0,00%
21	TRANSPORTE DE ESTRUCTURA METÁLICA	KG/KM	42.660.684,90	$ 2,00	$ 85.321.370,00	0,00	$ 0,00	0,00%	0,00	$ 0,00	0,00%
22	MONTAJE DE ESTRUCTURA METÁLICA	KG	211.978,56	$ 7.007,00	$ 1.485.333.770,00	0,00	$ 0,00	0,00%	0,00	$ 0,00	0,00%
	Subtotal				**$ 8.249.530.635,00**		**$ 202.155.600,00**	2,451%		**$ 1.148.244.640,00**	13,919%
1.6 OBRAS COMPLEMENTARIAS											
23	BARANDA METALICA TUBERIA GALVANIZADA 2 112" - 4" INCLUYE SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PINTURA	ML	116,00	$ 515.773,00	$ 59.829.668,00	0,00	$ 0,00	0,00%	0,00	$ 0,00	0,00%
24	APOYO ELASTOMÉRICO EN NEOPRENO 70X70X10 CM DUREZA 60 INCLUYE 5 LAMINAS METALICAS REFUERZO 1/8". SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	8,00	$ 3.951.974,00	$ 31.615.792,00	0,00	$ 0,00	0,00%	0,00	$ 0,00	0,00%
25	TUBERIA PVCS 3" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	ML	19,80	$ 37.686,00	$ 746.183,00	0,00	$ 0,00	0,00%	0,00	$ 0,00	0,00%
26	SUMINISTRO E INSTALACIÓN JUNTA DE DILATACIÓN REF. JNA 70, MOVIMIENTO +/- 40 MM	ML	20,00	$ 1.949.943,00	$ 38.998.860,00	0,00	$ 0,00	0,00%	0,00	$ 0,00	0,00%
27	SEÑAL VERTICAL PREVENTIVA (SP) CUADRADO DE 75 X 75 CM CON PARAL EN ANGULO 2"X2" DE 1/4". SUMINISTRO E INSTALACIÓN.	UN	22,00	$ 343.778,00	$ 7.563.116,00	0,00	$ 0,00	0,00%	0,00	$ 0,00	0,00%
28	LINEA DE DEMARCACIÓN VÍAL CON PINTURA ACRILICA EN FRÍO (ML) E=0.12 M. INCLUYE SUMINISTRO, MICROESFERAS Y APLICACIÓN CON EQUIPO.	ML	1.950,00	$ 4.620,00	$ 9.009.000,00	0,00	$ 0,00	0,00%	0,00	$ 0,00	0,00%
29	DEMARCACIÓN VÍAL CON PINTURA ACRILICA EN FRÍO (M2) INCLUYE SUMINISTRO, MICROESFERAS Y APLICACIÓN MANUAL CON EQUIPO COMPRESOR.	M2	43,80	$ 31.087,00	$ 1.361.611,00	0,00	$ 0,00	0,00%	0,00	$ 0,00	0,00%
30	TUBERIA PVCS 6" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	ML	580,00	$ 95.207,00	$ 55.220.060,00	0,00	$ 0,00	0,00%	0,00	$ 0,00	0,00%
	Subtotal				**$ 204.344.290,00**		**$ 0,00**	0,000%		**$ 0,00**	0,000%
2. VÍAS DE ACCESO PUENTE VEHICULAR UBICADO EN LA VEREDA QUEBRADITAS											
2.1 PRELIMINARES											

ACTA DE EJECUCION DE ACTIVIDADES
"CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR SOBRE EL CAÑO CHICHIMENE EN LA VEREDA QUEBRADITAS DEL MUNICIPIO DE ACACÍAS"

CONDICIONES CONTRACTUALES SEGÚN PROPUESTA ECONOMICA						EJECUTADO MES 6			EJECUTADO ACUMULADO MES 6		
Nº	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD EJECUTADA	VALOR EJECUTADO	% EECUTADO	CANTIDAD EJECUTADA	VALOR EJECUTADO	% EECUTADO
31	LOCALIZACIÓN, TRAZADO Y REPLANTEO TOPOGRÁFICO VÍAS INCLUYE EQUIPO AUTOMÁTICO DE PRECISIÓN, CARTERA Y PLANOS	KM	0,59	$ 5.316.692,00	$ 3.136.848,00	0,00	$ 0,00	0,00%	0,10	$ 531.669,00	16,95%
	Subtotal				$ 3.136.848,00		$ 0,00	0,000%		$ 531.669,00	16,949%
2.2 EXCAVACIONES Y RELLENOS											
32	EXCAVACION MECANICA PARA CAJAS VIAS INCLUYE CARGUE	M3	1.075,00	$ 49.501,00	$ 53.213.575,00	0,00	$ 0,00	0,00%	0,00	$ 0,00	0,00%
33	EXCAVACION MECANICA EN CONGLOMERADO INCLUYE CARGUE	M3	189,44	$ 37.854,00	$ 7.171.062,00	0,00	$ 0,00	0,00%	0,00	$ 0,00	0,00%
34	RELLENO CON MATERIAL MIXTO DE RÍO SIN PROCESAR TAMAÑO MAX. 3" SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN MECÁNICA CON EQUIPO PESADO.	M3	6.060,36	$ 41.708,00	$ 252.765.495,00	0,00	$ 0,00	0,00%	0,00	$ 0,00	0,00%
35	SUB-BASE GRANULAR CLASE C NORMA INVIAS. SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN CON VIBROCOMPACTADOR.	M3	888,00	$ 126.692,00	$ 112.502.496,00	0,00	$ 0,00	0,00%	0,00	$ 0,00	0,00%
36	BASE GRANULAR CLASE C NORMA INVIAS. SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN CON VIBROCOMPACTADOR.	M3	592,00	$ 136.285,00	$ 80.680.720,00	0,00	$ 0,00	0,00%	0,00	$ 0,00	0,00%
37	TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR	M3/KM	195.295,32	$ 1.916,00	$ 374.185.833,00	0,00	$ 0,00	0,00%	0,00	$ 0,00	0,00%
	Subtotal				$ 880.519.181,00		$ 0,00	0,000%		$ 0,00	0,000%
2.3 PLUVIAL											
38	EXCAVACIÓN MECANICA EN CONGLOMERADO INCLUYE CARGUE	M3	779,13	$ 37.854,00	$ 29.493.187,00	0,00	$ 0,00	0,00%	0,00	$ 0,00	0,00%
39	CAMADA EN ARENA PARA CIMENTACION DE TUBERIAS.	M3	131,55	$ 117.814,00	$ 15.498.432,00	0,00	$ 0,00	0,00%	0,00	$ 0,00	0,00%
40	RELLENO CON MATERIAL MIXTO DE RÍO SIN PROCESAR TAMAÑO MAX. 2" SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN MANUAL CON EQUIPO LIVIANO.	M3	368,34	$ 62.532,00	$ 23.033.037,00	0,00	$ 0,00	0,00%	0,00	$ 0,00	0,00%
41	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA CORRUGADA PVC ALCANTARILLADO DE 250MM Ø10" TIPO NOVAFORT O EQUIVALENTE	ML	327,00	$ 134.567,00	$ 44.003.409,00	0,00	$ 0,00	0,00%	0,00	$ 0,00	0,00%
42	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA CORRUGADA PVC ALCANTARILLADO DE 315MM Ø12" TIPO NOVAFORT O EQUIVALENTE	ML	550,00	$ 216.443,00	$ 119.043.650,00	0,00	$ 0,00	0,00%	0,00	$ 0,00	0,00%
43	LOSA INFERIOR BASE PARA CAMARA (POZO) DE INSPECCION EN CONCRETO DE 4000 PSI, D=1.80 M E=0.20 M. INCLUYE CAÑUELAS.	UN	11,00	$ 493.909,00	$ 5.432.999,00	0,00	$ 0,00	0,00%	0,00	$ 0,00	0,00%
44	CILINDRO EN CONCRETO DE 4000 PSI DE Ø INT=1.20 M E=0.20 M FUNDIDO EN SITIO PARA CAMARA DE INSPECCION. INCLUYE PELDAÑOS SEGÚN NORMA SUMINISTRADA.	ML	22,00	$ 474.302,00	$ 10.434.644,00	0,00	$ 0,00	0,00%	0,00	$ 0,00	0,00%
45	LOSA SUPERIOR PARA CAMARA (POZO) DE INSPECCIÓN EN CONCRETO DE 4000 PSI, D=1.60 M, E=0.125 M. FUNDIDA EN SITIO. INCLUYE ACERO DE REFUERZO, ANILLO Y TAPA EN H.D. 24" TRAFICO PESADO.	UN	11,00	$ 938.288,00	$ 10.321.168,00	0,00	$ 0,00	0,00%	0,00	$ 0,00	0,00%
46	CONSTRUCCIÓN DE SUMIDERO LATERAL EN CONCRETO TIPO SL-100 FUNDIDO EN SITIO	UN	34,00	$ 1.131.034,00	$ 38.455.156,00	0,00	$ 0,00	0,00%	0,00	$ 0,00	0,00%
	Subtotal				$ 295.715.682,00		$ 0,00	0,000%		$ 0,00	0,000%
2.4 OBRAS DE PROTECCIÓN											
47	CANALIZACIÓN RIO (BULLDOZER TIPO D8K CAT)	HR	160,00	$ 398.665,00	$ 63.786.400,00	0,00	$ 0,00	0,00%	0,00	$ 0,00	0,00%
48	EXCAVACION MECANICA HUMEDA EN CONGLOMERADO (INCLUYE CARGUE MECANICO Y RETIRO DE MATERIAL 5 KM)	M3	450,00	$ 37.854,00	$ 17.034.300,00	0,00	$ 0,00	0,00%	0,00	$ 0,00	0,00%
49	MANEJO AGUA CON MOTOBOMBA 4" 11 HP AUTOCEBANTE A GASOLINA	DÍA	20,00	$ 179.155,00	$ 3.583.100,00	0,00	$ 0,00	0,00%	0,00	$ 0,00	0,00%
50	GEOTEXTIL NT 3000 SUMINISTRO E INSTALACIÓN	M2	288,00	$ 15.374,00	$ 4.427.712,00	0,00	$ 0,00	0,00%	0,00	$ 0,00	0,00%
51	RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE DE LA EXCAVACIÓN. COMPACTACIÓN MECANICA.	M3	360,00	$ 27.836,00	$ 10.020.960,00	0,00	$ 0,00	0,00%	0,00	$ 0,00	0,00%
52	TUBERIA DE 6" RELLENO DE CONCRETO	ML	36,00	$ 94.935,00	$ 3.417.660,00	0,00	$ 0,00	0,00%	0,00	$ 0,00	0,00%
53	BOLSACRETOS 1101 CAPACIDAD 1 M3	M3	288,00	$ 943.605,00	$ 271.758.240,00	0,00	$ 0,00	0,00%	0,00	$ 0,00	0,00%
	Subtotal				$ 374.028.372,00		$ 0,00	0,000%		$ 0,00	0,000%
2.5 OBRAS DE DEMOLICIÓN											
54	DEMOLICION CIMIENTO ENTERRADO. INCLUYE TRASIEGO Y CARGUE MANUAL.	M3	130,35	$ 424.373,00	$ 55.317.021,00	0,00	$ 0,00	0,00%	0,00	$ 0,00	0,00%
55	DEMOLICION CONCRETO REFORZADO. INCLUYE TRASIEGO Y CARGUE MANUAL.	M3	301,66	$ 379.303,00	$ 114.420.543,00	0,00	$ 0,00	0,00%	0,00	$ 0,00	0,00%
	Subtotal				$ 169.737.564,00		$ 0,00	0,000%		$ 0,00	0,000%
2.6 ILUMNICACIÓN											
56	LOCALIZACION Y REPLANTEO RED ELECTRICA	KM	0,66	$ 384.996,00	$ 254.097,00	0,00	$ 0,00	0,00%	0,10	$ 38.500,00	15,15%
57	BAJANTE CON TUBO CONDUIT METALICO 3`` L=6M	UN	29,00	$ 758.843,00	$ 22.006.447,00	0,00	$ 0,00	0,00%	0,00	$ 0,00	0,00%
58	ACOMETIDA PARCIAL 3 No8+1 No14 DUCTO 1`` PVC	ML	60,00	$ 38.543,00	$ 2.312.580,00	0,00	$ 0,00	0,00%	0,00	$ 0,00	0,00%
59	CAJA DE INSPECCIÓN TIPO CS 274 - AP 274, INCLUYE TAPA EN MARCO METALICO	UN	1,00	$ 594.247,00	$ 594.247,00	0,00	$ 0,00	0,00%	0,00	$ 0,00	0,00%
60	CAJA DE PASO AP-280 ALUMBRADO PUBLICO	UN	28,00	$ 273.028,00	$ 7.644.784,00	0,00	$ 0,00	0,00%	0,00	$ 0,00	0,00%
61	POSTE DE CONCRETO 12 M x 1050 KG REFORZADO	UN	1,00	$ 1.429.962,00	$ 1.429.962,00	0,00	$ 0,00	0,00%	0,00	$ 0,00	0,00%
62	MÁSTIL METÁLICO GALVANIZADO DE 9 M CON BRAZO RETORNEADO. SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	29,00	$ 2.886.917,00	$ 83.720.593,00	0,00	$ 0,00	0,00%	0,00	$ 0,00	0,00%
63	CAJA DE PASO METÁLICA TIPO 20X20	UN	28,00	$ 169.758,00	$ 4.753.224,00	0,00	$ 0,00	0,00%	0,00	$ 0,00	0,00%

ACTA DE EJECUCION DE ACTIVIDADES
"CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR SOBRE EL CAÑO CHICHIMENE EN LA VEREDA QUEBRADITAS DEL MUNICIPIO DE ACACÍAS"

CONDICIONES CONTRACTUALES SEGÚN PROPUESTA ECONOMICA						EJECUTADO MES 6			EJECUTADO ACUMULADO MES 6		
Nº	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD EJECUTADA	VALOR EJECUTADO	% EECUTADO	CANTIDAD EJECUTADA	VALOR EJECUTADO	% EECUTADO
64	ESTRUCTURA TIPO 710-02 NORMA ICEL MONTAJE DE TRANSFORMADOR MONOFÁSICO EN POSTE PESO MÁXIMO 500 KG B. MONTAJE CON CRUCETA METÁLICA SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA.	UN	1,00	$ 1.323.369,00	$ 1.323.369,00	0,00	$ 0,00	0,00%	0,00	$ 0,00	0,00%
65	PUESTA A TIERRA TERMINAL DE BAJA TENSION SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	28,00	$ 470.535,00	$ 13.174.980,00	0,00	$ 0,00	0,00%	0,00	$ 0,00	0,00%
66	ESTRUCTURA TIPO 514-02 NORMA ICEL CIRCUITO BIFÁSICO ESTRUCTURA TERMINAL. MONTAJE CON CRUCETA METÁLICA SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA.	UN	1,00	$ 797.569,00	$ 797.569,00	0,00	$ 0,00	0,00%	0,00	$ 0,00	0,00%
67	CANALIZACIONES ZANJA Y RELLENOS PARA DUCTOS PVC DE 2Ø3`` ZONA VERDE	ML	592,00	$ 46.000,00	$ 27.232.000,00	0,00	$ 0,00	0,00%	0,00	$ 0,00	0,00%
68	ESTRUCTURA TIPO 730 NORMA ICEL DERIVACIÓN TRIFÁSICA CON CORTACIRCUITO SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA.	UN	1,00	$ 1.684.736,00	$ 1.684.736,00	0,00	$ 0,00	0,00%	0,00	$ 0,00	0,00%
69	MEDIDOR MONOFASICO ELECTROMAGNETICO DE 10-60A CALIBRADO	UN	1,00	$ 352.069,00	$ 352.069,00	0,00	$ 0,00	0,00%	0,00	$ 0,00	0,00%
70	EMPALME DE DERIVACIÓN EN GEL GHFC-1 RANGO APLICACIÓN PRINCIPAL DE CABLE 6 A 2 Y DERIVACIÓN DE 14 A 8	UN	87,00	$ 72.956,00	$ 6.347.172,00	0,00	$ 0,00	0,00%	0,00	$ 0,00	0,00%
71	MANIOBRA EN LINEA VIVA	HR	4,00	$ 1.016.101,00	$ 4.064.404,00	0,00	$ 0,00	0,00%	0,00	$ 0,00	0,00%
72	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TRANSFORMADOR MONOFASICO DE 5 KVA	UN	1,00	$ 3.369.279,00	$ 3.369.279,00	0,00	$ 0,00	0,00%	0,00	$ 0,00	0,00%
73	CABLE DE ALUMINIO AISLADO No. 4/0 AWG SERIE 8000 THHM	ML	650,00	$ 111.344,00	$ 72.373.600,00	0,00	$ 0,00	0,00%	0,00	$ 0,00	0,00%
74	LUMINARIA LED PARA ALUMBRADO PÚBLICO IP 65/65 (CONJUNTO ÓPTICO/CONJUNTO ELÉCTRICO), FABRICADA EN ALUMINIO Y CERRADA CON VIDRIO TEMPLADO RESISTENTE A CHOQUES TÉRMICOS Y MECÁNICOS. 32 LEDS. 120-277 VOLTOS, 55 W, 4000°K. CON FOTO CELDA COMPLETA. REF: RALED II 32	UND	29,00	$ 2.308.085,00	$ 66.934.465,00	0,00	$ 0,00	0,00%	0,00	$ 0,00	0,00%
75	ACERO ESTRUCTURAL T ASTM A36	KG	8,35	$ 25.087,00	$ 209.564,00	0,00	$ 0,00	0,00%	0,00	$ 0,00	0,00%
	Subtotal				$ 320.579.141,00		$ 0,00	0,000%		$ 38.500,00	0,012%
2.7 PAVIMENTO ASFÁLTICO											
76	RIEGO DE IMPRIMACION CON EMULSION ASFALTICA CRL-0 O CRL-1	M2	3.383,40	$ 4.320,00	$ 14.616.288,00	0,00	$ 0,00	0,00%	0,00	$ 0,00	0,00%
77	MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MDC-19 INCLUYE SUMINISTRO, COLOCACIÓN Y COMPACTACIÓN.	M3	327,76	$ 921.093,00	$ 301.897.442,00	0,00	$ 0,00	0,00%	0,00	$ 0,00	0,00%
78	TRANSPORTE DE MEZCLAS ASFALTICAS	M3/KM	14.552,54	$ 2.197,00	$ 31.971.930,00	0,00	$ 0,00	0,00%	0,00	$ 0,00	0,00%
	Subtotal				$ 348.485.660,00		$ 0,00	0,000%		$ 0,00	0,000%
2.8 ANDENES Y ESPACIO PÚBLICO											
79	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SARDINEL PREFABRICADO BLOQUE CEMENTO A-10 SENCILLO	ML	1.184,00	$ 89.123,00	$ 105.521.632,00	0,00	$ 0,00	0,00%	0,00	$ 0,00	0,00%
80	BORDILLO DE PIEZAS PREFABRICADAS DE CONCRETO TIPO A-80 80X35X20 CM. INCLUYE LA CONFORMACION DE LA SUPERFICIE DE APOYO	ML	1.184,00	$ 97.489,00	$ 115.426.976,00	0,00	$ 0,00	0,00%	0,00	$ 0,00	0,00%
81	LOSETA A-40; 600X200X600 MM	M2	1.420,80	$ 142.955,00	$ 203.110.464,00	0,00	$ 0,00	0,00%	0,00	$ 0,00	0,00%
82	ANDEN CONCRETO 20,7MPa (3000 PSI e=0,10mts)	M3	6,24	$ 1.285.334,00	$ 8.020.484,00	0,00	$ 0,00	0,00%	0,00	$ 0,00	0,00%
83	SUB BASE GRANULAR MATERIAL DE RIO SELECCIONADO HASTA 2" INCLUYE ZARANDE, CARGUE, CONFORMACION Y COMPACTACION.	M3	284,16	$ 117.112,00	$ 33.278.546,00	0,00	$ 0,00	0,00%	0,00	$ 0,00	0,00%
	Subtotal				$ 465.358.102,00		$ 0,00	0,000%		$ 0,00	0,000%
	SUBTOTAL OBRAS				$ 13.320.269.893,00		$ 380.289.340,00	2,855%		$ 1.343.309.461,00	10,085%
	IMPLEMENTACIÓN PLAN DE MANEJO AMBIENTAL	UND	1,00	$ 75.000.000,00	$ 75.000.000,00	0,00	$ 0,00	0,00%	0,25	$ 18.750.000,00	25,00%
	IMPLEMENTACIIÓN PLAN DE MANEJO DE TRÁNSITO	UND	1,00	$ 35.000.000,00	$ 35.000.000,00	0,00	$ 0,00	0,00%	0,25	$ 8.750.000,00	25,00%
				VALOR TOTAL	$ 13.430.269.893,00		$ 380.289.340,00	2,832%		$ 1.370.809.461,00	10,207%

EJECUTADO MES No 6	$ 380.289.340,00	2,83%
PROGRAMADO MES 6	$ 1.706.260.611,86	12,70%
(+) AVANCE (-) ATRASO MES 6	-$ 1.325.971.271,86	-9,87%
PROGRAMADO ACUMULADO MES 6	$ 2.589.574.032,85	19,28%
EJECUTADO ACUMULADO MES 6	$ 1.370.809.460,80	10,21%
(+) AVANCE (-) ATRASO ACUMULADO MES 6	-$ 1.218.764.572,05	-9,07%

JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA
CONTRATISTA DE INTERVENTORIA

JIMMY ANDRES TORRES CASTRO
DIRECTOR DE INTERVENTORIA

13.3 Control estado del tiempo

ALCALDÍA DE ACACÍAS

CONTROL ESTADO DEL TIEMPO

CONTRATO N°	**929 DE 2023**	**PROYECTO N°**	**BPIN 2023500060004**

OBJETO DEL CONTRATO	CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR SOBRE EL CAÑO CHICHIMEME EN LA VEREDA QUEBRADITAS DEL MUNICIPIO DE ACACÍAS
CONTRATISTA:	CONSORCIO ACACIA R/L. FRANCISO MORA GUTIERREZ
NIT:	NIT 901767420-0
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	978 DE 2023
OBJETO INTERVENTORÍA:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA, AMBIENTAL Y SOCIAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR SOBRE EL CAÑO CHICHIMEME EN LA VEREDA QUEBRADITAS DEL MUNICIPIO DE ACACÍAS
CONTRATISTA:	JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA
NIT:	NIT 9658796-1

ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

OCTUBRE DEL 2024

DIA	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Tiempo en la mañana																															
Soleado	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X			X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X
Lluvias moderadas																															
Lluvias intensas																															
Tiempo en la Tarde																															
Soleado	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X			X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X
Lluvias moderadas																															
Lluvias intensas																															

Nota: Se aclara que el presente documento se elabora con corte al día 31 de octubre de 2024

Firma

Nombre: JIMMY ANDRES TORRES CASTRO
DIRECTOR DE INTERVENTORIA

Firma

Nombre: JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

13.4 Control equipos del contratista

ALCALDÍA DE ACACÍAS

CONTROL EQUIPOS DEL CONTRATISTA

JR

CONTRATO N°	929 DE 2023	PROYECTO N°	BPIN 2023500060004
OBJETO DEL CONTRATO	CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR SOBRE EL CAÑO CHICHIMEME EN LA VEREDA QUEBRADITAS DEL MUNICIPIO DE ACACÍAS		
CONTRATISTA:	CONSORCIO ACACIA R/L. FRANCISO MORA GUTIERREZ		
NIT:	NIT 901767420-0		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	978 DE 2023		
OBJETO INTERVENTORÍA:	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURIDICA, AMBIENTAL Y SOCIAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR SOBRE EL CAÑO CHICHIMEME EN LA VEREDA QUEBRADITAS DEL MUNICIPIO DE ACACÍAS		
CONTRATISTA:	JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA		
NIT:	NIT 9658796-1		

MAQUINARIA Y EQUIPO

MES DE OCTUBRE 2024

TIPO DE MAQUINARIAY EQUIPO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Motoniveladora																															
Retroexcavadora																															
Vibrocompactador																															
Volquetas		X															X								X						
Piloteadora	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X			X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X
Exacavadora	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X			X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X
Vehiculo pick up																															
Herramienta menor	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X			X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X
Equipos de topografia	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X			X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X
Equipo de soldadura	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X			X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X
Motobomba	X	X	X		X				X													X									X

Nota: Se aclara que el presente documento se elabora con corte al dia 31 de octubre de 2024

Firma

Nombre:JIMMY ANDRES TORRES CASTRO
DIRECTOR DE INTERVENTORIA

Firma

Nombre:JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

13.5 Control ensayos y pruebas de laboratorio

ALCALDÍA DE ACACÍAS

CONTROL ENSAYOS Y PRUEBAS DE LABORATORIO

JR

CONTRATO N°	929 DE 2023	PROYECTO N°	BPIN 2023500060004
OBJETO DEL CONTRATO	CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR SOBRE EL CAÑO CHICHIMEME EN LA VEREDA QUEBRADITAS DEL MUNICIPIO DE ACACÍAS		
CONTRATISTA:	CONSORCIO ACACIA R/L. FRANCISO MORA GUTIERREZ		
NIT:	NIT 901767420-0		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	978 DE 2023		
OBJETO INTERVENTORÍA:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA, AMBIENTAL Y SOCIAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR SOBRE EL CAÑO CHICHIMEME EN LA VEREDA QUEBRADITAS DEL MUNICIPIO DE ACACÍAS		
CONTRATISTA:	JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA		
NIT:	NIT 9658796-1		

RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO MES DE OCTUBRE DEL 2024

Fecha	Ensayo realizado por	Material	Nombre Prueba / Ensayo	Localización	Laboratorio	Norma / Especificación	Resultados		Análisis de Resultados	Observaciones / Decisiones tomadas cuando no cumple norma o especificación
	C / I*						Rango Cumplimiento	Porcentaje Obtenido %	Cumple S/N	
N.A.	N.A.	N.A.	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A

* Contratista / Interventor

En el presente periodo se tomo una muestra de concreto pero la prueba de los especimenes se realiza en el siguiente periodo

Firma

Nombre: JIMMY ANDRES TORRES CASTRO

DIRECTOR DE INTERVENTORIA

Firma

Nombre: JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA

RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

13.6 Control personal contratista

13.7 Copias planillas de seguridad social del periodo

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE							
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901767420	0	CONSORCIO ACACIA	A - 200 O MAS COTIZANTES	CONSORCIO ACACIA	CR 33 15 28	ACACIAS-META	3177872922	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-10	2024-11	1044955986	9477216674	E	2024/11/07	2024/11/12	BANCOLOMBIA	5	$4,542,200

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: CONSORCIO ACACIA (9 Afiliados)																							$14,596,118	$2,335,600			$14,596,118	$584,100			$14,738,255	$589,800			$14,596,118		$1,016,300		$0	$0		$4,525,800
Centro de Trabajo: CONSORCIO ACACIA (4 Afiliados)																							$7,905,545	$1,265,000			$7,905,545	$316,300			$7,905,545	$316,300			$7,905,545		$550,400		$0	$0		$2,448,000
Ciudad: ACACIAS Depto: META (4 Afiliados)																							$7,905,545	$1,265,000			$7,905,545	$316,300			$7,905,545	$316,300			$7,905,545		$550,400		$0	$0		$2,448,000
1	CC	1121833673	CERON JOSE																		23030 1	30	$1,900,000	$304,000	EPS002	30	$1,900,000	$76,000	CCF34	30	$1,900,000	$76,000	14-11	30	$1,900,000	6.960%	$132,300	30	$0	$0	Si	$588,300
2	CC	12981495	CHAMORRO SERVIO									X									23020 1	30	$2,773,218	$443,800	EPS037	30	$2,773,218	$111,000	CCF34	30	$2,773,218	$111,000	14-11	30	$2,773,218	6.960%	$193,100	30	$0	$0	Si	$858,900
3	CC	1121841590	SUAREZ ANA									X									23090 1	30	$1,932,327	$309,200	EPS005	30	$1,932,327	$77,300	CCF34	30	$1,932,327	$77,300	14-11	30	$1,932,327	6.960%	$134,500	30	$0	$0	Si	$598,300
4	CC	1006778068	SUAREZ DUVERNEY																		23030 1	30	$1,300,000	$208,000	EPSC34	30	$1,300,000	$52,000	CCF34	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	6.960%	$90,500	30	$0	$0	Si	$402,500
Centro de Trabajo: PERSONAL OPERATIVO (5 Afiliados)																							$6,690,573	$1,070,600			$6,690,573	$267,800			$6,832,710	$273,500			$6,690,573		$465,900		$0	$0		$2,077,800
Ciudad: ACACIAS Depto: META (5 Afiliados)																							$6,690,573	$1,070,600			$6,690,573	$267,800			$6,832,710	$273,500			$6,690,573		$465,900		$0	$0		$2,077,800
5	CC	1120818194	BALANTA DAMARI																		23030 1	30	$1,300,000	$208,000	EPS037	30	$1,300,000	$52,000	CCF34	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	6.960%	$90,500	30	$0	$0	Si	$402,500
6	CC	1121926674	BUSTOS NALSY																		23030 1	30	$1,300,000	$208,000	EPS002	30	$1,300,000	$52,000	CCF34	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	6.960%	$90,500	30	$0	$0	Si	$402,500
7	CC	1122124334	FELIX HERNAN	X								X									23020 1	27	$1,191,196	$190,600	EPS041	27	$1,191,196	$47,700	CCF34	27	$1,191,196	$47,700	14-11	27	$1,191,196	6.960%	$83,000	27	$0	$0	Si	$369,000
8	CC	3142566	GARCIA TEODULFO									X									23030 1	30	$1,335,326	$213,700	CCFC55	30	$1,335,326	$53,500	CCF34	30	$1,335,326	$53,500	14-11	30	$1,335,326	6.960%	$93,000	30	$0	$0	Si	$413,700
9	CC	40412289	RAMIREZ SANDRA		X							X								X	23030 1	25	$1,564,051	$250,300	CCFC55	25	$1,564,051	$62,600	CCF34	25	$1,706,188	$68,300	14-11	25	$1,564,051	6.960%	$108,900	25	$0	$0	Si	$490,100
Total			**Afiliados(9)**																				$14,596,118	$2,335,600			$14,596,118	$584,100			$14,738,255	$589,800			$14,596,118		$1,016,300		$0	$0		$4,525,800

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901767420	0	CONSORCIO ACACIA	A - 200 O MAS COTIZANTES	CONSORCIO ACACIA	CR 33 15 28	ACACIAS-META	3177872922	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-10	2024-11	1044955986	9477216674	E	2024/11/07	2024/11/12	BANCOLOMBIA	5	$4,542,200

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				9	$2,335,600	$8,400	$0	$2,344,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	6	$1,392,000	$5,000	$0	$1,397,000
PROTECCION	230201	800,229,739	0	2	$634,400	$2,300	$0	$636,700
SKANDIA	230901	800,253,055	2	1	$309,200	$1,100	$0	$310,300
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				9	$1,016,300	$3,600	$0	$1,019,900
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	9	$1,016,300	$3,600	$0	$1,019,900
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				9	$589,800	$2,100	$0	$591,900
COFREM	CCF34	892,000,146	3	9	$589,800	$2,100	$0	$591,900
EPS (ADMINISTRADORAS: 6)				9	$584,100	$2,300	$0	$586,400
CAJACOPI	CCFC55	901,543,211	6	2	$116,100	$500	$0	$116,600
CAPITAL SALUD	EPSC34	900,298,372	9	1	$52,000	$200	$0	$52,200
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	2	$163,000	$600	$0	$163,600
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	1	$47,700	$200	$0	$47,900
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	2	$128,000	$500	$0	$128,500
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$77,300	$300	$0	$77,600
TOTAL				9	$4,525,800	$16,400	$0	$4,542,200

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancolombia

1070706903	
JHOAN SEBASTIAN SANCHEZ CUERVO	
CUNDINAMARCA	
7777777	
I-INDEPENDIENTE	
Comercio al por menor de bebidas y productos del	
NO	

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:			7946428579	TIPO DE PLANILLA:			I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	octubre	AÑO 2024	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	octubre	AÑO 2024
DÍAS DE MORA:			7				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):			2024/11/12	NÚMERO AUTORIZACIÓN:			1045142666

TOTAL APORTES A PENSIÓN

No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
		EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
1	$ 208.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.100	$ 0	$ 208.000	$ 1.100	$ 209.100
								$ 208.000	**$ 1.100**	**$ 209.100**

TOTAL APORTES A SALUD

No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 162.500	$ 0	$ 900	$ 0	$ 162.500	$ 900	$ 0	$ 163.400
											$ 162.500	**$ 900**	**$ 0**	**$ 163.400**

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

ADMINISTRADORA	No. COTIZANTES	TOTALES		
NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO
	1	$ 26.000	$ 200	$ 26.200
		$ 26.000	**$ 200**	**$ 26.200**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

IRP	SEGURIDAD SOCIAL																					PARAFISCALES						
	PENSIÓN									SALUD					ARP							CCF		SENA	ICBF	ESAP	MINEDU
	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
	230301-PORVENIR	30	$ 1.300.000	$ 208.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 208.000	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 1.300.000	$ 162.500	$ 0	$ 162.500				$ 0	$ 0	30	$ 1.300.000	CCF22-COLSUBSIDIO	$ 26.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL	**$ 398.700**

Planilla Pagada

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE							
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	1032459081	SERGIO ANDRES REDONDO ARAUJO		KR 91B #25-45 Apartamento 201	4101201	saredondoa@unal.edu.co	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	1 - Independiente			BOGOTÁ, D.C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	APC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-10	2024-10	1	12/11/2024	91588707	$377.300	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD													
Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS005	Sanitas EPS	830251440-6	162.500	0		0		0	0	0	0	162.500	1

TOTALES PENSIÓN											
Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230301	Porvenir	800224808-8	208.000	0	0	0	0	0	0		208.000	1

TOTALES RIESGOS LABORALES															
Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-23	Positiva Seguros	860011153-4	6.800				6.800	0	0	6.800			68	6.800	1

TOTALES CAJAS							
Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados

TOTALES PARAFISCALES				
Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	162.500	162.500
Pensión	1	208.000	208.000
Riesgos Laborales	1	6.800	6.800
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	3	377.300	377.300

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE							
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	1032459081	SERGIO ANDRES REDONDO ARAUJO		KR 69b #25-45 Apartamento 201	4101280	saredondoa@unal.edu.co	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	1 - Independiente			BOGOTÁ D.C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	IBC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-10	2024-10	1	12/11/2024	91588707	$377.300	

DETALLE POR COTIZANTE

| INFORMACIÓN COTIZANTE | | | | | | | INFORMACIÓN NOVEDADES | | | | | | |

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE							
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	13716371	URIEL ANDRES ESCALANTE RUEDA		Torres del monte apartamento 302	3212269244	escalanteuo.sas@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I - Independiente			NORTE DE SANTANDE	PAMPLONA		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	IBC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-10	2024-10	I	13/11/2024	91753921	$377.300	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	162.500	0		0		0	0	0	0	162.500	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
23023	Protección (ING + Protección)	800229739-0	208.000	0	0	0	0	0	0		208.000	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-7	Seguros Bolívar S.A.	860002503-2	6.800				6.800	0	0	6.800			68	6.800	1

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	162.500	162.500
Pensión	1	208.000	208.000
Riesgos Laborales	1	6.800	6.800
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	3	377.300	377.300

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE							
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	13716371	URIEL ANDRES ESCALANTE RUEDA		Torres del moral apartamento 302	3212008244	escalanteco.sas@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
UNICA	1 - Independiente			NORTE DE SANTANDE	PAMPLONA		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	NPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-10	2024-10	I	13/11/2024	81753921	$377.300	

DETALLE POR COTIZANTE

| INFORMACIÓN COTIZANTE | | | | | | | INFORMACIÓN NOVEDADES | | | | | | |

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE							
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	79259919	JACINTO ALFONSO MALAGON SIERRA		CALLE 26 38 69	6822341	jacintomalagon1@yahoo.es	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	1 - Independiente			META	VILLAVICENCIO		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-10	2024-10	I	06/11/2024	81526341	$175.000	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	175.000	0		0		0	0	0	0	175.000	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	175.000	175.000
Pensión	0	0	0
Riesgos Laborales	0	0	0
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	1	175.000	175.000

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE							
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	79259509	JACINTO ALFONSO MALAGON SIERRA		CALLE 26 38 69	6682341	jacintomalagon1@yahoo.es	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	1 - Independiente			META	VILLAVICENCIO		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-10	2024-10	I	06/11/2024	91526341	$175.000	

DETALLE POR COTIZANTE

| INFORMACIÓN COTIZANTE | | | | | | | | INFORMACIÓN NOVEDADES | | | | | | | |

Villavicencio julio 29 de 2024

Señores:

CONSORCIO ACACIA

Ciudad.

REFERENCIA: SOPORTE DE NO PAGO DE PENSION JACINTO MALAGON.

De manera atenta suministro mi historial laboral donde consta que he cotizado 1.310 semanas lo cual ya me da derecho a no seguir cotizando en pensión de conformidad con lo previsto en el artículo 4 de la Ley 797 de 2003, la obligación de cotizar cesa al momento en que el afiliado "reúna los requisitos para acceder a la pensión mínima de vejez, o cuando el afiliado se pensione por invalidez o anticipadamente". Por esta razón, un pensionado de un régimen exceptuado, en el evento de que se vincule laboralmente, no tiene la obligación de cotizar a pensiones durante su relación laboral debido a su condición de pensionado.

Cordialmente,

JACINTO ALFONSO MALAGON SIERRA

Colpensiones

COLPENSIONES Nit 900.336.004-7
REPORTE DE SEMANAS COTIZADAS EN PENSIONES
PERIODO DE INFORME: Enero 1967 julio/2024
ACTUALIZADO A: 29 julio 2024

C 79259509 JACINTO ALFONSO MALAGON SIERRA

[10] TOTAL SEMANAS COTIZADAS:	1.310,00
[11] SEMANAS COTIZADAS CON TARIFA DE ALTO RIESGO(INCLUIDAS EN EL CAMPO 10 " TOTAL SEMANAS COTIZADAS"):	0,00

RESUMEN DE TIEMPOS PÚBLICOS NO COTIZADOS A COLPENSIONES

El siguiente resumen INFORMATIVO refleja los periodos laborados en el sector público y no cotizados al ISS hoy Colpensiones.

[12]Identificación Empleador	[13]Nombre o Razón Social	[14]Desde	[15]Hasta	[16]Último Salario	[17]Semanas	[18]Lic	[19]Sim	[20]Total
NO REGISTRA INFORMACION								

[21]TOTAL SEMANAS REPORTADAS:

RESUMEN TIEMPO PÚBLICO SIMULTÁNEO CON TRADICIONAL (67 - 94) Y POST 94

El siguiente resumen refleja los periodos laborados que presentan simultaneidad, es decir aquellos en los que usted prestó servicios para varios empleadores en el mismo periodo de tiempo.

[22]Desde	[23]Hasta	[24]Semanas Simultáneas
NO REGISTRA INFORMACION		

[25] TOTAL SEMANAS SIMULTÁNEAS:

[26]TOTAL SEMANAS (cotizadas[10] + reportadas tiempos públicos[21] - simultáneos[25])	1310,00

Si usted laboró en entidades del sector público y estas entidades no cotizaron a pensiones al Instituto de Seguros Sociales (ISS), hoy Colpensiones, es posible que estos periodos no se vean reflejados en su reporte de Historia Laboral. De ser así, puede radicar la solicitud de inclusión de dichos periodos allegando la certificación Electrónica de Tiempos Públicos - CETIL expedida por su empleador, conforme al Decreto 726 de 2018 expedido por el Ministerio de Trabajo.

* Los tiempos públicos tenidos en cuenta para la liquidación de una prestación económica decidida con anterioridad al 26/05/2017, no se visualizarán en el reporte de Historia Laboral.

Si ha trabajado en varias empresas al mismo tiempo, solo se contabilizará en el total de semanas uno de los periodos y el salario base será la suma de lo cotizado, sin exceder el máximo asegurable al momento de solicitar el reconocimiento pensional.

Las semanas de los periodos de abril y mayo de 2020 con observación "Pago Decreto 558/2020 COVID 19", serán considerdas en el reconocimiento pensional para: Cumplir requisito de las 1300 semanas, Cuando se trate de una pensión de vejez con 1 SMLMV y para el otorgamiento de las pensiones de invalidez y muerte.

DETALLE DE PAGOS EFECTUADOS ANTERIORES A 1995

Este reporte contiene el detalle de las semanas cotizadas hasta el 31 de diciembre de 1994.

[27] Identificación Empleador	[28]Nombre o Razon Social	[29]Ciclo Desde	[30]Ciclo Hasta	[31] Asignación Básica Mensual	[32] Días Rep.	[33] Observación
NO REGISTRA INFORMACION						

PLANILLA PAGO ARL PROFESIONALES

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901767420	0	CONSORCIO ACACIA	A - 200 O MAS COTIZANTES	CONSORCIO ACACIA	CR 33 15 28	ACACIAS-META	3177872922	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-10	2024-10	104495063	9477216523	Y	2024/11/07	2024/11/12	BANCOLOMBIA	5	$370,400

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES					
No.	Identificación	Nombre	ingreso,retiro,vsp,tde,tae,tdp,sln,ige,irl,vac,avp,vct,cod	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: CONSORCIO ACACIA (4 Afiliados)						$0	$0			$0	$0			$0	$0			$5,300,800		$369,000		$0	$0		$369,000
Centro de Trabajo: PERSONAL PROFESIONAL (4 Afiliados)						$0	$0			$0	$0			$0	$0			$5,300,800		$369,000		$0	$0		$369,000
Ciudad: ACACIAS Depto: META (4 Afiliados)						$0	$0			$0	$0			$0	$0			$5,300,800		$369,000		$0	$0		$369,000
1	CC	1371437I	ESCALANTE URIEL		0	$0	$0		0	$0	$0		0	$0	$0	14-11	30	$1,300,000	6.960%	$90,500	0	$0	$0	No	$90,500
2	CC	79259929	MALAGON JACINTO		0	$0	$0		0	$0	$0		0	$0	$0	14-11	30	$1,400,000	6.960%	$97,500	0	$0	$0	No	$97,500
3	CC	9812430181	REDONDO SERGIO		0	$0	$0		0	$0	$0		0	$0	$0	14-11	30	$1,300,000	6.960%	$90,500	0	$0	$0	No	$90,500
4	CC	1117076403	SANCHEZ JHOAN		0	$0	$0		0	$0	$0		0	$0	$0	14-11	30	$1,300,000	6.960%	$90,500	0	$0	$0	No	$90,500
Total Afiliados(4)						$0	$0			$0	$0			$0	$0			$5,300,000		$369,000		$0	$0		$369,000

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901767420	0	CONSORCIO ACACIA	A - 200 O MAS COTIZANTES	CONSORCIO ACACIA	CR 33 15 28	ACACIAS-META	3177872922	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-10	2024-10	104495063	9477216523	Y	2024/11/07	2024/11/12	BANCOLOMBIA	5	$370,400

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				4	$369,000	$1,400	$0	$370,400
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	4	$369,000	$1,400	$0	$370,400
TOTAL				4	$369,000	$1,400	$0	$370,400

PLANILLA PAGO SS CONTRATISTAS

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DAVIVIENDA

901364971	
SABIK INGENIERIA SAS	
BOGOTA - DISTRITO CAPITAL	
3203988	
C-MIPYME MENOS DE 200 COTIZANTES	
Actividades de arquitectura e ingeniería y otras	
SI	

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	7949357893			TIPO DE PLANILLA:	E-EMPLEADOS			
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	octubre	AÑO 2024	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	noviembre	AÑO	2024
DÍAS DE MORA:	0							
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2024/11/14			NÚMERO AUTORIZACIÓN:	1048841654			

TOTAL APORTES A PENSIÓN

No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
		EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
7	$ 1.455.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.455.500	$ 0	$ 1.455.500
1	$ 208.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 208.000	$ 0	$ 208.000
2	$ 272.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 272.000	$ 0	$ 272.000
2	$ 624.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 624.000	$ 0	$ 624.000
								$ 2.559.500	$ 0	$ 2.559.500

TOTAL APORTES A SALUD

No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
2		$ 0		$ 0		$ 0	$ 516.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 516.000	$ 0	$ 0	$ 516.000
1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 162.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 162.500	$ 0	$ 0	$ 162.500
2		$ 0		$ 0		$ 0	$ 325.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 325.000	$ 0	$ 0	$ 325.000
1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 162.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 162.500	$ 0	$ 0	$ 162.500
1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 16.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 16.000	$ 0	$ 0	$ 16.000
1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 325.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 325.000	$ 0	$ 0	$ 325.000
3		$ 0		$ 0		$ 0	$ 194.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 194.400	$ 0	$ 0	$ 194.400
1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 162.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 162.500	$ 0	$ 0	$ 162.500
											$ 1.863.900	$ 0	$ 0	$ 1.863.900

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
12		$ 0	$ 0		$ 0	$ 856.300	$ 856.300	$ 0	$ 0	$ 856.300
							$ 856.300	$ 0	$ 0	$ 856.300

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

ADMINISTRADORA	No. COTIZANTES	TOTALES		
NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO
	12	$ 639.900	$ 0	$ 639.900
		$ 639.900	$ 0	$ 639.900

TOTAL APORTES A OTROS PARAFISCALES

ADMINISTRADORA	No. COTIZANTES	TOTALES		
NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO
	8	$ 432.000	$ 0	$ 432.000
	7	$ 208.000	$ 0	$ 208.000
		$ 640.000	$ 0	$ 640.000

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

	SEGURIDAD SOCIAL																PARAFISCALES					
	PENSIÓN						SALUD				ARP						CCF	SENA	ICBF	ESAP	MINEDU	
RP	COT		FSP	APORTES VOLUNTARIOS	INDICADOR	TOTAL	COT			VALOR	TOTAL	COT		CENTRO	TOTAL	COT	IBC		TOTAL	TOTAL	TOTAL	TOTAL	TOTAL	

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DAVIVIENDA

901364971
SABIK INGENIERIA SAS
BOGOTA - DISTRITO CAPITAL
3203988
C-MIPYME MENOS DE 200 COTIZANTES
Actividades de arquitectura e ingeniería y otras

SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:			**7949357893**	TIPO DE PLANILLA:			E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	octubre	AÑO 2024	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	noviembre	AÑO 2024
DÍAS DE MORA:			0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):			2024/11/14	NÚMERO AUTORIZACIÓN:			1048841654

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

	SEGURIDAD SOCIAL																					PARAFISCALES						
	PENSIÓN									SALUD						ARP							CCF		SENA	ICBF	ESAP	MINEDU
IRP	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DIAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
	230301-PORVENIR	8	$ 400.000	$ 64.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 64.000	EPS005-SANITAS S.A.	8	$ 400.000	$ 16.000	$ 0	$ 16.000	14-11 - ARL SURA	8	$ 400.000	5	$ 27.900	8	$ 400.000	CCF24-COMPENSAR	$ 16.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
	230301-PORVENIR	30	$ 1.300.000	$ 208.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 208.000	ESSC07-ASOC. MUT. SER EMPRESA SOL. ESS	30	$ 1.300.000	$ 162.500	$ 0	$ 162.500	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.300.000		$ 90.500	30	$ 1.300.000	CCF24-COMPENSAR	$ 52.000	$ 26.000	$ 39.000	$ 0	$ 0
	230201-PROTECCION	30	$ 1.300.000	$ 208.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 208.000	EPS017-FAMISANAR	30	$ 1.300.000	$ 162.500	$ 0	$ 162.500	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.300.000		$ 90.500	30	$ 1.300.000	CCF24-COMPENSAR	$ 52.000	$ 26.000	$ 39.000	$ 0	$ 0
	25-14 COLPENSIONES	30	$ 1.300.000	$ 208.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 208.000	CCFC55-CAJACOPI EPS S.A.S	30	$ 1.300.000	$ 162.500	$ 0	$ 162.500	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.300.000		$ 90.500	30	$ 1.300.000	CCF24-COMPENSAR	$ 52.000	$ 26.000	$ 39.000	$ 0	$ 0

TOTAL	$ 6.559.600

Planilla Pagada
ach SOi
Planilla Pagada

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
COMPROBANTE DE PAGO

DAVIVIENDA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:		NIT NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	901364971
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			SABIK INGENIERIA SAS
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	DEPARTAMENTO:	BOGOTA - DISTRITO CAPITAL
DIRECCIÓN:	CALLE 7B NO. 70 - 05	TELÉFONO:	3203988
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	C-MIPYME MENOS DE 200
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades de arquitectura e
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	**7949357893**	TIPO DE PLANILLA:		E-EMPLEADOS	
PERIODO COTIZACIÓN OTROS SUBSISTEMAS:	MES: octubre	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:		MES:	noviembre
	AÑO: 2024			AÑO:	2024
DÍAS DE MORA:	0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2024/11/14	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		1048841654	

LIQUIDACIÓN GENERAL

			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
800229739	230201	230201- PROTECCION	2	$ 272.000
900336004	25-14	25-14 COLPENSIONES	1	$ 208.000
800227940	231001	231001-COLFONDOS	2	$ 624.000
800224808	230301	230301-PORVENIR	7	$ 1.455.500
		SUBTOTAL:	12	**$ 2.559.500**
SALUD				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
800251440	EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	2	$ 516.000
830003564	EPS017	EPS017-FAMISANAR	3	$ 194.400
900156264	EPS041	NUEVA EPS CM	1	$ 16.000
900226715	ESSC24	ESSC24-COOSALUD ESS	1	$ 162.500
800130907	EPS002	EPS002-SALUD TOTAL	1	$ 325.000
900156264	EPS037	EPS037-NUEVA EPS	1	$ 162.500
806008394	ESSC07	ESSC07-ASOC. MUT. SER EMPRESA SOL. ESS	2	$ 325.000
901543211	CCFC55	CCFC55- CAJACOPI EPS S.A.S	1	$ 162.500
		SUBTOTAL:	12	**$ 1.863.900**
CAJA DE COMPENSACIÓN				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
860066942	CCF24	CCF24-COMPENSAR	12	$ 639.900
		SUBTOTAL:	12	**$ 639.900**
RIESGOS PROFESIONALES				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
890903790	14-11	14-11 - ARL SURA	12	$ 856.300
		SUBTOTAL:	12	**$ 856.300**
OTROS PARAFISCALES				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		

13.8 Control seguridad industrial y certificado de no accidentes ARL

ARL | sura

Medellín, 6 de noviembre de 2024

SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A. - ARL SURA S.A.

HACE CONSTAR

Que la empresa CONSORCIO ACACIA, NIT N901767420, no presenta accidentes de trabajo desde el 01 de octubre de 2024 hasta el 31 de octubre de 2024.

La presente constancia se expide a solicitud de la empresa.

Para información adicional puede comunicarse con nuestra Línea de Atención 018000 51

Atentamente,

Dirección de Higiene, Seguridad y Ambiente

Dirección IP: 186.60.5.199, 198.143.41.20, 172.16.42.57.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

ALCALDÍA DE ACACÍAS

CONTROL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL

JR

CONTRATO N°	929 DE 2023	PROYECTO N°	BPIN 2023500060004
OBJETO DEL PROYECTO:	CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR SOBRE EL CAÑO CHICHIMEME EN LA VEREDA QUEBRADITAS DEL MUNICIPIO DE ACACÍAS		
CONTRATISTA:	CONSORCIO ACACIA R/L. FRANCISO MORA GUTIERREZ		
NIT	NIT 901767420-0		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	978 DE 2023		
OBJETO INTERVENTORÍA:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA, AMBIENTAL Y SOCIAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR SOBRE EL CAÑO CHICHIMEME EN LA VEREDA QUEBRADITAS DEL MUNICIPIO DE ACACÍAS		
CONTRATISTA	JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA		
PERIODO DE INSPECCION:	01-10-2024 al 31-10-2024	N° DE TRABAJADORES:	12

CRITERIO DE EVALUACIÓN DE SISO

Escriba el valor correspondiente en la columna "criterio de calificación" teniendo en cuenta los siguientes rangos: A. Cumple completamente con el criterio enunciado (10 puntos); B. Cumple parcialmente con el criterio enunciado (5 puntos); C. Cumple con el mínimo del criterio enunciado (3 puntos); D. No cumple con el criterio enunciado (0 puntos); E. No aplica el ítem.

ÍTEM	DOCUMENTACION BASICA LEGAL	CRITERIO DE CALIFICACIÓN				
		A	B	C	D	E
		10	5	3	0	N.A
1	Tiene copia cada trabajador de Afiliaciones (nuevos) y pagos(> 30 días) ARP, EPS y AFP		x			
2	Existe el Registro de charla diaria (de la semana en curso), y capacitación		x			
3	Existen inspecciones o registros preoperacionales de: (Herramientas, EPP)		x			
4	Existe un panorama de riesgos actualizado acorde a las actividades.		x			
5	Se cuenta con el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo actualizado, disponible, vigente y firmado por el representante legal de la empresa	x				
6	Se cuentan con las hojas de seguridad de los productos químicos en el sitio de trabajo y almacenamiento (combustibles, etc.).				x	
7	Se poseen procedimientos de trabajo , en el cual encuentran identificadas las actividades criticas con sus riesgos y controles.		x			
8	Se cuenta con el plan de emergencia, para actividades criticas y en general que correspondan al alcance de la actividad desarrollada.			x		
9	El personal cuenta con un programa de inducción en SGSST, Medio ambiente, actividades y riesgos del cargo.(divulgacion de procedimientos)		x			
	SUBTOTAL	10	30	3	0	0
	Valor Estructura: % Obtenido (A+B+C)/(90- NA)	48%				

ÍTEM	GESTIÓN AMBIENTAL Y SANITARIA	10	5	3	0	N.A
10	Está la zona de trabajo limpia, ordenada sin residuos.		x			
11	Las unidades sanitarias fijas ó portátiles están limpias.	x				
12	Están demarcado y organizado el almacenamiento provisional de los residuos para la disposición final		x			
13	Esta demarcado y organizado el almacenamiento provisional de residuos generados de todas clases.		x			
14	El material, equipos y herramientas están organizado.		x			
15	El materia de descapote se acopia y se protege	x				
16	La bodega de almacenamiento esta en orden y aseo	x				
	SUBTOTAL	30	20	0	0	0
	Valor Estructura: % Obtenido (A+B+C)/(70-NA)	71%				

ITEM	GESTIÓN DEL PELIGRO	10	5	3	0	N.A
17	Las Excavaciones son seguras (escombro a 1 metro de la orilla o más según profundidad)					x
18	La excavación cuenta con escaleras, pasos firmes, señalización, se tiene entibado o se maneja talud, el personal está alejado de la herramienta mecánica					x
19	Herramientas y/o escombros en areas vecinas, que generen algun tipo de riesgo al personal.					x
20	Hay recurso de comunicaciones constante en buen estado de funcionamiento que garanticen la comunicación integral en caso de necesitarse.	x				
21	Se cuenta con los equipos necesarios para realizar monitoreo de atmosferas requerido (gases)					x
22	Los equipos tienen guarda de seguridad (Ranas, mezcladoras, etc..)		x			
23	Se cuenta con equipos de rescate en sitio para trabajos en alturas y/o espacios confinados		x			
	SUBTOTAL	10	10	0	0	4

ÍTEM	ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL	CRITERIO DE CALIFICACIÓN				
		A	B	C	D	E
		10	5	3	0	N.A
34	El personal posee y utiliza de manera adecuada los EPP requeridos para la labor	x				
35	El personal cuenta con dotación adecuada	x				
36	Cascos de seguridad con ratcher para trabajos en alturas	x				
37	Se cuenta con barbuquejo		x			
38	Botas de caucho en buen estado con punta reforzada	x				
39	Botas de cuero en buen estado con punta reforzada	x				
40	Protección respiratoria adecuada para la labor.					x
41	Camisa manga larga y pantalón en buen estado	x				
42	Cuentan con gafas de seguridad oscuras y claras	x				
43	Están utilizando protección auditiva adecuada para la labor.	x				
44	se cuenta en campo con elementos de protección de personal para reposición según necesidad.	x				
45	El personal visitante tiene los EPP de acuerdo al riesgo para ingresar.	x				
	SUBTOTAL	100	5	0	0	1
	Valor Estructura: % Obtenido (A+B+C)/(120-NA)	95%				

ÍTEM	MEDICINA PREVENTIVA	10	5	3	0	N.A
46	Se han practicado los exámenes de ingreso y periódicos a los trabajadores, Ver registro (Registro expedido por medico especialista en S.O)	x				
47	Conformación, Capacitación, del Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo				x	
48	Existen beneficios de recreación y deporte para el personal, de conformidad con el Articulo 21 de la Ley 50 de 1990.				x	
	SUBTOTAL	10	0	0	0	0
	Valor Estructura: % Obtenido (A+B+C)/(30-NA)	33%				

ÍTEM	SEÑALIZACIÓN	10	5	3	0	N.A
49	Se evidencian etiquetas con advertencias de peligro e instrucciones generales.	x				
50	Se cuenta con avisos preventivos, conos, demarcación con cinta peligro, identificando excavaciones, trabajos en vías, etc.		x			
51	Tienen Protección o señalización las varillas salientes de las estructuras o pisos		x			
52	Se tiene señalizada y demarcada las áreas de trabajo	x				
53	Las áreas de trabajo están delimitadas y tiene avisos de prevención	x				
	SUBTOTAL	30	10	0	0	0
	Valor Estructura: % Obtenido (A+B+C)/(50-NA)	80%				

ALCALDÍA DE ACACÍAS

CONTROL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL

JR

CONTRATO N°	929 DE 2023	PROYECTO N°	BPIN 2023500060004
OBJETO DEL PROYECTO:	CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR SOBRE EL CAÑO CHICHIMEME EN LA VEREDA QUEBRADITAS DEL MUNICIPIO DE ACACÍAS		
CONTRATISTA:	CONSORCIO ACACIA R/L. FRANCISO MORA GUTIERREZ		
NIT	NIT 901767420-0		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	978 DE 2023		
OBJETO INTERVENTORÍA:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA, AMBIENTAL Y SOCIAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR SOBRE EL CAÑO CHICHIMEME EN LA VEREDA QUEBRADITAS DEL MUNICIPIO DE ACACÍAS		
CONTRATISTA	JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA		
PERIODO DE INSPECCION:	01-10-2024 al 31-10-2024	N° DE TRABAJADORES:	12

	Valor % Obtenido (A+B+C)/(70-NA)	67%				
ITEM	MANEJO DE CARGAS Y MAQUINARIA PESADA	10	5	3	0	N.A
24	Están las Eslingas en óptimo estado de funcionamiento y cuentan con etiqueta de capacidad de carga y características del fabricante	x				
25	Se cuenta con Plan de Izaje y tiene todos los riesgos asociados a la labor, cuenta con cálculos según norma (capacidades, puntos de apoyo ASME B30.5).				x	
26	El personal que realiza la labor se encuentra certificado (aparejador, supervisor del Izaje, Operador).				x	
27	Se señaliza y demarca la carga	x				
	SUBTOTAL	20	0	0	0	0
	Valor : % Obtenido (A+B+C)/(40-NA)	50%				
ITEM	PREPARACIÓN Y RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS	10	5	3	0	N.A
28	Se cuenta con el kit de primeros auxilios en el frente de trabajo de acuerdo a la labor y numero de trabajadores expuestos.	x				
29	Se realiza divulgación y entrenamiento en el plan de emergencias a trabajadores y visitantes		x			
30	Los extintores están ubicados adecuadamente en el área y los trabajadores conocen su ubicación y utilización	x				
31	La ruta de evacuación está debidamente señalizada, y el personal está enterado de la ubicación del punto de encuentro			x		
32	La empresa tiene contemplado un plan para la atención de emergencias de riesgo identificado			x		
33	Se tienen conformadas la brigada de emergencia (incendio, evacuación, primeros auxilios) y poseen un programa de entrenamiento periódico.				x	
	SUBTOTAL	20	5	6	0	0
	Valor Estructura: % Obtenido (A+B+C)/(60-NA)	52%				

ITEM	TRABAJOS EN ALTURAS	10	5	3	0	N.A
54	Se cuenta con elementos de protección pasiva, equipos certificados y cumplen con especificaciones técnicas. (escaleras, andamios, plataformas).				x	
55	Se cuenta con los elementos y equipos de protección personal de acuerdo al trabajo a realizar (arnés, cuerdas, eslingas, conectores) y se tienen las fichas de inspección de cada uno. (Ver registro)				x	
56	Se cuenta con kit y plan de rescate para trabajos en altura especifico para la labor				x	
57	Se cuenta con el coordinador certificado para trabajo seguro en alturas				x	
58	Se cuenta con el rescatista certificado para trabajo seguro en alturas				x	
	SUBTOTAL	0	0	0	0	0
	Valor Estructura: % Obtenido (A+B+C)/(40-NA)	0%				

GESTION EN CAMPO

	COMPONENTES	% OBTENIDO	10	5	3	0	N.A
1	DOCUMENTACION EN CAMPO	48%	10	30	3	0	0
2	ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL	95%	100	5	0	0	1
3	GESTIÓN AMBIENTAL Y SANITARIA	71%	30	20	0	0	0
4	MEDICINA PREVENTIVA	33%	10	0	0	0	0
5	GESTIÓN DEL PELIGRO	67%	10	10	0	0	4
6	SEÑALIZACIÓN	80%	30	10	0	0	0
7	MANEJO DE CARGAS Y MAQUINARIA PESADA	50%	20	0	0	0	0
8	TRABAJOS EN ALTURAS	0%	0	0	0	0	0
9	PREPARACIÓN Y RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS	52%	20	5	6	0	0
	RESULTADO DE NUESTRA GESTIÓN EN CAMPO	55,1%	230	80	9	0	5

ALTO	MEDIO	BAJO
	X	

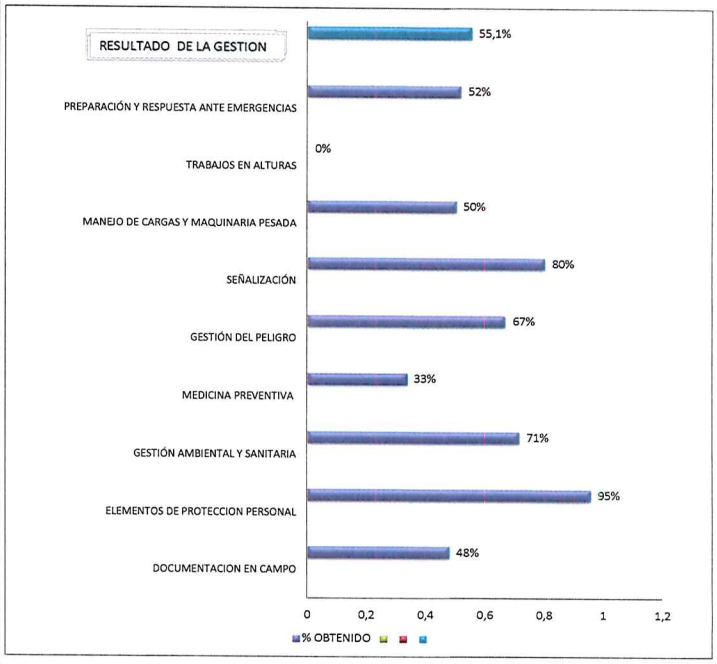


GRAFICO DE GESTION SISO

OBSERVACIONES		
ÏTEM RELACIONADO	RECOMENDACIONES	FECHA DE SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO
OBSERVACIONES GENERALES		

Firma
Nombre:JIMMY ANDRES TORRES CASTRO
DIRECTOR DE INTERVENTORIA

Firma:
Nombre: FLOR ANGELA NARVAEZ CASTRO
PROFESIONAL SISO

Firma:
Nombre: JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA
RESIDENTE DE INTERVENTORIA

13.9 Control correspondencia enviada y recibida

ALCALDÍA DE ACACÍAS

CONTROL CORRESPONDENCIA ENVIADA DURANTE EL PERIODO DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2024

JR

CONTRATO N°	929 DE 2023	PROYECTO N°	BPIN 2023500060004
OBJETO DEL CONTRATO	CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR SOBRE EL CAÑO CHICHIMEME EN LA VEREDA QUEBRADITAS DEL MUNICIPIO DE ACACÍAS		
CONTRATISTA:	CONSORCIO ACACIA R/L. FRANCISO MORA GUTIERREZ		
NIT:	NIT 901767420-0		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA	978 DE 2023		
OBJETO INTERVENTORÍA:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA, AMBIENTAL Y SOCIAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR SOBRE EL CAÑO CHICHIMEME EN LA VEREDA QUEBRADITAS DEL MUNICIPIO DE ACACÍAS		
CONTRATISTA:	JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA		

RELACION DE CORRESPONDENCIA ENVIADA

FECHA	# OFICIO	ASUNTO	ENVIA	RECIBE
02 de octubre de 2024	CI- OCA-978.2023-114	Radicación de informe semanal No 23	interpuentechichimene@gmail.com	infraestructura@acacias.gov.co> consorcioacacia.info23@gmail.com, cristhian.f9393@gmail.com
02 de octubre de 2024	CI- OCA-978.2023-115	Respuesta a oficio CA-075 de fecha 2 de octubre de 2024	interpuentechichimene@gmail.com	consorcioacacia.info23@gmail.com, infraestructura@acacias.gov.co> cristhian.f9393@gmail.com
02 de octubre de 2024	CI- OCA-978.2023-116	Reiteración solicitud entrega de procedimiento constructivo, notificación de laboratorio, documentación planta de concreto.	consorcioacacia.info23@gmail.com,	consorcioacacia.info23@gmail.com, infraestructura@acacias.gov.co> cristhian.f9393@gmail.com
02 de octubre de 2024	CI- OCA-978.2023-117	Respuesta a oficio CA-070 orden de operación No 10 recursos de anticipo	consorcioacacia.info23@gmail.com,	consorcioacacia.info23@gmail.com, infraestructura@acacias.gov.co> cristhian.f9393@gmail.com
9 de octubre de 2024	CI- OCA-978.2023-118	Radicación de informes semanales No 18 y 19 del contrato de obra 929 DE 2023	interpuentechichimene@gmail.com	infraestructura@acacias.gov.co> consorcioacacia.info23@gmail.com, cristhian.f9393@gmail.com
9 de octubre de 2024	CI- OCA-978.2023-119	Radicación comité de obra No 24 del contrato de obra 929 DE 2023	interpuentechichimene@gmail.com	infraestructura@acacias.gov.co> consorcioacacia.info23@gmail.com, cristhian.f9393@gmail.com
16 de octubre de 2024	CI- OCA-978.2023-120	Solicitud cumplimiento compromisos pactados en el comité de obra No 24	consorcioacacia.info23@gmail.com,	consorcioacacia.info23@gmail.com, infraestructura@acacias.gov.co> cristhian.f9393@gmail.com
23 de octubre de 2024	CI- OCA-978.2023-121	Radicación de informes semanales No 20 y 21 del contrato de obra 929 DE 2023	interpuentechichimene@gmail.com	infraestructura@acacias.gov.co> consorcioacacia.info23@gmail.com, cristhian.f9393@gmail.com
23 de octubre de 2024	CI- OCA-978.2023-122	Radicación comité de obra No 25 del contrato de obra 929 DE 2023	interpuentechichimene@gmail.com	infraestructura@acacias.gov.co> consorcioacacia.info23@gmail.com, cristhian.f9393@gmail.com
23 de octubre de 2024	CI- OCA-978.2023-123	Radicación de informes semanales No 22 y 23 del contrato de obra 929 DE 2023	interpuentechichimene@gmail.com	consorcioacacia.info23@gmail.com, infraestructura@acacias.gov.co> cristhian.f9393@gmail.com

Nota: Se aclara que el presente documento se elabora con corte al dia 31 de octubre de 2024

Firma

Nombre: JIMMY ANDRES TORRES CASTRO
DIRECTOR DE INTERVENTORIA

Firma

Nombre: JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

ALCALDÍA DE ACACÍAS

CONTROL CORRESPONDENCIA RECIBIDA DURANTE EL PERIODO DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2024

JR

CONTRATO N°	929 DE 2023	PROYECTO N°	BPIN 2023500060004
OBJETO DEL CONTRATO	CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR SOBRE EL CAÑO CHICHIMEME EN LA VEREDA QUEBRADITAS DEL MUNICIPIO DE ACACÍAS		
CONTRATISTA:	CONSORCIO ACACIA R/L. FRANCISO MORA GUTIERREZ		
NIT:	NIT 901767420-0		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	978 DE 2023		
OBJETO INTERVENTORÍA:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA, AMBIENTAL Y SOCIAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR SOBRE EL CAÑO CHICHIMEME EN LA VEREDA QUEBRADITAS DEL MUNICIPIO DE ACACÍAS		
CONTRATISTA:	JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA		

RELACION DE CORRESPONDENCIA RECIBIDA

FECHA	# OFICIO	ASUNTO	ENVIA	RECIBE
02 de octubre de 2024	CA-077	Solicitud de aprobación ítems no previsto	consorcio.acacia@geotecnia.co	interpuentechichimene@gmail.com
02 de octubre de 2024	CA-078	Cambio plan de inversión de anticipo	consorcio.acacia@geotecnia.co	interpuentechichimene@gmail.com
02 de octubre de 2024	CA-078	Refuerzo transversal pilotes	infraestructura@acacias.gov.co>	interpuentechichimene@gmail.com, consorcioacacia.info23@gmail.com,
02 de octubre de 2024	CA-079	Procedimiento de pilotaje	consorcio.acacia@geotecnia.co	interpuentechichimene@gmail.com
02 de octubre de 2024	CA-080	Certificado calibración piloteadora	consorcio.acacia@geotecnia.co	interpuentechichimene@gmail.com
05 de octubre de 2024	CA-081	Solicitud aprobación para cargue orden de operación No. 13 recursos de anticipo	consorcio.acacia@geotecnia.co	interpuentechichimene@gmail.com
16 de octubre de 2024	CA-082	Respuesta oficio CI- OCA-978.2023-120	consorcio.acacia@geotecnia.co	interpuentechichimene@gmail.com
16 de octubre de 2024	CA-084	Informe plan PAGA	consorcio.acacia@geotecnia.co	interpuentechichimene@gmail.com
16 de octubre de 2024	CA-085	Diseño geométrico vía	consorcio.acacia@geotecnia.co	interpuentechichimene@gmail.com
15 de octubre de 2024	CA-086	Solicitud aprobación para cargue orden de operación No.13 recursos de anticipo	consorcio.acacia@geotecnia.co	interpuentechichimene@gmail.com
25 de octubre de 2024	CA-088	Solicitud aprobación para cargue orden de operación No.14 recursos de anticipo	consorcio.acacia@geotecnia.co	interpuentechichimene@gmail.com

Nota: Se aclara que el presente documento se elabora con corte al día 31 de octubre de 2024

Firma

Nombre: JIMMY ANDRES TORRES CASTRO
DIRECTOR DE INTERVENTORIA

Firma

Nombre: JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

13.10 Control impiementación PMA

ALCALDÍA DE ACACÍAS

INFORME IMPLEMENTACIÓN PLAN DE MANEJO AMBIENTAL

CONTRATO N°	929 DE 2022	**PROYECTO N°**	BPIN 2023500060004

OBJETO PROYECTO:	CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR SOBRE EL CAÑO CHICHIMEME EN LA VEREDA QUEBRADITAS DEL MUNICIPIO DE ACACÍAS
CONTRATISTA	CONSORCIO ACACIA R/L. FRANCISO MORA GUTIERREZ
NIT	NIT 901767420-0
CONTRATO DE INTERVENTORIA N°	978 DE 2023
OBJETO INTERVENTORIA	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA, AMBIENTAL Y SOCIAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR SOBRE EL CAÑO CHICHIMEME EN LA VEREDA QUEBRADITAS DEL MUNICIPIO DE ACACÍAS
CONTRATISTA	JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA
PERIODO IMPLEMENTACIÓN:	01/10/2024 a 31/10/2024

ESTADO PERMISOS AMBIENTALES

Permisos: Ambiental y otros	Aplica	Número y fecha de acto administrativo que otorga el permiso	Estado de cumplimiento requerimientos	Observaciones
Permiso de ocupación de cauces	SI	PS-GJ. 1.2.6.23.2235 Hasta el 10 de octubre de 2024	En ejecución	Se radico solicitud de proroga por parte de la entidad contratante
Permiso de aprovechamiento forestal	NO			No aplica al proyecto
Permiso de vertimientos	NO			No aplica al proyecto
Permiso de concesión de aguas	NO			No aplica al proyecto
Autorización de sitios de disposición final de sobrantes	SI		Pendiente de entrega de autorización del privado	Se ha dispuesto el material sobrante de descapote, en un predio privado el cual cuenta con autorización.
Permiso de emisiones atmosféricas	NO			No aplica al proyecto
Permiso de explotación de materiales	NO	Concesión minera No 19099 para extracción y transporte de material granular. Rio Guayuriba vigencia hasta el 28 de diciembre de 2030, Licencia ambiental Resolución No PS-GJ-1.2.6.013-1941 para extracción y transporte de material granular. Rio Guayuriba, vigencia hasta el 28 de diciembre de 2030		Se ha aportado documentacion de la mina que suministrara material granular
Permiso de cierres temporales de vías	NO		No se han realizado cierres viales	No se ha ejecutado obras que requieran cierres viales
Pago de tasas y/o regalías	NO			No aplica al proyecto
Permiso de trabajos nocturnos	NO			No aplica al proyecto
Otro (cual):	NO			

VERIFICACIÓN DE PROGRAMAS AMBIENTALES

CUMPLIMIENTO DE METAS

Programa ambiental	Aplica	Cumplimiento de metas %	Observaciones
Desarrollo e implementación del sistema de gestión ambiental	SI	50%	Se han ejecutado actividades de acuerdo al Pla ambiental General Ajustado presentado y avalado por interventoria
Manejo integral de residuos sólidos	SI	0%	La ejecución de obra no ha generado residuos solidos
Manejo integral de materiales de construcción	SI	20%	Los materiales de construcción (aceros) se le dado manejo adecuado según PMA.
Explotación fuentes de materiales	SI	0%	No se ha suministrado material ni explotación de estos para la ejecución de la obra
Manejo integral de aguas y residuos líquidos	SI	20%	La ejecución de obra no ha generado residuos solidos y se ha dado un manejo adecuado a las aguas existentes.
Control de erosión, estabilidad de taludes y laderas	SI	0%	No se ha presentado erosión ni afectaciones de estabilidad de taludes y/o laderas
Instalación, funcionamiento y desmantelamiento de campamento y sitios de acopio temporal	SI	100%	El lugar de acopio de material es ubicado en un predio privado en cercanía con la ejecución del proyecto
Instalación, funcionamiento y abandono de las plantas de trituración, asfalto y concreto	N/A	0%	El contrato no establece operación de plantas para fabricación de concreto y/o asfalto, ya que se compara a proveedores autorizados por la corporación ambiental
Manejo de maquinaria, equipos y vehículos	SI	100%	El manejo y control de los equipos y vehículos ha sido acorde a lo establecido en el PMA del proyecto
Manejo de Vegetación	SI	0%	No se ha presentado afectación a la vegetación de la zona
Manejo de fauna	SI	0%	No s e ha presentado afectación a la fauna de la zona
Protección de fauna	SI	0%	Se han tomado todas las medidas y precauciones que garanticen la protección de fauna
Protección de áreas sensibles	SI	0%	No se presentan áreas sensibles ambientalmente del proyecto
Plan de Gestión Social	SI	70%	Se ha implementa el plan de gestión social de acuerdo a las necesidades del proyecto.
Programa de higiene y salud ocupacional	SI	100%	Se ha dado cumplimiento al programa de seguridad y salud en el trabajo según documento enviado.
Otros	SI	100%	Se ha cumplido lo establecido en el PMA

Nota: Diligencie las casillas de programa ambiental teniendo en cuenta lo establecido en el PMA o EIA; de acuerdo a la necesidad puede incluir mas filas con los programas que no encuentre diligenciados en el presente formato.

ALCALDÍA DE ACACÍAS

INFORME IMPLEMENTACIÓN PLAN DE MANEJO AMBIENTAL

JR

CONTRATO N°	929 DE 2022	**PROYECTO N°**	BPIN 2023500060004

OBJETO PROYECTO:	CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR SOBRE EL CAÑO CHICHIMEME EN LA VEREDA QUEBRADITAS DEL MUNICIPIO DE ACACÍAS
CONTRATISTA	CONSORCIO ACACIA R/L. FRANCISO MORA GUTIERREZ
NIT	NIT 901767420-0
CONTRATO DE INTERVENTORIA N°	978 DE 2023
OBJETO INTERVENTORIA	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA, AMBIENTAL Y SOCIAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR SOBRE EL CAÑO CHICHIMEME EN LA VEREDA QUEBRADITAS DEL MUNICIPIO DE ACACÍAS
CONTRATISTA	JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA
PERIODO IMPLEMENTACIÓN:	01/10/2024 a 31/10/2024

RESTAURACIÓN O RECUPERACIÓN DE AREAS INTERVENIDAS

Cumplió con los requerimientos para la entrega de áreas intervenidas?	N/A
Localización:	N/A
No. de individuos sembrados	N/A
Estado fitosanitario de los individuos	N/A
	N/A
Área empradizada (m^2)	N/A

Observaciones: No es requerido la restauracion de atreas intervenidas, sin embargo se evaluara el impacto durante la ejeuccion de la obra para lo cual obligar al contratista a su recuperacion si existe afectacion.

TRATAMIENTOS SILVICULTURALES EJECUTADOS

Tratamiento Autorizado	EJECUTADO				Observaciones
	Aplica	unidad	Localización	Periodo	
Tala	NO				
Poda	NO				
Otro, cual?	N.A				

SITIOS DE DISPOSICIÓN FINAL DE SOBRANTES

Material	Volumen dispuesto (m^3)	Nombre de Sitio de disposición
Sobrante de excavación	144	Finca los cerezos

MONITOREOS

MONITOREOS	Aplica	N°	Periodo	Requerimientos Cumplidos
AGUA	NO			
AIRE	NO			
RUIDO	N.A			
VEGETACION	NO			

INTERVENCIÓN CORRIENTES DE AGUAS

Se intervinieron corrientes de aguas durante el trascurso del proyecto:	NO
Nombre	NO
Tipo de Intervención:	NO
Medidas para su recuperación:	NO

PASIVOS AMBIENTALES PENDIENTES PARA EL CIERRE

RADICAR MEDIDAS DE MANEJO DEL PERMISO DE OCUPACION DE CAUCE Y CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

¿Cuales?

CONCLUSIONES, COMENTARIOS O RECOMENDACIONES

SE RECOMIENDA DAR CUMPLIMIENTO A REQUERIMIENTOS AMBIENTALES EN CUANTO A LOS PERMISOS AMBIENTALES OTORGADOS DE OCUPACION DE CAUCE

Firma

Nombre: JIMMY ANDRES TORRES CASTRO
DIRECTOR DE INTERVENTORIA

Firma

Nombre: KAROL PAOLA SANTANA TORRES
PROFESIONAL AMBIENTAL DE INTERVENTORÍA

13.11 Control seguimiento ambiental

ACTA SEGUIMIENTO AMBIENTAL

CONTRATO N°	929 DE 2023	PROYECTO N°	BPIN 2023500060004

OBJETO PROYECTO:	CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR SOBRE EL CAÑO CHICHIMEME EN LA VEREDA QUEBRADITAS DEL MUNICIPIO DE ACACÍAS
CONTRATISTA	CONSORCIO ACACIA R/L. FRANCISO MORA GUTIERREZ
NIT	NIT 901767420-0
CONTRATO DE INTERVENTORIA N°	978 DE 2023
OBJETO INTERVENTORÍA	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA, AMBIENTAL Y SOCIAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR SOBRE EL CAÑO CHICHIMEME EN LA VEREDA QUEBRADITAS DEL MUNICIPIO DE ACACÍAS
CONTRATISTA	JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA

PERIODO DE INSPECCION:	01/10/2024 a 31/10/2024

SUELO

COMPONENTE	MEDIDAS DE MITIGACION	PRESENTA			CALIFICACIÓN	OBSERVACIÓN
		SI	NO	APLICA		
MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS	Capacitación Personal	X		SI	5	Se ha capacitado personal
	Separación y clasificación		X	SI	1	No s eha dado cumplimiento
	Disposición Final	X		SI	5	Se ha dispuesto en sitios autorizados
	Programación de retiro	X		SI	1	No se ha dado cumplimiento
	Protección del suelo en manejo de sustancias peligrosas	X		SI	0	No se ha manejado sustancias peligrosas
	Limpieza interna y externa de la obra	X		SI	4	Se mantiene en buena limpieza
	Almacenamiento de materiales y combustibles	X		SI	4	Se cumple almacenaminto lejos de contaminantes
	Campamento	X		SI	6	Disponen de campamento cercano a la obra
	Manejo de Vegetación	X		SI	0	No se ha intervenido
	Estabilidad de Taludes			NO	0	No se ha afectado
				SUMATORIA	26	
				PROMEDIO	2,6	

Calificación: Buena: 4,6 - 6 Aceptable: 2,6 - 4,5 Deficiente: 0 - 2,5

AGUA

COMPONENTE	MEDIDAS DE MITIGACION	PRESENTA			CALIFICACION	
		SI	NO	APLICA	CALIFICACIÓN	OBSERVACIÓN
MANEJO DE VERTIMIENTOS	Capacitación Personal		X	SI	4	Se ha capacitado el personal
	Manejo Escorrentía		X	NO	0	No es necesario dicho manejo
	Protección del suelo y agua en la manipulación de sustancias peligrosas.		X	SI	0	No se ha implementado la proteccion por sustancias
	Medidas de contingencia		X	SI	0	No se ha realziado entrega
	Zonas de trabajo secas		X	SI	0	No se han definido, dichas zonas
	Manejo nivel freático		X	SI	5	Manejado con bonbas mecanicas
	Separación y clasificación de vertimientos			NO	0	No se ha requerido para el proyecto
	Conexión a sistema de tratamiento (manejo de aguas residuales domesticas)			NO	0	No es requerido para el proyecto
				SUMATORIA	9	
				PROMEDIO	1,1	

Calificación: Buena: 4,6 - 6 Aceptable: 2,6 - 4,5 Deficiente: 0 - 2,5

RESOLUCIONES		NUMERO	VIGENCIA
CONCESIÓN DE AGUAS		N.A.	
CONCESIÓN DE AGUAS SUBTERRANEAS		N.A.	
OCUPACIÓN DE CAUCE	Permiso ocupación de cauce Del caño Chichimene, para la construcción de un puente vehicular, dos cabezales de descarga· de aguas lluvias de 12" y la demolición del puente antiguo, en la vereda Quebraditas del· municipio de Acacias	PS-GJ. 1.2.6.23.2235	HASTA EL 10 DE OCTUBRE DE 2024

AIRE

COMPONENTE	MEDIDAS DE MITIGACION	PRESENTA			CALIFICACION	
		SI	NO	APLICA	CALIFICACIÓN	OBSERVACIÓN
	Capacitación Personal		X	SI	3	Se ha capacitado personal
	Humedecimiento de áreas de trabajo			N/A	0	No ha sido requerido
	Cubrimiento de acopios de materiales	X		SI	5	Se protejen con plasticos los aceros acopiados

ALCALDÍA DE ACACÍAS

ACTA SEGUIMIENTO AMBIENTAL

JR

CONTRATO N°	929 DE 2023	PROYECTO N°	BPIN 2023500060004

OBJETO PROYECTO:	CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR SOBRE EL CAÑO CHICHIMEME EN LA VEREDA QUEBRADITAS DEL MUNICIPIO DE ACACÍAS
CONTRATISTA	CONSORCIO ACACIA R/L. FRANCISO MORA GUTIERREZ
NIT	NIT 901767420-0
CONTRATO DE INTERVENTORIA N°	978 DE 2023
OBJETO INTERVENTORÍA	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA, AMBIENTAL Y SOCIAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR SOBRE EL CAÑO CHICHIMEME EN LA VEREDA QUEBRADITAS DEL MUNICIPIO DE ACACÍAS
CONTRATISTA	JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA

ATMOSFERICO Y CONTROL DE RUIDO	Uso de mallas protectoras		X	SI	5	Se ha implementado
	No exceder volúmenes del volcó de los camiones	X		SI	5	Se ha trasnsportado material
	Olores desagradables	X		SI	6	No se ha presentado
	Aseo Interno y externo de la obra	X		SI	5	Se ha contado con limpieza
	Uso de equipos en buen estado	X		SI	5	La mquianaria utilizada cumple
	Apantallamiento sonoro del área		X	N/A	0	No aplica para el proyecto
	Planificación de horarios de trabajo		X	SI	6	Se tiene definidios horarios
	Medidas de Contingencia		X	SI	4	No se ha capacitado personal, ni se ha informado el plan
				SUMATORIA	44	
				PROMEDIO	**4,00**	

Calificación: Buena: 4,6 - 6 Aceptable: 2,6 - 4,5 Deficiente: 0 - 2,5

CAMPAMENTO, ALMACENAMIENTO DE MATERIALES Y COMBUSTIBLES

COMPONENTE	MEDIDAS DE MITIGACION	PRESENTA			CALIFICACION	
		SI	NO	APLICA	CALIFICACIÓN	OBSERVACIÓN
CUIDADOS AMBIENTALES	Programa de manejo y almacenamiento de materiales		X	SI	3	No se ha iniciado ejecucion fisica de obra
	Almacenamiento adecuado de combustibles	X		SI	5	Se cuenta con bodega retirada del cualquier posible afectacion
	Localización y señalización en el Campamento	X		SI	6	Cuenta con cercania a la obra toiene deficiente señalizacion
	Elementos de seguridad, botiquín, camilla, extintor entre otros	X		SI	6	Cuenta con elementos de seguridad y atencion
	Obras de contención		X	N/A	0	No es requerido para el proyecto
	Capacitación del Personal		X	SI	4	No se ha capacitado personal
				SUMATORIA	24	
				PROMEDIO	**4,00**	

Calificación: Buena: 4,6 - 6 Aceptable: 2,6 - 4,5 Deficiente: 0 - 2,5

SEÑALIZACIÓN

COMPONENTE	MEDIDAS DE MITIGACION	PRESENTA			CALIFICACION	
		SI	NO	APLICA	CALIFICACIÓN	OBSERVACIÓN
AISLAMIENTO DEL FRENTE DE TRABAJO Y SEÑALIZACIÓN	Capacitación Personal	X		SI	4	Se han dado capacitaciones y charlas
	Demarcación del perímetro	X		SI	6	Se tiene cerramiento y aislamiento del area de trabajo.
	Zonificación de la obra	X		SI	5	Se tiene zona de operatividad y zona de administracion.
	Lona de Cerramiento	X		SI	5	Se tiene cerramiento con lona en un 80 % del perimetro.
	Cinta de Reflectiva	X		SI	5	Los elementos de señalizacion cuentan con cinta reflectiva
	Señales Informativas y preventivas	X		SI	6	Se tiene señalización preventiva en toda el area y de aproximacion.
	Uso de Paleteros	X		SI	6	Permanecen dos conttolasdores viales

ALCALDÍA DE ACACÍAS

ACTA SEGUIMIENTO AMBIENTAL

CONTRATO N°	929 DE 2023	PROYECTO N°	BPIN 2023500060004

OBJETO PROYECTO:	CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR SOBRE EL CAÑO CHICHIMEME EN LA VEREDA QUEBRADITAS DEL MUNICIPIO DE ACACÍAS
CONTRATISTA	CONSORCIO ACACIA R/L. FRANCISO MORA GUTIERREZ
NIT	NIT 901767420-0
CONTRATO DE INTERVENTORIA N°	978 DE 2023
OBJETO INTERVENTORÍA	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA, AMBIENTAL Y SOCIAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR SOBRE EL CAÑO CHICHIMEME EN LA VEREDA QUEBRADITAS DEL MUNICIPIO DE ACACÍAS
CONTRATISTA	JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA

	Iluminación Nocturna		X	SI	3	Cuenta con Iluminacion nocturna
Calificación:	Buena: 4,6 - 6	Aceptable: 2,6 - 4,5	Deficiente: 0 - 2,5	SUMATORIA	40	
				PROMEDIO	**5**	

GESTIÓN SOCIAL

COMPONENTE	MEDIDAS DE MITIGACION	PRESENTA			CALIFICACION	
		SI	NO	APLICA	CALIFICACIÓN	OBSERVACIÓN
AMBIENTE LABORAL, CONVIVENCIA Y COMUNICACIÓN CON LA COMUNIDAD	Capacitación Personal		X	SI	1	No se ha capcitado personal
	Dotación de elementos de protección personal	X		SI	6	Se ha entregado elementos de EPP
	Adopción de Medidas de seguridad industrial y salud ocupacional	X		SI	6	Se cuenta con plan aprobado
	Espacio para peticiones, quejas y reclamos	X		SI	5	Se ha dispuesto oficina para ello
	Programa de información a la comunidad	X		SI	5	Se cuenta con oficina en campamento
	Socializaciones	X		SI	6	Se ha realizaod socializacion del proyecto
Calificación:	Buena: 4,6 - 6 Aceptable: 2,6 - 4,5		Deficiente: 0 - 2,5	SUMATORIA	29	
				PROMEDIO	**4,8333**	

MANEJO DE MAQUINARIA Y EQUIPOS

COMPONENTE	MEDIDAS DE MITIGACION	PRESENTA			CALIFICACION	
		SI	NO	APLICA	CALIFICACIÓN	OBSERVACIÓN
MANEJO DE MAQUINARIA Y EQUIPOS	Capacitación del Personal	X		SI	5	Se ha capacitado el operador
	Mantenimiento Preventivo	X		SI	5	Se ha realizado mantenieмtos preventivos a la maquinaria
	Definición de Horarios de trabajo	X		SI	6	se han definidio los horarios
	Ficha de control de actividades	X		SI	4	Se lleva el control de actividades
	Uso de equipos en buen estado, Certificados	X		SI	5	La maquianria esta en buen estado
	Elementos de protección personal	X		SI	6	Se cuenta con EPP
	Extintores	X		SI	6	Se tiene dispobildiad de extintores
	Medidas de Contingencia	X		SI	6	No se ha programado medidas
Calificación:	Buena: 4,6 - 6 Aceptable: 2,6 - 4,5		Deficiente: 0 - 2,5	SUMATORIA	43	
				PROMEDIO	**5,375**	

MANEJO DE MATERIALES DE ESCOMBROS

COMPONENTE	MEDIDAS DE MITIGACION	PRESENTA			CALIFICACION	
		SI	NO	APLICA	CALIFICACIÓN	OBSERVACIÓN
MANEJO DE MATERIALES DE ESCOMBROS	Capacitación del Personal		X	SI	1	Ni se ha capacitado personal
	Mantenimiento Preventivo	X		SI	5	Se ha realizado mantenimeinto de volquetas y excavadora
	Definición de Horarios de trabajo	X		SI	3	Se han definido horarios de cargue
	Ficha de control de actividades		X	SI	0	No se cuenta con fichas
	Uso de equipos en buen estado, Certificados	X		SI	5	Se cuenta con equipos en buen estado
	Elementos de protección personal	X		SI	6	El personal cuenta con elementos
	Extintores	X		SI	6	Se cuenta con extintores

ALCALDÍA DE ACACÍAS

ACTA SEGUIMIENTO AMBIENTAL

JR

CONTRATO N°	929 DE 2023	PROYECTO N°	BPIN 2023500060004

OBJETO PROYECTO:	CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR SOBRE EL CAÑO CHICHIMEME EN LA VEREDA QUEBRADITAS DEL MUNICIPIO DE ACACÍAS
CONTRATISTA	CONSORCIO ACACIA R/L. FRANCISO MORA GUTIERREZ
NIT	NIT 901767420-0
CONTRATO DE INTERVENTORIA N°	978 DE 2023
OBJETO INTERVENTORÍA	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA, AMBIENTAL Y SOCIAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR SOBRE EL CAÑO CHICHIMEME EN LA VEREDA QUEBRADITAS DEL MUNICIPIO DE ACACÍAS
CONTRATISTA	JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA

	Medidas de Contingencia		X	SI	0	No se ha entregado
	Volumen de material (m3)	X		SI	5	Se ha cuantificado material
	Volumen de excavación (m3)	X		SI	5	Se ha cuentificado material
	Volumen de demolición (m3)		X	SI	0	No se ha realizado demolicion
	Volumen de tierra (m3)	X		SI	5	Se ha cuantificado material
Calificación:	Buena: 4,6 - 6	Aceptable: 2,6 - 4,5	Deficiente: 0 - 2,5	SUMATORIA	41	
				PROMEDIO	**3,42**	

DOCUMENTACIÓN	NUMERO	
REGISTRO PROVEEDOR:	NO SE HA REALIZADO ENTREGA	
RESOLUCIÓN DE APROBACIÓN ESCOMBRERA:	NO SE HA REALIZAOD ENTREGA	

MANEJO DE ACTIVIDADES SILVICULTURALES

COMPONENTE	MEDIDAS DE MITIGACION	PRESENTA		CALIFICACIÓN		
		SI	NO	APLICA	CALIFICACIÓN	OBSERVACIÓN
MANEJO DE ACTIVIDADES SILVICULTURALES	Capacitación Personal		X	SI	0	No se ha presentado
	Dotación de elementos de protección personal	X		SI	5	Se cuenta con elementos de EPP
	Adopción de Medidas de seguridad industrial y salud ocupacional	X		SI	4	Se cuenta con manual aprobado
	Espacio para peticiones, quejas y reclamos	X		SI	5	Se cuenta en oficina con espacio para la comunidad
	Programa de información a la comunidad	X		SI	6	Se cuenta con constante coomunicacion
	Socializaciones	X		SI	6	Se han realizado socialziaciones
	Arboles talados		X	N/A	0	
	Arboles podados		X	N/A		
	Arboles bloqueados		X	N/A		
	Arboles sembrados		X	N/A		
Calificación:	Buena: 4,6 - 6	Aceptable: 2,6 - 4,5	Deficiente: 0 - 2,5	SUMATORIA	26	
				PROMEDIO	**3,714**	

RESULTADO DE LA GESTION EN CAMPO	PUNTAJE	%	RESULTADO
	30,65	56,8	**Aceptable**

OBSERVACIONES GENERALES

EL CONTRATISTA HA IMPLEMENTADO DURANTE EL RPESENTE PERIODO LAS RECOMENDACIONES Y OBLIGACIONES CONTRACTUALES DE ACUERDO A LOS TRABAJOS A REALIZAR, HA IMPLEMENTADO CADA UNA DE LAS EXIGENCIAS REALIZADAS

Firma

Nombre: JIMMY ANDRES TORRES CASTRO
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

Firma

Nombre: KAROL PAOLA SANTANA TORRES
PROFESIONAL AMBIENTAL INTERVENTORÍA

13.12 Control y seguimiento plan de inversión de anticipo

INFORME DE INVERSIÓN Y BUEN MANEJO DEL ANTICIPO

ALCALDÍA DE ACACÍAS

CONTRATO N°	929 DE 2023
OBJETO DEL CONTRATO	CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR SOBRE EL CAÑO CHICHIMEME EN LA VEREDA QUEBRADITAS DEL MUNICIPIO
CONTRATISTA:	CONSORCIO ACACIA R/L RODRIGO SUAREZ QUIÑONEZ
NIT:	NIT 901967420-0
CONTRATO INTERVENTORIA N	978 DE 2023
OBJETO	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA, AMBIENTAL Y SOCIAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR SOBRE EL CAÑO CHICHIMEME EN LA VEREDA QUEBRADITAS DEL MUNICIPIO DE ACACÍAS
CONTRATISTA	JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA
NIT:	NIT 9658796-1
VALOR DEL CONTRATO DE OBRA	$ 13.430.269.893,00
VALOR ANTICIPO DEL 30%	$ 4.029.080.967,90
FIDUCIARIA	ALIANZA FIDUCIARIA S.A.
No CONTRATO	FIDEICOMISO CONSORCIO ACACIA CONTRATO FIDUCIARIO No 119326
NOMBRE DE LA CUENTA	ALIANZA FIDUCIARIA S.A. FIDEICOMISOS NIT 830053812
BANCO Y NUMERO DE CUENTA	BANCOLOMBIA CUENTA DE AHORROS 04000008729
FECHA DE APERTURA	1/03/2024
FECHA DE DESEMBOLSO	SIN DESEMBOLSO
VALOR GIRADO MUNICIPIO	$ 0,00

DATOS PLAN DE INVERSION DE ANTICIPO

No.	DESCRIPCIÓN	VR. MES 1	VR. MES 2	VR. MES 3	VALOR PROGRAMA APROBADO (A)	VALOR REPROGRAMADO	PORCENTAJE
1	Pago de salarios y	$ 612.420.314,820	$ 76.552.539,350	$ 76.552.539,350	$ 765.525.393,520	$ 765.525.393,580	20,00%
2	Alquiler de equipos y	$ 398.073.204,630	$ 49.759.150,580	$ 49.759.150,580	$ 497.591.505,790	$ 497.591.505,820	13,00%
3	Transporte de materiales,	$ 826.767.425,000	$ 103.345.928,130	$ 103.345.928,130	$ 1.033.459.281,260	$ 1.033.459.281,330	27,00%
4	Compra de materiales e	$ 1.224.840.629,630	$ 153.105.078,700	$ 153.105.078,700	$ 1.531.050.787,030	$ 1.531.050.787,170	40,00%
	TOTAL				**$ 3.827.626.967,60**	**$ 3.827.626.967,90**	**100,00%**


DATOS APROBACIONES ORDENES DE OPERACIÓN


ORDEN DE OPERACIÓN	FECHA	BENEFICIARIO	VALOR	ITEM AFECTADO	DESCRIPCIÓN DE LA ORDEN
1	17/09/2024	RICH CONSTRUCTORA SAS	$ 402.079.000,00	1	Orden de operación No 535235 para Suministro y fabricación de 24379,16 kg de estructura metálica ASTM- 572 para amarres y arriostramiento viga principal
2	17/09/2024	INGEMONTAJES PIRE LTDA REEMBOLSO HISO	$ 118.257.016,47	1	Orden de operación No 535236 para fabricacion de camisas en HR 9mm D 155x12 en 49.988,86 kg, sin material
3	17/09/2024	CONSORCIO METALURGICO REEMBOLSO HISO	$ 245.463.680,00	4	Orden de operación No 535239 suministro de 58.600 kg de acero A-36 para camisas perdidas
4	17/09/2024	FERRETERIA ANDRES MARTINEZ REEMBOLSO HISO	$ 142.711.867,73	4	Orden de operación No 535242 Compra de 31.558,91 kg de acero figurado para canastas de pilotes y 700 kg de alambre
5	17/09/2024	LA CAMPANA SA REEMBOLSO HISO	$ 50.992.931,00	4	Orden de operación No 535244 para comprar de 26 laminas HR 9mm de 1200x6000 para camisas perdidas
6	30/09/2024	GRAVAS Y CONCRETO SA	$ 550.000.007,00	4	Orden de operación No 540245 Compra de 1.087,42 m3 de concreto premezclado para puente
7	17/09/2024	PARKER SAS	$ 49.404.784,00	2	Orden de operación No 535248 Alquiler excavadora junio julio y agosto
8	17/09/2024	SABIK INGENIERIA SAS	$ 105.278.123,00	2	Orden de operación No 535246 Parcial 1 piloteadora
9	17/09/2024	SABIK INGENIERIA SAS REEMBOLSO	$ 150.000.000,00	1	Orden de operación No 535247 Anticipo piloteadora
10	1/10/2024	DELTA 360 SAS	$ 18.000.000,00	1	Orden de operación No 540848 pago comision topografica julio y agosto
11	1/10/2024	HISO INGENEIRIA	$ 129.591.000,00	3	Orden de operación No 540851 para el pago de cargue, transporte y descargue de 385.000 kg a una distancia de 170 kms de estrucutra metalica y demas lementos
		TOTAL APROBADO	**$ 1.961.778.409,20**		

RESUMEN DE RECURSOS APROBADOS Y SALDOS DE ANTICIPO

ITEM No.	DESCRIPCIÓN	VALOR	PRESENTE PERIODO	ACUMULADO TOTAL	SALDO ANTICIPO
1	Pago de salarios y contratos de mano de obra	$ 765.525.393,52	$ 688.336.016,47	$ 688.336.016,47	$ 77.189.377,05
2	Alquiler de equipos y maquinaria	$ 497.591.505,79	$ 154.682.907,00	$ 154.682.907,00	$ 342.908.598,79
3	Transporte de materiales, equipos y maquinaria	$ 1.033.459.281,26	$ 129.591.000,00	$ 129.591.000,00	$ 903.868.281,26
4	Compra de materiales e insumos	$ 1.531.050.787,03	$ 989.168.485,73	$ 989.168.485,73	$ 541.882.301,30
	TOTAL	**$ 3.827.626.967,60**	**$ 1.961.778.409,20**	**$ 1.961.778.409,20**	**$ 1.865.848.558,40**

GRAFICOS D EINVERSION DE RECURSOS DE ANTICIPO

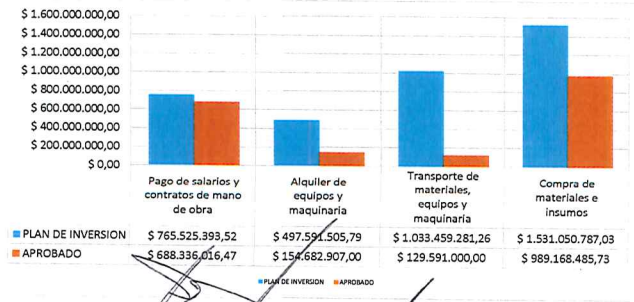

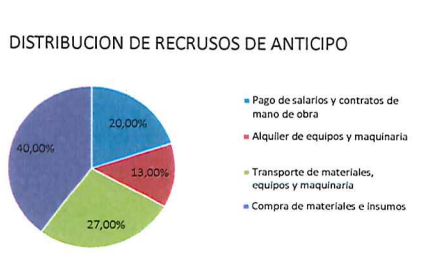

Firma:
Nombre: JIMMY ANDRES TORRES CASTRO
Director de interventoria

Firma:
Nombre: JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA
Residente de Interventoria
