AGENCIA PARA LA
DEL **META**
NIT. 900220547 5

HOJA CONTROL DOCUMENTAL

131-GDC-FR-001-V04
09/09/2024

SERIE	120-10
SUBSERIE	120-10-05
No. CARPETA	102
DESCRIPCION CARPETA	**CONSORCIO HOSPITAL 002** AMPLIACIÓN DE LA CAPACIDAD INSTALADA DEL HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE VILLAVICENCIO ESE - META **CONTRATO N° 511 23 PY 331-2021 PARCIAL N°3 C1-4 C102**

ITEM	DESCRIPCIÓN TIPO DOCUMENTAL	FOLIOS
1.	OFICIO RADICACION PARCIAL N°3	18596
2.	LISTA DE CHEQUEO	18597-18598
3.	ACTA DE PAGO DE OBRA	18599-18631
4.	MEMORIAS DE CALCULO	18632-18963
5.	INFORME DE OBRA	18764-18796

Fecha de Elaboración:		Nombre del Archivo en el SIGA:	511 23 PY 331-2021 PARCIAL N°3 C1-4 C102

	Firma		Firma
Nombre:	**JUAN CARLOS RODRIGUEZ**	Nombre:	**CESAR ASHLEY MORA BARNEY**
Cargo:	DIRECTOR DE OBRA	Cargo:	DIRECTOR INTERVENTORIA

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1 - Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

AGENCIA PARA LA
DEL **META**
NIT 900220547-5

HOJA DE RUTA DE TRAMITE

130-GFI-FR-024-V03
09/09/2024

CONTRATO N°	511 de 2023	PROYECTO N°	2021 005500 331
OBJETO DEL CONTRATO	Obra - HDV.		
DSCRIPCIÓN DEL TRAMITE:	(X) PAGO PARCIAL, ( ) PAGO FINAL DE PROYECTO, ( ) UNICO PAGO, ( ) ANTICIPO ( ) MODIFICATORIA, ( ) ADICION, ( ) PRORROGA, ( ) SUSPENSION, ( ) AMPLIACIÓN A LA SUSPENCIÓN, ( ) REINICIO ( ) LIQUIDACION ( ) OTRO (INDIQUE CUAL):	PERSONA JURÍDICA (SI APLICA):	
		NIT (SI APLICA):	
		R.L. Ó PERSONA NATURAL:	
		IDENTIFICACIÓN:	
		CORREO ELÉCTRONICO:	
FECHA DE RADICACIÓN:	20/11/2024	TELÉFONO:	

NOMBRE (QUIEN ENTREGA)	ACTIVIDAD	QUIEN RECIBE		
		NOMBRE	FIRMA	FECHA Y HORA
William Pulido J.	Rad. 4010-24 (4 carp):	Liliana C.		20/11/24
Liliana C.	Revisión	David A. Flórez		20-NOV-024 5:15 Pm
David Flórez.	acta parcial No 3 revisada.			

NOTAS:
1). Todos los documentos deben ser originales, impresión clara y a color, deben estar foliados 1-200 en carpetas de conformidad a la Ley de Archivo y cargados a las plataformas de registro de documentos de la Entidad.
2). Lo escrito en la casilla de actividadaes son editables, se puede dejar en blanco para escribir en efero segun la necesidad
3). Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1 - Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

Consorcio Inter Hospital

CI-572-2023

Villavicencio, 20 de noviembre de 2024

OF-CO-511-2024-268

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META - A.I.M
N° 4010-24
20-Nov-2024
10:58 am Folios 4 Carpetas
Por William Pulido J.

Señores
AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META.
ING: GINA TATIANA ELAICA NIETO
Dirección Operativa de Ejecución, Seguimiento y Control de Proyectos- AIM
ING DAVID FLOREZ
Supervisor de apoyo AIM.
contactenos@aim-meta.gov.co
Ciudad.

REF: CONTRATO DE OBRA No 0511 DE 2023.
"AMPLIACIÓN DE LA CAPACIDAD INSTALADA DEL HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE VILLAVICENCIO ESE – META"

ASUNTO: RADICACIÓN DE PARCIAL DE OBRA Nº3.

Cordial saludo;

En atención a la LISTA DE CHEQUEO CONTRATO DE OBRA PAGO PARCIAL con formato No. 112-ECP-FR-173-V05, nos permitimos radicar PARCIAL DE OBRA Nº3, correspondiente al periodo de 28/09/2024 a 15/11/2024.Para su conocimiento revisión y fines pertinentes.

Atentamente:

EDWIN FABIAN HENAO CAMARGO
Representante Legal
c.c Archivo
Se anexa: lo enunciado en cuatro (04) carpetas

LISTA DE CHEQUEO CONTRATO DE OBRA
PAGO PARCIAL

112-ECP-FR-173-V05
09/09/2024

CONTRATO N°	511 de 2023	PROYECTO N°	2021005500331

PAGO PARCIAL	CODIGO FORMATO	CASILLA DE VERIFICACIÓN SI / NO / N/A
PLAN DE COBROS OBRA (Aplica en el primer pago)	112-ECP-FR-009	N/A
ACTA PAGO DE OBRA	112-ECP-FR-029	SI
MEMORIA DE CALCULO OBRA (Cantidades totales Ejecutadas por cada item contractual)	112-ECP-FR-027	SI
INFORME DE OBRA	112-ECP-FR-013	SI
BITACORA DE OBRA (Copia)	112-ECP-FR-022	SI
INFORME PLAN DE INVERSION ANTICIPO OBRA (Si Aplica)	112-ECP-FR-030	SI
FACTURA	-	SI
CERTIFICADO DE CUENTA BANCARIA (Vigencia 30 Dias)	-	SI
COPIA DE TARJETA PROFESIONAL Y ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS DE CONTADORES DE OBRA E INTERVENTORIA	-	SI
INFORME INTERVENTORÍA	112-ECP-FR-017	SI
ACTA RESUMEN DE ENSAYOS Y PRUEBAS DE LABORATORIO OBRA	112-ECP-FR-018	SI
ACTA RELACIÓN PERSONAL OBRA.	112-ECP-FR-008	SI
ACTA CONTROL Y SEGUIMIENTO DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCAL OBRA. Del periodo a realizar el cobro, Pagos al sistema de seguridad social integral del personal.	112-ECP-FR-021	SI
CERTIFICADO DONDE INDIQUE CUAL ES EL PORCENTAJE (%) Y EL VALOR EJECUTADO DEL PROYECTO EN CADA MUNICIPIO. Lo anterior firmado por el Representante Legal de la Interventoria con el fin de calcular la retencion de ICA	-	SI
VERIFICACIÓN EN SIGA: ACTA CONTROL Y SEGUIMIENTO DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCAL OBRA 112-ECP-FR-021. Desde el inicio hasta la fecha de cobro, Pagos al sistema de seguridad social integral del personal.	-	SI
CONTROL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL	112-ECP-FR-019	SI
ACTA SEGUIMIENTO AMBIENTAL	112-ECP-FR-020	SI
ACTA DE RECONOCIMIENTO Y PAGO (Elabora el Contratista)	130-GFI-FR-017	SI
VERIFICACIÓN EN SIGA - Cargue de INFORME MENSUAL OBRA (Desde el inicio hasta la fecha de cobro, Acta de vecindad, Plan de manejo de trafico, formato entrega de dotación y elementos de protección personal, Implementación del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo, informe implementación PMA, Pagos al sistema de seguridad social integral del personal - INFORME MENSUAL INTERVENTORIA (Desde el inicio hasta la fecha de cobro, Acta de resumen de ensayos y pruebas de laboratorio, control de seguridad industrial, acta de seguimiento ambiental, acta control y seguimiento de seguridad social y parafiscal obra, bitacora, informe de especialistas) y todos los demas procedimientos o actos administrativos realizados en cumplimiento de la ejecución del proyecto. Todos los documentos de soporte del pago parcial, deben ser digitalizados y cargados a la carpeta del contrato de obra que se encuentra en la plataforma SIGA, en cumplimiento de la Resolución 82 del 6 de Abril de 2017.	Anexar Pantallazo	SI

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1 - Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT. 900220547-5

LISTA DE CHEQUEO CONTRATO DE OBRA
PAGO PARCIAL
112-ECP-FR-173-V05
09/09/2024

CONTRATO N°	511 de 2023	PROYECTO N°	2021005500331

PAGO PARCIAL	CODIGO FORMATO	CASILLA DE VERIFICACIÓN SI / NO / N/A
VERIFICACIÓN EN GESPROY -SGR - De conformidad con la Circular 062 de 2013 del DNP, con el objeto de facilitar la gestión y monitoreo a la ejecución de los proyectos de inversión financiados con recursos del SGR ; el responsable del proyecto debera realizar el registro de la información de ejecución con el detalle definido en cada uno de los componentes de la plataforma y presentar a la AIM el reporte del estado actual del proyecto. (Anexar Pantallazo)	-	SI
ENTREGA DOCUMENTACION AL RESPECTIVO RESPONSABLE DE ARCHIVO		SI

NOTAS
•TODOS LOS DOCUMENTOS DEBEN SER ORIGINALES, IMPRESIÓN CLARA Y A COLOR, SERÁN RADICADOS ÚNICAMENTE POR EL SUPERVISOR A LA GERENCIA DONDE DEBEN ESTAR FOLIADOS 1-200 EN CARPETAS DE CONFORMIDAD A LA LEY DE ARCHIVO Y CARGADOS A LAS PLATAFORMAS DE REGISTRO DE DOCUMENTOS DE LA ENTIDAD .
•LA LISTA DE CHEQUEO DEBE IR FIRMADA POR LOS PROFESIONALES RESPONSABLES DEL PROCESO, COMO INDICADOR DEL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS AQUI ESTABLECIDOS.
•ANEXAR PANTALLAZO DEL CARGUE A SECOP Y CARGUE A SIGA

OBSERVACIONES

Firma
Nombre: JUAN CARLOS RODRIGUEZ
DIRECTOR DE OBRA
N° Matricula Profesional: 2570062356 CND

Firma
Nombre: CESAR ASHLEY MORA BARNEY
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
N° Matricula Profesional: 25202-214496 CND

Firma
Nombre: DAVID ASHBEL FLOREZ SIERRA
APOYO A LA SUPERVISIÓN
M.P. 25202-114086 CND

Firma
Nombre: GINA TATIANA ELAICA NIETO
SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORIA N. 572 DE 2023
M.P. 25202 - 193880 CND

Firma
Nombre: ANGELLY XAMIRA CHEEDIAK
RESPONSABLE DEL ARCHIVO
M.P.

Nota: Cuando el proyecto no contempla profesional de Apoyo a la Supervisión, se selecciona de la lista desplegable para firma el cargo de Director Operativo de Ejecución, seguimiento y control de proyectos.

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

Nota: Una vez cumplido el proceso de verificación por cada responsable se debe firmar la lista de chequeo.

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1 - Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

ACTA PAGO DE OBRA
112-ECP-FR-029

Carrera 38 N. 25-05 Barrio 7 de agosto – Villavicencio
Email: coordinador.hospital@cyg.com.co
Tel. 321-3370874

CONTRATO N°	511 de 2023	PROYECTO N°	2021005500331
ACTA DE PAGO PARCIAL N°	3	PERIODO ACTA DE PAGO PARCIAL:	28/9/2024 a 31/10/2024
OBJETO CONTRATO:	AMPLIACIÓN DE LA CAPACIDAD INSTALADA DEL HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE VILLAVICENCIO ESE - META	OBJETO PROYECTO:	AMPLIACIÓN DE LA CAPACIDAD INSTALADA DEL HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE VILLAVICENCIO ESE - META
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	$ 80.389.497.271,00	VALOR TOTAL DEL PROYECTO:	$ 84.208.944.899,00
CONTRATISTA:	CONSORCIO HOSPITAL 002	CONTRATO DE INTERVENTORIA N°	572 DE 2023
NIT:	901.752.517-0	INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTER HOSPITAL
CORREO ELECTRONICO CONTRATISTA:	coordinador.hospital@cyg.com.co	CORREO ELECTRONICO INTERVENTORIA:	coninterhospital2023@gmail.com
SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORIA	ING. GINA TATIANA ELAICA NIETO	APOYO A LA SUPERVISION:	DAVID ASHBEL FLOREZ SIERRA
CORREO ELECTRONICO INTERVENTORIA:	coninterhospital2023@gmail.com	CONTRATO DE APOYO A LA SUPERVISION N°	765 DE 2023
FECHA DE INICIACIÓN:	12/12/2023	FECHA PRESENTE ACTA:	15/11/2024

N° ITEM	CONDICIONES INICIALES					CONDICIONES ACTUALIZADAS Acta de Modificación No. 2 de fecha 12/09/2024		OBRA EJECUTADA						
								ACTAS ANTERIORES		PRESENTE ACTA		ACUMULADO		
	DESCRIPCION	UND	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT	VALOR	%
1	COMPONENTE ARQUITECTONICO													
1,1	PRELIMINARES DEMOLICIONES													
1,1,1	LOCALIZACION, TRAZADO Y REPLANTEO OBRA ARQUITECTÓNICA INCLUYE COMISIÓN TOPOGRAFICA, CARTERA Y PLANOS	M2	19.147,50	$ 6.101,00	$ 116.818.898,00	19.147,50	$ 116.818.898,00	2.227,04	13.587.171,00	0,00	$ -	2.227,04	$ 13.587.171,00	11,63
	SUBTOTAL				$ 116.818.898,00		$ 116.818.898,00		$ 13.587.171,00		$ -		$ 13.587.171,00	
1,2	DESMONTE Y DEMOLICIONES													
1,2,1	DEMOLICION MECÁNICA ANDENES, PLACAS, SARDINELES EN CONCRETO REFORZADO. INCLUYE TRASIEGO Y CARGUE MANUAL	M3	269,57	$ 421.528,00	$ 113.629.280,00	552,04	$ 232.700.317,00	407,08	171.595.618,00	40,56	$ 17.097.176,00	447,64	$ 188.692.794,00	81,09
1,2,2	DESMONTE DE PISO ADOQUIN. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO	M2	217,35	$ 12.324,00	$ 2.678.621,00	-	$ -	0,00	-	0,00	$ -	0,00	$ -	
1,2,3	DEMOLICION CIMIENTO ENTERRADO. INCLUYE TRASIEGO Y CARGUE MANUAL	M3	305,65	$ 487.768,00	$ 149.087.265,00	159,10	$ 77.603.889,00	125,89	61.405.114,00	7,59	$ 3.702.159,00	133,48	$ 65.107.273,00	83,90
1,2,4	DEMOLICION MANUAL MURO DIVISORIO BLOQUE DE ARCILLA. INCLUYE TRASIEGO Y CARGUE MANUAL	M2	3.151,74	$ 16.618,00	$ 52.375.605,00	2.440,78	$ 40.560.882,00	2.094,09	34.799.588,00	193,00	$ 3.207.274,00	2.287,09	$ 38.006.862,00	93,70
1,2,5	DEMOLICIÓN CONCRETO REFORZADO. INCLUYE TRASIEGO Y CARGUE MANUAL	M3	490,72	$ 433.572,00	$ 212.762.018,00	267,79	$ 116.106.246,00	238,70	103.493.636,00	8,46	$ 3.668.019,00	247,16	$ 107.161.656,00	92,30
1,2,6	DEMOLICION CONCRETO CICLÓPEO. INCLUYE TRASIEGO Y CARGUE MANUAL	M3	125,94	$ 334.814,00	$ 42.167.279,00	259,59	$ 86.914.366,00	136,88	45.829.340,00	15,05	$ 5.038.951,00	151,93	$ 50.868.291,00	58,53
1,2,7	DESMONTE DE ESTRUCTURA METALICA DE CUBIERTA. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO.	M2	2.295,62	$ 23.150,00	$ 53.143.603,00	2.320,35	$ 53.716.103,00	2.008,85	46.504.878,00	311,50	$ 7.211.225,00	2.320,35	$ 53.716.103,00	100,00
1,2,8	DESMONTE DE TEJA ASBESTO CEMENTO. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO	M2	2.295,62	$ 26.654,00	$ 61.187.455,00	2.320,35	$ 61.846.609,00	2.008,85	53.543.886,00	311,50	$ 8.302.721,00	2.320,35	$ 61.846.609,00	100,00
1,2,9	DEMOLICION MECÁNICA PLACA ALIGERADA CONCRETO REFORZADO E= 0.25 M. INCLUYE TRASIEGO Y CARGMANUAL	M2	450,66	$ 120.870,00	$ 54.471.274,00	804,02	$ 97.181.897,00	799,39	96.622.269,00	0,00	$ -	799,39	$ 96.622.269,00	99,42
1,2,10	DESMONTE DE MARCO Y PUERTA. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO	UN	68,00	$ 112.748,00	$ 7.666.864,00	47,00	$ 5.299.156,00	42,00	4.735.416,00	3,00	$ 338.244,00	45,00	$ 5.073.660,00	95,74
1,2,11	DESMONTE DE VENTANERÍA ALUMINIO. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO	M2	128,00	$ 20.976,00	$ 2.684.928,00	236,26	$ 4.955.790,00	203,59	4.270.504,00	32,67	$ 685.286,00	236,26	$ 4.955.790,00	100,00
1,2,12	DESMONTE DE SANITARIO. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO	UN	15,00	$ 52.441,00	$ 786.615,00	18,00	$ 943.938,00	12,00	629.292,00	0,00	$ -	12,00	$ 629.292,00	66,67
1,2,13	TRANSPORTE DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS Y SOBRANTES	VJ	170,27	$ 259.921,00	$ 44.256.325,00	317,32	$ 82.478.132,00	214,99	55.880.416,00	0,00	$ -	214,99	$ 55.880.416,00	67,75
1,2,14	DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS SITIO AUTORIZADO RELLENO SANITARIO PARQUE ECOLOGICO RECICLANTE KM 18 VIA CAÑOS NEGROS (NO INCLUYE TRANSPORTE DE ESCOMBROS)	TON	3.225,56	$ 66.090,00	$ 213.177.509,00	4.100,00	$ 270.969.000,00	2.965,19	195.969.407,00	0,00	$ -	2.965,19	$ 195.969.407,00	72,32
1,2,15	DESMONTE DE REJAS Y VENTANAS METALICAS. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO	M2	104,83	$ 23.959,00	$ 2.511.670,00	191,44	$ 4.586.711,00	70,16	1.680.963,00	0,00	$ -	70,16	$ 1.680.963,00	36,65
1,2,16	DESMONTE DE DUCHAS Y GRIFERÍAS. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO	UN	25,00	$ 20.976,00	$ 524.400,00	42,00	$ 880.992,00	32,00	671.232,00	0,00	$ -	32,00	$ 671.232,00	76,19
1,2,17	DESMONTE DE LAVAMANOS. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO	UN	16,00	$ 41.953,00	$ 671.248,00	19,00	$ 797.107,00	16,00	671.248,00	0,00	$ -	16,00	$ 671.248,00	84,21
1,2,18	DESMONTE DE CIELO RASO EN LAMINA LIVIANA. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO	M2	1.986,37	$ 8.038,00	$ 15.966.466,00	1.934,91	$ 15.552.807,00	1.701,33	13.675.291,00	233,57	$ 1.877.436,00	1.934,90	$ 15.552.726,00	100,00
	SUBTOTAL				$ 1.029.748.425,00		$ 1.153.093.942,00		$ 891.978.100,00		$ 51.128.491,00		$ 943.106.591,00	
1,3	EXCAVACIONES Y RELLENOS													
1,3,1	EXCAVACION MECANICA EN CONGLOMERADO INCLUYE CARGUE	M3	34.529,81	$ 41.950,00	$ 1.448.525.530,00	34.529,81	$ 1.448.525.530,00	26.408,67	1.107.843.707,00	0,00	$ -	26.408,67	$ 1.107.843.707,00	76,48
1,3,2	EXCAVACION MANUAL EN CONGLOMERADO H= 0 - 2.00 M INCLUYE CARGUE	M3	156,89	$ 104.882,00	$ 16.454.675,00	5.067,59	$ 531.498.974,00	909,30	95.369.203,00	231,27	$ 24.256.060,00	1.140,57	$ 119.625.263,00	22,51
1,3,3	RELLENO CON MATERIAL MIXTO DE RÍO SIN PROCESAR TAMAÑO MAX. 2" SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN MANUAL CON EQUIPO LIVIANO	M3	10.905,41	$ 73.847,00	$ 805.331.443,00	4.994,10	$ 368.799.408,00	0,00	-	0,00	$ -	0,00	$ -	-
	ITEMS NO PREVISTOS													
N.P.P.P.1,3,4	TRANSPORTE DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS Y SOBRANTES	VJ	-	$ 259.921,00	$ -	6.904,66	$ 1.794.666.132,00	4.821,20	1.253.131.125,00	80,23	$ 20.853.462,00	4.901,43	$ 1.273.984.587,00	70,99
N.P.1,3,5	DISPOSICION FINAL DE MATERIAL DE EXCAVACION SITIO AUTORIZADO (NO INCLUYE TRANSPORTE)	TON		$ 27.720,00	$ -	76.526,62	$ 2.121.317.906,00	53.434,97	1.481.217.368,00	889,20	$ 24.648.624,00	54.324,17	$ 1.505.865.992,00	70,99
N.P.1,3,6	EXCAVACION MANUAL PARA CAISSON EN CONGLOMERADO H > 6.00 M INCLUYE CARGUE	M3	-	$ 423.048,84	$ -	679,77	$ 287.575.910,00	383,98	162.442.294,00	0,00	$ -	383,98	$ 162.442.294,00	56,49

CONTRATO N°	511 de 2023	PROYECTO N°	2021005500331
ACTA DE PAGO PARCIAL N°	3	PERIODO ACTA DE PAGO PARCIAL:	28/9/2024 a 31/10/2024
OBJETO CONTRATO:	AMPLIACIÓN DE LA CAPACIDAD INSTALADA DEL HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE VILLAVICENCIO ESE - META	OBJETO PROYECTO:	AMPLIACIÓN DE LA CAPACIDAD INSTALADA DEL HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE VILLAVICENCIO ESE - META
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	$ 80.389.497.271,00	VALOR TOTAL DEL PROYECTO:	$ 84.208.944.899,00
CONTRATISTA:	CONSORCIO HOSPITAL 002	CONTRATO DE INTERVENTORIA N°	572 DE 2023
NIT:	901.752.517-0	INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTER HOSPITAL
CORREO ELECTRONICO CONTRATISTA:	coordinador.hospital@cyg.com.co	CORREO ELECTRONICO INTERVENTORIA:	coninterhospital2023@gmail.com
SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORIA	ING. GINA TATIANA ELAICA NIETO	APOYO A LA SUPERVISION:	DAVID ASHBEL FLOREZ SIERRA
CORREO ELECTRONICO INTERVENTORIA:	coninterhospital2023@gmail.com	CONTRATO DE APOYO A LA SUPERVISION N°	765 DE 2023
FECHA DE INICIACIÓN:	12/12/2023	FECHA PRESENTE ACTA:	15/11/2024

N° ITEM	CONDICIONES INICIALES					CONDICIONES ACTUALIZADAS Acta de Modificación No. 2 de fecha 12/09/2024		OBRA EJECUTADA						
								ACTAS ANTERIORES		PRESENTE ACTA		ACUMULADO		
	DESCRIPCION	UNO	CANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	%
N.P.1.3.7	RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE DE LA EXCAVACIÓN. COMPACTACIÓN MANUAL	M3	-	$ 37.447,27	$ -	296,16	$ 11.090.271,00	0,00	-	0,00	$ -	0,00	$ -	-
	SUBTOTAL				**$ 2.270.311.648,00**		**$ 6.563.474.131,00**		**$ 4.100.003.697,00**		**$ 69.758.146,00**		**$ 4.169.761.843,00**	
1,4	**FACHADA**													
1,4,1	SUMINISTRO E INSTALACION DE VIDRIO SISTEMA SOL LITE, CON PROTECCION A RAYOS UV Y CONTROL SOLAR (INCLUYE ESTRUCTURA)	M2	1.080,04	$ 1.935.984,00	$ 2.090.930.673,00	580,04	$ 1.122.938.673,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
1,4,2	SUMINSITRO E INSTALACIÓN DE REVESTIMIENTO LAMINAS EN SCREEN PANEL PARA FACHADAS (incluye estructura de soporte y remates de cubierta)	M2	972,33	$ 1.220.670,00	$ 1.186.892.230,00	472,33	$ 576.557.230,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
1,4,3	TABLERO EN CONCRETO 27.6 MPA (4000 PSI) AUTONIVELANTE, AUTO COMPACTANTE Y DE COLOR SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	509,20	$ 2.507.067,00	$ 1.276.586.482,00	-	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
	SUBTOTAL				**$ 4.554.409.385,00**		**$ 1.699.495.903,00**		**$ -**		**$ -**		**$ -**	
1,5	**MAMPOSTERÍA**													
1,5,1	MURO EN BLOQUE FLEXA No. 4 0.10X0.20X0.30 m (MORTERO TIPO S 1:4)	M2	8.402,50	$ 63.241,00	$ 531.382.503,00	8.402,50	$ 531.382.503,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
1,5,2	VÍGA AÉREA EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	82,71	$ 1.554.643,00	$ 128.584.523,00	82,71	$ 128.584.523,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
1,5,3	COLUMNA EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	124,32	$ 1.593.776,00	$ 198.138.232,00	124,32	$ 198.138.232,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
1,5,4	MESÓN EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	13,43	$ 2.255.398,00	$ 30.285.823,00	13,43	$ 30.285.823,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
1,5,5	GRANITO PULIDO PARA MESON	M2	134,28	$ 285.042,00	$ 38.275.867,00	134,28	$ 38.275.867,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
1,5,6	PAÑETE MUROS INTERIORES MORTERO 1:4 INCLUYE FILOS Y DILATACIONES. SUMINISTRO Y APLICACIÓN	M2	14.301,92	$ 30.282,00	$ 433.090.799,00	14.301,92	$ 433.090.799,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
1,5,7	PAÑETE MURO EXTERIOR Y CULATAS MORTERO 1:4 IMPERMEABILIZADO. SUMINISTRO Y APLICACIÓN	M2	2.667,08	$ 41.479,00	$ 110.627.712,00	2.667,08	$ 110.627.712,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
1,5,8	ACERO DE REFUERZO FY=4200 MPa (4200 KG/CM2, G60) INCLUYE SUMINISTRO, FIGURADO, ARMADO, COLOCACIÓN Y AMARRE	KG	15.401,47	$ 10.248,00	$ 157.834.285,00	15.401,47	$ 157.834.285,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
1,5,9	INSTALACION ASCENSOR CAMILLERO CON UNA CAPACIDAD DE 1200 KG MANIOBRA DUPLEX	UN	2,00	$ 69.564.722,00	$ 139.129.444,00	2,00	$ 139.129.444,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
1,5,10	SANITARIO DISCAPACITADOS INCLUYE GRIFERIA ANTIVANDALICA	UN	10,00	$ 1.017.680,00	$ 10.176.800,00	10,00	$ 10.176.800,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
1,5,11	SANITARIO ACUACER BLANCO CORONA	UN	89,00	$ 459.734,00	$ 40.916.326,00	89,00	$ 40.916.326,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
1,5,12	LAVAPLATOS ACERO INOXIDABLE 1.20 x 0.60 INCLUYE GRIFERIA	UN	9,00	$ 636.368,00	$ 5.727.312,00	9,00	$ 5.727.312,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
1,5,13	LAVAMANOS SOBREPONER CORONA O SIMILAR INCLUYE GRIFERIA Y ACCESORIOS	UN	120,00	$ 569.912,00	$ 68.389.440,00	120,00	$ 68.389.440,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
1,5,14	ORINAL GOTTA BLANCO INCLUYE GRIFERIA ANTIVANDALICA T CORONA	UN	11,00	$ 1.023.295,00	$ 11.256.245,00	11,00	$ 11.256.245,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
1,5,15	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PASAMANOS PARA DISCAPACITADOS EN ACERO INOXIDABLE L = 1.5 MTS	UN	10,00	$ 358.900,00	$ 3.589.000,00	10,00	$ 3.589.000,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
1,5,16	INSTALACION ASCENSOR CON UNA CAPACIDAD DE 1200 KG MANIOBRA CUADRUPLEX	UN	4,00	$ 81.951.703,00	$ 327.806.812,00	4,00	$ 327.806.812,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
1,5,17	COLUMNA FALSA EN SUPERBOARD PARA PERIMETRO DE COLUMNAS METÁLICAS, CAL 8MM INCLUYE PINTURA SECCIÓN DE 0.80 X 0.40	ML	1.969,30	$ 564.118,00	$ 1.110.917.577,00	-	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
	SUBTOTAL				**$ 3.346.128.700,00**		**$ 2.235.211.123,00**		**$ -**		**$ -**		**$ -**	
1,6	**CARPINTERÍA METÁLICA Y DE MADERA**													
1,6,1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUERTA TABLERO CORRIDO, INCLUYE MARCO, CERRADURA LAMINA COLL ROLLED CAL 20; 2 X 0.90 M	UN	29,00	$ 571.367,00	$ 16.569.643,00	29,00	$ 16.569.643,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
1,6,2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA DOBLE HOJA DE 2.0X2.15 ENTAMBORADA EN MADERA, VISOR, GUARDACAMILLA Y GUARDA PIES EN ACERO TIPO 304, CHAPA DE SEGURIDAD, PASADORES, BISAGRA PIVOTE DE REBOTE Y PINTURA.	UN	26,00	$ 5.397.295,00	$ 140.329.670,00	26,00	$ 140.329.670,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
1,6,3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN VENTANA ALUMINIO SIS PROYECTANTE, PISAVIDRIOS PRES	M2	326,67	$ 382.801,00	$ 125.051.134,00	326,67	$ 125.051.134,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
1,6,4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUERTA MADERA ENTAMBORADA TIPO PRESTIGE 0.90X2 m INCLUYE MARCO Y CHAPA	UN	251,00	$ 649.497,00	$ 163.023.747,00	251,00	$ 163.023.747,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
1,6,5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUERTA ACCESO VIDRIO TEMPLADO 10 MM INCLUYE BARANDAS 2 BARRAS ACERO INOXIDABLE	M2	48,09	$ 1.467.270,00	$ 70.563.949,00	48,09	$ 70.563.949,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-

CONTRATO N°	511 de 2023	PROYECTO N°	2021005500331
ACTA DE PAGO PARCIAL N°	3	PERIODO ACTA DE PAGO PARCIAL:	28/9/2024 a 31/10/2024
OBJETO CONTRATO:	AMPLIACIÓN DE LA CAPACIDAD INSTALADA DEL HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE VILLAVICENCIO ESE - META	OBJETO PROYECTO:	AMPLIACIÓN DE LA CAPACIDAD INSTALADA DEL HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE VILLAVICENCIO ESE - META
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	$ 80.389.497.271,00	VALOR TOTAL DEL PROYECTO:	$ 84.208.944.899,00
CONTRATISTA:	CONSORCIO HOSPITAL 002	CONTRATO DE INTERVENTORIA N°	572 DE 2023
NIT:	901.752.517-0	INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTER HOSPITAL
CORREO ELECTRONICO CONTRATISTA:	coordinador.hospital@cyg.com.co	CORREO ELECTRONICO INTERVENTORIA:	coninterhospital2023@gmail.com
SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORIA	ING. GINA TATIANA ELAICA NIETO	APOYO A LA SUPERVISION:	DAVID ASHBEL FLOREZ SIERRA
CORREO ELECTRONICO INTERVENTORIA:	coninterhospital2023@gmail.com	CONTRATO DE APOYO A LA SUPERVISION N°	765 DE 2023
FECHA DE INICIACIÓN:	12/12/2023	FECHA PRESENTE ACTA:	15/11/2024

N° ITEM	CONDICIONES INICIALES					CONDICIONES ACTUALIZADAS Acta de Modificación No. 2 de fecha 12/09/2024		OBRA EJECUTADA						
								ACTAS ANTERIORES		PRESENTE ACTA		ACUMULADO		
	DESCRIPCION	UNO	CANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	%
1,6,6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUERTA ALUMINIO SISTEMA BISAGRA, CON VIDRIO 4 MM	M2	106,00	$ 463.663,00	$ 49.148.278,00	106,00	$ 49.148.278,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
1,6,7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SUMINISTRO E INSTALACION CERRADURA PUERTA ALUMINIO TIPO YALE DE EMBUTIR L370	UN	106,00	$ 178.034,00	$ 18.871.604,00	106,00	$ 18.871.604,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
1,6,8	HOJA TRIPLEX 1.00X2.10 GUARDACAMILLA Y GUARDAPIES, PLOMADA INCLUYE CHAPA DE BOLA (PINTURA)	UN	2,00	$ 3.696.322,00	$ 7.392.644,00	2,00	$ 7.392.644,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
1,6,9	DOS HOJAS TRIPLEX 1.20X2.10 CADA UNA, GUARDACAMILLA Y GUARDAPIES, PLOMADA INCLUYE CHAPA DE BOLA (PINTURA)	UN	5,00	$ 7.331.435,00	$ 36.657.175,00	5,00	$ 36.657.175,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
1,6,10	MARCO Y CONTRAMARCO ELABORA EN LAMINA COLD ROLLD CALIBRE 16 BLINDADO POR LA PARTE INTERNA EN PLOMO DE 2MM, TERMINADO EN PINTURA ELECTROSTATICA DE 1.25X0.90M Y VIDRIO PLOMADO ESPESOR DE 15 MM	UN	2,00	$ 24.223.814,00	$ 48.447.628,00	2,00	$ 48.447.628,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
1,6,11	MARCO Y CONTRAMARCO ELABORA EN LAMINA COLD ROLLD CALIBRE 16 BLINDADO POR LA PARTE INTERNA EN PLOMO DE 2MM, TERMINADO EN PINTURA ELECTROSTATICA DE 0.65X0.50M Y VIDRIO PLOMADO ESPESOR DE 12 MM	UN	3,00	$ 5.724.404,00	$ 17.173.212,00	3,00	$ 17.173.212,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
1,6,12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA HOJA DE (0.8-1) X2.15 ENTAMBORADA EN MADERA, VISOR, GUARDACAMILLA Y GUARDA PIES EN ACERO TIPO 304, CHAPA DE SEGURIDAD, PASADORES, BISAGRA PIVOTE DE REBOTE Y PINTURA	UN	3,00	$ 2.768.989,00	$ 8.306.967,00	3,00	$ 8.306.967,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
1,6,13	GUARDA CAMILLA EN PVC CON ALMA CONTRAIMPACTO	ML	257,48	$ 101.790,00	$ 26.208.889,00	257,48	$ 26.208.889,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
1,6,14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN MARCO MADERA CEDRO E=0.10M	ML	5,00	$ 192.089,00	$ 960.445,00	5,00	$ 960.445,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
	SUBTOTAL				**$ 728.704.985,00**		**$ 728.704.985,00**		**$ -**		**$ -**		**$ -**	
1,7	**PISOS Y ENCHAPES**													
1,7,1	AFINADO PISOS MORTERO 1:4, E=50MM	M2	8.425,45	$ 40.189,00	$ 338.610.410,00	8.425,45	$ 338.610.410,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
1,7,2	PISO BALDOSA GRANO MARMOL 0.30X0.30	M2	7.989,24	$ 162.985,00	$ 1.302.126.281,00	10.038,75	$ 1.636.165.022,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
1,7,3	GUARDAESCOBA EN GRANITO PULIDO	ML	5.026,88	$ 60.276,00	$ 303.000.219,00	5.026,88	$ 303.000.219,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
1,7,4	APLICACIÓN DE SISTEMA DE PISOS DE ALTA TÉCNOLOGÍA, EN URETANO CEMENTICIO DE ALTO DESEMPEÑO, CON ADITIVO ANTIMICROBIANO, CON ALTA RESISTENCIA A LOS QUÍMICOS, CHOQUES TÉRMICOS Y A LAS TRANSMISIÓN DE HUMEDAD.	M2	436,21	$ 798.858,00	$ 348.469.848,00	436,21	$ 348.469.848,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
1,7,5	PORCELANATO CEDAR BLANCO 0.30X0.60 BRILLANTE	M2	2.093,83	$ 157.152,00	$ 329.049.258,00	2.093,83	$ 329.049.258,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
1,7,6	PISO CONDUCTIVO EPOXI QUARZ ANTIESTATICO INCLUYE GUARDAESCOBA	M2	59,78	$ 904.932,00	$ 54.096.835,00	59,78	$ 54.096.835,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
	SUBTOTAL				**$ 2.675.352.851,00**		**$ 3.009.391.592,00**		**$ -**		**$ -**		**$ -**	
1,8	**ACABADOS**													
1,8,1	PINTURA VINILO TIPO 1 S/MURO (ALTA CALIDAD)	M2	12.689,12	$ 14.194,00	$ 180.109.426,00	12.689,12	$ 180.109.426,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
1,8,2	ESTUCO PLASTICO	M2	15.111,68	$ 20.740,00	$ 313.416.160,00	15.111,68	$ 313.416.160,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
1,8,3	CIELO RASO PLACA SUPERBOARD 6 MM INC PINTURA	M2	6.712,02	$ 116.912,00	$ 784.715.682,00	-	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
1,8,4	SUMINISTRO E INSTALACION DE IMPERMEABILIZACION EN POLIURETANO, INCLUYE IMPRIMANTE, BASE, SELLANTE Y ENDURECEDOR DE CUARZO	M2	1.843,38	$ 380.867,00	$ 702.082.610,00	1.843,38	$ 702.082.610,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
1,8,5	SUMINISTRO E INSTALACION DE MANTO EN PVC	M2	666,06	$ 308.262,00	$ 205.320.988,00	666,06	$ 205.320.988,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
1,8,6	PINTURA ANTIBACTERIAL TIPO VIRAL ZERO, PARA ZONAS DE ASEPSIA	M2	1.198,51	$ 26.676,00	$ 31.971.319,00	1.198,51	$ 31.971.319,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
1,8,7	CONSTRUCCION DE CUBIERTA VERDE, SISTEMA URBANSCAPE O SIMILAR, SISTEMA MULTICAPA CON MEMBRANA ANTI RAICES,SISTEMA DE DRENAJE, SUSTRATO DE CULTIVO Y CAPA VEGETAL NO INCLUYE IMPERMEABILIZACION DE PLACA	M2	650,00	$ 364.146,00	$ 236.694.900,00	650,00	$ 236.694.900,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
	SUBTOTAL				**$ 2.454.311.085,00**		**$ 1.669.595.403,00**		**$ -**		**$ -**		**$ -**	
	SUBTOTAL COMPONENTE ARQUITECTONICO				**$ 17.175.785.977,00**		**$ 17.175.785.977,00**		**$ 5.005.568.968,00**		**$ 120.886.637,00**		**$ 5.126.455.605,00**	
2	COMPONENTE ESTRUCTURAL													
2,1	**PRELIMINARES**													
2,1,1	LOCALIZACION, TRAZADO Y REPLANTEO OBRA ARQUITECTÓNICA INCLUYE COMISIÓN TOPOGRAFICA, CARTERA Y PLANOS.	M2	2.571,13	$ 6.101,00	$ 15.686.464,00	2.571,13	$ 15.686.464,00	2.474,49	15.096.863,00	0,00	$ -	2.474,49	$ 15.096.863,00	96,24
2,1,2	CAMPAMENTO DE 18 M2 CERRAMIENTO EN MADERA Y CUBIERTA EN TEJA DE ZINC.	UN	1,00	$ 5.482.267,00	$ 5.482.267,00	1,00	$ 5.482.267,00	0,00	-	0,00	$ -	0,00	$ -	-

CONTRATO N°	511 de 2023	PROYECTO N°	2021005500331
ACTA DE PAGO PARCIAL N°	3	PERIODO ACTA DE PAGO PARCIAL:	28/9/2024 a 31/10/2024
OBJETO CONTRATO:	AMPLIACIÓN DE LA CAPACIDAD INSTALADA DEL HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE VILLAVICENCIO ESE - META	OBJETO PROYECTO:	AMPLIACIÓN DE LA CAPACIDAD INSTALADA DEL HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE VILLAVICENCIO ESE - META
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	$ 80.389.497.271,00	VALOR TOTAL DEL PROYECTO:	$ 84.208.944.899,00
CONTRATISTA:	CONSORCIO HOSPITAL 002	CONTRATO DE INTERVENTORIA N°	572 DE 2023
NIT:	901.752.517-0	INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTER HOSPITAL
CORREO ELECTRONICO CONTRATISTA:	coordinador.hospital@cyg.com.co	CORREO ELECTRONICO INTERVENTORIA:	coninterhospital2023@gmail.com
SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORIA	ING. GINA TATIANA ELAICA NIETO	APOYO A LA SUPERVISION:	DAVID ASHBEL FLOREZ SIERRA
CORREO ELECTRONICO INTERVENTORIA:	coninterhospital2023@gmail.com	CONTRATO DE APOYO A LA SUPERVISION N°	765 DE 2023
FECHA DE INICIACIÓN:	12/12/2023	FECHA PRESENTE ACTA:	15/11/2024

N° ITEM	CONDICIONES INICIALES					CONDICIONES ACTUALIZADAS Acta de Modificación No. 2 de fecha 12/09/2024		OBRA EJECUTADA						
								ACTAS ANTERIORES		PRESENTE ACTA		ACUMULADO		
	DESCRIPCIÓN	UNO	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	%
2,1,3	CERRAMIENTO PROVISIONAL EN TELA VERDE H=2.10 M. ESTRUCTURA MADERA COMÚN. BASES EN CONCRETO 2000 PSI.	ML	200,00	$ 76.532,00	$ 15.306.400,00	200,00	$ 15.306.400,00	0,00	-	0,00	$ -	0,00	$ -	-
	SUBTOTAL				**$ 36.475.131,00**		**$ 36.475.131,00**		**$ 15.096.863,00**		**$ -**		**$ 15.096.863,00**	
2,2	**ACERO ESTRUCTURAL**													
2,2,1	ESTRUCTURAS EN ACERO ESTRUCTURAL TIPO ASTM A500 INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN	KG	879.003,87	$ 27.717,00	$ 24.363.350.290,00	879.003,87	$ 24.363.350.290,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
2,2,2	ACERO ESTRUCTURAL T ASTM A36 (INCLUYE SUMINISTRO MONTAJE Y PINTURA)	KG	43.950,19	$ 25.337,00	$ 1.113.565.964,00	43.950,19	$ 1.113.565.964,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
	SUBTOTAL				**$ 25.476.916.254,00**		**$ 25.476.916.254,00**		**$ -**		**$ -**		**$ -**	
2,3	**CONCRETOS**													
2,3,1	ZAPATA EN CONCRETO 34.5 MPa (5000 PSI) PREMEZCLADO ACELERADO A 3 DÍAS. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	116,11	$ 1.318.143,00	$ 153.049.584,00	-	$ -	0,00	-	0,00	$ -	0,00	$ -	-
2,3,2	VIGA EN CONCRETO 34.5 MPa (5000 PSI) PREMEZCLADO ACELERADO A 3 DÍAS. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	277,24	$ 1.397.100,00	$ 387.332.004,00	-	$ -	0,00	-	0,00	$ -	0,00	$ -	-
2,3,3	COLUMNA EN CONCRETO 34.5 MPa (5000 PSI) PREMEZCLADO ACELERADO A 3 DÍAS. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	416,27	$ 1.842.389,00	$ 766.931.269,00	-	$ -	0,00	-	0,00	$ -	0,00	$ -	-
2,3,4	VÍGA AÉREA EN CONCRETO 34.5 MPa (5000 PSI) PREMEZCLADO ACELERADO A 3 DÍAS. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	1.710,50	$ 1.803.256,00	$ 3.084.469.388,00	-	$ -	0,00	-	0,00	$ -	0,00	$ -	-
2,3,5	TORRES, ESTRUCTURAS ESBELTAS EN CONCRETO 34.5 MPa (5000 PSI) SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	1.859,86	$ 1.802.712,00	$ 3.352.791.940,00	1.859,86	$ 3.352.791.940,00	79,19	142.756.763,00	79,96	$ 144.144.852,00	159,15	$ 286.901.615,00	8,56
2,3,6	PLACA DE CONTRAPISO EN CONCRETO 34.5 MPa (5000 PSI) PREMEZCLADO ACELERADO A 3 DÍAS. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	323,66	$ 1.264.869,00	$ 409.387.501,00	-	$ -	0,00	-	0,00	$ -	0,00	$ -	-
2,3,7	PLACA DE ENTREPISO MACIZA EN CONCRETO IMPERMEABILIZADO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	1.225,06	$ 1.382.108,00	$ 1.693.165.226,00	2.006,47	$ 2.773.162.768,00	0,00	-	0,00	$ -	0,00	$ -	-
2,3,8	ESCALERAS EN CONCRETO 34.5 MPa (5000 PSI) PREMEZCLADO ACELERADO A 3 DÍAS. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	58,34	$ 1.888.289,00	$ 110.162.780,00	58,34	$ 110.162.780,00	0,00	-	0,00	$ -	0,00	$ -	-
2,3,9	RAMPA EN CONCRETO 34.5 MPa (5000 PSI) PREMEZCLADO ACELERADO A 3 DÍAS. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	21,05	$ 1.776.395,00	$ 37.393.115,00	-	$ -	0,00	-	0,00	$ -	0,00	$ -	
	ITEMS NO PREVISTOS													
N.P. 2,3,10	PLACA DE ENTREPISO ALIGERADA E= 0.60 M EN CONCRETO 35 MPa (5000 PSI) PREMEZCLADO CON CASETÓN RECUPERABLE. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN (losa superior=0,10m)	M2	-	$ 421.504,68	$ -	3.792,58	$ 1.598.590.219,00	318,80	134.375.692,00	486,44	$ 205.036.737,00	805,24	$ 339.412.429,00	21,23
N.P. 2,3,11	RAMPA VEHICULAR EN PLACA DE ENTREPISO ALIGERADA E= 0.60 M EN CONCRETO 35 MPa (5000 PSI) PREMEZCLADO CON CASETÓN RECUPERABLE. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN (losa superior=0,12m)	M2	-	$ 468.351,39	$ -	300,37	$ 140.678.707,00	0,00	-	0,00	$ -	0,00	$ -	-
N.P. 2,3,12	RAMPA PEATONAL EN CONCRETO 28 MPa (4000 PSI) PREMEZCLADO. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	-	$ 1.342.994,91	$ -	8,00	$ 10.743.959,00	0,00	-	0,00	$ -	0,00	$ -	-
N.P. 2,3,13	PUNTALES EN CONCRETO 28 MPa (4000 PSI) DEBAJO DE RAMPAS PEATONALES	M3	-	$ 1.475.525,52	$ -	2,39	$ 3.526.506,00	0,00	-	0,00	$ -	0,00	$ -	-
N.P. 2,3,14	CONSTRUCCIÓN ANILLO DEL CAISSON MEDIA LUNA EN CONCRETO 4000 PSI - 35 MPa ØINT= 3.00 M, ØEXT= 3,24 M PROFUNDIDAD MAYOR A 10 M. NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO	ML	-	$ 1.325.388,42	$ -	117,00	$ 155.070.445,00	57,46	76.156.819,00	0,00	$ -	57,46	$ 76.156.819,00	49,11
N.P. 2,3,15	SOLADO, LIMPIEZA EN CONCRETO 13.8 MPa (2000 PSI)	M3	-	$ 739.742,94	$ -	40,45	$ 29.922.602,00	22,43	16.592.434,00	0,66	$ 488.230,00	23,09	$ 17.080.664,00	57,08
N.P. 2,3,16	CONECTORES MECANICOS PARA VARILLAS #5	UND	-	$ 25.272,57	$ -	76,00	$ 1.920.715,00	0,00	-	0,00	$ -	0,00	$ -	-
N.P. 2,3,17	CONECTORES MECANICOS PARA VARILLAS #6	UND	-	$ 28.316,32	$ -	270,00	$ 7.645.406,00	0,00	-	0,00	$ -	0,00	$ -	-
N.P. 2,3,18	CONECTORES MECANICOS PARA VARILLAS #7	UND		$ 33.542,53	$ -	178,00	$ 5.970.570,00	0,00	-	0,00	$ -	0,00	$ -	-
N.P. 2,3,19	CONECTORES MECANICOS PARA VARILLAS #8	UND	-	$ 36.660,33	$ -	264,00	$ 9.678.327,00	0,00	-	0,00	$ -	0,00	$ -	-
N.P. 2,3,20	ZAPATA EN CONCRETO 34.5 MPa (5000 PSI) PREMEZCLADO. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	-	$ 1.242.468,80	$ -	216,48	$ 268.969.646,00	191,31	237.696.706,00	0,00	$ -	191,31	$ 237.696.706,00	88,37
N.P. 2,3,21	VIGA EN CONCRETO 34.5 MPa (5000 PSI) PREMEZCLADO. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	-	$ 1.321.647,51	$ -	237,08	$ 313.336.192,00	136,92	183.603.272,00	2,31	$ 3.053.006,00	141,23	$ 186.656.278,00	59,57

CONTRATO N°	511 de 2023	PROYECTO N°	2021005500331
ACTA DE PAGO PARCIAL N°	3	PERIODO ACTA DE PAGO PARCIAL:	28/9/2024 a 31/10/2024
OBJETO CONTRATO:	AMPLIACIÓN DE LA CAPACIDAD INSTALADA DEL HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE VILLAVICENCIO ESE - META	OBJETO PROYECTO:	AMPLIACIÓN DE LA CAPACIDAD INSTALADA DEL HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE VILLAVICENCIO ESE - META
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	$ 80.389.497.271,00	VALOR TOTAL DEL PROYECTO:	$ 84.208.944.899,00
CONTRATISTA:	CONSORCIO HOSPITAL 002	CONTRATO DE INTERVENTORIA N°	572 DE 2023
NIT:	901.752.517-0	INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTER HOSPITAL
CORREO ELECTRONICO CONTRATISTA:	coordinador.hospital@cyg.com.co	CORREO ELECTRONICO INTERVENTORIA:	coninterhospital2023@gmail.com
SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORIA	ING. GINA TATIANA ELAICA NIETO	APOYO A LA SUPERVISION:	DAVID ASHBEL FLOREZ SIERRA
CORREO ELECTRONICO INTERVENTORIA:	coninterhospital2023@gmail.com	CONTRATO DE APOYO A LA SUPERVISION N°	765 DE 2023
FECHA DE INICIACIÓN:	12/12/2023	FECHA PRESENTE ACTA:	15/11/2024

N° ITEM	CONDICIONES INICIALES					CONDICIONES ACTUALIZADAS Acta de Modificación No. 2 de fecha 12/09/2024		OBRA EJECUTADA						
								ACTAS ANTERIORES		PRESENTE ACTA		ACUMULADO		
	DESCRIPCION	UND	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	%
N.P. 2,3,22	COLUMNA EN CONCRETO 34.5 MPa (5000 PSI) PREMEZCLADO. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	-	$ 1.767.431,63	$ -	162,31	$ 286.871.828,00	55,80	98.622.685,00	33,82	$ 59.774.538,00	89,62	$ 158.397.223,00	55,22
N.P. 2,3,23	VÍGA AÉREA EN CONCRETO 34.5 MPa (5000 PSI) PREMEZCLADO. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	-	$ 1.728.188,64	$ -	364,70	$ 630.270.397,00	41,80	72.238.285,00	48,68	$ 84.128.223,00	90,48	$ 156.366.508,00	24,81
N.P. 2,3,24	PLACA DE CONTRAPISO EN CONCRETO 34.5 MPa (5000 PSI) PREMEZCLADO. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	-	$ 1.141.834,70	$ -	258,68	$ 295.369.800,00	13,49	15.403.350,00	0,00	$ -	13,49	$ 15.403.350,00	5,21
	SUBTOTAL				**$ 9.994.682.807,00**		**$ 9.994.682.807,00**		**$ 977.446.006,00**		**$ 496.625.586,00**		**$ 1.474.071.592,00**	
2,4	**ACERO DE REFUERZO**													
2,4,1	ACERO DE REFUERZO FY=4200 MPa (4200 KG/CM2, G60) INCLUYE SUMINISTRO, FIGURADO, ARMADO, COLOCACIÓN Y AMARRE.	KG	544.282,55	$ 10.248,00	$ 5.577.807.572,00	544.282,55	$ 5.577.807.572,00	88.604,13	908.015.124,00	39.374,54	$ 403.510.286,00	127.978,67	$ 1.311.525.410,00	23,51
2,4,2	MALLA ELECTROSOLDADA FY=5000 KG/CM2, 500 MPA. FIGURADO, ARMADO, COLOCACIÓN Y AMARRE. SUMINISTRO E INSTALACIÓN	KG	52.681,69	$ 11.029,00	$ 581.026.359,00	52.681,69	$ 581.026.359,00	4.473,20	49.334.923,00	4.642,00	$ 51.196.618,00	9.115,20	$ 100.531.541,00	17,30
	SUBTOTAL				**$ 6.158.833.931,00**		**$ 6.158.833.931,00**		**$ 957.350.047,00**		**$ 454.706.904,00**		**$ 1.412.056.951,00**	
	SUBTOTAL COMPONENTE ESTRUCTURAL				**$ 41.666.908.123,00**		**$ 41.666.908.123,00**		**$ 1.949.892.916,00**		**$ 951.332.490,00**		**$ 2.901.225.406,00**	
3	COMPONENTE HIDRAULICO E HIDROLOGICO													
3,1	**OBRAS PRELIMINARES**													
3,1,1	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO REDES INCLUYE COMISIÓN TOPOGRÁFICA, CARTERA Y PLANOS	ML	806,38	$ 6.127,00	$ 4.940.690,00	806,38	$ 4.940.690,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
	SUBTOTAL				**$ 4.940.690,00**		**$ 4.940.690,00**		**$ -**		**$ -**		**$ -**	
3,2	**EXCAVACIONES**													
3,2,1	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN H= 0 - 2.00 M INCLUYE CARGUE	M3	191,05	$ 94.394,00	$ 18.033.879,00	191,05	$ 18.033.879,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
3,2,2	TRANSPORTE DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS Y SOBRANTE	VJ	10,18	$ 259.921,00	$ 2.646.987,00	10,18	$ 2.646.987,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
	SUBTOTAL				**$ 20.680.866,00**		**$ 20.680.866,00**		**$ -**		**$ -**		**$ -**	
3,3	**RELLENOS**													
3,3,1	RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE DE LA EXCAVACIÓN. COMPACTACIÓN MECÁNICA	M3	68,44	$ 30.310,00	$ 2.074.283,00	68,44	$ 2.074.283,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
3,3,2	RELLENO CON ARENA	M3	51,33	$ 118.873,00	$ 6.101.359,00	51,33	$ 6.101.359,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
	SUBTOTAL				**$ 8.175.642,00**		**$ 8.175.642,00**		**$ -**		**$ -**		**$ -**	
3,4	**RED DE SUMINISTRO**													
3,4,1	**ACOMENTIDA**													
3,4,1,1	TUBERÍA PVCP RDE 21 2 1/2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	ML	111,28	$ 56.121,00	$ 6.245.145,00	111,28	$ 6.245.145,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
3,4,1,2	ACCESORIO PVCP 2 1/2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	13,00	$ 61.623,00	$ 801.099,00	13,00	$ 801.099,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
3,4,1,3	VALVULA DE BOLA 2 1/2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	3,00	$ 574.031,00	$ 1.722.093,00	3,00	$ 1.722.093,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
3,4,1,4	MACROMEDIDOR 2" SUMINISTRO E INSTALACION	UN	1,00	$ 1.116.778,00	$ 1.116.778,00	1,00	$ 1.116.778,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
	SUBTOTAL				**$ 9.885.115,00**		**$ 9.885.115,00**		**$ -**		**$ -**		**$ -**	
3,4,2	**RED INTERNA DE SUMINSTRO AGUA FRIA**													
3,4,2,1	TUBERÍA PVCP RDE 09 1/2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	ML	337,96	$ 14.174,00	$ 4.790.245,00	337,96	$ 4.790.245,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
3,4,2,2	TUBERÍA PVCP RDE 21 1-1/4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	ML	477,39	$ 24.381,00	$ 11.639.246,00	477,39	$ 11.639.246,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
3,4,2,3	TUBERÍA PVCP RDE 21 1-1/2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	ML	139,89	$ 29.431,00	$ 4.117.103,00	139,89	$ 4.117.103,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
3,4,2,4	TUBERÍA PVCP RDE 21 2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	ML	262,80	$ 40.718,00	$ 10.700.690,00	262,80	$ 10.700.690,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
3,4,2,5	TUBERÍA PVCP RDE 21 2-1/2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	ML	38,57	$ 56.121,00	$ 2.164.587,00	38,57	$ 2.164.587,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
3,4,2,6	TUBERÍA PVCP RDE 13.5 1" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	ML	250,76	$ 20.306,00	$ 5.091.933,00	250,76	$ 5.091.933,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
3,4,2,7	TUBERÍA PVCP RDE 21 4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	ML	47,35	$ 117.836,00	$ 5.579.535,00	47,35	$ 5.579.535,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
3,4,2,8	ACCESORIO PVCP 1/2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	293,00	$ 4.837,00	$ 1.417.241,00	293,00	$ 1.417.241,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
3,4,2,9	ACCESORIO PVCP 1-1/4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	791,00	$ 11.372,00	$ 8.995.252,00	791,00	$ 8.995.252,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
3,4,2,10	ACCESORIO PVCP 1-1/2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	178,00	$ 12.317,00	$ 2.192.426,00	178,00	$ 2.192.426,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
3,4,2,11	ACCESORIO PVCP 2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	94,00	$ 25.307,00	$ 2.378.858,00	94,00	$ 2.378.858,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
3,4,2,12	ACCESORIO PVCP 2-1/2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	17,00	$ 61.623,00	$ 1.047.591,00	17,00	$ 1.047.591,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
3,4,2,13	ACCESORIO PVCP 1" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	140,00	$ 6.518,00	$ 912.520,00	140,00	$ 912.520,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-

CONTRATO N°	511 de 2023	PROYECTO N°	2021005500331
ACTA DE PAGO PARCIAL N°	3	PERIODO ACTA DE PAGO PARCIAL:	28/9/2024 a 31/10/2024
OBJETO CONTRATO:	AMPLIACIÓN DE LA CAPACIDAD INSTALADA DEL HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE VILLAVICENCIO ESE - META	OBJETO PROYECTO:	AMPLIACIÓN DE LA CAPACIDAD INSTALADA DEL HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE VILLAVICENCIO ESE - META
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	$ 80.389.497.271,00	VALOR TOTAL DEL PROYECTO:	$ 84.208.944.899,00
CONTRATISTA:	CONSORCIO HOSPITAL 002	CONTRATO DE INTERVENTORIA N°	572 DE 2023
NIT:	901.752.517-0	INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTER HOSPITAL
CORREO ELECTRONICO CONTRATISTA:	coordinador.hospital@cyg.com.co	CORREO ELECTRONICO INTERVENTORIA:	coninterhospital2023@gmail.com
SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORIA	ING. GINA TATIANA ELAICA NIETO	APOYO A LA SUPERVISION:	DAVID ASHBEL FLOREZ SIERRA
CORREO ELECTRONICO INTERVENTORIA:	coninterhospital2023@gmail.com	CONTRATO DE APOYO A LA SUPERVISION N°	765 DE 2023
FECHA DE INICIACIÓN:	12/12/2023	FECHA PRESENTE ACTA:	15/11/2024

N° ITEM	CONDICIONES INICIALES					CONDICIONES ACTUALIZADAS Acta de Modificación No. 2 de fecha 12/09/2024		OBRA EJECUTADA						
								ACTAS ANTERIORES		PRESENTE ACTA		ACUMULADO		
	DESCRIPCION	UND	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	%
3,4,2,14	ACCESORIO PVCP 4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	16,00	$ 151.293,00	$ 2.420.688,00	16,00	$ 2.420.688,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
3,4,2,15	ABRAZADERA 1/2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	112,65	$ 9.320,00	$ 1.049.929,00	112,65	$ 1.049.929,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
3,4,2,16	ABRAZADERA 1 1/4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	159,13	$ 10.887,00	$ 1.732.448,00	159,13	$ 1.732.448,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
3,4,2,17	ABRAZADERA 1 1/2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	46,63	$ 11.110,00	$ 518.059,00	46,63	$ 518.059,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
3,4,2,18	ABRAZADERA 2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	87,60	$ 12.297,00	$ 1.077.217,00	87,60	$ 1.077.217,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
3,4,2,19	ABRAZADERA 2 1/2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	12,86	$ 12.878,00	$ 165.568,00	12,86	$ 165.568,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
3,4,2,20	ABRAZADERA 1" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	18,79	$ 10.902,00	$ 204.812,00	18,79	$ 204.812,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
3,4,2,21	ABRAZADERA 4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	15,78	$ 16.240,00	$ 256.321,00	15,78	$ 256.321,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
3,4,2,22	VALVULA DE BOLA 1 1/4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	68,00	$ 112.372,00	$ 7.641.296,00	68,00	$ 7.641.296,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
3,4,2,23	VALVULA DE BOLA 1 1/2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	15,00	$ 168.502,00	$ 2.527.530,00	15,00	$ 2.527.530,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
3,4,2,24	VALVULA DE BOLA 2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	3,00	$ 273.196,00	$ 819.588,00	3,00	$ 819.588,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
3,4,2,25	VALVULA DE BOLA 1/2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	5,00	$ 35.764,00	$ 178.820,00	5,00	$ 178.820,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
3,4,2,26	PUNTO HIDRÁULICO PVCP PARAL DESDE PISO PROMEDIO 1/2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	192,00	$ 62.785,00	$ 12.054.720,00	192,00	$ 12.054.720,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
3,4,2,27	PUNTO HIDRÁULICO PVCP PARAL DESDE PISO PROMEDIO 1-1/4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	111,00	$ 103.996,00	$ 11.543.556,00	111,00	$ 11.543.556,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
3,4,2,28	INSTALACION DE EQUIPO DE PRESIÓN CONSTANTE DE TRES (3) BOMBAS EN PARALELO DE 10 HP PARA UN CAUDAL DE BOMBEO CADA UNO DE 4.96 L/S Y UNA ALTURA DINAMICA TOTAL DE 65.43 M.C.A, INCLUYE 1 TANQUE PULMON DE 300 L	UN	1,00	$ 4.935.894,00	$ 4.935.894,00	1,00	$ 4.935.894,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
3,4,2,29	VALVULA DE BOLA 1" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	2,00	$ 76.847,00	$ 153.694,00	2,00	$ 153.694,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
3,4,2,30	VALVULA DE PURGA 2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	1,00	$ 1.321.401,00	$ 1.321.401,00	1,00	$ 1.321.401,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
3,4,2,31	TUBERIA PVCP RDE 11 3/4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	777,49	$ 17.231,00	$ 13.396.930,00	777,49	$ 13.396.930,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
3,4,2,32	ACCESORIO PVCP 3/4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	304,00	$ 4.082,00	$ 1.240.928,00	304,00	$ 1.240.928,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
	SUBTOTAL				**$ 124.266.626,00**		**$ 124.266.626,00**		**$ -**		**$ -**		**$ -**	
3,4,3	**MONTAJE APARATOS**													
3,4,3,1	MONTAJE SANITARIO DE FLUXOMETRO	UN	100,00	$ 88.629,00	$ 8.862.900,00	100,00	$ 8.862.900,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
3,4,3,2	MONTAJE DE DUCHA	UN	12,00	$ 56.069,00	$ 672.828,00	12,00	$ 672.828,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
3,4,3,3	MONTAJE LAVAMANOS	UN	137,00	$ 60.452,00	$ 8.281.924,00	137,00	$ 8.281.924,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
3,4,3,4	MONTAJE LAVAPLATOS	UN	20,00	$ 52.319,00	$ 1.046.380,00	20,00	$ 1.046.380,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
3,4,3,5	MONTAJE ORINAL	UN	11,00	$ 63.269,00	$ 695.959,00	11,00	$ 695.959,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
3,4,3,6	LLAVE MANGUERA 1/2" SUMINISTRO E INSTALACION	UN	23,00	$ 39.480,00	$ 908.040,00	23,00	$ 908.040,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
	SUBTOTAL				**$ 20.468.031,00**		**$ 20.468.031,00**		**$ -**		**$ -**		**$ -**	
3,5	**RED SANITARIA**													
3,5,1	**REDES DE AGUA RESIDUAL INTERNA**													
3,5,1,1	TUBERIA PVCS 2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	ML	587,03	$ 27.626,00	$ 16.217.291,00	587,03	$ 16.217.291,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
3,5,1,2	TUBERIA PVCS 3" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	ML	100,08	$ 40.701,00	$ 4.073.356,00	100,08	$ 4.073.356,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
3,5,1,3	TUBERIA PVCS 4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	ML	717,53	$ 61.741,00	$ 44.301.020,00	717,53	$ 44.301.020,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
3,5,1,4	TUBERÍA PVCS 6" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	ML	38,88	$ 102.245,00	$ 3.975.286,00	38,88	$ 3.975.286,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
3,5,1,5	ACCESORIO PVCS 2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	567,50	$ 12.960,00	$ 7.354.800,00	567,50	$ 7.354.800,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
3,5,1,6	ACCESORIO PVCS 3" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	63,00	$ 23.210,00	$ 1.462.230,00	63,00	$ 1.462.230,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
3,5,1,7	ACCESORIO PVCS 4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	512,50	$ 39.832,00	$ 20.413.900,00	512,50	$ 20.413.900,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
3,5,1,8	ACCESORIO PVCS 6" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	40,00	$ 179.568,00	$ 7.182.720,00	40,00	$ 7.182.720,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
3,5,1,9	ABRAZADERA 2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	195,68	$ 12.297,00	$ 2.406.236,00	195,68	$ 2.406.236,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
3,5,1,10	ABRAZADERA 3" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	33,36	$ 13.412,00	$ 447.424,00	33,36	$ 447.424,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
3,5,1,11	ABRAZADERA 4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	239,18	$ 16.240,00	$ 3.884.229,00	239,18	$ 3.884.229,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
3,5,1,12	ABRAZADERA 6" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	12,96	$ 18.979,00	$ 245.968,00	12,96	$ 245.968,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
	SUBTOTAL				**$ 111.964.460,00**		**$ 111.964.460,00**		**$ -**		**$ -**		**$ -**	
3,5,2	**SALIDAS SANITARIAS**													

CONTRATO N°	511 de 2023	PROYECTO N°	2021005500331
ACTA DE PAGO PARCIAL N°	3	PERIODO ACTA DE PAGO PARCIAL:	28/9/2024 a 31/10/2024
OBJETO CONTRATO:	AMPLIACIÓN DE LA CAPACIDAD INSTALADA DEL HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE VILLAVICENCIO ESE - META	OBJETO PROYECTO:	AMPLIACIÓN DE LA CAPACIDAD INSTALADA DEL HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE VILLAVICENCIO ESE - META
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	$ 80.389.497.271,00	VALOR TOTAL DEL PROYECTO:	$ 84.208.944.899,00
CONTRATISTA:	CONSORCIO HOSPITAL 002	CONTRATO DE INTERVENTORIA N°	572 DE 2023
NIT:	901.752.517-0	INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTER HOSPITAL
CORREO ELECTRONICO CONTRATISTA:	coordinador.hospital@cyg.com.co	CORREO ELECTRONICO INTERVENTORIA:	coninterhospital2023@gmail.com
SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORIA	ING. GINA TATIANA ELAICA NIETO	APOYO A LA SUPERVISION:	DAVID ASHBEL FLOREZ SIERRA
CORREO ELECTRONICO INTERVENTORIA:	coninterhospital2023@gmail.com	CONTRATO DE APOYO A LA SUPERVISION N°	765 DE 2023
FECHA DE INICIACIÓN:	12/12/2023	FECHA PRESENTE ACTA:	15/11/2024

N° ITEM	CONDICIONES INICIALES					CONDICIONES ACTUALIZADAS Acta de Modificación No. 2 de fecha 12/09/2024		OBRA EJECUTADA						
								ACTAS ANTERIORES		PRESENTE ACTA		ACUMULADO		
	DESCRIPCION	UND	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	%
3,5,2,1	SALIDA SANITARIA LAVAMANOS 2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	137,00	$ 95.919,00	$ 13.140.903,00	137,00	$ 13.140.903,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
3,5,2,2	SALIDA SANITARIA DUCHA 2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	12,00	$ 74.556,00	$ 894.672,00	12,00	$ 894.672,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
3,5,2,3	SALIDA SANITARIA SIFON DE PISO 2"	UN	114,00	$ 75.884,00	$ 8.650.776,00	114,00	$ 8.650.776,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
3,5,2,4	SALIDA SANITARIA LAVAPLATOS 2"	UN	20,00	$ 82.860,00	$ 1.657.200,00	20,00	$ 1.657.200,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
3,5,2,5	SALIDA SANITARIA SANITARIO 4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	100,00	$ 92.146,00	$ 9.214.600,00	100,00	$ 9.214.600,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
3,5,2,6	SALIDA SANITARIA ORINAL 2"	UN	11,00	$ 91.964,00	$ 1.011.604,00	11,00	$ 1.011.604,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
	SUBTOTAL				**$ 34.569.755,00**		**$ 34.569.755,00**		**$ -**		**$ -**		**$ -**	
3,6	**RED EXTERIOR AGUA RESIDUALES**													
3,6,1	TUBERIA PVCS 6" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	ML	153,16	$ 102.245,00	$ 15.659.844,00	153,16	$ 15.659.844,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
3,6,2	TUBERIA PVCS 8" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	ML	34,36	$ 182.649,00	$ 6.275.820,00	34,36	$ 6.275.820,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
3,6,3	CAJA DE INSPECCIÓN DE 0.70 X 0.70 X 0.70 M EN CONCRETO 3000 PSI ELABORADA EN SITIO. INCLUYE TAPA EN CONCRETO REFORZADO Y MARCO EN ÁNGULO METÁLICO. SUMINISTRO Y ELABORACIÓN.	UN	5,00	$ 723.170,00	$ 3.615.850,00	5,00	$ 3.615.850,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
3,6,4	CAJA DE INSPECCIÓN DE 1.0 X 1.0 X 1.0 M EN CONCRETO 3000 PSI ELABORADA EN SITIO. INCLUYE TAPA EN CONCRETO REFORZADO Y MARCO EN ÁNGULO METÁLICO. SUMINISTRO Y ELABORACIÓN.	UN	4,00	$ 1.059.054,00	$ 4.236.216,00	4,00	$ 4.236.216,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
3,6,5	PLACA CUBIERTA - POZO INSPECCIÓN D=1.20M (CONCRETO UN F'C=28MPA REFORZ. ELAB. OBRA, E=0.20M, INC. TAPA H.D PARA TRAF_PESADO) SEGÚN LA NORMA EN124	UN	1,00	$ 2.242.958,00	$ 2.242.958,00	1,00	$ 2.242.958,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
3,6,6	CAÑUELA POZO DE INSPECCIÓN PARA TUBERÍAS ENTRE 8" Y 14" (CONCRETO F'C = 28MPA ELAB. EN OBRA)	UN	1,00	$ 27.373,00	$ 27.373,00	1,00	$ 27.373,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
3,6,7	CILINDRO POZO INSPECCIÓN D=1.20M (CONCRETO IMPERMEAB. F'C =28MPA ELAB. EN OBRA, E=0.20M, INCLUYE ESCALERA GATO VAR.#6)	ML	1,00	$ 1.100.865,00	$ 1.100.865,00	1,00	$ 1.100.865,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
3,6,8	PLACA CIRCULAR BASE - POZO INSPECCIÓN D=1.20M (CONCRETO F'C = 28MPA REFORZ. ELAB. EN OBRA, E=0.20M)	UN	1,00	$ 1.074.692,00	$ 1.074.692,00	1,00	$ 1.074.692,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
3,6,9	SUMINISTRO E INSTALACION DE SEPARADOR DE GRASAS EN POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (PEAD/HDPE), RECTANGULAR, DE 1000 LITROS, DE 1235X720X1250 mm	UN	1,00	$ 3.250.084,00	$ 3.250.084,00	1,00	$ 3.250.084,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
	SUBTOTAL				**$ 37.483.702,00**		**$ 37.483.702,00**		**$ -**		**$ -**		**$ -**	
3,6,1	**VENTILACION**													
3,6,1,1	TUBERÍA PVCL 2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	ML	107,94	$ 20.621,00	$ 2.225.831,00	107,94	$ 2.225.831,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
3,6,1,2	TUBERÍA PVCL 3" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	ML	371,87	$ 27.973,00	$ 10.402.320,00	371,87	$ 10.402.320,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
3,6,1,3	TUBERIA PVCL 4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	ML	99,60	$ 44.301,00	$ 4.412.380,00	99,60	$ 4.412.380,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
3,6,1,4	ACCESORIO PVCS 2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	165,00	$ 12.960,00	$ 2.138.400,00	165,00	$ 2.138.400,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
3,6,1,5	ACCESORIO PVCS 3" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	146,00	$ 23.210,00	$ 3.388.660,00	146,00	$ 3.388.660,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
3,6,1,6	ACCESORIO PVCS 4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	30,00	$ 39.832,00	$ 1.194.960,00	30,00	$ 1.194.960,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
3,6,1,7	ABRAZADERA 2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	35,98	$ 12.297,00	$ 442.446,00	35,98	$ 442.446,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
3,6,1,8	ABRAZADERA 3" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	123,96	$ 13.412,00	$ 1.662.507,00	123,96	$ 1.662.507,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
3,6,1,9	ABRAZADERA 4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	33,20	$ 16.240,00	$ 539.168,00	33,20	$ 539.168,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
	SUBTOTAL				**$ 26.406.672,00**		**$ 26.406.672,00**		**$ -**		**$ -**		**$ -**	
3,7	**RED AGUA LLUVIA**													
3,7,1	**RED DE AGUA LLUVIA INTERNA**													
3,7,1,1	TUBERIA PVCS 4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	ML	400,83	$ 61.741,00	$ 24.747.645,00	400,83	$ 24.747.645,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
3,7,1,2	TUBERIA PVCS 6" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	ML	102,45	$ 102.245,00	$ 10.475.000,00	102,45	$ 10.475.000,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
3,7,1,3	TUBERIA PVCS 8" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	ML	19,88	$ 182.649,00	$ 3.631.062,00	19,88	$ 3.631.062,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
3,7,1,4	ACCESORIO PVCS 4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	57,00	$ 39.832,00	$ 2.270.424,00	57,00	$ 2.270.424,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
3,7,1,5	ACCESORIO PVCS 6" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	8,00	$ 179.568,00	$ 1.436.544,00	8,00	$ 1.436.544,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
3,7,1,6	ACCESORIO PVCS 8" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	3,00	$ 245.029,00	$ 735.087,00	3,00	$ 735.087,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
3,7,1,7	ABRAZADERA 4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	118,98	$ 16.240,00	$ 1.932.289,00	118,98	$ 1.932.289,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
3,7,1,8	ABRAZADERA 6" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	43,10	$ 18.979,00	$ 817.932,00	43,10	$ 817.932,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
3,7,1,9	ABRAZADERA 8" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	6,63	$ 19.922,00	$ 132.016,00	6,63	$ 132.016,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-

CONTRATO N°	511 de 2023	PROYECTO N°	2021005500331
ACTA DE PAGO PARCIAL N°	3	PERIODO ACTA DE PAGO PARCIAL:	28/9/2024 a 31/10/2024
OBJETO CONTRATO:	AMPLIACIÓN DE LA CAPACIDAD INSTALADA DEL HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE VILLAVICENCIO ESE - META	OBJETO PROYECTO:	AMPLIACIÓN DE LA CAPACIDAD INSTALADA DEL HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE VILLAVICENCIO ESE - META
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	$ 80.389.497.271,00	VALOR TOTAL DEL PROYECTO:	$ 84.208.944.899,00
CONTRATISTA:	CONSORCIO HOSPITAL 002	CONTRATO DE INTERVENTORIA N°	572 DE 2023
NIT:	901.752.517-0	INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTER HOSPITAL
CORREO ELECTRONICO CONTRATISTA:	coordinador.hospital@cvg.com.co	CORREO ELECTRONICO INTERVENTORIA:	coninterhospital2023@gmail.com
SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORIA	ING. GINA TATIANA ELAICA NIETO	APOYO A LA SUPERVISION:	DAVID ASHBEL FLOREZ SIERRA
CORREO ELECTRONICO INTERVENTORIA:	coninterhospital2023@gmail.com	CONTRATO DE APOYO A LA SUPERVISION N°	765 DE 2023
FECHA DE INICIACIÓN:	12/12/2023	FECHA PRESENTE ACTA:	15/11/2024

N° ITEM	CONDICIONES INICIALES					CONDICIONES ACTUALIZADAS Acta de Modificación No. 2 de fecha 12/09/2024		OBRA EJECUTADA						
								ACTAS ANTERIORES		PRESENTE ACTA		ACUMULADO		
	DESCRIPCION	UND	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	%
3,7,1,10	JUNTA DE EXPANSION PVC 6" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	6,00	$ 144.531,00	$ 867.186,00	6,00	$ 867.186,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
3,7,1,11	CANAL EN LAMINA GALVANIZADA CAL. 22 ANCHO DE 200 MM SUMINISTRO E INSTALACIÓN	ML	40,00	$ 82.384,00	$ 3.295.360,00	40,00	$ 3.295.360,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
3,7,1,12	SUMIDERO LONGITUDINAL DE MAMPOSTERIA, DE 500 MM DE ANCHO Y 400 MM DE ALTO, CON REJILLA DE ENTRAMADO DE ACERO GALVANIZADO	ML	99,99	$ 859.869,00	$ 85.978.301,00	99,99	$ 85.978.301,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
3,7,1,13	TUBERIA FILTRO PERFORADA 100MM (4")	ML	195,68	$ 61.843,00	$ 12.101.438,00	195,68	$ 12.101.438,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
3,7,1,14	TUBERIA FILTRO PERFORADA 100MM (2 1/2") SUMINISTRO E INSTALACION	ML	231,00	$ 33.845,00	$ 7.818.195,00	231,00	$ 7.818.195,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
3,7,1,15	CAJA DE INSPECCIÓN DE 0.80 X 0.80 X 0.80 M EN CONCRETO 3000 PSI ELABORADA EN SITIO. INCLUYE TAPA EN CONCRETO REFORZADO Y MARCO EN ÁNGULO METÁLICO. SUMINISTRO Y ELABORACIÓN.	UN	11,00	$ 828.296,00	$ 9.111.256,00	11,00	$ 9.111.256,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
3,7,1,16	INSTALACION DE MOTOBOMBA SUMERGIBLE IHM WQK48-30-7,5 10 HP 220V O SIMILAR, INCLUYE ARRANCADOR Y SWITCH FLOTADOR	UN	1,00	$ 6.029.067,00	$ 6.029.067,00	1,00	$ 6.029.067,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
3,7,1,17	INSTALACION DE MOTOBOMBA SUMERGIBLE IHM WQK30-20-3,7 5HP 220V O SIMILAR, INCLUYE ARRANCADOR Y SWITCH FLOTADOR	UN	1,00	$ 5.173.592,00	$ 5.173.592,00	1,00	$ 5.173.592,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
3,7,1,18	CANAL LAMINA COLD ROLLED CAL.20 CON ANTICORROSIVO Y PINTURA ANCHO 30 CMS SUMINISTRO E INSTALACION	ML	20,00	$ 94.991,00	$ 1.899.820,00	20,00	$ 1.899.820,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
	SUBTOTAL				**$ 178.452.214,00**		**$ 178.452.214,00**		**$ -**		**$ -**		**$ -**	
3,7,2	**SALIDAS AGUA LLUVIAS**													
3,7,2,1	SIFON 180° PVCS 4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	31,00	$ 12.049,00	$ 373.519,00	31,00	$ 373.519,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
	SUBTOTAL				**$ 373.519,00**		**$ 373.519,00**		**$ -**		**$ -**		**$ -**	
3,8	**RED AGUA LLUVIA REDES EXTERNA**													
3,8,1	TUBERIA PVCS 6" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	ML	17,73	$ 102.245,00	$ 1.812.804,00	17,73	$ 1.812.804,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
3,8,2	TUBERIA PVCS 8" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	ML	19,04	$ 182.649,00	$ 3.477.637,00	19,04	$ 3.477.637,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
3,8,3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA CORRUGADA PVC ALCANTARILLADO DE 250MM Ø10" TIPO NOVAFORT O EQUIVALENTE	ML	95,22	$ 166.807,00	$ 15.883.363,00	95,22	$ 15.883.363,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
3,8,4	CAJA DE INSPECCIÓN DE 0.8 X 0.8 X 0.8 M EN CONCRETO 3000 PSI ELABORADA EN SITIO. INCLUYE TAPA EN CONCRETO REFORZADO Y MARCO EN ÁNGULO METÁLICO. SUMINISTRO Y ELABORACIÓN.	UN	4,00	$ 828.296,00	$ 3.313.184,00	4,00	$ 3.313.184,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
3,8,5	PLACA CUBIERTA - POZO INSPECCIÓN D=1.20M (CONCRETO UN F'C=28MPA REFORZ. ELAB. OBRA, E=0.20M, INC. TAPA H.D PARA TRAF_PESADO) SEGÚN LA NORMA EN124	UN	1,00	$ 2.562.151,00	$ 2.562.151,00	1,00	$ 2.562.151,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
3,8,6	CAÑUELA POZO DE INSPECCIÓN PARA TUBERÍAS ENTRE 8" Y 14" (CONCRETO F'C = 28MPA ELAB. EN OBRA)	UN	1,00	$ 278.168,00	$ 278.168,00	1,00	$ 278.168,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
3,8,7	CILINDRO POZO INSPECCIÓN D=1.20M (CONCRETO IMPERMEAB. F'C =28MPA ELAB. EN OBRA, E=0.20M, INCLUYE ESCALERA GATO VAR.#6)	ML	1,20	$ 1.144.392,00	$ 1.373.270,00	1,20	$ 1.373.270,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
3,8,8	PLACA CIRCULAR BASE - POZO INSPECCIÓN D=1.20M (CONCRETO F'C = 28MPA REFORZ. ELAB. EN OBRA, E=0.20M)	UN	1,00	$ 1.074.692,00	$ 1.074.692,00	1,00	$ 1.074.692,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
	SUBTOTAL				**$ 29.775.269,00**		**$ 29.775.269,00**		**$ -**		**$ -**		**$ -**	
3,9	**REDES CONTRA INCENDIOS**													
3,9,1	**REDES CONTRA INCENDIO INTERNAS**													
3,9,1,1	TUBERIA AC SCH 40 1" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	ML	2.055,93	$ 34.916,00	$ 71.784.852,00	2.055,93	$ 71.784.852,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
3,9,1,2	TUBERIA AC SCH 10 1 1/4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	ML	244,33	$ 45.541,00	$ 11.127.033,00	244,33	$ 11.127.033,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
3,9,1,3	TUBERIA AC SCH 10 1 1/2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	ML	221,92	$ 47.744,00	$ 10.595.348,00	221,92	$ 10.595.348,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
3,9,1,4	TUBERIA AC SCH 10 2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	ML	950,74	$ 58.171,00	$ 55.305.497,00	950,74	$ 55.305.497,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
3,9,1,5	TUBERIA AC SCH 10 2 1/2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	ML	448,57	$ 83.940,00	$ 37.652.966,00	448,57	$ 37.652.966,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
3,9,1,6	TUBERIA AC SCH 10 3" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	ML	694,38	$ 96.174,00	$ 66.781.302,00	694,38	$ 66.781.302,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
3,9,1,7	TUBERIA AC SCH 10 4"	ML	413,38	$ 119.614,00	$ 49.446.035,00	413,38	$ 49.446.035,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
3,9,1,8	ACCESORIO AG 1" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	706,00	$ 8.772,00	$ 6.193.032,00	706,00	$ 6.193.032,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
3,9,1,9	ACCESORIO ACERO RANURADO 1-1/4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	106,00	$ 13.283,00	$ 1.407.998,00	106,00	$ 1.407.998,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
3,9,1,10	ACCESORIO ACERO RANURADO 1 1/2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	71,00	$ 19.693,00	$ 1.398.203,00	71,00	$ 1.398.203,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
3,9,1,11	ACCESORIO ACERO RANURADO 2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	28,00	$ 27.407,00	$ 767.396,00	28,00	$ 767.396,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
3,9,1,12	ACCESORIO ACERO RANURADO 2 1/2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	121,00	$ 37.116,00	$ 4.491.036,00	121,00	$ 4.491.036,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-

18607

CONTRATO N°	511 de 2023	PROYECTO N°	2021005500331
ACTA DE PAGO PARCIAL N°	3	PERIODO ACTA DE PAGO PARCIAL:	28/9/2024 a 31/10/2024
OBJETO CONTRATO:	AMPLIACIÓN DE LA CAPACIDAD INSTALADA DEL HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE VILLAVICENCIO ESE - META	OBJETO PROYECTO:	AMPLIACIÓN DE LA CAPACIDAD INSTALADA DEL HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE VILLAVICENCIO ESE - META
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	$ 80.389.497.271,00	VALOR TOTAL DEL PROYECTO:	$ 84.208.944.899,00
CONTRATISTA:	CONSORCIO HOSPITAL 002	CONTRATO DE INTERVENTORIA N°	572 DE 2023
NIT:	901.752.517-0	INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTER HOSPITAL
CORREO ELECTRONICO CONTRATISTA:	coordinador.hospital@cyg.com.co	CORREO ELECTRONICO INTERVENTORIA:	coninterhospital2023@gmail.com
SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORIA	ING. GINA TATIANA ELAICA NIETO	APOYO A LA SUPERVISION:	DAVID ASHBEL FLOREZ SIERRA
CORREO ELECTRONICO INTERVENTORIA:	coninterhospital2023@gmail.com	CONTRATO DE APOYO A LA SUPERVISION N°	765 DE 2023
FECHA DE INICIACIÓN:	12/12/2023	FECHA PRESENTE ACTA:	15/11/2024

N° ITEM	CONDICIONES INICIALES					CONDICIONES ACTUALIZADAS Acta de Modificación No. 2 de fecha 12/09/2024		OBRA EJECUTADA						
								ACTAS ANTERIORES		PRESENTE ACTA		ACUMULADO		
	DESCRIPCION	UND	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	%
3,9,1,13	ACCESORIO ACERO RANURADO 3" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	154,00	$ 47.223,00	$ 7.272.342,00	154,00	$ 7.272.342,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
3,9,1,14	ACCESORIO ACERO RANURADO 4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	79,00	$ 67.343,00	$ 5.320.097,00	79,00	$ 5.320.097,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
3,9,1,15	COUPLING PARA UNION RANURADA 1 1/4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	212,00	$ 16.272,00	$ 3.449.664,00	212,00	$ 3.449.664,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
3,9,1,16	COUPLING PARA UNION RANURADA 1 1/2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	142,00	$ 15.788,00	$ 2.241.896,00	142,00	$ 2.241.896,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
3,9,1,17	COUPLING PARA UNION RANURADA 2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	56,00	$ 18.212,00	$ 1.019.872,00	56,00	$ 1.019.872,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
3,9,1,18	COUPLING PARA UNION RANURADA 2 1/2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	242,00	$ 24.911,00	$ 6.028.462,00	242,00	$ 6.028.462,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
3,9,1,19	COUPLING PARA UNION RANURADA 3" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	308,00	$ 41.709,00	$ 12.846.372,00	308,00	$ 12.846.372,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
3,9,1,20	COUPLING PARA UNION RANURADA 4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	158,00	$ 31.099,00	$ 4.913.642,00	158,00	$ 4.913.642,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
3,9,1,21	STRAP 1 1/4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	76,00	$ 14.491,00	$ 1.101.316,00	76,00	$ 1.101.316,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
3,9,1,22	STRAP 1-1/2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	39,00	$ 15.873,00	$ 619.047,00	39,00	$ 619.047,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
3,9,1,23	STRAP 2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	558,00	$ 17.299,00	$ 9.652.842,00	558,00	$ 9.652.842,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
3,9,1,24	STRAP 2 1/2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	74,00	$ 22.288,00	$ 1.649.312,00	74,00	$ 1.649.312,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
3,9,1,25	Tee MECANICA 2" X 1 1/4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	26,00	$ 37.357,00	$ 971.282,00	26,00	$ 971.282,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
3,9,1,26	Tee MECANICA 2" X 1 1/2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	6,00	$ 15.163,00	$ 90.978,00	6,00	$ 90.978,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
3,9,1,27	Tee MECANICA 2 1/2" X 1 1/4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	8,00	$ 24.222,00	$ 193.776,00	8,00	$ 193.776,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
3,9,1,28	Tee MECANICA 2 1/2" X 1 1/2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	12,00	$ 38.331,00	$ 459.972,00	12,00	$ 459.972,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
3,9,1,29	Tee MECANICA 3" X 1 1/4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	7,00	$ 32.107,00	$ 224.749,00	7,00	$ 224.749,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
3,9,1,30	Tee MECANICA 3" X 1 1/2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	14,00	$ 50.570,00	$ 707.980,00	14,00	$ 707.980,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
3,9,1,31	REDUCCION CONCENTRICA 1 1/2" X 1 1/4" S SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	12,00	$ 16.526,00	$ 198.312,00	12,00	$ 198.312,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
3,9,1,32	REDUCCION CONCENTRICA 2" X 1 1/4" SUMINISTRO E INSTALACION	UN	8,00	$ 22.392,00	$ 179.136,00	8,00	$ 179.136,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
3,9,1,33	REDUCCION CONCENTRICA 2 1/2" X 1 1/2" S SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	14,00	$ 23.055,00	$ 322.770,00	14,00	$ 322.770,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
3,9,1,34	REDUCCION CONCENTRICA 2 1/2" X 2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	9,00	$ 30.014,00	$ 270.126,00	9,00	$ 270.126,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
3,9,1,35	REDUCCION CONCENTRICA 3" X 2 1/2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	13,00	$ 30.983,00	$ 402.779,00	13,00	$ 402.779,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
3,9,1,36	REDUCCION CONCENTRICA 4" X 3" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	8,00	$ 116.156,00	$ 929.248,00	8,00	$ 929.248,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
3,9,1,37	PINTURA ESMALTE TUBERIA 1/2" - 1" SUMINISTRO Y APLICACIÓN	ML	2.055,93	$ 3.049,00	$ 6.268.531,00	2.055,93	$ 6.268.531,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
3,9,1,38	PINTURA ESMALTE TUBERIA 1 1/4" - 2" SUMINISTRO Y APLICACIÓN	ML	1.416,99	$ 5.000,00	$ 7.084.950,00	1.416,99	$ 7.084.950,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
3,9,1,39	PINTURA ESMALTE TUBERIA 2 1/2" - 4" SUMINISTRO Y APLICACIÓN	ML	2.427,47	$ 7.341,00	$ 17.820.057,00	2.427,47	$ 17.820.057,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
3,9,1,40	GABINETE CONTRA INCENDIO TIPO II SUMINISTRO E INSTALACIÓN (INCLUYE ADITAMENTOS)	UN	20,00	$ 2.924.608,00	$ 58.492.160,00	20,00	$ 58.492.160,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
3,9,1,41	ESTACION DE CONTROL SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	10,00	$ 4.553.650,00	$ 45.536.500,00	10,00	$ 45.536.500,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
3,9,1,42	SOPORTE SISMO RESISTENTE 4" LONGITUDINAL Y TRANSVERSAL, SUMINISTRO E INSTALACION	UN	128,00	$ 215.427,00	$ 27.574.656,00	128,00	$ 27.574.656,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
3,9,1,43	SOPORTE SISMO RESISTENTE CUATRO VIAS 4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	21,00	$ 193.273,00	$ 4.058.733,00	21,00	$ 4.058.733,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
3,9,1,44	PUNTO ROCIADOR 1" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	1.229,00	$ 68.857,00	$ 84.625.253,00	1.229,00	$ 84.625.253,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
3,9,1,45	ROCIADOR PENDENT BRONCE K 5.6 D=1/2" CON ESCUDO SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	645,00	$ 59.362,00	$ 38.288.490,00	645,00	$ 38.288.490,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
3,9,1,46	ROCIADOR UP RIGHT K 5.6 1/2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	584,00	$ 43.275,00	$ 25.272.600,00	584,00	$ 25.272.600,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
3,9,1,47	ABRAZADERA 1" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	480,52	$ 10.902,00	$ 5.238.665,00	480,52	$ 5.238.665,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
3,9,1,48	ABRAZADERA 1 1/4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	122,74	$ 10.887,00	$ 1.336.307,00	122,74	$ 1.336.307,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
3,9,1,49	ABRAZADERA 1 1/2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	80,28	$ 11.110,00	$ 891.911,00	80,28	$ 891.911,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
3,9,1,50	ABRAZADERA 2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	285,89	$ 12.297,00	$ 3.515.548,00	285,89	$ 3.515.548,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
3,9,1,51	ABRAZADERA 2 1/2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	204,75	$ 12.878,00	$ 2.636.813,00	204,75	$ 2.636.813,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
3,9,1,52	ABRAZADERA 3" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	219,52	$ 13.412,00	$ 2.944.247,00	219,52	$ 2.944.247,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
3,9,1,53	ABRAZADERA 4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	103,87	$ 16.240,00	$ 1.686.795,00	103,87	$ 1.686.795,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
3,9,1,54	VALVULA CHEQUE RANURADA 4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	2,00	$ 552.776,00	$ 1.105.552,00	2,00	$ 1.105.552,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
3,9,1,55	SUMINISTRO E INSTALACION SIAMESA DE 4 X 2 1/2" X 2 1/2"	UN	2,00	$ 1.092.932,00	$ 2.185.864,00	2,00	$ 2.185.864,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
3,9,1,56	VALVULA ANGULAR 2 1/2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	20,00	$ 566.786,00	$ 11.335.720,00	20,00	$ 11.335.720,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-

18608

CONTRATO N°	511 de 2023	PROYECTO N°	2021005500331
ACTA DE PAGO PARCIAL N°	3	PERIODO ACTA DE PAGO PARCIAL:	28/9/2024 a 31/10/2024
OBJETO CONTRATO:	AMPLIACIÓN DE LA CAPACIDAD INSTALADA DEL HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE VILLAVICENCIO ESE - META	OBJETO PROYECTO:	AMPLIACIÓN DE LA CAPACIDAD INSTALADA DEL HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE VILLAVICENCIO ESE - META
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	$ 80.389.497.271,00	VALOR TOTAL DEL PROYECTO:	$ 84.208.944.899,00
CONTRATISTA:	CONSORCIO HOSPITAL 002	CONTRATO DE INTERVENTORIA N°	572 DE 2023
NIT:	901.752.517-0	INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTER HOSPITAL
CORREO ELECTRONICO CONTRATISTA:	coordinador.hospital@cyg.com.co	CORREO ELECTRONICO INTERVENTORIA:	coninterhospital2023@gmail.com
SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORIA	ING. GINA TATIANA ELAICA NIETO	APOYO A LA SUPERVISION:	DAVID ASHBEL FLOREZ SIERRA
CORREO ELECTRONICO INTERVENTORIA:	coninterhospital2023@gmail.com	CONTRATO DE APOYO A LA SUPERVISION N°	765 DE 2023
FECHA DE INICIACIÓN:	12/12/2023	FECHA PRESENTE ACTA:	15/11/2024

N° ITEM	CONDICIONES INICIALES					CONDICIONES ACTUALIZADAS Acta de Modificación No. 2 de fecha 12/09/2024		OBRA EJECUTADA						
								ACTAS ANTERIORES		PRESENTE ACTA		ACUMULADO		
	DESCRIPCION	UND	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	%
3,9,1,57	INSTALACION EQUIPO CONTRA INCENDIO LISTADO ELECTRICO SCF-150-125-250 200 HP 406 V, COMPUESTO POR BOMBA ELECTRICA DE 1000 GPM-PRESION NOMINAL 187 PSI, MOTOR ELECTRICO DE 200 HP, ULTABLERO CONTROLADOR BOMBA ELECTRICA , MOTOBOMBA JOCKEY 16,5 GPM-PRESION NOMINAL 197 PSI-POTENCIA 5HP-VOLTAJE 440 V/3 FASES, TABLERO CONTROLADOR BOMBA JOCKEY-POTENCIA 5 HP-VOLTAJE 460 V, ACCESORIOS INCLUIDOS: MANOMETRO Y VACUOMETRO DE CARATULA DE 3 1/2" PARA DESCARGA Y SUCCION, VALVULA DESAIREADORA, VALVULA DE ALIVIO,MEDIDOR DE FLUJO DE 6", CABEZAL DE PRUEBAS DE 6" CON 4 SET DE VALVULAS DE 2 1/2", INCREMENTADOR CONCENTRICO EN LA DESCARGA 952-D-5*6-104 / DN125-150, REDUCTOR EXCENTRICO EN LA SUCCION 952-S-8*6-104/DN200-150	UN	1,00	$ 6.110.541,00	$ 6.110.541,00	1,00	$ 6.110.541,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
3,9,1,58	TUBERIA AC SCH 10 6" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	ML	99,45	$ 179.466,00	$ 17.847.894,00	99,45	$ 17.847.894,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
3,9,1,59	ACCESORIO ACERO RANURADO 6" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	12,00	$ 119.889,00	$ 1.438.668,00	12,00	$ 1.438.668,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
	SUBTOTAL				**$ 751.313.125,00**		**$ 751.313.125,00**		**$ -**		**$ -**		**$ -**	
3,9,2	**SEGURIDAD HUMANA**													
3,9,2,1	SUMINISTRO E INSTALACION DE SIRENA CON LUZ DE ESTROBO EN EL TECHO	UN	21,00	$ 353.191,00	$ 7.417.011,00	21,00	$ 7.417.011,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
3,9,2,2	SUMINISTRO E INSTALACION DE DETECTOR DE HUMO DIRECCIONABLE FOTOELECTRICO	UN	140,00	$ 575.989,00	$ 80.638.460,00	140,00	$ 80.638.460,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
3,9,2,3	SUMINISTRO E INSTALACION DE AVISADOR MANUAL DIRECCIONABLE	UN	21,00	$ 401.202,00	$ 8.425.242,00	21,00	$ 8.425.242,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
3,9,2,4	TUBERIA PARA CANALIZACIÓN DE PROTECCIÓN DE CABLEADO, FORMADA POR TUBO DE PVC RÍGIDO, BLINDADO, ENCHUFABLE, DE COLOR NEGRO, DE 16 MM DE DIÁMETRO NOMINAL, CON IP547. INCLUYE ABRAZADERAS, ELEMENTOS DE SUJECIÓN Y ACCESORIOS (CURVAS, MANGUITOS, TES, CODOS Y CURVAS FLEXIBLES).	ML	1.324,18	$ 53.645,00	$ 71.035.636,00	1.324,18	$ 71.035.636,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
3,9,2,5	SUMINISTRO E INSTALACION DE PANEL DE CONTROL REF: NFS-320, MARCA: NOTIFIER o SIMILAR	UN	1,00	$ 13.378.867,00	$ 13.378.867,00	1,00	$ 13.378.867,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
3,9,2,6	SUMINISTRO E INSTALACION DE CAJA TIPO RAWELT 2400 5 SALIDAS Ø 3/4" REF: RC-0391, MARCA: RAWELT O SIMILAR	UN	63,00	$ 156.804,00	$ 9.878.652,00	63,00	$ 9.878.652,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
3,9,2,7	SUMINISTRO E INSTALACION DE TAPA CIEGA PARA CAJA 2400 REF: TC-0416, MARCA: RAWELT O SIMILAR	UN	63,00	$ 15.712,00	$ 989.856,00	63,00	$ 989.856,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
3,9,2,8	SUMINISTRO E INSTALACION DE SEÑALIZACION DE RUTAS DE EVACUACION Y SALIDAS DE EMERGENCIA	UN	121,00	$ 24.129,00	$ 2.919.609,00	121,00	$ 2.919.609,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
3,9,2,9	LUMINARIA DE EMERGENCIA, CON TUBO LINEAL FLUORESCENTE, 6 W - G5, FLUJO LUMINOSO 155 LÚMENES, CARCASA DE 245X110X58 MM, CLASE II, IP42, CON BATERÍAS DE NI-CD DE ALTA TEMPERATURA, AUTONOMÍA DE 1 H, ALIMENTACIÓN A 230 V, TIEMPO DE CARGA 24 H. INCLUSO ACCESORIOS Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN.ILUMINACION DE EMERGENCIA	UN	112,00	$ 691.856,00	$ 77.487.872,00	112,00	$ 77.487.872,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
	SUBTOTAL				**$ 272.171.205,00**		**$ 272.171.205,00**		**$ -**		**$ -**		**$ -**	
	SUBTOTAL COMPONENTE HIDRAULICO E HIDROLOGICO				**$ 1.630.926.891,00**		**$ 1.630.926.891,00**		**$ -**		**$ -**		**$ -**	
4	COMPONENTE ELECTRICO													
4,1	**DESMONTE Y REUBICACIÓN DE REDES**													
4,1,1	RETIRO DE LUMINARIA O REFLECTOR; INCLUYE ENTREGA EN PERIMETRO URBANO	UN	13,00	$ 59.654,00	$ 775.502,00	13,00	$ 775.502,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
4,1,2	RETIRO DE RED DE MEDIA TENSIÓN SUBTERRÁNEA (13,2 KV); INCLUYE ENTREGA PERÍMETRO URBANO	ML	29,60	$ 14.913,00	$ 441.425,00	29,60	$ 441.425,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
4,1,3	RETIRO DE RED DE BAJA TENSIÓN O ALUMBRADO PÚBLICO ABIERTA O TRENZADA; INCLUYE ENTREGA PERÍMETRO URBANO	ML	72,30	$ 7.457,00	$ 539.141,00	72,30	$ 539.141,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
4,1,4	RETIRO DE RED DE BAJA TENSIÓN O ALUMBRADO PÚBLICO SUBTERRÁNEA; INCLUYE ENTREGA PERÍMETRO URBANO	ML	80,00	$ 8.948,00	$ 715.840,00	80,00	$ 715.840,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
4,1,5	DESMONTE DE ESTRUCTURA RED DE MEDIA TENSIÓN; INCLUYE ENTREGA PERÍMETRO URBANO	UN	1,00	$ 119.307,00	$ 119.307,00	1,00	$ 119.307,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
4,1,6	DESMONTE DE ESTRUCTURA RED DE BAJA TENSIÓN O ALUMBRADO PÚBLICO; INCLUYE ENTREGA PERÍMETRO URBANO	UN	8,00	$ 89.481,00	$ 715.848,00	8,00	$ 715.848,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
4,1,7	DESMONTE DE TRANSFORMADOR TRIFÁSICO TIPO PEDESTAL DE 112,5 KVA; INCLUYE ENTREGA PERÍMETRO URBANO	UN	1,00	$ 794.376,00	$ 794.376,00	1,00	$ 794.376,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-

CONTRATO N°	511 de 2023	PROYECTO N°	2021005500331
ACTA DE PAGO PARCIAL N°	3	PERIODO ACTA DE PAGO PARCIAL:	28/9/2024 a 31/10/2024
OBJETO CONTRATO:	AMPLIACIÓN DE LA CAPACIDAD INSTALADA DEL HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE VILLAVICENCIO ESE - META	OBJETO PROYECTO:	AMPLIACIÓN DE LA CAPACIDAD INSTALADA DEL HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE VILLAVICENCIO ESE - META
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	$ 80.389.497.271,00	VALOR TOTAL DEL PROYECTO:	$ 84.208.944.899,00
CONTRATISTA:	CONSORCIO HOSPITAL 002	CONTRATO DE INTERVENTORIA N°	572 DE 2023
NIT:	901.752.517-0	INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTER HOSPITAL
CORREO ELECTRONICO CONTRATISTA:	coordinador.hospital@cvg.com.co	CORREO ELECTRONICO INTERVENTORIA:	coninterhospital2023@gmail.com
SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORIA	ING. GINA TATIANA ELAICA NIETO	APOYO A LA SUPERVISION:	DAVID ASHBEL FLOREZ SIERRA
CORREO ELECTRONICO INTERVENTORIA:	coninterhospital2023@gmail.com	CONTRATO DE APOYO A LA SUPERVISION N°	765 DE 2023
FECHA DE INICIACIÓN:	12/12/2023	FECHA PRESENTE ACTA:	15/11/2024

N° ITEM	CONDICIONES INICIALES					CONDICIONES ACTUALIZADAS Acta de Modificación No. 2 de fecha 12/09/2024		OBRA EJECUTADA						
								ACTAS ANTERIORES		PRESENTE ACTA		ACUMULADO		
	DESCRIPCION	UND	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	%
4,1,8	DESMONTE DE POSTE DE CONCRETO DE 10 METROS, INCLUYE ENTREGA PERÍMETRO URBANO	UN	8,00	$ 266.020,00	$ 2.128.160,00	8,00	$ 2.128.160,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
	SUBTOTAL				**$ 6.229.599,00**		**$ 6.229.599,00**		**$ -**		**$ -**		**$ -**	
4,2	**ACOMETIDA RED DE MEDIA TENSIÓN Y SUBESTACIÓN**													
4,2,1	MANIOBRA EN LINEA VIVA	HR	6,00	$ 1.170.574,00	$ 7.023.444,00	6,00	$ 7.023.444,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
4,2,2	POSTE DE CONCRETO LÍNEA DE 16 M X 750 KG. SUMINISTRO E INSTALACIÓN NO INCLUYE CIMENTACIÓN	UN	1,00	$ 3.854.683,00	$ 3.854.683,00	1,00	$ 3.854.683,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
4,2,3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA NORMA CODENSA LA464 PARA 34,5 KV	UN	2,00	$ 1.169.122,00	$ 2.338.244,00	2,00	$ 2.338.244,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
4,2,4	ESTRUCTURA TIPO 523-02 NORMA ICEL CIRCUITO TRIFÁSICO AISLAMIENTO EN ESPIGO DISPOSICIÓN EN SEMIBANDERA ÁNGULO DE 0° A 5°. B. MONTAJE CON CRUCETA METÁLICA SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA (LA202).	UN	2,00	$ 437.758,00	$ 875.516,00	2,00	$ 875.516,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
4,2,5	SUMINISTRO, TENDIDO, TENSIONADO Y AMARRE DE CABLE MENSAJERO DE ACERO 3/8"	ML	10,00	$ 11.055,00	$ 110.550,00	10,00	$ 110.550,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
4,2,6	SUMINISTRO, TENDIDO, TENSIONADO Y AMARRE DE CABLE SEMIAISLADO 3 NO. 4/0 PARA RED COMPACTA EN 35KV	ML	10,00	$ 111.409,00	$ 1.114.090,00	10,00	$ 1.114.090,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
4,2,7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA NORMA CODENSA LA121 CON BAJANTE GALVANIZADA DE Ø6" - (TRANSICIÓN A CIRCUITO SUBTERRÁNEO 34,5KV CON SECCIONADORES TIPO CUCHILLA Y PARARRAYOS) - NO INCLUYE TERMINALES PREMOLDEADOS	UN	1,00	$ 14.397.472,00	$ 14.397.472,00	1,00	$ 14.397.472,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
4,2,8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RECONECTADOR PARA 34,5 KV, INCLUYE PARAMETRIZACIÓN DE ACUERDO A REQUERIMIENTOS DE EMSA Y TRANSFORMADOR PARA SU FUNCIONAMIENTO	UN	1,00	$ 120.546.111,00	$ 120.546.111,00	1,00	$ 120.546.111,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
4,2,9	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE JUEGO (3) DE TERMINALES PREMOLDEADOS TIPO EXTERIOR PARA 35KV	UN	1,00	$ 2.875.927,00	$ 2.875.927,00	1,00	$ 2.875.927,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
4,2,10	CONSTRUCCIÓN CANALIZACIÓN PARA RED DE MEDIA TENSIÓN SIMILAR A NORMA CODENSA CS207 PARA DOS DUCTOS PVC DE 6" - NO INCLUYE ROTURA DE VIA NI REPOSICIÓN	ML	556,10	$ 256.647,00	$ 142.721.397,00	556,10	$ 142.721.397,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
4,2,11	CONSTRUCCIÓN DE CAJA DE INSPECCIÓN SIMILAR A NORMA CODENSA CS 280 PARA RED DE MEDIA TENSIÓN EN 34,5 KV	UN	14,00	$ 6.832.928,00	$ 95.660.992,00	14,00	$ 95.660.992,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
4,2,12	CONSTRUCCIÓN DE CAJA DE INSPECCIÓN SIMILAR A NORMA CODENSA CS276 PARA RED DE MEDIA TENSIÓN EN 34,5 KV	UN	2,00	$ 4.773.251,00	$ 9.546.502,00	2,00	$ 9.546.502,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
4,2,13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN RED MEDIA TENSIÓN EN CABLE DE COBRE XLPE – 35KV 4/0 AWG (133%) (TRES LÍNEAS)	ML	628,10	$ 979.810,00	$ 615.418.661,00	628,10	$ 615.418.661,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
4,2,14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TERMINAL PREMOLDEADO TIPO INTERIOR PARA 35 KV (JUEGO X 3 UNIDADES)	UN	7,00	$ 2.489.063,00	$ 17.423.441,00	7,00	$ 17.423.441,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
4,2,15	INSTALACIÓN DE CELDA DUPLEX CON SECCIONADORES TRIPOLARES EN AIRE 35 KV, OPERACIÓN BAJO CARGA, DE ACUERDO A NORMA CODENSA CTS 519-5, INCLUYE FUSIBLES TIPO HH DE 50A (6) - EN CONFIGURACIÓN DE ACUERDO A DIAGRAMA UNIFILAR	UN	1,00	$ 1.361.103,00	$ 1.361.103,00	1,00	$ 1.361.103,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
4,2,16	INSTALACIÓN DE CELDA DE MEDIDA PARA MEDIA TENSIÓN (35KV) EN 3 ELEMENTOS INCLUYE TC'S Y TP'S, BORNERA, Y MEDIDOR ELECTRONICO BIDIRECCIONAL DE ACUERDO A NORMA CODENSA AE327	UN	1,00	$ 1.361.103,00	$ 1.361.103,00	1,00	$ 1.361.103,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
4,2,17	INSTALACIÓN DE CELDA PARA TRANSFORMADOR TIPO SECO DE 800KVA A 35KV - DE ACUERDO A NORMA CODENSA CTS518-2	UN	1,00	$ 788.394,00	$ 788.394,00	1,00	$ 788.394,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
4,2,18	INSTALACIÓN DE CELDA PARA TRANSFORMADOR TIPO SECO DE 600KVA A 35KV - DE ACUERDO A NORMA CODENSA CTS518-2	UN	1,00	$ 788.394,00	$ 788.394,00	1,00	$ 788.394,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
4,2,19	INSTALACIÓN DE TRANSFORMADOR TIPO SECO DE 800 KVA CLASE H, RELACIÓN DE TRANSFORMACIÓN 34500/460-266V, GRUPO DE CONEXIÓN DYN5, INCLUYE DPS A INSTALAR EN LA ENTRADA DE LA ACOMETIDA DE MEDIA TENSIÓN, RIELES DE PISO, BASE PARA COLOCACIÓN DEL TRANSFORMADOR	UN	1,00	$ 1.387.253,00	$ 1.387.253,00	1,00	$ 1.387.253,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-

CONTRATO N°	511 de 2023	PROYECTO N°	2021005500331
ACTA DE PAGO PARCIAL N°	3	PERIODO ACTA DE PAGO PARCIAL:	28/9/2024 a 31/10/2024
OBJETO CONTRATO:	AMPLIACIÓN DE LA CAPACIDAD INSTALADA DEL HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE VILLAVICENCIO ESE - META	OBJETO PROYECTO:	AMPLIACIÓN DE LA CAPACIDAD INSTALADA DEL HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE VILLAVICENCIO ESE - META
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	$ 80.389.497.271,00	VALOR TOTAL DEL PROYECTO:	$ 84.208.944.899,00
CONTRATISTA:	CONSORCIO HOSPITAL 002	CONTRATO DE INTERVENTORIA N°	572 DE 2023
NIT:	901.752.517-0	INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTER HOSPITAL
CORREO ELECTRONICO CONTRATISTA:	coordinador.hospital@cyg.com.co	CORREO ELECTRONICO INTERVENTORIA:	coninterhospital2023@gmail.com
SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORIA	ING. GINA TATIANA ELAICA NIETO	APOYO A LA SUPERVISION:	DAVID ASHBEL FLOREZ SIERRA
CORREO ELECTRONICO INTERVENTORIA:	coninterhospital2023@gmail.com	CONTRATO DE APOYO A LA SUPERVISION N°	765 DE 2023
FECHA DE INICIACIÓN:	12/12/2023	FECHA PRESENTE ACTA:	15/11/2024

N° ITEM	CONDICIONES INICIALES					CONDICIONES ACTUALIZADAS Acta de Modificación No. 2 de fecha 12/09/2024		OBRA EJECUTADA						
								ACTAS ANTERIORES		PRESENTE ACTA		ACUMULADO		
	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	%
4,2,20	INSTALACIÓN DE TRANSFORMADOR TIPO SECO DE 600 KVA CLASE H, RELACIÓN DE TRANSFORMACIÓN 34500/214-124V, GRUPO DE CONEXIÓN DYN5, INCLUYE DPS A INSTALAR EN LA ENTRADA DE LA ACOMETIDA DE MEDIA TENSIÓN, RIELES DE PISO, BASE PARA COLOCACIÓN DEL TRANSFORMADOR	UN	1,00	$ 1.387.253,00	$ 1.387.253,00	1,00	$ 1.387.253,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
4,2,21	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MALLA DE PUESTA A TIERRA PARA TRANSFORMADOR Y TABLEROS. INCLUYE 10 VARILLAS DE PUESTA A TIERRA DE 5/8" X 2,4M, 78 METROS DE CABLE 2/0 COBRE DESNUDO, SOLDADURA EXOTERMICA, TERMINALES DE PONCHAR, PLATINA DE COBRE, DUCTO PVC DE 1" Y TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU INSTALACIÓN Y MONTAJE DE ACUERDO A PLANOS Y MEMORIAS DE CALCULO	UN	1,00	$ 11.080.452,00	$ 11.080.452,00	1,00	$ 11.080.452,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
4,2,22	INSTALACIÓN DE PLANTA ELÉCTRICA DE 600 KW NOMINALES (A NIVEL DEL MAR) AUTONOMIA DE 8 HORAS A FULL CARGA, INCLUYE CABINA INSONORIZADA, CARGADOR AUTOMATICO DE BATERIAS, BATERIA, MOTOR CUMMINS O SIMILAR, GENERADOR STAMFORD O SIMILAR Y PROTECCIÓN CONTRA SOBRECORRIENTE - TENSIÓN DE SALIDA 214V FASE - FASE - INCLUYE DUCTO METALICO DE ESCAPE AUTOSOPORTADO DE 10" CON LENGUETA DE ESCAPE	UN	1,00	$ 2.417.483,00	$ 2.417.483,00	1,00	$ 2.417.483,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
4,2,23	INSTALACIÓN DE PLANTA ELÉCTRICA DE 600 KW NOMINALES (A NIVEL DEL MAR) AUTONOMIA DE 8 HORAS A FULL CARGA, INCLUYE CABINA INSONORIZADA, CARGADOR AUTOMATICO DE BATERIAS, BATERIA, MOTOR CUMMINS O SIMILAR, GENERADOR STAMFORD O SIMILAR Y PROTECCIÓN CONTRA SOBRECORRIENTE - TENSIÓN DE SALIDA 460V FASE - FASE - INCLUYE DUCTO METALICO DE ESCAPE AUTOSOPORTADO DE 10" CON LENGUETA DE ESCAPE	UN	1,00	$ 2.417.483,00	$ 2.417.483,00	1,00	$ 2.417.483,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
4,2,24	CORTES PAVIMENTO FLEXIBLE (CARPETA ASFALTICA)	ML	1.112,20	$ 10.951,00	$ 12.179.702,00	1.112,20	$ 12.179.702,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
4,2,25	MEZCLA ASFALTICA RECICLADA EN CALIENTE DE TIPO MDC-25 PARA BACHEO	M3	27,81	$ 224.785,00	$ 6.251.271,00	27,81	$ 6.251.271,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
	SUBTOTAL				**$ 1.075.326.921,00**		**$ 1.075.326.921,00**		**$ -**		**$ -**		**$ -**	
4,3	**RED BAJA TENSIÓN Y ACOMETIDAS PRINCIPALES**													
4,3,1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ELECTROBARRA SOPORTADA EN TECHO DE 1600A - 130X170MM ALUMINIO PARA ACOMETIDA GENERAL TRANSFORMADOR - GABINETE GENERAL RED NORMAL SISTEMA DE 460V; INCLUYE UNIDAD ALIMENTACIÓN TRANSICIÓN ELECTROBARRA A CABLE, TRENZAS FLEXIBLES PARA CONEXIÓN, ANGULOS VERTICALES 2000A (2), ANGULOS HORIZONTALES 200A (2), SECCIONES DE 3 METROS (3), SECCIONES DE 1,5 METROS (1) Y ACCESORIOS DE SOPORTE	UN	1,00	$ 108.191.732,00	$ 108.191.732,00	1,00	$ 108.191.732,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
4,3,2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ELECTROBARRA SOPORTADA EN TECHO DE 1600A - 130X170MM ALUMINIO PARA ACOMETIDA GENERAL PLANTA DE EMERGENCIA - GABINETE GENERAL PLANTA SISTEMA DE SISTEMA DE 460V; INCLUYE UNIDAD ALIMENTACIÓN TRANSICIÓN ELECTROBARRA A CABLE, TRENZAS FLEXIBLES PARA CONEXIÓN, ANGULOS VERTICALES 2000A (2), ANGULOS HORIZONTALES 200A (2), SECCIONES DE 3 METROS (2), SECCIONES DE 1,5 METROS (1) SECCIONES DE 1 METRO (1), BARRERRA CORTAFUEGO (1) Y ACCESORIOS DE SOPORTE	UN	1,00	$ 106.798.229,00	$ 106.798.229,00	1,00	$ 106.798.229,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
4,3,3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ELECTROBARRA SOPORTADA EN TECHO DE 2000A - 130X220MM ALUMINIO PARA ACOMETIDA GENERAL TRANSFORMADOR - GABINETE GENERAL RED NORMAL SISTEMA DE 214V; INCLUYE UNIDAD ALIMENTACIÓN TRANSICIÓN ELECTROBARRA A CABLE, TRENZAS FLEXIBLES PARA CONEXIÓN, ANGULOS VERTICALES 2000A (2), SECCIONES DE 1,5 METROS (1) Y ACCESORIOS DE SOPORTE	UN	1,00	$ 47.891.254,00	$ 47.891.254,00	1,00	$ 47.891.254,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
4,3,4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ELECTROBARRA SOPORTADA EN TECHO DE 2000A - 130X220MM ALUMINIO PARA ACOMETIDA GENERAL PLANTA EMERGENCIA - GABINETE GENERAL PLANTA SISTEMA DE 214V; INCLUYE UNIDAD ALIMENTACIÓN TRANSICIÓN ELECTROBARRA A CABLE, TRENZAS FLEXIBLES PARA CONEXIÓN, ANGULOS VERTICALES 2000A (2), ANGULOS HORIZONTALES 2000A (2), SECCIONES DE 3 METROS (6), SECCIONES DE 1,5 METROS (1), SECCIONES DE 1 METRO (1), BARRERRA CORTAFUEGO (2) Y ACCESORIOS DE SOPORTE	UN	1,00	$ 214.211.246,00	$ 214.211.246,00	1,00	$ 214.211.246,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-

CONTRATO N°	511 de 2023	PROYECTO N°	2021005500331
ACTA DE PAGO PARCIAL N°	3	PERIODO ACTA DE PAGO PARCIAL:	28/9/2024 a 31/10/2024
OBJETO CONTRATO:	AMPLIACIÓN DE LA CAPACIDAD INSTALADA DEL HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE VILLAVICENCIO ESE - META	OBJETO PROYECTO:	AMPLIACIÓN DE LA CAPACIDAD INSTALADA DEL HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE VILLAVICENCIO ESE - META
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	$ 80.389.497.271,00	VALOR TOTAL DEL PROYECTO:	$ 84.208.944.899,00
CONTRATISTA:	CONSORCIO HOSPITAL 002	CONTRATO DE INTERVENTORIA N°	572 DE 2023
NIT:	901.752.517-0	INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTER HOSPITAL
CORREO ELECTRONICO CONTRATISTA:	coordinador.hospital@cyg.com.co	CORREO ELECTRONICO INTERVENTORIA:	coninterhospital2023@gmail.com
SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORIA	ING. GINA TATIANA ELAICA NIETO	APOYO A LA SUPERVISION:	DAVID ASHBEL FLOREZ SIERRA
CORREO ELECTRONICO INTERVENTORIA:	coninterhospital2023@gmail.com	CONTRATO DE APOYO A LA SUPERVISION N°	765 DE 2023
FECHA DE INICIACIÓN:	12/12/2023	FECHA PRESENTE ACTA:	15/11/2024

N° ITEM	CONDICIONES INICIALES					CONDICIONES ACTUALIZADAS Acta de Modificación No. 2 de fecha 12/09/2024		OBRA EJECUTADA						
								ACTAS ANTERIORES		PRESENTE ACTA		ACUMULADO		
	DESCRIPCION	UNID	CANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	%
4,3,5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA DE PASO 60X60 PARA ACOMETIDA RED CONTRA INCENDIOS	UN	3,00	$ 408.689,00	$ 1.226.067,00	3,00	$ 1.226.067,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
4,3,6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA IMC DE 3" PARA ACOMETIDA SISTEMA RED CONTRA INCENDIOS, INCLUYE ACCESORIOS DE SOPORTE E INSTALACIÓN	ML	48,40	$ 316.762,00	$ 15.331.281,00	48,40	$ 15.331.281,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
4,3,7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA TRANSFERENCIA RED CONTRA INCENDIOS - GABINETE CONTROL SISTEMA DE BOMBEO RED CONTRA INCENDIOS EN CABLE DE COBRE CON AISLAMIENTO LIBRE DE HALOGENOS THHN 3X350MCM+1/0T	ML	60,90	$ 875.211,00	$ 53.300.350,00	60,90	$ 53.300.350,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
4,3,8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TRANSFERENCIA AUTOMATICA POR BREAKERS MOTORIZADOS DE 225KVA - 460V (RED CONTRA INCENDIOS), INCLUYE: GABINETE METALICO DE 1,8M X1,0M X 0,4M, DOS BREAKER MOTORIZADOS DE 300 AMPERIOS A 460V CON BOBINA DE DISPARO, ENCLAVAMIENTO MECANICO PARA BREAKERS, MODULO ELECTRONICO DE TRANSFERENCIA AUTOMATICA, PILOTOS DE SEÑALIZACIÓN, SELECTORES Y DEMAS ELEMENTOS PARA INSTALACIÓN Y MONTAJE	UN	1,00	$ 30.384.333,00	$ 30.384.333,00	1,00	$ 30.384.333,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
4,3,9	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GABINETE CONTROL SISTEMA BOMBEO RED CONTRA INCENDIOS, INCLUYE: GABINETE METALICO DE 1,2M X 0,8M X 0,4M, BARRAJE TRIFÁSICO DE 25X5MM (350 AMPERIOS), UN BREAKER DE 3X300A - 460V ICU 50KA SOLO MAGNETICO, UN BREAKER DE 3X30A - 460V ICU 50KA SOLO MAGNETICO Y DEMAS ACCESORIOS PARA CONEXIÓN Y MONTAJE	UN	1,00	$ 7.831.435,00	$ 7.831.435,00	1,00	$ 7.831.435,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
4,3,10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UN DUCTO PVC DE 3" POR PLACA O MURO - BOMBA RED CONTRA INCENDIOS	ML	3,10	$ 46.582,00	$ 144.404,00	3,10	$ 144.404,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
4,3,11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UN DUCTO PVC DE 1" POR PLACA O MURO - BOMBA JOCKEY Y SEÑAL PARA TANQUE	ML	7,50	$ 11.378,00	$ 85.335,00	7,50	$ 85.335,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
4,3,12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CORAZA AMERICANA DE 3" SOBREPUESTA BOMBAS RCI; INCLUYE ACCESORIOS DE SOPORTE	ML	1,50	$ 80.873,00	$ 121.310,00	1,50	$ 121.310,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
4,3,13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CORAZA AMERICANA DE 1" SOBREPUESTA BOMBAS RCI; INCLUYE ACCESORIOS DE SOPORTE	ML	1,50	$ 23.016,00	$ 34.524,00	1,50	$ 34.524,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
4,3,14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA ELECTROBOMBA RED CONTRA INCENDIOS - EN CABLE DE COBRE CON AISLAMIENTO LIBRE DE HALOGENOS THHN 3X350MCM+1/0T	ML	6,10	$ 875.211,00	$ 5.338.787,00	6,10	$ 5.338.787,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
4,3,15	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA PARCIAL ELECTROBOMBA JOCKEY EN CABLE DE COBRE AISLADO LIBRE DE HALOGENOS THHN 3X12+12T	ML	5,50	$ 30.129,00	$ 165.710,00	5,50	$ 165.710,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
4,3,16	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE SEÑAL BOMBAS SISTEMA RED CONTRA INCENDIOS, ENCAUCHETADO 3X16	ML	9,50	$ 14.237,00	$ 135.252,00	9,50	$ 135.252,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
4,3,17	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GABINETE GENERAL RED NORMAL UNO 460V, INCLUYE: GABINETE METALICO DE 1,8M X 1,2M X 0,4M, BARRAJE TRIFÁSICO DE 80X10MM (1380 AMPERIOS), BREAKER GENERAL DE 3X1200A - 460V ICU70KA, UN(1) BREAKER DE 3X630A - 460V ICU 50KA, UN(1) BREAKER DE 3X400A - 460V ICU 50KA, UN(1) BREAKER DE 3X300A - 460V ICU 50KA, UN(1) BREAKER DE 3X70A - 460V ICU 70KA, DPS CLASE I+II DE 70KA - 460V, ANALIZADOR DE RED MULTIFUNCIONAL CON TRANSFORMADORES DE CORRIENTE Y DEMAS ACCESORIOS PARA CONEXIÓN Y MONTAJE	UN	1,00	$ 30.764.106,00	$ 30.764.106,00	1,00	$ 30.764.106,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
4,3,18	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GABINETE GENERAL PLANTA 460V, INCLUYE: GABINETE METALICO DE 1,8M X 1,2M X 0,4M, BARRAJE TRIFÁSICO DE 80X10MM (1380 AMPERIOS), UN(1) BREAKER DE 3X630A - 460V ICU 50KA, UN(1) BREAKER DE 3X400A - 460V ICU 50KA, UN(1) BREAKER DE 3X70A - 460V ICU 70KA, DPS CLASE I+II DE 70KA - 460V, ANALIZADOR DE RED MULTIFUNCIONAL CON TRANSFORMADORES DE CORRIENTE Y DEMAS ACCESORIOS PARA CONEXIÓN Y MONTAJE	UN	1,00	$ 20.429.497,00	$ 20.429.497,00	1,00	$ 20.429.497,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-

CONTRATO N°	511 de 2023	PROYECTO N°	2021005500331
ACTA DE PAGO PARCIAL N°	3	PERIODO ACTA DE PAGO PARCIAL:	28/9/2024 a 31/10/2024
OBJETO CONTRATO:	AMPLIACIÓN DE LA CAPACIDAD INSTALADA DEL HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE VILLAVICENCIO ESE - META	OBJETO PROYECTO:	AMPLIACIÓN DE LA CAPACIDAD INSTALADA DEL HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE VILLAVICENCIO ESE - META
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	$ 80.389.497.271,00	VALOR TOTAL DEL PROYECTO:	$ 84.208.944.899,00
CONTRATISTA:	CONSORCIO HOSPITAL 002	CONTRATO DE INTERVENTORIA N°	572 DE 2023
NIT:	901.752.517-0	INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTER HOSPITAL
CORREO ELECTRONICO CONTRATISTA:	coordinador.hospital@cyg.com.co	CORREO ELECTRONICO INTERVENTORIA:	coninterhospital2023@gmail.com
SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORIA	ING. GINA TATIANA ELAICA NIETO	APOYO A LA SUPERVISION:	DAVID ASHBEL FLOREZ SIERRA
CORREO ELECTRONICO INTERVENTORIA:	coninterhospital2023@gmail.com	CONTRATO DE APOYO A LA SUPERVISION N°	765 DE 2023
FECHA DE INICIACIÓN:	12/12/2023	FECHA PRESENTE ACTA:	15/11/2024

N° ITEM	CONDICIONES INICIALES					CONDICIONES ACTUALIZADAS Acta de Modificación No. 2 de fecha 12/09/2024		OBRA EJECUTADA						
								ACTAS ANTERIORES		PRESENTE ACTA		ACUMULADO		
	DESCRIPCION	UND	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	%
4,3,19	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GABINETE GENERAL RED NORMAL 214V, INCLUYE: GABINETE METALICO DE 1,8M X 1,2M X 0,4M, BARRAJE TRIFÁSICO DE 160X10MM (2500 AMPERIOS), BREAKER GENERAL DE 3X1800A ICU70KA, UN(1) BREAKER DE 3X800A ICU 50KA, UN(1) BREAKER DE 3X630A ICU 50KA, UN(1) BREAKER DE 3X400A ICU 50KA, UN(1) BREAKER DE 3X200A ICU 50KA, UN(1) BREAKER DE 3X170A ICU50KA, UN(1) BREAKER DE 3X50A ICU 70KA, DPS CLASE I+II DE 70KA - 214V, ANALIZADOR DE RED MULTIFUNCIONAL CON TRANSFORMADORES DE CORRIENTE Y DEMAS ACCESORIOS PARA CONEXIÓN Y MONTAJE	UN	1,00	$ 41.633.245,00	$ 41.633.245,00	1,00	$ 41.633.245,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
4,3,20	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GABINETE GENERAL PLANTA 214V, INCLUYE: GABINETE METALICO DE 1,8M X 1,2M X 0,4M, BARRAJE TRIFÁSICO DE 160X10MM (2500 AMPERIOS), UN(1) BREAKER DE 3X800A ICU 50KA, UN(1) BREAKER DE 3X630A ICU 50KA, UN(1) BREAKER DE 3X400A, UN(1) BREAKER DE 3X170A ICU50KA, UN(1) BREAKER DE 3X50A ICU 70KA, DPS CLASE I+II DE 70KA - 214V, ANALIZADOR DE RED MULTIFUNCIONAL CON TRANSFORMADORES DE CORRIENTE Y DEMAS ACCESORIOS PARA CONEXIÓN Y MONTAJE	UN	1,00	$ 29.708.769,00	$ 29.708.769,00	1,00	$ 29.708.769,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
	SUBTOTAL				**$ 713.726.866,00**		**$ 713.726.866,00**		**$ -**		**$ -**		**$ -**	
4,4	**TABLEROS, TRANSFERENCIAS Y ACOMETIDAS PRINCIPALES SISTEMA A 460V**													
4,4,1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DOS DUCTOS PVC DE 6" POR PLACA O MURO - ACOMETIDA PRINCIPAL AIRES ACONDICIONADOS EQUIPOS PRINCIPALES (TRANSFERENCIA Y TABLERO)	ML	9,00	$ 200.061,00	$ 1.800.549,00	9,00	$ 1.800.549,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
4,4,2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA AIRES ACONDICIONADOS EQUIPOS PRINCIPALES (TRANSFERENCIA Y TABLERO) EN CABLE DE COBRE CON AISLAMIENTO LIBRE DE HALOGENOS THHN 2x(3X500MCM+500MCM(N))+3/0T	ML	15,00	$ 2.764.915,00	$ 41.473.725,00	15,00	$ 41.473.725,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
4,4,3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TRANSFERENCIA AUTOMATICA POR BREAKERS MOTORIZADOS DE 500KVA - 460V (AIRES ACONDICIONADOS EQUIPOS PRINCIPALES), INCLUYE: GABINETE METALICO DE 1,8M X1,0M X 0,4M, DOS BREAKER MOTORIZADOS DE 630 AMPERIOS A 460V CON BOBINA DE DISPARO, ENCLAVAMIENTO MECANICO PARA BREAKERS, MODULO ELECTRONICO DE TRANSFERENCIA AUTOMATICA, PILOTOS DE SEÑALIZACIÓN, SELECTORES Y DEMAS ELEMENTOS PARA INSTALACIÓN Y MONTAJE	UN	1,00	$ 44.176.042,00	$ 44.176.042,00	1,00	$ 44.176.042,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
4,4,4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO GENERAL A.A. EQUIPOS PRINCIPALES, INCLUYE: GABINETE METALICO DE 1,2M X 0,8M X 0.4M, BARRAJE TRIFÁSICO DE 60X5MM (740 AMPERIOS), UN(1) BREAKER DE 3X400A - 460V ICU 50KA, UN(1) BREAKER DE 3X300A - 460V ICU 50KA, ANALIZADOR DE RED MULTIFUNCIONAL CON TRANSFORMADORES DE CORRIENTE Y DEMAS ACCESORIOS PARA CONEXIÓN Y MONTAJE	UN	1,00	$ 14.631.855,00	$ 14.631.855,00	1,00	$ 14.631.855,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
4,4,5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA DE PASO 60X60 PARA ACOMETIDAS PARCIAL GABINETE AIRES ACONDICIONADOS EN TERRAZA -	UN	6,00	$ 408.689,00	$ 2.452.134,00	6,00	$ 2.452.134,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
4,4,6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DOS DUCTOS PVC SCH40 DE 4" POR CIELO FALSO O BUITRON TABLEROS A.A. EN TERRAZA; INCLUYE ACCESORIOS DE SOPORTE	ML	66,90	$ 168.202,00	$ 11.252.714,00	66,90	$ 11.252.714,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
4,4,7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA TABLEROS AIRES ACONDICIONADOS EN TERRAZA EN CABLE DE COBRE CON AISLAMIENTO LIBRE DE HALOGENOS THHN 3X500MCM+1/0T	ML	80,40	$ 1.084.711,00	$ 87.210.764,00	80,40	$ 87.210.764,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
4,4,8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO A.A. EN TERRAZA (1), INCLUYE: GABINETE METALICO DE 1,2M X 0,8M X 0,4M, BARRAJE TRIFÁSICO DE 25X5MM (350 AMPERIOS), BREAKER GENERAL DE 3x300A - 460V ICU 50KA, UN(1) BREAKER DE 3X170A - 460V ICU 50KA, TRES(3) BREAKER DE 3X40A - 460V ICU 50KA Y DEMAS ACCESORIOS PARA CONEXIÓN Y MONTAJE	UN	1,00	$ 9.482.324,00	$ 9.482.324,00	1,00	$ 9.482.324,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
4,4,9	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO A.A. EN TERRAZA (2), INCLUYE: GABINETE METALICO DE 1,2M X 0,8M X 0,4M, BARRAJE TRIFÁSICO DE 40X5MM (515 AMPERIOS), BREAKER GENERAL DE 3x400A - 460V ICU 50KA, DOS(2) BREAKER DE 3X170A - 460V ICU 50KA Y DEMAS ACCESORIOS PARA CONEXIÓN Y MONTAJE	UN	1,00	$ 11.186.643,00	$ 11.186.643,00	1,00	$ 11.186.643,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-

1X613

CONTRATO N°	511 de 2023	PROYECTO N°	2021005500331
ACTA DE PAGO PARCIAL N°	3	PERIODO ACTA DE PAGO PARCIAL:	28/9/2024 a 31/10/2024
OBJETO CONTRATO:	AMPLIACIÓN DE LA CAPACIDAD INSTALADA DEL HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE VILLAVICENCIO ESE - META	OBJETO PROYECTO:	AMPLIACIÓN DE LA CAPACIDAD INSTALADA DEL HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE VILLAVICENCIO ESE - META
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	$ 80.389.497.271,00	VALOR TOTAL DEL PROYECTO:	$ 84.208.944.899,00
CONTRATISTA:	CONSORCIO HOSPITAL 002	CONTRATO DE INTERVENTORIA N°	572 DE 2023
NIT:	901.752.517-0	INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTER HOSPITAL
CORREO ELECTRONICO CONTRATISTA:	coordinador.hospital@cyg.com.co	CORREO ELECTRONICO INTERVENTORIA:	coninterhospital2023@gmail.com
SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORIA	ING. GINA TATIANA ELAICA NIETO	APOYO A LA SUPERVISION:	DAVID ASHBEL FLOREZ SIERRA
CORREO ELECTRONICO INTERVENTORIA:	coninterhospital2023@gmail.com	CONTRATO DE APOYO A LA SUPERVISION N°	765 DE 2023
FECHA DE INICIACIÓN:	12/12/2023	FECHA PRESENTE ACTA:	15/11/2024

N° ITEM	CONDICIONES INICIALES					CONDICIONES ACTUALIZADAS Acta de Modificación No. 2 de fecha 12/09/2024		OBRA EJECUTADA						
								ACTAS ANTERIORES		PRESENTE ACTA		ACUMULADO		
	DESCRIPCION	UND	CANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	%
4,4,10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UN DUCTO PVC DE 3" POR PLACA O MURO - EQUIPOS A.A. EN TERRAZA	ML	26,30	$ 46.582,00	$ 1.225.107,00	26,30	$ 1.225.107,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
4,4,11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UN DUCTO PVC DE 1" POR PLACA O MURO - EQUIPOS A.A. EN TERRAZA	ML	38,00	$ 11.378,00	$ 432.364,00	38,00	$ 432.364,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
4,4,12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CORAZA AMERICANA DE 3" SOBREPUESTA EQUIPOS A.A. EN TERRAZA; INCLUYE ACCESORIOS DE SOPORTE	ML	4,50	$ 80.873,00	$ 363.929,00	4,50	$ 363.929,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
4,4,13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CORAZA AMERICANA DE 1" SOBREPUESTA EQUIPOS A.A. EN TERRAZA; INCLUYE ACCESORIOS DE SOPORTE	ML	4,50	$ 23.016,00	$ 103.572,00	4,50	$ 103.572,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
4,4,14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA EQUIPOS CHILLER - EN CABLE DE COBRE CON AISLAMIENTO LIBRE DE HALOGENOS THHN 3X2/0+2T	ML	33,80	$ 316.098,00	$ 10.684.112,00	33,80	$ 10.684.112,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
4,4,15	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA BOMBAS CENTRIFUGAS EN CABLE DE COBRE AISLADO LIBRE DE HALOGENOS THHN 3X6+6T	ML	39,50	$ 94.815,00	$ 3.745.193,00	39,50	$ 3.745.193,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
4,4,16	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DOS DUCTOS PVC DE 4" POR PLACA O MURO - ACOMETIDA PRINCIPAL EQUIPOS A 460V (TRANSFERENCIA Y TABLERO)	ML	9,40	$ 102.079,00	$ 959.543,00	9,40	$ 959.543,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
4,4,17	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA EQUIPOS NO ESENCIALES (TRANSFERENCIA Y TABLERO) EN CABLE DE COBRE CON AISLAMIENTO LIBRE DE HALOGENOS THHN 3X500MCM+500MCM(N))+1/0T	ML	16,90	$ 1.409.305,00	$ 23.817.255,00	16,90	$ 23.817.255,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
4,4,18	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TRANSFERENCIA AUTOMATICA POR BREAKERS MOTORIZADOS DE 300KVA - 460V (EQUIPOS NO ESENCIALES), INCLUYE: GABINETE METALICO DE 1,8M X1,2M X 0,4M, DOS BREAKER MOTORIZADOS DE 400 AMPERIOS A 460V CON BOBINA DE DISPARO, ENCLAVAMIENTO MECANICO PARA BREAKERS, MODULO ELECTRONICO DE TRANSFERENCIA AUTOMATICA, PILOTOS DE SEÑALIZACIÓN, SELECTORES Y DEMAS ELEMENTOS PARA INSTALACIÓN Y MONTAJE	UN	1,00	$ 32.655.935,00	$ 32.655.935,00	1,00	$ 32.655.935,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
4,4,19	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO GENERAL EQUIPOS NO ESENCIALES, INCLUYE: GABINETE METALICO DE 1,8M X 1,2M X 0,4M, BARRAJE TRIFÁSICO DE 50X5MM (515 AMPERIOS), UN(1) BREAKER DE 3X125A - 460V ICU 50KA, UN(1) BREAKER DE 3X70A - 460V ICU 50KA, TRES(3) BREAKER DE 3X63A - 460V ICU 50KA, UN(1) BREAKER DE 3X50A - 460V ICU 50KA, UN(1) BREAKER DE 3X30A - 460V ICU 50KA, ANALIZADOR DE RED MULTIFUNCIONAL CON TRANSFORMADORES DE CORRIENTE Y DEMAS ACCESORIOS PARA CONEXIÓN Y MONTAJE	UN	1,00	$ 13.987.393,00	$ 13.987.393,00	1,00	$ 13.987.393,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
4,4,20	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESCALERILLA METALICA PORTA CONDUCTORES DE 400X100MM, INCLUYE ACCESORIOS PARA FIJACIÓN A PARED Y AMARRES CONDUCTORES - RED EQUIPOS NO ESENCIALES	ML	35,00	$ 198.051,00	$ 6.931.785,00	35,00	$ 6.931.785,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
4,4,21	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESCALERILLA METALICA PORTA CONDUCTORES DE 200X100MM, INCLUYE ACCESORIOS PARA FIJACIÓN A PARED Y AMARRES CONDUCTORES - ACOMETIDA RESONADOR	ML	10,00	$ 181.997,00	$ 1.819.970,00	10,00	$ 1.819.970,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
4,4,22	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA DE PASO 40X40 PARA ACOMETIDAS EQUIPOS ESPECIALES - PRIMER PISO	UN	4,00	$ 353.019,00	$ 1.412.076,00	4,00	$ 1.412.076,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
4,4,23	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA DE PASO 40X40 PARA ACOMETIDAS GABINETES DE BOMBEO - SOTANO DOS	UN	2,00	$ 353.019,00	$ 706.038,00	2,00	$ 706.038,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
4,4,24	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE OCHO DUCTOS PVC SCH40 DE 2" POR CIELO FALSO O BUITRON; INCLUYE ACCESORIOS DE SOPORTE - ACOMETIDAS EQUIPOS NO ESENCIALES	ML	4,50	$ 261.187,00	$ 1.175.342,00	4,50	$ 1.175.342,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
4,4,25	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUATRO DUCTOS PVC SCH40 DE 2" POR CIELO FALSO O BUITRON; INCLUYE ACCESORIOS DE SOPORTE - ACOMETIDAS EQUIPOS NO ESENCIALES	ML	20,40	$ 135.288,00	$ 2.759.875,00	20,40	$ 2.759.875,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
4,4,26	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DOS DUCTOS PVC SCH40 DE 2" POR CIELO FALSO O BUITRON; INCLUYE ACCESORIOS DE SOPORTE - ACOMETIDAS EQUIPOS NO ESENCIALES	ML	27,80	$ 94.595,00	$ 2.629.741,00	27,80	$ 2.629.741,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
4,4,27	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UN DUCTO PVC SCH40 DE 2" POR CIELO FALSO O BUITRON; INCLUYE ACCESORIOS DE SOPORTE - ACOMETIDAS EQUIPOS NO ESENCIALES	ML	38,80	$ 65.548,00	$ 2.543.262,00	38,80	$ 2.543.262,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
4,4,28	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA METALICA EMT 2 DUCTOS DE 2" SOBREPUESTA ACOMETIDAS GABINETES EQUIPOS DE BOMBEO; INCLUYE ACCESORIOS DE SOPORTE	ML	30,90	$ 181.365,00	$ 5.604.179,00	30,90	$ 5.604.179,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-

CONTRATO N°	511 de 2023	PROYECTO N°	2021005500331
ACTA DE PAGO PARCIAL N°	3	PERIODO ACTA DE PAGO PARCIAL:	28/9/2024 a 31/10/2024
OBJETO CONTRATO:	AMPLIACIÓN DE LA CAPACIDAD INSTALADA DEL HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE VILLAVICENCIO ESE - META	OBJETO PROYECTO:	AMPLIACIÓN DE LA CAPACIDAD INSTALADA DEL HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE VILLAVICENCIO ESE - META
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	$ 80.389.497.271,00	VALOR TOTAL DEL PROYECTO:	$ 84.208.944.899,00
CONTRATISTA:	CONSORCIO HOSPITAL 002	CONTRATO DE INTERVENTORIA N°	572 DE 2023
NIT:	901.752.517-0	INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTER HOSPITAL
CORREO ELECTRONICO CONTRATISTA:	coordinador.hospital@cvg.com.co	CORREO ELECTRONICO INTERVENTORIA:	coninterhospital2023@gmail.com
SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORIA	ING. GINA TATIANA ELAICA NIETO	APOYO A LA SUPERVISION:	DAVID ASHBEL FLOREZ SIERRA
CORREO ELECTRONICO INTERVENTORIA:	coninterhospital2023@gmail.com	CONTRATO DE APOYO A LA SUPERVISION N°	765 DE 2023
FECHA DE INICIACIÓN:	12/12/2023	FECHA PRESENTE ACTA:	15/11/2024

N° ITEM	CONDICIONES INICIALES					CONDICIONES ACTUALIZADAS Acta de Modificación No. 2 de fecha 12/09/2024		OBRA EJECUTADA						
								ACTAS ANTERIORES		PRESENTE ACTA		ACUMULADO		
	DESCRIPCION	UND	CANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	%
4,4,29	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA METALICA EMT DE 2" SOBREPUESTA ACOMETIDAS GABINETES EQUIPOS DE BOMBEO; INCLUYE ACCESORIOS DE SOPORTE	ML	12,50	$ 108.933,00	$ 1.361.663,00	12,50	$ 1.361.663,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
4,4,30	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA PARCIAL EN CABLE DE COBRE CON AISLAMIENTO LIBRE DE HALOGENOS THHN 3X2/0+2/0N+4T	ML	25,30	$ 383.984,00	$ 9.714.795,00	25,30	$ 9.714.795,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
4,4,31	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA PARCIAL EN CABLE DE COBRE CON AISLAMIENTO LIBRE DE HALOGENOS THHN 3X2+2N+8T	ML	141,20	$ 225.374,00	$ 31.822.809,00	141,20	$ 31.822.809,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
4,4,32	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA PARCIAL EN CABLE DE COBRE CON AISLAMIENTO LIBRE DE HALOGENOS THHN 2X4+4N+8T	ML	41,60	$ 127.992,00	$ 5.324.467,00	41,60	$ 5.324.467,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
4,4,33	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA PARCIAL EN CABLE DE COBRE CON AISLAMIENTO LIBRE DE HALOGENOS THHN 3X4+4N+8T	ML	90,10	$ 161.397,00	$ 14.541.870,00	90,10	$ 14.541.870,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
4,4,34	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GABINETE CONTROL SISTEMA DE BOMBEO SUMINISTRO, INCLUYE: GABINETE METALICO DE 1,2M X 0,8M X 0,4M, BARRAJE TRIFÁSICO DE 12X2MM (110 AMPERIOS), BREAKER GENERAL DE 3X50A - 460V ICU 50KA, TRES(3) BREAKER DE 3X20A - 460V ICU 50KA, UN(1) MINIBREAKER DE 2X6A - 460V ICU 10KA, TRES(3) CONJUNTOS ARRANCADOR COMPACTO PARA BOMBA DE 10HP - 460V ACCIONADOS POR PLC, UN(1) PLC PARA CONTROL EQUIPOS DE BOMBEO Y DEMAS ACCESORIOS PARA CONEXIÓN Y MONTAJE	UN	1,00	$ 22.203.977,00	$ 22.203.977,00	1,00	$ 22.203.977,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
4,4,35	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GABINETE CONTROL SISTEMA DE BOMBEO AGUAS LLUVIAS, INCLUYE: GABINETE METALICO DE 1,2M X 0,8M X 0,4M, BARRAJE TRIFÁSICO DE 12X2MM (110 AMPERIOS), BREAKER GENERAL DE 3X30A - 460V ICU 50KA, DOS(2) BREAKER DE 3X20A - 460V ICU 50KA, DOS(2) CONJUNTOS ARRANCADOR COMPACTO PARA BOMBA DE 10HP - 460V ACCIONADOS POR FLOTADOR Y DEMAS ACCESORIOS PARA CONEXIÓN Y MONTAJE	UN	1,00	$ 17.239.734,00	$ 17.239.734,00	1,00	$ 17.239.734,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
4,4,36	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UN DUCTO PVC DE 1" POR PLACA O MURO -	ML	23,40	$ 11.378,00	$ 266.245,00	23,40	$ 266.245,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
4,4,37	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA DE PASO 30X30 PARA ACOMETIDA BOMBA AGUAS LLUVIA	UN	4,00	$ 334.872,00	$ 1.339.488,00	4,00	$ 1.339.488,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
4,4,38	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA METALICA EMT DE 1" SOBREPUESTA ACOMETIDA BOMBA AGUAS LLUVIA; INCLUYE ACCESORIOS DE SOPORTE	ML	54,00	$ 63.523,00	$ 3.430.242,00	54,00	$ 3.430.242,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
4,4,39	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CORAZA AMERICANA DE 1" SOBREPUESTA BOMBAS; INCLUYE ACCESORIOS DE SOPORTE	ML	6,00	$ 23.016,00	$ 138.096,00	6,00	$ 138.096,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
4,4,40	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA PARCIAL EN CABLE DE COBRE AISLADO LIBRE DE HALOGENOS THHN 3X12+12T	ML	27,60	$ 30.129,00	$ 831.560,00	27,60	$ 831.560,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
4,4,41	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA PARCIAL EN CABLE DE COBRE AISLADO LIBRE DE HALOGENOS THHN 3X10+10T	ML	65,90	$ 41.904,00	$ 2.761.474,00	65,90	$ 2.761.474,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
4,4,42	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE SEÑAL BOMBAS, ENCAUCHETADO 3X16	ML	79,50	$ 14.237,00	$ 1.131.842,00	79,50	$ 1.131.842,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
4,4,43	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DOS DUCTOS PVC DE 4" POR PLACA O MURO	ML	1,80	$ 102.079,00	$ 183.742,00	1,80	$ 183.742,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
4,4,44	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA EN CABLE DE COBRE CON AISLAMIENTO LIBRE DE HALOGENOS THHN 3X350MCM+1/0T	ML	4,80	$ 875.211,00	$ 4.201.013,00	4,80	$ 4.201.013,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
4,4,45	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BANCO DE CONDENSADORES A 460V DE NUEVE (9) PASOS AUTOMATICOS, INCLUYE: GABINETE METALICO DE 1,8M X 1,0M X 0,4M, BARRAJE TRIFÁSICO DE 25X5MM (350 AMPERIOS), UN(1) BREAKER DE 3X63A - 460V ICU50KA, CUATRO (4) BREAKER DE 3X40A - 460V ICU 50KA, CUATRO(4) BREAKER DE 3X20A - 460V ICU50KA, UN(1) MINIBREAKER DE 2X6A - 460V ICU 10KA, UN(1) CONTACTOR DE 70A EN AC3 ACCIONADO POR PLC, CUATRO (4) CONTACTORES DE 50A EN AC3 ACCIONADOS POR PLC, CUATRO CONTACTORES DE 30A ACCIONADOS POR PLC, UN (1) CONDENSADOR DE 30 KVAR - 460V, CUATRO(4) CONDENSADORES DE 20KVAR - 460V, CUATRO CONDENSADORES DE 10KVAR- 460V, UN(1) MODULO DE CONTROL PARA BANCO DE CONDENSADORES Y DEMAS ACCESORIOS PARA CONEXIÓN Y MONTAJE	UN	1,00	$ 26.355.231,00	$ 26.355.231,00	1,00	$ 26.355.231,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
	SUBTOTAL				**$ 480.071.669,00**		**$ 480.071.669,00**		$ -		$ -		$ -	
4,5	**TABLEROS, TRANSFERENCIAS Y ACOMETIDAS PRINCIPALES SISTEMA A 214V**													
4,0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DOS DUCTOS PVC DE 6" POR PLACA O MURO	ML	37,60	$ 200.061,00	$ 7.522.294,00	37,60	$ 7.522.294,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

CONTRATO N°	511 de 2023	PROYECTO N°	2021005500331
ACTA DE PAGO PARCIAL N°	3	PERIODO ACTA DE PAGO PARCIAL:	28/9/2024 a 31/10/2024
OBJETO CONTRATO:	AMPLIACIÓN DE LA CAPACIDAD INSTALADA DEL HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE VILLAVICENCIO ESE - META	OBJETO PROYECTO:	AMPLIACIÓN DE LA CAPACIDAD INSTALADA DEL HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE VILLAVICENCIO ESE - META
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	$ 80.389.497.271,00	VALOR TOTAL DEL PROYECTO:	$ 84.208.944.899,00
CONTRATISTA:	CONSORCIO HOSPITAL 002	CONTRATO DE INTERVENTORIA N°	572 DE 2023
NIT:	901.752.517-0	INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTER HOSPITAL
CORREO ELECTRONICO CONTRATISTA:	coordinador.hospital@cvg.com.co	CORREO ELECTRONICO INTERVENTORIA:	coninterhospital2023@gmail.com
SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORIA	ING. GINA TATIANA ELAICA NIETO	APOYO A LA SUPERVISION:	DAVID ASHBEL FLOREZ SIERRA
CORREO ELECTRONICO INTERVENTORIA:	coninterhospital2023@gmail.com	CONTRATO DE APOYO A LA SUPERVISION N°	765 DE 2023
FECHA DE INICIACIÓN:	12/12/2023	FECHA PRESENTE ACTA:	15/11/2024

N° ITEM	CONDICIONES INICIALES					CONDICIONES ACTUALIZADAS Acta de Modificación No. 2 de fecha 12/09/2024		OBRA EJECUTADA						
								ACTAS ANTERIORES		PRESENTE ACTA		ACUMULADO		
	DESCRIPCION	UND	CANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	%
4,5,2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA EN CABLE DE COBRE CON AISLAMIENTO LIBRE DE HALOGENOS THHN 3x(3X500MCM+500MCM(N))+3/0T	ML	43,60	$ 4.078.206,00	$ 177.809.782,00	43,60	$ 177.809.782,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
4,5,3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TRANSFERENCIA AUTOMATICA POR BREAKERS MOTORIZADOS DE 300KVA (RED EMERGENCIA UNO), INCLUYE: GABINETE METALICO DE 1,8M X1,0M X 0,4M, DOS BREAKER MOTORIZADOS DE 800 AMPERIOS CON BOBINA DE DISPARO, ENCLAVAMIENTO MECANICO PARA BREAKERS, MODULO ELECTRONICO DE TRANSFERENCIA AUTOMATICA, PILOTOS DE SEÑALIZACIÓN, SELECTORES Y DEMAS ELEMENTOS PARA INSTALACIÓN Y MONTAJE	UN	1,00	$ 43.861.849,00	$ 43.861.849,00	1,00	$ 43.861.849,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
4,5,4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO GENERAL EMERGENCIA UNO, INCLUYE: GABINETE METALICO DE 1,8M X 1,2M X 0,4M, BARRAJE TRIFÁSICO DE 50X10MM (920 AMPERIOS), UN(1) BREAKER DE 3X125A - ICU 50KA, DOS(2) BREAKER DE 3X100A ICU 50KA, UN(1) BREAKER DE 3X80A ICU 50KA, SEIS(6) BREAKER DE 3X70A ICU 50KA, UN(1) BREAKER DE 3X63A ICU 50KA, UN(1) BREAKER DE 3X40A ICU 50KA, TRES(3) BREAKER DE 3X30A ICU 50KA, ANALIZADOR DE RED MULTIFUNCIONAL CON TRANSFORMADORES DE CORRIENTE Y DEMAS ACCESORIOS PARA CONEXIÓN Y MONTAJE	UN	1,00	$ 20.901.830,00	$ 20.901.830,00	1,00	$ 20.901.830,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
4,5,5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DOS DUCTOS PVC SCH40 DE 2" POR CIELO FALSO O BUITRON; INCLUYE ACCESORIOS DE SOPORTE - ACOMETIDA TABLERO RED REGULADA UNO	ML	2,20	$ 94.595,00	$ 208.109,00	2,20	$ 208.109,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
4,5,6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA METALICA EMT DOS DUCTOS DE 2" SOBREPUESTA ACOMETIDA TABLERO RED REGULADA UNO; INCLUYE ACCESORIOS DE SOPORTE	ML	6,40	$ 181.365,00	$ 1.160.736,00	6,40	$ 1.160.736,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
4,5,7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA METALICA EMT DE 2" SOBREPUESTA ACOMETIDA UPS UNO; INCLUYE ACCESORIOS DE SOPORTE	ML	5,60	$ 108.933,00	$ 610.025,00	5,60	$ 610.025,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
4,5,8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA PARCIAL EN CABLE DE COBRE CON AISLAMIENTO LIBRE DE HALOGENOS THHN 3X2/0+2/0N+4T	ML	26,10	$ 383.984,00	$ 10.021.982,00	26,10	$ 10.021.982,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
4,5,9	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GABINETE PARA RED REGULADA UNO, INCLUYE GABINETE METÁLICO DE 1,8M X 1,2M X 0,4M, BARRAJE TRIFÁSICO DE 15X2MM (140 AMPERIOS), DOS (2) BREAKER DE 3X125A ICU 50KA, CUATRO (4) BREAKER DE 3X30A ICU 25KA, CINCO (5) BREAKER DE 1X30A ICU 25KA, CONMUTABLE DE TRES POSICIONES DE 3X125 AMPERIOS Y DEMAS ACCESORIOS PARA CONEXIÓN Y MONTAJE	UN	1,00	$ 9.543.067,00	$ 9.543.067,00	1,00	$ 9.543.067,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
4,5,10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UPS TRIFÁSICA DE 60 KVA - RED REGULADA - INCLUYE BANCO DE BATERIAS PARA RESPALDO DE 30 MINUTOS	UN	2,00	$ 184.670.190,00	$ 369.340.380,00	2,00	$ 369.340.380,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
4,5,11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DOS DUCTOS PVC DE 4" POR PLACA O MURO - ACOMETIDA TABLERO GENERAL DE EMERGENCIA DOS (TRANSFERENCIA Y TABLERO)	ML	10,90	$ 102.079,00	$ 1.112.661,00	10,90	$ 1.112.661,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
4,5,12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DOS DUCTOS PVC SCH40 DE 4" POR CIELO FALSO O BUITRON- ACOMETIDA TABLERO GENERAL DE EMERGENCIA DOS; INCLUYE ACCESORIOS DE SOPORTE	ML	14,00	$ 168.202,00	$ 2.354.828,00	14,00	$ 2.354.828,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
4,5,13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA EN CABLE DE COBRE CON AISLAMIENTO LIBRE DE HALOGENOS THHN 2x(3X500MCM+500MCM(N))+3/0T	ML	29,90	$ 2.764.915,00	$ 82.670.959,00	29,90	$ 82.670.959,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
4,5,14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TRANSFERENCIA AUTOMATICA POR BREAKERS MOTORIZADOS DE 225KVA (RED EMERGENCIA DOS), INCLUYE: GABINETE METALICO DE 1,8M X1,2M X 0,4M, DOS BREAKER MOTORIZADOS DE 600 AMPERIOS CON BOBINA DE DISPARO, ENCLAVAMIENTO MECANICO PARA BREAKERS, MODULO ELECTRONICO DE TRANSFERENCIA AUTOMATICA, PILOTOS DE SEÑALIZACIÓN, SELECTORES Y DEMAS ELEMENTOS PARA INSTALACIÓN Y MONTAJE	UN	1,00	$ 43.530.210,00	$ 43.530.210,00	1,00	$ 43.530.210,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-

CONTRATO N°	511 de 2023	PROYECTO N°	2021005500331
ACTA DE PAGO PARCIAL N°	3	PERIODO ACTA DE PAGO PARCIAL:	28/9/2024 a 31/10/2024
OBJETO CONTRATO:	AMPLIACIÓN DE LA CAPACIDAD INSTALADA DEL HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE VILLAVICENCIO ESE - META	OBJETO PROYECTO:	AMPLIACIÓN DE LA CAPACIDAD INSTALADA DEL HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE VILLAVICENCIO ESE - META
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	$ 80.389.497.271,00	VALOR TOTAL DEL PROYECTO:	$ 84.208.944.899,00
CONTRATISTA:	CONSORCIO HOSPITAL 002	CONTRATO DE INTERVENTORIA N°	572 DE 2023
NIT:	901.752.517-0	INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTER HOSPITAL
CORREO ELECTRONICO CONTRATISTA:	coordinador.hospital@cyg.com.co	CORREO ELECTRONICO INTERVENTORIA:	coninterhospital2023@gmail.com
SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORIA	ING. GINA TATIANA ELAICA NIETO	APOYO A LA SUPERVISION:	DAVID ASHBEL FLOREZ SIERRA
CORREO ELECTRONICO INTERVENTORIA:	coninterhospital2023@gmail.com	CONTRATO DE APOYO A LA SUPERVISION N°	765 DE 2023
FECHA DE INICIACIÓN:	12/12/2023	FECHA PRESENTE ACTA:	15/11/2024

N° ITEM	CONDICIONES INICIALES					CONDICIONES ACTUALIZADAS Acta de Modificación No. 2 de fecha 12/09/2024		OBRA EJECUTADA						
								ACTAS ANTERIORES		PRESENTE ACTA		ACUMULADO		
	DESCRIPCION	UND	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	%
4,5,15	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO GENERAL EMERGENCIA DOS, INCLUYE: GABINETE METALICO DE 1,8M X 1,2M X 0,4M, BREAKER GENERAL DE 3X630A ICU 50KA, BARRAJE TRIFÁSICO DE 30X10MM (660 AMPERIOS), UN(1) BREAKER DE 3X125A - ICU 50KA, UN(1) BREAKER DE 3X80A ICU 50KA, CUATRO(4) BREAKER DE 3X70A ICU 50KA, DOS(2) BREAKER DE 3X63A ICU 50KA, UN(1) BREAKER DE 3X50A ICU 70KA, DOS(2) BREAKER DE 3X50A ICU 50KA, UN(1) BREAKER DE 3X30A ICU 50KA, UN(1) BREAKER DE 3X20A ICU 50KA, DPS CLASE II DE 70KA - 214V, ANALIZADOR DE RED MULTIFUNCIONAL CON TRANSFORMADORES DE CORRIENTE Y DEMAS ACCESORIOS PARA CONEXIÓN Y MONTAJE	UN	1,00	$ 19.804.200,00	$ 19.804.200,00	1,00	$ 19.804.200,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
4,5,16	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GABINETE PARA RED REGULADA DOS, INCLUYE GABINETE METÁLICO DE 1,8M X 1,2M X 0,4M, BARRAJE TRIFÁSICO DE 15X2MM (140 AMPERIOS), DOS (2) BREAKER DE 3X125A ICU 50KA, DOS(2) BREAKER DE 3X40A ICU 25KA, TRES (3) BREAKER DE 3X30A ICU 25KA, TRES (3) BREAKER DE 1X30A ICU 25KA, CONMUTABLE DE TRES POSICIONES DE 3X125 AMPERIOS Y DEMAS ACCESORIOS PARA CONEXIÓN Y MONTAJE	UN	1,00	$ 9.792.782,00	$ 9.792.782,00	1,00	$ 9.792.782,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
4,5,17	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DOS DUCTOS PVC DE 4" POR PLACA O MURO -	ML	14,00	$ 102.079,00	$ 1.429.106,00	14,00	$ 1.429.106,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
4,5,18	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA EN CABLE DE COBRE CON AISLAMIENTO LIBRE DE HALOGENOS THHN 3X500MCM+500MCM(N))+2/0T	ML	26,50	$ 1.410.739,00	$ 37.384.584,00	26,50	$ 37.384.584,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
4,5,19	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TRANSFERENCIA AUTOMATICA POR BREAKERS MOTORIZADOS DE 125KVA (EQUIPOS MENORES A.A.), INCLUYE: GABINETE METALICO DE 1,8M X1,2M X 0,4M, DOS BREAKER MOTORIZADOS DE350 AMPERIOS CON BOBINA DE DISPARO, ENCLAVAMIENTO MECANICO PARA BREAKERS, MODULO ELECTRONICO DE TRANSFERENCIA AUTOMATICA, PILOTOS DE SEÑALIZACIÓN, SELECTORES Y DEMAS ELEMENTOS PARA INSTALACIÓN Y MONTAJE	UN	1,00	$ 32.655.935,00	$ 32.655.935,00	1,00	$ 32.655.935,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
4,5,20	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO EQUIPOS MENORES A.A, INCLUYE: GABINETE METALICO DE 1,8M X 1,2M X 0,4M, BARRAJE TRIFÁSICO DE 40X5MM (515 AMPERIOS), UN(1) BREAKER DE 3X125A - ICU 50KA, CUATRO(4) BREAKER DE 3X50A ICU 50KA, UN(1) BREAKER DE 3X40A ICU 50KA, CUATRO(4) BREAKER DE 3X30A ICU 50KA, ANALIZADOR DE RED MULTIFUNCIONAL CON TRANSFORMADORES DE CORRIENTE Y DEMAS ACCESORIOS PARA CONEXIÓN Y MONTAJE	UN	1,00	$ 15.716.883,00	$ 15.716.883,00	1,00	$ 15.716.883,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
4,5,21	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESCALERILLA METALICA PORTA CONDUCTORES DE 400X100MM, INCLUYE ACCESORIOS PARA FIJACIÓN A PARED Y AMARRES CONDUCTORES - RED TABLEROS EQUIPOS MENORES A.A.	ML	60,00	$ 198.051,00	$ 11.883.060,00	60,00	$ 11.883.060,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
4,5,22	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA METALICA EMT DE 1 1/4" SOBREPUESTA, INCLUYE ACCESORIOS DE SOPORTE - TABLEROS EQUIPOS MENORES A.A	ML	123,20	$ 88.762,00	$ 10.935.478,00	123,20	$ 10.935.478,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
4,5,23	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA EN CABLE DE COBRE CON AISLAMIENTO LIBRE DE HALOGENOS THHN 3X8+8N+8T	ML	97,50	$ 75.676,00	$ 7.378.410,00	97,50	$ 7.378.410,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
4,5,24	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA EN CABLE DE COBRE CON AISLAMIENTO LIBRE DE HALOGENOS THHN 3X4+4N+8T	ML	23,80	$ 161.397,00	$ 3.841.249,00	23,80	$ 3.841.249,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
4,5,25	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO A.A Y VENTILACIÓN SOTANO DOS, INCLUYE: GABINETE METALICO DE 0,8M X 0,8M X 0,4M, BREAKER GENERAL DE 3X50A ICU 25KA, BARRAJE TRIFÁSICO DE 12X2MM (110 AMPERIOS), SEIS (6) BREAKER DE 3X20A ICU 25KA Y DEMAS ACCESORIOS PARA CONEXIÓN Y MONTAJE	UN	1,00	$ 5.291.537,00	$ 5.291.537,00	1,00	$ 5.291.537,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
4,5,26	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO A.A Y VENTILACIÓN SOTANO UNO, INCLUYE: GABINETE METALICO DE 0,8M X 0,8M X 0,4M, BREAKER GENERAL DE 3X50A ICU 25KA, BARRAJE TRIFÁSICO DE 12X2MM (110 AMPERIOS), SEIS (6) BREAKER DE 3X20A ICU 25KA Y DEMAS ACCESORIOS PARA CONEXIÓN Y MONTAJE	UN	1,00	$ 5.716.568,00	$ 5.716.568,00	1,00	$ 5.716.568,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
4,5,27	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO A.A Y VENTILACIÓN PRIMER PISO, INCLUYE: GABINETE METALICO DE 1,8M X 1,2M X 0,4M, BREAKER GENERAL DE 3X50A ICU 25KA, BARRAJE TRIFÁSICO DE 12X2MM (110 AMPERIOS), CUARENTA Y CUATRO (44) BREAKER DE 2X20A ICU 25KA Y DEMAS ACCESORIOS PARA CONEXIÓN Y MONTAJE	UN	1,00	$ 10.548.296,00	$ 10.548.296,00	1,00	$ 10.548.296,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-

CONTRATO N°	511 de 2023	PROYECTO N°	2021005500331
ACTA DE PAGO PARCIAL N°	3	PERIODO ACTA DE PAGO PARCIAL:	28/9/2024 a 31/10/2024
OBJETO CONTRATO:	AMPLIACIÓN DE LA CAPACIDAD INSTALADA DEL HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE VILLAVICENCIO ESE - META	OBJETO PROYECTO:	AMPLIACIÓN DE LA CAPACIDAD INSTALADA DEL HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE VILLAVICENCIO ESE - META
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	$ 80.389.497.271,00	VALOR TOTAL DEL PROYECTO:	$ 84.208.944.899,00
CONTRATISTA:	CONSORCIO HOSPITAL 002	CONTRATO DE INTERVENTORIA N°	572 DE 2023
NIT:	901.752.517-0	INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTER HOSPITAL
CORREO ELECTRONICO CONTRATISTA:	coordinador.hospital@cyg.com.co	CORREO ELECTRONICO INTERVENTORIA:	coninterhospital2023@gmail.com
SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORIA	ING. GINA TATIANA ELAICA NIETO	APOYO A LA SUPERVISION:	DAVID ASHBEL FLOREZ SIERRA
CORREO ELECTRONICO INTERVENTORIA:	coninterhospital2023@gmail.com	CONTRATO DE APOYO A LA SUPERVISION N°	765 DE 2023
FECHA DE INICIACIÓN:	12/12/2023	FECHA PRESENTE ACTA:	15/11/2024

N° ITEM	CONDICIONES INICIALES					CONDICIONES ACTUALIZADAS Acta de Modificación No. 2 de fecha 12/09/2024		OBRA EJECUTADA						
								ACTAS ANTERIORES		PRESENTE ACTA		ACUMULADO		
	DESCRIPCION	UND	CANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	%
4,5,28	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO A.A Y VENTILACIÓN SEGUNDO PISO, INCLUYE: GABINETE METALICO DE 0,8M X 0,8M X 0,4M, BREAKER GENERAL DE 3X50A ICU 25KA, BARRAJE TRIFÁSICO DE 12X2MM (110 AMPERIOS), DOS (2) BREAKER DE 3X20A ICU 25KA, CATORCE (14) BREAKER DE 2X20A ICU 25KA Y DEMAS ACCESORIOS PARA CONEXIÓN Y MONTAJE	UN	1,00	$ 6.279.552,00	$ 6.279.552,00	1,00	$ 6.279.552,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
4,5,29	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO A.A Y VENTILACIÓN TERCER PISO, INCLUYE: GABINETE METALICO DE 0,8M X 0,8M X 0,4M, BREAKER GENERAL DE 3X30A ICU 25KA, BARRAJE TRIFÁSICO DE 12X2MM (110 AMPERIOS), QUINCE (15) BREAKER DE 2X20A ICU 25KA Y DEMAS ACCESORIOS PARA CONEXIÓN Y MONTAJE	UN	1,00	$ 5.701.612,00	$ 5.701.612,00	1,00	$ 5.701.612,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
4,5,30	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO A.A Y VENTILACIÓN CUARTO PISO, INCLUYE: GABINETE METALICO DE 0,8M X 0,8M X 0,4M, BREAKER GENERAL DE 3X30A ICU 25KA, BARRAJE TRIFÁSICO DE 12X2MM (110 AMPERIOS), TRECE (13) BREAKER DE 2X20A ICU 25KA Y DEMAS ACCESORIOS PARA CONEXIÓN Y MONTAJE	UN	1,00	$ 5.479.343,00	$ 5.479.343,00	1,00	$ 5.479.343,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
4,5,31	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO A.A Y VENTILACIÓN QUINTO PISO, INCLUYE: GABINETE METALICO DE 0,8M X 0,8M X 0,4M, BREAKER GENERAL DE 3X30A ICU 25KA, BARRAJE TRIFÁSICO DE 12X2MM (110 AMPERIOS), VENTIUN (21) BREAKER DE 2X20A ICU 25KA Y DEMAS ACCESORIOS PARA CONEXIÓN Y MONTAJE	UN	1,00	$ 6.513.877,00	$ 6.513.877,00	1,00	$ 6.513.877,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
4,5,32	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO A.A Y VENTILACIÓN SEXTO PISO, INCLUYE: GABINETE METALICO DE 0,8M X 0,8M X 0,4M, BREAKER GENERAL DE 3X30A ICU 25KA, BARRAJE TRIFÁSICO DE 12X2MM (110 AMPERIOS), VENTICUATRO (24) BREAKER DE 2X20A ICU 25KA Y DEMAS ACCESORIOS PARA CONEXIÓN Y MONTAJE	UN	1,00	$ 6.847.281,00	$ 6.847.281,00	1,00	$ 6.847.281,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
4,5,33	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO A.A Y VENTILACIÓN SEPTIMO PISO, INCLUYE: GABINETE METALICO DE 0,8M X 0,8M X 0,4M, BREAKER GENERAL DE 3X40A ICU 25KA, BARRAJE TRIFÁSICO DE 12X2MM (110 AMPERIOS), UN(1) BREAKER DE 3X20A ICU 25KA, DIECISEIS (16) BREAKER DE 2X20A ICU 25KA Y DEMAS ACCESORIOS PARA CONEXIÓN Y MONTAJE	UN	1,00	$ 6.337.781,00	$ 6.337.781,00	1,00	$ 6.337.781,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
4,5,34	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO A.A Y VENTILACIÓN OCTAVO PISO, INCLUYE: GABINETE METALICO DE 1,2M X 0,8M X 0,4M, BREAKER GENERAL DE 3X125A ICU 25KA, BARRAJE TRIFÁSICO DE 14X2MM (140 AMPERIOS), DOS(2) BREAKER DE 3X40A ICU 25KA, ONCE (11) BREAKER DE 2X20A ICU 25KA Y DEMAS ACCESORIOS PARA CONEXIÓN Y MONTAJE	UN	1,00	$ 7.277.853,00	$ 7.277.853,00	1,00	$ 7.277.853,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
4,5,35	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DOS DUCTOS PVC DE 2" POR PLACA O MURO - ACOMETIDA TABLERO GENERAL RED VITAL (TRANSFERENCIA Y TABLERO)	ML	24,20	$ 21.768,00	$ 526.786,00	24,20	$ 526.786,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
4,5,36	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA PARCIAL RED VITAL (TRANSFERENCIA Y TABLERO) EN CABLE DE COBRE CON AISLAMIENTO LIBRE DE HALOGENOS THHN 3X2/0+2/0N+4T	ML	31,70	$ 383.984,00	$ 12.172.293,00	31,70	$ 12.172.293,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
4,5,37	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TRANSFERENCIA AUTOMATICA POR BREAKERS MOTORIZADOS DE 75KVA (RED EMERGENCIA DOS), INCLUYE: GABINETE METALICO DE 1,8M X1,0M X 0,4M, DOS BREAKER MOTORIZADOS DE 200 AMPERIOS CON BOBINA DE DISPARO, ENCLAVAMIENTO MECANICO PARA BREAKERS, MODULO ELECTRONICO DE TRANSFERENCIA AUTOMATICA, PILOTOS DE SEÑALIZACIÓN, SELECTORES Y DEMAS ELEMENTOS PARA INSTALACIÓN Y MONTAJE	UN	1,00	$ 30.724.407,00	$ 30.724.407,00	1,00	$ 30.724.407,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
4,5,38	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO GENERAL RED VITAL, INCLUYE: GABINETE METALICO DE 1,8M X 1,2M X 0,4M, BARRAJE TRIFÁSICO DE 30X10MM (220 AMPERIOS), ONCE (11) BREAKER DE 3X30A ICU 50KA Y DEMAS ACCESORIOS PARA CONEXIÓN Y MONTAJE	UN	1,00	$ 12.719.045,00	$ 12.719.045,00	1,00	$ 12.719.045,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
	SUBTOTAL				**$ 1.043.606.630,00**		**$ 1.043.606.630,00**		**$ -**		**$ -**		**$ -**	
4,6	**ACOMETIDAS, TABLEROS PARCIALES E INSTALACIONES INTERNAS RED EMERGENCIA**													
4,6,1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESCALERILLA METALICA PORTA CONDUCTORES DE 400X100MM, INCLUYE ACCESORIOS PARA FIJACIÓN A PARED Y AMARRES CONDUCTORES - RED DE EMERGENCIA	ML	60,00	$ 198.051,00	$ 11.883.060,00	60,00	$ 11.883.060,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-

19618

CONTRATO N°	511 de 2023	PROYECTO N°	2021005500331
ACTA DE PAGO PARCIAL N°	3	PERIODO ACTA DE PAGO PARCIAL:	28/9/2024 a 31/10/2024
OBJETO CONTRATO:	AMPLIACIÓN DE LA CAPACIDAD INSTALADA DEL HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE VILLAVICENCIO ESE - META	OBJETO PROYECTO:	AMPLIACIÓN DE LA CAPACIDAD INSTALADA DEL HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE VILLAVICENCIO ESE - META
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	$ 80.389.497.271,00	VALOR TOTAL DEL PROYECTO:	$ 84.208.944.899,00
CONTRATISTA:	CONSORCIO HOSPITAL 002	CONTRATO DE INTERVENTORIA N°	572 DE 2023
NIT:	901.752.517-0	INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTER HOSPITAL
CORREO ELECTRONICO CONTRATISTA:	coordinador.hospital@cyg.com.co	CORREO ELECTRONICO INTERVENTORIA:	coninterhospital2023@gmail.com
SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORIA	ING. GINA TATIANA ELAICA NIETO	APOYO A LA SUPERVISION:	DAVID ASHBEL FLOREZ SIERRA
CORREO ELECTRONICO INTERVENTORIA:	coninterhospital2023@gmail.com	CONTRATO DE APOYO A LA SUPERVISION N°	765 DE 2023
FECHA DE INICIACIÓN:	12/12/2023	FECHA PRESENTE ACTA:	15/11/2024

N° ITEM	CONDICIONES INICIALES					CONDICIONES ACTUALIZADAS Acta de Modificación No. 2 de fecha 12/09/2024		OBRA EJECUTADA						
								ACTAS ANTERIORES		PRESENTE ACTA		ACUMULADO		
	DESCRIPCION	UND	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	%
4,6,2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESCALERILLA METALICA PORTA CONDUCTORES DE 400X100MM, INCLUYE ACCESORIOS PARA FIJACIÓN A PARED Y AMARRES CONDUCTORES - RED DE EMERGENCIA - REGULADA	ML	60,00	$ 198.051,00	$ 11.883.060,00	60,00	$ 11.883.060,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
4,6,3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA DE PASO 30X30 PARA ACOMETIDAS PARCIALES ASCENSORES	UN	10,00	$ 334.872,00	$ 3.348.720,00	10,00	$ 3.348.720,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
4,6,4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA METALICA EMT 4 DUCTOS DE 2" SOBREPUESTA ACOMETIDAS GABINETES ASCENSORES; INCLUYE ACCESORIOS DE SOPORTE	ML	48,00	$ 342.566,00	$ 16.443.168,00	48,00	$ 16.443.168,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
4,6,5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA METALICA EMT DE 2" SOBREPUESTA ACOMETIDAS GABINETES ASCENSORES; INCLUYE ACCESORIOS DE SOPORTE	ML	229,10	$ 108.933,00	$ 24.956.550,00	229,10	$ 24.956.550,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
4,6,6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ACOMETIDA PARCIAL EN CABLE DE COBRE CON AISLAMIENTO LIBRE DE HALOGENOS THHN 3X1/0+1/0N+4T	ML	406,90	$ 375.266,00	$ 152.695.735,00	406,90	$ 152.695.735,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
4,6,7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GABINETE CONTROL ASCENSORES, INCLUYE: GABINETE METALICO DE 0,6M X 0,6M X 0,3M CON SELECTOR DE BLOQUEO PARA MANTENIMIENTO, BARRAJE (NEUTRO Y TIERRA) DE 12X2MM (110 AMPERIOS), BREAKER DE 3X70A ICU 25KA, Y DEMAS ACCESORIOS PARA CONEXIÓN Y MONTAJE	UN	6,00	$ 3.363.140,00	$ 20.178.840,00	6,00	$ 20.178.840,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
4,6,8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA DE PASO 30X30 PARA ACOMETIDAS PARCIALES RED NORMAL Y REGULADA	UN	35,00	$ 334.872,00	$ 11.720.520,00	35,00	$ 11.720.520,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
4,6,9	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA METALICA EMT DE 1 1/4" SOBREPUESTA; INCLUYE ACCESORIOS DE SOPORTE - TABLEROS EMERGENCIA Y REGULADOS	ML	95,80	$ 80.802,00	$ 7.740.832,00	95,80	$ 7.740.832,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
4,6,10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UN DUCTO PVC DE 1" POR PLACA O MURO -	ML	11,90	$ 11.378,00	$ 135.398,00	11,90	$ 135.398,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
4,6,11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UN DUCTO PVC SCH40 DE 1 1/4" POR CIELO FALSO; INCLUYE ACCESORIOS DE SOPORTE - RED DE EMERGENCIA	ML	644,30	$ 58.994,00	$ 38.009.834,00	644,30	$ 38.009.834,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
4,6,12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DOS DUCTOS PVC SCH40 DE 2" POR CIELO FALSO O BUITRON; INCLUYE ACCESORIOS DE SOPORTE - RED EMERGENCIA SEPTIMO PISO SFV	ML	52,80	$ 94.595,00	$ 4.994.616,00	52,80	$ 4.994.616,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
4,6,13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ACOMETIDA EN CABLE DE COBRE CON AISLAMIENTO LIBRE DE HALOGENOS THHN 3X8+8N+8T	ML	346,40	$ 75.676,00	$ 26.214.166,00	346,40	$ 26.214.166,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
4,6,14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ACOMETIDA EN CABLE DE COBRE CON AISLAMIENTO LIBRE DE HALOGENOS THHN 3X2+2N+8T	ML	88,10	$ 225.374,00	$ 19.855.449,00	88,10	$ 19.855.449,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
4,6,15	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ACOMETIDA EN CABLE DE COBRE CON AISLAMIENTO LIBRE DE HALOGENOS THHN 3X6+6N+8T	ML	14,20	$ 107.535,00	$ 1.526.997,00	14,20	$ 1.526.997,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
4,6,16	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ACOMETIDA EN CABLE DE COBRE CON AISLAMIENTO LIBRE DE HALOGENOS THHN 3X4+4N+8T	ML	335,20	$ 161.397,00	$ 54.100.274,00	335,20	$ 54.100.274,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
4,6,17	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ACOMETIDA EN CABLE DE COBRE CON AISLAMIENTO LIBRE DE HALOGENOS THHN 1X8+8N+8T	ML	156,10	$ 47.254,00	$ 7.376.349,00	156,10	$ 7.376.349,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
4,6,18	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA EN CABLE DE COBRE CON AISLAMIENTO LIBRE DE HALOGENOS THHN 3X1/0+6T	ML	65,70	$ 278.609,00	$ 18.304.611,00	65,70	$ 18.304.611,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
4,6,19	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO PARCIAL DE 12 CIRCUITOS CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR Y TOTALIZADOR DE 3X30A ICU 25KA	UN	3,00	$ 1.530.957,00	$ 4.592.871,00	3,00	$ 4.592.871,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
4,6,20	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO PARCIAL DE 30 CIRCUITOS CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR Y TOTALIZADOR DE 3X100A ICU 25KA	UN	2,00	$ 2.582.402,00	$ 5.164.804,00	2,00	$ 5.164.804,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
4,6,21	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO PARCIAL DE 12 CIRCUITOS CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR Y TOTALIZADOR DE 3X40A ICU 25KA	UN	1,00	$ 1.625.945,00	$ 1.625.945,00	1,00	$ 1.625.945,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
4,6,22	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO PARCIAL DE 18 CIRCUITOS CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR Y TOTALIZADOR DE 3X63A ICU 25KA	UN	3,00	$ 2.015.788,00	$ 6.047.364,00	3,00	$ 6.047.364,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
4,6,23	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO PARCIAL DE 24 CIRCUITOS CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR Y TOTALIZADOR DE 3X80A ICU 25KA	UN	1,00	$ 2.316.939,00	$ 2.316.939,00	1,00	$ 2.316.939,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
4,6,24	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO PARCIAL DE 18 CIRCUITOS CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR Y TOTALIZADOR DE 3X80A ICU 25KA	UN	1,00	$ 2.015.788,00	$ 2.015.788,00	1,00	$ 2.015.788,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
4,6,25	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO PARCIAL DE 24 CIRCUITOS CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR Y TOTALIZADOR DE 3X70A ICU 25KA	UN	2,00	$ 2.316.939,00	$ 4.633.878,00	2,00	$ 4.633.878,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
4,6,26	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO PARCIAL DE 12 CIRCUITOS CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR Y TOTALIZADOR DE 3X50A ICU 25KA	UN	2,00	$ 1.650.852,00	$ 3.301.704,00	2,00	$ 3.301.704,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
4,6,27	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO PARCIAL DE 18 CIRCUITOS CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR Y TOTALIZADOR DE 3X70A ICU 25KA	UN	2,00	$ 2.015.788,00	$ 4.031.576,00	2,00	$ 4.031.576,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-

CONTRATO N°	511 de 2023	PROYECTO N°	2021005500331
ACTA DE PAGO PARCIAL N°	3	PERIODO ACTA DE PAGO PARCIAL:	28/9/2024 a 31/10/2024
OBJETO CONTRATO:	AMPLIACIÓN DE LA CAPACIDAD INSTALADA DEL HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE VILLAVICENCIO ESE - META	OBJETO PROYECTO:	AMPLIACIÓN DE LA CAPACIDAD INSTALADA DEL HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE VILLAVICENCIO ESE - META
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	$ 80.389.497.271,00	VALOR TOTAL DEL PROYECTO:	$ 84.208.944.899,00
CONTRATISTA:	CONSORCIO HOSPITAL 002	CONTRATO DE INTERVENTORIA N°	572 DE 2023
NIT:	901.752.517-0	INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTER HOSPITAL
CORREO ELECTRONICO CONTRATISTA:	coordinador.hospital@cyg.com.co	CORREO ELECTRONICO INTERVENTORIA:	coninterhospital2023@gmail.com
SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORIA	ING. GINA TATIANA ELAICA NIETO	APOYO A LA SUPERVISION:	DAVID ASHBEL FLOREZ SIERRA
CORREO ELECTRONICO INTERVENTORIA:	coninterhospital2023@gmail.com	CONTRATO DE APOYO A LA SUPERVISION N°	765 DE 2023
FECHA DE INICIACIÓN:	12/12/2023	FECHA PRESENTE ACTA:	15/11/2024

N° ITEM	CONDICIONES INICIALES					CONDICIONES ACTUALIZADAS Acta de Modificación No. 2 de fecha 12/09/2024		OBRA EJECUTADA						
								ACTAS ANTERIORES		PRESENTE ACTA		ACUMULADO		
	DESCRIPCION	UND	CANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	%
4,6,28	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO PARCIAL DE 8 CIRCUITOS	UN	1,00	$ 664.728,00	$ 664.728,00	1,00	$ 664.728,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
4,6,29	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO PARCIAL RED REGULADA DE 8 CIRCUITOS	UN	7,00	$ 664.728,00	$ 4.653.096,00	7,00	$ 4.653.096,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
4,6,30	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO PARCIAL RED REGULADA DE 12 CIRCUITOS CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR Y TOTALIZADOR DE 3X30A ICU 25KA	UN	9,00	$ 1.530.957,00	$ 13.778.613,00	9,00	$ 13.778.613,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
4,6,31	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO PARCIAL RED REGULADA DE 4 CIRCUITOS	UN	1,00	$ 519.720,00	$ 519.720,00	1,00	$ 519.720,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
4,6,32	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO PARCIAL RED REGULADA DE 18 CIRCUITOS CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR Y TOTALIZADOR DE 3X40A ICU 25KA	UN	1,00	$ 1.990.881,00	$ 1.990.881,00	1,00	$ 1.990.881,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
4,6,33	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA DE PASO 25X25 - TOMAS NORMALES Y REGULADAS	UN	46,00	$ 301.582,00	$ 13.872.772,00	46,00	$ 13.872.772,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
4,6,34	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA METALICA EMT DE 1" PARA TOMA CORRIENTE NORMAL Y REGULADA; INCLUYE ACCESORIOS DE SOPORTE	ML	166,40	$ 68.272,00	$ 11.360.461,00	166,40	$ 11.360.461,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
4,6,35	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA METALICA EMT DE 3/4" PARA TOMA CORRIENTE NORMAL Y REGULADA; INCLUYE ACCESORIOS DE SOPORTE	ML	522,20	$ 53.867,00	$ 28.129.347,00	522,20	$ 28.129.347,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
4,6,36	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UN DUCTO PVC SCH40 DE 3/4" POR CIELO FALSO; INCLUYE ACCESORIOS DE SOPORTE - TOMA CORRIENTES NORMALES Y REGULADAS	ML	816,90	$ 39.871,00	$ 32.570.620,00	816,90	$ 32.570.620,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
4,6,37	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UN DUCTO PVC DE 1" POR PLACA O MURO	ML	148,60	$ 11.378,00	$ 1.690.771,00	148,60	$ 1.690.771,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
4,6,38	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA PARCIAL TOMAS EN CABLE DE COBRE AISLADO LIBRE DE HALOGENOS THHN 1X12+12N+12T	ML	737,70	$ 23.230,00	$ 17.136.771,00	737,70	$ 17.136.771,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
4,6,39	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA TOMACORRIENTE NORMAL EN DUCTERIA PVC (INCRUSTADA EN MURO O PLACA) Y CABLE LIBRE DE HALOGENOS NO 12	UN	1.024,00	$ 165.755,00	$ 169.733.120,00	1.024,00	$ 169.733.120,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
4,6,40	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA TOMACORRIENTE ESPECIAL MONOFÁSICA 20A EN DUCTERIA PVC (INCRUSTADA EN MURO O PLACA) Y CABLE LIBRE DE HALOGENOS NO 12 - CUARTO PISO	UN	5,00	$ 204.858,00	$ 1.024.290,00	5,00	$ 1.024.290,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
4,6,41	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA TOMACORRIENTE NORMAL EN DUCTERIA EMT (A LA VISTA) Y CABLE LIBRE DE HALOGENOS NO 12	UN	18,00	$ 284.969,00	$ 5.129.442,00	18,00	$ 5.129.442,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
4,6,42	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARATOMACORRIENTE TIPO GFCI EN DUCTERIA PVC (INCRUSTADA EN MURO O PLACA) Y CABLE LIBRE DE HALOGENOS NO 12	UN	71,00	$ 255.411,00	$ 18.134.181,00	71,00	$ 18.134.181,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
4,6,43	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA SIN TOMA (FLUXOMETRO) EN DUCTERIA PVC (INCRUSTADA EN MURO O PLACA) Y CABLE LIBRE DE HALOGENOS NO 12	UN	92,00	$ 147.180,00	$ 13.540.560,00	92,00	$ 13.540.560,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
4,6,44	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARATOMACORRIENTE REGULADA EN DUCTERIA EMT 3/4" (A LA VISTA) Y CABLE LIBRE DE HALOGENOS NO 12 -	UN	5,00	$ 398.048,00	$ 1.990.240,00	5,00	$ 1.990.240,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
4,6,45	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARATOMACORRIENTE REGULADA EN DUCTERIA PVC 3/4" (INCRUSTADA EN MURO O PLACA) Y CABLE LIBRE DE HALOGENOS NO 12 - SOTANO DOS	UN	372,00	$ 251.570,00	$ 93.584.040,00	372,00	$ 93.584.040,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
4,6,46	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA TOMACORRIENTE NORMAL EN DUCTERIA EMT (POR MURO O PLACA) Y CABLE LIBRE DE HALOGENOS NO 12	UN	192,00	$ 274.729,00	$ 52.747.968,00	192,00	$ 52.747.968,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
4,6,47	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA TOMACORRIENTE TIPO GFCI EN DUCTERIA EMT (POR MURO O PLACA) Y CABLE LIBRE DE HALOGENOS NO 12	UN	42,00	$ 343.225,00	$ 14.415.450,00	42,00	$ 14.415.450,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
4,6,48	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA TOMACORRIENTE GRADO HOSPITALARIO EN DUCTERIA EMT (POR MURO O PLACA) Y CABLE LIBRE DE HALOGENOS NO 12	UN	183,00	$ 396.977,00	$ 72.646.791,00	183,00	$ 72.646.791,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
	SUBTOTAL				**$ 1.034.412.910,00**		**$ 1.034.412.910,00**		**$ -**		**$ -**		**$ -**	
4,7	**ACOMETIDAS PARCIALES E INSTALACIONES INTERNAS EQUIPOS MENORES A.A.**													
4,7,1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA DE PASO 40X40 PARA ACOMETIDA EQUIPOS MENORES A.A.	UN	1,00	$ 353.019,00	$ 353.019,00	1,00	$ 353.019,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
4,7,2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA DE PASO 30X30 PARA ACOMETIDA EQUIPOS MENORES A.A.	UN	76,00	$ 334.872,00	$ 25.450.272,00	76,00	$ 25.450.272,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-

18620

CONTRATO N°	511 de 2023	PROYECTO N°	2021005500331
ACTA DE PAGO PARCIAL N°	3	PERIODO ACTA DE PAGO PARCIAL:	28/9/2024 a 31/10/2024
OBJETO CONTRATO:	AMPLIACIÓN DE LA CAPACIDAD INSTALADA DEL HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE VILLAVICENCIO ESE - META	OBJETO PROYECTO:	AMPLIACIÓN DE LA CAPACIDAD INSTALADA DEL HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE VILLAVICENCIO ESE - META
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	$ 80.389.497.271,00	VALOR TOTAL DEL PROYECTO:	$ 84.208.944.899,00
CONTRATISTA:	CONSORCIO HOSPITAL 002	CONTRATO DE INTERVENTORIA N°	572 DE 2023
NIT:	901.752.517-0	INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTER HOSPITAL
CORREO ELECTRONICO CONTRATISTA:	coordinador.hospital@cyg.com.co	CORREO ELECTRONICO INTERVENTORIA:	coninterhospital2023@gmail.com
SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORIA	ING. GINA TATIANA ELAICA NIETO	APOYO A LA SUPERVISION:	DAVID ASHBEL FLOREZ SIERRA
CORREO ELECTRONICO INTERVENTORIA:	coninterhospital2023@gmail.com	CONTRATO DE APOYO A LA SUPERVISION N°	765 DE 2023
FECHA DE INICIACIÓN:	12/12/2023	FECHA PRESENTE ACTA:	15/11/2024

N° ITEM	CONDICIONES INICIALES					CONDICIONES ACTUALIZADAS Acta de Modificación No. 2 de fecha 12/09/2024		OBRA EJECUTADA						
								ACTAS ANTERIORES		PRESENTE ACTA		ACUMULADO		
	DESCRIPCION	UND	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	%
4,7,3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUATRO DUCTOS PVC SCH40 DE 2" POR CIELO FALSO O BUITRON; INCLUYE ACCESORIOS DE SOPORTE - ACOMETIDAS EQUIPOS MENORES A.A.	ML	45,90	$ 135.288,00	$ 6.209.719,00	45,90	$ 6.209.719,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
4,7,4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TRES DUCTOS PVC SCH40 DE 2" POR CIELO FALSO O BUITRON; INCLUYE ACCESORIOS DE SOPORTE - ACOMETIDAS EQUIPOS MENORES A.A.	ML	67,30	$ 115.189,00	$ 7.752.220,00	67,30	$ 7.752.220,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
4,7,5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DOS DUCTOS PVC SCH40 DE 2" POR CIELO FALSO O BUITRON; INCLUYE ACCESORIOS DE SOPORTE - ACOMETIDAS EQUIPOS MENORES A.A.	ML	111,50	$ 94.595,00	$ 10.547.343,00	111,50	$ 10.547.343,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
4,7,6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UN DUCTO PVC SCH40 DE 2" POR CIELO FALSO O BUITRON; INCLUYE ACCESORIOS DE SOPORTE - ACOMETIDAS EQUIPOS MENORES A.A.	ML	94,10	$ 65.548,00	$ 6.168.067,00	94,10	$ 6.168.067,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
4,7,7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UN DUCTO PVC SCH40 DE 1" POR CIELO FALSO; INCLUYE ACCESORIOS DE SOPORTE - ACOMETIDAS EQUIPOS MENORES A.A.	ML	119,20	$ 61.031,00	$ 7.274.895,00	119,20	$ 7.274.895,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
4,7,8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UN DUCTO PVC SCH40 DE 3/4" POR CIELO FALSO; INCLUYE ACCESORIOS DE SOPORTE - ACOMETIDAS EQUIPOS MENORES A.A.	ML	1.066,20	$ 39.871,00	$ 42.510.460,00	1.066,20	$ 42.510.460,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
4,7,9	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA METALICA EMT CUATRO DUCTOS DE 2" SOBREPUESTA ACOMETIDAS EQUIPOS MENORES A.A. ; INCLUYE ACCESORIOS DE SOPORTE	ML	5,80	$ 342.566,00	$ 1.986.883,00	5,80	$ 1.986.883,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
4,7,10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA METALICA EMT DE 1 1/4" SOBREPUESTA; INCLUYE ACCESORIOS DE SOPORTE - EQUIPOS MENORES A.A.	ML	63,60	$ 80.802,00	$ 5.139.007,00	63,60	$ 5.139.007,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
4,7,11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA METALICA EMT DE 1" SOBREPUESTA; INCLUYE ACCESORIOS DE SOPORTE - EQUIPOS MENORES A.A.	ML	52,90	$ 68.272,00	$ 3.611.589,00	52,90	$ 3.611.589,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
4,7,12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA METALICA EMT DE 3/4" SOBREPUESTA; INCLUYE ACCESORIOS DE SOPORTE - EQUIPOS MENORES A.A.	ML	104,00	$ 53.867,00	$ 5.602.168,00	104,00	$ 5.602.168,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
4,7,13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CORAZA AMERICANA DE 1" SOBREPUESTA; INCLUYE ACCESORIOS DE SOPORTE - EQUIPOS MENORES A.A.	ML	22,10	$ 23.016,00	$ 508.654,00	22,10	$ 508.654,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
4,7,14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CORAZA AMERICANA DE 3/4" SOBREPUESTA; INCLUYE ACCESORIOS DE SOPORTE - EQUIPOS MENORES A.A.	ML	108,70	$ 18.970,00	$ 2.062.039,00	108,70	$ 2.062.039,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
4,7,15	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA PARCIAL EQUIPOS MENORES A.A. EN CABLE DE COBRE AISLADO LIBRE DE HALOGENOS THHN 3X10+10T -	ML	32,20	$ 41.904,00	$ 1.349.309,00	32,20	$ 1.349.309,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
4,7,16	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA PARCIAL EQUIPOS MENORES A.A. EN CABLE DE COBRE AISLADO LIBRE DE HALOGENOS THHN 3X12+12T -	ML	236,40	$ 30.129,00	$ 7.122.496,00	236,40	$ 7.122.496,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
4,7,17	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA PARCIAL EQUIPOS MENORES A.A. EN CABLE DE COBRE AISLADO LIBRE DE HALOGENOS THHN 2X12+12T -	ML	6.009,10	$ 23.230,00	$ 139.591.393,00	6.009,10	$ 139.591.393,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
4,7,18	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA TOMACORRIENTE BIFÁSICO AIRES ACONDICIONADOS (NO INCLUYE DUCTERIA NI CABLE) -	UN	162,00	$ 93.423,00	$ 15.134.526,00	162,00	$ 15.134.526,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
	SUBTOTAL				**$ 288.374.059,00**		**$ 288.374.059,00**		**$ -**		**$ -**		**$ -**	
4,8	**ACOMETIDAS PARCIALES, TABLEROS PARCIALES E INSTALACIONES INTERNAS RED VITAL**													
4,8,1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESCALERILLA METALICA PORTA CONDUCTORES DE 400X100MM, INCLUYE ACCESORIOS PARA FIJACIÓN A PARED Y AMARRES CONDUCTORES - RED VITAL	ML	60,00	$ 198.051,00	$ 11.883.060,00	60,00	$ 11.883.060,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
4,8,2	CONSTRUCCIÓN CANALIZACIÓN PARA RED DE BAJA TENSIÓN SIMILAR A NORMA CODENSA CS207 PARA DOS DUCTOS PVC DE 2" - ILUMINACIÓN EXTERIOR	ML	205,70	$ 69.844,00	$ 14.366.911,00	205,70	$ 14.366.911,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
4,8,3	CONSTRUCCIÓN CANALIZACIÓN PARA RED DE BAJA TENSIÓN SIMILAR A NORMA CODENSA CS207 PARA DOS DUCTOS PVC DE 1" - ALIMENTACIÓN MASTILES METALICOS - ILUMINACIÓN EXTERIOR	ML	47,20	$ 48.391,00	$ 2.284.055,00	47,20	$ 2.284.055,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
4,8,4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA DE PASO 25X25 - ILUMINACIÓN EXTERIOR	UN	2,00	$ 301.582,00	$ 603.164,00	2,00	$ 603.164,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
4,8,5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UN DUCTO PVC DE 1" POR PLACA O MURO - ILUMINACIÓN EXTERIOR	ML	84,80	$ 11.378,00	$ 964.854,00	84,80	$ 964.854,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-

CONTRATO N°	511 de 2023	PROYECTO N°	2021005500331
ACTA DE PAGO PARCIAL N°	3	PERIODO ACTA DE PAGO PARCIAL:	28/9/2024 a 31/10/2024
OBJETO CONTRATO:	AMPLIACIÓN DE LA CAPACIDAD INSTALADA DEL HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE VILLAVICENCIO ESE - META	OBJETO PROYECTO:	AMPLIACIÓN DE LA CAPACIDAD INSTALADA DEL HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE VILLAVICENCIO ESE - META
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	$ 80.389.497.271,00	VALOR TOTAL DEL PROYECTO:	$ 84.208.944.899,00
CONTRATISTA:	CONSORCIO HOSPITAL 002	CONTRATO DE INTERVENTORIA N°	572 DE 2023
NIT:	901.752.517-0	INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTER HOSPITAL
CORREO ELECTRONICO CONTRATISTA:	coordinador.hospital@cyg.com.co	CORREO ELECTRONICO INTERVENTORIA:	coninterhospital2023@gmail.com
SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORIA	ING. GINA TATIANA ELAICA NIETO	APOYO A LA SUPERVISION:	DAVID ASHBEL FLOREZ SIERRA
CORREO ELECTRONICO INTERVENTORIA:	coninterhospital2023@gmail.com	CONTRATO DE APOYO A LA SUPERVISION N°	765 DE 2023
FECHA DE INICIACIÓN:	12/12/2023	FECHA PRESENTE ACTA:	15/11/2024

N° ITEM	CONDICIONES INICIALES					CONDICIONES ACTUALIZADAS Acta de Modificacion No. 2 de fecha 12/09/2024		OBRA EJECUTADA						
								ACTAS ANTERIORES		PRESENTE ACTA		ACUMULADO		
	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	%
4,8,6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA METALICA EMT DE 1 1/4" SOBREPUESTA; INCLUYE ACCESORIOS DE SOPORTE -	ML	118,50	$ 80.802,00	$ 9.575.037,00	118,50	$ 9.575.037,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
4,8,7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ACOMETIDA EN CABLE DE COBRE CON AISLAMIENTO LIBRE DE HALOGENOS THHN 3X8+8N+8T	ML	117,70	$ 75.676,00	$ 8.907.065,00	117,70	$ 8.907.065,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
4,8,8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CIRCUITO ILUMINACIÓN EXTERIOR EN CABLE DE ALUMINIO SERIE 8000 CON AISLAMIENTO LIBRE DE HALOGENOS THHN 3X6+6T	ML	223,70	$ 38.362,00	$ 8.581.579,00	223,70	$ 8.581.579,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
4,8,9	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA PARCIAL ILUMINACIÓN EXTERIOR EN CABLE DE COBRE AISLADO LIBRE DE HALOGENOS THHN 2X12+12T	ML	256,50	$ 23.230,00	$ 5.958.495,00	256,50	$ 5.958.495,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
4,8,10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GABINETE CONTROL ILUMINACIÓN SOTANO DOS, INCLUYE: GABINETE METALICO DE 0,8M X 0,8M X 0,4M, BREAKER GENERAL DE 3X30A ICU 25KA, BARRAJE TRIFÁSICO DE 12X2MM (110 AMPERIOS), TRES (3) BREAKER DE 1X20A ICU 25KA Y DEMAS ACCESORIOS PARA CONEXIÓN Y MONTAJE	UN	1,00	$ 4.257.231,00	$ 4.257.231,00	1,00	$ 4.257.231,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
4,8,11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GABINETE CONTROL ILUMINACIÓN SOTANO UNO, INCLUYE: GABINETE METALICO DE 0,8M X 0,8M X 0,4M, BREAKER GENERAL DE 3X30A ICU 25KA, BARRAJE TRIFÁSICO DE 12X2MM (110 AMPERIOS), UN(1) BREAKER DE 3X20A ICU 25KA, TRES (3) BREAKER DE 1X20A ICU 25KA, UN CONTACTOR DE 30 EN AC3 CONTROLADO POR RELOJ PROGRAMABLE. PROGRAMADOR HORARIO Y DEMAS ACCESORIOS PARA CONEXIÓN Y MONTAJE	UN	1,00	$ 5.546.473,00	$ 5.546.473,00	1,00	$ 5.546.473,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
4,8,12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO PARCIAL DE 12 CIRCUITOS CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR Y TOTALIZADOR DE 3X30A ICU 25KA	UN	9,00	$ 1.530.957,00	$ 13.778.613,00	9,00	$ 13.778.613,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
4,8,13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA ILUMINACIÓN EN DUCTERIA PVC SCH40 (POR CIELO FALSO) Y CABLE LIBRE DE HALOGENOS NO 12	UN	1.922,00	$ 241.679,00	$ 464.507.038,00	1.922,00	$ 464.507.038,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
4,8,14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA ILUMINACIÓN EN DUCTERIA EMT (A LA VISTA) Y CABLE LIBRE DE HALOGENOS NO 12	UN	472,00	$ 338.093,00	$ 159.579.896,00	472,00	$ 159.579.896,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
4,8,15	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA PANEL LED CUADRADO 40W ;	UN	1.068,00	$ 283.091,00	$ 302.341.188,00	1.068,00	$ 302.341.188,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
4,8,16	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA HERMETICA LED 40W	UN	306,00	$ 269.391,00	$ 82.433.646,00	306,00	$ 82.433.646,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
4,8,17	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA PANEL LED REDONDO 24W -	UN	297,00	$ 92.486,00	$ 27.468.342,00	297,00	$ 27.468.342,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
4,8,18	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA LED AVISO SALIDA 3W;	UN	61,00	$ 169.782,00	$ 10.356.702,00	61,00	$ 10.356.702,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
4,8,19	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA EMERGENCIA LED 3W;	UN	278,00	$ 157.358,00	$ 43.745.524,00	278,00	$ 43.745.524,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
4,8,20	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SENSOR DE MOVIMIENTO 600W	UN	171,00	$ 128.058,00	$ 21.897.918,00	171,00	$ 21.897.918,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
4,8,21	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EMPALME DE DERIVACIÓN EN GEL TIPO GHFC-1; RANGO DE APLICACIÓN PRINCIPAL DE CABLE 2 A 2/0 Y DERIVACIÓN DE 14 A 6 - ILUMINACIÓN EXTERIOR	UN	81,00	$ 81.538,00	$ 6.604.578,00	81,00	$ 6.604.578,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
4,8,22	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE PUESTA A TIERRA PARA MASTILES METALICOS EN CIMENTACIÓN, INCLUYE VARILLA DE COBRE DE 5/8" X 2,4M, CABLE DE COBRE NO 1/0 AWG Y TERMINALES DE PONCHAR - ILUMINACIÓN EXTERIOR	UN	27,00	$ 448.677,00	$ 12.114.279,00	27,00	$ 12.114.279,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
4,8,23	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MASTIL METALICO DE 3M CERTIFICADO - ILUMINACIÓN EXTERIOR	UN	27,00	$ 1.683.598,00	$ 45.457.146,00	27,00	$ 45.457.146,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
4,8,24	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA LED TIPO EXTERIOR SKYLINE 45W	UN	27,00	$ 2.590.930,00	$ 69.955.110,00	27,00	$ 69.955.110,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
	SUBTOTAL			Subtotal	**$ 1.333.167.904,00**		**$ 1.333.167.904,00**		**$ -**		**$ -**		**$ -**	
4,9	**SISTEMA DE PROTECCIÓN CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS**													
4,9,1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LINEA DE CONTINUIDAD PARA SISTEMA DE APANTALLAMIENTO EN CABLE DE COBRE DESNUDO NO 1/0, INSTALADO EN LA EXCAVACIÓN Y BAJANTES DE CUBIERTA	ML	503,30	$ 77.698,00	$ 39.105.403,00	503,30	$ 39.105.403,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
4,9,2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUNTA FRANKLYN DE 0,6M PARA SISTEMA DE APANTALLAMIENTO, INCLUYE SOPORTE PARA FIJACIÓN SOBRE CUBIERTA, CONEXION A ALAMBRON ALUMINIO ALEACIÓN 6201 CON CONECTOR ESPECIAL PARA DERIVACION ALAMBRON - ALAMBRON.	UN	32,00	$ 703.994,00	$ 22.527.808,00	32,00	$ 22.527.808,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
4,9,3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALAMBRON DE ALUMINIO ALEACIÓN 6201	ML	195,90	$ 15.349,00	$ 3.006.869,00	195,90	$ 3.006.869,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
4,9,4	SOPORTE PARA CONDUCTOR DEHNSNAP PLASTICO GRIS - M6	UN	143,00	$ 37.128,00	$ 5.309.304,00	143,00	$ 5.309.304,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-

18622

CONTRATO N°	511 de 2023	PROYECTO N°	2021005500331
ACTA DE PAGO PARCIAL N°	3	PERIODO ACTA DE PAGO PARCIAL:	28/9/2024 a 31/10/2024
OBJETO CONTRATO:	AMPLIACIÓN DE LA CAPACIDAD INSTALADA DEL HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE VILLAVICENCIO ESE - META	OBJETO PROYECTO:	AMPLIACIÓN DE LA CAPACIDAD INSTALADA DEL HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE VILLAVICENCIO ESE - META
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	$ 80.389.497.271,00	VALOR TOTAL DEL PROYECTO:	$ 84.208.944.899,00
CONTRATISTA:	CONSORCIO HOSPITAL 002	CONTRATO DE INTERVENTORIA N°	572 DE 2023
NIT:	901.752.517-0	INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTER HOSPITAL
CORREO ELECTRONICO CONTRATISTA:	coordinador.hospital@cyg.com.co	CORREO ELECTRONICO INTERVENTORIA:	coninterhospital2023@gmail.com
SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORIA	ING. GINA TATIANA ELAICA NIETO	APOYO A LA SUPERVISION:	DAVID ASHBEL FLOREZ SIERRA
CORREO ELECTRONICO INTERVENTORIA:	coninterhospital2023@gmail.com	CONTRATO DE APOYO A LA SUPERVISION N°	765 DE 2023
FECHA DE INICIACIÓN:	12/12/2023	FECHA PRESENTE ACTA:	15/11/2024

N° ITEM	CONDICIONES INICIALES					CONDICIONES ACTUALIZADAS Acta de Modificación No. 2 de fecha 12/09/2024		OBRA EJECUTADA						
								ACTAS ANTERIORES		PRESENTE ACTA		ACUMULADO		
	DESCRIPCION	UND	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	%
4,9,5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE ELECTRODO PUESTA A TIERRA SIPRA, INCLUYE VARILLA DE COBRE DE 5/8" X 2,4M Y SOLDADURA EXOTERMICA VARILLA - CABLE.	UN	16,00	$ 367.837,00	$ 5.885.392,00	16,00	$ 5.885.392,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
4,9,6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOLDADURA EXOTERMICA CABLE - CABLE	UN	8,00	$ 62.502,00	$ 500.016,00	8,00	$ 500.016,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
4,9,7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR CRUZ PARALELO ALAMBRON ALUMINIO - ALAMBRON ALUMINIO	UN	6,00	$ 152.078,00	$ 912.468,00	6,00	$ 912.468,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
4,9,8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR BIMETALICO ALAMBRON ALUMINIO - COBRE	UN	6,00	$ 130.132,00	$ 780.792,00	6,00	$ 780.792,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
4,9,9	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UN DUCTO PVC 1" INCRUSTADO EN MURO PARA SISTEMA DE APANTALLAMIENTO	ML	180,00	$ 11.378,00	$ 2.048.040,00	180,00	$ 2.048.040,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
4,9,10	CONSTRUCCIÓN CAJA DE INSPECCIÓN PUESTA A TIERRA AP280	UN	8,00	$ 329.765,00	$ 2.638.120,00	8,00	$ 2.638.120,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
	SUBTOTAL				**$ 82.714.212,00**		**$ 82.714.212,00**		**$ -**		**$ -**		**$ -**	
4,10	**SISTEMA FOTOVOLTAICO ON GRID**													
4,10,1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA DE SOPORTE PARA PANELES EN PERFILES DE ALUMINIO INCLUYE BORNERAS DE PUESTA A TIERRA, SOPORTES DE FIJACION A TECHO Y PANELES.	UN	72,00	$ 544.093,00	$ 39.174.696,00	72,00	$ 39.174.696,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
4,10,2	INSTALACIÓN DE PANEL SOLAR MONOCRISTALINO DE 450WP.	UN	72,00	$ 132.382,00	$ 9.531.504,00	72,00	$ 9.531.504,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
4,10,3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MICROINVERSOR ENPHASE IQ+	UN	72,00	$ 1.266.877,00	$ 91.215.144,00	72,00	$ 91.215.144,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
4,10,4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE CONEXIÓN PARA MICROINVERSORES IQ+ TIPO PORTRAIT	UN	72,00	$ 174.240,00	$ 12.545.280,00	72,00	$ 12.545.280,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
4,10,5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TERMINAL DE RAMAL PARA MODULOS IQ+	UN	6,00	$ 184.475,00	$ 1.106.850,00	6,00	$ 1.106.850,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
4,10,6	SUMINISTRO, INSTALACION Y CONFIGURACION DE MODULO DE COMUNICACIÓN SFV ENVOY, INCLUYE ACCESO A PLATAFORMA DE MONITOREO REMOTO	UN	1,00	$ 5.442.868,00	$ 5.442.868,00	1,00	$ 5.442.868,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
4,10,7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA PARA INTEGRACIÓN RAMALES SISTEMA FOTOVOLTAICO AC COMBINER BOX	UN	1,00	$ 6.743.363,00	$ 6.743.363,00	1,00	$ 6.743.363,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
4,10,8	CAJA METALICA DE EMPALMES USO INTEMPERIE GRADO IP67 - 100X100X100 MM	UN	6,00	$ 227.950,00	$ 1.367.700,00	6,00	$ 1.367.700,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
4,10,9	CAJA METALICA DE EMPALMES USO INTEMPERIE GRADO IP67 - 200X200X100 MM	UN	6,00	$ 318.140,00	$ 1.908.840,00	6,00	$ 1.908.840,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
4,10,10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CORAZA AMERICANA DE 1"	ML	26,70	$ 23.016,00	$ 614.527,00	26,70	$ 614.527,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
4,10,11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CORAZA AMERICANA DE 2"	ML	6,70	$ 61.358,00	$ 411.099,00	6,70	$ 411.099,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
4,10,12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PARCIAL CONEXIÓN RAMALES SFV EN CABLE DE COBRE AISLADO LIBRE DE HALOGENOS THHN 2X10+10T	ML	26,70	$ 33.702,00	$ 899.843,00	26,70	$ 899.843,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
	SUBTOTAL				**$ 170.961.714,00**		**$ 170.961.714,00**		**$ -**		**$ -**		**$ -**	
	SUBTOTAL COMPONENTE ELECTRICO				**$ 6.228.592.484,00**		**$ 6.228.592.484,00**		**$ -**		**$ -**		**$ -**	
5	COMPONENTE VOZ Y DATOS CCTV YSISTEMA DE DETECCION DE INCENDIOS													
5,1	**REDES GENERALES Y ACOMETIDA**													
5,1,1	Suministro e instalación de Bajante en Ducto Galvanizado IMC de 2" Acometida Redes Comunicaciones	UN	1,00	$ 1.357.508,00	$ 1.357.508,00	1,00	$ 1.357.508,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
5,1,2	CAJA DE INSPECCIÓN TIPO CS 274 - AP 274, INCLUYE TAPA EN MARCO METALICO	UN	2,00	$ 679.686,00	$ 1.359.372,00	2,00	$ 1.359.372,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
5,1,3	Construcción de Caja de Inspección Similar a Norma CODENSA CS280 Para Redes de Comunicaciones	UN	1,00	$ 6.905.316,00	$ 6.905.316,00	1,00	$ 6.905.316,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
5,1,4	Construcción Canalización Para Red de Comunicaciones Similar a Norma CODENSA CS207 Para Dos Ductos PVC de 2"	ML	35,80	$ 69.844,00	$ 2.500.415,00	35,80	$ 2.500.415,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
5,1,5	Suministro e Instalación de Tuberia Metalica EMT 2 Ductos de 2" Sobrepuesta Acometida Voz Datos; Incluye Accesorios de Soporte	ML	29,00	$ 181.365,00	$ 5.259.585,00	29,00	$ 5.259.585,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
5,1,6	Suministro e Instalación de Escalerilla Metalica Porta Conductores de 400x100mm, Incluye Accesorios Para Fijación a Pared y Amarres Conductores - Red Voz y Datos	ML	35,00	$ 198.051,00	$ 6.931.785,00	35,00	$ 6.931.785,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
5,1,7	Suministro e Instalación de Escalerilla Metalica Porta Conductores de 400x100mm, Incluye Accesorios Para Fijación a Pared y Amarres Conductores - Red CCTV	ML	35,00	$ 198.051,00	$ 6.931.785,00	35,00	$ 6.931.785,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
5,1,8	Suministro e Instalación de Fibra Optica Monomodo x 12 Hilos - Conexión Racks Principal - a Racks en Cuarto y Septimo Piso	ML	79,00	$ 60.378,00	$ 4.769.862,00	79,00	$ 4.769.862,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-

CONTRATO N°	511 de 2023	PROYECTO N°	2021005500331
ACTA DE PAGO PARCIAL N°	3	PERIODO ACTA DE PAGO PARCIAL:	28/9/2024 a 31/10/2024
OBJETO CONTRATO:	AMPLIACIÓN DE LA CAPACIDAD INSTALADA DEL HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE VILLAVICENCIO ESE - META	OBJETO PROYECTO:	AMPLIACIÓN DE LA CAPACIDAD INSTALADA DEL HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE VILLAVICENCIO ESE - META
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	$ 80.389.497.271,00	VALOR TOTAL DEL PROYECTO:	$ 84.208.944.899,00
CONTRATISTA:	CONSORCIO HOSPITAL 002	CONTRATO DE INTERVENTORIA N°	572 DE 2023
NIT:	901.752.517-0	INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTER HOSPITAL
CORREO ELECTRONICO CONTRATISTA:	coordinador.hospital@cyg.com.co	CORREO ELECTRONICO INTERVENTORIA:	coninterhospital2023@gmail.com
SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORIA	ING. GINA TATIANA ELAICA NIETO	APOYO A LA SUPERVISION:	DAVID ASHBEL FLOREZ SIERRA
CORREO ELECTRONICO INTERVENTORIA:	coninterhospital2023@gmail.com	CONTRATO DE APOYO A LA SUPERVISION N°	765 DE 2023
FECHA DE INICIACIÓN:	12/12/2023	FECHA PRESENTE ACTA:	15/11/2024

N° ITEM	CONDICIONES INICIALES					CONDICIONES ACTUALIZADAS Acta de Modificación No. 2 de fecha 12/09/2024		OBRA EJECUTADA						
								ACTAS ANTERIORES		PRESENTE ACTA		ACUMULADO		
	DESCRIPCION	UND	CANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	%
5,1,9	Suministro e Instalación de Rack de Piso Para Red Comunicaciones 45UR, Voz, Datos; Incluye Switches, Patch Panel, Patch Cords, Planta IP -	UN	3,00	$ 192.529.606,00	$ 577.588.818,00	3,00	$ 577.588.818,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
5,1,10	Suministro e Instalación de Rack de Piso Para Red Comunicaciones 40UR, CCTV; Incluye Switches, Patch Panel, Patch Cords, -	UN	3,00	$ 155.674.767,00	$ 467.024.301,00	3,00	$ 467.024.301,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
	SUBTOTAL				**$ 1.080.628.747,00**		**$ 1.080.628.747,00**		**$ -**		**$ -**		**$ -**	
5,2	**RED COMUNICACIONES, VOZ, DATOS Y SISTEMA DE VIDEO**													
5,2,1	Suministro e Instalación de Caja de Paso 60x60 Para Red Voz, Datos	UN	14,00	$ 408.689,00	$ 5.721.646,00	14,00	$ 5.721.646,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
5,2,2	Suministro e Instalación de Caja de Paso 40x40 Para Red Voz, Datos	UN	4,00	$ 353.019,00	$ 1.412.076,00	4,00	$ 1.412.076,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
5,2,3	Suministro e Instalación de Caja de Paso 30x30 Para Red Voz, Datos	UN	48,00	$ 334.872,00	$ 16.073.856,00	48,00	$ 16.073.856,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
5,2,4	Suministro e Instalación de Catorce Ductos PVC de 2" por Cielo Falso; Incluye Accesorios de Soporte - Red Voz-Datos	ML	3,50	$ 324.482,00	$ 1.135.687,00	3,50	$ 1.135.687,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
5,2,5	Suministro e Instalación de Doce Ductos PVC de 2" por Cielo Falso; Incluye Accesorios de Soporte - Red Voz-Datos	ML	13,70	$ 301.221,00	$ 4.126.728,00	13,70	$ 4.126.728,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
5,2,6	Suministro e Instalación de Diez Ductos PVC de 2" por Cielo Falso; Incluye Accesorios de Soporte - Red Voz-Datos	ML	6,90	$ 248.134,00	$ 1.712.125,00	6,90	$ 1.712.125,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
5,2,7	Suministro e Instalación de Ocho Ductos PVC de 2" por Cielo Falso; Incluye Accesorios de Soporte - Red Voz-Datos	ML	23,60	$ 195.046,00	$ 4.603.086,00	23,60	$ 4.603.086,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
5,2,8	Suministro e Instalación de Seis Ductos PVC de 2" por Cielo Falso; Incluye Accesorios de Soporte - Red Voz-Datos	ML	24,40	$ 124.179,00	$ 3.029.968,00	24,40	$ 3.029.968,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
5,2,9	Suministro e Instalación de Cinco Ductos PVC de 2" por Cielo Falso; Incluye Accesorios de Soporte - Red Voz-Datos	ML	20,50	$ 112.549,00	$ 2.307.255,00	20,50	$ 2.307.255,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
5,2,10	Suministro e Instalación de Cuatro Ductos PVC de 2" por Cielo Falso; Incluye Accesorios de Soporte - Red Voz-Datos	ML	72,90	$ 100.919,00	$ 7.356.995,00	72,90	$ 7.356.995,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
5,2,11	Suministro e Instalación de Tres Ductos PVC de 2" por Cielo Falso; Incluye Accesorios de Soporte - Red Voz-Datos	ML	44,00	$ 89.288,00	$ 3.928.672,00	44,00	$ 3.928.672,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
5,2,12	Suministro e Instalación de Dos Ductos PVC de 2" por Cielo Falso; Incluye Accesorios de Soporte - Red Voz-Datos	ML	124,10	$ 68.710,00	$ 8.526.911,00	124,10	$ 8.526.911,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
5,2,13	Suministro e Instalación de Un Ducto PVC de 2" por Cielo Falso; Incluye Accesorios de Soporte - Red Voz-Datos	ML	41,40	$ 57.080,00	$ 2.363.112,00	41,40	$ 2.363.112,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
5,2,14	Suministro e Instalación de Un Ducto PVC de 3/4" por Placa o Muro Red Voz y Datos	ML	2.681,00	$ 9.144,00	$ 24.515.064,00	2.681,00	$ 24.515.064,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
5,2,15	Suministro e Instalación de Tubería Metalica EMT de 1" Para Red Voz Datos; Incluye Accesorios de Soporte -	ML	44,20	$ 68.272,00	$ 3.017.622,00	44,20	$ 3.017.622,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
5,2,16	Suministro e Instalación de Tubería Metalica EMT de 3/4" Para Red Voz Datos; Incluye Accesorios de Soporte -	ML	233,10	$ 53.867,00	$ 12.556.398,00	233,10	$ 12.556.398,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
5,2,17	Suministro e Instalación de Cable UTP Categoría 6A - Voz Datos	ML	13.423,60	$ 15.663,00	$ 210.253.847,00	13.423,60	$ 210.253.847,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
5,2,18	Suministro e Instalación de Salida Voz y Datos Certificada, no Incluye Canalización ni cable UTP, Incluye Tomas RJ 45 Categoría 6A	UN	353,00	$ 164.260,00	$ 57.983.780,00	353,00	$ 57.983.780,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
5,2,19	Suministro e Instalación de Salida Datos Certificada, no Incluye Canalización ni cable UTP, Incluye Toma RJ 45 Categoría 6A	UN	25,00	$ 120.628,00	$ 3.015.700,00	25,00	$ 3.015.700,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
5,2,20	Suministro e Instalación de Caja de Paso 30x30 Para Red CCTV	UN	41,00	$ 334.872,00	$ 13.729.752,00	41,00	$ 13.729.752,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
5,2,21	Suministro e Instalación de Tubería Metalica EMT de 1" Para Red CCTV; Incluye Accesorios de Soporte -	ML	88,70	$ 68.272,00	$ 6.055.726,00	88,70	$ 6.055.726,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
5,2,22	Suministro e Instalación de Tubería Metalica EMT de 3/4" Para Red CCTV; Incluye Accesorios de Soporte -	ML	150,40	$ 53.867,00	$ 8.101.597,00	150,40	$ 8.101.597,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
5,2,23	Suministro e Instalación de Cuatro Ductos PVC de 2" por Cielo Falso; Incluye Accesorios de Soporte - Red CCTV	ML	17,30	$ 100.919,00	$ 1.745.899,00	17,30	$ 1.745.899,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
5,2,24	Suministro e Instalación de Dos Ductos PVC de 2" por Cielo Falso; Incluye Accesorios de Soporte - Red CCTV-Datos	ML	41,90	$ 68.710,00	$ 2.878.949,00	41,90	$ 2.878.949,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
5,2,25	Suministro e Instalación de Un Ducto PVC de 2" por Cielo Falso; Incluye Accesorios de Soporte - Red CCTV-Datos	ML	2,10	$ 57.080,00	$ 119.868,00	2,10	$ 119.868,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
5,2,26	Suministro e Instalación de Dos Ductos PVC de 1 1/2" por Cielo Falso; Incluye Accesorios de Soporte - Red CCTV-Datos	ML	43,20	$ 63.323,00	$ 2.735.554,00	43,20	$ 2.735.554,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
5,2,27	Suministro e Instalación de Dos Ductos PVC de 1 1/4" por Cielo Falso; Incluye Accesorios de Soporte - Red CCTV	ML	95,80	$ 58.655,00	$ 5.619.149,00	95,80	$ 5.619.149,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
5,2,28	Suministro e Instalación de Dos Ductos PVC de 1" por Cielo Falso; Incluye Accesorios de Soporte - Red CCTV	ML	512,90	$ 55.562,00	$ 28.497.750,00	512,90	$ 28.497.750,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-

CONTRATO N°	511 de 2023	PROYECTO N°	2021005500331
ACTA DE PAGO PARCIAL N°	3	PERIODO ACTA DE PAGO PARCIAL:	28/9/2024 a 31/10/2024
OBJETO CONTRATO:	AMPLIACIÓN DE LA CAPACIDAD INSTALADA DEL HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE VILLAVICENCIO ESE - META	OBJETO PROYECTO:	AMPLIACIÓN DE LA CAPACIDAD INSTALADA DEL HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE VILLAVICENCIO ESE - META
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	$ 80.389.497.271,00	VALOR TOTAL DEL PROYECTO:	$ 84.208.944.899,00
CONTRATISTA:	CONSORCIO HOSPITAL 002	CONTRATO DE INTERVENTORIA N°	572 DE 2023
NIT:	901.752.517-0	INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTER HOSPITAL
CORREO ELECTRONICO CONTRATISTA:	coordinador.hospital@cyg.com.co	CORREO ELECTRONICO INTERVENTORIA:	coninterhospital2023@gmail.com
SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORIA	ING. GINA TATIANA ELAICA NIETO	APOYO A LA SUPERVISION:	DAVID ASHBEL FLOREZ SIERRA
CORREO ELECTRONICO INTERVENTORIA:	coninterhospital2023@gmail.com	CONTRATO DE APOYO A LA SUPERVISION N°	765 DE 2023
FECHA DE INICIACIÓN:	12/12/2023	FECHA PRESENTE ACTA:	15/11/2024

N° ITEM	CONDICIONES INICIALES					CONDICIONES ACTUALIZADAS Acta de Modificación No. 2 de fecha 12/09/2024		OBRA EJECUTADA						
								ACTAS ANTERIORES		PRESENTE ACTA		ACUMULADO		
	DESCRIPCIÓN	UND	CANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	%
5,2,29	Suministro e Instalación de Un Ducto PVC de 3/4" por Cielo Falso; Incluye Accesorios de Soporte - Red CCTV	ML	385,50	$ 33.454,00	$ 12.896.517,00	385,50	$ 12.896.517,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
5,2,30	Suministro e Instalación de Cable UTP Categoria 6A Para Camaras	ML	4.012,80	$ 15.663,00	$ 62.852.486,00	4.012,80	$ 62.852.486,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
5,2,31	Instalación de Camara Tipo Domo IP 5MP - POE -	UN	134,00	$ 43.768,00	$ 5.864.912,00	134,00	$ 5.864.912,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
	SUBTOTAL				**$ 524.738.687,00**		**$ 524.738.687,00**		$ -		$ -		$ -	
5,3	**RED SONIDO**													
5,3,1	Suministro e Instalación de Escalerilla Metalica Porta Conductores de 400x100mm, Incluye Accesorios Para Fijación a Pared y Amarres Conductores - Red Sonido	ML	35,00	$ 198.051,00	$ 6.931.785,00	35,00	$ 6.931.785,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
5,3,2	Suministro e Instalación de Strip Sonido 30x30x15	UN	8,00	$ 757.167,00	$ 6.057.336,00	8,00	$ 6.057.336,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
5,3,3	Suministro e Instalación de Un Ducto PVC de 3/4" por Cielo Falso; Incluye Accesorios de Soporte - Red Sonido	ML	911,40	$ 33.454,00	$ 30.489.976,00	911,40	$ 30.489.976,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
5,3,4	Suministro e Instalación de Cable Polarizado 2x12	ML	935,40	$ 21.921,00	$ 20.504.903,00	935,40	$ 20.504.903,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
5,3,5	Suministro e Instalación de Toma Sonido Para Parlante	UN	86,00	$ 201.944,00	$ 17.367.184,00	86,00	$ 17.367.184,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
	SUBTOTAL				**$ 81.351.184,00**		**$ 81.351.184,00**		$ -		$ -		$ -	
5,4	**RED DETECCIÓN DE INCENDIOS**													
5,4,1	Suministro e Instalación de Escalerilla Metalica Porta Conductores de 400x100mm, Incluye Accesorios Para Fijación a Pared y Amarres Conductores - Red Detección Incendios	ML	35,00	$ 198.051,00	$ 6.931.785,00	35,00	$ 6.931.785,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
5,4,2	Suministro e Instalación de Tuberia Metalica EMT de 1/2" Para Sistema Detección Incendios; Incluye Abrazaderas -	ML	3.396,70	$ 37.804,00	$ 128.408.847,00	3.396,70	$ 128.408.847,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
5,4,3	Suministro e Instalación de Detector Optico Termico (Humo o Temperatura) Direccionable	UN	767,00	$ 880.403,00	$ 675.269.101,00	767,00	$ 675.269.101,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
5,4,4	Suministro e Instalación de Sirena con Estrobo 2W, Color Rojo	UN	53,00	$ 1.459.169,00	$ 77.335.957,00	53,00	$ 77.335.957,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
5,4,5	Suministro e Instalación de Activación Manual Rearmable Para Sistema Algoritmico Direccionable, Con Aislador de Circuito Color Rojo	UN	53,00	$ 829.256,00	$ 43.950.568,00	53,00	$ 43.950.568,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
5,4,6	Instalación de Central Compacta Direccionable Sistema Detección Incendios 150 Elementos, 4000 Eventos	UN	8,00	$ 954.459,00	$ 7.635.672,00	8,00	$ 7.635.672,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
5,4,7	Suministro e Instalación de Cable FPLR 2x14 AWG Solido HT 105 Grados Centigrados Apantallado Rojo Sotano Dos	ML	3.396,70	$ 18.643,00	$ 63.324.678,00	3.396,70	$ 63.324.678,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
	SUBTOTAL				**$ 1.002.856.608,00**		**$ 1.002.856.608,00**		$ -		$ -		$ -	
	SUBTOTAL COMPONENTE VOZ Y DATOS CCTV YSISTEMA DE DETECCIÓN DE INCENDIOS				**$ 2.689.575.226,00**		**$ 2.689.575.226,00**		$ -		$ -		$ -	
6	DISEÑO REDES DE AIRES ACONDICIONADOS													
6,01	**UNIDADES ENFRIADORAS**													
6,01,1	Instalacion de Chiller Enfriado por Aire tipo SCROLL, Cap. 100 Ton, 460V-3Ph-60Hz	und	3,00	$ 10.487.344,00	$ 31.462.032,00	3,00	$ 31.462.032,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
	SUBTOTAL				**$ 31.462.032,00**		**$ 31.462.032,00**		$ -		$ -		$ -	
6,2	**BOMBAS DE AGUA FRIA**													
6,2,1	Instalacion de bomba centrifuga control Sensorless 360GPM @125 ft, (15kW), 460V-3Ph-60Hz	und	3,00	$ 12.609.928,00	$ 37.829.784,00	3,00	$ 37.829.784,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
	SUBTOTAL				**$ 37.829.784,00**		**$ 37.829.784,00**		$ -		$ -		$ -	
6,3	**UNIDADES INTERIORES**													
6,3,1	Instalacion de consola de pared hidronica 9.000 Btu/h, 220V-1Ph-60Hz	und	3,00	$ 2.551.271,00	$ 7.653.813,00	3,00	$ 7.653.813,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
6,3,2	Instalacion de cassete de 4 vias hidronico 24.000 Btu/h, 220V-1Ph-60Hz	und	2,00	$ 2.932.724,00	$ 5.865.448,00	2,00	$ 5.865.448,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
6,3,3	Instalacion de fancoil hidrónico de baja presion estatica 9.000 Btu/h, 220V-1Ph-60Hz	und	31,00	$ 2.551.271,00	$ 79.089.401,00	31,00	$ 79.089.401,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
6,3,4	Instalacion de fancoil hidrónico de baja presion estatica 12.000 Btu/h, 220V-1Ph-60Hz	und	16,00	$ 2.551.271,00	$ 40.820.336,00	16,00	$ 40.820.336,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
6,3,5	Instalacion de fancoil hidrónico de media presion estatica 18.000 Btu/h, 220V-1Ph-60Hz	und	18,00	$ 2.551.271,00	$ 45.922.878,00	18,00	$ 45.922.878,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
6,3,6	Instalacion de fancoil hidrónico de media presion estatica 24.000 Btu/h, 220V-1Ph-60Hz	und	30,00	$ 2.932.724,00	$ 87.981.720,00	30,00	$ 87.981.720,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
6,3,7	Instalacion de fancoil hidrónico de media presion estatica 30.000 Btu/h, 220V-1Ph-60Hz	und	14,00	$ 2.932.724,00	$ 41.058.136,00	14,00	$ 41.058.136,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-

CONTRATO N°	511 de 2023	PROYECTO N°	2021005500331
ACTA DE PAGO PARCIAL N°	3	PERIODO ACTA DE PAGO PARCIAL:	28/9/2024 a 31/10/2024
OBJETO CONTRATO:	AMPLIACIÓN DE LA CAPACIDAD INSTALADA DEL HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE VILLAVICENCIO ESE - META	OBJETO PROYECTO:	AMPLIACIÓN DE LA CAPACIDAD INSTALADA DEL HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE VILLAVICENCIO ESE - META
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	$ 80.389.497.271,00	VALOR TOTAL DEL PROYECTO:	$ 84.208.944.899,00
CONTRATISTA:	CONSORCIO HOSPITAL 002	CONTRATO DE INTERVENTORIA N°	572 DE 2023
NIT:	901.752.517-0	INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTER HOSPITAL
CORREO ELECTRONICO CONTRATISTA:	coordinador.hospital@cyg.com.co	CORREO ELECTRONICO INTERVENTORIA:	coninterhospital2023@gmail.com
SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORIA	ING. GINA TATIANA ELAICA NIETO	APOYO A LA SUPERVISION:	DAVID ASHBEL FLOREZ SIERRA
CORREO ELECTRONICO INTERVENTORIA:	coninterhospital2023@gmail.com	CONTRATO DE APOYO A LA SUPERVISION N°	765 DE 2023
FECHA DE INICIACIÓN:	12/12/2023	FECHA PRESENTE ACTA:	15/11/2024

N° ITEM	CONDICIONES INICIALES					CONDICIONES ACTUALIZADAS Acta de Modificación No. 2 de fecha 12/09/2024		OBRA EJECUTADA						
								ACTAS ANTERIORES		PRESENTE ACTA		ACUMULADO		
	DESCRIPCION	UND	CANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	%
6,3,8	Instalacion de fancoil hidrónico de media presion estatica 36.000 Btu/h, 220V-1Ph-60Hz	und	18,00	$ 2.932.724,00	$ 52.789.032,00	18,00	$ 52.789.032,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
6,3,9	Instalacion de fancoil hidrónico de media presion estatica 42.000 Btu/h, 220V-1Ph-60Hz	und	12,00	$ 3.102.725,00	$ 37.232.700,00	12,00	$ 37.232.700,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
6,3,10	Instalacion de fancoil hidrónico de media presion estatica 48.000 Btu/h, 220V-1Ph-60Hz	und	7,00	$ 3.102.725,00	$ 21.719.075,00	7,00	$ 21.719.075,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
6,3,11	Instalacion de fancoil hidrónico de media presion estatica 54.000 Btu/h, 220V-1Ph-60Hz	und	5,00	$ 3.102.725,00	$ 15.513.625,00	5,00	$ 15.513.625,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
6,3,12	Instalacion de unidad manejadora de aire interior 76.311 Btu/h@2400CFM, 220V-3Ph-60Hz	und	1,00	$ 3.046.275,00	$ 3.046.275,00	1,00	$ 3.046.275,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
	SUBTOTAL				**$ 438.692.439,00**		**$ 438.692.439,00**		**$ -**		**$ -**		**$ -**	
6,4	**UNIDADES DE VENTILACION**													
6,4,1	Instalacion de ventilador para presurización de escaleras (VPE-1)	und	2,00	$ 1.495.086,00	$ 2.990.172,00	2,00	$ 2.990.172,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
6,4,2	Instalacion de ventilador de extraccion de sotanos axial (VE-S1)	und	4,00	$ 846.569,00	$ 3.386.276,00	4,00	$ 3.386.276,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
6,4,3	Instalacion de ventilador tipo JETFAN (VE-S2)	und	8,00	$ 888.973,00	$ 7.111.784,00	8,00	$ 7.111.784,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
6,4,4	Instalacion de unidad recuperadora de energia (RE-01)	und	1,00	$ 3.757.928,00	$ 3.757.928,00	1,00	$ 3.757.928,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
6,4,5	Instalacion de unidad recuperadora de energia (RE-02)	und	1,00	$ 3.757.928,00	$ 3.757.928,00	1,00	$ 3.757.928,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
6,4,6	Instalacion de unidad recuperadora de energia (RE-03)	und	1,00	$ 3.953.878,00	$ 3.953.878,00	1,00	$ 3.953.878,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
6,4,7	Instalacion de unidad recuperadora de energia (RE-04)	und	1,00	$ 3.757.928,00	$ 3.757.928,00	1,00	$ 3.757.928,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
6,4,8	Instalacion de unidad recuperadora de energia (RE-05)	und	1,00	$ 2.198.107,00	$ 2.198.107,00	1,00	$ 2.198.107,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
6,4,9	Instalacion de unidad recuperadora de energia (RE-06)	und	1,00	$ 2.150.273,00	$ 2.150.273,00	1,00	$ 2.150.273,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
	SUBTOTAL				**$ 33.064.274,00**		**$ 33.064.274,00**		**$ -**		**$ -**		**$ -**	
6,5	**REJILLAS**													
6,5,1	Suministro e instalacion de difusor suministro de aire, elemento central fijo con dámper (DS3V 6"x6")	und	10,00	$ 111.425,00	$ 1.114.250,00	10,00	$ 1.114.250,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
6,5,2	Suministro e instalacion de difusor suministro de aire, elemento central fijo con dámper (DS4V 9"x9")	und	87,00	$ 153.435,00	$ 13.348.845,00	87,00	$ 13.348.845,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
6,5,3	Suministro e instalacion de difusor suministro de aire, elemento central fijo con dámper (DS3V 9"x9")	und	69,00	$ 153.435,00	$ 10.587.015,00	69,00	$ 10.587.015,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
6,5,4	Suministro e instalacion de difusor suministro de aire, elemento central fijo con dámper (DS2V 9"x9")	und	26,00	$ 153.435,00	$ 3.989.310,00	26,00	$ 3.989.310,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
6,5,5	Suministro e instalacion de difusor suministro de aire, elemento central fijo con dámper (DS4V 12"x12")	und	98,00	$ 195.444,00	$ 19.153.512,00	98,00	$ 19.153.512,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
6,5,6	Suministro e instalacion de difusor suministro de aire, elemento central fijo con dámper (DS3V 12"x12")	und	53,00	$ 195.444,00	$ 10.358.532,00	53,00	$ 10.358.532,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
6,5,7	Suministro e instalacion de difusor suministro de aire, elemento central fijo con dámper (DS2V 12"x12")	und	31,00	$ 195.444,00	$ 6.058.764,00	31,00	$ 6.058.764,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
6,5,8	Suministro e instalacion de difusor suministro de aire, elemento central fijo con dámper (DS4V 15"x15")	und	2,00	$ 266.678,00	$ 533.356,00	2,00	$ 533.356,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
6,5,9	Suministro e instalacion de difusor suministro de aire, elemento central fijo con dámper (DS3V 15"x15")	und	3,00	$ 266.678,00	$ 800.034,00	3,00	$ 800.034,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
6,5,10	Suministro e instalacion de difusor suministro de aire, elemento central fijo con dámper (DS2V 15"x15")	und	2,00	$ 266.678,00	$ 533.356,00	2,00	$ 533.356,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
6,5,11	Suministro e instalacion de difusor suministro de aire, elemento central fijo con dámper (DS4V 18"x18")	und	2,00	$ 321.473,00	$ 642.946,00	2,00	$ 642.946,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
6,5,12	Suministro e instalacion de rejilla de retorno aleta fija con damper (RR 6"x6")	und	95,00	$ 75.780,00	$ 7.199.100,00	95,00	$ 7.199.100,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
6,5,13	Suministro e instalacion de rejilla de retorno aleta fija con damper (RR 8"x6")	und	2,00	$ 86.703,00	$ 173.406,00	2,00	$ 173.406,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
6,5,14	Suministro e instalacion de rejilla de retorno aleta fija con damper (RR 8"x8")	und	12,00	$ 99.186,00	$ 1.190.232,00	12,00	$ 1.190.232,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
6,5,15	Suministro e instalacion de rejilla de retorno aleta fija con damper (RR 10"x10")	und	18,00	$ 117.912,00	$ 2.122.416,00	18,00	$ 2.122.416,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
6,5,16	Suministro e instalacion de rejilla de retorno aleta fija con damper (RR 12"x12")	und	28,00	$ 147.560,00	$ 4.131.680,00	28,00	$ 4.131.680,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
6,5,17	Suministro e instalacion de rejilla de retorno aleta fija con damper (RR 14"x14")	und	48,00	$ 189.692,00	$ 9.105.216,00	48,00	$ 9.105.216,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
6,5,18	Suministro e instalacion de rejilla de retorno aleta fija con damper (RR 16"x16")	und	11,00	$ 230.263,00	$ 2.532.893,00	11,00	$ 2.532.893,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
6,5,19	Suministro e instalacion de rejilla de retorno aleta fija con damper (RR 18"x18")	und	37,00	$ 270.835,00	$ 10.020.895,00	37,00	$ 10.020.895,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-

CONTRATO N°	511 de 2023	PROYECTO N°	2021005500331
ACTA DE PAGO PARCIAL N°	3	PERIODO ACTA DE PAGO PARCIAL:	28/9/2024 a 31/10/2024
OBJETO CONTRATO:	AMPLIACIÓN DE LA CAPACIDAD INSTALADA DEL HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE VILLAVICENCIO ESE - META	OBJETO PROYECTO:	AMPLIACIÓN DE LA CAPACIDAD INSTALADA DEL HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE VILLAVICENCIO ESE - META
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	$ 80.389.497.271,00	VALOR TOTAL DEL PROYECTO:	$ 84.208.944.899,00
CONTRATISTA:	CONSORCIO HOSPITAL 002	CONTRATO DE INTERVENTORIA N°	572 DE 2023
NIT:	901.752.517-0	INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTER HOSPITAL
CORREO ELECTRONICO CONTRATISTA:	coordinador.hospital@cyg.com.co	CORREO ELECTRONICO INTERVENTORIA:	coninterhospital2023@gmail.com
SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORIA	ING. GINA TATIANA ELAICA NIETO	APOYO A LA SUPERVISION:	DAVID ASHBEL FLOREZ SIERRA
CORREO ELECTRONICO INTERVENTORIA:	coninterhospital2023@gmail.com	CONTRATO DE APOYO A LA SUPERVISION N°	765 DE 2023
FECHA DE INICIACIÓN:	12/12/2023	FECHA PRESENTE ACTA:	15/11/2024

N° ITEM	CONDICIONES INICIALES					CONDICIONES ACTUALIZADAS Acta de Modificación No. 2 de fecha 12/09/2024		OBRA EJECUTADA						
								ACTAS ANTERIORES		PRESENTE ACTA		ACUMULADO		
	DESCRIPCION	UND	CANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	%
6,5,20	Suministro e instalacion de rejilla de retorno aleta fija con damper (RR 20"x20")	und	24,00	$ 351.637,00	$ 8.439.288,00	24,00	$ 8.439.288,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
6,5,21	Suministro e instalacion de rejilla de retorno aleta fija con damper (RR 24"x24")	und	17,00	$ 473.351,00	$ 8.046.967,00	17,00	$ 8.046.967,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
6,5,22	Suministro e instalacion de rejilla de retorno aleta fija con damper (RR 28"x24")	und	5,00	$ 517.044,00	$ 2.585.220,00	5,00	$ 2.585.220,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
6,5,23	Suministro e instalacion de rejilla de suministro con damper (RS 28"x14")	und	14,00	$ 429.898,00	$ 6.018.572,00	14,00	$ 6.018.572,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
6,5,24	Suministro e instalacion de rejilla de suministro con damper (RS 40"x30")	und	2,00	$ 1.173.817,00	$ 2.347.634,00	2,00	$ 2.347.634,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
6,5,25	Suministro e instalacion de rejilla tipo louver (RTLV 24"x12")	und	4,00	$ 318.969,00	$ 1.275.876,00	4,00	$ 1.275.876,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
6,5,26	Suministro e instalacion de rejilla tipo louver (RTLV 38"x38")	und	1,00	$ 1.457.194,00	$ 1.457.194,00	1,00	$ 1.457.194,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
6,5,27	Suministro e instalacion de rejilla tipo louver (RTLV 52"x38")	und	5,00	$ 1.873.127,00	$ 9.365.635,00	5,00	$ 9.365.635,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
	SUBTOTAL				**$ 143.132.144,00**		**$ 143.132.144,00**		**$ -**		**$ -**		**$ -**	
6,6	**DAMPER DE BALANCEO**													
6,6,1	Suministro e instalacion de damper de balanceo (DB 4"x4")	und	51,00	$ 73.968,00	$ 3.772.368,00	51,00	$ 3.772.368,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
6,6,2	Suministro e instalacion de damper de balanceo (DB 8"x4")	und	54,00	$ 73.968,00	$ 3.994.272,00	54,00	$ 3.994.272,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
6,6,3	Suministro e instalacion de damper de balanceo (DB 10"x4")	und	16,00	$ 69.735,00	$ 1.115.760,00	16,00	$ 1.115.760,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
6,6,4	Suministro e instalacion de damper de balanceo (DB 10"x6")	und	1,00	$ 72.501,00	$ 72.501,00	1,00	$ 72.501,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
6,6,5	Suministro e instalacion de damper de balanceo (DB 12"x4")	und	15,00	$ 76.084,00	$ 1.141.260,00	15,00	$ 1.141.260,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
6,6,6	Suministro e instalacion de damper de balanceo (DB 12"x6")	und	13,00	$ 80.317,00	$ 1.044.121,00	13,00	$ 1.044.121,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
6,6,7	Suministro e instalacion de damper de balanceo (DB 14"x6")	und	1,00	$ 86.667,00	$ 86.667,00	1,00	$ 86.667,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
6,6,8	Suministro e instalacion de damper de balanceo (DB 18"x8")	und	1,00	$ 109.948,00	$ 109.948,00	1,00	$ 109.948,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
6,6,9	Suministro e instalacion de damper de balanceo (DB 28"x14")	und	14,00	$ 220.003,00	$ 3.080.042,00	14,00	$ 3.080.042,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
6,6,10	Suministro e instalacion de damper de balanceo (DB 30"x40")	und	2,00	$ 450.697,00	$ 901.394,00	2,00	$ 901.394,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
	SUBTOTAL				**$ 15.318.333,00**		**$ 15.318.333,00**		**$ -**		**$ -**		**$ -**	
6,7	**DUCTERIA**													
6,7,1	Suministro e instalacion de ducteria en lamina polisocianurato con cara exterior e interior en laminado de aluminio, espesor 20mm	m2	2.535,00	$ 149.430,00	$ 378.805.050,00	2.535,00	$ 378.805.050,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
6,7,2	Suministro e instalacion de ducteria en lamina galvanizada cal.24, sistema TDF	m2	2.725,00	$ 120.721,00	$ 328.964.725,00	2.725,00	$ 328.964.725,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
6,7,3	Suministro e instalacion de ducteria en lamina galvanizada cal.22, sistema TDF	m2	310,00	$ 134.117,00	$ 41.576.270,00	310,00	$ 41.576.270,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
6,7,4	Suministro e instalacion de ducteria en lamina galvanizada cal.18	m2	44,00	$ 213.046,00	$ 9.374.024,00	44,00	$ 9.374.024,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
	SUBTOTAL			Subtotal	**$ 758.720.069,00**		**$ 758.720.069,00**		**$ -**		**$ -**		**$ -**	
6,8	**TUBERIA DE AGUA FRIA**													
6,8,1	Suministro e instalacion de tuberia PVC preaislada RDE 21 Ø3/4"	m	650,00	$ 180.916,00	$ 117.595.400,00	650,00	$ 117.595.400,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
6,8,2	Suministro e instalacion de tuberia PVC preaislada RDE 21 Ø1"	m	512,00	$ 187.908,00	$ 96.208.896,00	512,00	$ 96.208.896,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
6,8,3	Suministro e instalacion de tuberia PVC preaislada RDE 21 Ø1-1/4"	m	658,00	$ 254.901,00	$ 167.724.858,00	658,00	$ 167.724.858,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
6,8,4	Suministro e instalacion de tuberia PVC preaislada RDE 21 Ø1-1/2"	m	238,00	$ 300.651,00	$ 71.554.938,00	238,00	$ 71.554.938,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
6,8,5	Suministro e instalacion de tuberia PVC preaislada RDE 21 Ø2"	m	343,00	$ 480.553,00	$ 164.829.679,00	343,00	$ 164.829.679,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
6,8,6	Suministro e instalacion de tuberia PVC preaislada RDE 21 Ø2-1/2"	m	70,00	$ 550.569,00	$ 38.539.830,00	70,00	$ 38.539.830,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
6,8,7	Suministro e instalacion de tuberia PVC preaislada RDE 21 Ø3"	m	185,00	$ 634.186,00	$ 117.324.410,00	185,00	$ 117.324.410,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
6,8,8	Suministro e instalacion de tuberia PVC preaislada RDE 21 Ø4"	m	42,00	$ 888.057,00	$ 37.298.394,00	42,00	$ 37.298.394,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
6,8,9	Suministro e instalacion de tuberia PVC aislado RDE 21 Ø6"	m	94,00	$ 1.385.141,00	$ 130.203.254,00	94,00	$ 130.203.254,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
	SUBTOTAL				**$ 941.279.659,00**		**$ 941.279.659,00**		**$ -**		**$ -**		**$ -**	
6,9	**ACCESORIO TUBERIAS**													
6,9,1	Suministro e instalacion de valvula de compuerta en bronce Ø2-1/2"	UN	6,00	$ 429.738,00	$ 2.578.428,00	6,00	$ 2.578.428,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
6,9,2	Suministro e instalacion de valvula de compuerta en bronce Ø3"	UN	6,00	$ 491.152,00	$ 2.946.912,00	6,00	$ 2.946.912,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
6,9,3	Suministro e instalacion de valvula de compuerta en bronce Ø4"	UN	2,00	$ 904.859,00	$ 1.809.718,00	2,00	$ 1.809.718,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
6,9,4	Suministro e instalacion de tanque de expansion cerrado 48,5 Galones	UN	1,00	$ 10.261.947,00	$ 10.261.947,00	1,00	$ 10.261.947,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
6,9,5	Suministro e instalacion de separador de aire VORTEX@720GPM	UN	1,00	$ 28.575.791,00	$ 28.575.791,00	1,00	$ 28.575.791,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
6,9,6	Suministro e instalacion de valvula de control proporcional independiente de la presion Ø3"(Bypass)	UN	1,00	$ 6.004.925,00	$ 6.004.925,00	1,00	$ 6.004.925,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
6,9,7	Suministro e instalacion de valvula de flujo turbina Ø6"	UN	1,00	$ 4.811.381,00	$ 4.811.381,00	1,00	$ 4.811.381,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-

CONTRATO N°	511 de 2023	PROYECTO N°	2021005500331
ACTA DE PAGO PARCIAL N°	3	PERIODO ACTA DE PAGO PARCIAL:	28/9/2024 a 31/10/2024
OBJETO CONTRATO:	AMPLIACIÓN DE LA CAPACIDAD INSTALADA DEL HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE VILLAVICENCIO ESE - META	OBJETO PROYECTO:	AMPLIACIÓN DE LA CAPACIDAD INSTALADA DEL HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE VILLAVICENCIO ESE - META
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	$ 80.389.497.271,00	VALOR TOTAL DEL PROYECTO:	$ 84.208.944.899,00
CONTRATISTA:	CONSORCIO HOSPITAL 002	CONTRATO DE INTERVENTORIA N°	572 DE 2023
NIT:	901.752.517-0	INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTER HOSPITAL
CORREO ELECTRONICO CONTRATISTA:	coordinador.hospital@cyg.com.co	CORREO ELECTRONICO INTERVENTORIA:	coninterhospital2023@gmail.com
SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORIA	ING. GINA TATIANA ELAICA NIETO	APOYO A LA SUPERVISION:	DAVID ASHBEL FLOREZ SIERRA
CORREO ELECTRONICO INTERVENTORIA:	coninterhospital2023@gmail.com	CONTRATO DE APOYO A LA SUPERVISION N°	765 DE 2023
FECHA DE INICIACIÓN:	12/12/2023	FECHA PRESENTE ACTA:	15/11/2024

N° ITEM	CONDICIONES INICIALES					CONDICIONES ACTUALIZADAS Acta de Modificación No. 2 de fecha 12/09/2024		OBRA EJECUTADA						
								ACTAS ANTERIORES		PRESENTE ACTA		ACUMULADO		
	DESCRIPCION	UND	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	%
	SUBTOTAL				**$ 56.989.102,00**		**$ 56.989.102,00**		$ -		$ -		$ -	
6,1	**TABLEROS ELECTRICOS FUERZA/CONTROL**													
6,10,1	Suministro e instalacion TAE-S1(FUERZA Y CONTROL EXTRACCION SOTANOS)	UN	1,00	$ 13.132.335,00	$ 13.132.335,00	1,00	$ 13.132.335,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
6,10,2	Suministro e instalacion TAE-01	UN	1,00	$ 6.583.004,00	$ 6.583.004,00	1,00	$ 6.583.004,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
6,10,3	Suministro e instalacion TAE-02	UN	1,00	$ 6.476.846,00	$ 6.476.846,00	1,00	$ 6.476.846,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
6,10,4	Suministro e instalacion TAE-03	UN	1,00	$ 4.124.556,00	$ 4.124.556,00	1,00	$ 4.124.556,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
6,10,5	Suministro e instalacion TAE-04	UN	1,00	$ 4.050.356,00	$ 4.050.356,00	1,00	$ 4.050.356,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
6,10,6	Suministro e instalacion TAE-05	UN	1,00	$ 4.639.650,00	$ 4.639.650,00	1,00	$ 4.639.650,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
6,10,7	Suministro e instalacion TAE-06	UN	1,00	$ 4.853.235,00	$ 4.853.235,00	1,00	$ 4.853.235,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
6,10,8	Suministro e instalacion TAE-07	UN	1,00	$ 4.543.373,00	$ 4.543.373,00	1,00	$ 4.543.373,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
6,10,9	Suministro e instalacion TAE-08	UN	1,00	$ 6.508.292,00	$ 6.508.292,00	1,00	$ 6.508.292,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
6,10,10	Suministro e instalacion TAE-09A/9B	UN	2,00	$ 2.212.869,00	$ 4.425.738,00	2,00	$ 4.425.738,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
6,10,11	Suministro e instalacion TAE-09C	UN	1,00	$ 9.162.713,00	$ 9.162.713,00	1,00	$ 9.162.713,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
6,10,12	Suministro e instalacion TAE-09D	UN	1,00	$ 9.908.236,00	$ 9.908.236,00	1,00	$ 9.908.236,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
6,10,13	Suministro e instalacion de sensor de CO para 200m2	UN	12,00	$ 871.395,00	$ 10.456.740,00	12,00	$ 10.456.740,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
6,10,14	Suministro e instalacion de switch presion diferencial para filtros	UN	1,00	$ 689.949,00	$ 689.949,00	1,00	$ 689.949,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
6,10,15	Suministro e instalacion de transmisor de presion diferencial para filtro	UN	1,00	$ 1.093.687,00	$ 1.093.687,00	1,00	$ 1.093.687,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
6,10,16	Suministro e instalacion de sensor de velocidad en ducto	UN	1,00	$ 1.049.298,00	$ 1.049.298,00	1,00	$ 1.049.298,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
6,10,17	Suministro e instalacion de sensor de temperatura en ducto	UN	1,00	$ 911.477,00	$ 911.477,00	1,00	$ 911.477,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
6,10,18	Suministro e instalacion de switch de presion diferencial en tuberia	UN	3,00	$ 1.700.769,00	$ 5.102.307,00	3,00	$ 5.102.307,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
6,10,19	Suministro e instalacion de transmisor de presion diferencial en tuberia	UN	1,00	$ 4.640.016,00	$ 4.640.016,00	1,00	$ 4.640.016,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
6,10,20	Suministro e instalacion de sensor de temperatura en tuberia	UN	2,00	$ 2.027.352,00	$ 4.054.704,00	2,00	$ 4.054.704,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
6,10,21	Suministro e instalacion de kit de control para unidad de presurizacion de escalera	UN	2,00	$ 25.905.938,00	$ 51.811.876,00	2,00	$ 51.811.876,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
6,10,22	Suministro e instalacion de sistema de control para UMA-01	UN	1,00	$ 13.957.325,00	$ 13.957.325,00	1,00	$ 13.957.325,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
6,10,23	Suministro e instalacion de control central de planta de agua fria	UN	1,00	$ 29.037.304,00	$ 29.037.304,00	1,00	$ 29.037.304,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
6,10,24	Suministro e instalacion de termostato de zona	UN	152,00	$ 398.939,00	$ 60.638.728,00	152,00	$ 60.638.728,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
	SUBTOTAL				**$ 261.851.745,00**		**$ 261.851.745,00**		$ -		$ -		$ -	
	SUBTOTAL COMPONENTE AIRES ACONDICIONADO				**$ 2.718.339.581,00**		**$ 2.718.339.581,00**		$ -		$ -		$ -	
7	SUMINISTRO DE EQUIPOS													
7,1	**SUMINISTRO DE EQUIPOS (ARQUITECTONICO)**													
7,1,1	SUMINISTRO ASCENSOR CAMILLERO CON UNA CAPACIDAD DE 1200 KG MANIOBRA DUPLEX	UN	2,00	$ 473.119.868,00	$ 946.239.736,00	2,00	$ 946.239.736,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
7,1,2	SUMINISTRO ASCENSOR CON UNA CAPACIDAD DE 1200 KG MANIOBRA CUADRUPLEX	UN	4,00	$ 498.983.074,00	$ 1.995.932.296,00	4,00	$ 1.995.932.296,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
	SUBTOTAL				**$ 2.942.172.032,00**		**$ 2.942.172.032,00**		$ -		$ -		$ -	
7,2	**SUMINISTRO DE EQUIPOS HIDRAULICOS E HIDROSANITARIOS**													
7,2,1	SUMINISTRO EQUIPO DE PRESIÓN CONSTANTE DE TRES (3) BOMBAS EN PARALELO DE 10 HP PARA UN CAUDAL DE BOMBEO CADA UNO DE 4.96 L/S Y UNA ALTURA DINAMICA TOTAL DE 65.43 M.C.A, INCLUYE 1 TANQUE PULMON DE 300 L	UN	1,00	$ 89.762.330,00	$ 89.762.330,00	1,00	$ 89.762.330,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
7,2,2	SUMINISTRO DE MOTOBOMBA SUMERGIBLE IHM WQK48-30-7,5 10 HP 220V O SIMILAR, INCLUYE ARRANCADOR Y SWITCH FLOTADOR	UN	1,00	$ 22.576.848,00	$ 22.576.848,00	1,00	$ 22.576.848,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
7,2,3	SUMINISTRO DE MOTOBOMBA SUMERGIBLE IHM WQK30-20-3,7 5HP 220V O SIMILAR, INCLUYE ARRANCADOR Y SWITCH FLOTADOR	UN	1,00	$ 13.238.181,00	$ 13.238.181,00	1,00	$ 13.238.181,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-

CONTRATO N°	511 de 2023	PROYECTO N°	2021005500331
ACTA DE PAGO PARCIAL N°	3	PERIODO ACTA DE PAGO PARCIAL	28/9/2024 a 31/10/2024
OBJETO CONTRATO:	AMPLIACIÓN DE LA CAPACIDAD INSTALADA DEL HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE VILLAVICENCIO ESE - META	OBJETO PROYECTO:	AMPLIACIÓN DE LA CAPACIDAD INSTALADA DEL HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE VILLAVICENCIO ESE - META
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	$ 80.389.497.271,00	VALOR TOTAL DEL PROYECTO:	$ 84.208.944.899,00
CONTRATISTA:	CONSORCIO HOSPITAL 002	CONTRATO DE INTERVENTORIA N°	572 DE 2023
NIT:	901.752.517-0	INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTER HOSPITAL
CORREO ELECTRONICO CONTRATISTA:	coordinador.hospital@cyg.com.co	CORREO ELECTRONICO INTERVENTORIA:	coninterhospital2023@gmail.com
SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORIA	ING. GINA TATIANA ELAICA NIETO	APOYO A LA SUPERVISION:	DAVID ASHBEL FLOREZ SIERRA
CORREO ELECTRONICO INTERVENTORIA:	coninterhospital2023@gmail.com	CONTRATO DE APOYO A LA SUPERVISION N°	765 DE 2023
FECHA DE INICIACIÓN:	12/12/2023	FECHA PRESENTE ACTA:	15/11/2024

N° ITEM	CONDICIONES INICIALES					CONDICIONES ACTUALIZADAS Acta de Modificación No. 2 de fecha 12/09/2024		OBRA EJECUTADA						
								ACTAS ANTERIORES		PRESENTE ACTA		ACUMULADO		
	DESCRIPCION	UND	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR	CANT	VALOR	CANT.	VALOR	%
7,2,4	SUMINISTRO EQUIPO CONTRA INCENDIO LISTADO ELECTRICO SCF-150-125-250 200 HP 406 V, COMPUESTO POR BOMBA ELECTRICA DE 1000 GPM-PRESION NOMINAL 187 PSI, MOTOR ELECTRICO DE 200 HP, ULTABLERO CONTROLADOR BOMBA ELECTRICA , MOTOBOMBA JOCKEY 16,5 GPM-PRESION NOMINAL 197 PSI-POTENCIA 5HP-VOLTAJE 440 V/3 FASES, TABLERO CONTROLADOR BOMBA JOCKEY-POTENCIA 5 HP-VOLTAJE 460 V, ACCESORIOS INCLUIDOS: MANOMETRO Y VACUOMETRO DE CARATULA DE 3 1/2" PARA DESCARGA Y SUCCION, VALVULA DESAIREADORA, VALVULA DE ALIVIO,MEDIDOR DE FLUJO DE 6", CABEZAL DE PRUEBAS DE 6" CON 4 SET DE VALVULAS DE 2 1/2', INCREMENTADOR CONCENTRICO EN LA DESCARGA 952-D-5*6-104 / DN125-150, REDUCTOR EXCENTRICO EN LA SUCCION 952-S-8*6-104/DN200-150	UN	1,00	$ 432.672.861,00	$ 432.672.861,00	1,00	$ 432.672.861,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
	SUBTOTAL				**$ 558.250.220,00**		**$ 558.250.220,00**		**$ -**		**$ -**		**$ -**	
7,3	**SUMINISTRO DE EQUIPOS ELECTRICOS**													
7,3,1	SUMINISTRO DE CELDA DUPLEX CON SECCIONADORES TRIPOLARES EN AIRE 35 KV, OPERACIÓN BAJO CARGA, DE ACUERDO A NORMA CODENSA CTS 519-5, INCLUYE FUSIBLES TIPO HH DE 50A (6) - EN CONFIGURACIÓN DE ACUERDO A DIAGRAMA UNIFILAR	UN	1,00	$ 44.928.662,00	$ 44.928.662,00	1,00	$ 44.928.662,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
7,3,2	SUMINISTRO DE CELDA DE MEDIDA PARA MEDIA TENSIÓN (35KV) EN 3 ELEMENTOS INCLUYE TC'S Y TP'S, BORNERA, Y MEDIDOR ELECTRONICO BIDIRECCIONAL DE ACUERDO A NORMA CODENSA AE327	UN	1,00	$ 39.540.592,00	$ 39.540.592,00	1,00	$ 39.540.592,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
7,3,3	SUMINISTRO DE CELDA PARA TRANSFORMADOR TIPO SECO DE 800KVA A 35KV - DE ACUERDO A NORMA CODENSA CTS518-2	UN	1,00	$ 19.452.720,00	$ 19.452.720,00	1,00	$ 19.452.720,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
7,3,4	SUMINISTRO DE CELDA PARA TRANSFORMADOR TIPO SECO DE 600KVA A 35KV - DE ACUERDO A NORMA CODENSA CTS518-2	UN	1,00	$ 19.452.720,00	$ 19.452.720,00	1,00	$ 19.452.720,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
7,3,5	SUMINISTRO DE TRANSFORMADOR TIPO SECO DE 800 KVA CLASE H, RELACIÓN DE TRANSFORMACIÓN 34500/460-266V, GRUPO DE CONEXIÓN DYN5, INCLUYE DPS A INSTALAR EN LA ENTRADA DE LA ACOMETIDA DE MEDIA TENSIÓN, RIELES DE PISO, BASE PARA COLOCACIÓN DEL TRANSFORMADOR	UN	1,00	$ 129.855.526,00	$ 129.855.526,00	1,00	$ 129.855.526,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
7,3,6	SUMINISTRO DE TRANSFORMADOR TIPO SECO DE 600 KVA CLASE H, RELACIÓN DE TRANSFORMACIÓN 34500/214-124V, GRUPO DE CONEXIÓN DYN5, INCLUYE DPS A INSTALAR EN LA ENTRADA DE LA ACOMETIDA DE MEDIA TENSIÓN, RIELES DE PISO, BASE PARA COLOCACIÓN DEL TRANSFORMADOR	UN	1,00	$ 112.045.594,00	$ 112.045.594,00	1,00	$ 112.045.594,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
7,3,7	SUMINISTRO DE PLANTA ELÉCTRICA DE 600 KW NOMINALES (A NIVEL DEL MAR) AUTONOMIA DE 8 HORAS A FULL CARGA, INCLUYE CABINA INSONORIZADA, CARGADOR AUTOMATICO DE BATERIAS, BATERIA, MOTOR CUMMINS O SIMILAR, GENERADOR STAMFORD O SIMILAR Y PROTECCIÓN CONTRA SOBRECORRIENTE - TENSIÓN DE SALIDA 214V FASE - FASE - INCLUYE DUCTO METALICO DE ESCAPE AUTOSOPORTADO DE 10" CON LENGUETA DE ESCAPE	UN	1,00	$ 520.876.998,00	$ 520.876.998,00	1,00	$ 520.876.998,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
7,3,8	SUMINISTRO DE PLANTA ELÉCTRICA DE 800 KW NOMINALES (A NIVEL DEL MAR) AUTONOMIA DE 8 HORAS A FULL CARGA, INCLUYE CABINA INSONORIZADA, CARGADOR AUTOMATICO DE BATERIAS, BATERIA, MOTOR CUMMINS O SIMILAR, GENERADOR STAMFORD O SIMILAR Y PROTECCIÓN CONTRA SOBRECORRIENTE - TENSIÓN DE SALIDA 460V FASE - FASE - INCLUYE DUCTO METALICO DE ESCAPE AUTOSOPORTADO DE 10" CON LENGUETA DE ESCAPE	UN	1,00	$ 592.555.558,00	$ 592.555.558,00	1,00	$ 592.555.558,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
7,3,9	SUMINISTRO DE PANEL SOLAR MONOCRISTALINO DE 450WP.	UN	72,00	$ 1.098.803,00	$ 79.113.816,00	72,00	$ 79.113.816,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
	SUBTOTAL				**$ 1.557.822.186,00**		**$ 1.557.822.186,00**		**$ -**		**$ -**		**$ -**	
7,4	**SUMINISTRO DE EQUIPOS VOZ-DATOS-CCTV-SONIDO Y DETECCIÓN INCENDIOS**													
7,4,1	Suministro de Camara Tipo Domo IP 5MP - POE -	UN	134,00	$ 413.573,00	$ 55.418.782,00	134,00	$ 55.418.782,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
7,4,2	Suministro de Parlante Incrustar en Techo	UN	86,00	$ 485.940,00	$ 41.790.840,00	86,00	$ 41.790.840,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
7,4,3	Suministro de Central Compacta Direccionable Sistema Detección Incendios 150 Elementos, 4000 Eventos	UN	8,00	$ 5.514.600,00	$ 44.116.800,00	8,00	$ 44.116.800,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
	SUBTOTAL				**$ 141.326.422,00**		**$ 141.326.422,00**		**$ -**		**$ -**		**$ -**	
7,5	**SUMINISTRO DE EQUIPOS AIRES ACONDICIONADOS**													

CONTRATO N°	511 de 2023	PROYECTO N°	2021005500331
ACTA DE PAGO PARCIAL N°	3	PERIODO ACTA DE PAGO PARCIAL:	28/9/2024 a 31/10/2024
OBJETO CONTRATO:	AMPLIACIÓN DE LA CAPACIDAD INSTALADA DEL HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE VILLAVICENCIO ESE - META	OBJETO PROYECTO:	AMPLIACIÓN DE LA CAPACIDAD INSTALADA DEL HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE VILLAVICENCIO ESE - META
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	$ 80.389.497.271,00	VALOR TOTAL DEL PROYECTO:	$ 84.208.944.899,00
CONTRATISTA:	CONSORCIO HOSPITAL 002	CONTRATO DE INTERVENTORIA N°	572 DE 2023
NIT:	901.752.517-0	INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTER HOSPITAL
CORREO ELECTRONICO CONTRATISTA:	coordinador.hospital@cyg.com.co	CORREO ELECTRONICO INTERVENTORIA:	coninterhospital2023@gmail.com
SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORIA	ING. GINA TATIANA ELAICA NIETO	APOYO A LA SUPERVISION:	DAVID ASHBEL FLOREZ SIERRA
CORREO ELECTRONICO INTERVENTORIA:	coninterhospital2023@gmail.com	CONTRATO DE APOYO A LA SUPERVISION N°	765 DE 2023
FECHA DE INICIACIÓN:	12/12/2023	FECHA PRESENTE ACTA:	15/11/2024

N° ITEM	CONDICIONES INICIALES					CONDICIONES ACTUALIZADAS Acta de Modificación No. 2 de fecha 12/09/2024		OBRA EJECUTADA						
								ACTAS ANTERIORES		PRESENTE ACTA		ACUMULADO		
	DESCRIPCION	UND	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	%
7,5,1	SUMINISTRO DE CHILLER ENFRIADO POR AIRE TIPO SCROLL, CAP. 100 TON, 460V-3PH-60HZ	UN	3,00	$ 448.911.357,00	$ 1.346.734.071,00	3,00	$ 1.346.734.071,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
7,5,2	SUMINISTRO DE BOMBA CENTRIFUGA CONTROL SENSORLESS 360GPM @125 FT, (15KW), 460V-3PH-60HZ	UN	3,00	$ 88.936.507,00	$ 266.809.521,00	3,00	$ 266.809.521,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
7,5,3	SUMINISTRO DE CONSOLA DE PARED HIDRONICA 9.000 BTU/H, 220V-1PH-60HZ	UN	3,00	$ 2.201.850,00	$ 6.605.550,00	3,00	$ 6.605.550,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
7,5,4	SUMINISTRO DE CASSETE DE 4 VIAS HIDRONICO 24.000 BTU/H, 220V-1PH-60HZ	UN	2,00	$ 2.755.187,00	$ 5.510.374,00	2,00	$ 5.510.374,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
7,5,5	SUMINISTRO DE FANCOIL HIDRÓNICO DE BAJA PRESION ESTATICA 9.000 BTU/H, 220V-1PH-60HZ	UN	31,00	$ 2.201.850,00	$ 68.257.350,00	31,00	$ 68.257.350,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
7,5,6	SUMINISTRO DE FANCOIL HIDRÓNICO DE BAJA PRESION ESTATICA 12.000 BTU/H, 220V-1PH-60HZ	UN	16,00	$ 2.755.187,00	$ 44.082.992,00	16,00	$ 44.082.992,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
7,5,7	SUMINISTRO DE FANCOIL HIDRÓNICO DE MEDIA PRESION ESTATICA 18.000 BTU/H, 220V-1PH-60HZ	UN	18,00	$ 2.268.091,00	$ 40.825.638,00	18,00	$ 40.825.638,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
7,5,8	SUMINISTRO DE FANCOIL HIDRÓNICO DE MEDIA PRESION ESTATICA 24.000 BTU/H, 220V-1PH-60HZ	UN	30,00	$ 3.003.667,00	$ 90.110.010,00	30,00	$ 90.110.010,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
7,5,9	SUMINISTRO DE FANCOIL HIDRÓNICO DE MEDIA PRESION ESTATICA 30.000 BTU/H, 220V-1PH-60HZ	UN	14,00	$ 3.065.629,00	$ 42.918.806,00	14,00	$ 42.918.806,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
7,5,10	SUMINISTRO DE FANCOIL HIDRÓNICO DE MEDIA PRESION ESTATICA 36.000 BTU/H, 220V-1PH-60HZ	UN	18,00	$ 3.232.829,00	$ 58.190.922,00	18,00	$ 58.190.922,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
7,5,11	SUMINISTRO DE FANCOIL HIDRÓNICO DE MEDIA PRESION ESTATICA 42.000 BTU/H, 220V-1PH-60HZ	UN	12,00	$ 3.814.188,00	$ 45.770.256,00	12,00	$ 45.770.256,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
7,5,12	SUMINISTRO DE FANCOIL HIDRÓNICO DE MEDIA PRESION ESTATICA 48.000 BTU/H, 220V-1PH-60HZ	UN	7,00	$ 4.000.076,00	$ 28.000.532,00	7,00	$ 28.000.532,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
7,5,13	SUMINISTRO DE FANCOIL HIDRÓNICO DE MEDIA PRESION ESTATICA 54.000 BTU/H, 220V-1PH-60HZ	UN	5,00	$ 4.151.539,00	$ 20.757.695,00	5,00	$ 20.757.695,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
7,5,14	SUMINISTRO DE UNIDAD MANEJADORA DE AIRE INTERIOR 76.311 BTU/H@2400CFM, 220V-3PH-60HZ	UN	1,00	$ 29.446.357,00	$ 29.446.357,00	1,00	$ 29.446.357,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
7,5,15	SUMINISTRO DE VENTILADOR PARA PRESURIZACIÓN DE ESCALERAS (VPE-1)	UN	2,00	$ 22.696.567,00	$ 45.393.134,00	2,00	$ 45.393.134,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
7,5,16	SUMINISTRO DE VENTILADOR DE EXTRACCION DE SOTANOS AXIAL (VE-S1)	UN	4,00	$ 4.311.704,00	$ 17.246.816,00	4,00	$ 17.246.816,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
7,5,17	SUMINISTRO DE VENTILADOR TIPO JETFAN (VE-S2)	UN	8,00	$ 7.462.714,00	$ 59.701.712,00	8,00	$ 59.701.712,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
7,5,18	SUMINISTRO DE UNIDAD RECUPERADORA DE ENERGIA (RE-01)	UN	1,00	$ 103.170.613,00	$ 103.170.613,00	1,00	$ 103.170.613,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
7,5,19	SUMINISTRO DE UNIDAD RECUPERADORA DE ENERGIA (RE-02)	UN	1,00	$ 79.942.346,00	$ 79.942.346,00	1,00	$ 79.942.346,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
7,5,20	SUMINISTRO DE UNIDAD RECUPERADORA DE ENERGIA (RE-03)	UN	1,00	$ 211.188.090,00	$ 211.188.090,00	1,00	$ 211.188.090,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
7,5,21	SUMINISTRO DE UNIDAD RECUPERADORA DE ENERGIA (RE-04)	UN	1,00	$ 157.126.432,00	$ 157.126.432,00	1,00	$ 157.126.432,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
7,5,22	SUMINISTRO DE UNIDAD RECUPERADORA DE ENERGIA (RE-05)	UN	1,00	$ 45.433.990,00	$ 45.433.990,00	1,00	$ 45.433.990,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
7,5,23	SUMINISTRO DE UNIDAD RECUPERADORA DE ENERGIA (RE-06)	UN	1,00	$ 45.433.990,00	$ 45.433.990,00	1,00	$ 45.433.990,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
	SUBTOTAL				**$ 2.858.657.197,00**		**$ 2.858.657.197,00**		**$ -**		**$ -**		**$ -**	
	SUBTOTAL SUMINISTRO DE EQUIPOS				**$ 8.058.228.057,00**		**$ 8.058.228.057,00**		**$ -**		**$ -**		**$ -**	
	COMPONENTES DE PRESUPUESTO													
	INSPECCION Y CERTIFICACION RETIE INSPECCION Y CERTIFICACION RETIE DISTRIBUCIÓN, TRANSFORMACIÓN Y USO FINAL; INCLUYE EQUIPOS ESPECIALES Y SISTEMA FOTOVOLTAICO ON GRID DE 32,4 KVA	GB	1,00	$ 83.046.600,00	$ 83.046.600,00	1,00	$ 83.046.600,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
	INSPECCION Y CERTIFICACION RETILAP	UN	1,00	$ 23.109.320,00	$ 23.109.320,00	1,00	$ 23.109.320,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
	IMPLEMENTACION PLAN DE MANEJO DE TRANSITO	UN	1,00	$ 85.045.879,00	$ 85.045.879,00	1,00	$ 85.045.879,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
	IMPLEMENTACIÓN PLAN DE MANEJO AMBIENTAL	UN	1,00	$ 29.939.133,00	$ 29.939.133,00	1,00	$ 29.939.133,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-
	SUBTOTAL				**$ 221.140.932,00**		**$ 221.140.932,00**		**$ -**		**$ -**		**$ -**	
	VALOR TOTAL OBRA				**$ 80.389.497.271,00**		**$ 80.389.497.271,00**		**$ 6.955.461.884,00**		**$ 1.072.219.127,00**		**$ 8.027.681.011,00**	9,99%

CONTRATO N°	511 de 2023	PROYECTO N°	2021005500331
ACTA DE PAGO PARCIAL N°	3	PERIODO ACTA DE PAGO PARCIAL:	28/9/2024 a 31/10/2024
OBJETO CONTRATO:	AMPLIACIÓN DE LA CAPACIDAD INSTALADA DEL HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE VILLAVICENCIO ESE - META	OBJETO PROYECTO:	AMPLIACIÓN DE LA CAPACIDAD INSTALADA DEL HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE VILLAVICENCIO ESE - META
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	$ 80.389.497.271,00	VALOR TOTAL DEL PROYECTO:	$ 84.208.944.899,00
CONTRATISTA:	CONSORCIO HOSPITAL 002	CONTRATO DE INTERVENTORIA N°	572 DE 2023
NIT:	901.752.517-0	INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTER HOSPITAL
CORREO ELECTRONICO CONTRATISTA:	coordinador.hospital@cyg.com.co	CORREO ELECTRONICO INTERVENTORIA:	coninterhospital2023@gmail.com
SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORIA	ING. GINA TATIANA ELAICA NIETO	APOYO A LA SUPERVISION:	DAVID ASHBEL FLOREZ SIERRA
CORREO ELECTRONICO INTERVENTORIA:	coninterhospital2023@gmail.com	CONTRATO DE APOYO A LA SUPERVISION N°	765 DE 2023
FECHA DE INICIACIÓN:	12/12/2023	FECHA PRESENTE ACTA:	15/11/2024

N° ITEM	CONDICIONES INICIALES				CONDICIONES ACTUALIZADAS Acta de Modificación No. 2 de fecha 12/09/2024		OBRA EJECUTADA					
							ACTAS ANTERIORES		PRESENTE ACTA		ACUMULADO	
	DESCRIPCION	UND	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT. VALOR %
	CONDICIONES GENERALES						CONDICIONES ACTUALIZADAS					
	VALOR CONDICIONES ORIGINALES			$ 80.389.497.271,00								
	VALOR ADICIONAL			$ 0,00								
	VALOR TOTAL			$ 80.389.497.271,00								
	CONDICIONES ACTUALIZADAS			$ 80.389.497.271,00								
	ANTICIPO 40%			$ 32.155.798.908,40								
	PRESENTE ACTA			$ 1.072.219.127,00								
	ACUMULADO			$ 8.027.681.011,00								

RESUMEN			%
EJECUTADO	$	8.027.681.011,00	9,99
POR EJECUTAR	$	72.361.816.260,00	90,01
POR AMORTIZAR	$	28.944.726.504,00	90,01
TOTALES	$	80.389.497.271,00	100,00

RELACIÓN DE ACTAS		AMORTIZACIONES	NETO PARCIAL
ACTA 1	$ 4.562.199.028,00	$ 1.824.879.611,20	$ 2.737.319.416,80
ACTA 2	$ 2.393.262.856,00	$ 957.305.142,40	$ 1.435.957.713,60
ACTA 3	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
PRESENTE ACTA	$ 1.072.219.127,00	$ 428.887.650,80	$ 643.331.476,20
TOTALES	$ 8.027.681.011,00	$ 3.211.072.404,40	$ 4.816.608.606,60

RELACIÓN DE PAGOS PROYECTO N° 2021005500331 (Registro Presupuestal No. 1002-2.3.19.1906.0300.003-00AD de 2023)

ACTA No.	CONCEPTO	VALOR	AMORTIZACIÓN	NETO PARCIAL	ACUMULADO
1	ANTICIPO	$ 32.155.798.908,40			$ 32.155.798.908,40
2	PAGO PARCIAL N°1	$ 4.562.199.028,00	$ 1.824.879.611,20	$ 2.737.319.416,80	$ 34.893.118.325,20
3	PAGO PARCIAL N°2	$ 2.393.262.856,00	$ 957.305.142,40	$ 1.435.957.713,60	$ 36.329.076.038,80
4	PRESENTE ACTA	$ 1.072.219.127,00	$ 428.887.650,80	$ 643.331.476,20	$ 36.972.407.515,00
5	VALOR POR EJECUTAR O NO EJECUTADO	$ 43.417.089.756,00			

VALOR A PAGAR PRESENTE ACTA: **MIL SETENTA Y DOS MILLONES DOSCIENTOS DIECINUEVE MIL CIENTO VEINTISIETE PESOS MCTE**

NOTAS
1: El contador del contratista e interventor, Certifica que revisó, verificó y constató el pago de los Parafisicales de Ley por parte del contratista, con base en los soportes presentados por éste.
2: Las cantidades y valores consignados en la presente Acta son responsabilidad exclusiva del Contratista e Interventor. El pago de la presente acta se realizará con base en el principio de confiabilidad y responsabilidad con la que la Interventoría y el Contratista realizan las mediciones en campo y las revisiones efectuadas por parte de la interventoría.
3. Que la interventoria certifica que el contratista Consorcio Hospital 002 identificado con el NIT 901.752.517-0 cumplio con la clausula 8 forma de pago y se encuentra a paz y salvo de los pagos al sistema de seguridad social integral de los periodos relacionados en la presente acta.
4. El contrato de obra N° 511 de 2023 representado legalmente por el Consorcio Hospital 002, durante su ejecución ha tenido modificaciones en su conformación o cesión de derechos por parte de los consorciados: SI ____ de fecha _____. NO X .

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella el día: **viernes, 15 de noviembre de 2024**

Firma:
Nombre: DANIEL ALEJANDRO ENGATIVA RODRIGUEZ
REPRESENTANTE LEGAL CONTRATISTA OBRA

Firma:
Nombre: JUAN CARLOS RODRIGUEZ SANCHEZ
DIRECTOR DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 2570062356 CND

Firma:
Nombre: LUIS FERNANDO TROCHEZ ARIAS
CONTADOR DEL CONTRATISTA
N° Matrícula Profesional: 175252-T

Firma:
Nombre: EDWIN FABIAN HENAO CAMARGO
REPRESENTANTE LEGAL INTERVENTORÍA

Firma:
Nombre: CESAR ASHLEY MORA BARNEY
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 25202-214496 CND

Firma:
Nombre: ALFREDO FERNANDO CASTAÑEDA CAMACHO
CONTADOR DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 117585-T

Nota: en la presente acta se debera adjuntar el certificado bancario y las respectivas tarjetas y antecedentes de los contadores.
Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

MEMORIA DE CALCULO OBRA 112-ECP-FR-027

Carrera 38 N. 25-05 Barrio 7 de agosto – Villavicencio
Email: coordinador.hospital@cyg.com.co
Tel. 321-3370874

18633

CONTRATO N°	511 DE 2023	**PROYECTO N°**	2021005500331
FECHA DE INICIÓ:	12/12/2023	FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL:	11/03/2025
OBJETO PROYECTO:	"AMPLIACIÓN DE LA CAPACIDAD INSTALADA DEL HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE VILLAVICENCIO ESE - META".		
CONTRATISTA :	CONSORCIO HOSPITAL 002 RL DANIEL ALEJANDRO ENGATIVA RODRIGUEZ NIT: 901752517-0		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	572 DE 2023		
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTER HOSPITAL RL : EDWIN FABIAN HENAO CAMARGO. NIT: 901755332-9		

ACTA:	**ACTA DE PAGO PARCIAL No. 3**
CAPITULO:	**COMPONENTE ARQUITECTONICO**

N° ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
1,2,1	**DEMOLICION MECÁNICA ANDENES, PLACAS, SARDINELES EN CONCRETO REFORZADO. INCLUYE TRASIEGO Y CARGUE MANUAL**	**M3**

DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES			
	AREA (M2)	ESPESOR (M)	CANTIDAD (UND)	TOTAL
PLACA CONTRAPISO CAMPAMENTO (Obra) (2)	250,55	0,12	1	30,07
ANDENES PRIMER PISO (3)	87,41	0,12	1	10,49
PASAN:			SUBTOTAL	40,56
			TOTAL	40,56

Firma
Nombre: JUAN CARLOS RODRIGUEZ SANCHEZ
DIRECTOR DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 2570062356 CND

Firma
Nombre: CESAR ASHLEY MORA BARNEY
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 25202-214496 CND

Firma
Nombre: ROBERTO HERNAN HURTADO ROBLEDO
RESIDENTE DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 17202-51811 CDS

Firma
Nombre:ALONSO QUINTERO PEÑARANDA
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
N° Mat. Profesional: 25700-25724 CND

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

CONTRATO N°	**511 DE 2023**	**PROYECTO N°**	**2021005500331**
FECHA DE INICIÓ:	12/12/2023	FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL:	11/03/2025
OBJETO PROYECTO:	"AMPLIACIÓN DE LA CAPACIDAD INSTALADA DEL HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE VILLAVICENCIO ESE - META".		
CONTRATISTA :	CONSORCIO HOSPITAL 002 RL DANIEL ALEJANDRO ENGATIVA RODRIGUEZ NIT: 901752517-0		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	572 DE 2023		
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTER HOSPITAL RL : EDWIN FABIAN HENAO CAMARGO. NIT: 901755332-9		

ACTA:	**ACTA DE PAGO PARCIAL No. 3**	
CAPITULO:	**COMPONENTE ARQUITECTONICO**	
N° ÍTEM	**DESCRIPCIÓN**	**UNIDAD**
1,2,1	**DEMOLICION MECÁNICA ANDENES, PLACAS, SARDINELES EN CONCRETO REFORZADO. INCLUYE TRASIEGO Y CARGUE MANUAL**	**M3**

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA









1893

CONTRATO N°	511 DE 2023	PROYECTO N°	2021005500331
FECHA DE INICIÓ:	12/12/2023	FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL:	11/03/2025
OBJETO PROYECTO:	"AMPLIACIÓN DE LA CAPACIDAD INSTALADA DEL HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE VILLAVICENCIO ESE - META".		
CONTRATISTA :	CONSORCIO HOSPITAL 002 RL DANIEL ALEJANDRO ENGATIVA RODRIGUEZ NIT: 901752517-0		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	572 DE 2023		
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTER HOSPITAL RL : EDWIN FABIAN HENAO CAMARGO. NIT: 901755332-9		

ACTA:	ACTA DE PAGO PARCIAL No. 3
CAPITULO:	COMPONENTE ARQUITECTONICO

N° ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
1,2,3	DEMOLICION CIMIENTO ENTERRADO. INCLUYE TRASIEGO Y CARGUE MANUAL	M3

DESCRIPCIÓN		DIMENSIONES				
		ANCHO (M)	ALTO (M)	PROFUNDIDAD (M)	CANTIDAD (UND)	TOTAL (M3)
CAMPAMENTO						
VIGAS DE CIMENTACION		0.25	0.25	100.33	1	6.27
OTROS						
VIGAS DE CIMENTACION	CAMPAMENTO PASILLO	0.2	0.2	33.1102	1	1.32
PASAN:	-				SUBTOTAL	7.59
					TOTAL	7.59

Firma
Nombre: JUAN CARLOS RODRIGUEZ SANCHEZ
DIRECTOR DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 2570062356 CND

Firma
Nombre: CESAR ASHLEY MORA BARNEY
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 25202-214496 CND

Firma
Nombre: ROBERTO HERNAN HURTADO ROBLEDO
RESIDENTE DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 17202-51811 CDS

Firma
Nombre:ALONSO QUINTERO PEÑARANDA
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
N° Mat. Profesional: 25700-25724 CND

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

1836

CONTRATO N°	511 DE 2023	PROYECTO N°	2021005500331
FECHA DE INICIÓ:	12/12/2023	FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL:	11/03/2025
OBJETO PROYECTO:	"AMPLIACIÓN DE LA CAPACIDAD INSTALADA DEL HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE VILLAVICENCIO ESE - META".		
CONTRATISTA :	CONSORCIO HOSPITAL 002 RL DANIEL ALEJANDRO ENGATIVA RODRIGUEZ NIT: 901752517-0		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	572 DE 2023		
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTER HOSPITAL RL : EDWIN FABIAN HENAO CAMARGO. NIT: 901755332-9		

ACTA:	ACTA DE PAGO PARCIAL No. 3	
CAPITULO:	COMPONENTE ARQUITECTONICO	
N° ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
1,2,3	DEMOLICION CIMIENTO ENTERRADO. INCLUYE TRASIEGO Y CARGUE MANUAL	M3

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA





Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

CONTRATO N°	511 DE 2023	**PROYECTO N°**	2021005500331
FECHA DE INICIÓ:	12/12/2023	FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL:	11/03/2025
OBJETO PROYECTO:	"AMPLIACIÓN DE LA CAPACIDAD INSTALADA DEL HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE VILLAVICENCIO ESE - META".		
CONTRATISTA :	CONSORCIO HOSPITAL 002 RL DANIEL ALEJANDRO ENGATIVA RODRIGUEZ NIT: 901752517-0		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	572 DE 2023		
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTER HOSPITAL RL : EDWIN FABIAN HENAO CAMARGO. NIT: 901755332-9		

ACTA:	**ACTA DE PAGO PARCIAL No. 3**	
CAPITULO:	**COMPONENTE ARQUITECTONICO**	
N° ÍTEM	**DESCRIPCIÓN**	**UNIDAD**
1,2,4	**DEMOLICION MANUAL MURO DIVISORIO BLOQUE DE ARCILLA. INCLUYE TRASIEGO Y CARGUE MANUAL**	**M2**

DESCRIPCIÓN		DIMENSIONES			
		ALTO (M)	LONGITUD (M)	CANTIDAD (UND)	TOTAL (M2)
DETALLE					
CAMPAMENTO	M88	2,5	5,76	1	14,4
	M89	2,5	30,98	1	77,45
	DSC	2	1	-3	-6
	DSC	1,47	7,43	-1	-10,9221
	M90	2,5	30,91	1	77,275
	DSC	1,43	12,97	-1	-18,5471
	DSC	2,2	3,63	-1	-7,986
	M91	2,5	5,83	1	14,575
	M92	2,5	5,73	1	14,325
	DSC	2,2	2,32	-1	-5,104
	M93	2,5	4,24	1	10,6
	M94	2,5	2,1	1	5,25
	M95	2,5	1,75	1	4,375
	M96	2,5	7,67	1	19,175
	M97	2,5	0,9	1	2,25
	DSC COLUMNAS	2,7	0,2	-13	-7,02
OTROS					
ACCESO DE VOLQUETAS	CERRAMIENTO DE MALLA ESLABONADA	7,68	1	1	7,68
	ESLABONES	0,5 0,4	3,05	2	1,22
PASAN: -				SUBTOTAL	193,00
				TOTAL	193,00

Firma
Nombre: JUAN CARLOS RODRIGUEZ SANCHEZ
DIRECTOR DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 2570062356 CND

Firma
Nombre: CESAR ASHLEY MORA BARNEY
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 25202-214496 CND

Firma
Nombre: ROBERTO HERNAN HURTADO ROBLEDO
RESIDENTE DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 17202-51811 CDS

Firma
Nombre: ALONSO QUINTERO PEÑARANDA
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
N° Mat. Profesional: 25700-25724 CND

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.


Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co


CONTRATO N°	511 DE 2023	PROYECTO N°	2021005500331
FECHA DE INICIÓ:	12/12/2023	FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL:	11/03/2025
OBJETO PROYECTO:	"AMPLIACIÓN DE LA CAPACIDAD INSTALADA DEL HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE VILLAVICENCIO ESE - META".		
CONTRATISTA :	CONSORCIO HOSPITAL 002 RL DANIEL ALEJANDRO ENGATIVA RODRIGUEZ NIT: 901752517-0		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	572 DE 2023		
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTER HOSPITAL RL : EDWIN FABIAN HENAO CAMARGO. NIT: 901755332-9		

ACTA:	ACTA DE PAGO PARCIAL No. 3
CAPITULO:	COMPONENTE ARQUITECTONICO

N° ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
1,2,4	DEMOLICION MANUAL MURO DIVISORIO BLOQUE DE ARCILLA. INCLUYE TRASIEGO Y CARGUE MANUAL	M2

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA

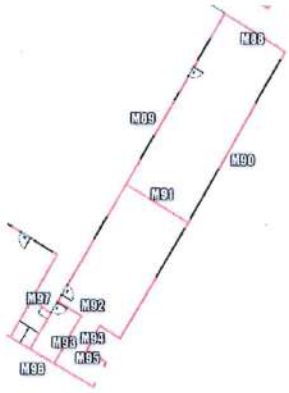



CERRAMIENTO





18639

CONTRATO N°	511 DE 2023	PROYECTO N°	2021005500331
FECHA DE INICIÓ:	12/12/2023	FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL:	11/03/2025
OBJETO PROYECTO:	"AMPLIACIÓN DE LA CAPACIDAD INSTALADA DEL HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE VILLAVICENCIO ESE - META".		
CONTRATISTA :	CONSORCIO HOSPITAL 002 RL DANIEL ALEJANDRO ENGATIVA RODRIGUEZ NIT: 901752517-0		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	572 DE 2023		
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTER HOSPITAL RL : EDWIN FABIAN HENAO CAMARGO. NIT: 901755332-9		

ACTA:	ACTA DE PAGO PARCIAL No. 3

CAPITULO:	COMPONENTE ARQUITECTONICO	
N° ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
1,2,5	DEMOLICIÓN CONCRETO REFORZADO. INCLUYE TRASIEGO Y CARGUE MANUAL	M3

DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES				
	ANCHO (M)	ALTO (M)	LONGITUD (M)	CANTIDAD (UND)	TOTAL (M3)
CAMPAMENTO					
COLUMNAS	0,25	0,25	2,5	14	2,19
VIGAS CUBIERTA	0,25	0,25	100,33	1	6,27
PASAN:				SUBTOTAL	8,46
				TOTAL	8,46

Firma
Nombre: JUAN CARLOS RODRIGUEZ SANCHEZ
DIRECTOR DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 2570062356 CND

Firma
Nombre: CESAR ASHLEY MORA BARNEY
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 25202-214496 CND

Firma
Nombre: ROBERTO HERNAN HURTADO ROBLEDO
RESIDENTE DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 17202-51811 CDS

Firma
Nombre:ALONSO QUINTERO PEÑARANDA
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
N° Mat. Profesional: 25700-25724 CND

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

0598

CONTRATO N°	511 DE 2023	**PROYECTO N°**	2021005500331
FECHA DE INICIÓ:	12/12/2023	FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL:	11/03/2025
OBJETO PROYECTO:	"AMPLIACIÓN DE LA CAPACIDAD INSTALADA DEL HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE VILLAVICENCIO ESE - META".		
CONTRATISTA :	CONSORCIO HOSPITAL 002 RL DANIEL ALEJANDRO ENGATIVA RODRIGUEZ NIT: 901752517-0		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	572 DE 2023		
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTER HOSPITAL RL : EDWIN FABIAN HENAO CAMARGO. NIT: 901755332-9		

ACTA:	**ACTA DE PAGO PARCIAL No. 3**	
CAPITULO:	**COMPONENTE ARQUITECTONICO**	
N° ÍTEM	**DESCRIPCIÓN**	**UNIDAD**
1,2,5	**DEMOLICIÓN CONCRETO REFORZADO. INCLUYE TRASIEGO Y CARGUE MANUAL**	**M3**

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA



CAMPAMENTO



1598

CONTRATO N°	511 DE 2023	**PROYECTO N°**	2021005500331
FECHA DE INICIÓ:	12/12/2023	FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL:	11/03/2025
OBJETO PROYECTO:	"AMPLIACIÓN DE LA CAPACIDAD INSTALADA DEL HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE VILLAVICENCIO ESE - META".		
CONTRATISTA :	CONSORCIO HOSPITAL 002 RL DANIEL ALEJANDRO ENGATIVA RODRIGUEZ NIT: 901752517-0		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	572 DE 2023		
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTER HOSPITAL RL : EDWIN FABIAN HENAO CAMARGO. NIT: 901755332-9		

ACTA:	**ACTA DE PAGO PARCIAL No. 3**
CAPITULO:	**COMPONENTE ARQUITECTONICO**

Nº ÍTEM	**DESCRIPCIÓN**	**UNIDAD**
1,2,6	DEMOLICION CONCRETO CICLÓPEO. INCLUYE TRASIEGO Y CARGUE MANUAL	M3

DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES			
	AREA (M2)	LARGO (M)	CANTIDAD (UND)	TOTAL (M3)
CAMPAMENTO				
VIGA CIMENTACION	0,15	100,33	1	15,05
PASAN: -			SUBTOTAL	15,05
			TOTAL	15,05

Firma
Nombre: JUAN CARLOS RODRIGUEZ SANCHEZ
DIRECTOR DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 2570062356 CND

Firma
Nombre: CESAR ASHLEY MORA BARNEY
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 25202-214496 CND

Firma
Nombre: ROBERTO HERNAN HURTADO ROBLEDO
RESIDENTE DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 17202-51811 CDS

Firma
Nombre: ALONSO QUINTERO PEÑARANDA
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
N° Mat. Profesional: 25700-25724 CND

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

18942

CONTRATO N°	511 DE 2023	**PROYECTO N°**	2021005500331
FECHA DE INICIÓ:	12/12/2023	FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL:	11/03/2025
OBJETO PROYECTO:	"AMPLIACIÓN DE LA CAPACIDAD INSTALADA DEL HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE VILLAVICENCIO ESE - META".		
CONTRATISTA :	CONSORCIO HOSPITAL 002 RL DANIEL ALEJANDRO ENGATIVA RODRIGUEZ NIT: 901752517-0		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	572 DE 2023		
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTER HOSPITAL RL : EDWIN FABIAN HENAO CAMARGO. NIT: 901755332-9		

ACTA:	**ACTA DE PAGO PARCIAL No. 3**
CAPITULO:	**COMPONENTE ARQUITECTONICO**

N° ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
1,2,6	DEMOLICION CONCRETO CICLÓPEO. INCLUYE TRASIEGO Y CARGUE MANUAL	M3

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA



CONTRATO N°	511 DE 2023	**PROYECTO N°**	2021005500331
FECHA DE INICIÓ:	12/12/2023	FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL:	11/03/2025
OBJETO PROYECTO:	"AMPLIACIÓN DE LA CAPACIDAD INSTALADA DEL HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE VILLAVICENCIO ESE - META".		
CONTRATISTA :	CONSORCIO HOSPITAL 002 RL DANIEL ALEJANDRO ENGATIVA RODRIGUEZ NIT: 901752517-0		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	572 DE 2023		
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTER HOSPITAL RL : EDWIN FABIAN HENAO CAMARGO. NIT: 901755332-9		

ACTA:	**ACTA DE PAGO PARCIAL No. 3**
CAPITULO:	**COMPONENTE ARQUITECTONICO**

N° ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
1,2,7	**DESMONTE DE ESTRUCTURA METALICA DE CUBIERTA. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO.**	M2

DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES			
	AREA (M2)	LONGITUD (M)	CANTIDAD (UND)	TOTAL (M2)
12 AREA MODULO PARTE FRONTAL CONTRA GLORIETA (CAMPAMENTO)	145,2		1	145,20
13 AREA ALERO CORREDOR MODULO FRENTE GLORIETA LADO INTERIOR (CAMPAMENTO)	102,18		1	102,18
14 ALERO FRONTAL CAMPAMENTO LADO GLORIETA	64,12		1	64,12
PASAN: -			SUBTOTAL	311,50
			TOTAL	311,50

Firma
Nombre: JUAN CARLOS RODRIGUEZ SANCHEZ
DIRECTOR DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 2570062356 CND

Firma
Nombre: CESAR ASHLEY MORA BARNEY
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 25202-214496 CND

Firma
Nombre: ROBERTO HERNAN HURTADO ROBLEDO
RESIDENTE DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 17202-51811 CDS

Firma
Nombre:ALONSO QUINTERO PEÑARANDA
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
N° Mat. Profesional: 25700-25724 CND

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

CONTRATO N°	511 DE 2023	**PROYECTO N°**	2021005500331
FECHA DE INICIÓ:	12/12/2023	FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL:	11/03/2025
OBJETO PROYECTO:	"AMPLIACIÓN DE LA CAPACIDAD INSTALADA DEL HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE VILLAVICENCIO ESE - META".		
CONTRATISTA :	CONSORCIO HOSPITAL 002 RL DANIEL ALEJANDRO ENGATIVA RODRIGUEZ NIT: 901752517-0		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	572 DE 2023		
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTER HOSPITAL RL : EDWIN FABIAN HENAO CAMARGO. NIT: 901755332-9		

ACTA:	**ACTA DE PAGO PARCIAL No. 3**

CAPITULO:	**COMPONENTE ARQUITECTONICO**	
N° ÍTEM	**DESCRIPCIÓN**	**UNIDAD**
1,2,8	**DESMONTE DE TEJA ASBESTO CEMENTO. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO**	**M2**

DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES			
	AREA (M2)	LONGITUD (M)	CANTIDAD (UND)	TOTAL (M2)
12 AREA MODULO PARTE FRONTAL CONTRA GLORIETA (CAMPAMENTO)	145,2		1	145,20
13 AREA ALERO CORREDOR MODULO FRENTE GLORIETA LADO INTERIOR (CAMPAMENTO)	102,18		1	102,18
14 ALERO FRONTAL CAMPAMENTO LADO GLORIETA	64,12		1	64,12
PASAN: -			**SUBTOTAL**	**311,50**
			TOTAL	**311,50**

Firma
Nombre: JUAN CARLOS RODRIGUEZ SANCHEZ
DIRECTOR DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 2570062356 CND

Firma
Nombre: CESAR ASHLEY MORA BARNEY
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 25202-214496 CND

Firma
Nombre: ROBERTO HERNAN HURTADO ROBLEDO
RESIDENTE DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 17202-51811 CDS

Firma
Nombre: ALONSO QUINTERO PEÑARANDA
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
N° Mat. Profesional: 25700-25724 CND

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

CONTRATO N°	511 DE 2023	**PROYECTO N°**	2021005500331
FECHA DE INICIÓ:	12/12/2023	FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL:	11/03/2025
OBJETO PROYECTO:	"AMPLIACIÓN DE LA CAPACIDAD INSTALADA DEL HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE VILLAVICENCIO ESE - META".		
CONTRATISTA :	CONSORCIO HOSPITAL 002 RL DANIEL ALEJANDRO ENGATIVA RODRIGUEZ NIT: 901752517-0		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	572 DE 2023		
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTER HOSPITAL RL : EDWIN FABIAN HENAO CAMARGO. NIT: 901755332-9		

ACTA:	**ACTA DE PAGO PARCIAL No. 3**

CAPITULO:	**COMPONENTE ARQUITECTONICO**	
N° ÍTEM	**DESCRIPCIÓN**	**UNIDAD**
1,2,8	**DESMONTE DE TEJA ASBESTO CEMENTO. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO**	**M2**

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA







Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

CONTRATO N°	511 DE 2023	**PROYECTO N°**	2021005500331
FECHA DE INICIÓ:	12/12/2023	FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL:	11/03/2025
OBJETO PROYECTO:	"AMPLIACIÓN DE LA CAPACIDAD INSTALADA DEL HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE VILLAVICENCIO ESE - META".		
CONTRATISTA :	CONSORCIO HOSPITAL 002 RL DANIEL ALEJANDRO ENGATIVA RODRIGUEZ NIT: 901752517-0		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	572 DE 2023		
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTER HOSPITAL RL : EDWIN FABIAN HENAO CAMARGO. NIT: 901755332-9		

ACTA:	**ACTA DE PAGO PARCIAL No. 3**

CAPITULO:	**COMPONENTE ARQUITECTONICO**	
N° ÍTEM	**DESCRIPCIÓN**	**UNIDAD**
1,2,10	**DESMONTE DE MARCO Y PUERTA. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO**	**UN**

DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES			
	AREA (M2)	LONGITUD (M)	CANTIDAD	TOTAL (UN)
CAMPAMENTO			3	3,00
PASAN: -			SUBTOTAL	3,00
			TOTAL	3,00

Firma
Nombre: JUAN CARLOS RODRIGUEZ SANCHEZ
DIRECTOR DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 2570062356 CND

Firma
Nombre: CESAR ASHLEY MORA BARNEY
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 25202-214496 CND

Firma
Nombre: ROBERTO HERNAN HURTADO ROBLEDO
RESIDENTE DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 17202-51811 CDS

Firma
Nombre: ALONSO QUINTERO PEÑARANDA
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
N° Mat. Profesional: 25700-25724 CND

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

18648

CONTRATO N°	511 DE 2023	PROYECTO N°	2021005500331
FECHA DE INICIÓ:	12/12/2023	FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL:	11/03/2025
OBJETO PROYECTO:	"AMPLIACIÓN DE LA CAPACIDAD INSTALADA DEL HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE VILLAVICENCIO ESE - META".		
CONTRATISTA :	CONSORCIO HOSPITAL 002 RL DANIEL ALEJANDRO ENGATIVA RODRIGUEZ NIT: 901752517-0		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	572 DE 2023		
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTER HOSPITAL RL : EDWIN FABIAN HENAO CAMARGO. NIT: 901755332-9		

ACTA:	ACTA DE PAGO PARCIAL No. 3
CAPITULO:	COMPONENTE ARQUITECTONICO

Nº ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
1,2,10	DESMONTE DE MARCO Y PUERTA. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO	UN

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA





Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

18649

CONTRATO N°	511 DE 2023	**PROYECTO N°**	2021005500331
FECHA DE INICIÓ:	12/12/2023	FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL:	11/03/2025
OBJETO PROYECTO:	"AMPLIACIÓN DE LA CAPACIDAD INSTALADA DEL HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE VILLAVICENCIO ESE - META".		
CONTRATISTA :	CONSORCIO HOSPITAL 002 RL DANIEL ALEJANDRO ENGATIVA RODRIGUEZ NIT: 901752517-0		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	572 DE 2023		
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTER HOSPITAL RL : EDWIN FABIAN HENAO CAMARGO. NIT: 901755332-9		

ACTA:	**ACTA DE PAGO PARCIAL No. 3**

CAPITULO:	**COMPONENTE ARQUITECTONICO**	
N° ÍTEM	**DESCRIPCIÓN**	**UNIDAD**
1,2,11	**DESMONTE DE VENTANERÍA ALUMINIO. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO**	**M2**

DESCRIPCIÓN		DIMENSIONES			
		ANCHO (M)	LARGO (M)	CANTIDAD (UND)	TOTAL
CAMPAMENTO					
DESMONTE VENTANAS	FACHADA PRINCIPAL	1,5	2,2	1	3,30
		4,4	1,43	2	12,58
		4,1	1,43	1	5,86
	FACHADA POSTERIOR	2	1,47	1	2,94
		0,7	1,47	1	1,03
		2,13	1,47	1	3,13
		2,6	1,47	1	3,82
PASAN: -				SUBTOTAL	32,67
				TOTAL	32,67

Firma
Nombre: JUAN CARLOS RODRIGUEZ SANCHEZ
DIRECTOR DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 2570062356 CND

Firma
Nombre: CESAR ASHLEY MORA BARNEY
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 25202-214496 CND

Firma
Nombre: ROBERTO HERNAN HURTADO ROBLEDO
RESIDENTE DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 17202-51811 CDS

Firma
Nombre:ALONSO QUINTERO PEÑARANDA
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
N° Mat. Profesional: 25700-25724 CND

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.


Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

0987

CONTRATO N°	511 DE 2023	PROYECTO N°	2021005500331
FECHA DE INICIÓ:	12/12/2023	FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL:	11/03/2025
OBJETO PROYECTO:	"AMPLIACIÓN DE LA CAPACIDAD INSTALADA DEL HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE VILLAVICENCIO ESE - META".		
CONTRATISTA :	CONSORCIO HOSPITAL 002 RL DANIEL ALEJANDRO ENGATIVA RODRIGUEZ NIT: 901752517-0		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	572 DE 2023		
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTER HOSPITAL RL : EDWIN FABIAN HENAO CAMARGO. NIT: 901755332-9		

ACTA:	ACTA DE PAGO PARCIAL No. 3	
CAPITULO:	COMPONENTE ARQUITECTONICO	
N° ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
1,2,11	DESMONTE DE VENTANERÍA ALUMINIO. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO	M2

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA



FACHADA PRINCIPAL CAMPAMENTO






Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

7592

CONTRATO N°	511 DE 2023	PROYECTO N°	2021005500331
FECHA DE INICIÓ:	12/12/2023	FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL:	11/03/2025
OBJETO PROYECTO:	"AMPLIACIÓN DE LA CAPACIDAD INSTALADA DEL HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE VILLAVICENCIO ESE - META".		
CONTRATISTA :	CONSORCIO HOSPITAL 002 RL DANIEL ALEJANDRO ENGATIVA RODRIGUEZ NIT: 901752517-0		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	572 DE 2023		
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTER HOSPITAL RL : EDWIN FABIAN HENAO CAMARGO. NIT: 901755332-9		

ACTA:	ACTA DE PAGO PARCIAL No. 3	
CAPITULO:	COMPONENTE ARQUITECTONICO	
N° ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
1,2,18	**DESMONTE DE CIELO RASO EN LAMINA LIVIANA. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO**	**M2**

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA

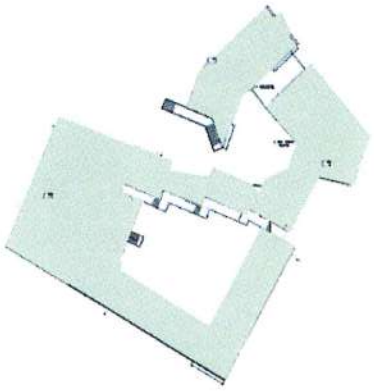







Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

CONTRATO N°	**511 DE 2023**	**PROYECTO N°**	**2021005500331**
FECHA DE INICIÓ:	12/12/2023	FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL:	11/03/2025
OBJETO PROYECTO:	"AMPLIACIÓN DE LA CAPACIDAD INSTALADA DEL HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE VILLAVICENCIO ESE - META".		
CONTRATISTA :	CONSORCIO HOSPITAL 002 RL DANIEL ALEJANDRO ENGATIVA RODRIGUEZ NIT: 901752517-0		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	572 DE 2023		
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTER HOSPITAL RL : EDWIN FABIAN HENAO CAMARGO. NIT: 901755332-9		
ACTA:	**ACTA DE PAGO PARCIAL No. 3**		

CAPITULO:	**COMPONENTE ARQUITECTONICO**	
N° ÍTEM	**DESCRIPCIÓN**	**UNIDAD**
1,3,2	**EXCAVACION MANUAL EN CONGLOMERADO H= 0 - 2.00 M INCLUYE CARGUE**	**M3**

DESCRIPCIÓN			DIMENSIONES				
			ANCHO (M)	ALTO (M)	PROFUNDIDAD (M)	CANTIDAD (UND)	TOTAL (M3)
DETALLE	EJES ZARPAS		AREA (M2)				
ZARPA TIPO 1	1	I-K	28,27	1,20	0,75	1,00	25,44
PASAN: -						SUBTOTAL	25,44
						TOTAL	25,44

Firma
Nombre: JUAN CARLOS RODRIGUEZ SANCHEZ
DIRECTOR DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 2570062356 CND

Firma
Nombre: ROBERTO HERNAN HURTADO ROBLEDO
RESIDENTE DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 17202-51811 CDS

Firma
Nombre: CESAR ASHLEY MORA BARNEY
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 25202-214496 CND

Firma
Nombre:ALONSO QUINTERO PEÑARANDA
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
N° Mat. Profesional: 25700-25724 CND

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.


Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

CONTRATO N°	511 DE 2023	**PROYECTO N°**	2021005500331
FECHA DE INICIÓ:	12/12/2023	FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL:	11/03/2025
OBJETO PROYECTO:	"AMPLIACIÓN DE LA CAPACIDAD INSTALADA DEL HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE VILLAVICENCIO ESE - META".		
CONTRATISTA :	CONSORCIO HOSPITAL 002 RL DANIEL ALEJANDRO ENGATIVA RODRIGUEZ NIT: 901752517-0		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	572 DE 2023		
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTER HOSPITAL RL : EDWIN FABIAN HENAO CAMARGO. NIT: 901755332-9		

ACTA:	**ACTA DE PAGO PARCIAL No. 3**
CAPITULO:	**COMPONENTE ARQUITECTONICO**

N° ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
1,3,2	**EXCAVACION MANUAL EN CONGLOMERADO H= 0 - 2.00 M INCLUYE CARGUE**	**M3**

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA

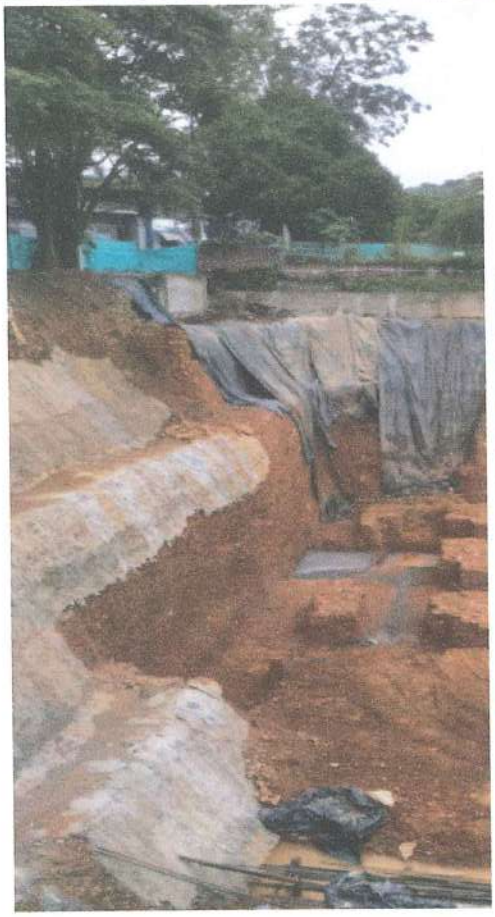



Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

CONTRATO N°	511 DE 2023	PROYECTO N°	2021005500331
FECHA DE INICIÓ:	12/12/2023	FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL:	11/03/2025
OBJETO PROYECTO:	"AMPLIACIÓN DE LA CAPACIDAD INSTALADA DEL HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE VILLAVICENCIO ESE - META".		
CONTRATISTA :	CONSORCIO HOSPITAL 002 RL DANIEL ALEJANDRO ENGATIVA RODRIGUEZ NIT: 901752517-0		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	572 DE 2023		
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTER HOSPITAL RL : EDWIN FABIAN HENAO CAMARGO. NIT: 901755332-9		

ACTA:	ACTA DE PAGO PARCIAL No. 3	
CAPITULO:	COMPONENTE ARQUITECTONICO	
N° ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
1,3,2	EXCAVACION MANUAL EN CONGLOMERADO H= 0 - 2.00 M INCLUYE CARGUE	M3

DESCRIPCIÓN			DIMENSIONES				
			ANCHO (M)	PROFUNDIDAD (M)	LONGITUD (M)	CANTIDAD (UND)	TOTAL (M3)
DETALLE	EJES VIGAS		AREA (M2)				
VIGA 003	F'-G	7-8	0,60	0,75	0,87	1,00	0,39
VIGA 004	H	7-8	0,60	0,75	0,37	1,00	0,17
VIGA 003	F'-G	1-2	0,60	0,75	0,88	1,00	0,39
VIGA 004	H	1-2	0,60	0,75	0,37	1,00	0,17
PASAN:		25,44				SUBTOTAL	1,12
						TOTAL	26,56

Firma
Nombre: JUAN CARLOS RODRIGUEZ SANCHEZ
DIRECTOR DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 2570062356 CND

Firma
Nombre: ROBERTO HERNAN HURTADO ROBLEDO
RESIDENTE DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 17202-51811 CDS

Firma
Nombre: CESAR ASHLEY MORA BARNEY
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 25202-214496 CND

Firma
Nombre:ALONSO QUINTERO PEÑARANDA
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
N° Mat. Profesional: 25700-25724 CND

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.


Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

9598

CONTRATO N°	511 DE 2023	PROYECTO N°	2021005500331
FECHA DE INICIÓ:	12/12/2023	FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL:	11/03/2025
OBJETO PROYECTO:	"AMPLIACIÓN DE LA CAPACIDAD INSTALADA DEL HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE VILLAVICENCIO ESE - META".		
CONTRATISTA :	CONSORCIO HOSPITAL 002 RL DANIEL ALEJANDRO ENGATIVA RODRIGUEZ NIT: 901752517-0		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	572 DE 2023		
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTER HOSPITAL RL : EDWIN FABIAN HENAO CAMARGO. NIT: 901755332-9		

ACTA:	ACTA DE PAGO PARCIAL No. 3	
CAPITULO:	COMPONENTE ARQUITECTONICO	
N° ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
1,3,2	EXCAVACION MANUAL EN CONGLOMERADO H= 0 - 2.00 M INCLUYE CARGUE	M3

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA

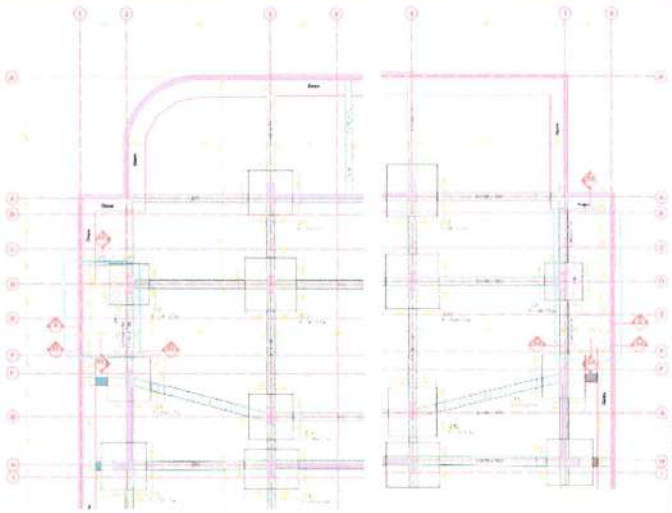





4539

CONTRATO N°	511 DE 2023	**PROYECTO N°**	2021005500331
FECHA DE INICIÓ:	12/12/2023	FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL:	11/03/2025
OBJETO PROYECTO:	"AMPLIACIÓN DE LA CAPACIDAD INSTALADA DEL HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE VILLAVICENCIO ESE - META".		
CONTRATISTA :	CONSORCIO HOSPITAL 002 RL DANIEL ALEJANDRO ENGATIVA RODRIGUEZ NIT: 901752517-0		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	572 DE 2023		
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTER HOSPITAL RL : EDWIN FABIAN HENAO CAMARGO. NIT: 901755332-9		

ACTA:	**ACTA DE PAGO PARCIAL No. 3**
CAPITULO:	**COMPONENTE ARQUITECTONICO**

N° ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
1,3,2	**EXCAVACION MANUAL EN CONGLOMERADO H= 0 - 2.00 M INCLUYE CARGUE**	**M3**

DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES				
	ANCHO (M)	ALTO (M)	LONGITUD (M)	CANTIDAD (UND)	TOTAL (M3)
DETALLE OTROS	AREA (M2)				
TALUD CONTRA GLORIETA	5,94		11,49	1,00	68,20
TALUD CONTRA HOSPITAL	5,94		23,00	1,00	136,51
PASAN: 26,56				SUBTOTAL	204,71
				TOTAL	231,27

Firma
Nombre: JUAN CARLOS RODRIGUEZ SANCHEZ
DIRECTOR DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 2570062356 CND

Firma
Nombre: ROBERTO HERNAN HURTADO ROBLEDO
RESIDENTE DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 17202-51811 CDS

Firma
Nombre: CESAR ASHLEY MORA BARNEY
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 25202-214496 CND


Firma
Nombre: ALONSO QUINTERO PEÑARANDA
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
N° Mat. Profesional: 25700-25724 CND

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

8981

CONTRATO N°	511 DE 2023	PROYECTO N°	2021005500331
FECHA DE INICIÓ:	12/12/2023	FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL:	11/03/2025
OBJETO PROYECTO:	"AMPLIACIÓN DE LA CAPACIDAD INSTALADA DEL HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE VILLAVICENCIO ESE - META".		
CONTRATISTA :	CONSORCIO HOSPITAL 002 RL DANIEL ALEJANDRO ENGATIVA RODRIGUEZ NIT: 901752517-0		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	572 DE 2023		
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTER HOSPITAL RL : EDWIN FABIAN HENAO CAMARGO. NIT: 901755332-9		
ACTA:	ACTA DE PAGO PARCIAL No. 3		

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA

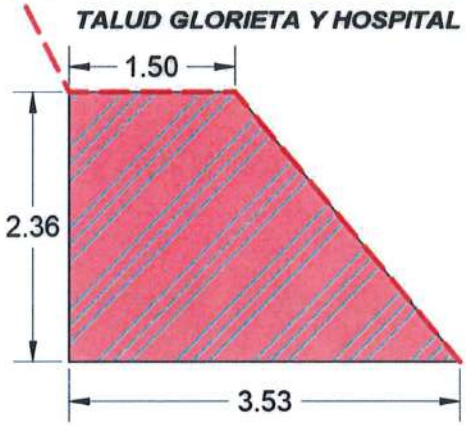





Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

CONTRATO N°	511 DE 2023	**PROYECTO N°**	2021005500331
FECHA DE INICIÓ:	12/12/2023	FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL:	11/03/2025
OBJETO PROYECTO:	"AMPLIACIÓN DE LA CAPACIDAD INSTALADA DEL HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE VILLAVICENCIO ESE - META".		
CONTRATISTA :	CONSORCIO HOSPITAL 002 RL DANIEL ALEJANDRO ENGATIVA RODRIGUEZ NIT: 901752517-0		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	572 DE 2023		
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTER HOSPITAL RL : EDWIN FABIAN HENAO CAMARGO. NIT: 901755332-9		

ACTA:	**ACTA DE PAGO PARCIAL No. 3**
CAPITULO:	**COMPONENTE ARQUITECTONICO**

N° ÍTEM	**DESCRIPCIÓN**	**UNIDAD**
N.P.P.P.1,3,4	**TRANSPORTE DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS Y SOBRANTES**	**VJ**

DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES				
	VOL M3	FACTOR EXPANSION	VJ / 7 M3	CANTIDAD (UND)	TOTAL (TON)
MATERIAL DE EXCAVACION	468,00	1,20	80,23	1,00	80,23
PASAN:				**SUBTOTAL**	**80,23**
				TOTAL	**80,23**

Firma
Nombre: JUAN CARLOS RODRIGUEZ SANCHEZ
DIRECTOR DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 2570062356 CND

Firma
Nombre: ROBERTO HERNAN HURTADO ROBLEDO
RESIDENTE DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 17202-51811 CDS

Firma
Nombre: CESAR ASHLEY MORA BARNEY
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 25202-214496 CND

Firma
Nombre:ALONSO QUINTERO PEÑARANDA
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
N° Mat. Profesional: 25700-25724 CND

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

CONTRATO N°	511 DE 2023	**PROYECTO N°**	2021005500331
FECHA DE INICIÓ:	12/12/2023	FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL:	11/03/2025
OBJETO PROYECTO:	"AMPLIACIÓN DE LA CAPACIDAD INSTALADA DEL HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE VILLAVICENCIO ESE - META".		
CONTRATISTA :	CONSORCIO HOSPITAL 002 RL DANIEL ALEJANDRO ENGATIVA RODRIGUEZ NIT: 901752517-0		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	572 DE 2023		
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTER HOSPITAL RL : EDWIN FABIAN HENAO CAMARGO. NIT: 901755332-9		
ACTA:	**ACTA DE PAGO PARCIAL No. 3**		

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA





Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

CONTRATO N°	**511 DE 2023**	**PROYECTO N°**	**2021005500331**
FECHA DE INICIÓ:	12/12/2023	FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL:	11/03/2025
OBJETO PROYECTO:	"AMPLIACIÓN DE LA CAPACIDAD INSTALADA DEL HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE VILLAVICENCIO ESE - META".		
CONTRATISTA :	CONSORCIO HOSPITAL 002 RL DANIEL ALEJANDRO ENGATIVA RODRIGUEZ NIT: 901752517-0		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	572 DE 2023		
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTERHOSPITAL RL : EDWIN FABIAN HENAO CAMARGO. NIT: 901755332-9		

ACTA:	**ACTA DE PAGO PARCIAL No. 3**

CAPITULO:	**COMPONENTE ARQUITECTONICO**	
N° ÍTEM	**DESCRIPCIÓN**	**UNIDAD**
N.P.1,3,5	**DISPOSICION FINAL DE MATERIAL DE EXCAVACION SITIO AUTORIZADO (NO INCLUYE TRANSPORTE)**	**TON**

DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES				
	VOL M3	DENSIDAD	PESO	CANTIDAD (UND)	TOTAL (TON)
MATERIAL DE EXCAVACION DISPUESTO EN SITIO AUTORIZADO	468,00	1,90	889,20	1,00	889,20
PASAN:				SUBTOTAL	889,20
				TOTAL	889,20

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA



Firma
Nombre: JUAN CARLOS RODRIGUEZ SANCHEZ
DIRECTOR DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 2570062356 CND

Firma
Nombre: ROBERTO HERNAN HURTADO ROBLEDO
RESIDENTE DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 17202-51811 CDS

Firma
Nombre: CESAR ASHLEY MORA BARNEY
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 25202-214496 CND

Firma
Nombre:ALONSO QUINTERO PEÑARANDA
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
N° Mat. Profesional: 25700-25724 CND

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

ZODME GUATIQUIA S.A.S
NIT. 901313682-5

NIT: 901.313.682-5

CERTIFICADO

[Nº 1004]

CERTIFICA

Que la empresa CONSORCIO HOSPITAL 002, con NIT 901752517-0, hizo disposición final de Residuos de Construcción y Demolición, RCD (**DISPOSICION DE RESIDUOS DE EXCAVACION**), producto de la actividad de excavación, construccion, demolición, reparaciones o mejoras locativas de obras civiles o de otras actividades conexas complementarias o análogas que se generaron de **DISPOSICION PROVENIENTE DE HOSPITAL SON DOSCIENTOS CUARENTA METROS CUBICOS DE EXCAVACION** , y que se relacionan a continuación:

TIPO DE MATERIAL	VOLUMEN
DISPOSICION DE RESIDUOS DE EXCAVACION	**240.00** m³

Esta disposición se hizo en la ZODME GUATIQUIA, ubicada en la ciudad de Villavicencio, Departamento del Meta margen izquierda del rio Guatiquia, sector vanguardia y que se encuentra debidamente autorizada por la Corporación para el Desarrollo Sostenible del área de Manejo Especial La Macarena "CORMACARENA", según los permisos otorgados,mediante los oficios, No. PM GA 3.17.6217 Y PM GA 3.18.4664, PS-GJ.1.2.6.19.2837

La presente se expide en Villavicencio a los 16 días del mes 10 del año 2.024

MAURICIO VELASQUEZ ZAPATA
Representante Legal

Vereda Vanguardia Sector la Playa
ZODME GUATIQUIA Cel.: 350 370 83 54
Villavicencio - Meta
zodmeguatiquia@gmail.com

16663

ZODME GUATIQUIA S.A.S

NIT. 901313682-5

NIT: 901.313.682-5

CERTIFICADO

CERTIFICA

Nº 1013

Que la empresa CONSORCIO HOSPITAL 002, con NIT 901752517-0, hizo disposición final de Residuos de Construcción y Demolición, RCD (**DISPOSICION DE RESIDUOS DE EXCAVACION**), producto de la actividad de excavación, construccion, demolición, reparaciones o mejoras locativas de obras civiles o de otras actividades conexas complementarias o análogas que se generaron de **DISPOSICION PROVENIENTE DE HOSPITAL DE LOS DIAS 30 Y 31 DE OCTUBRE** , y que se relacionan a continuación:

TIPO DE MATERIAL	VOLUMEN
DISPOSICION DE RESIDUOS DE EXCAVACION	**228.00** m^3
DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS DE CONSTRUCCION Y DEMOLICION	**24.00** m^3

Esta disposición se hizo en la ZODME GUATIQUIA, ubicada en la ciudad de Villavicencio, Departamento del Meta margen izquierda del río Guatiquía, sector vanguardia y que se encuentra debidamente autorizada por la Corporación para el Desarrollo Sostenible del área de Manejo Especial La Macarena "CORMACARENA", según los permisos otorgados,mediante los oficios, No. PM GA 3.17.6217 Y PM GA 3.18.4664, PS-GJ.1.2.6.19.2837

La presente se expide en Villavicencio a los 5 días del mes 11 del año 2.024.

MAURICIO VELASQUEZ ZAPATA
Representante Legal

Vereda Vanguardia Sector la Playa
ZODME GUATIQUIA Cel.: 350 370 83 54
Villavicencio - Meta
zodmeguatiquia@gmail.com

CONTRATO N°	511 DE 2023	**PROYECTO N°**	2021005500331
FECHA DE INICIÓ:	12/12/2023	FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL:	11/03/2025
OBJETO PROYECTO:	"AMPLIACIÓN DE LA CAPACIDAD INSTALADA DEL HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE VILLAVICENCIO ESE - META".		
CONTRATISTA :	CONSORCIO HOSPITAL 002 RL DANIEL ALEJANDRO ENGATIVA RODRIGUEZ NIT: 901752517-0		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	572 DE 2023		
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTER HOSPITAL RL : EDWIN FABIAN HENAO CAMARGO. NIT: 901755332-9		

ACTA:	**ACTA DE PAGO PARCIAL No. 3**
CAPITULO:	**COMPONENTE ARQUITECTONICO**

Nº ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
2,3,5	**TORRES, ESTRUCTURAS ESBELTAS EN CONCRETO 34.5 MPa (5000 PSI) SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN**	**M3**

DESCRIPCIÓN			DIMENSIONES				
			ANCHO (M)	ALTO (M)	LONGITUD (M)	CANTIDAD (UND)	TOTAL (M3)
DETALLE	EJES MURO FOSO ASCENSOR						
MURO FOSO ASCENSOR	D	1-2	0,30	0,25	3,00	1,00	0,23
MURO FOSO ASCENSOR	E	1-2	0,25	1,20	3,00	1,00	0,90
MURO FOSO ASCENSOR	F	1-2	0,25	1,20	3,00	1,00	0,90
PASAN: -						SUBTOTAL	2,03
						TOTAL	2,03

Firma
Nombre: JUAN CARLOS RODRIGUEZ SANCHEZ
DIRECTOR DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 2570062356 CND

Firma
Nombre: ROBERTO HERNAN HURTADO ROBLEDO
RESIDENTE DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 17202-51811 CDS

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

Firma
Nombre: CESAR ASHLEY MORA BARNEY
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 25202-214496 CND

Firma
Nombre:ALONSO QUINTERO PEÑARANDA
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
N° Mat. Profesional: 25700-25724 CND

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

(5998)

CONTRATO N°	**511 DE 2023**	**PROYECTO N°**	**2021005500331**
FECHA DE INICIÓ:	12/12/2023	FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL:	11/03/2025
OBJETO PROYECTO:	"AMPLIACIÓN DE LA CAPACIDAD INSTALADA DEL HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE VILLAVICENCIO ESE - META".		
CONTRATISTA :	CONSORCIO HOSPITAL 002 RL DANIEL ALEJANDRO ENGATIVA RODRIGUEZ NIT: 901752517-0		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	572 DE 2023		
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTER HOSPITAL RL : EDWIN FABIAN HENAO CAMARGO. NIT: 901755332-9		

ACTA:	**ACTA DE PAGO PARCIAL No. 3**	
CAPITULO:	**COMPONENTE ARQUITECTONICO**	
N° ÍTEM	**DESCRIPCIÓN**	**UNIDAD**
2,3,5	**TORRES, ESTRUCTURAS ESBELTAS EN CONCRETO 34.5 MPa (5000 PSI) SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN**	**M3**

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA







9971

CONTRATO N°	511 DE 2023	PROYECTO N°	2021005500331
FECHA DE INICIÓ:	12/12/2023	FECHA DE TERMINACIÓN	11/03/2025
OBJETO PROYECTO:	"AMPLIACIÓN DE LA CAPACIDAD INSTALADA DEL HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE VILLAVICENCIO ESE - META".		
CONTRATISTA :	CONSORCIO HOSPITAL 002 RL DANIEL ALEJANDRO ENGATIVA RODRIGUEZ NIT: 901752517-0		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	572 DE 2023		
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTER HOSPITAL RL : EDWIN FABIAN HENAO CAMARGO. NIT: 901755332-9		

ACTA:	ACTA DE PAGO PARCIAL No. 3
CAPITULO:	COMPONENTE ARQUITECTONICO

N° ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
2,3,5	TORRES, ESTRUCTURAS ESBELTAS EN CONCRETO 34.5 MPa (5000 PSI) SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3

DESCRIPCIÓN			DIMENSIONES				
			LONGITUD (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)	CANTIDAD (UND)	TOTAL (M3)
DETALLE	EJES MURO PANTALLA Y CONTENCION						
MURO PANTALLA M1 SOTANO	A	3-4	8,83	0,30	3,75	1,00	9,93
MURO PANTALLA M3 SEMISOTANO	7	F'-H	5,12	0,30	2,90	1,00	4,45
MURO PANTALLA M2 SEMISOTANO	H	5-6	11,45	0,30	2,90	1,00	9,96
ZARPA MURO TIPO 1	8	F-I	10,30	1,20	0,40	1,00	4,94
ZARPA MURO TIPO 1	1	F-I	10,10	1,20	0,40	1,00	4,85
ZARPA MURO TIPO 1	8	A-B	1,25	1,20	0,40	1,00	0,60
ZARPA MURO TIPO 1	A	7-8	3,30	1,20	0,40	1,00	1,58
ZARPA MURO TIPO 1	7	A'-A	0,70	1,20	0,40	1,00	0,34
MURO TIPO 1 SOTANO	1	F-I	10,10	0,30	4,65	1,00	14,09
MURO TIPO 1 SOTANO	8	A-B	0,95	0,30	4,65	1,00	1,33
MURO TIPO 1 SOTANO	A	7-8	3,30	0,30	4,65	1,00	4,60
MURO TIPO 1 SOTANO	7	A'-A	0,70	0,30	4,65	1,00	0,98
MURO TIPO 7 SOTANO	1	D-F	5,07	0,30	4,65	1,00	7,07
MURO TIPO 1 SOTANO	1	A-D	6,20	0,30	4,65	1,00	8,65
MURO TIPO 1 SOTANO	A	1-2	3,27	0,30	4,65	1,00	4,56
PASAN:		2,03				SUBTOTAL	77,93
						TOTAL	79,96

Firma
Nombre: JUAN CARLOS RODRIGUEZ SANCHEZ
DIRECTOR DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 2570062356 CND

Firma
Nombre: CESAR ASHLEY MORA BARNEY
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 25202-214496 CND

Firma
Nombre: ROBERTO HERNAN HURTADO ROBLEDO
RESIDENTE DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 17202-51811 CDS

Firma
Nombre:ALONSO QUINTERO PEÑARANDA
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
N° Mat. Profesional: 25700-25724 CND

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

CONTRATO N°	**511 DE 2023**	**PROYECTO N°**	**2021005500331**
FECHA DE INICIÓ:	12/12/2023	FECHA DE TERMINACIÓN	11/03/2025
OBJETO PROYECTO:	"AMPLIACIÓN DE LA CAPACIDAD INSTALADA DEL HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE VILLAVICENCIO ESE - META".		
CONTRATISTA :	CONSORCIO HOSPITAL 002 RL DANIEL ALEJANDRO ENGATIVA RODRIGUEZ NIT: 901752517-0		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	572 DE 2023		
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTER HOSPITAL RL : EDWIN FABIAN HENAO CAMARGO. NIT: 901755332-9		

ACTA:	**ACTA DE PAGO PARCIAL No. 3**	
CAPITULO:	**COMPONENTE ARQUITECTONICO**	
N° ÍTEM	**DESCRIPCIÓN**	**UNIDAD**
2,3,5	**TORRES, ESTRUCTURAS ESBELTAS EN CONCRETO 34.5 MPa (5000 PSI) SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN**	**M3**

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA







8993

CONTRATO N°	**511 DE 2023**	**PROYECTO N°**	**2021005500331**
FECHA DE INICIÓ:	12/12/2023	FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL:	11/03/2025
OBJETO PROYECTO:	"AMPLIACIÓN DE LA CAPACIDAD INSTALADA DEL HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE VILLAVICENCIO ESE - META".		
CONTRATISTA :	CONSORCIO HOSPITAL 002 RL DANIEL ALEJANDRO ENGATIVA RODRIGUEZ NIT: 901752517-0		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	572 DE 2023		
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTER HOSPITAL RL : EDWIN FABIAN HENAO CAMARGO. NIT: 901755332-9		

ACTA:	**ACTA DE PAGO PARCIAL No. 3**
CAPITULO:	**COMPONENTE ARQUITECTONICO**
N° ÍTEM	**DESCRIPCIÓN** / **UNIDAD**
N.P. 2,3,10	**PLACA DE ENTREPISO ALIGERADA E= 0.60 M EN CONCRETO 35 MPa (5000 PSI) PREMEZCLADO CON CASETÓN RECUPERABLE. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN (losa superior=0,10m)** — **M2**

DESCRIPCIÓN			DIMENSIONES				
			ANCHO (M)	ALTO (M)	PROFUNDIDAD (M)	CANTIDAD (UND)	TOTAL (MM2)
DETALLE	EJES DE PLACA		AREA (M2)				
PLACA SEMISOTANO	3-4	D-G	77,62		0,10	1,00	77,62
	3-4	G-H	25,81		0,10	1,00	25,81
	2-3	D-G	83,32		0,10	1,00	83,32
	2-3	G-H	27,71		0,10	1,00	27,71
	6-7	A-D	57,90		0,10	1,00	57,90
	5-6	A-D	64,98		0,10	1,00	64,98
	4-5	A-D	31,50		0,10	1,00	31,50
	3-4	A-D	50,04		0,10	1,00	50,04
	2-3	A-D	53,76		0,10	1,00	53,76
	1-2	A-D	13,80		0,10	1,00	13,80
	5-6	A'-A	8,02		0,10	1,00	8,02
	3'-4	A'-A	2,68		0,10	1,00	2,68
PASAN:						SUBTOTAL	486,44
						TOTAL	486,44

Firma
Nombre: JUAN CARLOS RODRIGUEZ SANCHEZ
DIRECTOR DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 2570062356 CND

Firma
Nombre: ROBERTO HERNAN HURTADO ROBLEDO
RESIDENTE DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 17202-51811 CDS

Firma
Nombre: CESAR ASHLEY MORA BARNEY
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 25202-214496 CND

Firma
Nombre:ALONSO QUINTERO PENARANDA
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
N° Mat. Profesional: 25700-25724 CND

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co


6981

CONTRATO N°	**511 DE 2023**	**PROYECTO N°**	**2021005500331**
FECHA DE INICIÓ:	12/12/2023	FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL:	11/03/2025
OBJETO PROYECTO:	"AMPLIACIÓN DE LA CAPACIDAD INSTALADA DEL HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE VILLAVICENCIO ESE - META".		
CONTRATISTA :	CONSORCIO HOSPITAL 002 RL DANIEL ALEJANDRO ENGATIVA RODRIGUEZ NIT: 901752517-0		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	572 DE 2023		
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTER HOSPITAL RL : EDWIN FABIAN HENAO CAMARGO. NIT: 901755332-9		

ACTA:	**ACTA DE PAGO PARCIAL No. 3**
CAPITULO:	**COMPONENTE ARQUITECTONICO**

N° ÍTEM	**DESCRIPCIÓN**	**UNIDAD**
N.P. 2,3,10	**PLACA DE ENTREPISO ALIGERADA E= 0.60 M EN CONCRETO 35 MPa (5000 PSI) PREMEZCLADO CON CASETÓN RECUPERABLE. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN (losa superior=0,10m)**	**M2**

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA

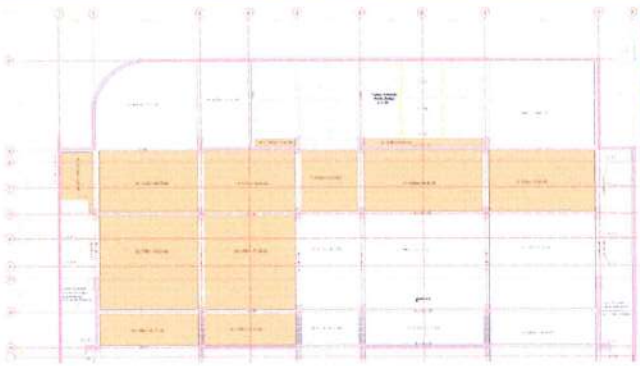





CONTRATO N°	**511 DE 2023**	**PROYECTO N°**	**2021005500331**
FECHA DE INICIÓ:	12/12/2023	FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL:	11/03/2025
OBJETO PROYECTO:	"AMPLIACIÓN DE LA CAPACIDAD INSTALADA DEL HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE VILLAVICENCIO ESE - META".		
CONTRATISTA :	CONSORCIO HOSPITAL 002 RL DANIEL ALEJANDRO ENGATIVA RODRIGUEZ NIT: 901752517-0		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	572 DE 2023		
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTER HOSPITAL RL : EDWIN FABIAN HENAO CAMARGO. NIT: 901755332-9		

ACTA:	**ACTA DE PAGO PARCIAL No. 3**
CAPITULO:	**COMPONENTE ARQUITECTONICO**

Nº ÍTEM	**DESCRIPCIÓN**	**UNIDAD**
N.P. 2,3,15	**SOLADO DE LIMPIEZA - INCLUYE EQUIPOS Y TODO LO NECESARIO DE ACUERDO A PLANOS Y ESPECIFICACIONES**	**M3**

DESCRIPCIÓN			DIMENSIONES				
			ANCHO (M)	ALTO (M)	PROFUNDIDAD (M)	CANTIDAD (UND)	TOTAL (M3)
DETALLE	EJES ZARPAS		AREA (M2)				
ZARPA TIPO 1	1	A-D	6,20	1,20	0,05	1,00	0,37
ZARPA TIPO 1	A	1-2	3,57	1,20	0,05	1,00	0,21
ZARPA TIPO 1	8	A-B	1,25	1,20	0,05	1,00	0,08
PASAN:						SUBTOTAL	0,66
						TOTAL	0,66

Firma
Nombre: JUAN CARLOS RODRIGUEZ SANCHEZ
DIRECTOR DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 2570062356 CND

Firma
Nombre: CESAR ASHLEY MORA BARNEY
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 25202-214496 CND

Firma
Nombre: ROBERTO HERNAN HURTADO ROBLEDO
RESIDENTE DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 17202-51811 CDS

Firma
Nombre:ALONSO QUINTERO PEÑARANDA
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
N° Mat. Profesional: 25700-25724 CND

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

1681

CONTRATO N°	511 DE 2023	PROYECTO N°	2021005500331
FECHA DE INICIÓ:	12/12/2023	FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL:	11/03/2025
OBJETO PROYECTO:	"AMPLIACIÓN DE LA CAPACIDAD INSTALADA DEL HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE VILLAVICENCIO ESE - META".		
CONTRATISTA :	CONSORCIO HOSPITAL 002 RL DANIEL ALEJANDRO ENGATIVA RODRIGUEZ NIT: 901752517-0		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	572 DE 2023		
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTER HOSPITAL RL : EDWIN FABIAN HENAO CAMARGO. NIT: 901755332-9		

ACTA:	ACTA DE PAGO PARCIAL No. 3	
CAPITULO:	COMPONENTE ARQUITECTONICO	
N° ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
N.P. 2,3,15	**SOLADO DE LIMPIEZA - INCLUYE EQUIPOS Y TODO LO NECESARIO DE ACUERDO A PLANOS Y ESPECIFICACIONES**	**M3**

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA





2891

CONTRATO N°	511 DE 2023	PROYECTO N°	2021005500331
FECHA DE INICIÓ:	12/12/2023	FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL:	11/03/2025
OBJETO PROYECTO:	"AMPLIACIÓN DE LA CAPACIDAD INSTALADA DEL HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE VILLAVICENCIO ESE - META".		
CONTRATISTA :	CONSORCIO HOSPITAL 002 RL DANIEL ALEJANDRO ENGATIVA RODRIGUEZ NIT: 901752517-0		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	572 DE 2023		
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTER HOSPITAL RL : EDWIN FABIAN HENAO CAMARGO. NIT: 901755332-9		

ACTA:	ACTA DE PAGO PARCIAL No. 3
CAPITULO:	COMPONENTE ARQUITECTONICO

N° ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
N.P.2,3,21	**VIGA EN CONCRETO 34.5 MPa (5000 PSI) PREMEZCLADO. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN**	**M3**

DESCRIPCIÓN			DIMENSIONES				
			ANCHO (M)	ALTO (M)	PROFUNDIDAD (M)	CANTIDAD (UND)	TOTAL (M3)
DETALLE	EJES VIGAS DE AMARRE						
HUELLA COLUMNAS	A	3	0.60	1.40	0.10	1.00	0.08
HUELLA COLUMNAS	A	4	0.60	1.40	0.00	1.00	0.00
HUELLA COLUMNAS	A	5	0.60	1.40	0.00	1.00	0.00
HUELLA COLUMNAS	A	6	0.60	1.40	0.00	1.00	0.00
HUELLA COLUMNAS	D	2	0.60	1.20	1.00	1.00	0.72
HUELLA COLUMNAS	D	3	0.60	1.20	0.00	1.00	0.00
HUELLA COLUMNAS	D	4	0.60	1.20	0.10	1.00	0.07
HUELLA COLUMNAS	D	5	0.60	1.20	0.00	1.00	0.00
HUELLA COLUMNAS	D	6	0.60	1.20	0.00	1.00	0.00
HUELLA COLUMNAS	D	7	0.60	1.20	1.00	1.00	0.72
HUELLA COLUMNAS	F'	2	0.60	1.20	0.20	1.00	0.14
HUELLA COLUMNAS	F'	7	0.60	1.20	0.20	1.00	0.14
HUELLA COLUMNAS	G	3	0.60	1.20	0.10	1.00	0.07
HUELLA COLUMNAS	G	4	0.60	1.20	0.20	1.00	0.14
HUELLA COLUMNAS	G	5	0.60	1.20	0.10	1.00	0.07
HUELLA COLUMNAS	G	6	0.60	1.20	0.00	1.00	0.00
HUELLA COLUMNAS	H	2	0.60	1.40	0.10	1.00	0.08
HUELLA COLUMNAS	H	3-6	0.60	1.20	0.00	1.00	0.00
HUELLA COLUMNAS	H	7	0.60	1.40	0.10	1.00	0.08
PASAN:		-				SUBTOTAL	2.31
						TOTAL	2.31

Firma
Nombre: JUAN CARLOS RODRIGUEZ SANCHEZ
DIRECTOR DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 2570062356 CND

Firma
Nombre: ROBERTO HERNAN HURTADO ROBLEDO
RESIDENTE DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 17202-51811 CDS

Firma
Nombre: CESAR ASHLEY MORA BARNEY
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 25202-214496 CND

Firma
Nombre:ALONSO QUINTERO PEÑARANDA
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
N° Mat. Profesional: 25700-25724 CND

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co


CONTRATO N°	511 DE 2023	PROYECTO N°	2021005500331
FECHA DE INICIÓ:	12/12/2023	FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL:	11/03/2025
OBJETO PROYECTO:	"AMPLIACIÓN DE LA CAPACIDAD INSTALADA DEL HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE VILLAVICENCIO ESE - META".		
CONTRATISTA :	CONSORCIO HOSPITAL 002 RL DANIEL ALEJANDRO ENGATIVA RODRIGUEZ NIT: 901752517-0		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	572 DE 2023		
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTER HOSPITAL RL : EDWIN FABIAN HENAO CAMARGO. NIT: 901755332-9		


ACTA:	ACTA DE PAGO PARCIAL No. 3

CAPITULO:	COMPONENTE ARQUITECTONICO	
N° ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
N.P.2,3,21	**VIGA EN CONCRETO 34.5 MPa (5000 PSI) PREMEZCLADO. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN**	**M3**

DESCRIPCIÓN		DIMENSIONES				
		ANCHO (M)	ALTO (M)	PROFUNDIDAD (M)	CANTIDAD (UND)	TOTAL (M3)
DETALLE	EJES VIGAS DE AMARRE					

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA

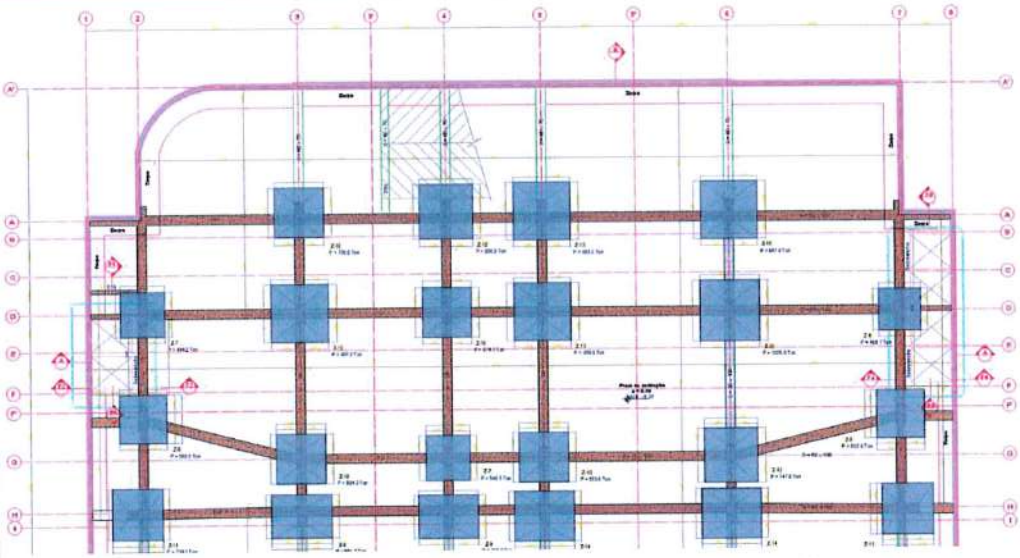







CONTRATO N°	511 DE 2023	PROYECTO N°	2021005500331
FECHA DE INICIÓ:	12/12/2023	FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL:	11/03/2025
OBJETO PROYECTO:	"AMPLIACIÓN DE LA CAPACIDAD INSTALADA DEL HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE VILLAVICENCIO ESE - META".		
CONTRATISTA :	CONSORCIO HOSPITAL 002 RL DANIEL ALEJANDRO ENGATIVA RODRIGUEZ NIT: 901752517-0		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	572 DE 2023		
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTER HOSPITAL RL : EDWIN FABIAN HENAO CAMARGO. NIT: 901755332-9		

ACTA:	ACTA DE PAGO PARCIAL No. 3
CAPITULO:	COMPONENTE ARQUITECTONICO

N° ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
N.P.2,3,22	**COLUMNA EN CONCRETO 34.5 MPa (5000 PSI) PREMEZCLADO. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN**	M3

DESCRIPCIÓN			DIMENSIONES				
			ANCHO (M)	ALTO (M)	LONGITUD (M)	CANTIDAD (UND)	TOTAL (M3)
DETALLE	EJES COLUMNAS		SECCION				
COLUMNAS SOTANO	A	3	0.60	1.40	3.75	1.00	3.15
COLUMNAS SOTANO	A	4	0.60	1.40	3.75	1.00	3.15
COLUMNAS SEMISOTANO	D	3	0.60	1.20	2.90	1.00	2.09
COLUMNAS SEMISOTANO	D	4	0.60	1.20	2.90	1.00	2.09
COLUMNAS SEMISOTANO	D	5	0.60	1.20	2.90	1.00	2.09
COLUMNAS SEMISOTANO	D	6	0.60	1.20	2.90	1.00	2.09
COLUMNAS SEMISOTANO	D	7	0.60	1.20	2.90	1.00	2.09
COLUMNAS SEMISOTANO	F'	7	0.60	1.20	2.90	1.00	2.09
COLUMNAS SEMISOTANO	G	4	0.60	1.20	2.90	1.00	2.09
COLUMNAS SEMISOTANO	G	5	0.60	1.20	2.90	1.00	2.09
COLUMNAS SEMISOTANO	G	6	0.60	1.20	2.90	1.00	2.09
COLUMNAS SEMISOTANO	H	4	0.60	1.20	2.90	1.00	2.09
COLUMNAS SEMISOTANO	H	5	0.60	1.20	2.90	1.00	2.09
COLUMNAS SEMISOTANO	H	6	0.60	1.20	2.90	1.00	2.09
COLUMNAS SEMISOTANO	H	7	0.60	1.40	2.90	1.00	2.44
PASAN:						SUBTOTAL	33.82
						TOTAL	33.82

Firma
Nombre: JUAN CARLOS RODRIGUEZ SANCHEZ
DIRECTOR DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 2570062356 CND

Firma
Nombre: ROBERTO HERNAN HURTADO ROBLEDO
RESIDENTE DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 17202-51811 CDS

Firma
Nombre: CESAR ASHLEY MORA BARNEY
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 25202-214496 CND

Firma
Nombre:ALONSO QUINTERO PEÑARANDA
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
N° Mat. Profesional: 25700-25724 CND


Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.


Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

CONTRATO N°	511 DE 2023	PROYECTO N°	2021005500331
FECHA DE INICIÓ:	12/12/2023	FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL:	11/03/2025
OBJETO PROYECTO:	"AMPLIACIÓN DE LA CAPACIDAD INSTALADA DEL HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE VILLAVICENCIO ESE - META".		
CONTRATISTA :	CONSORCIO HOSPITAL 002 RL DANIEL ALEJANDRO ENGATIVA RODRIGUEZ NIT: 901752517-0		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	572 DE 2023		
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTER HOSPITAL RL : EDWIN FABIAN HENAO CAMARGO. NIT: 901755332-9		

ACTA:	ACTA DE PAGO PARCIAL No. 3	
CAPITULO:	COMPONENTE ARQUITECTONICO	
N° ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
N.P.2,3,22	**COLUMNA EN CONCRETO 34.5 MPa (5000 PSI) PREMEZCLADO. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN**	**M3**

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA

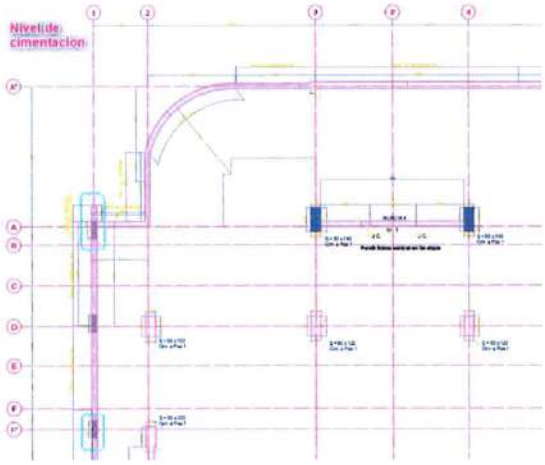

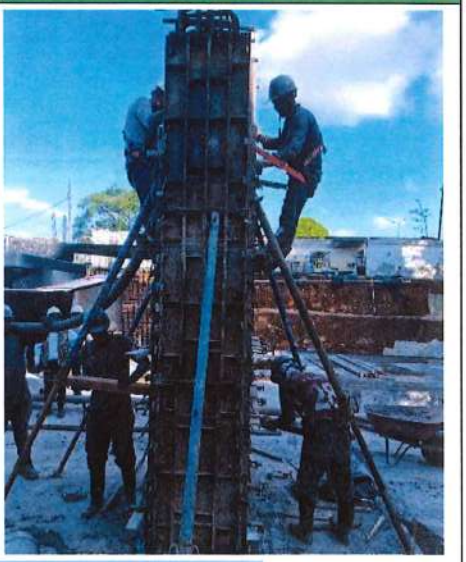




9498

CONTRATO N°	511 DE 2023	PROYECTO N°	2021005500331
FECHA DE INICIÓ:	12/12/2023	FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL:	11/03/2025
OBJETO PROYECTO:	"AMPLIACIÓN DE LA CAPACIDAD INSTALADA DEL HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE VILLAVICENCIO ESE - META".		
CONTRATISTA :	CONSORCIO HOSPITAL 002 RL DANIEL ALEJANDRO ENGATIVA RODRIGUEZ NIT: 901752517-0		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	572 DE 2023		
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTER HOSPITAL RL : EDWIN FABIAN HENAO CAMARGO. NIT: 901755332-9		

ACTA:	ACTA DE PAGO PARCIAL No. 3
CAPITULO:	COMPONENTE ARQUITECTONICO

N° ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
N.P.2,3,22	**COLUMNA EN CONCRETO 34.5 MPa (5000 PSI) PREMEZCLADO. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN**	**M3**

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA

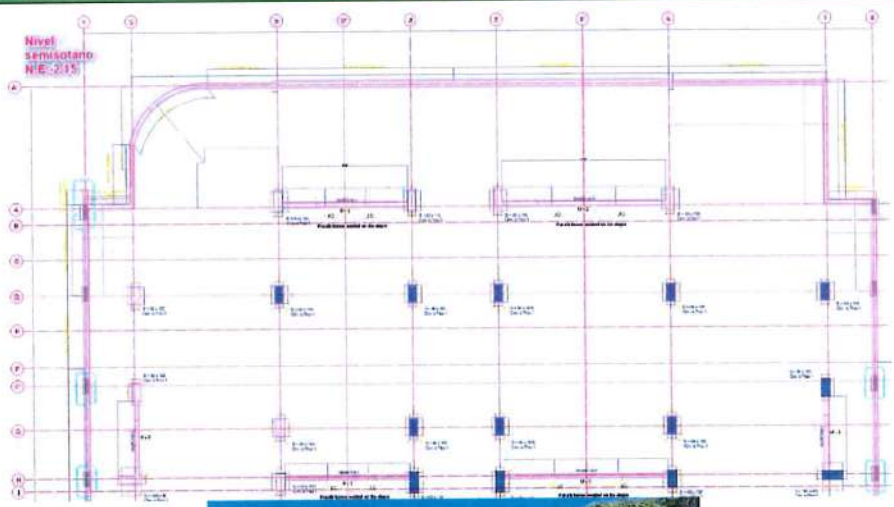



CONTRATO N°	511 DE 2023	PROYECTO N°	2021005500331
FECHA DE INICIÓ:	12/12/2023	FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL:	11/03/2025
OBJETO PROYECTO:	"AMPLIACIÓN DE LA CAPACIDAD INSTALADA DEL HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE VILLAVICENCIO ESE - META".		
CONTRATISTA :	CONSORCIO HOSPITAL 002 RL DANIEL ALEJANDRO ENGATIVA RODRIGUEZ NIT: 901752517-0		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	572 DE 2023		
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTERHOSPITAL RL : EDWIN FABIAN HENAO CAMARGO. NIT: 901755332-9		

ACTA:	ACTA DE PAGO PARCIAL No. 3
CAPITULO:	COMPONENTE ARQUITECTONICO

N° ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
N.P. 2,3,23	**VÍGA AÉREA EN CONCRETO 34.5 MPa (5000 PSI) PREMEZCLADO. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN**	**M3**

DESCRIPCIÓN			DIMENSIONES				
			ANCHO (M)	ALTO (M)	LONGITUD (M)	CANTIDAD (UND)	TOTAL (M3)
DETALLE	EJES DE VIGAS						
VIGA S-134	7	A-D	0.60	0.60	7.03	1.00	2.53
VIGA S-133	6	A-D	0.60	0.60	5.68	1.00	2.04
	6	A-A'	0.75	0.60	1.35	1.00	0.61
VIGA S-132	5	A-G	0.60	0.60	7.03	1.00	2.53
VIGA S-131	4	A-G	0.60	0.60	7.03	1.00	2.53
VIGA S-129	3	A-I	0.60	0.60	18.12	1.00	6.52
	3	G-H	0.60	0.50	2.48	1.00	0.74
VIGA S-128	2	A-I	0.60	0.60	13.16	1.00	4.74
	SOBREANCHO		0.40	0.60	6.49	1.00	1.56
PASAN:	-					SUBTOTAL	23.80
						TOTAL	23.80

Firma
Nombre: JUAN CARLOS RODRIGUEZ SANCHEZ
DIRECTOR DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 2570062356 CND

Firma
Nombre: ROBERTO HERNAN HURTADO ROBLEDO
RESIDENTE DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 17202-51811 CDS

Firma
Nombre: CESAR ASHLEY MORA BARNEY
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 25202-214496 CND

Firma
Nombre:ALONSO QUINTERO PEÑARANDA
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
N° Mat. Profesional: 25700-25724 CND

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

CONTRATO N°	511 DE 2023	PROYECTO N°	2021005500331
FECHA DE INICIÓ:	12/12/2023	FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL:	11/03/2025
OBJETO PROYECTO:	"AMPLIACIÓN DE LA CAPACIDAD INSTALADA DEL HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE VILLAVICENCIO ESE - META".		
CONTRATISTA :	CONSORCIO HOSPITAL 002 RL DANIEL ALEJANDRO ENGATIVA RODRIGUEZ NIT: 901752517-0		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	572 DE 2023		
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTERHOSPITAL RL : EDWIN FABIAN HENAO CAMARGO. NIT: 901755332-9		

ACTA:	ACTA DE PAGO PARCIAL No. 3
CAPITULO:	COMPONENTE ARQUITECTONICO

N° ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
N.P. 2,3,23	**VÍGA AÉREA EN CONCRETO 34.5 MPa (5000 PSI) PREMEZCLADO. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN**	**M3**

DESCRIPCIÓN			DIMENSIONES				
			ANCHO (M)	ALTO (M)	LONGITUD (M)	CANTIDAD (UND)	TOTAL (M3)
DETALLE	EJES VIGUETAS						
S-106	1-2	A	0.20	0.60	3.00	1.00	0.36
	2-3	A	0.40	0.60	9.47	1.00	2.27
	3-4	A	0.40	0.60	8.83	1.00	2.12
	4-5	A	0.40	0.60	5.55	1.00	1.33
	5-6	A	0.40	0.60	11.45	1.00	2.75
	6-7	A	0.40	0.60	10.05	1.00	2.41
S-109	1-2	D	0.30	0.60	2.60	1.00	0.47
	2-3	D	0.40	0.60	9.47	1.00	2.27
	3-4	D	0.40	0.60	8.82	1.00	2.12
S-116	2	3	0.40	0.60	9.47	1.00	2.27
	3	4	0.40	0.60	8.82	1.00	2.12
S-118	2	3	0.40	0.60	9.47	1.00	2.27
	3	4	0.40	0.60	8.82	1.00	2.12
PASAN:		23.80				SUBTOTAL	24.88
						TOTAL	48.68

Firma
Nombre: JUAN CARLOS RODRIGUEZ SANCHEZ
DIRECTOR DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 2570062356 CND

Firma
Nombre: CESAR ASHLEY MORA BARNEY
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 25202-214496 CND

Firma
Nombre: ROBERTO HERNAN HURTADO ROBLEDO
RESIDENTE DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 17202-51811 CDS

Firma
Nombre: ALONSO QUINTERO PEÑARANDA
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
N° Mat. Profesional: 25700-25724 CND

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.


6798

CONTRATO N°	511 DE 2023	PROYECTO N°	2021005500331
FECHA DE INICIÓ:	12/12/2023	FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL:	11/03/2025
OBJETO PROYECTO:	"AMPLIACIÓN DE LA CAPACIDAD INSTALADA DEL HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE VILLAVICENCIO ESE - META".		
CONTRATISTA :	CONSORCIO HOSPITAL 002 RL DANIEL ALEJANDRO ENGATIVA RODRIGUEZ NIT: 901752517-0		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	572 DE 2023		
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTERHOSPITAL RL : EDWIN FABIAN HENAO CAMARGO. NIT: 901755332-9		

ACTA:	ACTA DE PAGO PARCIAL No. 3

CAPITULO:	COMPONENTE ARQUITECTONICO	
N° ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
N.P. 2,3,23	**VÍGA AÉREA EN CONCRETO 34.5 MPa (5000 PSI) PREMEZCLADO. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN**	**M3**

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA

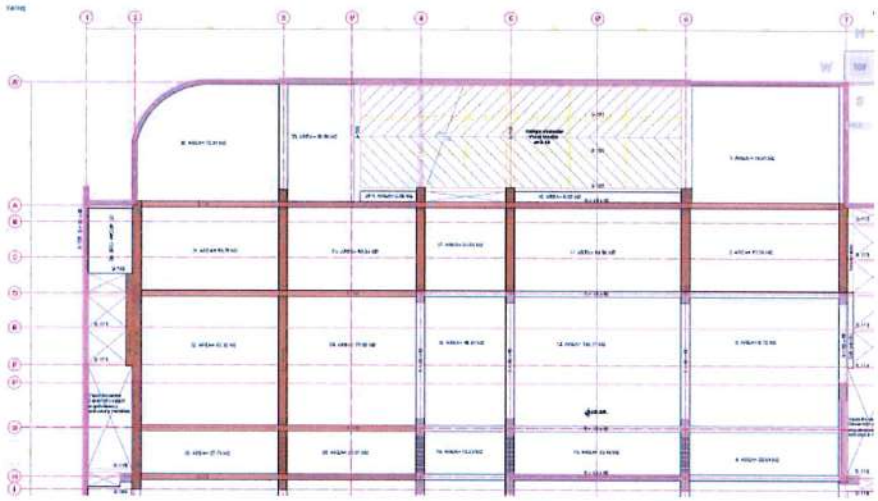





0880

CONTRATO N°	511 DE 2023	PROYECTO N°	2021005500331
FECHA DE INICIÓ:	12/12/2023	FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL:	11/03/2025
OBJETO PROYECTO:	"AMPLIACIÓN DE LA CAPACIDAD INSTALADA DEL HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE VILLAVICENCIO ESE - META".		
CONTRATISTA :	CONSORCIO HOSPITAL 002 RL DANIEL ALEJANDRO ENGATIVA RODRIGUEZ NIT: 901752517-0		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	572 DE 2023		
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTER HOSPITAL RL : EDWIN FABIAN HENAO CAMARGO. NIT: 901755332-9		
ACTA:	ACTA DE PAGO PARCIAL No.1		

CAPITULO:	COMPONENTE ARQUITECTONICO	
N° ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
2,4,1	**ACERO DE REFUERZO FY=4200 MPa (4200 KG/CM2, G60) INCLUYE SUMINISTRO, FIGURADO, ARMADO, COLOCACIÓN Y AMARRE.**	KG

DESCRIPCIÓN		DIMENSIONES				
		LONGITUD (M)	DIAMETRO (#)	PESO (KG/M)	CANTIDAD (UN)	TOTAL (KG)
DETALLE	TIPO DE REFUERZO					
COLUMNA A-4	REFUERZO LONGITUDINAL					0.00
	ESTRIBOS	3.92	3	0.56	27.00	59.27
	ESTRIBOS	0.76	3	0.56	324.00	137.89
	ESTRIBOS	1.56	3	0.56	108.00	94.35
COLUMNA A-5	REFUERZO LONGITUDINAL					0.00
	ESTRIBOS	3.92	3	0.56	28.00	61.47
	ESTRIBOS	0.76	3	0.56	336.00	143.00
	ESTRIBOS	1.56	3	0.56	112.00	97.84
COLUMNA A-6	REFUERZO LONGITUDINAL					0.00
	ESTRIBOS	3.92	3	0.56	27.00	59.27
	ESTRIBOS	0.76	3	0.56	324.00	137.89
	ESTRIBOS	1.56	3	0.56	108.00	94.35
COLUMNA D-2	REFUERZO LONGITUDINAL					0.00
	ESTRIBOS	3.52	3	0.56	25.00	49.28
	ESTRIBOS	0.76	3	0.56	250.00	106.40
	ESTRIBOS	1.36	3	0.56	100.00	76.16
COLUMNA D-3	REFUERZO LONGITUDINAL					0.00
	REFUERZO LONGITUDINAL					0.00
	ESTRIBOS	3.52	3	0.56	25.00	49.28
	ESTRIBOS	0.76	3	0.56	250.00	106.40
	ESTRIBOS	1.36	3	0.56	100.00	76.16
COLUMNA D-4	REFUERZO LONGITUDINAL					0.00
	ESTRIBOS	3.52	3	0.56	25.00	49.28
	ESTRIBOS	0.76	3	0.56	250.00	106.40
	ESTRIBOS	1.36	3	0.56	100.00	76.16
PASAN:					SUBTOTAL	1,580.86
					TOTAL	1,580.86

Firma
Nombre: JUAN CARLOS RODRIGUEZ SANCHEZ
DIRECTOR DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 2570062356 CND

Firma
Nombre: ROBERTO HERNAN HURTADO ROBLEDO
RESIDENTE DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 17202-51811 CDS

Firma
Nombre: CESAR ASHLEY MORA BARNEY
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 25202-214496 CND

Firma
Nombre:ALONSO QUINTERO PEÑARANDA
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
N° Mat. Profesional: 25700-25724 CND

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

1898

CONTRATO N°	511 DE 2023	PROYECTO N°	2021005500331
FECHA DE INICIÓ:	12/12/2023	FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL:	11/03/2025
OBJETO PROYECTO:	"AMPLIACIÓN DE LA CAPACIDAD INSTALADA DEL HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE VILLAVICENCIO ESE - META".		
CONTRATISTA :	CONSORCIO HOSPITAL 002 RL DANIEL ALEJANDRO ENGATIVA RODRIGUEZ NIT: 901752517-0		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	572 DE 2023		
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTER HOSPITAL RL : EDWIN FABIAN HENAO CAMARGO. NIT: 901755332-9		

ACTA:	ACTA DE PAGO PARCIAL No.3

CAPITULO:	COMPONENTE ARQUITECTONICO	
N° ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
2,4,1	**ACERO DE REFUERZO FY=4200 MPa (4200 KG/CM2, G60) INCLUYE SUMINISTRO, FIGURADO, ARMADO, COLOCACIÓN Y AMARRE.**	KG

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA





Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@alm-meta.gov.co

CONTRATO N°	511 DE 2023	PROYECTO N°	2021005500331
FECHA DE INICIÓ:	12/12/2023	FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL:	11/03/2025
OBJETO PROYECTO:	"AMPLIACIÓN DE LA CAPACIDAD INSTALADA DEL HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE VILLAVICENCIO ESE - META".		
CONTRATISTA :	CONSORCIO HOSPITAL 002 RL DANIEL ALEJANDRO ENGATIVA RODRIGUEZ NIT: 901752517-0		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	572 DE 2023		
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTER HOSPITAL RL : EDWIN FABIAN HENAO CAMARGO. NIT: 901755332-9		

ACTA:	ACTA DE PAGO PARCIAL No.3

CAPITULO:	COMPONENTE ARQUITECTONICO	
N° ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
2,4,1	ACERO DE REFUERZO FY=4200 MPa (4200 KG/CM2, G60) INCLUYE SUMINISTRO, FIGURADO, ARMADO, COLOCACIÓN Y AMARRE.	KG

DESCRIPCIÓN		DIMENSIONES				
		LONGITUD (M)	DIAMETRO (#)	PESO (KG/M)	CANTIDAD (UN)	TOTAL (KG)
DETALLE	TIPO DE REFUERZO					
COLUMNA D-5	REFUERZO LONGITUDINAL					0.00
	ESTRIBOS	3.52	3	0.56	25.00	49.28
	ESTRIBOS	0.76	3	0.56	250.00	106.40
	ESTRIBOS	1.36	3	0.56	100.00	76.16
COLUMNA D-6	REFUERZO LONGITUDINAL					0.00
	ESTRIBOS	3.52	3	0.56	25.00	49.28
	ESTRIBOS	0.76	3	0.56	250.00	106.40
	ESTRIBOS	1.36	3	0.56	100.00	76.16
COLUMNA D-7	REFUERZO LONGITUDINAL					0.00
	ESTRIBOS	3.52	3	0.56	28.00	55.19
	ESTRIBOS	0.76	3	0.56	280.00	119.17
	ESTRIBOS	1.36	3	0.56	112.00	85.30
COLUMNA F'-2	REFUERZO LONGITUDINAL					0.00
	ESTRIBOS	3.52	3	0.56	25.00	49.28
	ESTRIBOS	0.76	3	0.56	250.00	106.40
	ESTRIBOS	1.36	3	0.56	100.00	76.16
COLUMNA G-3	REFUERZO LONGITUDINAL					0.00
	ESTRIBOS	3.52	3	0.56	26.00	51.25
	ESTRIBOS	0.76	3	0.56	260.00	110.66
	ESTRIBOS	1.36	3	0.56	104.00	79.21
COLUMNA G-4	REFUERZO LONGITUDINAL					0.00
	REFUERZO LONGITUDINAL					0.00
	ESTRIBOS	3.52	3	0.56	25.00	49.28
	ESTRIBOS	0.76	3	0.56	250.00	106.40
	ESTRIBOS	1.36	3	0.56	100.00	76.16
COLUMNA G-5	REFUERZO LONGITUDINAL					0.00
	ESTRIBOS	3.52	3	0.56	25.00	49.28
	ESTRIBOS	0.76	3	0.56	250.00	106.40
	ESTRIBOS	1.36	3	0.56	100.00	76.16
PASAN:	1,580.86				SUBTOTAL	1,659.97
					TOTAL	3,240.83

Firma
Nombre: JUAN CARLOS RODRIGUEZ SANCHEZ
DIRECTOR DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 2570062356 CND

Firma
Nombre: ROBERTO HERNAN HURTADO ROBLEDO
RESIDENTE DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 17202-51811 CDS

Firma
Nombre: CESAR ASHLEY MORA BARNEY
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 25202-214496 CND

Firma
Nombre:ALONSO QUINTERO PEÑARANDA
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
N° Mat. Profesional: 25700-25724 CND

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

3981

CONTRATO N°:	511 DE 2023	PROYECTO N°:	2021005500331
FECHA DE INICIÓ:	12/12/2023	FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL:	11/03/2025
OBJETO PROYECTO:	"AMPLIACIÓN DE LA CAPACIDAD INSTALADA DEL HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE VILLAVICENCIO ESE - META".		
CONTRATISTA :	CONSORCIO HOSPITAL 002 RL DANIEL ALEJANDRO ENGATIVA RODRIGUEZ NIT: 901752517-0		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	572 DE 2023		
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTER HOSPITAL RL : EDWIN FABIAN HENAO CAMARGO. NIT: 901755332-9		
ACTA:	ACTA DE PAGO PARCIAL No 3		

CAPITULO:	COMPONENTE ARQUITECTONICO	
N° ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
2,4,1	ACERO DE REFUERZO FY=4200 MPa (4200 KG/CM2, G60) INCLUYE SUMINISTRO, FIGURADO, ARMADO, COLOCACIÓN Y AMARRE.	KG

DESCRIPCIÓN		DIMENSIONES				
		LONGITUD (M)	DIAMETRO (Ø)	PESO (KG/M)	CANTIDAD (UN)	TOTAL (KG)
DETALLE	TIPO DE REFUERZO					
COLUMNA G-6	REFUERZO LONGITUDINAL					0.00
	ESTRIBOS	3.52	3	0.56	25.00	49.28
	ESTRIBOS	0.76	3	0.56	250.00	106.40
	ESTRIBOS	1.36	3	0.56	100.00	76.16
COLUMNA F'-7	REFUERZO LONGITUDINAL					0.00
	REFUERZO LONGITUDINAL					0.00
	ESTRIBOS	3.52	3	0.56	25.00	49.28
	ESTRIBOS	0.76	3	0.56	250.00	106.40
	ESTRIBOS	1.36	3	0.56	100.00	76.16
COLUMNA H-2	REFUERZO LONGITUDINAL					0.00
	ESTRIBOS	3.92	3	0.56	28.00	61.47
	ESTRIBOS	0.76	3	0.56	336.00	143.00
	ESTRIBOS	1.56	3	0.56	112.00	97.84
COLUMNA H-3	REFUERZO LONGITUDINAL					0.00
	ESTRIBOS	3.52	3	0.56	25.00	49.28
	ESTRIBOS	0.76	3	0.56	300.00	127.68
	ESTRIBOS	1.36	3	0.56	100.00	76.16
COLUMNA H-4	REFUERZO LONGITUDINAL					0.00
	ESTRIBOS	3.92	3	0.56	27.00	59.27
	ESTRIBOS	0.76	3	0.56	324.00	137.89
	ESTRIBOS	1.56	3	0.56	108.00	94.35
COLUMNA H-5	REFUERZO LONGITUDINAL					0.00
	ESTRIBOS	3.92	3	0.56	27.00	59.27
	ESTRIBOS	0.76	3	0.56	324.00	137.89
	ESTRIBOS	1.56	3	0.56	108.00	94.35
COLUMNA H-6	REFUERZO LONGITUDINAL					0.00
	ESTRIBOS	3.52	3	0.56	25.00	49.28
	ESTRIBOS	0.76	3	0.56	300.00	127.68
	ESTRIBOS	1.36	3	0.56	100.00	76.16
PASAN:	3,240.83				SUBTOTAL	1,855.26
					TOTAL	5,096.09

Firma
Nombre: JUAN CARLOS RODRIGUEZ SANCHEZ
DIRECTOR DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 2570062356 CND

Firma
Nombre: ROBERTO HERNAN HURTADO ROBLEDO
RESIDENTE DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 17202-51811 CDS

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

Firma
Nombre: CESAR ASHLEY MORA BARNEY
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 25202-214496 CND

Firma
Nombre:ALONSO QUINTERO PEÑARANDA
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
N° Mat. Profesional: 25700-25724 CND

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

CONTRATO N°	511 DE 2023	PROYECTO N°	2021005500331
FECHA DE INICIÓ:	12/12/2023	FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL:	11/03/2025
OBJETO PROYECTO:	"AMPLIACIÓN DE LA CAPACIDAD INSTALADA DEL HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE VILLAVICENCIO ESE - META".		
CONTRATISTA :	CONSORCIO HOSPITAL 002 RL DANIEL ALEJANDRO ENGATIVA RODRIGUEZ NIT: 901752517-0		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	572 DE 2023		
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTER HOSPITAL RL : EDWIN FABIAN HENAO CAMARGO. NIT: 901755332-9		

ACTA:	ACTA DE PAGO PARCIAL N°3	
CAPITULO:	COMPONENTE ARQUITECTONICO	
N° ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
2,4,1	ACERO DE REFUERZO FY=4200 MPa (4200 KG/CM2, G60) INCLUYE SUMINISTRO, FIGURADO, ARMADO, COLOCACIÓN Y AMARRE.	KG

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA





Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

CONTRATO N°	511 DE 2023	PROYECTO N°	2021005500331
FECHA DE INICIÓ:	12/12/2023	FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL:	11/03/2025
OBJETO PROYECTO:	"AMPLIACIÓN DE LA CAPACIDAD INSTALADA DEL HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE VILLAVICENCIO ESE - META".		
CONTRATISTA :	CONSORCIO HOSPITAL 002 RL DANIEL ALEJANDRO ENGATIVA RODRIGUEZ NIT: 901752517-0		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	572 DE 2023		
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTER HOSPITAL RL : EDWIN FABIAN HENAO CAMARGO. NIT: 901755332-9		
ACTA:	ACTA DE PAGO PARCIAL No.3		
CAPITULO:	COMPONENTE ARQUITECTONICO		
N° ÍTEM	DESCRIPCIÓN		UNIDAD
2,4,1	**ACERO DE REFUERZO FY=4200 MPa (4200 KG/CM2, G60) INCLUYE SUMINISTRO, FIGURADO, ARMADO, COLOCACIÓN Y AMARRE.**		KG

DESCRIPCIÓN		DIMENSIONES				
		LONGITUD (M)	DIAMETRO (#)	PESO (KG/M)	CANTIDAD (UN)	TOTAL (KG)
DETALLE	TIPO DE REFUERZO					
COLUMNA A-3	REFUERZO LONGITUDINAL					0.00
	ESTRIBOS	3.92	3	0.56	27.00	59.27
	ESTRIBOS	0.76	3	0.56	324.00	137.89
	ESTRIBOS	1.56	3	0.56	108.00	94.35
COLUMNA H-7	REFUERZO LONGITUDINAL					0.00
	ESTRIBOS	3.92	3	0.56	28.00	61.47
	ESTRIBOS	0.76	3	0.56	336.00	143.00
	ESTRIBOS	1.56	3	0.56	112.00	97.84
PASAN:	5,096.09				SUBTOTAL	593.82
					TOTAL	5,689.91

Firma
Nombre: JUAN CARLOS RODRIGUEZ SANCHEZ
DIRECTOR DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 2570062356 CND

Firma
Nombre: ROBERTO HERNAN HURTADO ROBLEDO
RESIDENTE DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 17202-51811 CDS

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

Firma
Nombre: CESAR ASHLEY MORA BARNEY
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 25202-214496 CND

Firma
Nombre:ALONSO QUINTERO PEÑARANDA
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
N° Mat. Profesional: 25700-25724 CND

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

CONTRATO N°	511 DE 2023	PROYECTO N°	2021005500331
FECHA DE INICIÓ:	12/12/2023	FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL:	11/03/2025
OBJETO PROYECTO:	"AMPLIACIÓN DE LA CAPACIDAD INSTALADA DEL HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE VILLAVICENCIO ESE - META".		
CONTRATISTA :	CONSORCIO HOSPITAL 002 RL DANIEL ALEJANDRO ENGATIVA RODRIGUEZ NIT: 901752517-0		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	572 DE 2023		
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTER HOSPITAL RL : EDWIN FABIAN HENAO CAMARGO. NIT: 901755332-9		
ACTA:	ACTA DE PAGO PARCIAL No.3		

CAPITULO:	COMPONENTE ARQUITECTONICO	
N° ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
2,4,1	**ACERO DE REFUERZO FY=4200 MPa (4200 KG/CM2, G60) INCLUYE SUMINISTRO, FIGURADO, ARMADO, COLOCACIÓN Y AMARRE.**	KG

DESCRIPCIÓN		DIMENSIONES				
		LONGITUD (M)	DIAMETRO (#)	PESO (KG/M)	CANTIDAD (UN)	TOTAL (KG)
DETALLE	TIPO DE REFUERZO					
VIGA 002	REFUERZO LONGITUDINAL	8.00	7	3.042	3.00	73.01
	REFUERZO LONGITUDINAL	5.84	7	3.042	2.00	35.51
	REFUERZO LONGITUDINAL	4.50	6	2.235	5.00	50.29
PASAN:	5,689.91				SUBTOTAL	158.81
					TOTAL	5,848.72

Firma
Nombre: JUAN CARLOS RODRIGUEZ SANCHEZ
DIRECTOR DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 2570062356 CND

Firma
Nombre: ROBERTO HERNAN HURTADO ROBLEDO
RESIDENTE DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 17202-51811 CDS

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

Firma
Nombre: CESAR ASHLEY MORA BARNEY
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 25202-214496 CND

Firma
Nombre:ALONSO QUINTERO PEÑARANDA
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
N° Mat. Profesional: 25700-25724 CND

CONTRATO N°	511 DE 2023	PROYECTO N°	2021005500331

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA



Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

MEMORIA DE CALCULO OBRA

112-ECP-FR-027-V05
09/09/2024

CONTRATO N°	511 DE 2023	PROYECTO N°	2021005500331
FECHA DE INICIÓ:	12/12/2023	FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL:	11/03/2025
OBJETO PROYECTO:	"AMPLIACIÓN DE LA CAPACIDAD INSTALADA DEL HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE VILLAVICENCIO ESE - META".		
CONTRATISTA :	CONSORCIO HOSPITAL 002 RL DANIEL ALEJANDRO ENGATIVA RODRIGUEZ NIT: 901752517-0		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	572 DE 2023		
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTER HOSPITAL RL : EDWIN FABIAN HENAO CAMARGO. NIT: 901755332-9		
ACTA:	ACTA DE PAGO PARCIAL No.3		

CAPITULO:	COMPONENTE ARQUITECTONICO	
N° ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
2,4,1	ACERO DE REFUERZO FY=4200 MPa (4200 KG/CM2, G60) INCLUYE SUMINISTRO, FIGURADO, ARMADO, COLOCACIÓN Y AMARRE.	KG

DESCRIPCIÓN		DIMENSIONES				
		LONGITUD (M)	DIAMETRO (#)	PESO (KG/M)	CANTIDAD (UN)	TOTAL (KG)
DETALLE	TIPO DE REFUERZO					
SOBREANCHO VIGA S-128	REFUERZO LONGITUDINAL s	7.00	5	1.552	3.00	32.59
	REFUERZO LONGITUDINAL i	7.00	5	1.552	3.00	32.59
	ESTRIBOS	1.85	3	0.56	33.00	34.20
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
PASAN:	5,848.72				SUBTOTAL	99.38
					TOTAL	5,948.10

Firma
Nombre: JUAN CARLOS RODRIGUEZ SANCHEZ
DIRECTOR DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 2570062356 CND

Firma
Nombre: ROBERTO HERNAN HURTADO ROBLEDO
RESIDENTE DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 17202-51811 CDS

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

Firma
Nombre: CESAR ASHLEY MORA BARNEY
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 25202-214496 CND

Firma
Nombre:ALONSO QUINTERO PEÑARANDA
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
N° Mat. Profesional: 25700-25724 CND

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

CONTRATO N°	511 DE 2023	PROYECTO N°	2021005500331

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA





Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

0881

CONTRATO N°	511 DE 2023	PROYECTO N°	2021005500331
FECHA DE INICIÓ:	12/12/2023	FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL:	11/03/2025
OBJETO PROYECTO:	"AMPLIACIÓN DE LA CAPACIDAD INSTALADA DEL HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE VILLAVICENCIO ESE - META".		
CONTRATISTA :	CONSORCIO HOSPITAL 002 RL DANIEL ALEJANDRO ENGATIVA RODRIGUEZ NIT: 901752517-0		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	572 DE 2023		
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTER HOSPITAL RL : EDWIN FABIAN HENAO CAMARGO. NIT: 901755332-9		

ACTA:	ACTA DE PAGO PARCIAL No.3
CAPITULO:	COMPONENTE ARQUITECTONICO

N° ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
2,4,1	**ACERO DE REFUERZO FY=4200 MPa (4200 KG/CM2, G60) INCLUYE SUMINISTRO, FIGURADO, ARMADO, COLOCACIÓN Y AMARRE.**	KG

DESCRIPCIÓN		DIMENSIONES				
		LONGITUD (M)	DIAMETRO (#)	PESO (KG/M)	CANTIDAD (UN)	TOTAL (KG)
DETALLE	TIPO DE REFUERZO					
MURO M1 EJE H	REFUERZO VERTICAL ARRANQUE					0.00
	REFUERZO VERTICAL SOTANO					0.00
	REFUERZO VERTICAL SEMISOTANO	4.25	4	0.994	90.00	380.21
	REFUERZO HORIZONTAL SOTANO I					0.00
	REFUERZO HORIZONTAL SOTANO c					0.00
	REFUERZO HORIZONTAL SEMISOTANO I	6.80	4	0.994	34.00	229.81
	REFUERZO HORIZONTAL SEMISOTANO c	4.00	4	0.994	34.00	135.18
	GRAPAS SOTANO					0.00
	GRAPAS SEMISOTANO	0.46	3	0.56	147.00	37.87
PASAN:	**5,948.10**				SUBTOTAL	**783.07**
					TOTAL	**6,731.17**

Firma
Nombre: JUAN CARLOS RODRIGUEZ SANCHEZ
DIRECTOR DE OBRA
N° Matricula Profesional: 2570062356 CND

Firma
Nombre: ROBERTO HERNAN HURTADO ROBLEDO
RESIDENTE DE OBRA
N° Matricula Profesional: 17202-51811 CDS

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

Firma
Nombre: CESAR ASHLEY MORA BARNEY
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
N° Matricula Profesional: 25202-214496 CND

Firma
Nombre:ALONSO QUINTERO PENARANDA
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
N° Mat. Profesional: 25700-25724 CND

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

CONTRATO N°	511 DE 2023	PROYECTO N°	2021005500331
FECHA DE INICIÓ:	12/12/2023	FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL:	11/03/2025
OBJETO PROYECTO:	"AMPLIACIÓN DE LA CAPACIDAD INSTALADA DEL HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE VILLAVICENCIO ESE - META".		
CONTRATISTA :	CONSORCIO HOSPITAL 002 RL DANIEL ALEJANDRO ENGATIVA RODRIGUEZ NIT: 901752517-0		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	572 DE 2023		
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTER HOSPITAL RL : EDWIN FABIAN HENAO CAMARGO. NIT: 901755332-9		

ACTA:	ACTA DE PAGO PARCIAL No.3
CAPITULO:	COMPONENTE ARQUITECTONICO

N° ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
2,4,1	ACERO DE REFUERZO FY=4200 MPa (4200 KG/CM2, G60) INCLUYE SUMINISTRO, FIGURADO, ARMADO, COLOCACIÓN Y AMARRE.	KG

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA



Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

CONTRATO N°	511 DE 2023	PROYECTO N°	2021005500331
FECHA DE INICIÓ:	12/12/2023	FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL:	11/03/2025
OBJETO PROYECTO:	"AMPLIACIÓN DE LA CAPACIDAD INSTALADA DEL HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE VILLAVICENCIO ESE - META".		
CONTRATISTA :	CONSORCIO HOSPITAL 002 RL DANIEL ALEJANDRO ENGATIVA RODRIGUEZ NIT: 901752517-0		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	572 DE 2023		
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTER HOSPITAL RL : EDWIN FABIAN HENAO CAMARGO. NIT: 901755332-9		
ACTA:	ACTA DE PAGO PARCIAL No.3		

CAPITULO:	COMPONENTE ARQUITECTONICO	
N° ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
2,4,1	**ACERO DE REFUERZO FY=4200 MPa (4200 KG/CM2, G60) INCLUYE SUMINISTRO, FIGURADO, ARMADO, COLOCACIÓN Y AMARRE.**	KG

DESCRIPCIÓN		DIMENSIONES				
		LONGITUD (M)	DIAMETRO (#)	PESO (KG/M)	CANTIDAD (UN)	TOTAL (KG)
DETALLE	TIPO DE REFUERZO					
MURO M2 EJE H	REFUERZO VERTICAL ARRANQUE					0.00
	REFUERZO VERTICAL SOTANO					0.00
	REFUERZO VERTICAL SEMISOTANO	4.25	4	0.994	116.00	490.04
	REFUERZO HORIZONTAL SOTANO I					0.00
	REFUERZO HORIZONTAL SOTANO c					0.00
	REFUERZO HORIZONTAL SEMISOTANO I	8.00	4	0.994	34.00	270.37
	REFUERZO HORIZONTAL SEMISOTANO c	5.50	4	0.994	34.00	185.88
	GRAPAS SOTANO					0.00
	GRAPAS SEMISOTANO	0.46	3	0.56	189.00	48.69
MURO M2 EJE A	REFUERZO VERTICAL ARRANQUE					0.00
	REFUERZO VERTICAL SOTANO					0.00
	REFUERZO VERTICAL SEMISOTANO	4.25	4	0.994	116.00	490.04
	REFUERZO HORIZONTAL SOTANO I					0.00
	REFUERZO HORIZONTAL SOTANO c					0.00
	REFUERZO HORIZONTAL SEMISOTANO I	6.80	4	0.994	34.00	229.81
	REFUERZO HORIZONTAL SEMISOTANO c	4.00	4	0.994	34.00	135.18
	GRAPAS SOTANO					0.00
	GRAPAS SEMISOTANO	0.46	3	0.56	189.00	48.69
PASAN:	**6,731.17**				**SUBTOTAL**	**1,898.70**
					TOTAL	**8,629.87**

Firma
Nombre: JUAN CARLOS RODRIGUEZ SANCHEZ
DIRECTOR DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 2570062356 CND

Firma
Nombre: CESAR ASHLEY MORA BARNEY
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 25202-214496 CND

Firma
Nombre: ROBERTO HERNAN HURTADO ROBLEDO
RESIDENTE DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 17202-51811 CDS

Firma
Nombre:ALONSO QUINTERO PEÑARANDA
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
N° Mat. Profesional: 25700-25724 CND

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

CONTRATO N°	511 DE 2023	PROYECTO N°	2021005500331

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA



Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

CONTRATO N°	511 DE 2023	PROYECTO N°	2021005500331
FECHA DE INICIÓ:	12/12/2023	FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL:	11/03/2025
OBJETO PROYECTO:	"AMPLIACIÓN DE LA CAPACIDAD INSTALADA DEL HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE VILLAVICENCIO ESE - META".		
CONTRATISTA :	CONSORCIO HOSPITAL 002 RL DANIEL ALEJANDRO ENGATIVA RODRIGUEZ NIT: 901752517-0		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	572 DE 2023		
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTER HOSPITAL RL : EDWIN FABIAN HENAO CAMARGO. NIT: 901755332-9		
ACTA:	ACTA DE PAGO PARCIAL No.3		
CAPITULO:	COMPONENTE ARQUITECTONICO		
N° ÍTEM	DESCRIPCIÓN		UNIDAD
2,4,1	**ACERO DE REFUERZO FY=4200 MPa (4200 KG/CM2, G60) INCLUYE SUMINISTRO, FIGURADO, ARMADO, COLOCACIÓN Y AMARRE.**		KG

DESCRIPCIÓN		DIMENSIONES				
		LONGITUD (M)	DIAMETRO (#)	PESO (KG/M)	CANTIDAD (UN)	TOTAL (KG)
DETALLE	TIPO DE REFUERZO					
MURO M3 EJE 7	REFUERZO VERTICAL ARRANQUE					0.00
	REFUERZO VERTICAL SOTANO					0.00
	REFUERZO VERTICAL SEMISOTANO	4.25	4	0.994	52.00	219.67
	REFUERZO HORIZONTAL SOTANO					0.00
	REFUERZO HORIZONTAL SEMISOTANO	8.00	4	0.994	22.00	174.94
	GRAPAS SOTANO					0.00
	GRAPAS SEMISOTANO	0.46	3	0.56	99.00	25.50
PASAN:	8,629.87				SUBTOTAL	420.12
					TOTAL	9,049.99

Firma
Nombre: JUAN CARLOS RODRIGUEZ SANCHEZ
DIRECTOR DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 2570062356 CND

Firma
Nombre: ROBERTO HERNAN HURTADO ROBLEDO
RESIDENTE DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 17202-51811 CDS

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

Firma
Nombre: CESAR ASHLEY MORA BARNEY
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 25202-214496 CND

Firma
Nombre:ALONSO QUINTERO PEÑARANDA
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
N° Mat. Profesional: 25700-25724 CND

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

CONTRATO N°	511 DE 2023	PROYECTO N°	2021005500331

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA



Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

CONTRATO N°	511 DE 2023	PROYECTO N°	2021005500331
FECHA DE INICIÓ:	12/12/2023	FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL:	11/03/2025
OBJETO PROYECTO:	"AMPLIACIÓN DE LA CAPACIDAD INSTALADA DEL HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE VILLAVICENCIO ESE - META".		
CONTRATISTA :	CONSORCIO HOSPITAL 002 RL DANIEL ALEJANDRO ENGATIVA RODRIGUEZ NIT: 901752517-0		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	572 DE 2023		
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTER HOSPITAL RL : EDWIN FABIAN HENAO CAMARGO. NIT: 901755332-9		
ACTA:	ACTA DE PAGO PARCIAL No.3		
CAPITULO:	COMPONENTE ARQUITECTONICO		
N° ÍTEM	DESCRIPCIÓN		UNIDAD
2,4,1	**ACERO DE REFUERZO FY=4200 MPa (4200 KG/CM2, G60) INCLUYE SUMINISTRO, FIGURADO, ARMADO, COLOCACIÓN Y AMARRE.**		KG

DESCRIPCIÓN		DIMENSIONES				
		LONGITUD (M)	DIAMETRO (#)	PESO (KG/M)	CANTIDAD (UN)	TOTAL (KG)
DETALLE	TIPO DE REFUERZO					
MURO TIPO 7 EJE 8 (9.90M)	REFUERZO LONGITUDINAL MURO SOTANO	10.60	4	0.994	8.51	89.64
	VIGA SEMISOTANO	10.60	5	1.552	1.06	17.50
	FLEJES VIGA SEMISOTANO	1.68	3	0.56	8.77	8.25
	REFUERZO LONGITUDINAL MURO SEMISOTANO	10.60	4	0.994	6.38	67.23
	VIGA PISO 1	10.60	5	1.552	1.06	17.50
	FLEJES VIGA SOTANO	1.68	3	0.56	8.77	8.25
	REFUERZO VERTICAL ARRANQUE	4.50	5	1.552	8.77	61.27
	REFUERZO VERTICAL ARRANQUE	6.70	7	3.042	17.55	357.63
	REFUERZO VERTICAL MURO	3.50	8	3.973	17.55	244.00
	REFUERZO VERTICAL MURO	4.30	5	1.552	17.55	117.10
	REFUERZO VERTICAL MURO	3.60	5	1.552	8.77	49.02
	FLEJES ADICIONALES DETALLE 1	2.24	3	0.56	14.62	18.34
PASAN: 9,049.99					SUBTOTAL	1,055.74
					TOTAL	10,105.73

Firma
Nombre: JUAN CARLOS RODRIGUEZ SANCHEZ
DIRECTOR DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 2570062356 CND

Firma
Nombre: ROBERTO HERNAN HURTADO ROBLEDO
RESIDENTE DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 17202-51811 CDS

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

Firma
Nombre: CESAR ASHLEY MORA BARNEY
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 25202-214496 CND

Firma
Nombre:ALONSO QUINTERO PEÑARANDA
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
N° Mat. Profesional: 25700-25724 CND

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

CONTRATO N°	511 DE 2023	PROYECTO N°	2021005500331

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA







CONTRATO N°	511 DE 2023	PROYECTO N°	2021005500331
FECHA DE INICIÓ:	12/12/2023	FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL:	11/03/2025
OBJETO PROYECTO:	"AMPLIACIÓN DE LA CAPACIDAD INSTALADA DEL HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE VILLAVICENCIO ESE - META".		
CONTRATISTA :	CONSORCIO HOSPITAL 002 RL DANIEL ALEJANDRO ENGATIVA RODRIGUEZ NIT: 901752517-0		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	572 DE 2023		
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTER HOSPITAL RL : EDWIN FABIAN HENAO CAMARGO. NIT: 901755332-9		
ACTA:	ACTA DE PAGO PARCIAL No.3		

CAPITULO:	COMPONENTE ARQUITECTONICO	
N° ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
2,4,1	**ACERO DE REFUERZO FY=4200 MPa (4200 KG/CM2, G60) INCLUYE SUMINISTRO, FIGURADO, ARMADO, COLOCACIÓN Y AMARRE.**	KG

DESCRIPCIÓN		DIMENSIONES				
		LONGITUD (M)	DIAMETRO (#)	PESO (KG/M)	CANTIDAD (UN)	TOTAL (KG)
DETALLE	TIPO DE REFUERZO					
MURO TIPO 1 EJE 8 (0.95M)	REFUERZO LONGITUDINAL ZARPA	1.85	7	3.042	3.28	18.47
	REFUERZO LONGITUDINAL ZARPA	1.55	4	0.994	3.28	5.06
	REFUERZO LONGITUDINAL MURO SOTANO	1.55	4	0.994	8.53	13.15
	VIGA SEMISOTANO	1.69	5	1.552	1.31	3.44
	FLEJES VIGA SEMISOTANO	1.68	3	0.56	1.31	1.24
	REFUERZO LONGITUDINAL MURO SEMISOTANO	1.55	4	0.994	7.88	12.14
	VIGA PISO 1	1.69	5	1.552	1.31	3.44
	FLEJES VIGA SOTANO	1.68	3	0.56	1.31	1.24
	REFUERZO VERTICAL ZARPA	1.70	4	0.994	1.64	2.77
	REFUERZO VERTICAL ZARPA ARRANQUE	5.00	5	1.552	1.64	12.74
	REFUERZO VERTICAL MURO	6.00	6	2.235	3.28	44.02
	REFUERZO VERTICAL MURO	3.50	6	2.235	3.28	25.68
	REFUERZO VERTICAL MURO	4.30	5	1.552	3.28	21.91
	REFUERZO VERTICAL MURO	3.60	5	1.552	1.64	9.17
	FLEJES ADICIONALES DETALLE 1	2.24	3	0.56	16.41	20.58
PASAN:	**10,105.73**				**SUBTOTAL**	**195.04**
					TOTAL	**10,300.77**

Firma
Nombre: JUAN CARLOS RODRIGUEZ SANCHEZ
DIRECTOR DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 2570062356 CND

Firma
Nombre: ROBERTO HERNAN HURTADO ROBLEDO
RESIDENTE DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 17202-51811 CDS

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

Firma
Nombre: CESAR ASHLEY MORA BARNEY
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 25202-214496 CND

Firma
Nombre: ALONSO QUINTERO PEÑARANDA
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
N° Mat. Profesional: 25700-25724 CND

CONTRATO N°	511 DE 2023	PROYECTO N°	2021005500331

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA



Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

CONTRATO N°	511 DE 2023	PROYECTO N°	2021005500331
FECHA DE INICIÓ:	12/12/2023	FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL:	11/03/2025
OBJETO PROYECTO:	"AMPLIACIÓN DE LA CAPACIDAD INSTALADA DEL HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE VILLAVICENCIO ESE - META".		
CONTRATISTA :	CONSORCIO HOSPITAL 002 RL DANIEL ALEJANDRO ENGATIVA RODRIGUEZ NIT: 901752517-0		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	572 DE 2023		
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTER HOSPITAL RL : EDWIN FABIAN HENAO CAMARGO. NIT: 901755332-9		

ACTA:	ACTA DE PAGO PARCIAL No.3
CAPITULO:	COMPONENTE ARQUITECTONICO

N° ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
2,4,1	**ACERO DE REFUERZO FY=4200 MPa (4200 KG/CM2, G60) INCLUYE SUMINISTRO, FIGURADO, ARMADO, COLOCACIÓN Y AMARRE.**	KG

DESCRIPCIÓN		DIMENSIONES				
		LONGITUD (M)	DIAMETRO (#)	PESO (KG/M)	CANTIDAD (UN)	TOTAL (KG)
DETALLE	TIPO DE REFUERZO					
MURO TIPO 1 EJE A (3.3M)	REFUERZO LONGITUDINAL ZARPA	5.10	7	3.042	0.17	2.59
	REFUERZO LONGITUDINAL ZARPA	4.80	4	0.994	0.10	0.48
	REFUERZO LONGITUDINAL MURO SOTANO	4.00	4	0.994	0.43	1.72
	VIGA SEMISOTANO	4.14	5	1.552	0.07	0.43
	FLEJES VIGA SEMISOTANO	1.68	3	0.56	0.18	0.17
	REFUERZO LONGITUDINAL MURO SEMISOTANO	4.00	4	0.994	0.40	1.59
	VIGA PISO 1	4.14	5	1.552	0.07	0.43
	FLEJES VIGA SOTANO	1.68	3	0.56	0.18	0.17
	REFUERZO VERTICAL ZARPA	1.70	4	0.994	0.18	0.31
	REFUERZO VERTICAL ZARPA ARRANQUE	5.00	5	1.552	0.18	1.42
	REFUERZO VERTICAL MURO	6.00	6	2.235	0.37	4.92
	REFUERZO VERTICAL MURO	3.50	6	2.235	0.37	2.87
	REFUERZO VERTICAL MURO	4.30	5	1.552	0.37	2.45
	REFUERZO VERTICAL MURO	3.60	5	1.552	0.18	1.02
PASAN:	10,300.77				SUBTOTAL	20.57
					EJECUTADO	
					TOTAL	10,321.34

Firma
Nombre: JUAN CARLOS RODRIGUEZ SANCHEZ
DIRECTOR DE OBRA
N° Matricula Profesional: 2570062356 CND

Firma
Nombre: ROBERTO HERNAN HURTADO ROBLEDO
RESIDENTE DE OBRA
N° Matricula Profesional: 17202-51811 CDS

Firma
Nombre: CESAR ASHLEY MORA BARNEY
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
N° Matricula Profesional: 25202-214496 CND

Firma
Nombre:ALONSO QUINTERO PEÑARANDA
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
N° Mat. Profesional: 25700-25724 CND

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

CONTRATO N°	511 DE 2023	PROYECTO N°	2021005500331

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA



Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

CONTRATO N°	511 DE 2023	PROYECTO N°	2021005500331
FECHA DE INICIÓ:	12/12/2023	FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL:	11/03/2025
OBJETO PROYECTO:	"AMPLIACIÓN DE LA CAPACIDAD INSTALADA DEL HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE VILLAVICENCIO ESE - META".		
CONTRATISTA :	CONSORCIO HOSPITAL 002 RL DANIEL ALEJANDRO ENGATIVA RODRIGUEZ NIT: 901752517-0		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	572 DE 2023		
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTER HOSPITAL RL : EDWIN FABIAN HENAO CAMARGO. NIT: 901755332-9		

ACTA:	ACTA DE PAGO PARCIAL No.3
CAPITULO:	COMPONENTE ARQUITECTONICO

N° ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
2,4,1	**ACERO DE REFUERZO FY=4200 MPa (4200 KG/CM2, G60) INCLUYE SUMINISTRO, FIGURADO, ARMADO, COLOCACIÓN Y AMARRE.**	KG

DESCRIPCIÓN		DIMENSIONES				
		LONGITUD (M)	DIAMETRO (#)	PESO (KG/M)	CANTIDAD (UN)	TOTAL (KG)
DETALLE	TIPO DE REFUERZO					
MURO TIPO 1 EJE 1 entre F-L (L=28.27M)	REFUERZO LONGITUDINAL ZARPA	31.31	7	3.042	3.57	340.28
	REFUERZO LONGITUDINAL ZARPA	29.97	4	0.994	2.14	63.86
	REFUERZO LONGITUDINAL MURO SOTANO	29.82	4	0.994	9.29	275.34
	VIGA SEMISOTANO	29.87	5	1.552	1.43	66.25
	FLEJES VIGA SEMISOTANO	1.68	3	0.56	33.94	31.93
	REFUERZO LONGITUDINAL MURO SEMISOTANO	8.85	4	0.994	8.57	75.43
	VIGA PISO 1	29.87	5	1.552	1.43	66.25
	FLEJES VIGA SOTANO	1.68	3	0.56	33.94	31.93
	REFUERZO VERTICAL ZARPA	1.70	4	0.994	33.94	57.35
	REFUERZO VERTICAL ZARPA ARRANQUE	5.00	5	1.552	33.94	263.38
	REFUERZO VERTICAL MURO	6.00	6	2.235	67.52	905.49
	REFUERZO VERTICAL MURO	3.50	6	2.235	67.52	528.20
	REFUERZO VERTICAL MURO	4.30	5	1.552	67.52	450.63
	REFUERZO VERTICAL MURO	3.60	5	1.552	33.94	189.63
	FLEJES ADICIONALES DETALLE 1	2.24	3	0.56	35.73	44.82
PASAN:	10,321.34				SUBTOTAL	3,390.77
					TOTAL	13,712.11

Firma
Nombre: JUAN CARLOS RODRIGUEZ SANCHEZ
DIRECTOR DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 2570062356 CND

Firma
Nombre: ROBERTO HERNAN HURTADO ROBLEDO
RESIDENTE DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 17202-51811 CDS

Firma
Nombre: CESAR ASHLEY MORA BARNEY
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 25202-214496 CND

Firma
Nombre:ALONSO QUINTERO PEÑARANDA
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
N° Mat. Profesional: 25700-25724 CND

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

CONTRATO N°	511 DE 2023	PROYECTO N°	2021005500331

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA





Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

CONTRATO N°	511 DE 2023	PROYECTO N°	2021005500331
FECHA DE INICIÓ:	12/12/2023	FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL:	11/03/2025
OBJETO PROYECTO:	"AMPLIACIÓN DE LA CAPACIDAD INSTALADA DEL HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE VILLAVICENCIO ESE - META".		
CONTRATISTA :	CONSORCIO HOSPITAL 002 RL DANIEL ALEJANDRO ENGATIVA RODRIGUEZ NIT: 901752517-0		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	572 DE 2023		
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTER HOSPITAL RL : EDWIN FABIAN HENAO CAMARGO. NIT: 901755332-9		
ACTA:	ACTA DE PAGO PARCIAL No.3		
CAPITULO:	COMPONENTE ARQUITECTONICO		
N° ÍTEM	DESCRIPCIÓN		UNIDAD
2,4,1	**ACERO DE REFUERZO FY=4200 MPa (4200 KG/CM2, G60) INCLUYE SUMINISTRO, FIGURADO, ARMADO, COLOCACIÓN Y AMARRE.**		KG

DESCRIPCIÓN		DIMENSIONES				
		LONGITUD (M)	DIAMETRO (#)	PESO (KG/M)	CANTIDAD (UN)	TOTAL (KG)
DETALLE	TIPO DE REFUERZO					
MURO TIPO 7 EJE 1 entre D-F (L=5.07M)	REFUERZO LONGITUDINAL MURO SOTANO	5.07	4	0.994	32.00	161.27
	VIGA SEMISOTANO	5.07	5	1.552	4.00	31.47
	FLEJES VIGA SEMISOTANO	1.68	3	0.56	17.00	15.99
	REFUERZO LONGITUDINAL MURO SEMISOTANO	5.07	4	0.994	24.00	120.95
	VIGA PISO 1	5.07	5	1.552	4.00	31.47
	FLEJES VIGA SOTANO	1.68	3	0.56	17.00	15.99
	REFUERZO VERTICAL ARRANQUE	4.50	5	1.552	17.00	118.73
	REFUERZO VERTICAL ARRANQUE	6.70	7	3.042	34.00	692.97
	REFUERZO VERTICAL MURO	3.50	8	3.973	34.00	472.79
	REFUERZO VERTICAL MURO	4.30	5	1.552	34.00	226.90
	REFUERZO VERTICAL MURO	3.60	5	1.552	17.00	94.98
PASAN:	13,712.11				SUBTOTAL	1,983.52
					TOTAL	15,695.63

Firma
Nombre: JUAN CARLOS RODRIGUEZ SANCHEZ
DIRECTOR DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 2570062356 CND

Firma
Nombre: ROBERTO HERNAN HURTADO ROBLEDO
RESIDENTE DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 17202-51811 CDS

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

Firma
Nombre: CESAR ASHLEY MORA BARNEY
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 25202-214496 CND

Firma
Nombre:ALONSO QUINTERO PEÑARANDA
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
N° Mat. Profesional: 25700-25724 CND

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

CONTRATO N°	511 DE 2023	PROYECTO N°	2021005500331

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA





Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

CONTRATO N°	511 DE 2023	PROYECTO N°	2021005500331
FECHA DE INICIÓ:	12/12/2023	FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL:	11/03/2025
OBJETO PROYECTO:	"AMPLIACIÓN DE LA CAPACIDAD INSTALADA DEL HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE VILLAVICENCIO ESE - META".		
CONTRATISTA :	CONSORCIO HOSPITAL 002 RL DANIEL ALEJANDRO ENGATIVA RODRIGUEZ NIT: 901752517-0		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	572 DE 2023		
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTER HOSPITAL RL : EDWIN FABIAN HENAO CAMARGO. NIT: 901755332-9		

ACTA:	ACTA DE PAGO PARCIAL No.3
CAPITULO:	COMPONENTE ARQUITECTONICO

N° ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
2,4,1	ACERO DE REFUERZO FY=4200 MPa (4200 KG/CM2, G60) INCLUYE SUMINISTRO, FIGURADO, ARMADO, COLOCACIÓN Y AMARRE.	KG

DESCRIPCIÓN		DIMENSIONES				
		LONGITUD (M)	DIAMETRO (#)	PESO (KG/M)	CANTIDAD (UN)	TOTAL (KG)
DETALLE	TIPO DE REFUERZO					
MURO TIPO 1 EJE 1 entre A-D (6.20M)	REFUERZO LONGITUDINAL ZARPA	6.84	7	3.042	10.00	208.07
	REFUERZO LONGITUDINAL ZARPA	6.50	4	0.994	6.00	38.77
	REFUERZO LONGITUDINAL MURO SOTANO	7.05	4	0.994	26.00	182.20
	VIGA SEMISOTANO	7.10	5	1.552	4.00	44.08
	FLEJES VIGA SEMISOTANO	1.68	3	0.56	21.00	19.76
	REFUERZO LONGITUDINAL MURO SEMISOTANO	7.05	4	0.994	24.00	168.18
	VIGA PISO 1	7.10	5	1.552	4.00	44.08
	FLEJES VIGA SOTANO	1.68	3	0.56	21.00	19.76
	REFUERZO VERTICAL ZARPA	1.70	4	0.994	21.00	35.49
	REFUERZO VERTICAL ZARPA ARRANQUE	5.00	5	1.552	21.00	162.96
	REFUERZO VERTICAL MURO	6.00	6	2.235	43.00	576.63
	REFUERZO VERTICAL MURO	3.50	6	2.235	43.00	336.37
	REFUERZO VERTICAL MURO	4.30	5	1.552	43.00	286.96
	REFUERZO VERTICAL MURO	3.60	5	1.552	21.00	117.33
	FLEJES ADICIONALES DETALLE 1	2.24	3	0.56	100.00	125.44
PASAN:	15,695.63				SUBTOTAL	2,366.07
					TOTAL	18,061.70

Firma
Nombre: JUAN CARLOS RODRIGUEZ SANCHEZ
DIRECTOR DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 2570062356 CND

Firma
Nombre: ROBERTO HERNAN HURTADO ROBLEDO
RESIDENTE DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 17202-51811 CDS

Firma
Nombre: CESAR ASHLEY MORA BARNEY
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 25202-214496 CND

Firma
Nombre:ALONSO QUINTERO PEÑARANDA
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
N° Mat. Profesional: 25700-25724 CND

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

CONTRATO N°	511 DE 2023	PROYECTO N°	2021005500331
FECHA DE INICIÓ:	12/12/2023	FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL:	11/03/2025
OBJETO PROYECTO:	"AMPLIACIÓN DE LA CAPACIDAD INSTALADA DEL HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE VILLAVICENCIO ESE - META".		
CONTRATISTA :	CONSORCIO HOSPITAL 002 RL DANIEL ALEJANDRO ENGATIVA RODRIGUEZ NIT: 901752517-0		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	572 DE 2023		
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTER HOSPITAL RL : EDWIN FABIAN HENAO CAMARGO. NIT: 901755332-9		

ACTA:	ACTA DE PAGO PARCIAL No.3
CAPITULO:	COMPONENTE ARQUITECTONICO

N° ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
2,4,1	ACERO DE REFUERZO FY=4200 MPa (4200 KG/CM2, G60) INCLUYE SUMINISTRO, FIGURADO, ARMADO, COLOCACIÓN Y AMARRE.	KG

DESCRIPCIÓN		DIMENSIONES				
		LONGITUD (M)	DIAMETRO (#)	PESO (KG/M)	CANTIDAD (UN)	TOTAL (KG)
DETALLE	TIPO DE REFUERZO					
MURO TIPO 1 EJE A entre 1-2 (3.57M)	REFUERZO LONGITUDINAL ZARPA	5.41	7	3.042	10.00	164.57
	REFUERZO LONGITUDINAL ZARPA	5.07	4	0.994	6.00	30.24
	REFUERZO LONGITUDINAL MURO SOTANO	5.07	4	0.994	26.00	131.03
	VIGA SEMISOTANO	3.97	5	1.552	4.00	24.65
	FLEJES VIGA SEMISOTANO	1.68	3	0.56	12.00	11.29
	REFUERZO LONGITUDINAL MURO SEMISOTANO	7.05	4	0.994	24.00	168.18
	VIGA PISO 1	3.97	5	1.552	4.00	24.65
	FLEJES VIGA SOTANO	1.68	3	0.56	12.00	11.29
	REFUERZO VERTICAL ZARPA	1.70	4	0.994	12.00	20.28
	REFUERZO VERTICAL ZARPA ARRANQUE	5.00	5	1.552	12.00	93.12
	REFUERZO VERTICAL MURO	6.00	6	2.235	24.00	321.84
	REFUERZO VERTICAL MURO	3.50	6	2.235	24.00	187.74
	REFUERZO VERTICAL MURO	4.30	5	1.552	24.00	160.17
	REFUERZO VERTICAL MURO	3.60	5	1.552	12.00	67.05
PASAN:	18,061.70				SUBTOTAL	1,416.08
					TOTAL	19,477.78

Firma
Nombre: JUAN CARLOS RODRIGUEZ SANCHEZ
DIRECTOR DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 2570062356 CND

Firma
Nombre: CESAR ASHLEY MORA BARNEY
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 25202-214496 CND

Firma
Nombre: ROBERTO HERNAN HURTADO ROBLEDO
RESIDENTE DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 17202-51811 CDS

Firma
Nombre:ALONSO QUINTERO PEÑARANDA
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
N° Mat. Profesional: 25700-25724 CND

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

CONTRATO N°	511 DE 2023	PROYECTO N°	2021005500331

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA





Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

CONTRATO N°	511 DE 2023	PROYECTO N°	2021005500331
FECHA DE INICIÓ:	12/12/2023	FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL:	11/03/2025
OBJETO PROYECTO:	"AMPLIACIÓN DE LA CAPACIDAD INSTALADA DEL HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE VILLAVICENCIO ESE - META".		
CONTRATISTA :	CONSORCIO HOSPITAL 002 RL DANIEL ALEJANDRO ENGATIVA RODRIGUEZ NIT: 901752517-0		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	572 DE 2023		
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTER HOSPITAL RL : EDWIN FABIAN HENAO CAMARGO. NIT: 901755332-9		
ACTA:	ACTA DE PAGO PARCIAL No.3		
CAPITULO:	COMPONENTE ARQUITECTONICO		
N° ÍTEM	DESCRIPCIÓN		UNIDAD
2,4,1	ACERO DE REFUERZO FY=4200 MPa (4200 KG/CM2, G60) INCLUYE SUMINISTRO, FIGURADO, ARMADO, COLOCACIÓN Y AMARRE.		KG

DESCRIPCIÓN		DIMENSIONES				
		LONGITUD (M)	DIAMETRO (#)	PESO (KG/M)	CANTIDAD (UN)	TOTAL (KG)
DETALLE	TIPO DE REFUERZO					
VIGA S-134	REFUERZO LONGITUDINAL s	7.00	6	2.235	0.81	12.68
	REFUERZO 2DA FILA s	3.50	6	2.235	0.49	3.80
	REFUERZO LONGITUDINAL s	3.50	7	3.042	0.16	1.73
	REFUERZO LONGITUDINAL i	7.00	6	2.235	0.81	12.68
	REFUERZO LONGITUDINAL s	8.50	6	2.235	0.81	15.40
	REFUERZO 2DA FILA s	4.00	6	2.235	0.49	4.35
	REFUERZO LONGITUDINAL s	4.00	7	3.042	0.16	1.97
	REFUERZO LONGITUDINAL i	8.30	6	2.235	0.81	15.03
	REFUERZO LONGITUDINAL s	7.00	7	3.042	0.81	17.26
	REFUERZO 2DA FILA s	4.00	7	3.042	0.49	5.92
	REFUERZO LONGITUDINAL i	6.50	6	2.235	0.81	11.77
	REFUERZO LONGITUDINAL s	8.00	6	2.235	0.81	14.49
	REFUERZO 2DA FILA s	4.00	6	2.235	0.49	4.35
	REFUERZO LONGITUDINAL i	8.00	6	2.235	0.81	14.49
	REFUERZO LONGITUDINAL s	7.50	6	2.235	0.81	13.59
	REFUERZO LONGITUDINAL i	7.30	6	2.235	0.81	13.22
	REFUERZO LONGITUDINAL s	11.40	6	2.235	0.81	20.65
	REFUERZO LONGITUDINAL i	11.30	6	2.235	0.81	20.47
	ESTRIBOS T1	2.28	3	0.56	38.58	49.26
	GANCHOS T1	0.74	3	0.56	38.58	15.99
PASAN:	19,477.78				SUBTOTAL	269.09
					TOTAL	19,746.87

Firma
Nombre: JUAN CARLOS RODRIGUEZ SANCHEZ
DIRECTOR DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 2570062356 CND

Firma
Nombre: CESAR ASHLEY MORA BARNEY
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 25202-214496 CND

Firma
Nombre: ROBERTO HERNAN HURTADO ROBLEDO
RESIDENTE DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 17202-51811 CDS

Firma
Nombre: ALONSO QUINTERO PENARANDA
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
N° Mat. Profesional: 25700-25724 CND

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

CONTRATO N°	511 DE 2023	PROYECTO N°	2021005500331
FECHA DE INICIÓ:	12/12/2023	FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL:	11/03/2025
OBJETO PROYECTO:	"AMPLIACIÓN DE LA CAPACIDAD INSTALADA DEL HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE VILLAVICENCIO ESE - META".		
CONTRATISTA :	CONSORCIO HOSPITAL 002 RL DANIEL ALEJANDRO ENGATIVA RODRIGUEZ NIT: 901752517-0		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	572 DE 2023		
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTER HOSPITAL RL : EDWIN FABIAN HENAO CAMARGO. NIT: 901755332-9		

ACTA:	ACTA DE PAGO PARCIAL No.3
CAPITULO:	COMPONENTE ARQUITECTONICO

N° ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
2,4,1	**ACERO DE REFUERZO FY=4200 MPa (4200 KG/CM2, G60) INCLUYE SUMINISTRO, FIGURADO, ARMADO, COLOCACIÓN Y AMARRE.**	KG

DESCRIPCIÓN		DIMENSIONES				
		LONGITUD (M)	DIAMETRO (#)	PESO (KG/M)	CANTIDAD (UN)	TOTAL (KG)
DETALLE	TIPO DE REFUERZO					
VIGA S-133	REFUERZO LONGITUDINAL s	8.80	7	3.042	0.73	19.63
	REFUERZO 2DA FILA s	4.00	7	3.042	0.73	8.92
	REFUERZO LONGITUDINAL i	8.80	7	3.042	0.73	19.63
	REFUERZO LONGITUDINAL s	10.50	7	3.042	0.73	23.43
	REFUERZO 2DA FILA s	4.00	7	3.042	0.73	8.92
	REFUERZO LONGITUDINAL s	4.00	7	3.042	0.15	1.78
	REFUERZO 2DA FILA i	5.00	6	2.235	0.29	3.28
	REFUERZO LONGITUDINAL i	9.70	7	3.042	0.73	21.64
	REFUERZO LONGITUDINAL s	12.00	8	3.973	0.73	34.97
	REFUERZO 2DA FILA s	4.30	8	3.973	0.73	12.53
	REFUERZO 2DA FILA s	8.00	8	3.973	0.29	9.32
	REFUERZO LONGITUDINAL i	6.50	8	3.973	0.73	18.94
	REFUERZO 2DA FILA i	4.00	6	2.235	0.29	2.62
	REFUERZO 2DA FILA i	6.50	7	3.042	0.29	5.80
	REFUERZO LONGITUDINAL i	5.70	7	3.042	0.73	12.72
	REFUERZO LONGITUDINAL s	10.80	8	3.973	0.73	31.47
	REFUERZO LONGITUDINAL s	5.00	8	3.973	0.15	2.91
	REFUERZO 2DA FILA s	4.00	7	3.042	0.73	8.92
	REFUERZO 2DA FILA i	5.00	6	2.235	0.44	4.92
	REFUERZO LONGITUDINAL i	4.70	8	3.973	0.73	13.70
	REFUERZO LONGITUDINAL i	3.50	6	2.235	0.15	1.15
	REFUERZO LONGITUDINAL i	10.00	7	3.042	0.73	22.31
	REFUERZO LONGITUDINAL s	8.30	8	3.973	0.73	24.19
	REFUERZO 2DA FILA s	4.50	8	3.973	0.73	13.11
	REFUERZO LONGITUDINAL s	6.00	6	2.235	0.73	9.84
	REFUERZO LONGITUDINAL s	9.40	7	3.042	0.15	4.19
	REFUERZO LONGITUDINAL i	9.30	6	2.235	0.15	3.05
	REFUERZO 2DA FILA i	4.00	6	2.235	0.29	2.62
	REFUERZO 2DA FILA i	5.50	7	3.042	0.59	9.82
	REFUERZO LONGITUDINAL i	8.00	7	3.042	0.73	17.85
	REFUERZO LONGITUDINAL i	6.00	7	3.042	0.73	13.39
	ESTRIBOS T1	2.28	3	0.56	39.90	50.94
	ESTRIBOS T2	2.08	3	0.56	5.13	5.98
	ESTRIBOS T3	2.58	3	0.56	6.89	9.96
	GANCHOS T1 Y T3	0.74	3	0.56	53.69	22.25
	GANCHOS T2	0.64	3	0.56	15.40	5.52
PASAN:	**19,746.87**				**SUBTOTAL**	**482.25**
					TOTAL	**20,229.12**

Firma
Nombre: JUAN CARLOS RODRIGUEZ SANCHEZ
DIRECTOR DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 2570062356 CND

Firma
Nombre: ROBERTO HERNAN HURTADO ROBLEDO
RESIDENTE DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 17202-51811 CDS

Firma
Nombre: CESAR ASHLEY MORA BARNEY
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 25202-214496 CND

Firma
Nombre: ALONSO QUINTERO PEÑARANDA
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
N° Mat. Profesional: 25700-25724 CND

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

CONTRATO N°	511 DE 2023	PROYECTO N°	2021005500331
FECHA DE INICIÓ:	12/12/2023	FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL:	11/03/2025
OBJETO PROYECTO:	"AMPLIACIÓN DE LA CAPACIDAD INSTALADA DEL HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE VILLAVICENCIO ESE - META".		
CONTRATISTA :	CONSORCIO HOSPITAL 002 RL DANIEL ALEJANDRO ENGATIVA RODRIGUEZ NIT: 901752517-0		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	572 DE 2023		
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTER HOSPITAL RL : EDWIN FABIAN HENAO CAMARGO. NIT: 901755332-9		

ACTA:	ACTA DE PAGO PARCIAL No.3
CAPITULO:	COMPONENTE ARQUITECTONICO

N° ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
2,4,1	**ACERO DE REFUERZO FY=4200 MPa (4200 KG/CM2, G60) INCLUYE SUMINISTRO, FIGURADO, ARMADO, COLOCACIÓN Y AMARRE.**	KG

DESCRIPCIÓN		DIMENSIONES				
		LONGITUD (M)	DIAMETRO (#)	PESO (KG/M)	CANTIDAD (UN)	TOTAL (KG)
DETALLE	TIPO DE REFUERZO					
VIGA S-132	REFUERZO LONGITUDINAL s	8.80	7	3.042	0.87	23.22
	REFUERZO 2DA FILA s	4.00	6	2.235	0.87	7.76
	REFUERZO LONGITUDINAL i	8.80	7	3.042	0.87	23.22
	REFUERZO LONGITUDINAL s	10.50	7	3.042	0.87	27.71
	REFUERZO 2DA FILA s	4.00	6	2.235	0.87	7.76
	REFUERZO 2DA FILA i	5.00	6	2.235	0.35	3.88
	REFUERZO LONGITUDINAL i	9.70	7	3.042	0.87	25.60
	REFUERZO LONGITUDINAL s	12.00	8	3.973	0.87	41.36
	REFUERZO 2DA FILA s	4.30	7	3.042	0.69	9.08
	REFUERZO 2DA FILA s	7.70	7	3.042	0.35	8.13
	REFUERZO 2DA FILA i	6.50	7	3.042	0.52	10.29
	REFUERZO LATERAL i	6.50	7	3.042	0.87	17.15
	REFUERZO LONGITUDINAL i	5.70	7	3.042	0.87	15.04
	REFUERZO LONGITUDINAL i	4.60	7	3.042	0.87	12.14
	REFUERZO 2DA FILA i	5.00	6	2.235	0.35	3.88
	REFUERZO LONGITUDINAL i	10.00	7	3.042	0.87	26.39
	REFUERZO LONGITUDINAL s	10.80	7	3.042	0.87	28.50
	REFUERZO 2DA FILA i	4.00	7	3.042	0.87	10.56
	REFUERZO LATERAL s	4.00	7	3.042	0.17	2.11
	REFUERZO LONGITUDINAL s	5.50	7	3.042	0.87	14.51
	REFUERZO 2DA FILA s	3.20	6	2.235	0.35	2.48
	REFUERZO LONGITUDINAL i	5.40	7	3.042	0.87	14.25
	ESTRIBOS T1	2.28	3	0.56	41.64	53.17
	GANCHOS T1	0.74	3	0.56	41.64	17.26
	ESTRIBOS T2	2.08	3	0.56	6.07	7.07
	GANCHOS T2	0.64	3	0.56	18.22	6.53
PASAN:	**20,229.12**				**SUBTOTAL**	**419.05**
					EJECUTADO	
					TOTAL	**20,648.17**

Firma
Nombre: JUAN CARLOS RODRIGUEZ SANCHEZ
DIRECTOR DE OBRA
N° Matricula Profesional: 2570062356 CND

Firma
Nombre: ROBERTO HERNAN HURTADO ROBLEDO
RESIDENTE DE OBRA
N° Matricula Profesional: 17202-51811 CDS

Firma
Nombre: CESAR ASHLEY MORA BARNEY
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
N° Matricula Profesional: 25202-214496 CND

Firma
Nombre: ALONSO QUINTERO PEÑARANDA
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
N° Mat. Profesional: 25700-25724 CND

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

CONTRATO N°	511 DE 2023	PROYECTO N°	2021005500331
FECHA DE INICIÓ:	12/12/2023	FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL:	11/03/2025
OBJETO PROYECTO:	"AMPLIACIÓN DE LA CAPACIDAD INSTALADA DEL HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE VILLAVICENCIO ESE - META".		
CONTRATISTA :	CONSORCIO HOSPITAL 002 RL DANIEL ALEJANDRO ENGATIVA RODRIGUEZ NIT: 901752517-0		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	572 DE 2023		
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTER HOSPITAL RL : EDWIN FABIAN HENAO CAMARGO. NIT: 901755332-9		

ACTA:	ACTA DE PAGO PARCIAL No.3
CAPITULO:	COMPONENTE ARQUITECTONICO

N° ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
2,4,1	**ACERO DE REFUERZO FY=4200 MPa (4200 KG/CM2, G60) INCLUYE SUMINISTRO, FIGURADO, ARMADO, COLOCACIÓN Y AMARRE.**	KG

DESCRIPCIÓN		DIMENSIONES				
		LONGITUD (M)	DIAMETRO (#)	PESO (KG/M)	CANTIDAD (UN)	TOTAL (KG)
DETALLE	TIPO DE REFUERZO					
VIGA S-131	REFUERZO LONGITUDINAL s	8.80	7	3.042	0.86	22.92
	REFUERZO 2DA FILA s	4.00	6	2.235	0.51	4.59
	REFUERZO LONGITUDINAL i	8.40	6	2.235	0.86	16.07
	REFUERZO LONGITUDINAL s	11.00	7	3.042	0.86	28.65
	REFUERZO 2DA FILA s	4.00	6	2.235	0.51	4.59
	REFUERZO LONGITUDINAL i	10.50	7	3.042	0.86	27.34
	REFUERZO LONGITUDINAL s	12.00	8	3.973	0.86	40.82
	REFUERZO 2DA FILA S	7.50	7	3.042	0.51	11.72
	REFUERZO LATERAL	6.50	8	3.973	0.86	22.11
	REFUERZO LONGITUDINAL i	5.70	7	3.042	0.86	14.84
	REFUERZO LONGITUDINAL s	10.40	7	3.042	0.86	27.08
	REFUERZO 2DA FILA s	4.00	7	3.042	0.86	10.42
	REFUERZO 2DA FILA i	5.00	6	2.235	0.34	3.83
	REFUERZO LONGITUDINAL i	4.50	7	3.042	0.86	11.72
	REFUERZO LONGITUDINAL i	10.00	7	3.042	0.86	26.04
	REFUERZO LONGITUDINAL s	6.00	7	3.042	0.86	15.63
	REFUERZO 2DA FILA s	3.50	6	2.235	0.34	2.68
	REFUERZO LONGITUDINAL i	5.50	6	2.235	0.86	10.52
	ESTRIBOS T1	2.28	3	0.56	38.18	48.75
	GANCHOS T1	0.74	3	0.56	38.18	15.82
	ESTRIBOS T2	2.08	3	0.56	5.31	6.18
	GANCHOS T2	0.64	3	0.56	15.92	5.71
PASAN:	**20,648.17**				**SUBTOTAL**	**378.03**
					TOTAL	**21,026.20**

Firma
Nombre: JUAN CARLOS RODRIGUEZ SANCHEZ
DIRECTOR DE OBRA
N° Matricula Profesional: 2570062356 CND

Firma
Nombre: CESAR ASHLEY MORA BARNEY
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
N° Matricula Profesional: 25202-214496 CND

Firma
Nombre: ROBERTO HERNAN HURTADO ROBLEDO
RESIDENTE DE OBRA
N° Matricula Profesional: 17202-51811 CDS

Firma
Nombre:ALONSO QUINTERO PEÑARANDA
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
N° Mat. Profesional: 25700-25724 CND

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

CONTRATO N°	511 DE 2023	PROYECTO N°	2021005500331
FECHA DE INICIÓ:	12/12/2023	FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL:	11/03/2025
OBJETO PROYECTO:	"AMPLIACIÓN DE LA CAPACIDAD INSTALADA DEL HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE VILLAVICENCIO ESE - META".		
CONTRATISTA :	CONSORCIO HOSPITAL 002 RL DANIEL ALEJANDRO ENGATIVA RODRIGUEZ NIT: 901752517-0		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	572 DE 2023		
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTER HOSPITAL RL : EDWIN FABIAN HENAO CAMARGO. NIT: 901755332-9		

ACTA:	ACTA DE PAGO PARCIAL No.3
CAPITULO:	COMPONENTE ARQUITECTONICO

N° ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
2,4,1	**ACERO DE REFUERZO FY=4200 MPa (4200 KG/CM2, G60) INCLUYE SUMINISTRO, FIGURADO, ARMADO, COLOCACIÓN Y AMARRE.**	KG

DESCRIPCIÓN		DIMENSIONES				
		LONGITUD (M)	DIAMETRO (#)	PESO (KG/M)	CANTIDAD (UN)	TOTAL (KG)
DETALLE	TIPO DE REFUERZO					
VIGA S-129	REFUERZO LONGITUDINAL s	8.80	7	3.042	2.15	57.58
	REFUERZO 2DA FILA s	4.00	6	2.235	2.15	19.23
	REFUERZO LONGITUDINAL i	8.80	7	3.042	2.15	57.58
	REFUERZO LONGITUDINAL s	10.50	7	3.042	2.15	68.70
	REFUERZO 2DA FILA s	4.00	6	2.235	2.15	19.23
	REFUERZO LONGITUDINAL i	9.70	7	3.042	2.15	63.46
	REFUERZO LONGITUDINAL s	12.00	8	3.973	2.15	102.54
	REFUERZO 2DA FILA s	7.50	7	3.042	1.29	29.44
	REFUERZO LONGITUDINAL s	4.30	7	3.042	1.29	16.88
	REFUERZO LATERAL i	6.50	8	3.973	2.15	55.54
	REFUERZO LONGITUDINAL i	5.70	7	3.042	2.15	37.29
	REFUERZO LONGITUDINAL i	4.60	7	3.042	2.15	30.10
	REFUERZO 2DA FILA i	5.00	6	2.235	0.86	9.61
	REFUERZO LONGITUDINAL s	10.80	7	3.042	2.15	70.66
	REFUERZO LATERAL s	5.00	8	3.973	0.43	8.55
	REFUERZO 2DA FILA i	4.00	7	3.042	2.15	26.17
	REFUERZO LATERAL i	4.00	6	2.235	0.43	3.85
	REFUERZO LONGITUDINAL i	10.00	7	3.042	2.15	65.43
	REFUERZO LONGITUDINAL s	8.20	7	3.042	2.15	53.65
	REFUERZO LATERAL s	5.00	7	3.042	0.43	6.54
	REFUERZO 2DA FILA s	4.20	7	3.042	2.15	27.48
	REFUERZO LATERAL i	4.00	6	2.235	0.43	3.85
	REFUERZO LONGITUDINAL i	7.60	7	3.042	2.15	49.72
	REFUERZO LONGITUDINAL s	6.20	6	2.235	2.15	29.80
	REFUERZO 2DA FILA i	4.50	7	3.042	0.86	11.78
	REFUERZO LONGITUDINAL i	6.40	7	3.042	2.15	41.87
	ESTRIBOS T1	2.28	3	0.56	129.05	164.77
	ESTRIBOS T2	2.08	3	0.56	13.33	15.53
	GANCHOS T1	0.74	3	0.56	129.05	53.48
	GANCHOS T2	0.64	3	0.56	40.00	14.34
PASAN:	21,026.20				SUBTOTAL	1,214.63
					EJECUTADO	
					TOTAL	22,240.83

Firma
Nombre: JUAN CARLOS RODRIGUEZ SANCHEZ
DIRECTOR DE OBRA
N° Matricula Profesional: 2570062356 CND

Firma
Nombre: ROBERTO HERNAN HURTADO ROBLEDO
RESIDENTE DE OBRA
N° Matricula Profesional: 17202-51811 CDS

Firma
Nombre: CESAR ASHLEY MORA BARNEY
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
N° Matricula Profesional: 25202-214496 CND

Firma
Nombre: ALONSO QUINTERO PEÑARANDA
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
N° Mat. Profesional: 25700-25724 CND

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

CONTRATO N°	511 DE 2023	PROYECTO N°	2021005500331
FECHA DE INICIÓ:	12/12/2023	FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL:	11/03/2025
OBJETO PROYECTO:	"AMPLIACIÓN DE LA CAPACIDAD INSTALADA DEL HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE VILLAVICENCIO ESE - META".		
CONTRATISTA :	CONSORCIO HOSPITAL 002 RL DANIEL ALEJANDRO ENGATIVA RODRIGUEZ NIT: 901752517-0		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	572 DE 2023		
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTER HOSPITAL RL : EDWIN FABIAN HENAO CAMARGO. NIT: 901755332-9		
ACTA:	ACTA DE PAGO PARCIAL No.3		
CAPITULO:	COMPONENTE ARQUITECTONICO		
N° ÍTEM	DESCRIPCIÓN		UNIDAD
2,4,1	**ACERO DE REFUERZO FY=4200 MPa (4200 KG/CM2, G60) INCLUYE SUMINISTRO, FIGURADO, ARMADO, COLOCACIÓN Y AMARRE.**		KG

DESCRIPCIÓN		DIMENSIONES				
		LONGITUD (M)	DIAMETRO (#)	PESO (KG/M)	CANTIDAD (UN)	TOTAL (KG)
DETALLE	TIPO DE REFUERZO					
VIGA S-128	REFUERZO LONGITUDINAL s	8.20	6	2.235	2.18	39.86
	REFUERZO 2DA FILA s	4.00	6	2.235	1.31	11.67
	REFUERZO LONGITUDINAL i	7.80	6	2.235	2.18	37.92
	REFUERZO LONGITUDINAL s	9.20	6	2.235	2.18	44.72
	REFUERZO 2DA FILA s	4.00	6	2.235	1.31	11.67
	REFUERZO LONGITUDINAL i	9.20	6	2.235	2.18	44.72
	REFUERZO LONGITUDINAL s	9.00	7	3.042	2.18	59.55
	REFUERZO 2DA FILA s	4.00	6	2.235	1.31	11.67
	REFUERZO LONGITUDINAL i	9.00	6	2.235	2.18	43.75
	REFUERZO LONGITUDINAL s	6.80	6	2.235	2.18	33.06
	REFUERZO 2DA FILA s	4.00	6	2.235	1.31	11.67
	REFUERZO LONGITUDINAL i	6.50	6	2.235	2.18	31.60
	REFUERZO LONGITUDINAL s	9.40	6	2.235	2.18	45.70
	REFUERZO 2DA FILA s	4.00	6	2.235	0.87	7.78
	REFUERZO LONGITUDINAL i	9.20	6	2.235	2.18	44.72
	REFUERZO LONGITUDINAL s	8.60	6	2.235	1.31	25.08
	REFUERZO LATERAL s	7.70	6	2.235	0.87	14.97
	REFUERZO LATERAL s	3.50	6	2.235	0.44	3.40
	REFUERZO LATERAL i	7.70	6	2.235	0.87	14.97
	REFUERZO LONGITUDINAL i	8.60	6	2.235	1.31	25.08
	ESTRIBOS T1	2.28	3	0.56	104.41	133.31
	GANCHOS T1	0.74	3	0.56	104.41	43.27
PASAN:	**22,240.83**				**SUBTOTAL**	**740.15**
					TOTAL	**22,980.98**

Firma
Nombre: JUAN CARLOS RODRIGUEZ SANCHEZ
DIRECTOR DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 2570062356 CND

Firma
Nombre: ROBERTO HERNAN HURTADO BOBLEDO
RESIDENTE DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 17202-51811 CDS

Firma
Nombre: CESAR ASHLEY MORA BARNEY
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 25202-214496 CND

Firma
Nombre:ALONSO QUINTERO PEÑARANDA
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
N° Mat. Profesional: 25700-25724 CND

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@alm-meta.gov.co
https://alm-meta.gov.co

CONTRATO N°	511 DE 2023	PROYECTO N°	2021005500331
FECHA DE INICIÓ:	12/12/2023	FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL:	11/03/2025
OBJETO PROYECTO:	"AMPLIACIÓN DE LA CAPACIDAD INSTALADA DEL HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE VILLAVICENCIO ESE - META".		
CONTRATISTA :	CONSORCIO HOSPITAL 002 RL DANIEL ALEJANDRO ENGATIVA RODRIGUEZ NIT: 901752517-0		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	572 DE 2023		
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTER HOSPITAL RL : EDWIN FABIAN HENAO CAMARGO. NIT: 901755332-9		

ACTA:	ACTA DE PAGO PARCIAL No.3
CAPITULO:	COMPONENTE ARQUITECTONICO

N° ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
2,4,1	ACERO DE REFUERZO FY=4200 MPa (4200 KG/CM2, G60) INCLUYE SUMINISTRO, FIGURADO, ARMADO, COLOCACIÓN Y AMARRE.	KG

DESCRIPCIÓN		DIMENSIONES				
		LONGITUD (M)	DIAMETRO (#)	PESO (KG/M)	CANTIDAD (UN)	TOTAL (KG)
DETALLE	TIPO DE REFUERZO					
VIGA S-105	REFUERZO LONGITUDINAL s	6.20	5	1.552	2.00	19.24
	REFUERZO 2da FILA s	3.00	5	1.552	2.00	9.31
	REFUERZO LATERAL s	6.00	5	1.552	1.00	9.31
	REFUERZO LONGITUDINAL i	10.00	5	1.552	2.00	31.04
	REFUERZO 2da FILA s	4.00	5	1.552	2.00	12.42
	REFUERZO LONGITUDINAL s	8.40	5	1.552	2.00	26.07
	REFUERZO LATERAL i	6.00	5	1.552	1.00	9.31
	REFUERZO LONGITUDINAL i	10.00	5	1.552	2.00	31.04
	REFUERZO LONGITUDINAL s	11.00	5	1.552	2.00	34.14
	REFUERZO LATERAL s	3.00	6	2.235	1.00	6.71
	REFUERZO LONGITUDINAL i	7.20	5	1.552	2.00	22.35
	REFUERZO LONGITUDINAL s	10.50	5	1.552	2.00	32.59
	REFUERZO 2da FILA s	4.50	5	1.552	2.00	13.97
	REFUERZO LATERAL s	6.00	5	1.552	1.00	9.31
	REFUERZO LONGITUDINAL i	12.00	5	1.552	2.00	37.25
	REFUERZO 2da FILA s	4.00	5	1.552	2.00	12.42
	REFUERZO LONGITUDINAL s	12.00	6	2.235	2.00	53.64
	REFUERZO LATERAL i	6.00	5	1.552	1.00	9.31
	REFUERZO LONGITUDINAL i	11.00	5	1.552	2.00	34.14
	REFUERZO 2da FILA s	3.00	5	1.552	2.00	9.31
	REFUERZO LONGITUDINAL s	6.50	5	1.552	2.00	20.18
	REFUERZO LATERAL s	3.00	5	1.552	1.00	4.66
	REFUERZO LATERAL i	3.00	5	1.552	1.00	4.66
	REFUERZO LONGITUDINAL i	3.20	5	1.552	2.00	9.93
	ESTRIBOS T1	1.58	3	0.56	138.00	122.10
PASAN:	22,980.98				SUBTOTAL	584.42
					TOTAL	23,565.40

Firma
Nombre: JUAN CARLOS RODRIGUEZ SANCHEZ
DIRECTOR DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 2570062356 CND

Firma
Nombre: CESAR ASHLEY MORA BARNEY
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 25202-214496 CND

Firma
Nombre: ROBERTO HERNAN HURTADO ROBLEDO
RESIDENTE DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 17202-51811 CDS

Firma
Nombre: ALONSO QUINTERO PEÑARANDA
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
N° Mat. Profesional: 25700-25724 CND

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

CONTRATO N°	511 DE 2023	PROYECTO N°	2021005500331
FECHA DE INICIÓ:	12/12/2023	FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL:	11/03/2025
OBJETO PROYECTO:	"AMPLIACIÓN DE LA CAPACIDAD INSTALADA DEL HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE VILLAVICENCIO ESE - META".		
CONTRATISTA :	CONSORCIO HOSPITAL 002 RL DANIEL ALEJANDRO ENGATIVA RODRIGUEZ NIT: 901752517-0		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	572 DE 2023		
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTER HOSPITAL RL : EDWIN FABIAN HENAO CAMARGO. NIT: 901755332-9		
ACTA:	ACTA DE PAGO PARCIAL No.3		
CAPITULO:	COMPONENTE ARQUITECTONICO		
N° ÍTEM	DESCRIPCIÓN		UNIDAD
2,4,1	**ACERO DE REFUERZO FY=4200 MPa (4200 KG/CM2, G60) INCLUYE SUMINISTRO, FIGURADO, ARMADO, COLOCACIÓN Y AMARRE.**		KG

DESCRIPCIÓN		DIMENSIONES				
		LONGITUD (M)	DIAMETRO (#)	PESO (KG/M)	CANTIDAD (UN)	TOTAL (KG)
DETALLE	TIPO DE REFUERZO					
VIGA S-106	REFUERZO LONGITUDINAL s	12.00	6	2.235	3.00	80.46
	REFUERZO LATERAL s	4.40	6	2.235	1.00	9.83
	REFUERZO 2da FILA s	4.00	6	2.235	2.00	17.88
	REFUERZO LATERAL i	4.40	6	2.235	1.00	9.83
	REFUERZO LONGITUDINAL i	12.00	6	2.235	3.00	80.46
	REFUERZO LONGITUDINAL s	10.70	6	2.235	3.00	71.74
	REFUERZO 2da FILA s	4.00	6	2.235	2.00	17.88
	REFUERZO LONGITUDINAL i	10.30	6	2.235	3.00	69.06
	REFUERZO LONGITUDINAL s	6.00	6	2.235	3.00	40.23
	REFUERZO 2da FILA s	3.50	6	2.235	2.00	15.65
	REFUERZO LONGITUDINAL i	6.00	6	2.235	3.00	40.23
	REFUERZO LONGITUDINAL s	9.20	6	2.235	3.00	61.69
	REFUERZO 2da FILA s	4.00	6	2.235	2.00	17.88
	REFUERZO LONGITUDINAL i	9.00	6	2.235	3.00	60.35
	REFUERZO LONGITUDINAL s	12.00	6	2.235	3.00	80.46
	REFUERZO 2da FILA s	4.50	6	2.235	2.00	20.12
	REFUERZO LONGITUDINAL i	11.70	6	2.235	3.00	78.45
	REFUERZO LONGITUDINAL s	12.00	6	2.235	1.00	26.82
	REFUERZO LATERAL s	8.70	6	2.235	2.00	38.89
	REFUERZO 2da FILA s	4.00	6	2.235	2.00	17.88
	REFUERZO LONGITUDINAL s	4.40	6	2.235	2.00	19.67
	REFUERZO LONGITUDINAL i	4.40	6	2.235	2.00	19.67
	REFUERZO LATERAL i	8.80	7	3.042	2.00	53.54
	REFUERZO LONGITUDINAL i	11.80	6	2.235	1.00	26.37
	ESTRIBOS T1	2.08	3	0.56	10.00	11.65
	ESTRIBOS T2	1.88	3	0.56	233.00	245.30
	ESTRIBOS T3	1.68	3	0.56	10.00	9.41
	GANCHOS T1	0.74	3	0.56	10.00	4.14
PASAN:	**23,565.40**				SUBTOTAL	**1,245.53**
					TOTAL	**24,810.93**

Firma
Nombre: JUAN CARLOS RODRIGUEZ SANCHEZ
DIRECTOR DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 2570062356 CND

Firma
Nombre: ROBERTO HERNAN HURTADO ROBLEDO
RESIDENTE DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 17202-51811 CDS

Firma
Nombre: CESAR ASHLEY MORA BARNEY
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 25202-214496 CND

Firma
Nombre: ALONSO QUINTERO PEÑARANDA
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
N° Mat. Profesional: 25700-25724 CND

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

CONTRATO N°	511 DE 2023	PROYECTO N°	2021005500331
FECHA DE INICIÓ:	12/12/2023	FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL:	11/03/2025
OBJETO PROYECTO:	"AMPLIACIÓN DE LA CAPACIDAD INSTALADA DEL HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE VILLAVICENCIO ESE - META".		
CONTRATISTA :	CONSORCIO HOSPITAL 002 RL DANIEL ALEJANDRO ENGATIVA RODRIGUEZ NIT: 901752517-0		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	572 DE 2023		
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTER HOSPITAL RL : EDWIN FABIAN HENAO CAMARGO. NIT: 901755332-9		

ACTA:	ACTA DE PAGO PARCIAL No.3

CAPITULO:	COMPONENTE ARQUITECTONICO	
N° ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
2,4,1	ACERO DE REFUERZO FY=4200 MPa (4200 KG/CM2, G60) INCLUYE SUMINISTRO, FIGURADO, ARMADO, COLOCACIÓN Y AMARRE.	KG

DESCRIPCIÓN		DIMENSIONES				
		LONGITUD (M)	DIAMETRO (#)	PESO (KG/M)	CANTIDAD (UN)	TOTAL (KG)
DETALLE	TIPO DE REFUERZO					
VIGA S-106	REFUERZO LONGITUDINAL s	12.00	6	2.235	3.00	80.46
	REFUERZO LATERAL s	4.40	6	2.235	1.00	9.83
	REFUERZO 2da FILA s	4.00	6	2.235	2.00	17.88
	REFUERZO LATERAL i	4.40	6	2.235	1.00	9.83
	REFUERZO LONGITUDINAL i	12.00	6	2.235	3.00	80.46
	REFUERZO LONGITUDINAL s	10.70	6	2.235	3.00	71.74
	REFUERZO 2da FILA s	4.00	6	2.235	2.00	17.88
	REFUERZO LONGITUDINAL i	10.30	6	2.235	3.00	69.06
	REFUERZO LONGITUDINAL s	6.00	6	2.235	3.00	40.23
	REFUERZO 2da FILA s	3.50	6	2.235	2.00	15.65
	REFUERZO LONGITUDINAL i	6.00	6	2.235	3.00	40.23
	REFUERZO LONGITUDINAL s	9.20	6	2.235	3.00	61.69
	REFUERZO 2da FILA s	4.00	6	2.235	2.00	17.88
	REFUERZO LONGITUDINAL i	9.00	6	2.235	3.00	60.35
	REFUERZO LONGITUDINAL s	12.00	6	2.235	3.00	80.46
	REFUERZO 2da FILA s	4.50	6	2.235	2.00	20.12
	REFUERZO LONGITUDINAL i	11.70	6	2.235	3.00	78.45
	REFUERZO LONGITUDINAL s	12.00	6	2.235	1.00	26.82
	REFUERZO LATERAL s	8.70	6	2.235	2.00	38.89
	REFUERZO 2da FILA s	4.00	6	2.235	2.00	17.88
	REFUERZO LONGITUDINAL s	4.40	6	2.235	2.00	19.67
	REFUERZO LONGITUDINAL i	4.40	6	2.235	2.00	19.67
	REFUERZO LATERAL i	8.80	7	3.042	2.00	53.54
	REFUERZO LONGITUDINAL i	11.80	6	2.235	1.00	26.37
	ESTRIBOS T1	2.08	3	0.56	10.00	11.65
	ESTRIBOS T2	1.88	3	0.56	233.00	245.30
	ESTRIBOS T3	1.68	3	0.56	10.00	9.41
	GANCHOS T1	0.74	3	0.56	10.00	4.14
PASAN:	24,810.93				SUBTOTAL	1,245.53
					TOTAL	26,056.46

Firma
Nombre: JUAN CARLOS RODRIGUEZ SANCHEZ
DIRECTOR DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 2570062356 CND

Firma
Nombre: ROBERTO HERNAN HURTADO ROBLEDO
RESIDENTE DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 17202-51811 CDS

Firma
Nombre: CESAR ASHLEY MORA BARNEY
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 25202-214496 CND

Firma
Nombre:ALONSO QUINTERO PEÑARANDA
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
N° Mat. Profesional: 25700-25724 CND

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

CONTRATO N°	511 DE 2023	PROYECTO N°	2021005500331
FECHA DE INICIÓ:	12/12/2023	FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL:	11/03/2025
OBJETO PROYECTO:	"AMPLIACIÓN DE LA CAPACIDAD INSTALADA DEL HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE VILLAVICENCIO ESE - META".		
CONTRATISTA :	CONSORCIO HOSPITAL 002 RL DANIEL ALEJANDRO ENGATIVA RODRIGUEZ NIT: 901752517-0		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	572 DE 2023		
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTER HOSPITAL RL : EDWIN FABIAN HENAO CAMARGO. NIT: 901755332-9		

ACTA:	ACTA DE PAGO PARCIAL No.3
CAPITULO:	COMPONENTE ARQUITECTONICO

N° ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
2,4,1	ACERO DE REFUERZO FY=4200 MPa (4200 KG/CM2, G60) INCLUYE SUMINISTRO, FIGURADO, ARMADO, COLOCACIÓN Y AMARRE.	KG

DESCRIPCIÓN		DIMENSIONES				
		LONGITUD (M)	DIAMETRO (#)	PESO (KG/M)	CANTIDAD (UN)	TOTAL (KG)
DETALLE	TIPO DE REFUERZO					
VIGA S-107 can|(2)	REFUERZO LONGITUDINAL s	9.50	5	1.552	4.00	58.98
	REFUERZO LATERAL s	4.00	6	2.235	2.00	17.88
	REFUERZO LONGITUDINAL i	6.00	5	1.552	4.00	37.25
	REFUERZO LATERAL i	5.00	5	1.552	2.00	15.52
	REFUERZO LONGITUDINAL i	10.60	5	1.552	4.00	65.80
	REFUERZO LONGITUDINAL s	10.40	5	1.552	4.00	64.56
	REFUERZO 2da FILA s	4.00	5	1.552	4.00	24.83
	REFUERZO LATERAL s	4.00	5	1.552	2.00	12.42
	REFUERZO LATERAL i	5.00	5	1.552	2.00	15.52
	REFUERZO LONGITUDINAL i	10.00	5	1.552	4.00	62.08
	REFUERZO LONGITUDINAL s	8.80	5	1.552	4.00	54.63
	REFUERZO LATERAL s	3.50	5	1.552	2.00	10.86
	REFUERZO LONGITUDINAL i	7.50	5	1.552	4.00	46.56
	REFUERZO LONGITUDINAL s	10.80	5	1.552	4.00	67.05
	REFUERZO 2da FILA s	5.00	5	1.552	4.00	31.04
	REFUERZO LATERAL s	5.00	5	1.552	2.00	15.52
	REFUERZO LATERAL i	6.00	6	2.235	2.00	26.82
	REFUERZO LONGITUDINAL i	12.00	5	1.552	4.00	74.50
	REFUERZO LONGITUDINAL s	12.00	6	2.235	4.00	107.28
	REFUERZO LATERAL s	5.00	6	2.235	2.00	22.35
	REFUERZO 2da FILA s	5.00	5	1.552	4.00	31.04
	REFUERZO LATERAL i	6.00	5	1.552	2.00	18.62
	REFUERZO LONGITUDINAL i	10.50	5	1.552	4.00	65.18
	REFUERZO LONGITUDINAL s	6.20	5	1.552	4.00	38.49
	REFUERZO 2da FILA s	3.00	5	1.552	4.00	18.62
	ESTRIBOS T1	1.58	3	0.56	296.00	261.90
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
PASAN:	26,056.46				SUBTOTAL	1,265.31
					TOTAL	27,321.77

Firma
Nombre: JUAN CARLOS RODRIGUEZ SANCHEZ
DIRECTOR DE OBRA
N° Matricula Profesional: 2570062356 CND

Firma
Nombre: CESAR ASHLEY MORA BARNEY
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
N° Matricula Profesional: 25202-214496 CND

Firma
Nombre: ROBERTO HERNAN HURTADO ROBLEDO
RESIDENTE DE OBRA
N° Matricula Profesional: 17202-51811 CDS

Firma
Nombre: ALONSO QUINTERO PEÑARANDA
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
N° Mat. Profesional: 25700-25724 CND

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

CONTRATO N°	511 DE 2023	PROYECTO N°	2021005500331
FECHA DE INICIÓ:	12/12/2023	FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL:	11/03/2025
OBJETO PROYECTO:	"AMPLIACIÓN DE LA CAPACIDAD INSTALADA DEL HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE VILLAVICENCIO ESE - META".		
CONTRATISTA :	CONSORCIO HOSPITAL 002 RL DANIEL ALEJANDRO ENGATIVA RODRIGUEZ NIT: 901752517-0		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	572 DE 2023		
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTER HOSPITAL RL : EDWIN FABIAN HENAO CAMARGO. NIT: 901755332-9		
ACTA:	ACTA DE PAGO PARCIAL No.3		
CAPITULO:	COMPONENTE ARQUITECTONICO		
N° ÍTEM	DESCRIPCIÓN		UNIDAD
2,4,1	ACERO DE REFUERZO FY=4200 MPa (4200 KG/CM2, G60) INCLUYE SUMINISTRO, FIGURADO, ARMADO, COLOCACIÓN Y AMARRE.		KG

DESCRIPCIÓN		DIMENSIONES				
		LONGITUD (M)	DIAMETRO (#)	PESO (KG/M)	CANTIDAD (UN)	TOTAL (KG)
DETALLE	TIPO DE REFUERZO					
VIGA S-109	REFUERZO LONGITUDINAL s	12.00	6	2.235	0.93	24.94
	REFUERZO LATERAL s	4.00	7	3.042	0.46	5.66
	REFUERZO LONGITUDINAL s	8.70	6	2.235	0.46	9.04
	REFUERZO LONGITUDINAL i	8.70	6	2.235	0.46	9.04
	REFUERZO LONGITUDINAL i	12.00	6	2.235	0.93	24.94
	REFUERZO LONGITUDINAL s	10.70	6	2.235	1.39	33.35
	REFUERZO LATERAL s	3.50	6	2.235	0.46	3.64
	REFUERZO LONGITUDINAL i	10.40	6	2.235	1.39	32.42
	REFUERZO LONGITUDINAL s	6.00	6	2.235	1.39	18.70
	REFUERZO LATERAL s	3.50	6	2.235	0.46	3.64
	REFUERZO LONGITUDINAL i	5.70	6	2.235	1.39	17.77
	REFUERZO LONGITUDINAL s	9.20	6	2.235	1.39	28.68
	REFUERZO 2DA FILA s	4.50	6	2.235	0.93	9.35
	REFUERZO LONGITUDINAL i	9.00	6	2.235	1.39	28.05
	REFUERZO LONGITUDINAL s	12.00	6	2.235	1.39	37.41
	REFUERZO 2DA FILA s	4.50	6	2.235	1.39	14.03
	REFUERZO LONGITUDINAL i	12.00	6	2.235	1.39	37.41
	REFUERZO LONGITUDINAL s	12.00	6	2.235	0.93	24.94
	REFUERZO LONGITUDINAL s	8.70	6	2.235	0.46	9.04
	REFUERZO 2DA FILA s	4.00	6	2.235	0.93	8.31
	REFUERZO LONGITUDINAL i	8.40	6	2.235	0.46	8.73
	REFUERZO LONGITUDINAL i	11.70	6	2.235	0.93	24.31
	ESTRIBOS T1	1.68	3	0.56	16.74	15.75
	ESTRIBOS T2	1.88	3	0.56	133.42	140.47
PASAN:	27,321.77				SUBTOTAL	569.59
					TOTAL	27,891.36

Firma
Nombre: JUAN CARLOS RODRIGUEZ SANCHEZ
DIRECTOR DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 2570062356 CND

Firma
Nombre: ROBERTO HERNAN HURTADO ROBLEDO
RESIDENTE DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 17202-51811 CDS

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

Firma
Nombre: CESAR ASHLEY MORA BARNEY
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 25202-214496 CND

Firma
Nombre:ALONSO QUINTERO PEÑARANDA
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
N° Mat. Profesional: 25700-25724 CND

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@alm-meta.gov.co
https://alm-meta.gov.co

CONTRATO N°	511 DE 2023	PROYECTO N°	2021005500331
FECHA DE INICIÓ:	12/12/2023	FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL:	11/03/2025
OBJETO PROYECTO:	"AMPLIACIÓN DE LA CAPACIDAD INSTALADA DEL HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE VILLAVICENCIO ESE - META".		
CONTRATISTA :	CONSORCIO HOSPITAL 002 RL DANIEL ALEJANDRO ENGATIVA RODRIGUEZ NIT: 901752517-0		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	572 DE 2023		
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTER HOSPITAL RL : EDWIN FABIAN HENAO CAMARGO. NIT: 901755332-9		
ACTA:	ACTA DE PAGO PARCIAL No.3		
CAPITULO:	COMPONENTE ARQUITECTONICO		
N° ÍTEM	DESCRIPCIÓN		UNIDAD
2,4,1	ACERO DE REFUERZO FY=4200 MPa (4200 KG/CM2, G60) INCLUYE SUMINISTRO, FIGURADO, ARMADO, COLOCACIÓN Y AMARRE.		KG

DESCRIPCIÓN		DIMENSIONES				
		LONGITUD (M)	DIAMETRO (#)	PESO (KG/M)	CANTIDAD (UN)	TOTAL (KG)
DETALLE	TIPO DE REFUERZO					
VIGA S-110	REFUERZO LONGITUDINAL s	3.00	5	1.552	1.78	8.30
	REFUERZO LONGITUDINAL s	6.20	5	1.552	3.57	34.33
	REFUERZO 2DA FILA s	3.00	5	1.552	3.57	16.61
	REFUERZO LATERAL i	5.00	5	1.552	1.78	13.84
	REFUERZO LONGITUDINAL i	12.00	5	1.552	3.57	66.44
	REFUERZO LONGITUDINAL s	10.40	5	1.552	3.57	57.58
	REFUERZO 2DA FILA s	4.00	5	1.552	3.57	22.15
	REFUERZO LATERAL i	4.50	5	1.552	1.78	12.46
	REFUERZO LONGITUDINAL i	10.50	5	1.552	3.57	58.13
	REFUERZO LONGITUDINAL s	8.80	5	1.552	3.57	48.72
	REFUERZO LONGITUDINAL s	3.50	6	2.235	1.78	13.95
	REFUERZO LONGITUDINAL s	10.80	5	1.552	3.57	59.79
	REFUERZO LONGITUDINAL s	5.00	6	2.235	1.78	19.93
	REFUERZO 2DA FILA s	5.00	5	1.552	3.57	27.68
	REFUERZO LONGITUDINAL i	7.80	5	1.552	3.57	43.18
	REFUERZO LATERAL i	6.00	6	2.235	1.78	23.92
	REFUERZO LONGITUDINAL i	12.00	5	1.552	3.57	66.44
	REFUERZO LATERAL s	5.50	5	1.552	1.78	15.23
	REFUERZO LONGITUDINAL s	12.00	6	2.235	3.57	95.68
	REFUERZO 2DA FILA s	5.00	5	1.552	3.57	27.68
	REFUERZO LONGITUDINAL s	6.20	5	1.552	3.57	34.33
	REFUERZO 2DA FILA s	3.00	5	1.552	3.57	16.61
	REFUERZO LATERAL s	3.00	5	1.552	1.78	8.30
	REFUERZO LATERAL i	6.00	5	1.552	1.78	16.61
	REFUERZO LONGITUDINAL i	10.20	5	1.552	3.57	56.47
	ESTRIBOS	1.58	3	0.56	242.58	214.63
PASAN:	27,891.36				SUBTOTAL	1,079.00
					TOTAL	28,970.36

Firma
Nombre: JUAN CARLOS RODRIGUEZ SANCHEZ
DIRECTOR DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 2570062356 CND

Firma
Nombre: ROBERTO HERNAN HURTADO ROBLEDO
RESIDENTE DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 17202-51811 CDS

Firma
Nombre: CESAR ASHLEY MORA BARNEY
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 25202-214496 CND

Firma
Nombre:ALONSO QUINTERO PEÑARANDA
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
N° Mat. Profesional: 25700-25724 CND

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

CONTRATO N°	511 DE 2023	PROYECTO N°	2021005500331
FECHA DE INICIÓ:	12/12/2023	FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL:	11/03/2025
OBJETO PROYECTO:	"AMPLIACIÓN DE LA CAPACIDAD INSTALADA DEL HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE VILLAVICENCIO ESE - META".		
CONTRATISTA :	CONSORCIO HOSPITAL 002 RL DANIEL ALEJANDRO ENGATIVA RODRIGUEZ NIT: 901752517-0		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	572 DE 2023		
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTER HOSPITAL RL : EDWIN FABIAN HENAO CAMARGO. NIT: 901755332-9		
ACTA:	ACTA DE PAGO PARCIAL No.3		
CAPITULO:	COMPONENTE ARQUITECTONICO		
N° ÍTEM	DESCRIPCIÓN		UNIDAD
2,4,1	ACERO DE REFUERZO FY=4200 MPa (4200 KG/CM2, G60) INCLUYE SUMINISTRO, FIGURADO, ARMADO, COLOCACIÓN Y AMARRE.		KG

DESCRIPCIÓN		DIMENSIONES				
		LONGITUD (M)	DIAMETRO (#)	PESO (KG/M)	CANTIDAD (UN)	TOTAL (KG)
DETALLE	TIPO DE REFUERZO					
VIGA S-116	REFUERZO LONGITUDINAL s	8.00	6	2.235	1.34	23.92
	REFUERZO LATERAL s	7.00	6	2.235	0.45	6.98
	REFUERZO LONGITUDINAL i	8.80	6	2.235	1.34	26.31
	REFUERZO LONGITUDINAL s	10.60	6	2.235	1.34	31.69
	REFUERZO 2DA FILA s	4.00	6	2.235	0.89	7.97
	REFUERZO LATERAL s	3.50	6	2.235	0.45	3.49
	REFUERZO LONGITUDINAL i	10.20	6	2.235	1.34	30.50
	REFUERZO LONGITUDINAL s	12.00	6	2.235	1.34	35.88
	REFUERZO 2DA FILA s	4.00	6	2.235	0.89	7.97
	REFUERZO LONGITUDINAL i	12.00	6	2.235	1.34	35.88
	REFUERZO LONGITUDINAL s	8.30	6	2.235	1.34	24.82
	REFUERZO LONGITUDINAL i	8.00	6	2.235	1.34	23.92
	REFUERZO LONGITUDINAL s	6.20	6	2.235	1.34	18.54
	REFUERZO LATERAL s	5.00	7	3.042	0.45	6.78
	REFUERZO 2DA FILA s	4.00	6	2.235	0.89	7.97
	REFUERZO LONGITUDINAL i	6.20	6	2.235	1.34	18.54
	REFUERZO LONGITUDINAL s	9.30	6	2.235	1.34	27.81
	REFUERZO LATERAL i	7.50	6	2.235	0.45	7.47
	REFUERZO LONGITUDINAL i	9.00	6	2.235	1.34	26.91
	ESTRIBOS T1	1.88	3	0.56	120.84	127.22
PASAN:	28,970.36				SUBTOTAL	500.56
					TOTAL	29,470.92

Firma
Nombre: JUAN CARLOS RODRIGUEZ SANCHEZ
DIRECTOR DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 2570062356 CND

Firma
Nombre: ROBERTO HERNAN HURTADO ROBLEDO
RESIDENTE DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 17202-51811 CDS

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

Firma
Nombre: CESAR ASHLEY MORA BARNEY
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 25202-214496 CND

Firma
Nombre:ALONSO QUINTERO PEÑARANDA
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
N° Mat. Profesional: 25700-25724 CND

CONTRATO N°	511 DE 2023	PROYECTO N°	2021005500331
FECHA DE INICIÓ:	12/12/2023	FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL:	11/03/2025
OBJETO PROYECTO:	"AMPLIACIÓN DE LA CAPACIDAD INSTALADA DEL HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE VILLAVICENCIO ESE - META".		
CONTRATISTA :	CONSORCIO HOSPITAL 002 RL DANIEL ALEJANDRO ENGATIVA RODRIGUEZ NIT: 901752517-0		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	572 DE 2023		
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTER HOSPITAL RL : EDWIN FABIAN HENAO CAMARGO. NIT: 901755332-9		

ACTA:	ACTA DE PAGO PARCIAL No.3
CAPITULO:	COMPONENTE ARQUITECTONICO

N° ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
2,4,1	**ACERO DE REFUERZO FY=4200 MPa (4200 KG/CM2, G60) INCLUYE SUMINISTRO, FIGURADO, ARMADO, COLOCACIÓN Y AMARRE.**	KG

DESCRIPCIÓN		DIMENSIONES				
		LONGITUD (M)	DIAMETRO (#)	PESO (KG/M)	CANTIDAD (UN)	TOTAL (KG)
DETALLE	TIPO DE REFUERZO					
VIGA S-117	REFUERZO LONGITUDINAL s	6.20	5	1.552	0.89	8.58
	REFUERZO LATERAL s	3.00	5	1.552	0.45	2.08
	REFUERZO LATERAL i	5.00	5	1.552	0.45	3.46
	REFUERZO LONGITUDINAL i	12.00	5	1.552	0.89	16.61
	REFUERZO LONGITUDINAL s	10.40	5	1.552	0.89	14.40
	REFUERZO LATERAL s	4.00	5	1.552	0.45	2.77
	REFUERZO 2DA FILA s	4.00	5	1.552	0.89	5.54
	REFUERZO LATERAL i	4.50	5	1.552	0.45	3.11
	REFUERZO LONGITUDINAL s	8.80	5	1.552	0.89	12.18
	REFUERZO LATERAL s	3.50	6	2.235	0.45	3.49
	REFUERZO LATERAL i	4.50	5	1.552	0.45	3.11
	REFUERZO LONGITUDINAL i	10.50	5	1.552	0.89	14.53
	REFUERZO LONGITUDINAL s	10.80	5	1.552	0.89	14.95
	REFUERZO 2DA FILA s	5.00	5	1.552	0.89	6.92
	REFUERZO LATERAL s	5.00	5	1.552	0.45	3.46
	REFUERZO LONGITUDINAL i	7.80	5	1.552	0.89	10.80
	REFUERZO LATERAL i	6.00	5	1.552	0.45	4.15
	REFUERZO LONGITUDINAL i	12.00	5	1.552	0.89	16.61
	REFUERZO LONGITUDINAL s	12.00	5	1.552	0.89	16.61
	REFUERZO LATERAL s	5.50	5	1.552	0.45	3.81
	REFUERZO 2DA FILA s	5.00	5	1.552	0.89	6.92
	REFUERZO LONGITUDINAL s	6.20	5	1.552	0.89	8.58
	REFUERZO LATERAL s	3.00	5	1.552	0.45	2.08
	REFUERZO LATERAL i	6.00	5	1.552	0.45	4.15
	REFUERZO LONGITUDINAL i	10.20	5	1.552	0.89	14.12
	ESTRIBOS T1	1.58	3	0.56	60.65	53.66
PASAN:	**29,470.92**				SUBTOTAL	**256.67**
					TOTAL	**29,727.59**

Firma
Nombre: JUAN CARLOS RODRIGUEZ SANCHEZ
DIRECTOR DE OBRA
N° Matricula Profesional: 2570062356 CND

Firma
Nombre: ROBERTO HERNAN HURTADO ROBLEDO
RESIDENTE DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 17202-51811 CDS

Firma
Nombre: CESAR ASHLEY MORA BARNEY
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 25202-214496 CND

Firma
Nombre:ALONSO QUINTERO PEÑARANDA
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
N° Mat. Profesional: 25700-25724 CND

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

(8423

CONTRATO N°	511 DE 2023	PROYECTO N°	2021005500331
FECHA DE INICIÓ:	12/12/2023	FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL:	11/03/2025
OBJETO PROYECTO:	"AMPLIACIÓN DE LA CAPACIDAD INSTALADA DEL HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE VILLAVICENCIO ESE - META".		
CONTRATISTA :	CONSORCIO HOSPITAL 002 RL DANIEL ALEJANDRO ENGATIVA RODRIGUEZ NIT: 901752517-0		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	572 DE 2023		
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTER HOSPITAL RL : EDWIN FABIAN HENAO CAMARGO. NIT: 901755332-9		
ACTA:	ACTA DE PAGO PARCIAL No.3		
CAPITULO:	COMPONENTE ARQUITECTONICO		
N° ÍTEM	DESCRIPCIÓN		UNIDAD
2,4,1	**ACERO DE REFUERZO FY=4200 MPa (4200 KG/CM2, G60) INCLUYE SUMINISTRO, FIGURADO, ARMADO, COLOCACIÓN Y AMARRE.**		KG

DESCRIPCIÓN		DIMENSIONES				
		LONGITUD (M)	DIAMETRO (#)	PESO (KG/M)	CANTIDAD (UN)	TOTAL (KG)
DETALLE	TIPO DE REFUERZO					
VIGA S-118	REFUERZO LONGITUDINAL s	8.80	6	2.235	1.34	26.31
	REFUERZO LATERAL s	3.00	6	2.235	0.45	2.99
	REFUERZO LONGITUDINAL i	8.80	6	2.235	1.34	26.31
	REFUERZO LONGITUDINAL s	10.60	6	2.235	1.34	31.69
	REFUERZO LATERAL s	4.00	6	2.235	0.45	3.99
	REFUERZO LONGITUDINAL i	10.20	6	2.235	1.34	30.50
	REFUERZO LONGITUDINAL s	12.00	6	2.235	1.34	35.88
	REFUERZO LATERAL s	4.00	6	2.235	0.45	3.99
	REFUERZO 2DA FILA s	4.00	6	2.235	0.89	7.97
	REFUERZO LONGITUDINAL i	12.00	6	2.235	1.34	35.88
	REFUERZO LONGITUDINAL s	8.20	6	2.235	1.34	24.52
	REFUERZO LONGITUDINAL i	8.00	6	2.235	1.34	23.92
	REFUERZO LONGITUDINAL s	6.30	6	2.235	1.34	18.84
	REFUERZO 2DA FILA s	4.00	6	2.235	0.89	7.97
	REFUERZO LONGITUDINAL i	6.20	6	2.235	1.34	18.54
	REFUERZO LONGITUDINAL s	9.30	6	2.235	1.34	27.81
	REFUERZO LATERAL s	3.00	6	2.235	0.45	2.99
	REFUERZO LONGITUDINAL i	9.00	6	2.235	1.34	26.91
	ESTRIBOS T1	1.88	3	0.56	100.78	106.10
PASAN:	29,727.59				SUBTOTAL	463.09
					TOTAL	30,190.68

Firma
Nombre: JUAN CARLOS RODRIGUEZ SANCHEZ
DIRECTOR DE OBRA
N° Matricula Profesional: 2570062356 CND

Firma
Nombre: ROBERTO HERNAN HURTADO ROBLEDO
RESIDENTE DE OBRA
N° Matricula Profesional: 17202-51811 CDS

Firma
Nombre: CESAR ASHLEY MORA BARNEY
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
N° Matricula Profesional: 25202-214496 CND

Firma
Nombre:ALONSO QUINTERO PEÑARANDA
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
N° Mat. Profesional: 25700-25724 CND

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

CONTRATO N°	511 DE 2023	PROYECTO N°	2021005500331
FECHA DE INICIÓ:	12/12/2023	FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL:	11/03/2025
OBJETO PROYECTO:	"AMPLIACIÓN DE LA CAPACIDAD INSTALADA DEL HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE VILLAVICENCIO ESE - META".		
CONTRATISTA :	CONSORCIO HOSPITAL 002 RL DANIEL ALEJANDRO ENGATIVA RODRIGUEZ NIT: 901752517-0		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	572 DE 2023		
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTER HOSPITAL RL : EDWIN FABIAN HENAO CAMARGO. NIT: 901755332-9		
ACTA:	ACTA DE PAGO PARCIAL No.3		
CAPITULO:	COMPONENTE ARQUITECTONICO		
N° ÍTEM	DESCRIPCIÓN		UNIDAD
2.4.1	**ACERO DE REFUERZO FY=4200 MPa (4200 KG/CM2, G60) INCLUYE SUMINISTRO, FIGURADO, ARMADO, COLOCACIÓN Y AMARRE.**		KG

DESCRIPCIÓN		DIMENSIONES				
		LONGITUD (M)	DIAMETRO (#)	PESO (KG/M)	CANTIDAD (UN)	TOTAL (KG)
DETALLE	TIPO DE REFUERZO					
VIGA S-120 cant (1de3)	REFUERZO LONGITUDINAL s	9.50	5	1.552	2.00	29.49
	REFUERZO LATERAL s	4.00	6	2.235	1.00	8.94
	REFUERZO LONGITUDINAL i	6.00	5	1.552	2.00	18.62
	REFUERZO LONGITUDINAL s	10.40	5	1.552	2.00	32.28
	REFUERZO 2da FILA s	4.00	5	1.552	2.00	12.42
	REFUERZO LATERAL s	4.00	5	1.552	1.00	6.21
	REFUERZO LATERAL i	5.00	5	1.552	1.00	7.76
	REFUERZO LONGITUDINAL i	10.60	5	1.552	2.00	32.90
	REFUERZO LATERAL i	5.00	5	1.552	1.00	7.76
	REFUERZO LONGITUDINAL i	10.00	5	1.552	2.00	31.04
	REFUERZO LONGITUDINAL s	8.80	5	1.552	2.00	27.32
	REFUERZO LATERAL s	3.50	5	1.552	1.00	5.43
	REFUERZO LONGITUDINAL s	10.80	5	1.552	2.00	33.52
	REFUERZO 2da FILA s	5.00	5	1.552	2.00	15.52
	REFUERZO LATERAL s	5.00	5	1.552	1.00	7.76
	REFUERZO LONGITUDINAL i	7.50	5	1.552	2.00	23.28
	REFUERZO LONGITUDINAL s	12.00	6	2.235	2.00	53.64
	REFUERZO LATERAL s	5.00	6	2.235	1.00	11.18
	REFUERZO 2da FILA s	5.00	5	1.552	2.00	15.52
	REFUERZO LATERAL i	6.00	6	2.235	1.00	13.41
	REFUERZO LONGITUDINAL i	12.00	5	1.552	2.00	37.25
	REFUERZO LATERAL i	6.00	5	1.552	1.00	9.31
	REFUERZO LONGITUDINAL i	9.00	5	1.552	2.00	27.94
	REFUERZO LONGITUDINAL s	9.50	5	1.552	2.00	29.49
	REFUERZO 2da FILA s	4.00	5	1.552	2.00	12.42
	REFUERZO LONGITUDINAL i	5.70	5	1.552	2.00	17.69
	ESTRIBOS T1	1.58	3	0.56	160.00	141.57
PASAN:	30,190.68				SUBTOTAL	669.66
					TOTAL	30,860.34

Firma
Nombre: ROBERTO HERNAN HURTADO ROBLEDO
RESIDENTE DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 17202-51811 CDS

Firma
Nombre: ALONSO QUINTERO PEÑARANDA
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
N° Mat. Profesional: 25700-25724 CND

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

CONTRATO N°	511 DE 2023	PROYECTO N°	2021005500331
FECHA DE INICIÓ:	12/12/2023	FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL:	11/03/2025
OBJETO PROYECTO:	"AMPLIACIÓN DE LA CAPACIDAD INSTALADA DEL HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE VILLAVICENCIO ESE - META".		
CONTRATISTA :	CONSORCIO HOSPITAL 002 RL DANIEL ALEJANDRO ENGATIVA RODRIGUEZ NIT: 901752517-0		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	572 DE 2023		
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTER HOSPITAL RL : EDWIN FABIAN HENAO CAMARGO. NIT: 901755332-9		

ACTA:	ACTA DE PAGO PARCIAL No.3
CAPITULO:	COMPONENTE ARQUITECTONICO

N° ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
2,4,1	ACERO DE REFUERZO FY=4200 MPa (4200 KG/CM2, G60) INCLUYE SUMINISTRO, FIGURADO, ARMADO, COLOCACIÓN Y AMARRE.	KG

DESCRIPCIÓN		DIMENSIONES				
		LONGITUD (M)	DIAMETRO (#)	PESO (KG/M)	CANTIDAD (UN)	TOTAL (KG)
DETALLE	TIPO DE REFUERZO					
VIGA S-112	REFUERZO LONGITUDINAL s	4.30	5	1.552	3.00	20.02
	REFUERZO LONGITUDINAL i	4.30	5	1.552	3.00	20.02
	ESTRIBOS T1	1.68	3	0.56	13.00	12.23
VIGA S-113 cant(3)	REFUERZO LONGITUDINAL s	4.30	5	1.552	9.00	60.06
	REFUERZO LONGITUDINAL i	4.30	5	1.552	6.00	40.04
	ESTRIBOS T1	1.58	3	0.56	39.00	34.51
VIGA S-114	REFUERZO LONGITUDINAL s	4.40	6	2.235	4.00	39.34
	REFUERZO LONGITUDINAL i	4.40	6	2.235	4.00	39.34
	ESTRIBOS T1	1.84	3	0.56	13.00	13.40
VIGA S-119	REFUERZO LONGITUDINAL s	4.30	5	1.552	2.00	13.35
	REFUERZO LONGITUDINAL i	4.30	5	1.552	2.00	13.35
	ESTRIBOS T1	1.44	3	0.56	13.00	10.48
VIGA S-115	REFUERZO LONGITUDINAL s	4.40	6	2.235	2.00	19.67
	REFUERZO LONGITUDINAL i	4.40	6	2.235	2.00	19.67
	ESTRIBOS T1	1.58	3	0.56	13.00	11.50
VIGA S-111	REFUERZO LONGITUDINAL s	4.40	6	2.235	2.00	19.67
	REFUERZO LONGITUDINAL i	4.40	6	2.235	2.00	19.67
	ESTRIBOS T1	1.58	3	0.56	13.00	11.50
VIGA S-108 cant(2)	REFUERZO LONGITUDINAL s	4.30	5	1.552	4.00	26.69
	REFUERZO LONGITUDINAL i	4.30	5	1.552	4.00	26.69
	ESTRIBOS T1	1.44	3	0.56	26.00	20.97
PASAN:	30,860.34				SUBTOTAL	492.16
					TOTAL	31,352.50

Firma
Nombre: JUAN CARLOS RODRIGUEZ SANCHEZ
DIRECTOR DE OBRA
N° Matricula Profesional: 2570062356 CND

Firma
Nombre: ROBERTO HERNAN HURTADO ROBLEDO
RESIDENTE DE OBRA
N° Matricula Profesional: 17202-51811 CDS

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

Firma
Nombre: CESAR ASHLEY MORA BARNEY
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
N° Matricula Profesional: 25202-214496 CND

Firma
Nombre: ALONSO QUINTERO PEÑARANDA
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
N° Mat. Profesional: 25700-25724 CND

CONTRATO N°	511 DE 2023	PROYECTO N°	2021005500331
FECHA DE INICIÓ:	12/12/2023	FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL:	11/03/2025
OBJETO PROYECTO:	"AMPLIACIÓN DE LA CAPACIDAD INSTALADA DEL HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE VILLAVICENCIO ESE - META".		
CONTRATISTA :	CONSORCIO HOSPITAL 002 RL DANIEL ALEJANDRO ENGATIVA RODRIGUEZ NIT: 901752517-0		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	572 DE 2023		
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTER HOSPITAL RL : EDWIN FABIAN HENAO CAMARGO. NIT: 901755332-9		

ACTA:	ACTA DE PAGO PARCIAL No.3	
CAPITULO:	COMPONENTE ARQUITECTONICO	
N° ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
2,4,1	**ACERO DE REFUERZO FY=4200 MPa (4200 KG/CM2, G60) INCLUYE SUMINISTRO, FIGURADO, ARMADO, COLOCACIÓN Y AMARRE.**	**KG**

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA





CONTRATO N°	511 DE 2023	PROYECTO N°	2021005500331
FECHA DE INICIÓ:	12/12/2023	FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL:	11/03/2025
OBJETO PROYECTO:	"AMPLIACIÓN DE LA CAPACIDAD INSTALADA DEL HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE VILLAVICENCIO ESE - META".		
CONTRATISTA :	CONSORCIO HOSPITAL 002 RL DANIEL ALEJANDRO ENGATIVA RODRIGUEZ NIT: 901752517-0		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	572 DE 2023		
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTER HOSPITAL RL : EDWIN FABIAN HENAO CAMARGO. NIT: 901755332-9		

ACTA:	ACTA DE PAGO PARCIAL No.3	
CAPITULO:	COMPONENTE ARQUITECTONICO	
N° ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
2,4,1	ACERO DE REFUERZO FY=4200 MPa (4200 KG/CM2, G60) INCLUYE SUMINISTRO, FIGURADO, ARMADO, COLOCACIÓN Y AMARRE.	KG

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA



CONTRATO N°	511 DE 2023	PROYECTO N°	2021005500331
FECHA DE INICIÓ:	12/12/2023	FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL:	11/03/2025
OBJETO PROYECTO:	"AMPLIACIÓN DE LA CAPACIDAD INSTALADA DEL HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE VILLAVICENCIO ESE - META".		
CONTRATISTA :	CONSORCIO HOSPITAL 002 RL DANIEL ALEJANDRO ENGATIVA RODRIGUEZ NIT: 901752517-0		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	572 DE 2023		
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTER HOSPITAL RL : EDWIN FABIAN HENAO CAMARGO. NIT: 901755332-9		
ACTA:	ACTA DE PAGO PARCIAL No.3		
CAPITULO:	COMPONENTE ARQUITECTONICO		
N° ÍTEM	DESCRIPCIÓN		UNIDAD
2,4,1	**ACERO DE REFUERZO FY=4200 MPa (4200 KG/CM2, G60) INCLUYE SUMINISTRO, FIGURADO, ARMADO, COLOCACIÓN Y AMARRE.**		KG

DESCRIPCIÓN		DIMENSIONES				
		LONGITUD (M)	DIAMETRO (#)	PESO (KG/M)	CANTIDAD (UN)	TOTAL (KG)
DETALLE	TIPO DE REFUERZO					
RIOSTRAS EJES DE 4-7 ENTRE A-D	REFUERZO LONGITUDINAL s	12.00	5	1.552	5.00	93.12
	REFUERZO LONGITUDINAL i	12.00	5	1.552	5.00	93.12
	ESTRIBOS	0.77	3	0.56	100.00	43.12
RIOSTRAS EJES DE 2-4 ENTRE A-H	REFUERZO LONGITUDINAL s	24.00	5	1.552	4.00	148.99
	REFUERZO LONGITUDINAL i	24.00	5	1.552	4.00	148.99
	ESTRIBOS	0.77	3	0.56	247.00	106.51
						0.00
PASAN: 31,352.50					SUBTOTAL	633.85
					TOTAL	31,986.35

Firma
Nombre: JUAN CARLOS RODRIGUEZ SANCHEZ
DIRECTOR DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 2570062356 CND

Firma
Nombre: ROBERTO HERNAN HURTADO ROBLEDO
RESIDENTE DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 17202-51811 CDS

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

Firma
Nombre: CESAR ASHLEY MORA BARNEY
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 25202-214496 CND

Firma
Nombre: ALONSO QUINTERO PEÑARANDA
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
N° Mat. Profesional: 25700-25724 CND


Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

CONTRATO N°	511 DE 2023	PROYECTO N°	2021005500331
FECHA DE INICIÓ:	12/12/2023	FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL:	11/03/2025
OBJETO PROYECTO:	"AMPLIACIÓN DE LA CAPACIDAD INSTALADA DEL HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE VILLAVICENCIO ESE - META".		
CONTRATISTA :	CONSORCIO HOSPITAL 002 RL DANIEL ALEJANDRO ENGATIVA RODRIGUEZ NIT: 901752517-0		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	572 DE 2023		
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTER HOSPITAL RL : EDWIN FABIAN HENAO CAMARGO. NIT: 901755332-9		

ACTA:	ACTA DE PAGO PARCIAL No.3
CAPITULO:	COMPONENTE ARQUITECTONICO

N° ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
2,4,1	ACERO DE REFUERZO FY=4200 MPa (4200 KG/CM2, G60) INCLUYE SUMINISTRO, FIGURADO, ARMADO, COLOCACIÓN Y AMARRE.	KG

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA

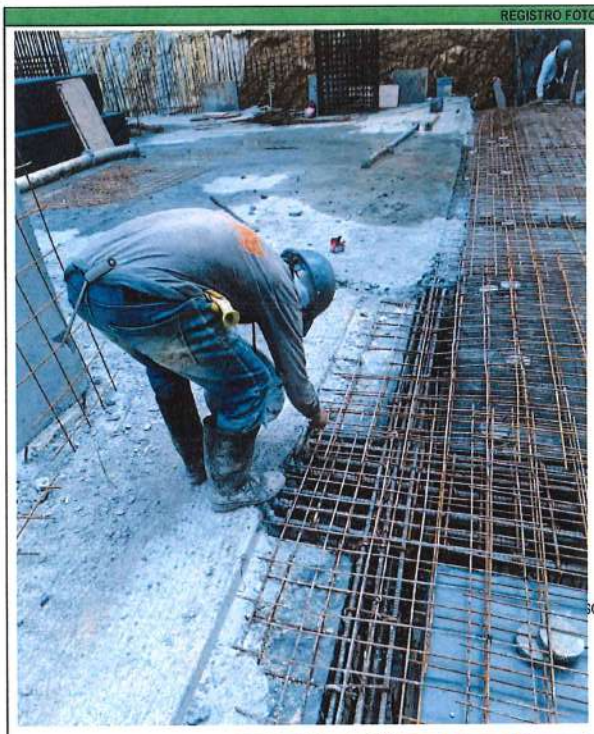





CONTRATO N°	511 DE 2023	PROYECTO N°	2021005500331
FECHA DE INICIÓ:	12/12/2023	FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL:	11/03/2025
OBJETO PROYECTO:	"AMPLIACIÓN DE LA CAPACIDAD INSTALADA DEL HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE VILLAVICENCIO ESE - META".		
CONTRATISTA :	CONSORCIO HOSPITAL 002 RL DANIEL ALEJANDRO ENGATIVA RODRIGUEZ NIT: 901752517-0		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	572 DE 2023		
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTER HOSPITAL RL : EDWIN FABIAN HENAO CAMARGO. NIT: 901755332-9		

ACTA:	ACTA DE PAGO PARCIAL No.3
CAPITULO:	COMPONENTE ARQUITECTONICO

N° ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
2,4,1	ACERO DE REFUERZO FY=4200 MPa (4200 KG/CM2, G60) INCLUYE SUMINISTRO, FIGURADO, ARMADO, COLOCACIÓN Y AMARRE.	KG

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA



CONTRATO N°	511 DE 2023	PROYECTO N°	2021005500331
FECHA DE INICIÓ:	12/12/2023	FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL:	11/03/2025
OBJETO PROYECTO:	"AMPLIACIÓN DE LA CAPACIDAD INSTALADA DEL HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE VILLAVICENCIO ESE - META".		
CONTRATISTA :	CONSORCIO HOSPITAL 002 RL DANIEL ALEJANDRO ENGATIVA RODRIGUEZ NIT: 901752517-0		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	572 DE 2023		
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTER HOSPITAL RL : EDWIN FABIAN HENAO CAMARGO. NIT: 901755332-9		

ACTA:	ACTA DE PAGO PARCIAL No.3
CAPITULO:	COMPONENTE ARQUITECTONICO

N° ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
2,4,1	**ACERO DE REFUERZO FY=4200 MPa (4200 KG/CM2, G60) INCLUYE SUMINISTRO, FIGURADO, ARMADO, COLOCACIÓN Y AMARRE.**	KG

DESCRIPCIÓN		DIMENSIONES				
		LONGITUD (M)	DIAMETRO (#)	PESO (KG/M)	CANTIDAD (UN)	TOTAL (KG)
DETALLE	TIPO DE REFUERZO					
VIGA S-138	REFUERZO LONGITUDINAL s	5.50	6	2.235	2.00	24.59
	REFUERZO LONGITUDINAL i	5.50	6	2.235	2.00	24.59
	ESTRIBOS T1	1.68	3	0.56	17.00	15.99
PASAN:	31,986.35				SUBTOTAL	65.16
					TOTAL	32,051.51

Firma
Nombre: JUAN CARLOS RODRIGUEZ SANCHEZ
DIRECTOR DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 2570062356 CND

Firma
Nombre: ROBERTO HERNAN HURTADO ROBLEDO
RESIDENTE DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 17202-51811 CDS

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

Firma
Nombre: CESAR ASHLEY MORA BARNEY
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 25202-214496 CND

Firma
Nombre: ALONSO QUINTERO PEÑARANDA
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
N° Mat. Profesional: 25700-25724 CND

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

18432

CONTRATO N°	511 DE 2023	PROYECTO N°	2021005500331
FECHA DE INICIÓ:	12/12/2023	FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL:	11/03/2025
OBJETO PROYECTO:	"AMPLIACIÓN DE LA CAPACIDAD INSTALADA DEL HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE VILLAVICENCIO ESE - META".		
CONTRATISTA :	CONSORCIO HOSPITAL 002 RL DANIEL ALEJANDRO ENGATIVA RODRIGUEZ NIT: 901752517-0		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	572 DE 2023		
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTER HOSPITAL RL : EDWIN FABIAN HENAO CAMARGO. NIT: 901755332-9		
ACTA:	ACTA DE PAGO PARCIAL No.3		
CAPITULO:	COMPONENTE ARQUITECTONICO		
N° ITEM	DESCRIPCIÓN		UNIDAD
2,4,1	**ACERO DE REFUERZO FY=4200 MPa (4200 KG/CM2, G60) INCLUYE SUMINISTRO, FIGURADO, ARMADO, COLOCACIÓN Y AMARRE.**		KG

DESCRIPCIÓN		DIMENSIONES				
		LONGITUD (M)	DIAMETRO (#)	PESO (KG/M)	CANTIDAD (UN)	TOTAL (KG)
DETALLE	TIPO DE REFUERZO					
P7 cant(2 de 4)	REFUERZO VERTICAL	5.30	8	3.973	132.00	2,779.51
	REFUERZO HORIZONTAL	2.95	3	0.56	160.00	264.32
	GRAPAS	0.95	3	0.56	560.00	297.92
P1 cant(4 de 8)	REFUERZO VERTICAL	1.65	7	3.042	144.00	722.78
	REFUERZO HORIZONTAL	2.20	3	0.56	40.00	49.28
	REFUERZO HORIZONTAL	1.20	3	0.56	80.00	53.76
PASAN:	32,051.51				SUBTOTAL	4,167.57
					TOTAL	36,219.08

Firma
Nombre: JUAN CARLOS RODRIGUEZ SANCHEZ
DIRECTOR DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 2570062356 CND

Firma
Nombre: ROBERTO HERNAN HURTADO ROBLEDO
RESIDENTE DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 17202-51811 CDS

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

Firma
Nombre: CESAR ASHLEY MORA BARNEY
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 25202-214496 CND

Firma
Nombre: ALONSO QUINTERO PEÑARANDA
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
N° Mat. Profesional: 25700-25724 CND

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

CONTRATO N°	511 DE 2023	PROYECTO N°	2021005500331
FECHA DE INICIÓ:	12/12/2023	FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL:	11/03/2025
OBJETO PROYECTO:	"AMPLIACIÓN DE LA CAPACIDAD INSTALADA DEL HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE VILLAVICENCIO ESE - META".		
CONTRATISTA :	CONSORCIO HOSPITAL 002 RL DANIEL ALEJANDRO ENGATIVA RODRIGUEZ NIT: 901752517-0		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	572 DE 2023		
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTER HOSPITAL RL : EDWIN FABIAN HENAO CAMARGO. NIT: 901755332-9		

ACTA:	ACTA DE PAGO PARCIAL No.3
CAPITULO:	COMPONENTE ARQUITECTONICO

N° ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
2,4,1	**ACERO DE REFUERZO FY=4200 MPa (4200 KG/CM2, G60) INCLUYE SUMINISTRO, FIGURADO, ARMADO, COLOCACIÓN Y AMARRE.**	KG

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA



Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

CONTRATO N°	511 DE 2023	PROYECTO N°	2021005500331
FECHA DE INICIÓ:	12/12/2023	FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL:	11/03/2025
OBJETO PROYECTO:	"AMPLIACIÓN DE LA CAPACIDAD INSTALADA DEL HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE VILLAVICENCIO ESE - META".		
CONTRATISTA :	CONSORCIO HOSPITAL 002 RL DANIEL ALEJANDRO ENGATIVA RODRIGUEZ NIT: 901752517-0		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	572 DE 2023		
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTER HOSPITAL RL : EDWIN FABIAN HENAO CAMARGO. NIT: 901755332-9		

ACTA:	ACTA DE PAGO PARCIAL No.3
CAPITULO:	COMPONENTE ARQUITECTONICO

N° ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
2,4,1	**ACERO DE REFUERZO FY=4200 MPa (4200 KG/CM2, G60) INCLUYE SUMINISTRO, FIGURADO, ARMADO, COLOCACIÓN Y AMARRE.**	KG

DESCRIPCIÓN		DIMENSIONES				
		LONGITUD (M)	DIAMETRO (#)	PESO (KG/M)	CANTIDAD (UN)	TOTAL (KG)
DETALLE	TIPO DE REFUERZO					
CAISSON 2	REFUERZO HORIZONTAL CURVO	5.85	4	0.994	24.00	139.56
	REFUERZO HORIZONTAL RECTO	4.04	4	0.994	24.00	96.38
	REFUERZO VERTICAL	1.30	3	0.56	258.00	187.82
CAISSON 3	REFUERZO HORIZONTAL CURVO	5.85	4	0.994	24.00	139.56
	REFUERZO HORIZONTAL RECTO	4.04	4	0.994	24.00	96.38
	REFUERZO VERTICAL	1.30	3	0.56	258.00	187.82
CAISSON 4	REFUERZO HORIZONTAL CURVO	5.85	4	0.994	24.00	139.56
	REFUERZO HORIZONTAL RECTO	4.04	4	0.994	24.00	96.38
	REFUERZO VERTICAL	1.30	3	0.56	258.00	187.82
CAISSON 5	REFUERZO HORIZONTAL CURVO	5.85	4	0.994	24.00	139.56
	REFUERZO HORIZONTAL RECTO	4.04	4	0.994	24.00	96.38
	REFUERZO VERTICAL	1.30	3	0.56	258.00	187.82
CAISSON 6	REFUERZO HORIZONTAL CURVO	5.85	4	0.994	24.00	139.56
	REFUERZO HORIZONTAL RECTO	4.04	4	0.994	24.00	96.38
	REFUERZO VERTICAL	1.30	3	0.56	258.00	187.82
CAISSON 7	REFUERZO HORIZONTAL CURVO	5.85	4	0.994	24.00	139.56
	REFUERZO HORIZONTAL RECTO	4.04	4	0.994	24.00	96.38
	REFUERZO VERTICAL	1.30	3	0.56	258.00	187.82
CAISSON 8	REFUERZO HORIZONTAL CURVO	5.85	4	0.994	24.00	139.56
	REFUERZO HORIZONTAL RECTO	4.04	4	0.994	24.00	96.38
	REFUERZO VERTICAL	1.30	3	0.56	258.00	187.82
PASAN:	**36,219.08**				**SUBTOTAL**	**2,966.32**
					TOTAL	**39,185.40**

Firma
Nombre: JUAN CARLOS RODRIGUEZ SANCHEZ
DIRECTOR DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 2570062356 CND

Firma
Nombre: ROBERTO HERNAN HURTADO ROBLEDO
RESIDENTE DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 17202-51811 CDS

Firma
Nombre: CESAR ASHLEY MORA BARNEY
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 25202-214496 CND

Firma
Nombre: ALONSO QUINTERO PEÑARANDA
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
N° Mat. Profesional: 25700-25724 CND

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

CONTRATO N°	511 DE 2023	PROYECTO N°	2021005500331
FECHA DE INICIÓ:	12/12/2023	FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL:	11/03/2025
OBJETO PROYECTO:	"AMPLIACIÓN DE LA CAPACIDAD INSTALADA DEL HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE VILLAVICENCIO ESE - META".		
CONTRATISTA :	CONSORCIO HOSPITAL 002 RL DANIEL ALEJANDRO ENGATIVA RODRIGUEZ NIT: 901752517-0		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	572 DE 2023		
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTER HOSPITAL RL : EDWIN FABIAN HENAO CAMARGO. NIT: 901755332-9		

ACTA:	ACTA DE PAGO PARCIAL No.3
CAPITULO:	COMPONENTE ARQUITECTONICO

N° ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
2,4,1	ACERO DE REFUERZO FY=4200 MPa (4200 KG/CM2, G60) INCLUYE SUMINISTRO, FIGURADO, ARMADO, COLOCACIÓN Y AMARRE.	KG

DESCRIPCIÓN		DIMENSIONES				
		LONGITUD (M)	DIAMETRO (#)	PESO (KG/M)	CANTIDAD (UN)	TOTAL (KG)
DETALLE	TIPO DE REFUERZO					
ESPALDAR PROTECCION CAISSON 2	REFUERZO HORIZONTAL RECTO	3.50	4	0.994	4.00	13.92
	REFUERZO VERTICAL	1.30	3	0.56	18.00	13.10
ESPALDAR PROTECCION CAISSON 3	REFUERZO HORIZONTAL RECTO	3.50	4	0.994	4.00	13.92
	REFUERZO VERTICAL	1.30	3	0.56	18.00	13.10
ESPALDAR PROTECCION CAISSON 4	REFUERZO HORIZONTAL RECTO	3.50	4	0.994	4.00	13.92
	REFUERZO VERTICAL	1.30	3	0.56	18.00	13.10
ESPALDAR PROTECCION CAISSON 5	REFUERZO HORIZONTAL RECTO	3.50	4	0.994	4.00	13.92
	REFUERZO VERTICAL	1.30	3	0.56	18.00	13.10
ESPALDAR PROTECCION CAISSON 6	REFUERZO HORIZONTAL RECTO	3.50	4	0.994	4.00	13.92
	REFUERZO VERTICAL	1.30	3	0.56	18.00	13.10
ESPALDAR PROTECCION CAISSON 7	REFUERZO HORIZONTAL RECTO	3.50	4	0.994	4.00	13.92
	REFUERZO VERTICAL	1.30	3	0.56	18.00	13.10
ESPALDAR PROTECCION CAISSON 8	REFUERZO HORIZONTAL RECTO	3.50	4	0.994	4.00	13.92
	REFUERZO VERTICAL	1.30	3	0.56	18.00	13.10
PASAN:	39,185.40				SUBTOTAL	189.14
					TOTAL	39,374.54

Firma
Nombre: JUAN CARLOS RODRIGUEZ SANCHEZ
DIRECTOR DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 2570062356 CND

Firma
Nombre: ROBERTO HERNAN HURTADO ROBLEDO
RESIDENTE DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 17202-51811 CDS

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

Firma
Nombre: CESAR ASHLEY MORA BARNEY
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 25202-214496 CND

Firma
Nombre: ALONSO QUINTERO PEÑARANDA
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
N° Mat. Profesional: 25700-25724 CND

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

9481


CONTRATO N°	511 DE 2023	PROYECTO N°	2021005500331
FECHA DE INICIÓ:	12/12/2023	FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL:	11/03/2025
OBJETO PROYECTO:	"AMPLIACIÓN DE LA CAPACIDAD INSTALADA DEL HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE VILLAVICENCIO ESE - META".		
CONTRATISTA :	CONSORCIO HOSPITAL 002 RL DANIEL ALEJANDRO ENGATIVA RODRIGUEZ NIT: 901752517-0		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	572 DE 2023		
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTER HOSPITAL RL : EDWIN FABIAN HENAO CAMARGO. NIT: 901755332-9		

ACTA:	ACTA DE PAGO PARCIAL No.3	
CAPITULO:	COMPONENTE ARQUITECTONICO	
N° ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
2,4,1	ACERO DE REFUERZO FY=4200 MPa (4200 KG/CM2, G60) INCLUYE SUMINISTRO, FIGURADO, ARMADO, COLOCACIÓN Y AMARRE.	KG

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA





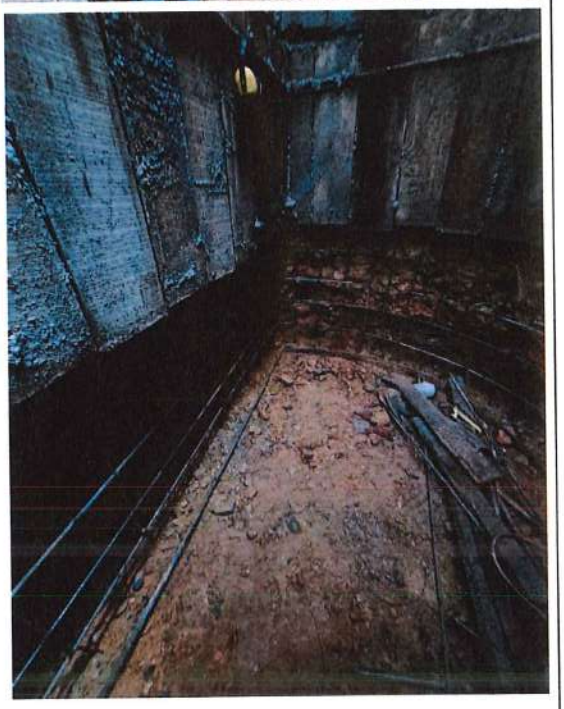

SIDERÚRGICA NACIONAL
SIDENAL S.A.

BOGOTA PBX 6151222 5205009 - 5205919 FAX: 6252955

SOGAMOSO PBX (8) 7723842 315-2537741 312-4801868 FAX: (8)7723843

Acero Colombiano con Calidad Certificada
Acero sismo - resistente

villavicencio
villavicencio
RESUMEN PEDIDO COMPLETO

RESUMEN DE PESOS BARRAS FIGURADAS

DIAMETRO	Fy (Mpa)	LONGITUD (m)	PESO (Kg)
SR-No8	420	82.50	327.8
SR-No7	420	705.38	2,145.8
SR-No6	420	2,381.40	5,322.4
SR-No5	420	3,556.30	5,519.4
SR-No3	420	7,633.52	4,274.8
		TOTAL BARRAS FIGURADAS	17,590.1

RESUMEN DE PESOS BARRAS ESTANDAR

DIAMETRO	Fy (Mpa)	LONGITUD (m)	CANTIDAD	PESO (Kg)
SR-No8	420	12.00	5.0	238.4
SR-No6	420	12.00	61.0	1,636.0
SR-No5	420	12.00	24.0	447.0
			TOTAL ESTANDAR	2,321.4

PESO TOTAL DEL PEDIDO = 19,911.5 Kg

SIDERÚRGICA NACIONAL
SIDENAL S.A.











BOGOTA PBX 6151222 5205009 - 5205919 FAX: 6252955

SOGAMOSO PBX (8) 7723842 315-2537741 312-4801868 FAX: (8)7723843










Acero Colombiano con Calidad Certificada
Acero sismo - resistente

villavicencio
villavicencio
ELEMENTO POR ELEMENTO





S135 (Es 1) Peso/Elemento= 260.06Kg

2 SR-No5 L=8.00 W=12.42 WT=24.83kg 	2 SR-No5 L=10.40 W=16.14 WT=32.28kg 	2 SR-No5 L=4.50 W=6.98 WT=13.97kg 	2 SR-No5 L=7.00 W=10.86 WT=21.73kg 
2 SR-No5 L=3.50 W=5.43 WT=10.86kg 	2 SR-No5 L=10.00 W=15.52 WT=31.04kg 	2 SR-No5 L=11.80 W=18.31 WT=36.63kg 	2 SR-No5 L=6.00 W=9.31 WT=18.62kg 
2 SR-No5 L=3.20 W=4.97 WT=9.93kg 	68 SR-No3 L=1.58 W=0.88 WT=60.17kg 		

S136 (Es 1) Peso/Elemento= 574.89Kg

5 SR-No8 L=5.50 W=21.85 WT=109.28kg 	5 SR-No8 L=3.50 W=13.91 WT=69.53kg 	5 SR-No6 L=5.20 W=11.62 WT=58.11kg 	5 SR-No7 L=5.595 W=17.02 WT=85.10kg 
2 SR-No6 L=2.50 W=5.59 WT=11.17kg 	3 SR-No7 L=5.80 W=17.64 WT=52.93kg 	5 SR-No7 L=5.20 W=15.82 WT=79.09kg 	59 SR-No3 L=0.84 W=0.47 WT=27.75kg 
59 SR-No3 L=2.48 W=1.39 WT=81.94kg 			

S103 (Es 1) Peso/Elemento= 681.65Kg

2 SR-No5 L=2.50 W=3.88 WT=7.76kg 	2 SR-No5 L=5.90 W=9.16 WT=18.31kg 	2 SR-No5 L=8.50 W=13.19 WT=26.38kg 	3 SR-No5 L=3.00 W=4.66 WT=13.97kg 

** Gancho fuera de norma - comunicarse con SIDENAL

villavicencio
villavicencio
ELEMENTO POR ELEMENTO

4 SR-No5 L=10.50 W=16.30 WT=65.18kg
10.50

1 SR-No5 L=5.00 W=7.76 WT=7.76kg
5.00

2 SR-No5 L=4.50 W=6.98 WT=13.97kg
4.50

6 SR-No6 L=12.00 W=26.82 WT=160.92kg
12.00

4 SR-No6 L=5.50 W=12.29 WT=49.17kg
5.50

2 SR-No6 L=6.80 W=15.20 WT=30.40kg
0.32
6.48

1 SR-No7 L=3.50 W=10.65 WT=10.65kg
0.37
3.13

2 SR-No6 L=3.00 W=6.70 WT=13.41kg
0.32
2.68

2 SR-No5 L=9.50 W=14.74 WT=29.49kg
0.27
9.23

5 SR-No5 L=6.00 W=9.31 WT=46.56kg
6.00

2 SR-No5 L=10.00 W=15.52 WT=31.04kg
10.00

2 SR-No5 L=7.20 W=11.17 WT=22.35kg
7.20

2 SR-No5 L=2.80 W=4.35 WT=8.69kg
0.27
2.53

142 SR-No3 L=1.58 W=0.88 WT=125.54kg
h
b
b=0.17
h=0.50
g=0.12

S104 (Es 1) Peso/Elemento= 702.52Kg

2 SR-No6 L=6.00 W=13.41 WT=26.82kg
0.32
5.68

2 SR-No5 L=2.50 W=3.88 WT=7.76kg
0.27
2.23

1 SR-No5 L=3.00 W=4.66 WT=4.66kg
0.27
2.73

2 SR-No5 L=8.50 W=13.19 WT=26.38kg
8.50

1 SR-No6 L=3.50 W=7.82 WT=7.82kg
3.50

4 SR-No5 L=10.50 W=16.30 WT=65.18kg
10.50

2 SR-No5 L=3.00 W=4.66 WT=9.31kg
3.00

1 SR-No5 L=5.00 W=7.76 WT=7.76kg
5.00

2 SR-No5 L=4.50 W=6.98 WT=13.97kg
4.50

6 SR-No6 L=12.00 W=26.82 WT=160.92kg
12.00

4 SR-No6 L=5.50 W=12.29 WT=49.17kg
5.50

2 SR-No6 L=7.40 W=16.54 WT=33.08kg
0.32
7.08

1 SR-No7 L=3.50 W=10.65 WT=10.65kg
0.37
3.13

2 SR-No6 L=3.00 W=6.70 WT=13.41kg
0.32
2.68

2 SR-No5 L=9.50 W=14.74 WT=29.49kg
0.27
9.23

5 SR-No5 L=6.00 W=9.31 WT=46.56kg
6.00

villavicencio
villavicencio
ELEMENTO POR ELEMENTO

2 SR-No5 L=10.00 W=15.52 WT=31.04kg	2 SR-No5 L=7.20 W=11.17 WT=22.35kg	2 SR-No5 L=3.40 W=5.28 WT=10.55kg	142 SR-No3 L=1.58 W=0.88 WT=125.64kg
10.00	7.20	0.27 3.13	h b=0.17 h=0.50 g=0.12 b

S101 (Es 1) Peso/Elemento= 477.73Kg

2 SR-No5 L=8.00 W=12.42 WT=24.83kg	1 SR-No6 L=2.50 W=5.59 WT=5.59kg	2 SR-No6 L=10.70 W=23.91 WT=47.83kg	3 SR-No5 L=4.50 W=6.98 WT=20.95kg
0.27 7.73	0.32 2.18	10.70	4.50
4 SR-No6 L=12.00 W=26.82 WT=107.28kg	SR-No6 L=5.50 W=12.29 WT=12.29kg	2 SR-No6 L=5.00 W=11.17 WT=22.35kg	2 SR-No5 L=6.60 W=10.24 WT=20.49kg
12.00	5.50	5.00	0.27 6.33
1 SR-No6 L=3.50 W=7.82 WT=7.82kg	2 SR-No5 L=3.00 W=4.66 WT=9.31kg	2 SR-No5 L=10.00 W=15.52 WT=31.04kg	2 SR-No5 L=6.80 W=10.55 WT=21.11kg
0.32 3.18	0.27 2.73	0.27 9.73	6.80
2 SR-No5 L=11.50 W=17.85 WT=35.70kg	1 SR-No6 L=7.00 W=15.64 WT=15.64kg	2 SR-No5 L=3.40 W=5.28 WT=10.55kg	96 SR-No3 L=1.58 W=0.88 WT=84.94kg
11.50	7.00	0.27 3.13	h b=0.17 h=0.50 g=0.12 b

S102 (Es 1) Peso/Elemento= 477.73Kg

2 SR-No5 L=8.00 W=12.42 WT=24.83kg	1 SR-No6 L=2.50 W=5.59 WT=5.59kg	2 SR-No6 L=10.70 W=23.91 WT=47.83kg	3 SR-No5 L=4.50 W=6.98 WT=20.95kg
0.27 7.73	0.32 2.18	10.70	4.50
4 SR-No6 L=12.00 W=26.82 WT=107.28kg	SR-No6 L=5.50 W=12.29 WT=12.29kg	2 SR-No6 L=5.00 W=11.17 WT=22.35kg	2 SR-No5 L=6.60 W=10.24 WT=20.49kg
12.00	5.50	5.00	0.27 6.33
1 SR-No6 L=3.50 W=7.82 WT=7.82kg	2 SR-No5 L=3.00 W=4.66 WT=9.31kg	2 SR-No5 L=10.00 W=15.52 WT=31.04kg	2 SR-No5 L=6.80 W=10.55 WT=21.11kg
0.32 3.18	0.27 2.73	0.27 9.73	6.80

villavicencio
villavicencio
ELEMENTO POR ELEMENTO

2 SR-No5 L=11.50 W=17.85 WT=35.70kg 11.50	1 SR-No6 L=7.00 W=15.64 WT=15.64kg 7.00	2 SR-No5 L=3.40 W=5.28 WT=10.55kg 0.27 3.13	96 SR-No3 L=1.58 W=0.88 WT=84.94kg h b b=0.17 h=0.50 g=0.12


S105 (Es 1) Peso/Elemento= 579.76Kg

5 SR-No5 L=3.00 W=4.66 WT=23.28kg 0.27 2.73	2 SR-No5 L=6.20 W=9.62 WT=19.24kg 0.27 5.93	2 SR-No5 L=8.40 W=13.04 WT=26.07kg 8.40	4 SR-No5 L=4.00 W=6.21 WT=24.83kg 4.00
4 SR-No5 L=11.00 W=17.07 WT=68.28kg 11.00	1 SR-No6 L=3.00 W=6.70 WT=6.70kg 3.00	2 SR-No5 L=10.50 W=16.30 WT=32.59kg 10.50	2 SR-No5 L=4.50 W=6.98 WT=13.97kg 4.50
2 SR-No6 L=12.00 W=26.82 WT=53.64kg 12.00	2 SR-No5 L=6.50 W=10.09 WT=20.18kg 0.27 6.23	2 SR-No5 L=10.00 W=15.52 WT=31.04kg 0.27 9.73	4 SR-No5 L=6.00 W=9.31 WT=37.25kg 6.00
2 SR-No5 L=10.00 W=15.52 WT=31.04kg 10.00	2 SR-No5 L=7.20 W=11.17 WT=22.35kg 7.20	2 SR-No5 L=12.00 W=18.62 WT=37.25kg 12.00	2 SR-No5 L=3.20 W=4.97 WT=9.93kg 0.27 2.93
138 SR-No3 L=1.58 W=0.88 WT=122.10kg h b b=0.17 h=0.50 g=0.12			


S106 (Es 1) Peso/Elemento= 1252.90Kg

7 SR-No6 L=12.00 W=26.82 WT=187.74kg 0.32 11.68	4 SR-No6 L=4.40 W=9.83 WT=59.00kg 0.32 0.32 3.76	3 SR-No6 L=10.70 W=23.91 WT=71.74kg 10.70	6 SR-No6 L=4.00 W=8.94 WT=71.52kg 4.00
6 SR-No6 L=6.00 W=13.41 WT=80.46kg 6.00	2 SR-No6 L=3.50 W=7.82 WT=15.64kg 3.50	3 SR-No6 L=9.20 W=20.56 WT=61.69kg 9.20	3 SR-No6 L=12.00 W=26.82 WT=80.46kg 12.00

villavicencio
villavicencio
ELEMENTO POR ELEMENTO

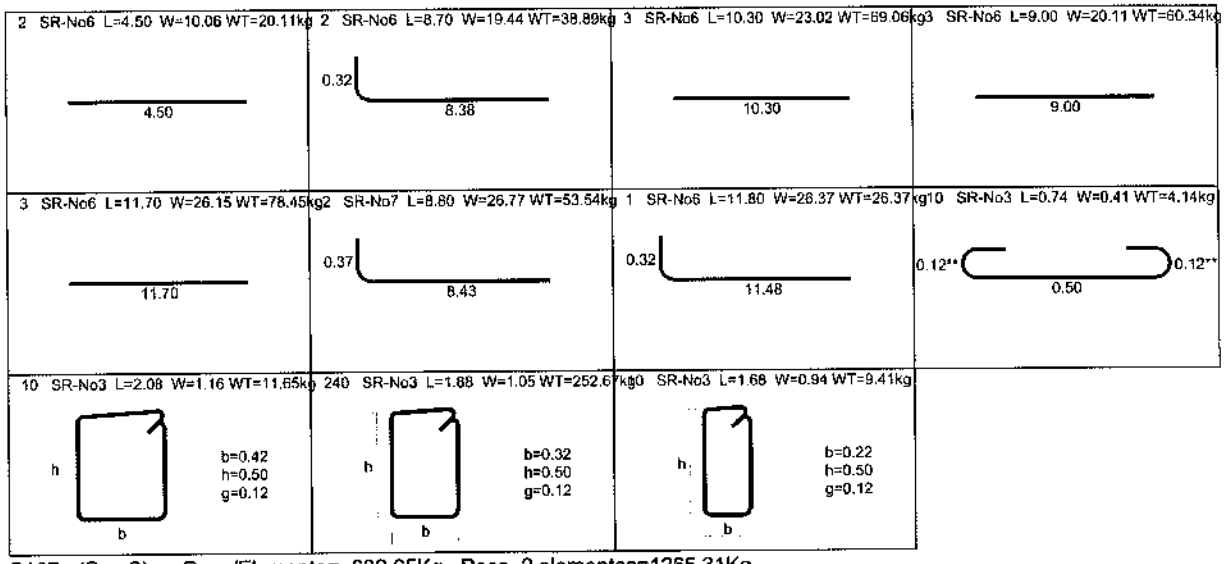


S107 (Son 2) Peso/Elemento= 632.65Kg Peso 2 elementos=1265.31Kg

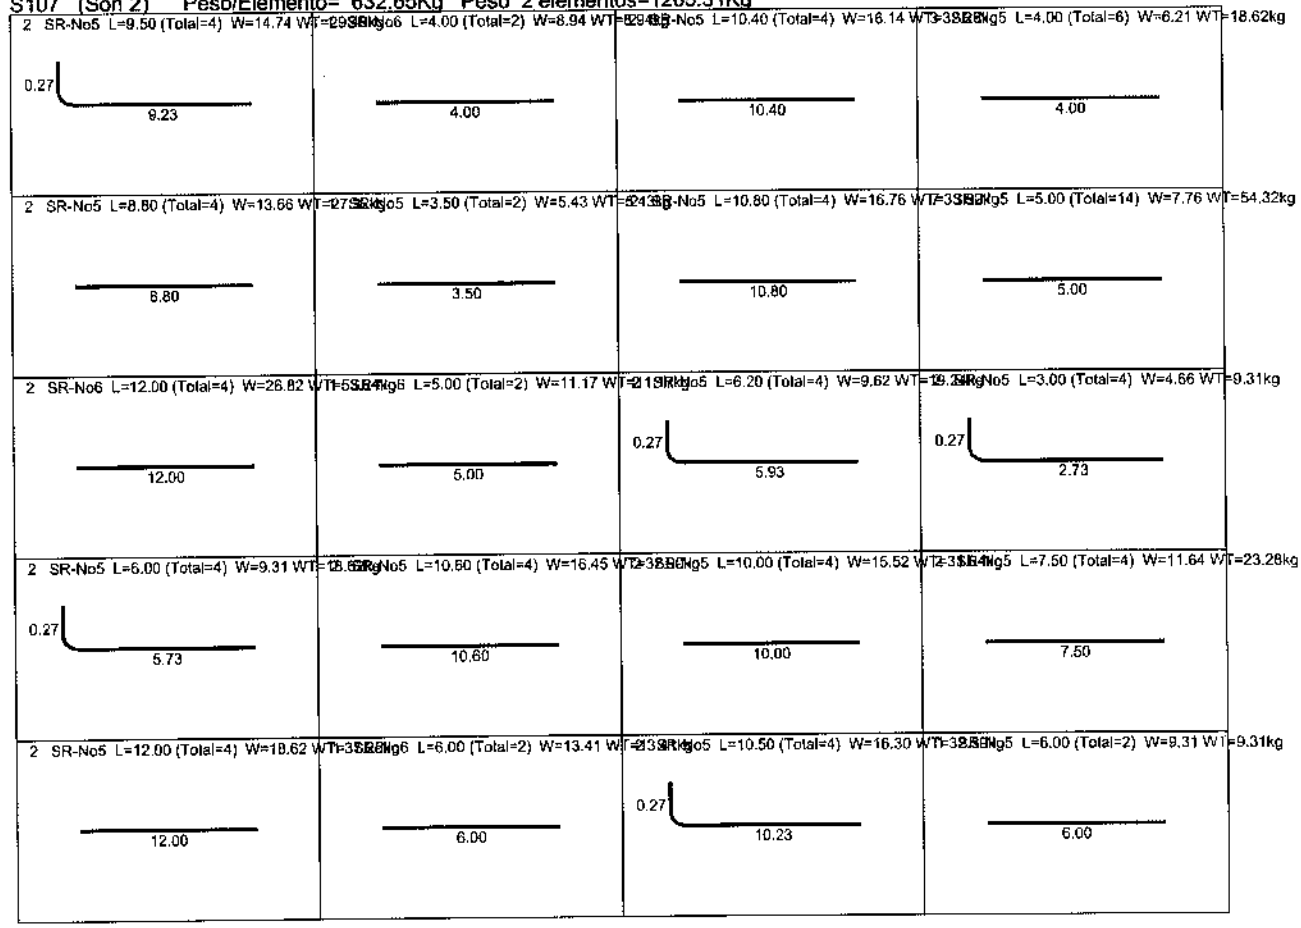

** Gancho fuera de norma - comunicarse con SIDENAL


villavicencio
villavicencio
ELEMENTO POR ELEMENTO


148 SR-No3 L=1.58 (Total=296) W=0.88 WT=130.95kg



S108 (Son 2) Peso/Elemento= 36.89Kg Peso 2 elementos=73.77Kg


4 SR-No5 L=4.30 (Total=8) W=6.67 WT=26.68kg 26 SR-No3 L=1.40 (Total=26) W=0.78 WT=10.19kg






S109 (Es 1) Peso/Elemento= 1216.19Kg


6 SR-No6 L=12.00 W=26.82 WT=160.92kg 6 SR-No6 L=8.70 W=19.44 WT=58.33kg 3 SR-No6 L=10.70 W=23.91 WT=71.74kg 2 SR-No6 L=3.50 W=7.82 WT=15.64kg




3 SR-No6 L=6.00 W=13.41 WT=40.23kg 3 SR-No6 L=9.20 W=20.58 WT=61.69kg 5 SR-No6 L=4.50 W=10.06 WT=50.29kg 6 SR-No6 L=12.00 W=26.82 WT=160.92kg



2 SR-No6 L=4.00 W=8.94 WT=17.88kg 3 SR-No5 L=10.40 W=23.24 WT=69.73kg 3 SR-No6 L=5.70 W=12.74 WT=38.22kg 3 SR-No6 L=9.00 W=20.11 WT=60.34kg



1 SR-No6 L=8.40 W=18.77 WT=18.77kg 2 SR-No6 L=11.70 W=26.15 WT=52.30kg 36 SR-No3 L=1.68 W=0.94 WT=33.87kg 290 SR-No3 L=1.88 W=1.05 WT=305.34kg



S110 (Son 4) Peso/Elemento= 606.70Kg Peso 4 elementos=2426.81Kg

6 SR-No5 L=3.00 (Total=24) W=4.66 WT=27.94kg 16 SR-No5 L=6.20 (Total=16) W=9.62 WT=38.58kg 8 SR-No5 L=10.40 (Total=8) W=16.14 WT=32.28kg 8 SR-No5 L=4.00 (Total=8) W=6.21 WT=12.42kg



SIDERÚRGICA NACIONAL
SIDENAL S.A.


BOGOTA PBX 6151222 5205009 - 5205919 FAX: 6252955

Acero Colombiano
con Calidad Certificada
Acero sismo - resistente


SOGAMOSO PBX (8) 7723842 315-2537741 312-4801868 FAX: (8)7723843

villavicencio
villavicencio
ELEMENTO POR ELEMENTO


2 SR-No5 L=8.80 (Total=8) W=13.66 WT=27.32kg | 6 SR-No6 L=3.50 (Total=4) W=7.82 WT=7.82kg | 8 SR-No5 L=10.80 (Total=8) W=16.76 WT=33.52kg | 5 SR-No5 L=5.00 (Total=20) W=7.76 WT=38.80kg




1 SR-No6 L=5.00 (Total=4) W=11.17 WT=11.17kg | 2 SR-No6 L=12.00 (Total=8) W=26.82 WT=53.64kg | 4 SR-No5 L=5.50 (Total=4) W=8.54 WT=8.54kg | 2 SR-No5 L=12.00 (Total=8) W=18.62 WT=37.25kg



2 SR-No5 L=10.50 (Total=8) W=16.30 WT=32.60kg | 4 SR-No5 L=4.50 (Total=4) W=6.98 WT=6.98kg | 2 SR-No5 L=7.80 (Total=8) W=12.11 WT=24.22kg | 2 SR-No5 L=12.00 (Total=8) W=18.62 WT=37.25kg




1 SR-No6 L=6.00 (Total=4) W=13.41 WT=13.41kg | 2 SR-No5 L=10.20 (Total=8) W=15.83 WT=31.66kg | 4 SR-No5 L=6.00 (Total=4) W=9.31 WT=9.31kg | 552 SR-No3 L=1.58 (Total=552) W=0.88 WT=122.10kg




S111 (Son 2) Peso/Elemento= 50.84Kg Peso 2 elementos=101.68Kg

4 SR-No6 L=4.40 (Total=8) W=9.83 WT=39.34kg | 26 SR-No3 L=1.58 (Total=26) W=0.88 WT=11.50kg




S112 (Es 1) Peso/Elemento= 51.54Kg

6 SR-No5 L=4.30 W=8.67 WT=40.04kg | 13 SR-No3 L=1.58 W=0.88 WT=11.50kg




S113 (Son 3) Peso/Elemento= 44.87Kg Peso 3 elementos=134.61Kg

5 SR-No5 L=4.30 (Total=15) W=8.67 WT=33.37kg | 39 SR-No3 L=1.58 (Total=39) W=0.88 WT=11.50kg




S114 (Es 1) Peso/Elemento= 92.07Kg

8 SR-No6 L=4.40 W=9.83 WT=78.67kg | 13 SR-No3 L=1.84 W=1.03 WT=13.40kg


















villavicencio
villavicencio
ELEMENTO POR ELEMENTO









S115 (Es 1) Peso/Elemento= 50.84Kg

4 SR-No6 L=4.40 W=9.83 WT=39.34kg 	13 SR-No3 L=1.58 W=0.88 WT=11.50kg 

S116 (Es 1) Peso/Elemento= 1127.92Kg

6 SR-No6 L=8.80 W=19.67 WT=118.01kg 	3 SR-No6 L=10.60 W=23.69 WT=71.07kg 	1 SR-No6 L=3.50 W=7.82 WT=7.82kg 	6 SR-No6 L=12.00 W=26.82 WT=160.92kg 
6 SR-No6 L=4.00 W=8.94 WT=53.64kg 	3 SR-No6 L=8.30 W=18.55 WT=55.65kg 	6 SR-No6 L=6.20 W=13.86 WT=83.14kg 	3 SR-No6 L=9.30 W=20.79 WT=62.36kg 
3 SR-No6 L=10.20 W=22.80 WT=68.39kg 	3 SR-No6 L=8.00 W=17.88 WT=53.64kg 	3 SR-No6 L=9.00 W=20.11 WT=60.34kg 	1 SR-No7 L=5.00 W=15.21 WT=15.21kg 
1 SR-No6 L=7.00 W=15.64 WT=15.64kg 	271 SR-No3 L=1.88 W=1.05 WT=285.31kg 	1 SR-No6 L=7.50 W=16.76 WT=16.76kg 	

S117 (Es 1) Peso/Elemento= 570.38Kg

4 SR-No5 L=6.20 W=9.62 WT=38.49kg 	2 SR-No5 L=3.00 W=4.66 WT=9.31kg 	2 SR-No5 L=10.40 W=16.14 WT=32.28kg 	3 SR-No5 L=4.00 W=6.21 WT=18.62kg 
2 SR-No5 L=8.80 W=13.66 WT=27.32kg 	1 SR-No6 L=3.50 W=7.82 WT=7.82kg 	2 SR-No5 L=10.80 W=16.76 WT=33.52kg 	6 SR-No5 L=5.00 W=7.76 WT=46.56kg 

villavicencio
villavicencio
ELEMENTO POR ELEMENTO

4 SR-No5 L=12.00 W=18.62 WT=74.50kg
12.00

1 SR-No5 L=5.50 W=8.54 WT=8.54kg
5.50

2 SR-No5 L=12.00 W=18.62 WT=37.25kg
0.27
11.73

2 SR-No5 L=10.50 W=16.30 WT=32.59kg
10.50

1 SR-No5 L=4.50 W=6.98 WT=6.98kg
4.50

2 SR-No5 L=7.80 W=12.11 WT=24.21kg
7.80

2 SR-No5 L=6.00 W=9.31 WT=18.62kg
6.00

2 SR-No5 L=10.20 W=15.83 WT=31.66kg
0.27
9.93

138 SR-No3 L=1.58 W=0.88 WT=122.10kg
h
b
b=0.17
h=0.50
g=0.12

S118 (Es 1) Peso/Elemento= 1036.02Kg

6 SR-No6 L=8.80 W=19.67 WT=118.01kg
0.32
8.48

3 SR-No6 L=10.60 W=23.69 WT=71.07kg
10.60

6 SR-No6 L=4.00 W=8.94 WT=53.64kg
4.00

6 SR-No6 L=12.00 W=26.82 WT=160.92kg
12.00

3 SR-No6 L=8.20 W=18.33 WT=54.98kg
8.20

3 SR-No6 L=6.30 W=14.08 WT=42.24kg
6.30

3 SR-No6 L=9.30 W=20.79 WT=62.36kg
0.32
8.98

1 SR-No6 L=3.00 W=6.70 WT=6.70kg
0.32
2.68

3 SR-No6 L=10.20 W=22.80 WT=68.39kg
10.20

3 SR-No6 L=8.00 W=17.88 WT=53.64kg
8.00

3 SR-No6 L=6.20 W=13.86 WT=41.57kg
6.20

3 SR-No6 L=9.00 W=20.11 WT=60.34kg
0.32
8.68

230 SR-No3 L=1.88 W=1.05 WT=242.14kg
h
b
b=0.32
h=0.50
g=0.12

S119 (Es 1) Peso/Elemento= 37.18Kg

4 SR-No5 L=4.30 W=6.67 WT=26.69kg
0.27
0.27
3.76

13 SR-No3 L=1.44 W=0.81 WT=10.46kg
h
b
b=0.10
h=0.50
g=0.12

SIDERÚRGICA NACIONAL
SIDENAL S.A.

BOGOTA PBX 6151222 5205009 - 5205919 FAX: 6252955


SOGAMOSO PBX (8) 7723842 315-2537741 312-4801868 FAX: (8) 7723843

Acero Colombiano con Calidad Certificada
Acero sismo - resistente


villavicencio
villavicencio
ELEMENTO POR ELEMENTO

S120 (Son 3) Peso/Elemento= 669.66Kg Peso 3 elementos=2008.97Kg


4 SR-No5 L=9.50 (Total=12) W=14.74 WT=58.96kg | 6 SR-No6 L=4.00 (Total=3) W=8.94 WT=26.82kg | 8 SR-No5 L=10.40 (Total=8) W=16.14 WT=129.12kg | 5 SR-No5 L=4.00 (Total=15) W=6.21 WT=31.04kg




2 SR-No5 L=8.80 (Total=6) W=13.66 WT=27.32kg | 5 SR-No5 L=3.50 (Total=3) W=5.43 WT=16.29kg | 8 SR-No5 L=10.80 (Total=6) W=16.76 WT=100.56kg | 5 SR-No5 L=5.00 (Total=21) W=7.76 WT=54.32kg



2 SR-No6 L=12.00 (Total=6) W=26.82 WT=53.64kg | 6 SR-No6 L=5.00 (Total=3) W=11.17 WT=33.51kg | 6 SR-No5 L=6.00 (Total=6) W=9.31 WT=55.86kg | 5 SR-No5 L=10.60 (Total=6) W=16.45 WT=32.90kg



2 SR-No5 L=10.00 (Total=6) W=15.52 WT=31.04kg | 5 SR-No5 L=7.50 (Total=6) W=11.64 WT=69.84kg | 5 SR-No5 L=12.00 (Total=6) W=18.62 WT=111.72kg | 6 SR-No6 L=6.00 (Total=3) W=13.41 WT=13.41kg




2 SR-No5 L=9.00 (Total=6) W=13.97 WT=27.94kg | 5 SR-No5 L=6.00 (Total=3) W=9.31 WT=27.93kg | 5 SR-No5 L=5.70 (Total=6) W=8.85 WT=53.10kg | 3 SR-No3 L=1.58 (Total=460) W=0.88 WT=141.57kg




S128 (Es 1) Peso/Elemento= 1702.04Kg


5 SR-No6 L=8.20 W=18.33 WT=91.63kg | 14 SR-No6 L=4.00 W=8.94 WT=125.16kg | 15 SR-No6 L=9.20 W=20.56 WT=308.43kg | 5 SR-No7 L=9.00 W=27.38 WT=136.89kg



5 SR-No6 L=6.80 W=15.20 WT=75.99kg | 5 SR-No6 L=9.00 W=20.11 WT=100.57kg | 5 SR-No6 L=6.50 W=14.53 WT=72.64kg | 5 SR-No6 L=7.80 W=17.43 WT=87.16kg




5 SR-No6 L=9.40 W=21.01 WT=105.04kg | 6 SR-No6 L=8.60 W=19.22 WT=115.33kg | 4 SR-No6 L=7.70 W=17.21 WT=68.84kg | 245 SR-No3 L=0.74 W=0.41 WT=101.53kg



** Gancho fuera de norma - comunicarse con SIDENAL


villavicencio
villavicencio
ELEMENTO POR ELEMENTO

245 SR-No3 L=2.28 W=1.28 WT=312.82kg




S129 (Es 1) Peso/Elemento= 2842.56Kg


10 SR-No7 L=8.80 W=26.77 WT=267.70kg 10 SR-No6 L=4.00 W=8.94 WT=89.40kg 5 SR-No7 L=10.50 W=31.94 WT=159.70kg SR-No8 L=12.00 W=47.68 WT=238.38kg




3 SR-No7 L=7.50 W=22.82 WT=68.45kg 3 SR-No7 L=4.30 W=13.08 WT=39.24kg 5 SR-No7 L=10.80 W=32.85 WT=164.27kg SR-No7 L=4.00 W=12.17 WT=60.84kg




5 SR-No7 L=8.20 W=24.94 WT=124.72kg 5 SR-No7 L=4.20 W=12.78 WT=63.88kg 5 SR-No6 L=6.20 W=13.86 WT=69.28kg 5 SR-No7 L=9.70 W=29.51 WT=147.54kg




5 SR-No7 L=10.00 W=30.42 WT=152.10kg SR-No7 L=5.70 W=17.34 WT=86.70kg 5 SR-No8 L=6.50 W=25.82 WT=129.12kg 5 SR-No7 L=4.60 W=13.99 WT=69.97kg




2 SR-No6 L=5.00 W=11.17 WT=22.35kg 5 SR-No7 L=7.60 W=23.12 WT=115.60kg 5 SR-No7 L=6.40 W=19.47 WT=97.34kg 2 SR-No6 L=4.00 W=8.94 WT=17.88kg



1 SR-No8 L=5.00 W=19.86 WT=19.86kg 1 SR-No7 L=5.00 W=15.21 WT=15.21kg 5 SR-No7 L=4.50 W=13.69 WT=68.45kg 300 SR-No3 L=0.74 W=0.41 WT=124.32kg




300 SR-No3 L=2.28 W=1.28 WT=383.04kg 31 SR-No3 L=0.64 W=0.36 WT=11.11kg 31 SR-No3 L=2.08 W=1.16 WT=36.11kg



S130 (Es 1) Peso/Elemento= 166.36Kg


3 SR-No5 L=5.00 W=7.76 WT=23.28kg 3 SR-No5 L=5.30 W=8.23 WT=24.68kg 4 SR-No6 L=8.30 W=18.55 WT=74.20kg 4 SR-No6 L=2.00 W=4.47 WT=17.88kg

** Gancho fuera de norma - comunicarse con SIDENAL



villavicencio
villavicencio
ELEMENTO POR ELEMENTO

25 SR-No3 L=1.68 W=1.05 WT=26.32kg



b=0.32
h=0.50
g=0.12

SIDERÚRGICA NACIONAL
SIDENAL S.A.

BOGOTA PBX 6151222 5205009 - 5205919 FAX: 6252955

SOGAMOSO PBX (8) 7723842 315-2537741 312-4801868 FAX: (8)7723843

Acero Colombiano con Calidad Certificada
Acero sismo - resistente

VILLAVICENCIO
VILLAVICENCIO
RESUMEN PEDIDO COMPLETO

RESUMEN DE PESOS BARRAS FIGURADAS

DIAMETRO	Fy (Mpa)	LONGITUD (m)	PESO (Kg)
SR-No8	420	249.00	989.3
SR-No7	420	1,394.00	4,240.5
SR-No6	420	764.20	1,708.0
SR-No5	420	21.60	33.5
SR-No3	420	4,589.00	2,569.8
		TOTAL BARRAS FIGURADAS	9,541.2

RESUMEN DE PESOS BARRAS ESTANDAR

DIAMETRO	Fy (Mpa)	LONGITUD (m)	CANTIDAD	PESO (Kg)
SR-No8	420	12.00	15.0	715.1
SR-No5	420	12.00	55.0	1,024.3
			TOTAL ESTANDAR	1,739.4

RESUMEN DE PESOS MALLAS ELECTROSOLDADAS ESPECIALES

MALLA	AREA EQ.(m2)	PESO (Kg)
M-188	1,582.5	4,736.3
	TOTAL MALLAS ESPECIALES	4,736.3

PESO TOTAL DEL PEDIDO = 16,016.8 Kg

SIDERÚRGICA NACIONAL
SIDENAL S.A.


Acero Colombiano
con Calidad Certificada
Acero sismo - resistente

BOGOTA PBX 6151222 5205009 - 5205919 FAX: 6252955
SOGAMOSO PBX (8) 7723842 315-2537741 312-4801868 FAX: (8)7723843


VILLAVICENCIO
VILLAVICENCIO
ELEMENTO POR ELEMENTO

S131 (Es 1) Peso/Elemento= 2239.20Kg


7 SR-No7 L=8.80 W=26.77 WT=187.39kg




6 SR-No6 L=4.00 W=8.94 WT=53.64kg




5 SR-No7 L=11.00 W=33.46 WT=167.31kg




5 SR-No8 L=12.00 W=47.68 WT=238.38kg




3 SR-No7 L=7.50 W=22.82 WT=68.45kg




5 SR-No7 L=10.40 W=31.64 WT=158.18kg




4 SR-No7 L=4.00 W=12.17 WT=60.84kg




5 SR-No7 L=6.00 W=18.25 WT=91.26kg




2 SR-No6 L=3.50 W=7.82 WT=15.64kg




5 SR-No7 L=10.50 W=31.94 WT=159.70kg




5 SR-No7 L=5.70 W=17.34 WT=86.70kg




5 SR-No7 L=4.50 W=13.69 WT=68.45kg




5 SR-No8 L=6.50 W=25.82 WT=129.12kg




5 SR-No6 L=8.40 W=18.77 WT=93.87kg




2 SR-No6 L=5.00 W=11.17 WT=22.35kg




5 SR-No7 L=10.00 W=30.42 WT=152.10kg




5 SR-No6 L=5.50 W=12.29 WT=61.46kg




223 SR-No3 L=0.74 W=0.41 WT=92.41kg




223 SR-No3 L=2.28 W=1.28 WT=284.73kg



31 SR-No3 L=2.08 W=1.16 WT=36.11kg




31 SR-No3 L=0.64 W=0.36 WT=11.11kg




S132 (Es 1) Peso/Elemento= 2363.94Kg


10 SR-No7 L=8.80 W=26.77 WT=267.70kg




10 SR-No6 L=4.00 W=8.94 WT=89.40kg




5 SR-No7 L=10.50 W=31.94 WT=159.70kg




5 SR-No8 L=12.00 W=47.68 WT=238.38kg




2 SR-No7 L=7.70 W=23.42 WT=46.85kg




2 SR-No7 L=4.30 W=13.08 WT=26.16kg



5 SR-No7 L=10.80 W=32.85 WT=164.27kg



4 SR-No7 L=4.00 W=12.17 WT=73.01kg



** Gancho fuera de norma - comunicarse con SIDENAL

SIDERÚRGICA NACIONAL
SIDENAL S.A.

BOGOTA PBX 6151222 5205009 - 5205919 FAX: 6252955

Acero Colombiano con Calidad Certificada
Acero sismo - resistente

SOGAMOSO PBX (8) 7723842 315-2537741 312-4801868 FAX: (8)7723843

VILLAVICENCIO
VILLAVICENCIO
ELEMENTO POR ELEMENTO

5 SR-No7 L=5.50 W=16.73 WT=83.66kg




2 SR-No6 L=3.20 W=7.15 WT=14.30kg

4 SR-No6 L=5.00 W=11.17 WT=44.70kg


5 SR-No7 L=9.70 W=29.51 WT=147.54kg

5 SR-No7 L=5.70 W=17.34 WT=86.70kg




8 SR-No7 L=6.50 W=19.77 WT=158.16kg

5 SR-No7 L=4.60 W=13.99 WT=69.97kg




5 SR-No7 L=10.00 W=30.42 WT=152.10kg


240 SR-No3 L=0.74 W=0.41 WT=99.48kg




5 SR-No7 L=5.40 W=16.43 WT=82.13kg




240 SR-No3 L=2.28 W=1.28 WT=306.48kg



5 SR-No3 L=2.08 W=1.16 WT=40.77kg



35 SR-No3 L=0.64 W=0.36 WT=12.54kg



S133 (Es 1) Peso/Elemento= 3321.05Kg

10 SR-No7 L=8.80 W=26.77 WT=267.70kg



6 SR-No7 L=4.00 W=12.17 WT=194.69kg

5 SR-No7 L=10.50 W=31.94 WT=159.70kg

5 SR-No8 L=12.00 W=47.68 WT=238.38kg


2 SR-No8 L=8.00 W=31.78 WT=63.57kg

3 SR-No8 L=4.30 W=17.08 WT=51.25kg


5 SR-No8 L=10.80 W=42.91 WT=214.50kg

5 SR-No8 L=8.30 W=32.98 WT=164.88kg


1 SR-No6 L=9.30 W=20.79 WT=20.79kg




1 SR-No7 L=9.40 W=28.59 WT=28.59kg




5 SR-No6 L=8.00 W=13.41 WT=67.05kg




5 SR-No6 L=5.00 W=11.17 WT=55.87kg




5 SR-No7 L=9.70 W=29.51 WT=147.54kg




2 SR-No6 L=4.00 W=8.94 WT=17.88kg



5 SR-No7 L=5.70 W=17.34 WT=86.70kg



5 SR-No8 L=6.50 W=25.82 WT=129.12kg



** Gancho fuera de norma - comunicarse con SIDENAL

SIDERÚRGICA NACIONAL
SIDENAL S.A.


BOGOTA PBX 6151222 5205009 - 5205919 FAX: 6252955

Acero Colombiano
con Calidad Certificada
Acero sismo - resistente


SOGAMOSO PBX (8) 7723842 315-2537741 312-4801868 FAX: (8)7723843

VILLAVICENCIO
VILLAVICENCIO
ELEMENTO POR ELEMENTO


5 SR-No8 L=4.70 W=18.67 WT=93.37kg




5 SR-No7 L=10.00 W=30.42 WT=152.10kg




SR-No6 L=3.50 W=7.82 WT=7.82kg




5 SR-No7 L=8.00 W=24.34 WT=121.68kg




5 SR-No7 L=6.00 W=18.25 WT=91.26kg




2 SR-No8 L=4.30 W=17.08 WT=34.17kg




1 SR-No8 L=5.00 W=19.86 WT=19.86kg




5 SR-No8 L=4.50 W=17.88 WT=89.39kg




2 SR-No7 L=6.50 W=19.77 WT=39.55kg




3 SR-No6 L=5.00 W=11.17 WT=33.52kg



2 SR-No6 L=4.00 W=8.94 WT=17.88kg




4 SR-No7 L=5.50 W=16.73 WT=66.92kg




366 SR-No3 L=0.74 W=0.41 WT=151.67kg




72 SR-No3 L=2.28 W=1.28 WT=347.20kg



5 SR-No3 L=2.08 W=1.16 WT=40.77kg



47 SR-No3 L=2.58 W=1.44 WT=67.91kg




105 SR-No3 L=0.64 W=0.36 WT=37.63kg




S134 (Es 1) Peso/Elemento= 1660.09Kg


10 SR-No6 L=7.00 W=15.64 WT=156.45kg




SR-No6 L=8.50 W=19.00 WT=94.99kg




6 SR-No6 L=4.00 W=8.94 WT=53.64kg




5 SR-No7 L=7.00 W=21.29 WT=106.47kg




3 SR-No7 L=4.00 W=12.17 WT=36.50kg




10 SR-No6 L=8.00 W=17.88 WT=178.80kg




5 SR-No6 L=7.50 W=16.76 WT=83.81kg




5 SR-No6 L=11.40 W=25.48 WT=127.39kg



5 SR-No6 L=8.30 W=18.55 WT=92.75kg




5 SR-No6 L=6.50 W=14.53 WT=72.64kg



5 SR-No6 L=7.30 W=16.32 WT=81.58kg

5 SR-No6 L=11.30 W=25.26 WT=126.28kg



** Gancho fuera de norma - comunicarse con SIDENAL

SIDERÚRGICA NACIONAL
SIDENAL S.A.


BOGOTA PBX 6151222 5205009 - 5205919 FAX: 6252955

Acero Colombiano
con Calidad Certificada
Acero sismo - resistente


SOGAMOSO PBX (8) 7723842 315-2537741 312-4801868 FAX: (8)7723843

VILLAVICENCIO
VILLAVICENCIO
ELEMENTO POR ELEMENTO


3 SR-No6 L=3.50 W=7.82 WT=23.47kg




1 SR-No7 L=3.60 W=10.65 WT=10.65kg




1 SR-No7 L=4.00 W=12.17 WT=12.17kg



238 SR-No3 L=0.74 W=0.41 WT=98.63kg




238 SR-No3 L=2.28 W=1.28 WT=303.84kg




S137 (Es 1) Peso/Elemento= 46.80Kg

4 SR-No5 L=5.40 W=8.38 WT=33.52kg




15 SR-No3 L=1.58 W=0.88 WT=13.27kg




RIOSTRAS (Es 1) Peso/Elemento= 6385.82Kg


55 SR-No5 L=12.00 W=18.62 WT=1024.32kg



160 SR-No3 L=0.77 W=0.43 WT=825.24kg



30 M-186 (2.35x6.10) W=43.06 WT=4736.26kg



** Gancho fuera de norma - comunicarse con SIDENAL

SIDERÚRGICA NACIONAL
SIDENAL S.A.

BOGOTA PBX 6151222 5205009 - 5205919 FAX: 6252955


Acero Colombiano con Calidad Certificada
Acero sismo - resistente

SOGAMOSO PBX (8) 7723842 315-2537741 312-4801868 FAX: (8)7723843

VILLAVICENCIO
VILLAVICENCIO
ELEMENTO POR ELEMENTO

MALLA SEISOTANO ET 2 (Es 1) Peso/Elemento= 5368.96Kg

120 M-188 (2.00x6.00) W=36.41 WT=4368.96kg AM_NEG L=50.00 W=50.00 WT=6000.00kg



ø1=6mm/.15
ø2=6mm/.15

PQ

PAQUETE
W=50.0 kg

SIDERÚRGICA NACIONAL
SIDENAL S.A.

BOGOTA PBX 6151222 5205009 - 5205919 FAX: 6252955

SOGAMOSO PBX (8) 7723842 315-2537741 312-4801868 FAX: (8) 7723843

Acero Colombiano con Calidad Certificada
Acero sismo - resistente

villavicencio
villavicencio
RESUMEN PEDIDO COMPLETO

RESUMEN DE PESOS BARRAS FIGURADAS

DIAMETRO	Fy (Mpa)	LONGITUD (m)	PESO (Kg)
SR-No8	420	1,585.50	6,299.2
SR-No7	420	594.00	1,806.9
SR-No6	420	111.60	249.4
SR-No5	420	506.00	785.3
SR-No4	420	471.00	468.2
SR-No3	420	2,459.70	1,377.4
		TOTAL BARRAS FIGURADAS	10,986.5

RESUMEN DE PESOS BARRAS ESTANDAR

DIAMETRO	Fy (Mpa)	LONGITUD (m)	CANTIDAD	PESO (Kg)
SR-No6	420	12.00	30.0	804.6
SR-No5	420	12.00	6.0	111.7
			TOTAL ESTANDAR	916.3

PESO TOTAL DEL PEDIDO = 11,902.8 Kg

SIDERÚRGICA NACIONAL
SIDENAL S.A.


BOGOTA PBX 6151222 5205009 - 5205919 FAX: 6252955

Acero Colombiano
con Calidad Certificada
Acero sismo - resistente


SOGAMOSO PBX (8) 7723842 315-2537741 312-4801868 FAX: (8)7723843

villavicencio
villavicencio
ELEMENTO POR ELEMENTO


p1 (Son 8) Peso/Elemento= 232.21Kg Peso 8 elementos=1857.72Kg




p2 (Son 2) Peso/Elemento= 172.87Kg Peso 2 elementos=345.75Kg




p3 (Son 8) Peso/Elemento= 391.97Kg Peso 8 elementos=3135.78Kg




p4 (Son 2) Peso/Elemento= 1172.71Kg Peso 2 elementos=2345.42Kg







p5 (Son 2) Peso/Elemento= 1268.70Kg Peso 2 elementos=2537.41Kg



p6 (Son 2) Peso/Elemento= 234.45Kg Peso 2 elementos=468.91Kg



viga riostra muro (Es 1) Peso/Elemento= 1052.51Kg



** Gancho fuera de norma - comunicarse con SIDENAL

SIDERÚRGICA NACIONAL
SIDENAL S.A.

Acero Colombiano
con Calidad Certificada
Acero sismo - resistente


BOGOTA PBX 6151222 5205009 - 5205919 FAX: 6252955

SOGAMOSO PBX (8) 7723842 315-2537741 312-4801868 FAX: (8)7723843


villavicencio
villavicencio
ELEMENTO POR ELEMENTO

sobre ancho cim eje 7 (Es 1) Peso/Elemento= 159.34Kg

6 SR-No5 L=12.00 W=18.62 WT=111.74kg



50 SR-No3 L=1.70 W=0.95 WT=47.60kg



SIDERÚRGICA NACIONAL
SIDENAL S.A.

BOGOTA PBX 6151222 5205009 - 5205919 FAX: 6252955

SOGAMOSO PBX (8) 7723842 315-2537741 312-4801868 FAX: (8) 7723843

Acero Colombiano con Calidad Certificada
Acero sismo - resistente

VILLAVICENCIO
META
RESUMEN PEDIDO COMPLETO

RESUMEN DE PESOS BARRAS FIGURADAS

DIAMETRO	Fy (Mpa)	LONGITUD (m)	PESO (Kg)
SR-No8	420	1,399.20	5,559.0
SR-No7	420	97.20	295.7
SR-No6	420	22.00	49.2
SR-No5	420	266.14	413.0
SR-No4	420	45.84	45.6
SR-No3	420	5,821.21	3,259.9
		TOTAL BARRAS FIGURADAS	9,622.4

RESUMEN DE PESOS BARRAS ESTANDAR

DIAMETRO	Fy (Mpa)	LONGITUD (m)	CANTIDAD	PESO (Kg)
SR-No7	420	12.00	6.0	219.0
SR-No6	420	12.00	6.0	160.9
SR-No5	420	12.00	6.0	111.7
			TOTAL ESTANDAR	491.6

PESO TOTAL DEL PEDIDO = 10,114.0 Kg

SIDERÚRGICA NACIONAL
SIDENAL S.A.

BOGOTA PBX 6151222 5205009 - 5205919 FAX: 6252955


Acero Colombiano con Calidad Certificada
Acero sismo - resistente

SOGAMOSO PBX (8) 7723842 315-2537741 312-4801868 FAX: (8)7723843


VILLAVICENCIO
META
ELEMENTO POR ELEMENTO

MURO TIPO 11 (Es 1) Peso/Elemento= 171.96Kg


14 SR-No5 L=5.05 W=7.84 WT=109.73kg




24 SR-No4 L=1.91 W=1.90 WT=45.56kg



4 SR-No5 L=1.91 W=2.96 WT=11.86kg




5 SR-No3 L=1.72 W=0.96 WT=4.82kg




S-138 (Es 1) Peso/Elemento= 65.16Kg

4 SR-No6 L=5.50 W=12.29 WT=49.17kg




17 SR-No3 L=1.68 W=0.94 WT=15.99kg




SOBREANCHO (Es 1) Peso/Elemento= 445.83Kg


149 SR-No3 L=1.85 W=1.04 WT=154.36kg




SR-No5 L=11.50 W=17.85 WT=107.09kg




SR-No5 L=5.50 W=8.54 WT=51.22kg



6 SR-No5 L=7.00 W=10.86 WT=65.18kg




6 SR-No5 L=7.30 W=11.33 WT=67.98kg




P7 (Es 1) Peso/Elemento= 6311.66Kg


264 SR-No8 L=5.30 W=21.08 WT=5559.02kg



SR-No3 L=2.80 W=1.57 WT=501.76kg




120 SR-No3 L=0.40 W=0.22 WT=250.38kg




P8 (Es 1) Peso/Elemento= 347.43Kg

72 SR-No7 L=1.35 W=4.11 WT=295.68kg




42 SR-No3 L=2.20 W=1.23 WT=51.74kg




AJUSTE FLEJES COLUMNAS (Es 1) Peso/Elemento= 2007.04Kg


100 SR-No3 L=3.52 W=1.97 WT=197.12kg




00 SR-No3 L=1.36 W=0.76 WT=304.64kg



000 SR-No3 L=0.76 W=0.43 WT=425.60kg



00 SR-No3 L=3.92 W=2.20 WT=219.52kg



** Gancho fuera de norma - comunicarse con SIDENAL


SIDERÚRGICA NACIONAL
SIDENAL S.A.

Acero Colombiano con Calidad Certificada
Acero sismo - resistente


BOGOTA PBX 6151222 5205009 - 5205919 FAX: 6252955 SOGAMOSO PBX (8) 7723842 315-2537741 312-4801868 FAX: (8)7723843

VILLAVICENCIO
META
ELEMENTO POR ELEMENTO

1200 SR-No3 L=0.76 W=0.43 WT=510.72kg




200 SR-No3 L=1.56 W=0.87 WT=349.44kg




BANCO (Es 1) Peso/Elemento= 491.69Kg


6 SR-No5 L=12.00 W=18.62 WT=111.72kg



SR-No6 L=12.00 W=26.82 WT=160.92kg




SR-No7 L=12.00 W=36.50 WT=219.02kg



FLEJES DETALLE 1 (Es 1) Peso/Elemento= 273.28Kg

200 SR-No3 L=2.44 W=1.37 WT=273.28kg



CONTRATO N°	511 DE 2023	PROYECTO N°	2021005500331
FECHA DE INICIÓ:	12/12/2023	FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL:	11/03/2025
OBJETO PROYECTO:	"AMPLIACIÓN DE LA CAPACIDAD INSTALADA DEL HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE VILLAVICENCIO ESE - META".		
CONTRATISTA :	CONSORCIO HOSPITAL 002 RL DANIEL ALEJANDRO ENGATIVA RODRIGUEZ NIT: 901752517-0		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	572 DE 2023		
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTER HOSPITAL RL : EDWIN FABIAN HENAO CAMARGO. NIT: 901755332-9		

ACTA:	ACTA DE PAGO PARCIAL No. 2
CAPITULO:	COMPONENTE ARQUITECTONICO

N° ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
2,4,2	**MALLA ELECTROSOLDADA FY=5000 KG/CM2, 500 MPA. FIGURADO, ARMADO, COLOCACIÓN Y AMARRE. SUMINISTRO E INSTALACIÓN**	KG

DESCRIPCIÓN			DIMENSIONES				
			AREA (M2)	CANTIDAD EFECTIVA(UN)	PESO (KGxUN)	CANTIDAD (UN)	TOTAL (KG)
ELEMENTO	EJES PLACA						
PLACA SEMISOTANO	3-4	D-H	154.37	32.00	42.20	1.00	1,350.40
PLACA SEMISOTANO	3-2	D-H	136.52	25.00	42.20	1.00	1,055.00
PLACA SEMISOTANO	5-7	A-D	149.71	27.00	42.20	1.00	1,139.40
PLACA SEMISOTANO	1-5	A-D	157.89	26	42.20	1.00	1,097.20
PASAN:		-				SUBTOTAL	4,642.00
						TOTAL	4,642.00

Firma
Nombre: JUAN CARLOS RODRIGUEZ SANCHEZ
DIRECTOR DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 2570062356 CND

Firma
Nombre: CESAR ASHLEY MORA BARNEY
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 25202-214496 CND

Firma
Nombre: ROBERTO HERNAN HURTADO ROBLEDO
RESIDENTE DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 17202-51811 CDS

Firma
Nombre: ALONSO QUINTERO PEÑARANDA
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
N° Mat. Profesional: 25700-25724 CND

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

1963

CONTRATO N°	511 DE 2023	PROYECTO N°	2021005500331
FECHA DE INICIÓ:	12/12/2023	FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL:	11/03/2025
OBJETO PROYECTO:	"AMPLIACIÓN DE LA CAPACIDAD INSTALADA DEL HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE VILLAVICENCIO ESE - META".		
CONTRATISTA :	CONSORCIO HOSPITAL 002 RL DANIEL ALEJANDRO ENGATIVA RODRIGUEZ NIT: 901752517-0		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	572 DE 2023		
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTER HOSPITAL RL : EDWIN FABIAN HENAO CAMARGO. NIT: 901755332-9		

ACTA:	ACTA DE PAGO PARCIAL No. 2	
CAPITULO:	COMPONENTE ARQUITECTONICO	
N° ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
2,4,2	**MALLA ELECTROSOLDADA FY=5000 KG/CM2, 500 MPA. FIGURADO, ARMADO, COLOCACIÓN Y AMARRE. SUMINISTRO E INSTALACIÓN**	**KG**

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA





INFORME DE OBRA
112-ECP-FR-013

INFORME DE OBRA PARCIAL No. 03

CONTRATO N°	511 DE 2023	PROYECTO N°	2021005500331

Periodo de 28/09/2024 a 31/10/2024
Fecha de Presentación: 15/11/2024

INFORMACIÓN BÁSICA	
OBJETO CONTRATO:	AMPLIACIÓN DE LA CAPACIDAD INSTALADA DEL HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE VILLAVICENCIO ESE - META
VALOR DEL CONTRATO OBRA:	$ 80.389.497.271,00
VALOR ADICIONAL CONTRATO DE OBRA:	$0,00
VALOR ACTUALIZADO CONTRATO DE OBRA:	$ 80.389.497.271,00
OBJETO PROYECTO BPIN 2021005500331:	AMPLIACIÓN DE LA CAPACIDAD INSTALADA DEL HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE VILLAVICENCIO ESE - META
VALOR DEL PROYECTO BPIN 2021005500331:	$ 84.208.944.899,00
VALOR ADICIONAL DEL PROYECTO:	$0,00
VALOR ACTUALIZADO DEL PROYECTO:	$ 84.208.944.899,00
CONTRATISTA:	CONSORCIO HOSPITAL 002 NIT. 901.752.517-0 RL. Daniel Alejandro Engativá Rodríguez
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	572 DE 2023
CORREO ELECTRÓNICO:	consorcio.hospital@cyg.com.co
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTER HOSPITAL RL. Edwin Fabian Henao Camargo
CORREO ELECTRÓNICO:	coninterhospital2023@gmail.com

TIEMPO DE EJECUCIÓN ACTUAL DEL PROYECTO			
FECHA DE INICIACIÓN:			12/12/2023
PRORROGA:			N.A.
SUSPENSIÓN:			N.A.
TIEMPO:			QUINCE (15) MESES
REINICIO:			N.A.
FECHA DE TERMINACIÓN			11/03/2025
15	Meses	0	Días

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1 - Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

INFORME DE OBRA PARCIAL No. 03

CONTRATO N°	511 DE 2023	PROYECTO N°	2021005500331

LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA DEL PROYECTO

MUNICIPIO:	VILLAVICENCIO	VEREDA:	N.A.
CORREGIMIENTO:	N.A.	BARRIO:	BARZAL ALTO
COMUNA:	2	DIRECCIÓN:	Calle 37 No 42-34
COORDENADAS GEOGRÁFICAS:	Norte: 4° 8'42.06" / Oeste: 73°38'38.05"		

MAPA DE LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA DEL PROYECTO

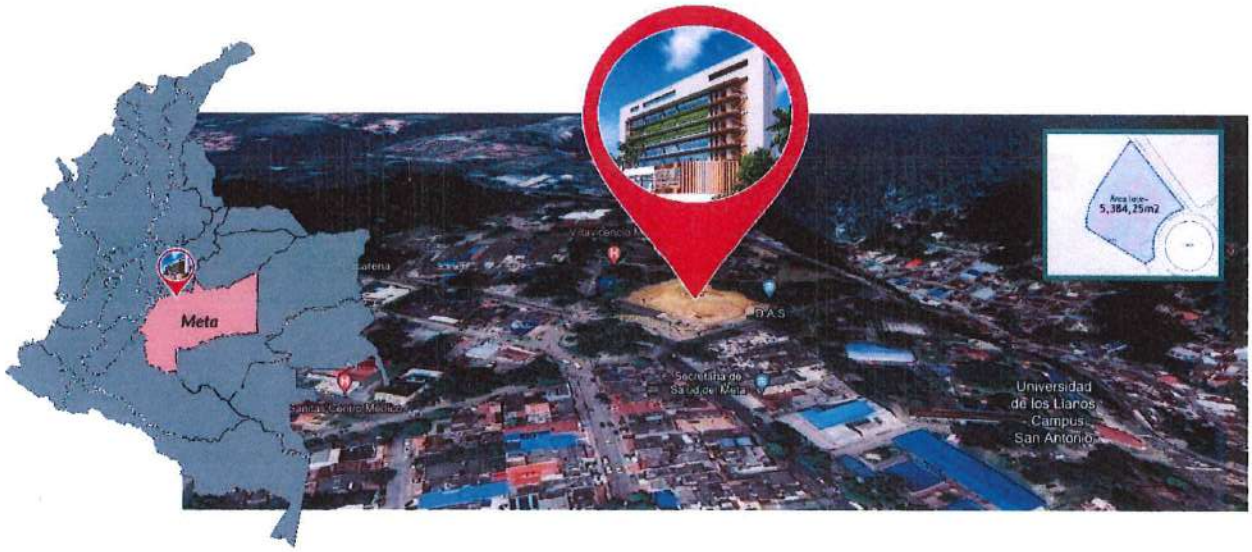


Ilustración 1. Localización general proyecto

A. INFORME TÉCNICO

1. CONTROL PROGRAMACIÓN Y AVANCE DE OBRA

Avance físico


PARCIAL	REPROGRAMADO		PARCIAL	
	ACUMULADO		ACUMULADO	
3	12,68%	$10.191.786.715,71	9,99%	$ 8.027.681.011,00

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1 - Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

INFORME DE OBRA PARCIAL No. 03

CONTRATO N°	511 DE 2023	PROYECTO N°	2021005500331

Grafica Avance Físico

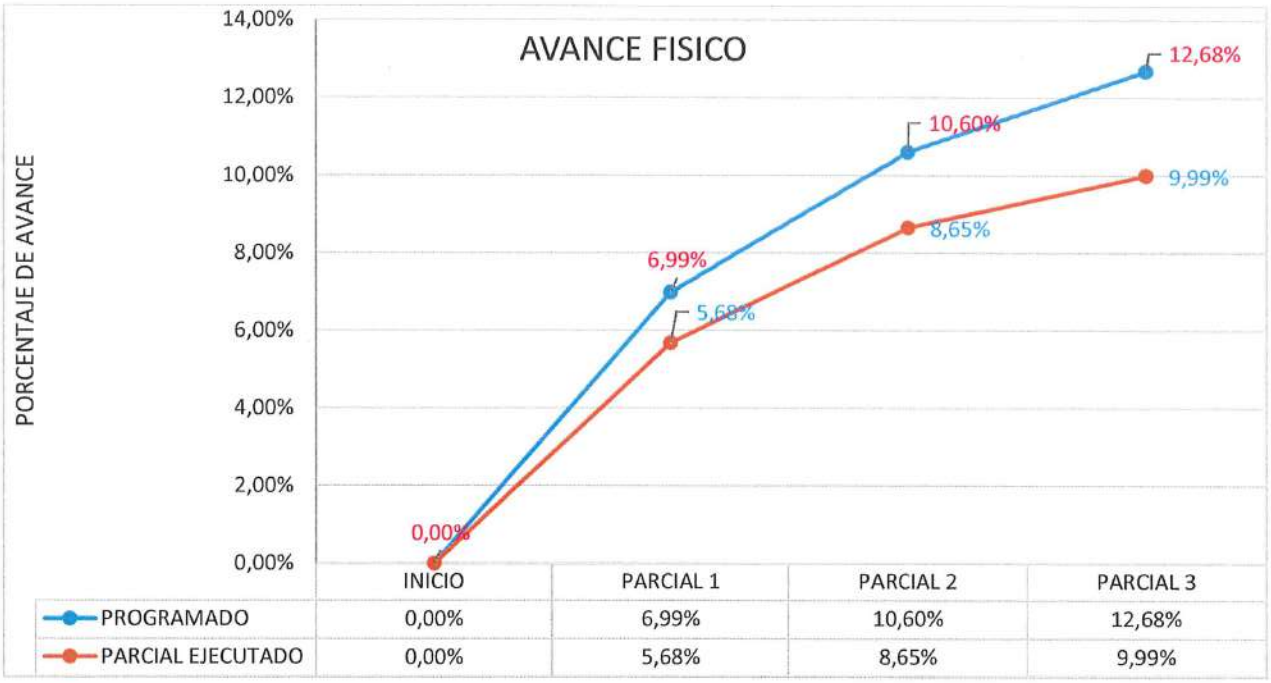

	INICIO	PARCIAL 1	PARCIAL 2	PARCIAL 3
PROGRAMADO	0,00%	6,99%	10,60%	12,68%
PARCIAL EJECUTADO	0,00%	5,68%	8,65%	9,99%

Nota: las cantidades objeto de cobro de la presente acta parcial, se encuentran como anexo 1 al presente informe

2. GESTIÓN TÉCNICA Y DOCUMENTAL

Oficios y documentos elaborados por el contrato de obra sobre el desarrollo de los proyectos. Comités realizados, solicitudes comunidad, entidades, temas varios e Informes presentados.

Periodo: 1 de septiembre de 2024 al 30 de septiembre de 2024

CORRESPONDENCIA RECIBIDA

FECHA OFICIO	REFERENCIA - RADICADO	ASUNTO	QUIEN ELABORA	QUIEN RECIBE
2/09/2024	OF-CO-511-2024-224	REITERACION SOLICITUD INFORME MENSUAL AGOSTO, REPROGRAMACION Y AJUSTE MODIFICACION 2.	CONSORCIO INTER HOSPITAL	CONSORCIO HOSPITAL 002

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1 - Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

INFORME DE OBRA PARCIAL No. 03

CONTRATO N°	511 DE 2023	PROYECTO N°	2021005500331

FECHA OFICIO	REFERENCIA - RADICADO	ASUNTO	QUIEN ELABORA	QUIEN RECIBE
2/09/2024	OF-CO-511-2024-225	SOLICITUD ESTADO DEL ENSAYO PARA VERIFICAR POSIBLES VACIOS INTERNOS EN ELEMENTO ESTRUCTURAL	CONSORCIO INTER HOSPITAL	CONSORCIO HOSPITAL 002
4/09/2024	OF-CO-511-2024-226	DEVOLUCION DE INFORME AGOSTO PARA AJUSTE	CONSORCIO INTER HOSPITAL	CONSORCIO HOSPITAL 002
5/09/2024	OF-CO-511-2024-227	RECOMENDACIONES PARA VISITA A OBRA DE DOS UNIVERSIDADES, SEGÚN COMPROMISOS ADQUIRIDOS PREVIAMENTE	CONSORCIO INTER HOSPITAL	CONSORCIO HOSPITAL 002
12/09/2024	OF-CO-511-2024-229	SOLICITUD REQUISITOS DE RETIRO DE PERSONAL	CONSORCIO INTER HOSPITAL	CONSORCIO HOSPITAL 002

Tabla No. 1. Correspondencia recibida mes de septiembre de 2024.

CORRESPONDENCIA ENVIADA

FECHA OFICIO	REFERENCIA - RADICADO	ASUNTO	QUIEN ELABORA	QUIEN RECIBE
8/09/2024	CE-205-125-107	ENTREGA REPROGRAMACION OBRA MODIFICACION 02	CONSORCIO HOSPITAL 002	CONSORCIO INTERHOSPITAL
5/09/2024	CE-205-12-130	ENTREGA DE MEDIDOR PARA AGUA ULTRASONICO MARCA BOVE 1" - ENVIADO POR GARANTIA	CONSORCIO HOSPITAL 002	EEAAV
23/09/2024	CE-205-127-141	SOLICITUD DE LEGALIZACION DEL SERVICIO ELECTRICO DEL PROYECTO - ORIGEN DE LOS RECURSOS	CONSORCIO HOSPITAL 002	EMSA S.A. ESP
23/09/2024	CE-205-127-142	SOLICITUD DE LEGALIZACION DEL SERVICIO ELECTRICO DEL PROYECTO - SOLICITUD DE UTILIZACION	CONSORCIO HOSPITAL 002	EMSA S.A. ESP
26/09/2024	CE-205-125-146	ENTREGA APU MOD 03 ESTRUCTURALES	CONSORCIO HOSPITAL 002	INTERVENTORIA
26/09/2024	CE-205-124-147	PROCEDIMIENTO DE CONECTORES MECANICOS	CONSORCIO HOSPITAL 002	INTERVENTORIA
26/09/2024	CE-205-124-148	RADICACION ACTUALIZACION DE POLIZAS MODIFICACION No. 2	CONSORCIO HOSPITAL 002	AIM
26/09/2024	CE-205-125-149	ENTREGA MEMORIAS DE CALCULO ACTA No.2	CONSORCIO HOSPITAL 002	INTERVENTORIA
28/09/2024	CE-205-125-150	RESPUESTA OFICIO OF-CO-511-2024-232 ENTREGA DE	CONSORCIO HOSPITAL 002	INTERVENTORIA

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1 - Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

INFORME DE OBRA PARCIAL No. 03

CONTRATO N°	511 DE 2023	PROYECTO N°	2021005500331

FECHA OFICIO	REFERENCIA - RADICADO	ASUNTO	QUIEN ELABORA	QUIEN RECIBE
		DETALLE AJUSTE PLACA DE ENTREPISO EN PISO No.1		
30/09/2024	CE-205-125-151	ENTREGA REPROGRAMACION DE OBRA SEGUN MODIFICACION 02	CONSORCIO HOSPITAL 002	INTERVENTORIA

Tabla No. 2. Correspondencia enviada mes de septiembre de 2024.

Periodo: 01 al 31 de octubre de 2024

CORRESPONDENCIA RECIBIDA

FECHA OFICIO	REFERENCIA - RADICADO	ASUNTO	QUIEN ELABORA	QUIEN RECIBE
01/10/2024	OF-CO-511-2024-235	DEVOLUCION DE INFORME MES DE AGOSTO 2024	Consorcio Inter Hospital	Consorcio Hospital 002
01/10/2024	OF-CO-511-2024-236	REFUERZO ADICIONAL PARA PLACAS DE ANCLAJE	Consorcio Inter Hospital	Consorcio Hospital 002
04/10/2024	OF-CO-511-2024-237	SOLICITUD MERODO DE CORTE ACEROS Y DISTANCIA PARA LOS ANCLAJES	Consorcio Inter Hospital	Consorcio Hospital 002
07/10/2024	OF-CO-511-2024-238	VISITA A OBRA POR PARTE DE ESTUDIANTES	Consorcio Inter Hospital	Consorcio Hospital 002
07/10/2024	OF-CO-511-2024-239	SOLICITUD PROGRAMACION QUINCENAL, INFORME MENSUAL DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE	Consorcio Inter Hospital	Consorcio Hospital 002
07/10/2024	OF-CO-511-2024-240	OBSERVACIONES CON RELACIÓN A INUNDACIÓN DE SÓTANO POR AGUAS LLUVIAS Y UBICACIÓN DE CAMPAMENTOS DE PERSONAL SUBCONTRATISTA DE OBRA.	Consorcio Inter Hospital	Consorcio Hospital 002
09/10/2024	OF-CO-511-2024-241	OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES DE ACCIDENTE DE TRABAJO OCURRIDO EL DIA 06 DE OCTUBRE DE 2024	Consorcio Inter Hospital	Consorcio Hospital 002
16/10/2024	OF-CO-511-2024-245	RESPUESTA A OFICIO CE – 205- 125- 159 DEL 09 DE OCTUBRE DE 2024	Consorcio Inter Hospital	Consorcio Hospital 002

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1 - Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

INFORME DE OBRA PARCIAL No. 03

CONTRATO N°	511 DE 2023	PROYECTO N°	2021005500331

FECHA OFICIO	REFERENCIA - RADICADO	ASUNTO	QUIEN ELABORA	QUIEN RECIBE
18/10/2024	OF-CO-511-2024-246	CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES CONTRACTUALES Y PENDIENTES ADMINISTRATIVOS	Consorcio Inter Hospital	Consorcio Hospital 002
22/10/2024	OF-CO-511-2024-247	SOLICITUD DE REPORTE DE LA IMPLEMENTACION DEL PROGRAMA DE MANEJO DE RCO A LA AUTORIDAD AMBIENTAL	Consorcio Inter Hospital	Consorcio Hospital 002
22/10/2024	OF-CO-511-2024-251	COMITÉ SEGUIMIENTO DE OBRA	Consorcio Inter Hospital	Consorcio Hospital 002
26/10/2024	OF-CO-511-2024-252	SOLICITUD PLAN DE CONTINGENCIA	Consorcio Inter Hospital	Consorcio Hospital 002

Tabla No. 3. Correspondencia recibida mes de octubre de 2024.

CORRESPONDENCIA ENVIADA

FECHA OFICIO	REFERENCIA – RADICADO	ASUNTO	QUIEN ELABORA	QUIEN RECIBE
09/10/2024	CE-205-125-156	RESPUESTA OFICIO OF-CO-511-2024-236 REFUERZO ADICIONAL PARA PLACAS DE ANCLAJE.	CONSORCIO HOSPITAL 002	Consorcio Interhospital
09/10/2024	CE-205-125-157	RESPUESTA OFICIO OF-CO-511-2024-237 SOLICITUD METODO DE CORTE	CONSORCIO HOSPITAL 002	INTERVENTORIA
10/10/2024	09/10/2024	RESPUESTA OFICIO UNIVERSIDAD SANTO TOMAS DE VILLAVICENCIO	CONSORCIO HOSPITAL 002	INTERVENTORIA
09/10/2024	CE-205-125-159	RESPUESTA OFICIO OF-CO-511-2024-240 OBSERVACIONES CAMPAMENTO PERSONAL OBRA.	CONSORCIO HOSPITAL 002	INTERVENTORIA
12/10/2024	CE-205-125-160	RESPUESTA OFICIO OF-CO-511-2024-239 SOLICTUD PROGRAMACION QUINCENAL, INFORME MENSUAL DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE	CONSORCIO HOSPITAL 002	INTERVENTORIA
16/10/2024	CE-205-125-161	RESPUESTA OFICIO OF-CO-511-2024-242 MEDIDAS DE CONTINGENCIA POR TEMPORADA DE LLUVIAS	CONSORCIO HOSPITAL 002	INTERVENTORIA
21/10/2024	CE-205-125-162	ACTA PARCIAL No. 2	CONSORCIO HOSPITAL 002	INTERVENTORIA
22/10/2024	CE-205-125-163	LLAMADO DE ATENCION N. 1	CONSORCIO HOSPITAL 002	NESTOR HERNANDEZ

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1 - Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

INFORME DE OBRA PARCIAL No. 03

CONTRATO N°	511 DE 2023	PROYECTO N°	2021005500331

FECHA OFICIO	REFERENCIA – RADICADO	ASUNTO	QUIEN ELABORA	QUIEN RECIBE
23/10/2024	CE-205-125-164	RESPUESTA OBSERVACIONES APU COMPONENTE HIDROLOGICO	CONSORCIO HOSPITAL 002	INTERVENTORIA
24/10/2024	CE-205-125-165	IMPLEMENTACION PMT	CONSORCIO HOSPITAL 002	MOVILIDAD
24/10/2024	CE-205-125-166	RESPUESTA OFICIO OF-CO-511-2024-245 REUBICACION DE CAMPAMENTOS PERSONAL OPERATIVO	CONSORCIO HOSPITAL 002	INTERVENTORIA
24/10/2024	CE-205-125-167	PRORROGA PMT	CONSORCIO HOSPITAL 002	MOVILIDAD
25/10/2024	CE-205-125-168	RESPUESTA NOTA DE CAMPO DE 24 DE OCTUBRE DE 2024	CONSORCIO HOSPITAL 002	INETERVENTORIA

Tabla No. 4. Correspondencia enviada mes de octubre de 2024.

3. PROBLEMAS PRESENTADOS Y MECANISMOS DE SOLUCIÓN PROPUESTOS

Actividad normal de obra sin ningún tipo de afectación

4. ESTADO DEL TIEMPO

Frecuencia

ESTADO	Septiembre/24	Octubre/24
	N° DE DÍAS	N° DE DÍAS
NUBLADO	22	10
TORMENTA	0	1
LLUVIOSO	2	16
SOLEADO	6	3

OBSERVACIONES:
Villavicencio presenta una notable variación en la probabilidad de días mojados a lo largo del año, definidos como aquellos con al menos 1 milímetro de precipitación.

- **Temporada más mojada**: Dura 8.6 meses, del 18 de marzo al 6 de diciembre, con una probabilidad de más del 43% de días mojados.
- **Mes más lluvioso**: Mayo, con un promedio de 21.7 días mojados.
- **Temporada más seca**: Dura 3.4 meses, del 6 de diciembre al 18 de marzo.
- **Mes menos lluvioso**: Enero, con un promedio de 5.4 días mojados.

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1 - Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

INFORME DE OBRA PARCIAL No. 03

CONTRATO N°	511 DE 2023	PROYECTO N°	2021005500331

Fuente: https://es.weatherspark.com/y/24273/Clima-promedio-en-Villavicencio-Colombia-durante-todo-el-a%C3%B1o

B. CUMPLIMIENTO DE PLANES Y ESPECIFICACIONES

1. PROCESO CONSTRUCTIVO

1,2 DESMONTE Y DEMOLICIONES

- 1,2,1 *DEMOLICION MECÁNICA ANDENES, PLACAS, SARDINELES EN CONCRETO REFORZADO. INCLUYE TRASIEGO Y CARGUE MANUAL:* La actividad comprende demolición de andenes, placas y sardineles en concreto, incluye trasiego y cargue manual, con los materiales, mano de obra y equipos necesarios para la correcta ejecución. Esta actividad se ejecutó siguiendo las normas vigentes, especificaciones técnicas y teniendo en cuenta los planos, memorias de cálculo, reglamentos técnicos del proyecto específicos.

- 1,2,3 *DEMOLICION CIMIENTO ENTERRADO. INCLUYE TRASIEGO Y CARGUE MANUAL:* La actividad comprende demolición de cimientos enterrados, incluye trasiego y cargue manual, con los materiales, mano de obra y equipos necesarios para la correcta ejecución. Esta actividad se ejecutó siguiendo las normas vigentes, especificaciones técnicas y teniendo en cuenta los planos, memorias de cálculo, reglamentos técnicos del proyecto específicos.

- 1,2,4 *DEMOLICION MANUAL MURO DIVISORIO BLOQUE DE ARCILLA. INCLUYE TRASIEGO Y CARGUE MANUAL:* La actividad comprende demolición de muros en bloque de arcilla, incluye trasiego y cargue manual, con los materiales, mano de obra y equipos necesarios para la correcta ejecución. Esta actividad se ejecutó siguiendo las normas vigentes, especificaciones técnicas y teniendo en cuenta los planos, memorias de cálculo, reglamentos técnicos del proyecto específicos.

- 1,2,5 *DEMOLICIÓN CONCRETO REFORZADO. INCLUYE TRASIEGO Y CARGUE MANUAL:* La actividad comprende demolición de concreto reforzado, incluye trasiego y cargue manual, con los materiales, mano de obra y equipos necesarios para la correcta ejecución. Esta actividad se ejecutó siguiendo las normas vigentes, especificaciones técnicas y teniendo en cuenta los planos, memorias de cálculo, reglamentos técnicos del proyecto específicos.

- 1,2,6 *DEMOLICION CONCRETO CICLÓPEO. INCLUYE TRASIEGO Y CARGUE MANUAL:* La actividad comprende demolición de concreto ciclópeo, incluye trasiego y cargue manual, con los materiales, mano de obra y equipos necesarios para la correcta

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1 - Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

ejecución. Esta actividad se ejecutó siguiendo las normas vigentes, especificaciones técnicas y teniendo en cuenta los planos, memorias de cálculo, reglamentos técnicos del proyecto específicos.

- 1,2,7 *DESMONTE DE ESTRUCTURA METALICA DE CUBIERTA. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO:* La actividad comprende el desmonte de la estructura metálica de cubierta existente dentro del predio, que impidan la ejecución de obras o que no estén contempladas en el área a intervenir, incluye trasiego y cargue manual, con los materiales, mano de obra y equipos necesarios para la correcta ejecución. Esta actividad se ejecutó siguiendo las normas vigentes, especificaciones técnicas y teniendo en cuenta los planos, memorias de cálculo, reglamentos técnicos del proyecto específicos.

- 1,2,8 *DESMONTE DE TEJA ASBESTO CEMENTO. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO:* La actividad comprende el desmonte de teja de asbesto cemento existentes ubicado en el lugar de las obras, que impidan la ejecución de obras o que no estén contempladas en el área a intervenir, incluye trasiego y cargue manual, con los materiales, mano de obra y equipos necesarios para la correcta ejecución. Esta actividad se ejecutó siguiendo las normas vigentes, especificaciones técnicas y teniendo en cuenta los planos, memorias de cálculo, reglamentos técnicos del proyecto específicos.

- 1,2,10 *DESMONTE DE MARCO Y PUERTA. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO:* La actividad comprende el desmonte de estructura de marco, puerta dentro del predio, que impidan la ejecución de obras o que no estén contempladas en el área a intervenir, incluye trasiego y cargue manual, con los materiales, mano de obra y equipos necesarios para la correcta ejecución. Esta actividad se ejecutó siguiendo las normas vigentes, especificaciones técnicas y teniendo en cuenta los planos, memorias de cálculo, reglamentos técnicos del proyecto específicos.

- 1,2,11 *DESMONTE DE VENTANERÍA ALUMINIO. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO:* La actividad comprende el desmonte de estructura de marco, ventana e incluye vidrio dentro del predio, que impidan la ejecución de obras o que no estén contempladas en el área a intervenir, incluye trasiego y cargue manual, con los materiales, mano de obra y equipos necesarios para la correcta ejecución. Esta actividad se ejecutó siguiendo las normas vigentes, especificaciones técnicas y teniendo en cuenta los planos, memorias de cálculo, reglamentos técnicos del proyecto específicos.

- 1,2,18 *DESMONTE DE CIELO RASO EN LAMINA LIVIANA. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO:* La actividad comprende el desmonte de cielo raso dentro del predio, que impidan la ejecución de obras o que no estén contempladas en el área a intervenir, incluye trasiego y cargue manual, con los materiales,

GOBERNACIÓN DEL META
Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1 - Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

mano de obra y equipos necesarios para la correcta ejecución. Esta actividad se ejecutó siguiendo las normas vigentes, especificaciones técnicas y teniendo en cuenta los planos, memorias de cálculo, reglamentos técnicos del proyecto específicos.

1,3 EXCAVACIONES Y RELLENOS

- *1,3,2 EXCAVACION MANUAL EN CONGLOMERADO H= 0 - 2.00 M INCLUYE CARGUE:* Se entiende por conglomerado los materiales de características tales que para su extracción sea necesaria la utilización, además de picas y garlanchas, de otras herramientas manuales como palancas, cuñas o equipos mecánicos. Dentro de esta clasificación se encuentran: la arcilla muy dura, peñón, la grava cementada, las piedras sueltas y cantos rodados de diámetro entre 0.15 y 0.40 m, la roca blanda o desintegrada y la pizarra. Una vez localizados los elementos que conforman la cimentación (vigas y zapatas), se procede a ejecutar la actividad, asegurando la zona y verificando los niveles establecidos en los planos del proyecto. Esta actividad se ejecutó siguiendo las normas vigentes, especificaciones técnicas y teniendo en cuenta los planos del proyecto específico.

- *N.P.P.P.1,3,4 TRANSPORTE DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS Y SOBRANTES:* La actividad consiste únicamente en transportar material sobrante de excavación desde el proyecto en ejecución hasta el lugar designado para la disposición final de los mismos, ya sea, escombrera, relleno o el que dispongan las autoridades ambientales y la interventoría. Se ejecutó siguiendo las normas vigentes, especificaciones técnicas de fabricantes de materiales y equipos, y teniendo en cuenta los planos del proyecto específico.

- *N.P.1,3,5 DISPOSICION FINAL DE MATERIAL DE EXCAVACION SITIO AUTORIZADO (NO INCLUYE TRANSPORTE):* Esta actividad consiste en la autorización del descargue del material sobrante de excavación de la obra en el sitio autorizado por la entidad contratante.

2,3 CONCRETOS

- *2,3,5 TORRES, ESTRUCTURAS ESBELTAS EN CONCRETO 34.5 MPa (5000 PSI) SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN:* Esta actividad contempla la construcción de los muros pantalla definidos en el diseño estructural, para el cual después de realizada la localización, excavación e instalación y verificación del acero de refuerzo, se procede a la instalación de la formaleta metálica, respetando los recubrimientos mínimos establecidos en la norma NSR-10 y verificando los niveles, espesores y plomos definidos en el diseño estructural. Posterior a esto se realiza el vaciado del concreto especificado en el diseño hasta el nivel de la cota superior del muro, el cual es especificado y verificado previamente en el plano, realizando el correcto vibrado para eliminar las burbujas de aire atrapadas dentro del concreto y garantizar su correcta compactación y fundición. Después de realizar el vaciado de la estructura, es importante verificar el cumplimiento del nivel de vaciado de concreto

respecto al nivel referente. La estructura puede desencofrarse un día después del vaciado, haciendo posible la conservación de la formaleta metálica que se haya utilizado, las cuales se deben limpiar para ser reutilizadas posteriormente. En último término se efectúa el curado en toda la superficie expuesta mediante riego de agua por un período de 7 días. El curado se realiza de inmediato para impedir así la formación de fisuras de retracción plástica frente a la pérdida de humedad. Esta actividad se ejecutó siguiendo las normas vigentes, especificaciones técnicas y teniendo en cuenta los planos, memorias de cálculo, reglamentos técnicos del proyecto específicos

- *N.P.2,3,10 PLACA DE ENTREPISO ALIGERADA E= 0.60 M EN CONCRETO 35 MPa (5000 PSI) PREMEZCLADO CON CASETÓN RECUPERABLE. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN (losa superior=0,10m):* Esta actividad contempla el armado y fundición de las placas de entrepiso aligeradas definidas en el diseño estructural, para el cual después de realizada la localización, se procede a realizar el encofrado con formaleta metálica, verificando que todo el encofrado se encuentre nivelado y a su vez se debe humectar con ACPM para facilitar el desmontaje del equipo. Una vez instalado y verificado el acero de refuerzo de las vigas y riostras, se procede a la instalación del casetón recuperable y a la instalación de la malla de refuerzo y las redes requeridas en las áreas a construir. Posterior a esto se realiza el vaciado del concreto especificado en el diseño verificando el espesor del concreto durante el vaciado de la losa mediante el reglado para ir nivelando cada sector, esta acción es realizada con una boquillera o codal metálico, realizando el correcto vibrado para eliminar las burbujas de aire atrapadas dentro del concreto y garantizar su correcta compactación y fundición. Después de realizar el vaciado de la estructura, es importante verificar el cumplimiento del nivel de vaciado de concreto respecto al nivel referente. Durante los próximos 7 días después del vaciado de concreto en la losa se debe realizar el curado. Este proceso consiste en regar con agua la placa manteniéndola húmeda, evitando que se formen grietas y fisuras y ayuda a que el concreto alcance la resistencia especificada. La estructura puede desencofrarse 15 días después del vaciado, haciendo posible la conservación del equipo de armado para el encofrado de la losa, las cuales se deben limpiar para ser reutilizadas posteriormente. Esta actividad se ejecutó siguiendo las normas vigentes, especificaciones técnicas y teniendo en cuenta los planos, memorias de cálculo, reglamentos técnicos del proyecto específicos.

- *N.P.2,3,15 SOLADO, LIMPIEZA EN CONCRETO 13.8 MPa (2000 PSI):* Esta actividad contempla la instalación de concreto de limpieza para todos los elementos de cimentación definidos en el diseño. El proceso constructivo del concreto de limpieza comienza con la preparación de la base, asegurando que esté libre de suciedad y nivelada. Se instalan bordes o moldes para contener el concreto. Luego, se mezcla el concreto con las proporciones adecuadas de cemento, arena, grava y agua, y se vierte sobre la base, distribuyéndolo uniformemente. Se utiliza una regla o llana para nivelar la superficie. Finalmente, se deja curar el concreto durante el tiempo recomendado, evitando el tráfico hasta que alcance la resistencia adecuada. Esta actividad se ejecutó siguiendo las normas

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1 - Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

vigentes, especificaciones técnicas y teniendo en cuenta los planos, memorias de cálculo, reglamentos técnicos del proyecto específicos

- *N.P.2,3,22 COLUMNA EN CONCRETO 34.5 MPa (5000 PSI) PREMEZCLADO. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN:* Esta actividad contempla el armado y fundición de las columnas en concreto definidas en el diseño estructural, para las cuales después de realizada la localización se procede a realizar la instalación y verificación el acero de refuerzo. Posterior a esto se procede a la instalación de la formaleta metálica garantizando los recubrimientos mínimos establecidos en la norma NSR-10 y verificando los plomos y niveles requeridos. Posterior a esto se realiza el vaciado del concreto especificado en el diseño hasta la cota superior de la columna definida en los planos, realizando el correcto vibrado para eliminar las burbujas de aire atrapadas dentro del concreto y garantizar su correcta compactación y fundición. Después de realizar el vaciado de la estructura, es importante verificar el cumplimiento del nivel de vaciado de concreto respecto al nivel referente y los plomos del elemento. La estructura puede desencofrarse un día después del vaciado, haciendo posible la conservación de la formaleta metálica que se haya utilizado, las cuales se deben limpiar para ser reutilizadas posteriormente. En último término se efectúa el curado en toda la superficie expuesta mediante la protección de la columna con vinipel durante un período de 7 días. El curado se realiza de inmediato para impedir así la formación de fisuras de retracción plástica frente a la pérdida de humedad. Esta actividad se ejecutó siguiendo las normas vigentes, especificaciones técnicas y teniendo en cuenta los planos, memorias de cálculo, reglamentos técnicos del proyecto específicos.

- *N.P.2,3,23 VÍGA AÉREA EN CONCRETO 34.5 MPa (5000 PSI) PREMEZCLADO. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN:* Esta actividad contempla el armado y fundición de las vigas en concreto definidas en el diseño estructural, para las cuales después de realizada la localización se procede a realizar la instalación y verificación el acero de refuerzo. Posterior a esto se procede a la instalación de la formaleta metálica garantizando los recubrimientos mínimos establecidos en la norma NSR-10 y verificando los plomos y niveles requeridos. Posterior a esto se realiza el vaciado del concreto especificado en el diseño hasta la cota superior de la viga definida en los planos, realizando el correcto vibrado para eliminar las burbujas de aire atrapadas dentro del concreto y garantizar su correcta compactación y fundición. Después de realizar el vaciado de la estructura, es importante verificar el cumplimiento del nivel de vaciado de concreto respecto al nivel referente y los plomos del elemento. La estructura puede desencofrarse un día después del vaciado, haciendo posible la conservación de la formaleta metálica que se haya utilizado, las cuales se deben limpiar para ser reutilizadas posteriormente. Durante los próximos 7 días después del vaciado de concreto se debe realizar el curado. El curado se realiza de inmediato para impedir así la formación de fisuras de retracción plástica frente a la pérdida de humedad. Esta actividad se ejecutó siguiendo las normas vigentes, especificaciones técnicas y teniendo en cuenta los planos, memorias de cálculo, reglamentos técnicos del proyecto específicos.

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1 - Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

CONTRATO N°	511 DE 2023	PROYECTO N°	2021005500331

2,4 ACERO DE REFUERZO

- *2,4,1 ACERO DE REFUERZO FY=4200 MPa (4200 KG/CM2, G60) INCLUYE SUMINISTRO, FIGURADO, ARMADO, COLOCACIÓN Y AMARRE:* La actividad comprende el suministro, transporte, almacenamiento, corte, doblamiento y colocación de barras de acero en estructuras de concreto. Incluye la mano de obra, material y equipos necesarios para la correcta ejecución, siguiendo las normas vigentes, especificaciones técnicas de fabricantes de materiales y equipos, y teniendo en cuenta los planos del proyecto específico. Las barras de refuerzo deberán cumplir las siguientes normas, según se establezca en los planos del proyecto: NTC 161, NTC 248, NTC 2289. El acero de refuerzo a utilizar debe ser en barras corrugadas de diámetros indicados según planos estructurales. El acero liso solo se permite en estribos, refuerzo de retracción y temperatura y refuerzo en espiral. Los números de designación de las barras de acero corrugado son iguales al número de octavos de pulgada del diámetro nominal.
  Antes de cortar el material en las formas indicadas en los planos, se debe verificar las listas de despiece y los diagramas de doblado. Si los planos no los muestran, el constructor deberá elaborarlos para someterlos a revisión y aprobación de interventoría. La aprobación no exime al constructor de responsabilidad. A su vez se debe cumplir en toda sección de un elemento estructural con las cuantías mínimas y máximas establecidas en Reglamento colombiano de construcción sismo resistente y el Código colombiano de diseño sísmico de puentes como también las especificaciones técnicas para esta actividad.

- *2,4,2 MALLA ELECTROSOLDADA FY=5000 KG/CM2, 500 MPA. FIGURADO, ARMADO, COLOCACIÓN Y AMARRE. SUMINISTRO E INSTALACIÓN:* La actividad comprende el suministro, transporte, almacenamiento, corte, doblamiento y colocación de barras de acero en estructuras de concreto. Incluye la mano de obra, material y equipos necesarios para la correcta ejecución, siguiendo las normas vigentes, especificaciones técnicas de fabricantes de materiales y equipos, y teniendo en cuenta los planos del proyecto específico. Los alambres para mallas y las mallas en sí, deberán cumplir con las siguientes normas, según se establezca en los planos del proyecto: NTC 1925, NTC 2310, ASTM A-185, ASTM A-497, AASHTO M-32, AASHTO M-55, AASHTO M-221, AASHTO M-225.
  En las mallas de alambre liso, las intersecciones no deberán estar espaciadas más de 300mm, y en alambre corrugado más de 400 mm, excepto cuando se utilicen como estribos. A su vez se debe cumplir en toda sección de un elemento estructural con las cuantías mínimas y máximas establecidas en Reglamento colombiano de construcción sismo resistente y el Código colombiano de diseño sísmico de puentes.

GOBERNACIÓN DEL META
Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1 - Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

INFORME DE OBRA PARCIAL No. 03

CONTRATO N°	511 DE 2023	PROYECTO N°	2021005500331

2. MATERIALES Y CONTROL DE CALIDAD

➢ **Mes: septiembre de 2024**

En el presente periodo se realizaron ensayos de resistencia a los cilindros de concreto tomados los días de vaciado de material. A continuación, se presenta el resumen de los ensayos ejecutados. En el informe 112-ECP-FR-017, presentado a interventoría se encuentran las actas y soportes del resumen de ensayos, según los lineamientos de la AIM.

Tabla 5. Ensayos ejecutados

DESCRIPCIÓN / ENSAYO	FECHA	NORMA
Resistencia a la compresión de cilindros de concreto a 56 días concreto de 5000 psi. Z13 Y Z10 EJE 5; VIGA 010 ENTRE D Y G; VIGA 002 2/3 ENTRE 5 Y 6 Y 1/3 ENTRE 5 Y 4; VIGA 003 2/3 ENTRE 5 Y 6 Y 1/3 ENTRE 5 Y 4	18/09/2024	NSR-10
Resistencia a la compresión de cilindros de concreto a 28 días concreto de 5000 psi. Z13, Z10 Y Z9 EJE 3; VIGA 002 COMPLETA ENTRE 3 Y 4; VIGA 003 ENTRE 3 Y 4; VIGA 004 ENTRE 3 Y 4; VIGA 008 ENTRE D Y H, TERCIO ENTRE H Y J	05/09/2024	NSR-10
Resistencia a la compresión de cilindros de concreto a 7 días concreto de 5000 psi. Z13 EJE A-6; Z13 A-5, VIGA 001 ENTRE 5-6 Y TERCIO ENTRE 6-7; VIGA 011 ENTRE A-D; VIGA 010 ENTRE A-D	12/09/2024	NSR-10
Resistencia a la compresión de cilindros de concreto a 7 días concreto de 5000 psi. VIGA 001 2/3 ENTRE 6-7 Y CONEXIÓN A MURO ENTRE 7-8; VIGA 012 CONEXIÓN MURO ENTRE A-B; ZARPA MURO CONTENCIÓN TIPO 1 A-ENTRE 7-8 ZARPA MURO CONTENCIÓN TIPO 1 EJE 7 ARRANQUE	20/09/2024	NSR-10
Resistencia a la compresión de cilindros de concreto a 7 días concreto de 5000 psi. Z8 EJE (F'2); Z11 EJE H-2; VIGA 003 ENTRE 1-3; VIGA 007 ENTRE F Y H; VIGA 004 ENTRE 1-3; ZARPA MURO TIPO 1 EJE 1 ENTRE F-L (10,20M)	24/09/2024	NSR-10
Resistencia a la compresión de cilindros de concreto a 28 días concreto de 5000 psi. MURO TIPO 7 EJE 8 TRAMO DE SOTANO; MURO TIPO 1 (15.35m) EJE 8	18/09/2/024	NSR-10
Resistencia a la compresión de cilindros de concreto a 28 días concreto de 5000 psi. MURO M1 EJE H ENTRE 3-4 TRAMO COMPLETO	18/09/2024	NSR-10
Resistencia a la compresión de cilindros de concreto a 28 días concreto de 5000 psi. MURO TIPO 1 (15.35m) EJE 8 2doTRAMO DE SOTANO	20/09/2024	NSR-10
Resistencia a la compresión de cilindros de concreto a 7 días concreto de 5000 psi. MURO TIPO 1 EJE 8 ENTRE A-B; MURO TIPO 1 EJE ENTRE 7-8; ARRANQUE	26/09/2024	NSR-10
Resistencia a la compresión de cilindros de concreto a 28 días concreto de 5000 psi. COLUMNA EJE D-3; COLUMNA EJE D-4; COLUMNA EJE D-5; COLUMNA EJE G-5; ZARPA MURO TIPO 1 EJE 8 ENTRE F-J (10M aprox); CONEXIÓN DE VIGAS 003 Y 004 A MURO	11/09/2024	NSR-10

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1 - Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

Resistencia a la compresión de cilindros de concreto a 28 días concreto de 5000 psi. COLUMNA EJE G-3; COLUMNA H-3; COLUMNA H-4; MURO M1 EJE H	13/09/2024	NSR-10
Resistencia a la compresión de cilindros de concreto a 7 días concreto de 5000 psi. COLUMNA G-4	03/09/2024	NSR-10
Resistencia a la compresión de cilindros de concreto a 28 días concreto de 5000 psi. COLUMNA G-4	24/09/2024	NSR-10
Resistencia a la compresión de cilindros de concreto a 7 días concreto de 5000 psi. COLUMNA A-6; COLUMNA A-5; PRIMEROS TRAMOS MURO M2 EJE A	21/09/2024	NSR-10
Resistencia a la compresión de cilindros de concreto a 7 días concreto de 5000 psi. TRAMO MEDIO M2, EJE A	24/09/2024	NSR-10
Resistencia a la compresión de cilindros de concreto a 3 días concreto de 5000 psi. PLACA SEMISOTANO EJE D-H ENTRE 6 Y 7	03/09/2024	NSR-10
Resistencia a la compresión de cilindros de concreto a 14 días concreto de 5000 psi. PLACA SEMISOTANO EJE D-H ENTRE 6 Y 7	13/09/2024	NSR-10
Resistencia a la compresión de cilindros de concreto a 28 días concreto de 5000 psi. PLACA SEMISOTANO EJE D-H ENTRE 6 Y 7	27/09/2024	NSR-10
Resistencia a la compresión de cilindros de concreto a 3 días concreto de 5000 psi. PLACA SEMISOTANO EJE D-H ENTRE 5 Y 6	11/09/2024	NSR-10
Resistencia a la compresión de cilindros de concreto a 3 días concreto de 5000 psi. PLACA SEMISOTANO EJE D-H ENTRE 4 Y 5	16/09/2054	NSR-10
Resistencia a la compresión de cilindros de concreto a 14 días concreto de 5000 psi. PLACA SEMISOTANO EJE D-H ENTRE 4 Y 5	20/09/2024	NSR-10

Fuente: Consorcio Hospital 002

1.1 CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LOS EQUIPOS DE TOPOGRAFIA

A continuación, se presenta el formato de control metrológico de los equipos de topografía utilizados en el desarrollo de las actividades constructivas del mes de agosto. El **ANEXO C** del presente documento corresponde a los resultados de la calibración.

Tabla 6. Control metrológico a los equipos de topografía

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1 - Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

CONSORCIO HOSPITAL 002	CONTROL METROLOGICO DE EQUIPOS SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN						
Nombre del equipo	Ubicación	Marca	No. de serie	No. de certificado	Modelo	Fecha última calibración	Fecha próxima calibración
NIVEL	OBRA	TOPCON	X24069	1477	AT-B4	16/04/2024	16/10/2024
ESTACIÓN	OBRA	NIKON	C051055	1476	N/A	16/04/2024	16/10/2024
OBSERVACIONES:							

Fuente: Consorcio Hospital 002

1.2 CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LOS EQUIPOS DE LABORATORIO

A continuación, se presenta el formato de control metrológico de los equipos de laboratorio, el **ANEXO D** del presente documento corresponde a el certificado de acreditación del laboratorio y los resultados de la calibración de sus equipos.

Tabla 7. Control metrológico a los equipos de laboratorio

CONSORCIO HOSPITAL 002	CONTROL METROLOGICO DE EQUIPOS SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN						
Nombre del equipo	Ubicación	Marca	No. de serie	No. de certificado	Modelo	Fecha última calibración	Fecha próxima calibración
Máquina de ensayo a compresión	GEOLAB RL	Rossemberg & Reingeniería S.A.S	301.190216.1	1814F	30000100	20/06/2024	20/06/2025
Balanza digital	GEOLAB RL	OHAUS	B739732846	3066 M	SPX 622	20/06/2024	20/06/2025
Balanza digital	GEOLAB RL	PREMIUM	8338530169	5079 M	ACS-3208	20/06/2024	20/06/2025
OBSERVACIONES:							

Fuente: Consorcio Hospital 002

1.3 CONTROL Y SEGUIMIENTO A LOS CERTIFICADOS DE PROVEEDORES

En el presente capitulo se relacionan certificados de calidad de los materiales suministrados por parte de los proveedores.

1.3.1 Acero

En el presente informe, se incluyen anexos los certificados de calidad del acero de refuerzo suministrado en el presente periodo. Este documento verifica el cumplimiento de las especificaciones establecidas por la NTC 2289, la cual está de conformidad con la normatividad. Entre las características evaluadas en el

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1 - Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

certificado se encuentran el límite de fluencia, resistencia a la tracción, porcentaje de elongación, composición química de la colada y resultados del ensayo de doblado.

- **Mes: Octubre de 2024**

A continuación, se presenta la descripción de los ensayos realizados para la verificación y control de materiales y actividades realizadas en el proceso de ejecución del proyecto.

a. ESTRUCTURAS DE CONCRETO

- RESISTENCIA MEZCLA DE CONCRETO

En el laboratorio GEOLAB RL se llevó a cabo el ensayo de resistencia a la compresión de cilindros de concreto, para verificar el cumplimiento de la resistencia de la mezcla de concreto a 4,7 y 28 días.

DESCRIPCIÓN / ENSAYO	FECHA	NORMA
Resistencia a la compresión de cilindros a 28 días, concreto de 5000 psi. Z13 EJE (A-6); Z13 EJE (A-5); VIGA 001 ENTRE 5-6 Y TERCIO ENTRE 6-7; VIGA 011 ENTRE A-D; VIGA 010 ENTRE A-D.	03/10/2024	NSR-10
Resistencia a la compresión de cilindros a 28 días, concreto de 5000 psi- PLACA SEMISOTANO EJE D-H ENTRE 6 Y 7.	10/10/2024	NSR-10
Resistencia a la compresión de cilindros a 28 días, concreto de 5000 psi. CAISSON 8,7,6,5.	11/10/2024	NSR-10
Resistencia a la compresión de cilindros a 28 días, concreto de 5000 psi. VIGA 001 2/3 ENTRE 6-7, Y CONEXIÓN A MURO ENTRE 7-8; VIGA 012 CONEXIÓN MURO ENTRE A-B; ZARPA MURO CONTENCION TIPO 1 A-ENTRE 78, ZARPA MURO CONTENCION TIPO 1 EJE 7 ARRANQUE.	11/10/2024	NSR-10
Resistencia a la compresión de cilindros a 28 días, concreto de 5000 psi. PLACA SEMISOTANO ENTRE EJES (D-H), (4,5).	11/10/2024	NSR-10
Resistencia a la compresión de cilindros a 28 días, concreto de 5000 psi. COLUMNA A-6; COLUMNA A-5; PRIMEROS TRAMOS MURO M2 EJE A.	12/10/2024	NSR-10
Resistencia a la compresión de cilindros a 28 días, concreto de 5000 psi. Z8 EJE (F'-2); Z11 EJE (H-2); VIGA 003 ENTRE 1-3; VIGA 007 ENTRE F' Y H; VIGA 004 ENTRE 1-3; ZARPA MURO TIPO 1 EJE 1 ENTRE F-L (10.20M)	15/10/2024	NSR-10

INFORME DE OBRA PARCIAL No. 03

CONTRATO N°	511 DE 2023	PROYECTO N°	2021005500331

Resistencia a la compresión de cilindros a 28 días, concreto de 5000 psi. TRAMO MEDIO M2 EJE A.	15/10/2024	NSR-10
Resistencia a la compresión de cilindros a 28 días, concreto de 5000 psi. CAISSON 2,3 Y 4.	17/10/2024	NSR-10
Resistencia a la compresión de cilindros a 28 días, concreto de 5000 psi. MURO TIPO 1 EJE 8 ENTRE A-B MURO TIPO 1 EJE A ENTRE 7-8ARRANQUE MURO TIPO 1 EJE 7 [NIVEL DE SOTANO]	17/10/2024	NSR-10
Resistencia a la compresión de cilindros a 7 días, concreto de 5000 psi. COLUMNA F-2; COLUMNA H-2; MURO M3 EJE 2.	01/10/2024	NSR-10
Resistencia a la compresión de cilindros a 28 días, concreto de 5000 psi. COLUMNA F-2; COLUMNA H-2; MURO M3 EJE 2.	22/10/2024	NSR-10
Resistencia a la compresión de cilindros a 7 días, concreto de 5000 psi. VIGA 001 ENTRE 4-5, VIGA 009 ENTRE A-D; Z12 EJE A-4.	01/10/2024	NSR-10
Resistencia a la compresión de cilindros a 28 días, concreto de 5000 psi. VIGA 001 ENTRE 4-5, VIGA 009 ENTRE A-D; Z12 EJE A-4.	22/10/2024	NSR-10
Resistencia a la compresión de cilindros a 7 días, concreto de 5000 psi. PLACA FOSO ASCENSOR EJES D-F ENTRE 1-2	02/10/2024	NSR-10
Resistencia a la compresión de cilindros a 28 días, concreto de 5000 psi. PLACA FOSO ASCENSOR EJES D-F ENTRE 1-2	23/10/2024	NSR-10
Resistencia a la compresión de cilindros a 7 días, concreto de 5000 psi. MUROS FOSO ASCENSOR EJES D-F ENTRE 1-2; Z7 EJE D2; VIGA 002 ENTRE 1-2; VIGA 007 ENTRE D-H	03/10/2024	NSR-10
Resistencia a la compresión de cilindros a 28 días, concreto de 5000 psi. MUROS FOSO ASCENSOR EJES D-F ENTRE 1-2; Z7 EJE D2; VIGA 002 ENTRE 1-2; VIGA 007 ENTRE D-H	24/10/2024	NSR-10
Resistencia a la compresión de cilindros a 4 días, concreto de 5000 psi. PLACA SEMISOTANO ENTRE EJES (D-H), (3,4).	01/10/2024	NSR-10
Resistencia a la compresión de cilindros a 7 días, concreto de 5000 psi. PLACA SEMISOTANO ENTRE EJES (D-H), (3,4).	04/10/2024	NSR-10
Resistencia a la compresión de cilindros a 7 días, concreto de 5000 psi. MURO CONTENCIÓN TIPO 1 EJE 1 (28.27m) TRAMO 7.80 m	07/10/2024	NSR-10
Resistencia a la compresión de cilindros a 7 días, concreto de 5000 psi. MURO CONTENCIÓN TIPO 1 EJE 1 (28.27m) TRAMO 7.80 m	28/10/2024	NSR-10

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1 - Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

INFORME DE OBRA PARCIAL No. 03

CONTRATO N°	511 DE 2023	PROYECTO N°	2021005500331

Resistencia a la compresión de cilindros a 4 días, concreto de 5000 psi. PLACA SEMISOTANO ENTRE EJES (A-D), (5-7)	05/10/2024	NSR-10
Resistencia a la compresión de cilindros a 7 días, concreto de 5000 psi. PLACA SEMISOTANO ENTRE EJES (A-D), (5-7)	08/10/2024	NSR-10
Resistencia a la compresión de cilindros a 7 días, concreto de 5000 psi. COLUMNA D-2.	10/10/2024	NSR-10
Resistencia a la compresión de cilindros a 7 días, concreto de 5000 psi. MURO DE CONTENCIÓN TIPO 7 EJE 1 (5.07 m)	10/10/2024	NSR-10
Resistencia a la compresión de cilindros a 7 días, concreto de 5000 psi. ZARPA MURO TIPO 1 EJE 1 ENTRE A-D; ZARPA MURO TIPO1 EJE A ENTRE 1-2; ZARPA MURO TIPO 10 EJE 2 ENTRE A-BVIGA 007 ENTRE A-D; VIGA 013; VIGA 001 ENTRE 2-4; VIGA 008 ENTRE A-D; Z10 EJE A-3	11/10/2024	NSR-10
Resistencia a la compresión de cilindros a 7 días, concreto de 5000 psi. MURO TIPO 1 EJE 1 ENTRE A-D, ARRANQUE MURO TIPO 1 EJE AENTRE 1-2 TRAMO .75cm	16/10/2024	NSR-10
Resistencia a la compresión de cilindros a 4 días, concreto de 5000 psi. PLACA SEMISOTANO ENTRE EJES (D-H), (2,3)	16/10/2024	NSR-10
Resistencia a la compresión de cilindros a 7 días, concreto de 5000 psi. PLACA SEMISOTANO ENTRE EJES (D-H), (2,3)	19/10/2024	NSR-10
Resistencia a la compresión de cilindros a 7 días, concreto de 5000 psi. COLUMNA A-4; COLUMNA A-3; MURO M1 EJE A PRIMEROS TRAMOS	19/10/2024	NSR-10
Resistencia a la compresión de cilindros a 7 días, concreto de 5000 psi. MURO TIPO 1 EJE A ENTRE 1-2; TRAMO MEDIO MURO M1 EJE A.	22/10/2024	NSR-10
Resistencia a la compresión de cilindros a 7 días, concreto de 5000 psi. NIVEL SEMISOTANO: COLUMNA F'-7; COLUMNA H-7; MURO M3 EJE 7; COLUMNA D-7; VIGA AEREAS S-113 Y FUNDIDA DE LA PATA PEDESTAL P7 EJE 8	23/10/2024	NSR-10
Resistencia a la compresión de cilindros a 4 días, concreto de 5000 psi. TRAMO MEDIO 5.8m MURO M2 EJE H ENTRE 5-6	21/10/2024	NSR-10
Resistencia a la compresión de cilindros a 7 días, concreto de 5000 psi. TRAMO MEDIO 5.8m MURO M2 EJE H ENTRE 5-6	24/10/2024	NSR-10
Resistencia a la compresión de cilindros a 7 días, concreto de 5000 psi. COLUMNA G-4; COLUMNA D-4.	24/10/2024	NSR-10
Resistencia a la compresión de cilindros a 7 días, concreto de 5000 psi. NIVEL SEMISOTANO: COLUMNA D-3; COLUMNA H-5; COLUMNA H6; TERCIO DE MURO M2.	25/10/2024	NSR-10
Resistencia a la compresión de cilindros a 3 días, concreto de 5000 psi. PLACA SEMISOTANO EJES (A-D) (2-5)	26/10/2024	NSR-10

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1 - Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

INFORME DE OBRA PARCIAL No. 03

CONTRATO N°	511 DE 2023	PROYECTO N°	2021005500331

➢ PLANTA – GRAVICON

Por parte del proveedor se realiza control en planta de resistencia del material despachado a la obra, cuya relación se presenta en la siguiente tabla.

DESCRIPCIÓN / ENSAYO	FECHA	NORMA
Resistencia a la compresión de cilindros de concreto a 28 días concreto de 5000 psi. CONTROL EN PLANTA.	03/10/2024	NSR-10
Resistencia a la compresión de cilindros de concreto a 28 días concreto de 5000 psi. CONTROL EN PLANTA.	05/10/2024	NSR-10
Resistencia a la compresión de cilindros de concreto a 28 días concreto de 5000 psi. CONTROL EN PLANTA.	11/10/2024	NSR-10
Resistencia a la compresión de cilindros de concreto a 28 días concreto de 5000 psi. CONTROL EN PLANTA.	11/10/2024	NSR-10
Resistencia a la compresión de cilindros de concreto a 28 días concreto de 5000 psi. CONTROL EN PLANTA.	12/10/2024	NSR-10
Resistencia a la compresión de cilindros de concreto a 28 días concreto de 5000 psi. CONTROL EN PLANTA.	15/10/2024	NSR-10
Resistencia a la compresión de cilindros de concreto a 28 días concreto de 5000 psi. CONTROL EN PLANTA.	15/10/2024	NSR-10
Resistencia a la compresión de cilindros de concreto a 28 días concreto de 5000 psi. CONTROL EN PLANTA.	17/10/2024	NSR-10
Resistencia a la compresión de cilindros de concreto a 28 días concreto de 5000 psi. CONTROL EN PLANTA.	21/10/2024	NSR-10
Resistencia a la compresión de cilindros de concreto a 7 días concreto de 5000 psi. CONTROL EN PLANTA.	01/10/2024	NSR-10
Resistencia a la compresión de cilindros de concreto a 28 días concreto de 5000 psi. CONTROL EN PLANTA.	22/10/2024	NSR-10
Resistencia a la compresión de cilindros de concreto a 7 días concreto de 5000 psi. CONTROL EN PLANTA.	01/10/2024	NSR-10
Resistencia a la compresión de cilindros de concreto a 28 días concreto de 5000 psi. CONTROL EN PLANTA.	22/10/2024	NSR-10
Resistencia a la compresión de cilindros de concreto a 7 días concreto de 5000 psi. CONTROL EN PLANTA.	03/10/2024	NSR-10

GOBERNACIÓN DEL META
Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1 - Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

INFORME DE OBRA PARCIAL No. 03

CONTRATO N°	511 DE 2023	PROYECTO N°	2021005500331

Resistencia a la compresión de cilindros de concreto a 28 días concreto de 5000 psi. CONTROL EN PLANTA.	24/10/2024	NSR-10

b. BARRAS DE REFUERZO

En el informe del componente de calidad, se incluye como anexo los certificados de calidad del acero de refuerzo que se está utilizando en la construcción de las estructuras de concreto. Este documento verifica el cumplimiento de las especificaciones establecidas por la norma NTC 2289, la cual está de conformidad con la normatividad vigente. Entre las características evaluadas en el certificado se encuentran el límite de fluencia, resistencia a la tracción, porcentaje de elongación, composición química de la colada y resultados del ensayo de doblado.

3. SISTEMA DE GESTIÓN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Relacionar la aplicación de la normatividad vigente sobre seguridad industrial, salud ocupacional y señalización.

Periodo: 1 al 30 de septiembre de 2024

FECHA	ACTIVIDAD SST REALIZADA	OBSERVACIÓN /ACCIÓN
09/09/2024	Medicina preventiva	Desarrollo de programas preventivos a evitar enfermedades profesionales
11/09/2024	Preparación y respuestas ante emergencias	Establecer rutas de evacuación, puntos de encuentro y socializarlos con la población trabajadora.
19/09/2024	Gestión del peligro	Aseguramiento de los trabajos críticos
19/09/2024	Señalización	Señalización e instalación de señales preventivas e informativas
21/09/2024	Trabajo en alturas	De trabajo prioritarios alturas, confinados y cargas.
24/09/2024	Elementos de protección personal	Entrega de los elementos de protección personal para el desarrollo de las actividades de obra.
26/09/2024	Documentación en campo	Revisión de pre operacionales y permisos de trabajo
28/09/2024	Gestión ambiental y sanitaria	Orden y aseo

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1 - Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

INFORME DE OBRA PARCIAL No. 03

CONTRATO N°	511 DE 2023	PROYECTO N°	2021005500331

Periodo: 1 al 31 de octubre de 2024

FECHA	ACTIVIDAD SST REALIZADA	OBSERVACIÓN /ACCIÓN
6/10/2024	Documentación en campo	Revisión de pre operacionales y permisos de trabajo
14/10/2024	Elementos de protección personal	Entrega de los elementos de protección personal para el desarrollo de las actividades de obra.
18/10/2024	Gestión ambiental y sanitaria	Orden y aseo
19/10/2024	Medicina preventiva	Desarrollo de programas preventivos a evitar enfermedades profesionales
19/10/2024	Gestión del peligro	Aseguramiento de los trabajos críticos
19/10/2024	Señalización	Señalización e instalación de señales preventivas e informativas
21/10/2024	Trabajo en alturas	De trabajo prioritarios alturas, confinados y cargas.
11/10/2024	Preparación y respuestas ante emergencias	Establecer rutas de evacuación, puntos de encuentro y socializarlos con la población trabajadora.

4. MANEJO AMBIENTAL

- **Mes: septiembre de 2024**

ACTIVIDAD PROPUESTA PARA EL MANEJO AMBIENTAL	AVANCE DE LA ACTIVIDAD A LA FECHA	OBSERVACIÓN / ACCIÓN
Cumplimiento de los requisitos legales.	01 al 30 de septiembre de 2024.	Suministro de material pétreo por parte de la empresa Gravicon.
Cumplimiento de los requisitos legales.	08/09/2024	Informe Ejecutivo de Actividades No. BIO-M-LUP-3681.
Cumplimiento de los requisitos legales.	01 al 30 de septiembre de 2024	Mantenimiento baños portátiles con la empresa Soluciones Integrales de América S.A.S

- **Mes: octubre de 2024**

GOBERNACIÓN DEL META
Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1 - Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

INFORME DE OBRA PARCIAL No. 03

CONTRATO N°	511 DE 2023	PROYECTO N°	2021005500331

ACTIVIDAD PROPUESTA PARA EL MANEJO AMBIENTAL	AVANCE DE LA ACTIVIDAD A LA FECHA	OBSERVACIÓN / ACCIÓN
Cumplimiento de los requisitos legales.	01 al 31 de octubre de 2024.	Suministro de concreto por parte de la empresa Gravicon.
Cumplimiento de los requisitos legales.	01 al 31 de octubre de 2024	Suministro de Acero sismorresistente corrugado por la empresa Grupo Siderúrgico Reyna.
Cumplimiento de los requisitos legales.	01 al 31 de octubre de 2024	Mantenimiento baños portátiles con la empresa Soluciones Integrales de América S.A.S

C. INFORME ADMINISTRATIVO

1. PERSONAL ACTUAL PROFESIONAL VIGENTE

NOMBRE	CARGO	% DEDICACIÓN PERSONA- MES
JUAN CARLOS RODRÍGUEZ SÁNCHEZ	DIRECTOR DE OBRA - ARQUITECTO	50%
ROBERTO HERNÁN HURTADO ROBLEDO	RESIDENTE DE OBRA – INGENIERO CIVIL	100%
JOSÉ LUIS CLAVIJO OLMOS	RESIDENTE DE OBRA - ARQUITECTO	100%
JAIME ELISEO BUITRAGO NOVOA	INGENIERO CIVIL - ESTRUCTURAL	50%
EDUARDO ANDRÉS MORENO GUTIÉRREZ	INGENIERO ELECTRICISTA	50%
PEDRO ANTONIO VENGOECHA	TECNÓLOGO EN CONSTRUCCIÓN	50%
FEDERICO SMELIN JARAMILLO	PROFESIONAL SST	100%

2. APORTES DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

Se presenta planilla de pago N°: 9474776194, 80934024, 9475407416, 80736039, 9474873355, 9475566215, 80099410, 9472667674

Anexo: Formato 112-ECP-FR-021-V01-ACTA CONTROL Y SEGUIMIENTO DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCAL OBRA

GOBERNACIÓN DEL META


Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1 - Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

INFORME DE OBRA PARCIAL No. 03

CONTRATO N°	511 DE 2023	PROYECTO N°	2021005500331

3. GESTIÓN SOCIAL

MES	Empleos directos generados:	Empleos indirectos generados:	Total empleos generados:
Septiembre - 24	75	9	84
Octubre - 24	70	9	79

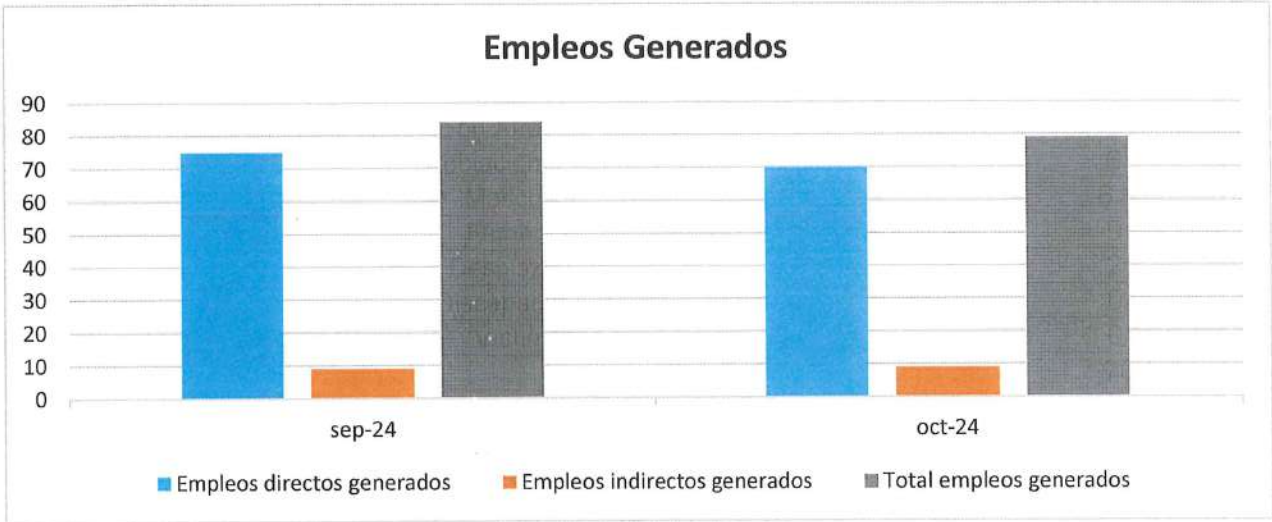

4. CLASIFICACIÓN DEMOGRÁFICA DE LOS EMPLEOS GENERADOS

CLASIFICACIÓN	DETALLE	CANTIDAD Septiembre - 24	CANTIDAD Octubre - 24
Etaria (Edad)	15 a 19 años	0	0
Etaria (Edad)	20 a 59 años	73	68
Etaria (Edad)	Mayor de 60 años	2	2
Grupos étnicos	Población Indígena	0	0
Grupos étnicos	Población Afrocolombiana	0	0
Grupos étnicos	Población Raizal	6	6
Género	Masculino	66	61
Género	Femenino	9	9
Población Vulnerable	Desplazados	2	2
Población Vulnerable	Discapacitados	0	0
Población Vulnerable	Víctimas	0	0
Total		75	70

INFORME DE OBRA PARCIAL No. 03

CONTRATO N°	511 DE 2023	PROYECTO N°	2021005500331

D. INFORME GESTIÓN CONTRACTUAL Y JURIDICA DEL PROYECTO

1. ACTOS ADMINISTRATIVOS CELEBRADOS

PRORROGAS, SUSPENSIONES, AMPLIACIONES DE SUSPENSIÓN Y REINICIO			
ACTA N° Y FECHA	TIEMPO (MESES / DÍAS)	JUSTIFICACIÓN	FOLIO N°
N.A.			

ADICIÓN			
CONTRATO ADICIONAL N° Y FECHA	VALOR ($)	JUSTIFICACIÓN	FOLIO N°
N.A.			

MODIFICACIÓN			
ACTA N° Y FECHA	VALOR ACTUALIZADO ($)	JUSTIFICACIÓN	FOLIO N°
ACTA MODIFICATORIA No. 01 30 de abril de 2024	$ 80.389.497.271	Que en el desarrollo de las labores iniciales de excavación de los sótanos de parqueaderos y confirmación de taludes del proyecto, se requiere contemplar actividades necesarias que generan modificaciones en las cantidades e inclusión de nuevos precios unitarios para llevar a cabo la obra de manera adecuada. Por consiguiente, se hace un balance económico al componente arquitectónico, donde se incluye el transporte y disposición final de material sobrante de la excavación.	04 folios
ACTA MODIFICATORIA No. 02 12 de septiembre de 2024	$ 80.389.497.271	*Que a través de los diferentes comités de obra realizados durante el desarrollo del proyecto y los ajustes realizados por los consultores, además de los diversos requisitos necesarios para la*	04 folios

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1 - Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

INFORME DE OBRA PARCIAL No. 03

CONTRATO N°	511 DE 2023	PROYECTO N°	2021005500331

MODIFICACIÓN			
ACTA N° Y FECHA	**VALOR ACTUALIZADO ($)**	**JUSTIFICACIÓN**	**FOLIO N°**
		ejecución correcta de la obra, se ha evidenciado que, se requiere contemplar actividades necesarias que generan modificaciones en las cantidades e inclusión de nuevos precios unitarios para llevar a cabo la obra de manera adecuada. En virtud de lo anterior y acorde con lo planteado por las partes se considera pertinente realizar una modificación de mayores o menores cantidades e ítems no previstos, al contrato de obra No. 511 de 2023. *1,0 COMPONENTE ARQUITECTONICO* *2,0 COMPONENTE ESTRUCTURAL*	

2. GARANTÍAS

ACTA DE INCIO (12/12/2023)

PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO N°	**CV-100035762**
ANEXO N°	**3**
PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL DERIVADO DE CUMPLIMIENTO N°	**CV-100009403**
ANEXO N°	**3**
FECHA DE APROBACIÓN POR PARTE DE LA ENTIDAD CONTRATANTE	**14/12/2023**
COMPAÑÍA DE SEGUROS	**SEGUROS MUNDIAL**

GARANTÍAS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
CUMPLIMIENTO	12/12/2023	11/07/2025	$ 8.038.949.727,20
BUEN MANEJO DEL ANTICIPO	12/12/2023	11/07/2025	$ 32.155.798.908,80
PRESTACIONES SOCIALES	12/12/2023	11/03/2028	$ 4.019.474.863,60
ESTABILIDAD DE LA OBRA	11/03/2025	11/03/2030	$ 8.038.949.727,20
RESPONSABILIDAD CIVIL	12/09/2023	11/03/2025	$ 4.019.474.864,00

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1 - Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

INFORME DE OBRA PARCIAL No. 03

CONTRATO N°	511 DE 2023	PROYECTO N°	2021005500331

ACTA DE MODIFICATORIA No. 01 (30/04/2024)

PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO N°	CV-100035762
ANEXO N°	4
PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL DERIVADO DE CUMPLIMIENTO N°	CV-100009403
ANEXO N°	4
FECHA DE APROBACIÓN POR PARTE DE LA ENTIDAD CONTRATANTE	31/05/2024
COMPAÑÍA DE SEGUROS	SEGUROS MUNDIAL

GARANTÍAS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
CUMPLIMIENTO	30/04/2024	11/07/2025	$ 8.038.949.728,00
BUEN MANEJO DEL ANTICIPO	30/04/2024	11/07/2025	$ 32.155.798.909,00
PRESTACIONES SOCIALES	30/04/2024	11/03/2028	$ 4.019.474.864,00
ESTABILIDAD DE LA OBRA	11/03/2025	11/03/2030	$ 8.038.949.728,00
RESPONSABILIDAD CIVIL	12/09/2023	11/03/2025	$ 4.019.474.864,00

ACTA DE MODIFICATORIA No. 02 (12/09/2024)

PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO N°	CV-100035762
ANEXO N°	5
PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL DERIVADO DE CUMPLIMIENTO N°	CV-100009403
ANEXO N°	5
FECHA DE APROBACIÓN POR PARTE DE LA ENTIDAD CONTRATANTE	26/09/2024
COMPAÑÍA DE SEGUROS	SEGUROS MUNDIAL

GARANTÍAS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
CUMPLIMIENTO	30/04/2024	11/07/2025	$ 8.038.949.728,00
BUEN MANEJO DEL ANTICIPO	30/04/2024	11/07/2025	$ 32.155.798.909,00
PRESTACIONES SOCIALES	30/04/2024	11/03/2028	$ 4.019.474.864,00
ESTABILIDAD DE LA OBRA	11/03/2025	11/03/2030	$ 8.038.949.728,00
RESPONSABILIDAD CIVIL	12/09/2023	11/03/2025	$ 4.019.474.864,00

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1 - Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

INFORME DE OBRA PARCIAL No. 03

CONTRATO N°	511 DE 2023	PROYECTO N°	2021005500331

E. INFORME FINANCIERO

1. PAGOS REALIZADOS

ACTA No.	EGRESO No.	FECHA	% EJECUCION	VALOR PAGO	VALOR AMORTIZADO	VALOR DESCUENTO	VALOR ACUMULADO
ANT.	1024	23-1-2024					$ 32.155.798.908,40
1	20524	26-08-2024	5,68%	$ 4.562.199.028,00	$ 1.824.879.611,20	$ 798.384.832,00	$ 34.893.118.325,20
TOTALES				**$ 4.562.199.028,00**	**$ 1.824.879.611,20**		**$ 34.893.118.325,20**

PERIODO QUE COMPRENDE EL INFORME FINANCIERO: ***28/09/2024 AL 31/10/2024***

Avance físico ejecutado 9,99 % y avance financiero ejecutado 43,41%

2. ANTICIPO

No.	DESCRIPCIÓN	VALOR INICIAL	REPROGRAMACIÓN MENOS FONSEG (5%)	VALOR EJECUTADO	SALDO
1	PAGO DE SALARIOS Y JORNALES	$ 1.607.789.945,42	$ 1.527.400.448,17	$ 0,00	$ 1.527.400.448,17
2	MATERIALES Y SUBCONTRATOS DE OBRA	$ 27.332.429.072,14	$ 25.965.807.618,89	$ 14.803.937.249,75	$ 11.161.873.369,14
3	TRANSPORTE	$ 1.607.789.945,42	$ 1.527.400.448,17	$ 0,00	$ 1.527.400.448,17
4	ALQUILER DE MAQUINARIA Y EQUIPOS	$ 1.607.789.945,42	$ 1.527.400.448,17	$ 0,00	$ 1.527.400.448,17
TOTAL		**$ 32.155.798.908,40**	**$ 30.548.008.963,40**	**$ 14.803.937.249,75**	**$ 15.744.071.713,65**

ÍTEM	COMPROBANTE No.	FECHA COMPROBANTE	BENEFICIARIO	VALOR	ÍTEM	DESCRIPCIÓN EGRESO
1	5833a	27/02/2024	CONSTRUCCIONES GMI SAS NIT:900.308.912-0	$1.460.504.653,00	Materiales y subcontratos de obra.	Anticipo 60% del contrato CE-205147-001
2	9904	1/04/2024	ORGANIZACIÓN TERRACANTO SAS NIT: 901.093.535-5	$2.479.979.235,00	Materiales y subcontratos de obra.	Anticipo 40% al contrato de obra No CE-205-147-002
3	10217a	3/04/2024	INDUSTRIAS DEL HIERRO S.A.S NIT: 890.940.621	$6.763.416.639,19	Materiales y subcontratos de obra.	Anticipo del 60% del contrato CE-205-147-003

GOBERNACIÓN DEL META

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1 - Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

INFORME DE OBRA PARCIAL No. 03

CONTRATO N°	511 DE 2023	PROYECTO N°	2021005500331

ÍTEM	COMPROBANTE No.	FECHA COMPROBANTE	BENEFICIARIO	VALOR	ÍTEM	DESCRIPCIÓN EGRESO
4	14585	9/05/2024	CONSTRUCCIONES GMI SAS NIT:900.308.912-0	$1.409.947.019,00	Materiales y subcontratos de obra.	Por anticipo del 60% del Otro Si No. 1 Contrato de obra N. CE-205-147-001
5	16165c	22/05/2024	GRUPO SIDERURGICO REYNA SAS NIT: 900.601.327 - 7	$1.000.000.038,80	Materiales y subcontratos de obra.	Pago factura proforma 56210 - compra de hierro
6	17644	5/06/2024	CONSTRUCCIONES GMI SAS NIT:900.308.912-0	$ 867.719.110,76	Materiales y subcontratos de obra.	Pago corte de obra según contrato CE-205-147-001
7	18355	13/06/2024	PILASTRO INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A.S. NIT 900.427.040-3	$ 422.370.554,00	Materiales y subcontratos de obra.	ANTICIPO DEL VEINTICINCO POR CIENTO (25%) SOBRE EL VALOR DEL CONTRATO DE OBRA No CE-205-147-004
8	31191	27/09/2024	GRUPO SIDERURGICO REYNA SAS NIT: 900.601.327 - 7	$ 400.000.000,00	Materiales y subcontratos de obra.	Pago factura proforma 62360 - compra de acero figurado
9	33162	15/10/2024	POWEL INGENIERIA Y SERVICIOS SAS NIT: 900.276.725	$ 1.658.400.000,00	Materiales y subcontratos de obra.	Anticipo del 30% del contrato CE-205-147-005
10	32723	10/10/24	ORGANIZACIÓN TERRACANTO SAS NIT: 901.093.535-5	$ 310.178.546,24	Materiales y subcontratos de obra.	Pago corte de obra según contrato CE-205-147-002
			TOTAL	**$ 16.772.512.834,33**		

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1 - Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

INFORME DE OBRA PARCIAL No. 03

CONTRATO N°	511 DE 2023	PROYECTO N°	2021005500331

F. REGISTRO FOTOGRÁFICO

1. COMPONENTE ARQUITECTÓNICO

ÍTEMS	ACTIVIDAD	CANTIDAD	
	DESMONTE Y DEMOLICIONES	**EJECUTADO**	**%**
	DEMOLICION MECÁNICA ANDENES, PLACAS, SARDINELES EN CONCRETO REFORZADO. INCLUYE TRASIEGO Y CARGUE MANUAL	**40,56**	**7,35**
1,2,1			
	OBSERVACIONES: Demolición de andenes y placa de contrapiso campamento de obra .		

INFORME DE OBRA PARCIAL No. 03

CONTRATO N°	511 DE 2023	PROYECTO N°	2021005500331

ÍTEMS	ACTIVIDAD	CANTIDAD	
	DESMONTE Y DEMOLICIONES	**EJECUTADO**	**%**
	DEMOLICION CIMIENTO ENTERRADO. INCLUYE TRASIEGO Y CARGUE MANUAL	**7,59**	**4,77**
1,2,3			
	OBSERVACIONES: Demolición cimentación campamento de obra.		

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1 - Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

INFORME DE OBRA PARCIAL No. 03

CONTRATO N°	511 DE 2023	PROYECTO N°	2021005500331

ÍTEMS	ACTIVIDAD	CANTIDAD	
	DESMONTE Y DEMOLICIONES	**EJECUTADO**	**%**
	DEMOLICION MANUAL MURO DIVISORIO BLOQUE DE ARCILLA. INCLUYE TRASIEGO Y CARGUE MANUAL	**193**	**7,91**
1,2,4			
	OBSERVACIONES: Demolición muros campamento de obra.		

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1 - Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co
