CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. GN3323-2023

OBJETO:
"AUNAR ESFUERZOS ADMINISTRATIVOS, TÉCNICOS, FINANCIEROS Y ADMINISTRATIVOS ENTRE EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO Y EL MUNICIPIO DE SAN PABLO PARA CONTRIBUIR A LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO: "CONSTRUCCIÓN MURO DE PROTECCIÓN PARA MITIGAR EL RIESGO DE LAS VIVIENDAS ALEDAÑAS A LA QUEBRADA BATEROS DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE SAN PABLO".

INFORME DE SUPERVISION

PERIODO: 01/OCTUBRE/2024 AL 31/OCTUBRE/2024

San Juan de Pasto, Octubre de 2024.

Gobernación de Nariño	GOBERNACIÓN DE NARIÑO SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y MINAS **SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y VIAS** **FORMATO: INFORME DE SUPERVISION - FICHA INFORMATIVA DE CONVENIO Y/O CONTRATO**	Código : SIVEYC.FTO.35-2 Versión: 0.0 Vig. 23/05/2016

FECHA DE PRESENTACION:	01 de noviembre de 2024.	CON CORTE :	01 de noviembre de 2024.

1. ASPECTOS ADMISTRATIVOS

PROCESO DE CONTRATACION:	Contratación Directa.
CONVENIO MACRO No:	Convenio Interadministrativo.
CONVENIO No.:	Convenio Interadministrativo No. GN3323-2023 del 28 de junio de 2023.
MODIFICATORIO No. 1:	10 de agosto de 2023. Aclaración a información contractual.
MODIFICATORIO No. 2:	30 de mayo de 2024. Adición en Tiempo por cuatro (04) meses, es decir hasta el 30 de septiembre de 2024.
MODIFICATORIO No. 3:	30 de septiembre de 2024. Adición en Tiempo hasta el 20 de noviembre de 2024; y Adición de Recursos.

CDP No.:	2023060415. Cuenta 2.3.2.02.02.005-24-2402-0600-2402021-2022003520100-53290-16-1.3.3.1.00. : Construcción y servicios de la construcción/Transporte/Infraestructura red vial regional/Intersubsectorial Transporte/Servicio de Información Geográfica-SIG/Estudios y Diseños de Preinversión, Mantenimiento, Mejoramiento, y Rehabilitación de la red vial en el departamento de Nariño/Otras obras de ingeniería civil/Administración Central/Recursos del Balance de libre destinación.	FECHA: 14 de junio de 2023.	$ 2.900.000.000,00
CDP No.:	2024090163. Cuenta 2.3.2.02.02.009-24-2402-0600-2402021-2023003520073-97990-16-1.3.3.1.00. : Servicios para la comunidad, sociales y personales/Transporte/Infraestructura red vial regional/Intersubsectorial Transporte/Vía secundaria con mantenimiento periódico o rutinario/Estudios de Preinversión, Mantenimiento, Mejoramiento, Rehabilitación y Atención de Emergencias en la red vial en el Departamento de Nariño/Otros servicios diversos n.c.p./Administración Central/Recursos del Balance de libre destinación.	FECHA: 17 de septiembre de 2024.	$ 200.000.000,00

Gobernación de Nariño	GOBERNACIÓN DE NARIÑO SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y MINAS **SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y VIAS** **FORMATO: INFORME DE SUPERVISION - FICHA INFORMATIVA DE CONVENIO Y/O CONTRATO**	Código : SIVEYC.FTO.35-2 Versión: 0.0 Vig: 23/05/2016

REGISTRO No:	2023061318. Cuenta 2.3.2.02.02.005-24-2402-0600-2402021-2022003520100-53290-16-1.3.3.1.00. : Construcción y servicios de la construcción/Transporte/Infraestructura red vial regional/Intersubsectorial Transporte/Servicio de Información Geográfica-SIG/Estudios y Diseños de Preinversión, Mantenimiento, Mejoramiento, y Rehabilitación de la red vial en el departamento de Nariño/Otras obras de ingenieria civil/Administración Central/Recursos del Balance de libre destinación.	FECHA: 28 de junio de 2023.	$ 2.839.026.698,88

REGISTRO No:	2024090910	FECHA: 30 de septiembre de 2024.	$ 199.998.906,27

OBJETO DEL CONTRATO:	"Aunar esfuerzos Administrativos, Técnicos, Financieros y Administrativos entre el departamento de Nariño y el municipio de San Pablo para contribuir a la ejecución del proyecto denominado: "Construcción Muro de Protección para mitigar el riesgo de las viviendas aledañas a la quebrada Bateros del casco urbano del municipio de San Pablo".

MODIFICACION No. 01-2023:	No. y fecha: 01 del 11 de agosto de 2023.	Detalle: Aclaratorio de textos en cláusulas contractuales

CONTRATISTA DE OBRA:	Municipio de San Pablo. Representante Legal: Ricardo Emiro Gómez Lasso (suscripción de Convenio Interadministrativo)- Ing. Mario Trujillo Cerón - Alcalde Municipio de San Pablo. NIT 800.099.143-2. Contratista de Obra Civil: Diego Reinel Fernandez Ordoñez.

CONTRATISTA INTERVENTORIA:	Municipio de San Pablo. Representante Legal: Ricardo Emiro Gómez Lasso (suscripción de Convenio Interadministrativo)- Ing. Mario Trujillo Cerón - Alcalde Municipio de San Pablo. NIT 800.099.143-2. Contratista de Interventoria: Antonio José rosada Bedoya.

	GOBERNACIÓN DE NARIÑO SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y MINAS **SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y VIAS** **FORMATO: INFORME DE SUPERVISION - FICHA INFORMATIVA DE CONVENIO Y/O CONTRATO**	Código: SIVEYC FTO 35-2 Versión: 0 0 Vig. 23/05/2016

SUPERVISOR:	Ing. Gabriel Fernando Osejo Aguirre. Secretario de Infraestructura y Minas.
PROFESIONAL DE APOYO A LA SUPERVISION - AREA TECNICA:	Ing. Ana Cristina Vela Perdomo. Profesional Universitaria SIMD.
PROFESIONAL DE APOYO A LA SUPERVISION - AREA JURIDICA:	Dra. Diana Burbano. Abogada Contratista SIMD.
META FISICA	Muro de contención de Longitud = 202 metros.
VALOR DEL CONVENIO:	$ 2.844.026.698,88
APORTE DEPARTAMENTO:	$ 2.839.026.698,88
OBRA CIVIL:	$ 2.653.806.566,58
INTERVENTORIA:	$ 185.220.132,30
APORTE MUNICIPIO:	$5.000.000,00 - Estudios y Diseños del Muro de Contención.
INTERVENTORIA:	$ 185.220.132,30
VALOR ADICIONAL - RECURSOS DEL DEPARTAMENTO DE NARIÑO:	$ 199.998.906,27
VALOR TOTAL DEL CONVENIO:	$ 3.044.025.605,15
FECHA DE INICIACION:	31 de julio de 2023.
PLAZO DEL CONVENIO:	Dieciseis (16) meses.
FECHA DE TERMINACION INICIAL:	30 de mayo de 2024.
FECHA DE TERMINACION FINAL:	20 de noviembre de 2024.
SUSPENSION:	-

	GOBERNACIÓN DE NARIÑO SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y MINAS **SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y VIAS** **FORMATO: INFORME DE SUPERVISION - FICHA INFORMATIVA DE CONVENIO Y/O CONTRATO**	Código : SIVEYC.FTO.35-2 Versión: 0.0 Vig: 23/05/2016

REINICIO:	-			
PORCENTEJE ANTICIPO:	40%			
TOTAL ANTICIPO:	$ 1.135.610.679,55			
VALOR PAGADO ACTAS + ANTIC.	$ 2.582.889.738,12			
GARANTIAS:	Aseguradora Solidaria.			
Póliza No.:	436-47-994000058928.			
% AVANCE FISICO EN OBRA	% PROGRAMADO	95,60%	% EJECUTADO:	95,60%
% AVANCE FINANCIERO	% PROGRAMADO	90,98%	% EJECUTADO	90,98%
META FISICA A LA FECHA	1	Atención de emergencia - Muro de Contención.		

2. DESCRIPCION AVANCE GENERAL DEL CONTRATO

ASPECTOS TECNICOS:

El Departamento de Nariño suscribió con el municipio de San Pablo el Convenio Interadministrativo No. GN3323-2023 del 28 de junio de 2023 cuyo objeto es: "Aunar esfuerzos Administrativos, Técnicos, Financieros y Administrativos entre el departamento de Nariño y el municipio de San Pablo para contribuir a la ejecución del proyecto denominado: "Construcción Muro de Protección para mitigar el riesgo de las viviendas aledañas a la quebrada Bateros del casco urbano del municipio de San Pablo", por un término de diez (10) meses, iniciando el 31 de julio de 2023 hasta el 30 de mayo de 2024, y prorrogado en Tiempo hasta el 20 de noviembre de 2024.

El municipio de San Pablo como ejecutor del proyecto adelantó la contratación de los contratos de Obra Civil e Interventoría derivados del convenio.

- Obra Civil con el Contratista Diego Reinel Fernandez Ordoñez, con quien se suscribió el Confiato de Obra No. UM 103.1-2D-10-16 del 11 de agosto de 2023, par valor de S2.653.806.566,58. con un plazo de ejecución de 10 meses y con una iniciación de obra del 22 de agosto de 2023. Mediante Otrosí No. 1, se modifica la cláusula Sexta "Plazo del contratoy cronograma estimado de obra a ocho (08) meses. Debido al mal tiempo presentado en la zona se prórroga el plazo de ejecución hasta el 30 de mayo de 2024. A la fecha, se encuentra en ejecución, y realizada prórroga en Tiempo hasta el 20 de noviembre de 2024.

- Interventoría con el Contratista Antonio José Rosada Bedoya, con quien se suscribió el Contrato de Interventoría No. UM 130.1-20-10-17 del 11 de agosto de 2023, por valor de $185.220.132,30, con un plazo de ejecución de 10 meses y con una inlciación de obra del 22 de agosto de 2023. Mediante Otrosí No. 1, se modifica la cláusula Sexta "Plazo del contratoy cronograma estimado de obra a ocho (08) meses. Debido al mal tiempo presentado en la zona se prórroga el plazo de ejecución hasta el 30 de mayo de 2024. A la fecha, se encuentra en ejecución, y realizada prórroga en Tiempo hasta el 20 de noviembre de 2024.

Interventoría informa en los Informes Semanales y Mensual, a la Secretaría de Infraestructura y Minas, los avances de la obra civil del muro de protección en ua longitud de 202,00 metros lineales, así:

- Desvío de la quebrada Bateros, el cual se ha realizado en su totalidad, es decir en una longitud de 202 metros lineales. Las lluvias presentes en la región han ocasionado que el Contratista de Obra vuelva a realizar el Desvio del cauce de la quebrada Bateros y se haya generado daños en la nivelación del terreno y formaletas que se habían realizado para la fundición del concreto ciclópeo. Interventoría informa que ésta actividad por el invierno presentado ha generado en varias oportunidades dificultades en los trabajos y ha sido necesario realizar nuevamente el desvio de la quebrada en los sectores de la obra. Las rocas fueron llevadas sobre el muro con el fin de dar protección al mismo.

- Excavaciones en Conglomerado: 1.153,43 M3 y en Roca: 641,03 M3.
- Demolición de estructuras.
- Transporte de material sobrante de la obra.
- Concreto Ciclópeo para cimentación: 240,04 M3.
- Concreto Reforzado, resistencia 4.000 PSI, para zarpas, cuerpo de muro: 685,45 M3.
- Acero de refuerzo Fy 420 Mpa, para cimentación, zarpas y cuerpos de muro: 68.458,48 Kgs.
- Entibado para Muro.
- Relleno para estructuras: 1.395,53 M3.
- Actividades de Base y Placa en Concreto para pavimento de vía.

Teniendo en cuenta la obra adicional de relleno de material del muro de protección y rehabilitación de la vía urbana aledaña, la obra presenta un avance del 95,60%.

Interventoría recuerda e informa que las estructuras de contención y protección de las viviendas aledañas a la quebrada Bateros, ya fue realizada por sus propietarios, evitando de esta manera el riesgo de caída y así atenten con sus vidas.

1. Se recordó a la Secretaría de Planeación Municipal y al Municipio de San Pablo, continuar con la gestión de tomar las medidas necesarias respecto a los residuos sólidos evacuados por las viviendas aledañas a la quebrada Bateros y a la construcción del muro de protección, toda vez que esta situación genera graves afectaciones medioambientales debido a los desechos evacuados. quienes evacuan sus aguas residuales a la quebrada Bateros, generando erosiones en los taludes aledaños a la quebrada.

2. Se recordó al Contratista tano de la Obra Civil como de Interventoría continuar con la información a las comunidades junto con el Comité Veedor del proyecto para el seguimiento del proyecto de Construcción del muro de protección aledaño a la quebrada Bateros en el municipio de San Pablo.

Además, Interventoría informa que el Personal tanto de Obra Civil como de Interventoría aprobados para la ejecución del contrato se mantiene con su vinculación a Salud, Pensión y Riesgos.

Que en la obra se ha utilizado equipos como: rotomartillos para la demolición de rocas, retroexcavadora de orugas y herramienta menor.

A los concretos empleados se han tomado muestras de laboratorio para ensayos de compresión en los concretos de las zapatas, y cuerpo del muro de protección, así como a la estructura de pavimento, documentos solicitados que sean presentados en los Informes Mensuales presentados por Interventoría.

El Municipio de San Pablo adelantó el trámite de legalización del Modificatorio No. 3 para continuar con la ejecución de las obras y terminación del muro de protección en lo que se refiere al relleno, muro de seguridad, y estructura de pavimento de la calle.

Con la legalización del Modificatorio No. 3, el Municipio de San Pablo adelantará la terminación de los rellenos en el muro de contención y drenajes; Así, como la pavimentación de la calle aledaña al muro de protección.

La Secretaría de Infraestructura y Minas reitero al Municipio de San Pablo, Contratistas de Obra Civil e Interventoría se coloquen al día en el cargue en plataforma Secop II de los Informes Mensuales y la entrega física de los Informes Mensuales por parte del Municipio al Departamento de Nariño.

ASPECTOS FINANCIEROS:

Se tramitó por parte del Municipio de San Pablo el pago del Anticipo del Convenio Interadministrativo No. GN3323-2023 por valor del Cuarenta por ciento (40%) que equivale a: Mil ciento treinta y cinco millones seiscientos diez mil seiscientos setenta y nueve pesos con cincuenta y cinco centavos ($1.135.610.679,55), a través del cargue del aplicativo Siscar Nariño.

Así como también se tramitó el Pago Parcial No. 01 el 29 de noviembre de 2023 por valor total de Mil ciento noventa y un millones doscientos cincuenta mil novecientos nueve pesos con siete centavos ($1.191.250.909,07) para un valor neto de Setecientos catorce millones setecientos cincuenta mil quinientos cuarenta y cinco pesos con cuarenta y cuatro centavos ($714.750.545,44) y una amortización por valor de Cuatrocientos setenta y seis millones quinientos mil trescientos sesenta y tres pesos con sesenta y tres centavos ($476.500.363,63), previa entrega de los documentos técnicos y legales requeridos para realizar los pagos.

El Municipio de San Pablo adelantó el trámite para Pago Parcial No. 2, por valor de Mil doscientos veinte millones ochocientos ochenta mil ochocientos cincuenta y cinco pesos con veintinún centavos M/Cte. ($1.220.880855,21), para un valor neto de Setecientos treinta y dos millones quinientos veintiocho mil quinientos trece pesos con trece centavos M/Cte. ($732.528.513,13) y una amortización por valor de Cuatrocientos ochenta y ocho millones trescientos cincuenta y dos mil trescientos cuarenta y dos pesos con ocho centavos ($488.352.342,08).

Con el fin de revisar el estado del Convenio Interadministrativo No. GN3323-2023, La Secretaria de Infraestructura y Minas convocó y realizó Comité Técnico No. 05 del 26 de agosto de 2024, con la participación del Municipio de San Pablo, Ing. Mario Trujillo, Contratistas de Obra Civil y de Interventoría, y en el cual se plantearon entre los compromisos: Gestionar la asignación de los recursos adicionales por parte del Municipio, Cargue de Informes Mensuales presentados por el Municipio en aplicativo Secop II, y Entrega Física de los Informes Mensuales presentados por el Municipio.



Egresos Tesorería

Gobernación de Nariño

NIT:800103923-8

No. 2023010051

Fecha: 22/09/2023

A Favor de: MUNICIPIO DE SAN PABLO — CC. O Nit: 800096143

Dirección: CL 3 5 ESQ BRR BOLIVAR — Teléfono: 3217557103

Cuenta Bancaria: Banco Davivienda 108490008758

Banco: 039-97249-4 Dpto. de Nariño - Libre Destinación

Cheque No.: TRANSFERENCIA RP — Por valor de $: 1.135.610.679,55

Valor en letras: UN MIL CIENTO TREINTA Y CINCO MILLONES SEISCIENTOS DIEZ Mil, SOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS CON CINCUENTA Y CINCUCTVS. M/C

Detalle: ANTICIPO 40% CONVENIO 3323-2023 A UNAR ESFUERZOS ADMINISTRATIVOS PARA CONSTRUCCION MURO. Cons. O Pago 2023017223

Concepto: ORDEN DE PAGO 032023010443 DEL 18-09-2023. ALUNAR ESFUERZOS ADMINISTRATIVOS TECNICOS, FINANCIEROS Y ADMINISTRATIVOS ENTRE EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO Y EL MUNICIPIO DE SAN PABLO, PARA CONTRIBUIR A LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO CONSTRUCCION MURO DE PROTECCION PARA MITIGAR EL RIESGO DE LAS VIVIENDAS ALEDAÑAS A LA QUEBRADA BATEROS DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE SAN PABLO

Orden de pago No.: COM 2023017223

MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Disponibilidad Presupuestal	Registro presupuestal	Código	Nombre de la cuenta	Valor
			TOTAL	

MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Debito	Credito

MARIA ACOSTA

MARIA F. DE LA ROSA
TESORERA GENERAL DEL DPTO.

Egresos Tesorería

Gobernación de Nariño

No. 2023017402

Fecha: 23/12/2023

A Favor de: MUNICIPIO DE SAN PABLO — DC. O Nit: 800096143

Dirección: CL 3 5 ESQ BRR BOLIVAR — Teléfono: 3217557103

Cuenta Bancaria: Banco Davivienda 108490008758

Banco: 039-97249-4 Dpto. de Nariño - Libre Destinación

Cheque No.: TRANSFERENCIA RP — Por valor de $: 714.750.545,44

Valor en letras: SETECIENTOS CATORCE MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS CON CUARENTA Y CUATROCTVS. M/C

Detalle: PAGO DE ACTA PARCIAL 1 DEL CONVENIO No. 3323-23 Cons. O Pago 2023017274

Concepto: SEGUN ORDEN DEPAGO 2023035845 DEL 12/12/2023 CONVENIO INTERADMINISTRATIVO no GN3323-2023 A UNAR ESFUERZOS ADMINISTRATIVOS, TECNICOS, FINANCIEROS Y ADMINISTRATIVOS ENTRE EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO Y EL MUNICIPIO DE SAN PABLO PARA CONTRIBUIR A LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO CONSTRUCCION MURO DE PROTECCION PARA MITIGAR EL RIESGO DE LAS VIVIENDAS ALEDAÑAS A LA QUEBRADA BATEROS DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE SAN PABLO

Orden de pago No.: COM 2023017274

MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Disponibilidad Presupuestal	Registro presupuestal	Código	Nombre de la cuenta	Valor
			TOTAL	714.750.545,44

MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Debito	Credito

ADRIANA CABRERA

VICTOR ALEXANDER GALLO CAJOME
TESORERO GENERAL DEL DPTO

PÁGINA 1 DE 2

Gobernación de NARIÑO

NIT 800.113.672-7

Egresos Tesorería

No. 2024008787

Fecha: 20/08/2024

A Favor de:	MUNICIPIO DE SAN PABLO	**CC. O Nit:**	800000143
Dirección:	CL 3 5 ESQ BRR BOLIVAR	**Telefonos:**	3217363103
Cuenta Bancaria:	Banco Davivienda- 109469266756		
Banco:	009 97248-4 Dpto. de Nariño - Libre Destinación		
Cheque No.	TRANSFERENCIA RP	**Por valor de $**	732.528.513,13
Valor en letras:	SETECIENTOS TREINTA Y DOS MILLONES QUINIENTOS VENTI OCHO MIL QUINIENTOS TRECE PESOS CON TRECE CTVS. M/C		
Detalle:	PAGO DE ACTA PARCIAL 2 DEL CONVENIO No. 3323-23 FACTURA 46 DEL 19 07 2024 SE REALIZA AMORTIZACION DEL ANTICIPO(40%) $488.352.342,00 Valor neto a pagar $732.528.513, 13 Conc		
Concepto:	O Pago 2024008834 SEGUN ORDEN DE PAGO 2024007004 2024-08-05PAGO DE ACTA PARCIAL 2 DEL CONVENIO No 3323-23, FACTURA 46 DEL 19 07 2024 Valor acta parcial No. 2 $1.540.880.467,21 Valor amortización anticipo (40%) $488.352.342,00 Valor neto a pagar $732.528.513,13		

Orden de pago No.: ODN-2024008834

MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Disponibilidad Presupuestal	Registro presupuestal	Código	Nombre de la cuenta	Valor
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
			TOTAL	732.528.513,13

MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Débito	Crédito
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

10

MARIAM CORTES

ELABORO

VICTOR ALEXANDER GALLO BAJONE
TESORERO GENERAL DEL DPTO.

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS:

El Departamento de Nariño suscribió en el mes de septiembre de 2024 el Modificatorio No. 3 al Convenio Interadministrativo No. GN3323-2023 con el objeto de ampliar el plazo de ejecución del convenio hasta el 20 de noviembre de 2024. El Modificatorio No. 3 se encuentra legalizado y cargado en la plataforma Secop II, y radicada la información física en el Departamento Administrativo de Contratación de Nariño - DAC.

ASPECTOS LEGALES :

Se encuentra legalizado el Modificatorio No. 03 de 2024 al Convenio Interadministrativo No. GN3323- 2023, en el Departamento Administrativo de Contratación de Nariño - DAC, con Adición en Recursos y Tiempo hasta el 20 de noviembre de 2024.

3.OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

- Se recordó a Interventoría continuar con el control y seguimiento a las actividades contratadas, llevando bitácora de trabajo suscrita por Contratista de Obra Civil y de Interventoría, además del Personal de los Contratistas.

- Se recordó y solicitó al Municipio de San Pablo y a Interventoría la entrega de los Informes Mensuales con cinco (05) días de antelación para revisión.

- Se recordó que el plazo del Convenio Interadministrativo No. GN3323-2023 termina el 20 de noviembre de 2024, fecha en la cual se recibirán las obras contratadas por el Municipio de San Pablo en cumplimiento al objeto del convenio.

Aprobó: Ing. Gabriel Fernando Osejo Aguirre.
Secretario de Infraestructura y Minas - SIMD.
Gobernación de Nariño.

Revisó: Ing. Luis Alberto Castillo.
Sub-Secretario de Infraestructura y Vías - SIMD.
Gobernación de Nariño.

Proyecto: Ing. Ana Cristina Vela Perdomo.
Profesional Universitaria - SIMD.
Gobernación de Nariño.

4. REGISTRO FOTOGRAFICO

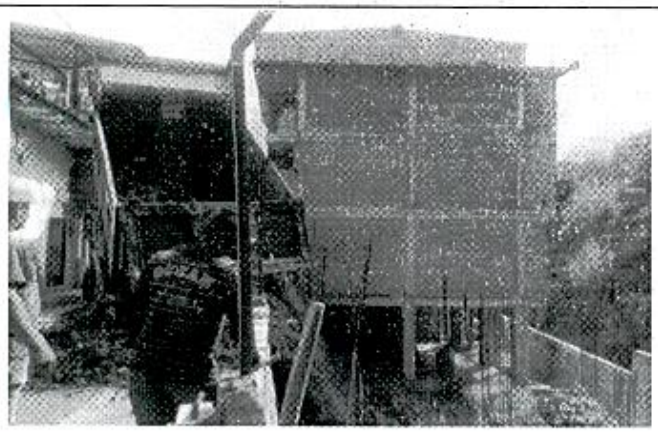


Foto 1: Acopio de material para relleno del muro de protección.

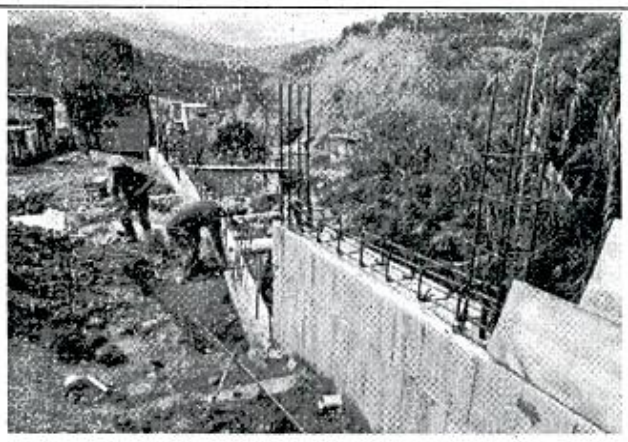


Foto 2: Armado refuerzo Muro protección a Muro sobre quebrada Bateros, para brindar seguridad a los usuarios.



Foto 3: Levantamiento de la estructura existente de la vía a rehabilitar aledaña al Muro de Protección.



Foto 4: Acopio de material de Subbase para rehabilitación de la vía.



Foto 5. Nivelación de la vía a pavimentar a través de la rehabilitación.

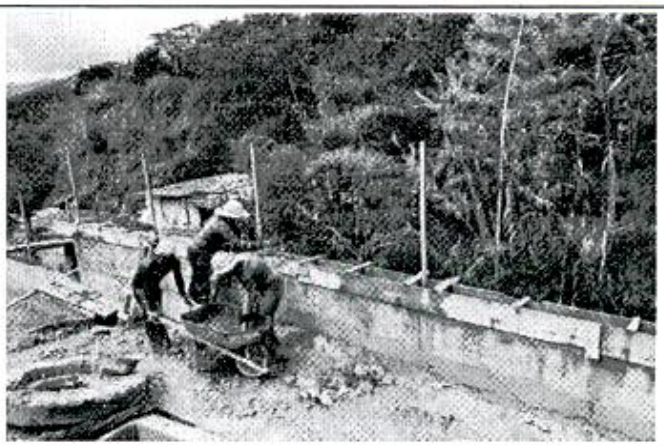


Foto 6: Muro de Cierre sobre Muro de Protección, brindando seguridad a los usuarios.

	GOBERNACIÓN DE NARIÑO SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y MINAS **SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y VIAS** **FORMATO: SEGUIMIENTO CONTRATO Y/O CONVENIO - SEGUIMIENTO FINANCIERO**	Código : SIVEYC.FTO.35-5 Versión: 0.0 Vig: 23/05/2016

6. INFORME FINANCIERO

CONVENIO No.:	**GN3323-2023.**

ACTAS	FECHA	VR. TOTAL	ACUMULADO	AMORT. ANTICIPO	VR. NETO	VR EGRESO	TOTAL DESC	COM EGRESO	FECHA PAGO
Anticipo 40%	22 de septiembre de 2023	$ 1.135.610.679,55				$ 1.135.610.679,55	$ 0,00	2023010051	22 de septiembre de 2023
Acta Pago Parcial No 01	29 de noviembre de 2023	$ 1.191.250.909,07	$ 2.326.861.588,62	$ 476.500.363,63	$ 714.750.545,44	$ 714.750.545,44	$ 476.500.363,63	2023017402	23 de diciembre de 2023
Acta Pago Parcial No 02	24 de mayo de 2024.	$ 1.220.860.855,21	$ 3.547.742.443,83	$ 488.352.342,08	$ 732.528.513,13	$ 732.528.513,13	$ 0,00	2024006767	20 de agosto de 2024
			$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		
				$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		
			$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		
			$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		
			$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		
			$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		
			$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		
			$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		
			$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		
			$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00		
		$ 2.412.131.764,28		**$ 964.852.705,71**	**$ 1.447.279.058,57**	**$ 2.582.889.738,12**	**$ 476.500.363,63**		

AVANCE FISICO	95,60%
AVANCE FINANCIERO PAGADO	90,98%

Gobernación de Nariño	GOBERNACIÓN DE NARIÑO SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y MINAS SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y VIAS **FORMATO: SEGUIMIENTO CONTRATO Y/O CONVENIO - CONTROL POLIZAS**	Código.: SIVEYC.FTO.35-6 Versión: 0.0 Vig: 23/05/2016

6. CONTROL POLIZAS

CONVENIO No.: GN3323-2023.

GARANTIAS:	Aseguradora Solidaria de Colombia.
Póliza No.:	436-47-994000058928.

ANEXO 0			**FECHA APROBACION:**	26/07/2023	**FECHA EXPEDICION:**	30/06/2023
DETALLE	**VALOR**	**%**	**FECHA INICIAL**	**FECHA FINAL**	**OBSERVACIONES**	**ALERTA**
Cumplimiento.	$ 284.402.669,89	10%	28-jun-23	28-oct-24	Actualización según Acta de Inicio.	(29)
Anticipo.	$ 1.061.522.627,00	100%	28-jun-23	28-oct-24	Actualización según Acta de Inicio.	

ACTUALIZACION DE POLIZA - ANEXO 1			**FECHA APROBACION:**	1/08/2023	**FECHA EXPEDICION:**	1/08/2023
DETALLE	**VALOR**	**%**	**FECHA INICIAL**	**FECHA FINAL**	**OBSERVACIONES**	**ALERTA**
Cumplimiento.	$ 284.402.669,89	10%	31-jul-23	30-nov-24	Actualización según Acta de Inicio.	4
Anticipo.	$ 1.061.522.627,00	100%	31-jul-23	30-nov-24	Actualización según Acta de Inicio.	

ACTUALIZACION DE POLIZA - ANEXO 2			**FECHA APROBACION:**	23/08/2023	**FECHA EXPEDICION:**	18/08/2023
DETALLE	**VALOR**	**%**	**FECHA INICIAL**	**FECHA FINAL**	**OBSERVACIONES**	**ALERTA**
Cumplimiento.	$ 284.402.669,89	10%	28-jun-23	30-nov-24	Actualización según Modificatorio No. 01.	4
Anticipo.	$ 1.061.522.627,00	100%	28-jun-23	30-nov-24	Actualización según Modificatorio No. 01.	

ACTUALIZACION DE POLIZA - ANEXO 3			**FECHA APROBACION:**	4/09/2023	**FECHA EXPEDICION:**	4/09/2023
DETALLE	**VALOR**	**%**	**FECHA INICIAL**	**FECHA FINAL**	**OBSERVACIONES**	**ALERTA**
Cumplimiento.	$ 284.402.669,89	10%	31-jul-23	30-nov-24	Actualización según Modificatorio No. 01.	4
Anticipo.	$ 1.061.522.627,00	100%	31-jul-23	30-nov-24	Actualización según Modificatorio No. 01.	

	GOBERNACIÓN DE NARIÑO SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y MINAS SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y VIAS FORMATO: SEGUIMIENTO CONTRATO Y/O CONVENIO- BALANCE CONTRATACION VS EJECUCION	Código.: SIVEYC.FTO.35-7 Versión: 0.0 Vig: 23/05/2016

7. BALANCE CONTRATACION VS EJECUCION (ESTADO FINAL)

CONVENIO No	GN3323-2023.

CAP.	ACT	DETALLE - ACTIVIDADES	VR CONTRATADO	VR EJECUTADO	DIFERENCIA	%
1.01	Particular 1	Desvio temporal de cause quebrada baleros con material seleccionado recubierto con estopas de polietileno.	$ 40.561.012,70	$ 40.561.012,70	$ -	0%
1.02	Particular 2	Excavación en material conglamerado	$ 46.402.258,21	$ 46.402.258,21	$ -	0%
1.03	210.2.1 P	Excavación en roca	$ 77.845.529,35	$ 77.845.529,35	$ -	0%
1.04	201.7	Demolición de estructuras incluye desalojo	$ 6.727.130,39	$ 6.727.130,39	$ -	0%
1.05	900.2.2	Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y préstamos para distancias mayores de mil metros (1.000 m) medidos a partir de cien metros (100 m).	$ 13.667.475,28	$ 13.667.475,28	$ -	0%
1.06	630.1.7 P	Concreto ciclópeo 60% concreto 2000 PSI - 40% Rejón. mezclado in situ.	$ 149.799.312,47	$ 142.148.678,40	$ (7.650.634,07)	-5%
1.07	630.1.3.1 P	Concreto reforzado resistencia 4000 PSI, mezclado in situ.	$ 829.671.421,80	$ 829.671.421,80	$ -	0%
1.08	640.1	Acero de refuerzo Fy 420 Mpa.	$ 724.908.980,20	$ 724.908.980,20	$ -	0%
1.09	Particular 3	Entibado para muro.	$ 46.304.760,45	$ 46.304.760,45	$ -	0%
1.10	610.2	Relleno para estructuras con recebo.	$ 584.398.543,35	$ 584.398.543,35	$ -	0%
1.11	673.2	Material granular drenante para filtro.	$ 17.264.656,54	$ 17.264.656,54	$ -	0%
1.12	673.1.1 P	Geotextil NT 2500.	$ 11.554.105,68	$ 11.554.105,68	$ -	0%
1.13	663.1 P	Tubería de plástico tipo PVC 2" para lagrimales	$ 3.627.474,55	$ 3.627.474,55	$ -	0%
1.14	663.1 P	Tubería de plástico tipo PVC perforada 4".	$ 9.348.459,20	$ 9.348.459,20	$ -	0%
1.15	Particular 4	Desmonte de puentes en madera existentes Ancho=1.3 m, longitud 20 metros incluye desalojo.	$ 2.849.542,80	$ 2.849.542,80	$ -	0%
1.16	Particular 5	Desmonte de muro en ladrillo y malla de cerramiento en mal estado incluye desalojo	$ 2.733.744,00	$ 2.733.744,00	$ -	0%
1.17	Particular 6	Cerramiento en malla eslabonada h=1,5 m, con tubería metálica, angulos de 1" para borde de la malla, columnetas en concreto h=0,5m y muro en ladrillo comun a la vista	$ 32.610.578,00	$ 32.610.578,00	$ -	0%
1.18	Particular 7	Puertas metálicas en malla de cerramiento de 1 m x 2 m y tubo de 1 1/2".	$ -	$ -	$ -	-
1.19	Particular 8	Andenes en concreto de 3000 PSI, espesor 0,1 m (incluye malla electrosoldada 5mm)	$ 20.775.955,20	$ 5.000.000,00	$ (15.775.955,20)	-76%
2.01	201.7	Demolición de estructuras de pavimento incluye desalojo	$ -	$ -	$ -	-
2.02	310.1	Conformación de la calzada existente.	$ -	$ -	$ -	-
2.03	210.2.2	Excavación en material común de la explanación y canales incluye escombrera	$ -	$ -	$ -	-
2.04	900.2.2	Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y préstamos para distancias mayores de mil metros (1.000 m) medidos a partir de cien metros (100 m).	$ -	$ -	$ -	-
2.05	311.1	Mejoramiento a través de afirmado.	$ -	$ -	$ -	-
2.06	330.3.2	Base granular clase C gradación gruesa	$ 13.483.766,79	$ 4.045.130,04	$ (9.438.636,75)	-70%
2.07	500.1.2 P	Pavimento en concreto hidráulico - NT1 - MR 3,8 Mpa.	$ 91.701.077,83	$ 27.510.323,35	$ (64.190.754,48)	-70%
2.08	672.1	Bordillo de concreto vaciado in situ, no incluye la preparación de la superficie de apoyo (0,20 x 0,15 m).	$ 10.776.438,40	$ -	$ (10.776.438,40)	-100%
2.09	640.1	Acero de refuerzo Fy 420 Mpa.	$ 3.177.151,80	$ 1.270.860,72	$ (1.906.291,08)	-60%
2.10	710.1.1	Señal vertical de tránsito tipo SR, SP y/o SI, tablero en lámina con lámina retrorreflectiva tipo IV (75x75 cm).	$ -	$ -	$ -	-
2.11	700.1	Línea de demarcación con pintura en frio.	$ -	$ -	$ -	-
		Concreto reforzado resistencia 3000 PSI, mezclado in situ.	$ 5.879.300,54	$ 587.930,05		0%
		Caja de Inspección 1 x 1 m., h 1 m., en concreto reforzado, incluye tapa de concreto con herraje	$ 2.695.238,00	$ 2.695.238,00		0%
		Sumidero sencillo tipo b, incluye tapa y acero de refuerzo fy = 420 Mpa	$ 5.229.255,20	$ 5.229.255,20		0%
		Implementar PAGA.	$ 60.821.042,54	$ 58.144.916,67	$ (2.676.125,87)	-4%
		Implementar Plan de Manejo Ambiental.	$ 36.975.122,46	$ 35.348.217,07	$ (1.626.905,39)	-4%
		Interventoria.	$ 185.220.132,30	$ 177.070.446,48	$ (8.149.685,82)	-4%
		COSTO TOTAL	$ 3.037.007.466,03	$ 2.909.524.668,48	$ (127.482.797,55)	-4%

