ACTA No. 4182.010.26.1.10	FECHA:	26/11/2024
	HORA INICIAL:	6:45 a.m.
OBJETIVO: Realizar Comité Técnico No.8 del Contrato de obra No. 4182.010.26.1.561-2024 y el contrato de consultoría No. 4182.010.26.1.563-2024	HORA FINAL:	7:00 a.m.
	LUGAR: Oficina UAESP – Despacho de la Dirección	

ASISTENTES:
Andrea Vivas – UAESP – Asesora.
María Paula Guerrero - CONSORCIO MNTY-INFINITA.
Evelyn Diaz – CONSORCIO MNTY-INFINITA – Representante Legal Interventoría.
Stephany Montoya Cardona – UAESP – Contratista.
Frank Ramírez - CONSORCIO MNTY-INFINITA.
Julio Cesar Aroca Calvo – UAESP – Apoyo a la Supervisión – Contratista.
Luis Fernando García Arizabaleta – UAESP – Contratista.
Leonardo Martínez – CONSORCIO PTARD VALLE – Ingeniero Residente de Obra.
María del Rosario Cuellar – UAESP – Contratista.
Marcela Córdoba Arce – UAESP – Contratista.
Walter Camilo Murcia Lozano – Director.
Juan Carlos Jurado Rey – UAESP – Coordinador Equipo AP-SB – Contratista.

AUSENTES: N/A

INVITADO: N/A

ORDEN DEL DÍA:

1. Introducción a cargo del Ingeniero Juan Carlos Jurado.
2. Presentación de avances de ejecución de obra y curva "S" a cargo de la Ing. Evelyn Diaz de la Interventoría CONSORCIO MNTY INFINITA.
3. Revisión de Compromisos.
4. Establecimiento de nuevos compromisos.

DESARROLLO:


INTRODUCCIÓN A CARGO DEL INGENIERO JUAN CARLOS JURADO


El comité se desarrolló en las instalaciones de la UAESP, más específicamente en el


Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su copia, alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.


despacho del Director. El Ingeniero Juan Carlos Jurado Rey, presenta al director los datos generales del proyecto de obra (alcances del proyecto, necesidad de balanceo inicial de obra, priorización de actividades en alcantarillado, avances presentados en el comité anterior, estado general del proyecto y necesidad de adicional para terminar el alcantarillado y acometer las obras de mejoramiento en la línea 2 de la PTARD). Igualmente, informa que el contratista de obra paso el Acta Parcial de Cobro No.1.


Seguido, el interventor hace la presentación del estado actual del proyecto, apoyándose en una presentación de Power Point.



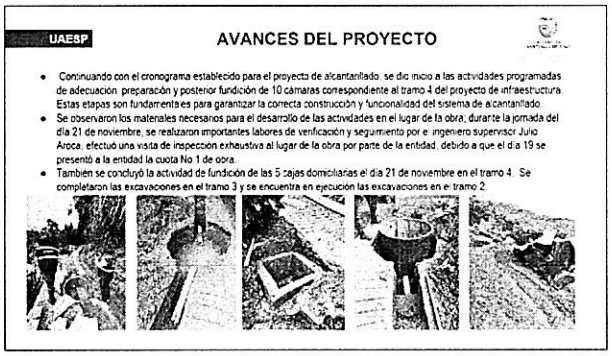

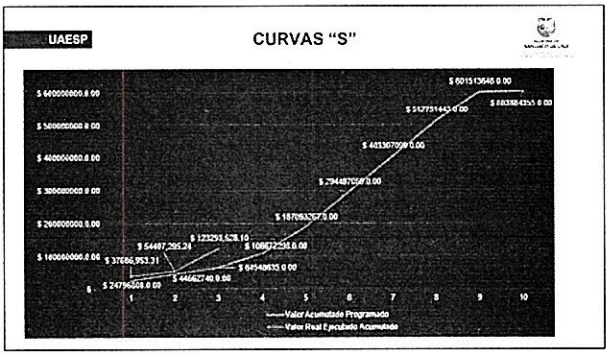

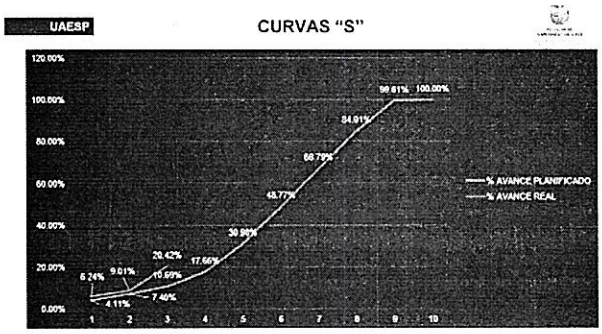

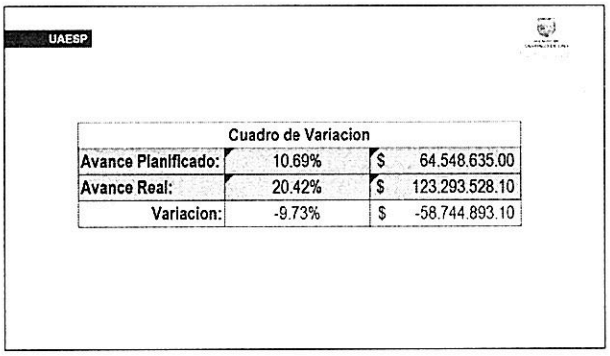

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su copia, alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.

PRESENTACIÓN DE AVANCES DE EJECUCIÓN DE OBRA Y CURVA "S"

Apoyándose en la presentación de Power Point, la interventoría presenta fotografías del avance de obra e informa que, en la semana presente, se está trabajando en tres (3) frentes correspondientes a los tramos 4, 3 y 2. Se establece que el avance proyectado de la obra es de 10,69% y el avance real es de 20,42% con una variación positiva de 9,73% (adelantado).

La interventoría informa que el constructor ha avanzado según el cronograma establecido para el proyecto de alcantarillado. Así mismo informa que se iniciaron las actividades programadas de adecuación, preparación y posterior fundición de 10 cámaras correspondiente al tramo 4 del proyecto de infraestructura, así como la fundición de 5 cajas de inspección domiciliares. Se ha instalado el 100% de tubería en el tramo 4 y el 50% de tubería en el tramo 3, así como la excavación en el tramo 2. Aun no se han iniciado actividades en el tramo 1.

Así mismo la interventoría informa que se aprobó y paso para tramite de pago el Acta Parcial de Pago No.1 por un valor total de $ 282,485,596, correspondiente al 46,78% del valor total de la obra.

REVISION DE COMPROMISOS ADQUIRIDOS EN EL COMITÉ PASADO

El ingeniero Aroca presenta el cumplimiento de los compromisos adquiridos en el comité del día 15 de noviembre de 2024, a saber:

QUE HACER	RESPONSABLE	FECHA DE COMPROMISO	CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES
El contratista deberá presentar un Plan de Contingencia (es la tercera vez que se solicita este requerimiento, pues también se había solicitado en los comités de los días 1 y 8 de noviembre).	Ingeniero Leonardo Martínez – CONSORCIO PTARD VALLE - Contratista de Obra	18 de noviembre de 2024	Si	El contratista envío la información a la interventoría antes del 18 de noviembre de 2024.
El contratista se compromete a fundir la mayor cantidad de cámaras posibles de alcantarillado tipo B de EMCALI		Entre el 15 al 22 de noviembre de 2024	Si	Se han fundido 10 cámara de alcantarillado tipo B según normas de EMCALI en el tramo 4.
Cumplir con el Cronograma presentado		Entre el 15 al 22 de noviembre de 2024	Si	La ejecución física esta por encima del cronograma ajustado en un 9,73% (ejecución 20,42% y proyectado 10,69%)

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su copia, alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.

QUE HACER	RESPONSABLE	FECHA DE COMPROMISO	CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES
Revisar y aprobar mediante acta (si el documento cumple), el cronograma presentado por el constructor y el Plan de Contingencia para el cumplimiento de este.	Evelyn Tatiana Diaz Representante Legal Interventoría CONSORCIO MINTY INFINITA	18 de noviembre de 2024	Si	La interventoría envío por correo electrónico el Aval plan de contingencia del contrato de obra No. 4182.010.26.1.563-2024.
Proyectar en el próximo comité el informe de interventoría y las fotos que evidencien el avance. Igualmente, una presentación corta con fotos, avance (proyectado, ejecutado) y curva "S".		22 de noviembre de 2024	Si	La interventoría envío y presento a través de Power Point, las fotos que evidenciaban el avance y la curva "S".

OBSERVACIONES GENERALES (Propuestas, Cambios y/o Adiciones):

El Arquitecto Luis Fernando García A., pregunta al constructor sobre la cantidad de formaletas metálicas para cámaras que están utilizando en la obra, a lo que el Ing. Leonardo Martínez informa que en el sitio de obra se tienen 4 formaletas metálicas y que considera que son suficientes.

El director manifiesta que:

- ✓ Si van a presentar Acta parcial de Cobro No.2, esta debe presentarse a más tardar la próxima semana, pues el sistema cierra el 6 de diciembre.
- ✓ Se espera que para el próximo comité se presente un avance significativo.

TAREAS Y COMPROMISOS ESTABLECIDOS EN ESTA REUNIÓN

QUE HACER	RESPONSABLE	FECHA DE COMPROMISO
Cumplir con el Cronograma presentado	Ingeniero Leonardo Martínez – CONSORCIO PTARD VALLE - Contratista de Obra	3 de diciembre de 2024
Proyectar en el próximo comité el informe de interventoría y las fotos que evidencien el avance. Igualmente, una presentación corta con fotos, avance (proyectado, ejecutado) y curva "S".	Evelyn Tatiana Diaz Representante Legal Interventoría CONSORCIO MINTY INFINITA	3 de diciembre de 2024

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su copia, alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.

Firmas (responsables)

NOTA: Se anexa listado de asistencia compuesto por un (1) folio(s).

Elaboró: Julio Cesar Aroca Calvo – Contratista

FIRMA: _____
NOMBRE: JULIO CESAR AROCA C.
CONTRATISTA

FIRMA: _____
NOMBRE: JUAN CARLOS JURADO R.
CONTRATISTA

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su copia, alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN TECNOLÓGICA Y DE LA INFORMACIÓN GESTIÓN DOCUMENTAL	MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG) LISTADO DE ASISTENCIA	MAGT04.03.P003.F007	
		VERSIÓN	002

ACTA DE REUNIÓN N° 4182.010.26.1.10

FECHA: 26 / 11 / 2024
HORA INICIAL: 6:45 a.m
HORA FINAL: 7:00 a.m.

OBJETIVO: Realizar Comité técnico No. 8 del Contrato de obra No. 4182.010.26.1.561-2024 y el contrato de Consultoria No. 4182.010.26.1.563-2024

LUGAR: UAESP.- Despacho del Director.

ASISTENTES

N°	Nombre	Organismo/Entidad	Teléfono	Correo Electrónico	Firma
1	Andrea Vivas	Uaesp	3148923774	andrea000016@hotmail.co	
2	María Paula Guerrero	Interventoría	3044929886	maria.p.guerrero.202@gmail.com	
3	Evelyn Tatiana Diaz	Interventoria	3138858453	ediaz.interventoria@gmail.com	
4	Stephany Montaño Cardona	Uaesp	3173197201	mstephany280@gmail.com	
5	Frank Ramirez	Interventoría	3173735764	frankingcivil19@gmail.com	
6	Julio Cesar Aroca C.	UAESP	3508263162	julio.aroca27@gmail.com	
7	LUIS FERNANDO GARCIA	UAESP	3155766268	[illegible]	
8	LEONARDO MARTINEZ TORRES	CONSULTOR	3012445987	ingenier.residente2@proquinal.co	
9	ROSANA QUELLAZ	UAESP	3012170888	rosaellaz2012@gmail	
10	Marcela Cordoba Arco	UAESP	3183831675	marcelacoar@gmail.com	Marcela CA
11	Walter Camilo Murcia Lotame	UAESP	3023896659	walter.murcia@cali.gov.co	
12	JUAN C. JURADO	UAESP	3124491612	juan.jurado@cali.gov.co	

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.
