
**INFORME DE ACTIVIDADES No. 2 Y FINAL**

Informe correspondiente al periodo entre el 18 de junio de 2024 y el 29 de junio de 2024
Fecha de elaboración: 30 de junio de 2024.

**DATOS GENERALES DEL CONTRATO:**

| | |
|---|---|
| Convenio No. | Convenio solidario No. 005-2024 |
| Fecha del contrato | 23 de abril de 2024 |
| Objeto | "AUNAR ESFUERZOS PARA EL MANTENIMIENTO DEL ACUEDUCTO DEL CORREGIMIENTO CATIVO DEL MUNICIPIO DE SANTA FE DE ANTIOQUIA." |
| CONTRATISTA | JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL CORREGIMIENTO DE CATIVO |
| NIT | 901.047.117-4 |
| CONTRATANTE | MUNICIPIO DE SANTA FE DE ANTIOQUIA |
| NIT | 890.907.569-1 |
| Plazo inicial | 1 mes |
| Costo inicial | $36.392.625 |
| Fecha de inicio | 30 de mayo de 2024 |
| Fecha de terminación | 29 de junio de 2024 |

## LOCALIZACIÓN

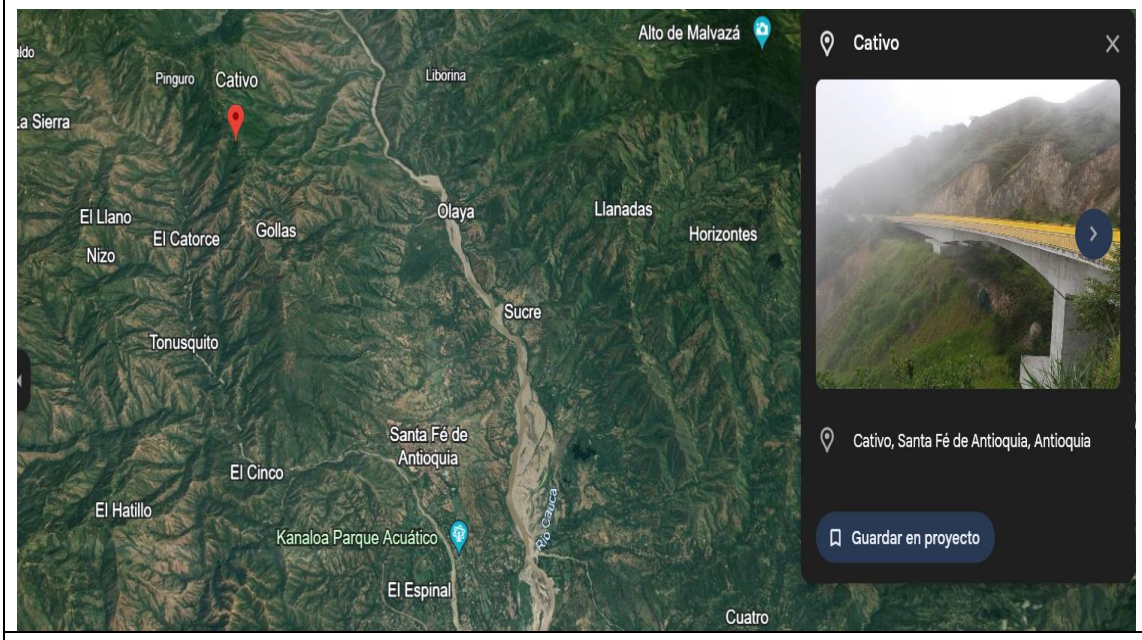


Localización Georreferenciada Cativo

Con el propósito de entregar informe Nro. 02 y final de la ejecución del contrato Convenio solidario 005-2024, se procede a relacionar las actividades específicas que se realizar para su cumplimiento.

**OBJETIVO:** Rendir informe de actividades del periodo comprendido el 18 de junio de 2024 y el 29 de junio de 2024 para la ejecución de actividades de mantenimiento de acueducto en el Corregimiento de Cativo mediante el convenio solidario 005 de 2024 cuyo objeto es: "AUNAR ESFUERZOS PARA LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO AL ACUEDUCTO DEL CORREGIMIENTO DE CATIVO DEL MUNICIPIO DE SANTA FE DE ANTIOQUIA"

**ALCANCE:** El alcance del proyecto abarca la ejecución de actividades de mantenimiento general en el sistema de acueducto del corregimiento de Cativo, en el Municipio de Santa Fe de Antioquia. Estas actividades incluyen inspección, limpieza, reparación de fugas, y mejora de la infraestructura hidráulica existente. Además, se realizarán trabajos manuales para el movimiento de tierras necesarios para garantizar el acceso adecuado a las estructuras del acueducto y asegurar su funcionamiento óptimo.

El objetivo principal del proyecto es mejorar significativamente la infraestructura del acueducto, asegurando un suministro de agua confiable y de calidad para los

habitantes del corregimiento de Cativo. Esto no solo contribuirá a satisfacer las necesidades básicas de la comunidad, sino que también apoyará el desarrollo agropecuario local, fomentará actividades culturales y turísticas, y en general, mejorará las condiciones de vida de los residentes.

Se espera que estas mejoras en el sistema de acueducto contribuyan a fortalecer la interconexión rural necesaria para el desarrollo integral de la comunidad, proporcionando una infraestructura robusta que resista las condiciones climáticas y geográficas propias de la región. Además, se buscará maximizar la eficiencia y sostenibilidad del sistema, implementando prácticas de mantenimiento preventivo y correctivo que aseguren su operación continua a largo plazo.

En resumen, el proyecto tiene como propósito fundamental mejorar la infraestructura del acueducto en el corregimiento Cativo, promoviendo el desarrollo socioeconómico local y mejorando la calidad de vida de los habitantes del Municipio de Santa Fe de Antioquia.

A continuación, se relaciona la totalidad de las actividades, las cuales fueron cumplidas según la necesidad o requerimientos del contratante:

| CAPITULO | ÍTEM | DESCRIPCIÓN |
|---|---|---|
| 1 | | **BOCATOMA** |
| | 1,1 | Limpieza y mantenimiento de bocatoma, incluye retiro de sedimentos gruesos y delgados, limpieza general |





| | | |
|---|---|---|
| **2** | | **LÍNEA DE ADUCCIÓN, CONDUCCIÓN Y DISTRIBUCCIÓN** |
| | 2,1 | Rocería y limpieza de caminos para acceso a tubería |





| | | |
|---|---|---|
| **3** | | **TANQUE DE ALMACENAMIENTO** |
| | 3,1 | Limpieza de tanque de almacenamiento, incluye retiro de sedimentos y residuos que se encuentran dentro del tanque |





| | | |
|---|---|---|
| **4** | | **REEMPLAZO DE TUBERÍAS** |
| | 4,1 | Retiro de tubería de 2" que se encuentra deteriorada |









| | | |
|---|---|---|
| **4** | | **REEMPLAZO DE TUBERÍAS** |
| | 4,2 | Suministro, transporte e instalación de tubería de 2" PVC - P, unión mecánica |










## ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL PERIODO PARA EL ACTA No.1

| CAP | ÍTEM | DESCRIPCIÓN | UND | CANT | V/UNITARIO incluye (A) | V/TOTAL incluye (A) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | **BOCATOMA** | | | | |
| | 1,1 | Limpieza y mantenimiento de bocatoma, incluye retiro de sedimentos gruesos y delgados, limpieza general | und | 1 | $ 1.031.249 | $ 1.031.249 |
| 2 | | **LÍNEA DE ADUCCIÓN, CONDUCCIÓN Y DISTRIBUCCIÓN** | | | | |
| | 2,1 | Rocería y limpieza de caminos para acceso a tubería | ml | 2000 | $ 8.089 | $ 16.177.508 |
| 3 | | **TANQUE DE ALMACENAMIENTO** | | | | |
| | 3,1 | Limpieza de tanque de almacenamiento, incluye retiro de sedimentos y residuos que se encuentran dentro del tanque | und | 1,00 | $ 808.875 | $ 808.875 |
| 4 | | **REEMPLAZO DE TUBERÍAS** | | | | |
| | 4,1 | Retiro de tubería de 2" que se encuentra deteriorada | ml | 10.5 | $ 17.050 | $ 178.680,54 |
| | | | | | **TOTAL** | **$18.196.312,5** |

**Se incluye el componente de administración del 9% en los valores unitarios y valores totales.**

## ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL PERIODO PARA EL ACTA No.2 OBJETO DEL PRESENTE INFORME

| CAP | ÍTEM | DESCRIPCIÓN | UND | CANT | V/UNITARIO incluye (A) | V/TOTAL incluye (A) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | | **REEMPLAZO DE TUBERÍAS** | | | | |
| | 4,1 | Retiro de tubería de 2" que se encuentra deteriorada | ml | 276,52 | $ 17.049,51 | $ 4.714.528,21 |
| | 4,2 | Suministro, transporte e instalación de tubería de 2" PVC - P, unión mecánica | ml | 287,00 | $ 46.974,86 | $ 13.481.784,25 |
| | | | | | **TOTAL** | **$18.196.312,5** |

**Se incluye el componente de administración del 9% en los valores unitarios y valores totales**

## ASPECTOS FINANCIEROS – SITUACIÓN ACTUAL

El contrato de obra se ha ejecutado en un **100%,** ya se realizó el desembolso del primer 50% equivalente a **$18.196.312,5**, y mediante este cobro se solicita el segundo pago por el 50% restante **$18.196.312,5.**

a continuación, se presenta el avance financiero:

| | | | |
|---|---|---|---|
| COSTO DIRECTO | $33.387.729 | | |
| ADMINISTRACIÓN | $3.004.896 | 9% | |
| VALOR TOTAL DEL CONVENIO | $36.392.625 | | |
| **VALOR EJECUTADO ACTA DE AVANCE #1 CONTRATO DE OBRA** | **$ 18.196.312,5** | % EJECUTADO ACTA DE AVANCE #1 | 50% |
| **VALOR EJECUTADO ACTA DE AVANCE #2 CONTRATO DE OBRA** | **$ 18.196.312,5** | % EJECUTADO ACTA DE AVANCE #2 | 50% |
| VALOR ACUMULADO CONTRATO DE OBRA | $ 36.392.625 | % TOTAL ACUMULADO | 100% |
| SALDO PENDIENTE POR EJECUTAR CONTRATO DE OBRA | $ 0 | | |

- Verificación de las novedades del personal y del pago de aportes al Sistemade Seguridad Social Integral.

| Periodo de Cotización | N° Planilla | Pago Salud | Pago Pensión | Pago Caja de compensación | Pago ARL | Para fiscal | Total, pagadoen el periodo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JUNIO | 9472183528 | $471.300 | $603.300 | $150.900 | $92.100 | $189.000 | $1.570.100 |

- Resumen de la ejecución de los recursos:

| | |
|---|---|
| Valor del Convenio (RECURSOS) | $36.392.625 |
| Aporte en especie | $2.000.000 |
| Valor ejecutado acta 1 | $18.196.312,5 |
| Valor ejecutado acta 2 | $18.196.312,5 |
| Pagos Realizados (Acumulado) | $18.196.312,5 |
| Saldo a favor del contratista | $18.196.312,5 |
| Porcentaje de ejecución financiera a la fecha | 50% |



**JUAN DAVID HIDALGO HIGUITA**
Representante legal
Junta de Acción Comunal Corregimiento de Cativo
