Aguazul, 04 de diciembre de 2024

Ingeniero:
JUAN MIGUEL SANDOVAL GUTIÉRREZ
Secretario de Infraestructura
Supervisor contrato de prestación de servicios No. 0620-2024
Aguazul

Ref.: Contrato de prestación de servicios profesionales y apoyo a la gestión No 2024-0620

Asunto: Informe de ejecución de actividades No 3 - ACTA No.4 PARCIAL 3-

Por medio de la presente me permito presentar informe No. 3 -acta 04 parcial 3 de ejecución de actividades, las cuales se desarrollaron durante el periodo de tiempo comprendido entre el 01/11/2024 al 30/11/2024, de acuerdo al contrato de la referencia, cuyo objeto contractual es "PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL CARGUE DE INFORMACIÓN, ACTUALIZACIÓN, REPROGRAMACIÓN, GENERACIÓN DE REPORTES Y LAS ALERTAS EN LA PLATAFORMA GESPROY 3.0 DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN FINANCIADOS CON RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS SGR QUE SE ENMARQUEN EN EL PROCESO DE GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA, EN EL MUNICIPIO DE AGUAZUL CASANARE."

Sin otro particular,

GENNY PAOLA SERRANO DELGADO
C.C. No. 47.442.426 de Yopal
Contratista

INFORME DE ACTIVIDADES
No. 3

Aguazul, 04 de diciembre del 2024.

Doctor(a)
JUAN MIGUEL SANDOVAL GUTIERREZ
SECRETARIO(A) DE INFRAESTRUCTURA
Ciudad

Ref: Informe de Actividades No. 3 del CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES No. 0620 - MA-CD-SI-543-2024 de 2024-09-16.

Cordial Saludo

En cumplimiento de las obligaciones del CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES:

NUMERO	:	0620
TIPO CONTRATO	:	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES
OBJETO	:	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL CARGUE DE INFORMACIÓN, ACTUALIZACIÓN, REPROGRAMACIÓN, GENERACIÓN DE REPORTES Y LAS ALERTAS EN LA PLATAFORMA GESPROY 3.0, DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN FINANCIADOS CON RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS SGR QUE SE ENMARQUEN EN EL PROCESO DE GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA, EN EL MUNICIPIO DE AGUAZUL, CASANARE.
VALOR	:	$17.000.000,00 MCTE.
VALOR ADICIONAL	:	$0,00 MCTE.
VALOR FINAL	:	$17.000.000,00 MCTE.
PLAZO	:	Tres (3) MESES Y Diez (10) DIAS
PRORROGA	:	
FECHA INICIO	:	2024-09-17
FECHA TERMINACIÓN	:	2024-12-26

A continuación, se relacionan las actividades o tareas realizadas en el período comprendido desde el 01/11/2024 hasta el 30/11/2024.

ACTIVIDAD DEL CONTRATO	ACTIVIDAD REALIZADA Y EVIDENCIAS
Elaboración de Informes Mensuales sobre Alertas en Proyectos de Inversión Elaborar un informe mensual que actualice el estado de las alertas presentadas en los proyectos de inversión a cargo de la Secretaría de Infraestructura. Estos proyectos abarcan las fases de: sin contratar, en ejecución, terminados y para cierre, financiados con recursos del Sistema General de Regalías (SGR).	En Atención al cumplimiento de esta actividad y de acuerdo con la designación dada por el supervisor se presenta una actualización del estado de alertas de los proyectos de inversión financiados con recursos del Sistema General de Regalías (SGR) y ejecutados por el Municipio de Aguazul, de acuerdo con lo dispuesto en la actividad No. 1 del Contrato CPS No. 0620-2024 de "Elaboración de Informes Mensuales sobre Alertas en Proyectos de Inversión a cargo de la Secretaría de Infraestructura. Estos proyectos abarcan las fases de: sin contratar, en ejecución, terminados y para cierre, financiados con recursos del Sistema General de Regalías (SGR).", del periodo 01 de noviembre al 30 de noviembre de 2024 Evidencia: Informe de alertas Medio físico: 3 folios Medio digital: Anexo 1

Informe Mensual sobre la Ejecución de Proyectos Activos en GESPROY 3.0 Elaborar un informe mensual que detalle el reporte de información sobre la ejecución de los proyectos en estado activo cargados en el aplicativo GESPROY 3.0 del Sistema General de Regalías (SGR).	En Atención al cumplimiento de esta actividad y de acuerdo con la designación dada por el supervisor se elaboró un informe de estado de los proyectos de inversión financiados con recursos del Sistema General de Regalías (SGR) y ejecutados por el Municipio de Aguazul en la Secretaria de Infraestructura, de acuerdo con lo dispuesto en la actividad No. 2 del Contrato CPS No.0620 -2024 de "Elaborar un informe mensual que detalle el reporte de información sobre la ejecución de los proyectos en estado activo cargados en el aplicativo GESPROY 3.0 del Sistema General de Regalías (SGR).". Actualmente el sistema GESPROY registra un total de 17 proyectos que se relacionan a continuación, en sus diferentes estados: en ejecución, terminado y para cierre. del periodo 01 de noviembre al 30 de noviembre e 2024 Evidencia: Informe de estado de proyectos Medio: Medio físico: 20 folios Medio digital: Anexo 2
Asistencia Profesional en la Gestión de Proyectos de Inversión Brindar asistencia profesional a los responsables de proyectos de inversión en temas relacionados con conflictos en el manejo de la plataforma, reprogramaciones y/o el cargue de información. Esta asistencia incluye la resolución de alertas y la mejora del índice de gestión de los proyectos.	En Atención al cumplimiento de esta actividad y de acuerdo con la designación dada por el supervisor, se realizó el cargue de acta de liquidación del contrato N. 380-2023 901718256-CONSORCIO INTER UNION CHARTE del proyecto **BPIN 2020850100007 implementación de sistemas solares fotovoltaicos individuales en zonas rurales no interconectadas del municipio de Aguazul Casanare**, se realizó borrado de ejecución con el fin de ajustar la actividad de interventoría la cual estaba en un porcentaje del 100, y en realidad va acorde al avance de la obra Al proyecto **BPIN '2021005850074 denominado Mejoramiento A NIVEL DE PAVIMENTO DEL PR 2+900 AL PR 10+900 DEL ANILLO VIAL CUPIAGUA CUSIANA DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL DEPARTAMENTO DE Casanare,** se realizó el registro de la ampliación a la suspensión al contrato de OBRA e INTERVENTORIA, se amplía la suspensión por un término de 25 días a partir del 16 de noviembre al 11 de diciembre de 2024. Se realizo el registro de acta de liquidación no requiere al contrato de APOYO A LA SUPERVISION N. 600-2022 7181366-EDGAR ENRIQUE LEGUIZAMON TOVAR Registro de pólizas contrato de interventoría n. 566-2022 900426155-PROYECTISTAS ASOCIADOS SAS Evidencia: Asistencia profesional Medio: Medio físico: 2 folios Medio digital: Anexo 3
Cargue Oportuno de Información en GESPROY 3.0 Realizar el cargue oportuno de la información resultante de la ejecución de los proyectos de inversión en la plataforma GESPROY 3.0, según lo establecido en el procedimiento E-GD-P-14: Seguimiento al Avance Físico de los Proyectos de Inversión Financiados con Recursos del SGR.	En Atención al cumplimiento de esta actividad y de acuerdo con la designación dada por el supervisor, se realizó el cargue de información del siguiente proyecto en el aplicativo GESPROY: Proyecto **BPIN 2019850100004 ADECUACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL EQUIPAMIENTO INSTITUCIONAL DENOMINADO PLAZA DE TOROS EN EL MUNICIPIO DE AGUAZUL**, se realizó reprogramación del proyecto, la nueva fecha de terminación es en diciembre, se reportó octubre 2024, se actualizo registro fotográfico etapa de ejecución. Ejecución Física 83,91% Ejecución Financiera 87,91%, se realizó cargue de ejecución al proyecto Se registro información al proyecto **BPIN '2022005850010 denominado Construcción Parador y obras de urbanismo en**

	el parque del arroz del municipio de Aguazul departamento de Casanare, Reporte de ejecución del mes de octubre de 2024, Ejecución Física 86,15%Ejecución Financiera 87,88% Evidencia: Cargue de información Medio: Medio físico: 2 folios Medio digital: Anexo 4
Otras Actividades Inherentes al Objeto Contractual Ejecutar las demás actividades que sean designadas por el supervisor del contrato, siempre y cuando estén relacionadas con el objeto contractual.	En Atención al cumplimiento de esta actividad y de acuerdo con la designación dada por el supervisor, en el periodo comprendido se cargaron al aplicativo Gesproy las siguientes resoluciones que dan cierre a los proyectos BPIN que a continuación se mencionan: **BPIN 2020850100008 Construcción de placa polideportiva cubierta y obras complementarias para el parque del barrio Sevilla en el municipio de Aguazul Casanare**, RESOLUCION DE CIERRE 421 DEL 25 DE NOVIEMBRE DE 2024 **BPIN 2021850100009 Construcción del cerramiento y urbanismo para el instituto educativo Colegio Camilo Torres Restrepo sede primaria Antonio Nariño en el área urbana del municipio de Aguazul departamento de Casanare**, RESOLUCION DE CIERRE 420 DEL 25 DE NOVIEMBRE DE 2024 **BPIN 2022850100018 Mejoramiento de la vía terciaria a nivel de pavimento flexible del PR 9+900 al PR 12+834 del anillo vial de Unión Charte Cupiagua en el municipio de Aguazul Departamento de Casanare.,** RESOLUCION DE CIERRE 425 DEL 25 DE NOVIEMBRE DE 2024. Se realizo asistencia virtual junto al enlace del DNP dra DIANA QUIROGA, con el fin de revisar los casos de duplicidad de contratos de los proyectos **BPIN. '2019850100002 CONSTRUCCIÓN DE VÍA, PUENTE VEHICULAR SOBRE EL CAÑO AGUAZULERO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, PARA EL ACCESO AL PARQUE DEL ARROZ DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL, CASANARE**. presenta duplicidad en el contrato de obra n. 20190699 y n. 699-2019. **BPIN '2019850100004 ADECUACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL EQUIPAMIENTO INSTITUCIONAL DENOMINADO PLAZA DE TOROS EN EL MUNICIPIO DE AGUAZUL**. presenta duplicidad del contrato N.º 220-2020 y N.º 20200220 (apoyo a la supervisión). Evidencia: Otras actividades Medio: Medio físico: 2 folios Medio digital: Anexo 5

Para una ejecución acumulada del contrato N. 0620, porcentaje de ejecución 74%

OBSERVACIONES:

ANEXO: PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2024. N. PLANILLA: 7945649563

Atentamente,

GENNY PAOLA SERRANO DELGADO
Contratista

ANEXOS

CONTRATO N. 0620 2024-09-16

ACTA No. 4 PARCIAL 3

ACTIVIDAD 1. -INFORME DE ALERTAS

Elaboración de Informes Mensuales sobre Alertas en Proyectos de Inversión Elaborar un informe mensual que actualice el estado de las alertas presentadas en los proyectos de inversión a cargo de la Secretaría de Infraestructura. Estos proyectos abarcan las fases de: sin contratar, en ejecución, terminados y para cierre, financiados con recursos del Sistema General de Regalías (SGR).

D/A: En Atención al cumplimiento de esta actividad y de acuerdo con la designación dada por el supervisor se elaboro un informe con la actualización del estado de las alertas presentadas en los proyectos de inversión a cargo de la secretaria de infraestructura financiados con recursos del sistema general de regalías SGR, del periodo **01 de noviembre al 30 de noviembre de 2024**

ASUNTO: INFORME MENSUAL DE ESTADO DE ALERTAS.

PERIODO: 01 de noviembre al 30 de noviembre de 2024

Este informe presenta una actualización del estado de alertas de los proyectos de inversión financiados con recursos del Sistema General de Regalías (SGR) y ejecutados por el Municipio de Aguazul, de acuerdo con lo dispuesto en la actividad No. 1 del Contrato CPS No. 0620-2024 de "**Elaboración de Informes Mensuales sobre Alertas en Proyectos de Inversión a cargo de la Secretaría de Infraestructura. Estos proyectos abarcan las fases de: sin contratar, en ejecución, terminados y para cierre, financiados con recursos del Sistema General de Regalías (SGR)**.".

ALERTAS SIN SUBSANAR

A continuación, se describe la alerta de ***tipo "EJ-1-01"*** Proyectos con información incompleta según el estado en GESPROY-SGR.

ALERTA: EJ-1-01

BPIN: 2019850100002

NOMBRE: CONSTRUCCIÓN DE VÍA, PUENTE VEHICULAR SOBRE EL CAÑO AGUAZULERO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, PARA EL ACCESO AL PARQUE DEL ARROZ DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL, CASANARE

ESTADO DEL PROYECTO: TERMINADO

DESCRIPCIÓN DE LA ALERTA: Proyectos: Contrato(s) sin póliza (amparo de cumplimiento) - 699-2019

Se presenta esta alerta debido a la duplicidad entre el contrato N. 699-2019 y el contrato N. 20190699. Para solucionar este inconveniente, se realizaron modificaciones a los Registros Presupuestales (RP) asociados al contrato N. 699-2019. Asimismo, se ha enviado el caso a la mesa de ayuda con el fin de actualizar la cadena presupuestal, y el caso esta bajo el Ticket 263847 06 de noviembre de 2024.

ALERTA EJ-2-27 (Hacienda)

A continuación, se describe la alerta de ***tipo "EJ-2-27"*** Proyectos con pagos registrados con mayor valor por fuente de financiación al monto aprobado

BPIN: 2018850100001

NOMBRE: CONSTRUCCIÓN DE PARQUE RECREODEPORTIVO Y CONEXIONES PEATONALES EN EL PREDIO DENOMINADO PARQUE DEL ARROZ DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL - CASANARE

ESTADO DEL PROYECTO: TERMINADO

DESCRIPCIÓN DE LA ALERTA: Proyectos con pagos registrados con mayor valor por fuente de financiación al monto aprobado. Fuentes: Fte: ASIG. DIREC_2056 Dif: -$179,464,548.53;

ALERTA EJ-1-24

BPIN: 2022850100011

NOMBRE: Mejoramiento y adecuación del equipamiento institucional urbano denominado Concha Acústica Alberto López en el Municipio de Aguazul Departamento de Casanare

ESTADO DEL PROYECTO: TERMINADO

DESCRIPCIÓN DE LA ALERTA: Proyectos terminados sin cerrar Nro. días: 357

BPIN: 2018850100001

NOMBRE: CONSTRUCCIÓN DE PARQUE RECREODEPORTIVO Y CONEXIONES PEATONALES EN EL PREDIO DENOMINADO PARQUE DEL ARROZ DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL - CASANARE

ESTADO DEL PROYECTO: TERMINADO

DESCRIPCIÓN DE LA ALERTA: Proyectos terminados sin cerrar Nro. días: 967

BPIN: 2021850100024

NOMBRE: Mejoramiento y construcción de obras complementarias en los equipamientos institucionales deportivos del municipio de Aguazul departamento de Casanare

ESTADO DEL PROYECTO: TERMINADO

DESCRIPCIÓN DE LA ALERTA: Proyectos terminados sin cerrar Nro. días: 357

BPIN: 2021850100006

NOMBRE: Mejoramiento de la iluminación de los escenarios deportivos a través de tecnologías leds y sistemas fotovoltaicos en el área urbana y rural del municipio de Aguazul Casanare

ESTADO DEL PROYECTO: TERMINADO

DESCRIPCIÓN DE LA ALERTA: Proyectos terminados sin cerrar Nro. días: 541


BPIN: 2019850100002

NOMBRE: Construcción de vía, puente vehicular sobre el caño aguazulero y obras complementarias, para el acceso al parque del arroz del municipio de Aguazul, Casanare

ESTADO DEL PROYECTO: TERMINADO

DESCRIPCIÓN DE LA ALERTA: Proyectos terminados sin cerrar Nro. días: 661

NOTA: Las alertas se visualizan en el aplicativo GESPROY, en el menú izquierdo, en la sección de *"Reportes" -Alertas SMSCE*

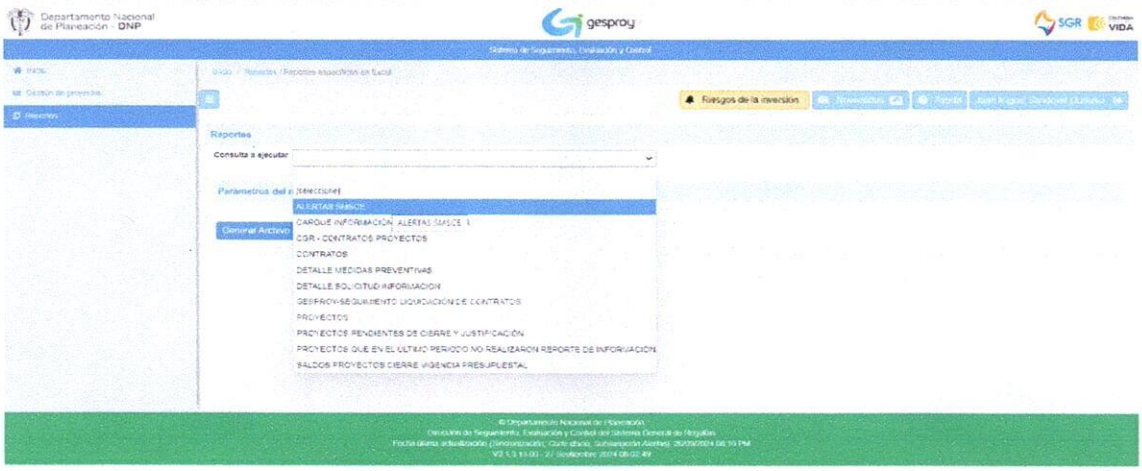

ELABORÓ:

ING. GENNY PAOLA SERRANO DELGADO
CONTRATO 0620 DEL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2024

Yopal, 03 de diciembre de 2024

Ingeniero
Juan Miguel Sandoval Gutierrez
Secretario de Infraestructura
Municipio de Aguazul

ASUNTO: INFORME ESTADO DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN FINANCIADOS POR EL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS – SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

PERIODO: 01 de noviembre al 30 de noviembre de 2024.

Este informe presenta una actualización del estado de los proyectos de inversión financiados con recursos del Sistema General de Regalías (SGR) y ejecutados por el Municipio de Aguazul en la Secretaria de Infraestructura, de acuerdo con lo dispuesto en la actividad No. 2 del Contrato CPS No.0620 -2024 de "*Elaborar un informe mensual que detalle el reporte de información sobre la ejecución de los proyectos en estado activo cargados en el aplicativo GESPROY 3.0 del Sistema General de Regalías (SGR).*".

Actualmente el sistema GESPROY registra un total de 17 proyectos que se relacionan a continuación, en sus diferentes estados: en ejecución, terminado y para cierre.

Proyectos en Estado en Ejecución:

ITEM	BPIN	NOMBRE DEL PROYECTO
1	2019850100004	ADECUACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL EQUIPAMIENTO INSTITUCIONAL DENOMINADO PLAZA DE TOROS EN EL MUNICIPIO DE AGUAZUL
2	2020850100007	IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS SOLARES FOTOVOLTAICOS INDIVIDUALES EN ZONAS RURALES NO INTERCONECTADAS DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL CASANARE
3	2021005850074	MEJORAMIENTO A NIVEL DE PAVIMENTO DEL PR 2+900 AL PR 10+900 DEL ANILLO VIAL CUPIAGUA CUSIANA DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL DEPARTAMENTO DE CASANARE
4	2022005850010	CONSTRUCCIÓN PARADOR Y OBRAS DE URBANISMO EN EL PARQUE DEL ARROZ DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL DEPARTAMENTO DE CASANARE
5	2022850100009	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ESTABILIZACIÓN MITIGACIÓN Y CONTROL PARA LA PROTECCIÓN MARGEN DERECHA AGUAS ARRIBA RIO CACHIZA DEL ESTRIBO DEL PASO ELEVADO DE LA TUBERÍA DEL ACUEDUCTO MUNICIPAL EN LA VEREDA ÚNETE DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL CASANARE

Proyectos en Estado Terminado

ITEM	BPIN	NOMBRE DEL PROYECTO
1	2018850100001	CONSTRUCCIÓN DE PARQUE RECREODEPORTIVO Y CONEXIONES PEATONALES EN EL PREDIO DENOMINADO PARQUE DEL ARROZ DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL - CASANARE
2	2019850100002	CONSTRUCCIÓN DE VÍA, PUENTE VEHICULAR SOBRE EL CAÑO AGUAZULERO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, PARA EL ACCESO AL PARQUE DEL ARROZ DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL, CASANARE
3	2021850100006	MEJORAMIENTO DE LA ILUMINACIÓN DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS A TRAVÉS DE TECNOLOGÍAS LEDS Y SISTEMAS FOTOVOLTAICOS EN EL ÁREA URBANA Y RURAL DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL CASANARE
4	2021850100024	MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LOS EQUIPAMIENTOS INSTITUCIONALES DEPORTIVOS DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL DEPARTAMENTO DE CASANARE
5	2022850100011	MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DEL EQUIPAMIENTO INSTITUCIONAL URBANO DENOMINADO CONCHA ACÚSTICA ALBERTO LÓPEZ EN EL MUNICIPIO DE AGUAZUL DEPARTAMENTO DE CASANARE

Proyectos en Estado Para Cierre

ITEM	BPIN	NOMBRE PROYECTO
1	2018850100004	CONSTRUCCIÓN DE DOBLE CALZADA EN PAVIMENTO FLEXIBLE, CICLO VÍA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS ENTRE CARRERA SEGUNDA - VÍA ESCUELA ANTIGUO DAS (SECTOR GUADUALES) Y EMPALME CON LA INTERSECCIÓN GLORIETA VÍA MANÍ EN EL MUNICIPIO DE AGUAZUL - CASANARE
2	2020850100008	CONSTRUCCIÓN DE PLACA POLIDEPORTIVA CUBIERTA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL PARQUE DEL BARRIO SEVILLA EN EL MUNICIPIO DE AGUAZUL CASANARE
3	2021850100002	CONSTRUCCIÓN DE PLACA POLIDEPORTIVA CUBIERTA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA JORGE ELIECER GAITÁN SEDE CAYAGUAS DE LAVEREDA IGUAMENA EN EL MUNICIPIO DE AGUAZUL CASANARE
4	2021850100005	CONSTRUCCIÓN DE PARADOR CICLISTICO EN LA VEREDA SAN JOSE DEL BUBUY EN EL MUNICIPIO DE AGUAZUL DEPARTAMENTO DE CASANARE
5	2021850100007	CONSTRUCCIÓN DE REDES DE GAS NATURAL PARA LAS VEREDAS LOS LIRIOS CUNAMA VOLCAN BLANCO PARAISO RINCON DEL VIJUA SAN IGNACIA Y RETIRO MILAGRO DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL DEPARTAMENTO DE CASANARE
6	2021850100009	CONSTRUCCIÓN DEL CERRAMIENTO Y URBANISMO PARA EL INSTITUTO EDUCATIVO COLEGIO CAMILO TORRES RESTREPO SEDE PRIMARIA ANTONIO NARIÑO EN EL AREA URBANA DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL DEPARTAMENTO DE CASANARE

ITEM	BPIN	NOMBRE PROYECTO
7	2022850100018	MEJORAMIENTO DE LA VÍA TERCIARIA A NIVEL DE PAVIMENTO FLEXIBLE DEL PR 9+900 AL PR 12+834 DEL ANILLO VIAL DE UNIÓN CHARTE CUPIAGUA EN EL MUNICIPIO DE AGUAZUL DEPARTAMENTO DE CASANARE

PROYECTOS EN EJECUCION

Proyecto 1.

BPIN: 2019850100004
PROYECTO: ADECUACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL EQUIPAMIENTO INSTITUCIONAL DENOMINADO PLAZA DE TOROS EN EL MUNICIPIO DE AGUAZUL
ESTADO: EN EJECUCIÓN
AVANCE FISICO: 83,91% a octubre de 2024
AVANCE FINANCIERO: 87,91% a julio de 2024
VALOR DEL PROYECTO: 9.971.689.194,00

OBSERVACIÓN: El proyecto tenía una programación inicial que abarcaba de junio de 2020 a junio de 2024 y presenta un avance físico del 87,78%. Sin embargo, se ha prorrogado por 3 meses adicionales, estableciendo una nueva fecha de finalización para el 11 de diciembre de 2024. Debido a las modificaciones en la ejecución, como suspensiones y prórrogas, no fue posible cumplir con la programación registrada y se envió oficio al DNP solicitando el borrado de la ejecución. Por esta razón, el departamento de planeación presentó el plan administrativo de control **PAC-1141-24** para ajustar la programación, que inicialmente estaba propuesta.

Recientemente, se ha reprogramado nuevamente el horizonte del proyecto, ahora extendiéndose desde junio de 2024 hasta diciembre de 2024. Este cambio refleja un esfuerzo por adaptar la ejecución del proyecto a las realidades actuales y asegurar su finalización dentro del nuevo marco temporal establecido.


Presenta contrato duplicado de apoyo a la supervisión N. **220-2020**, en el SPGR se modificó la información correspondiente a los RP y se asociación al contrato **N. 20200220, sin embargo, a la fecha no ha migrado la información.** Por lo tanto, se envió el caso el día 18 de septiembre, se envió el caso a la mesa de ayuda para su revisión por parte del DNP. Ante la falta de respuesta sobre los casos, se reiteró la solicitud el día 5 de noviembre de 2024. Ticket 263847.

Tiene medida de suspensión de giros.


ALERTA: No presenta alertas (Pero si presenta duplicidad de contratos)

IGPR SDO TRIMESTRE: 100

ANTES DE REPROGRAMAR:

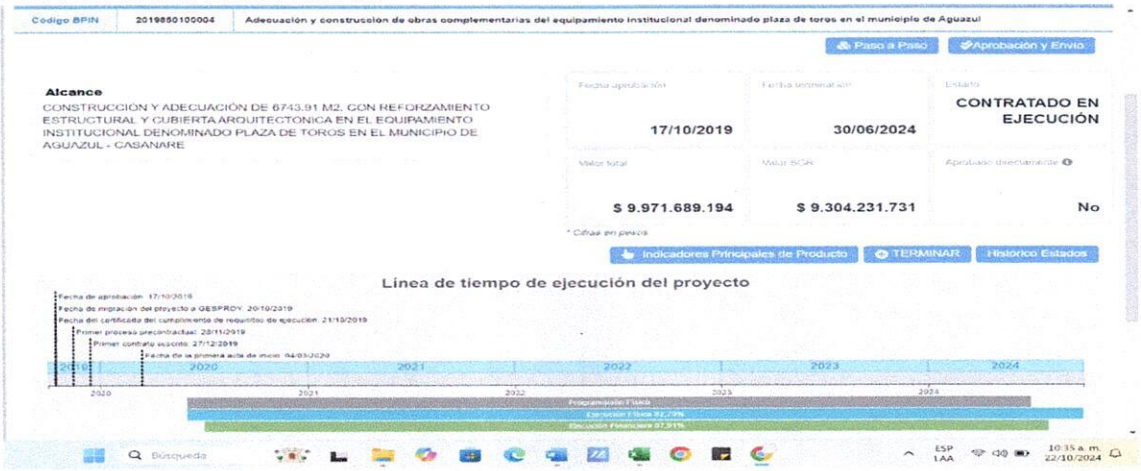

DESPUES DE REPROGRAMAR:

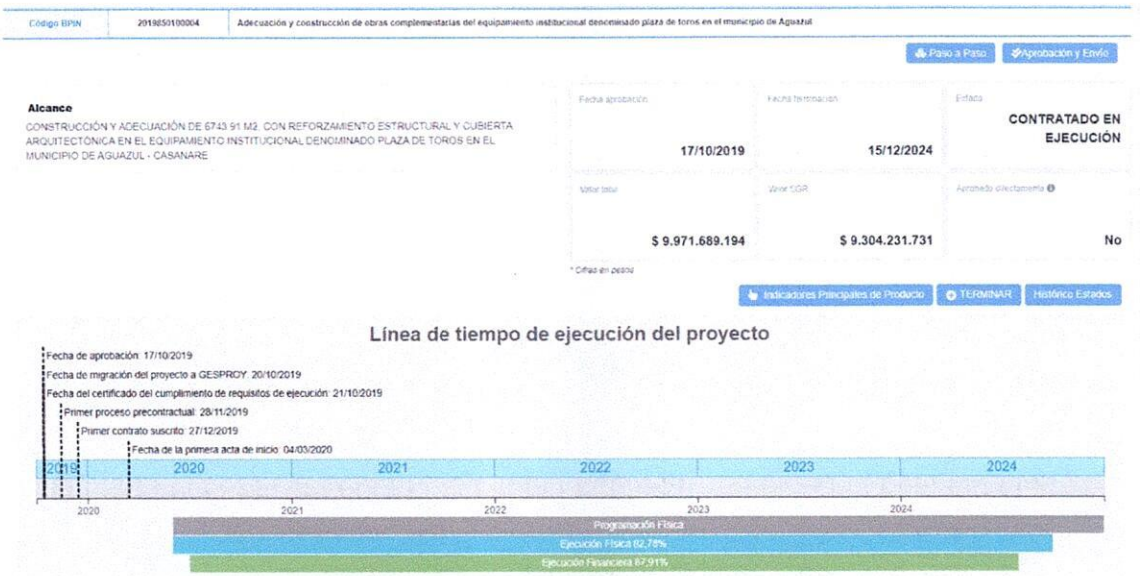

Proyecto 2.

BPIN: 2020850100007
PROYECTO: IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS SOLARES FOTOVOLTAICOS INDIVIDUALES EN ZONAS RURALES NO INTERCONECTADAS DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL CASANARE
ESTADO: EN EJECUCIÓN
AVANCE FISICO: 77,23 % a marzo de 2024
AVANCE FINANCIERO: 72,51% a agosto de 2024
VALOR DEL PROYECTO: $ 3.546.870.866

OBSERVACIÓN: La programación registrada esta de julio de 2021 a marzo de 2024, Presenta dos Planes administrativos de control por parte del Departamento nacional de planeación:
PAC 2581-24: "c) No ejecutar el proyecto de inversión en los términos de su aprobación sin justificación técnica o jurídica."

- ✓ "En la visita se observó que, aunque el contrato de obra tiene acta de terminación en octubre de 2023, están pendientes por desarrollar actividades para la funcionalidad del proyecto, tales como la sincronización del software para el cobro del servicio, instalación del sistema de cobro prepago y la creación de la entidad encargada de atender el servicio eléctrico prestado por los paneles instalados en cada beneficiario, careciendo así de la debida sostenibilidad del proyecto.
- ✓ Las actividades pendientes por desarrollar impiden que los beneficiarios tengan el debido soporte técnico del sistema, que garantice el correcto funcionamiento en el momento en que se presenten fallas en el servicio eléctrico.

- ✓ El proyecto no cuenta con acciones que permiten la continuidad y operación, situación que puede llegar a comprometer el uso eficiente de los sistemas fotovoltaicos instalado en los 137 beneficiarios los cuales pueden presentar posibles fallas irreparables que comprometen la estabilidad del proyecto.


PAC 1142-24: se registra programación vencida, siendo necesario que la entidad ejecutora rinda explicaciones al respecto, toda vez, que lo anterior configura una presunta situación irregular, que se enmarca en la causal c) del Artículo 174 de la Ley 2056 de 2020

Teniendo en cuenta que la actividad de interventoría no se ejecutó al 100 %, se solicitó borrado ante el DNP para ajustar el porcentaje de ejecución de la interventora, la cuál quedo 82,66% de acuerdo al avance de la obra.

ALERTA: No presenta alertas

IGPR SDO TRIMESTRE: 83,5

Tiene medida de suspensión de giros.

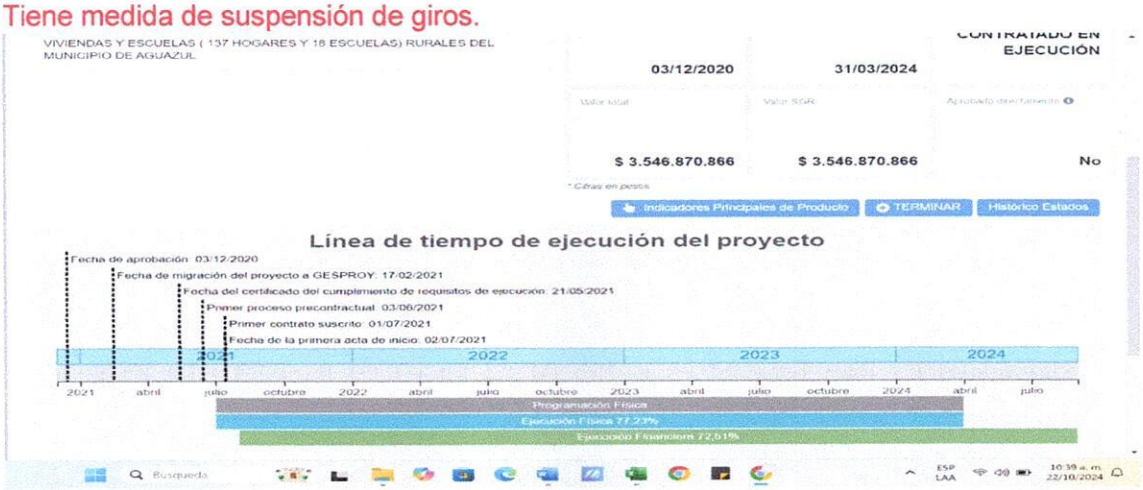

Proyecto 3.

BPIN: 2021005850074
PROYECTO: MEJORAMIENTO A NIVEL DE PAVIMENTO DEL PR 2+900 AL PR 10+900 DEL ANILLO VIAL CUPIAGUA CUSIANA DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL DEPARTAMENTO DE CASANARE
ESTADO: EN EJECUCIÓN
AVANCE FISICO: 92,74% a septiembre de 2024
AVANCE FINANCIERO: 79,67% a octubre de 2024
VALOR PROYECTO: $ 20.594.200.382

OBSERVACIÓN: La programación registrada abarca desde septiembre de 2022 hasta julio de 2024. El plazo inicial del proyecto era de diez (10) meses, pero ha sufrido cuatro (4) prórrogas y seis (6) suspensiones. Con la Suspensión N. 4, fechada el 17 de octubre de 2024, se establece que la nueva fecha de terminación del **contrato N. 579-2022 de obra** será el **17 de noviembre de 2024**


El contrato de Interventoría N. 566-2022, Con la Suspensión N. 4, fechada el 17 de octubre de 2024, se establece que la nueva fecha de terminación será el 17 de noviembre de 2024.

Se registro prórroga N. 04 del 01 octubre de 2024 (17 días), al contrato de Interventoría

Lo anterior indica que se debe solicitar la reprogramación del proyecto, teniendo en cuenta las prórrogas y suspensiones del proyecto.

ALERTA: No presenta alertas

IGPR SDO TRIMESTRE: 100

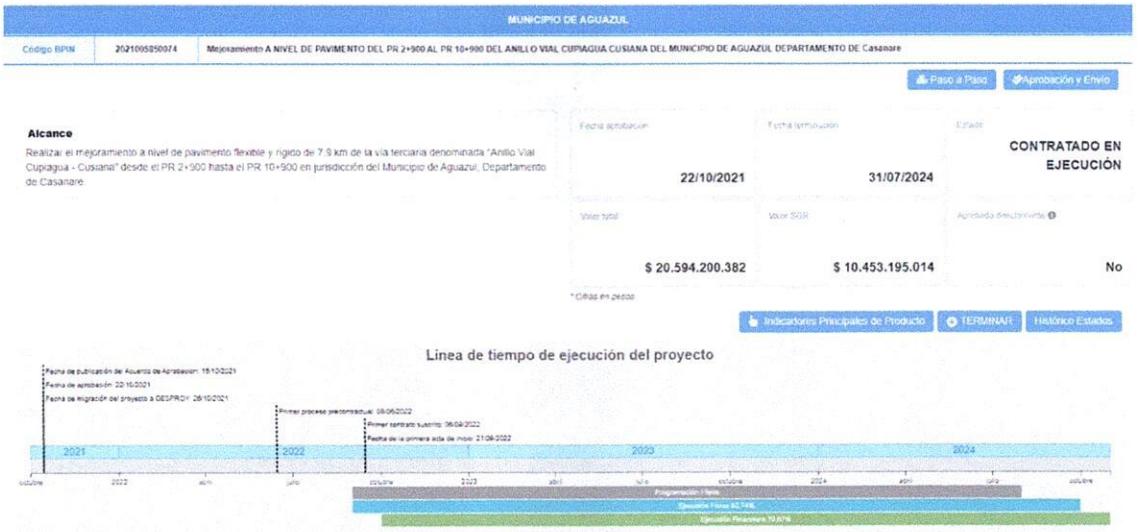

Proyecto 4.

BPIN: 2022005850010
PROYECTO: CONSTRUCCIÓN PARADOR Y OBRAS DE URBANISMO EN EL PARQUE DEL ARROZ DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL DEPARTAMENTO DE CASANARE
ESTADO: EN EJECUCIÓN
AVANCE FISICO: 86,15 a octubre de 2024
AVANCE FINANCIERO: 87,88 a julio de 2024
VALOR PROYECTO: $ 11.354.926.038


OBSERVACIÓN: El proyecto cuenta con una programación oficial que abarca desde agosto de 2022 hasta junio de 2024. Es importante señalar que, para reprogramar, se debe solicitar la eliminación de la programación vigente ante el Departamento Nacional de Planeación, considerando que se está gestionando un aumento de recursos ante la Gobernación de Casanare

Presenta un PAC-1163-24 (programación vencida), al cual se le dio respuesta.

ALERTA: No presenta alertas

IGPR SDO TRIMESTRE: 100

Tiene medida de suspensión de giros

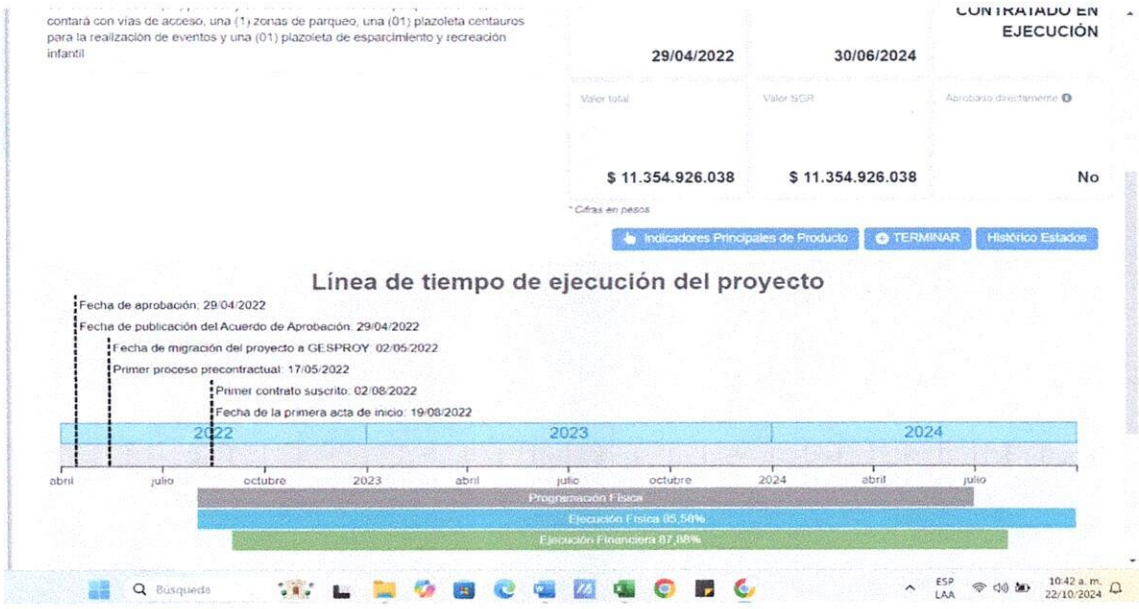

Proyecto 5.


BPIN: 2022850100009
PROYECTO: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ESTABILIZACIÓN MITIGACIÓN Y CONTROL PARA LA PROTECCIÓN MARGEN DERECHA AGUAS ARRIBA RIO CACHIZA DEL ESTRIBO DEL PASO ELEVADO DE LA TUBERÍA DEL ACUEDUCTO MUNICIPAL EN LA VEREDA ÚNETE DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL CASANARE
ESTADO: EN EJECUCIÓN
AVANCE FISICO: 11,14 a marzo 2024
AVANCE FINANCIERO: 45,35 a abril de 2024
VALOR PROYECTO: $ 1.150.418.293

OBSERVACIÓN: El proyecto tiene una programación oficial que se extiende desde septiembre de 2023 hasta mayo de 2024. Sin embargo, ha experimentado varias modificaciones, incluyendo suspensiones y reinicios, desde el 26 de junio de 2024. El 13 de agosto de 2024 se registró el Acta N.º 11, en la cual se aprobó la ampliación de la suspensión N.º 4.

Presenta un PAC-1144-24 (Programación vencida)

IGPR SDO TRIMESTRE: 85

Tiene medida de suspensión de giros

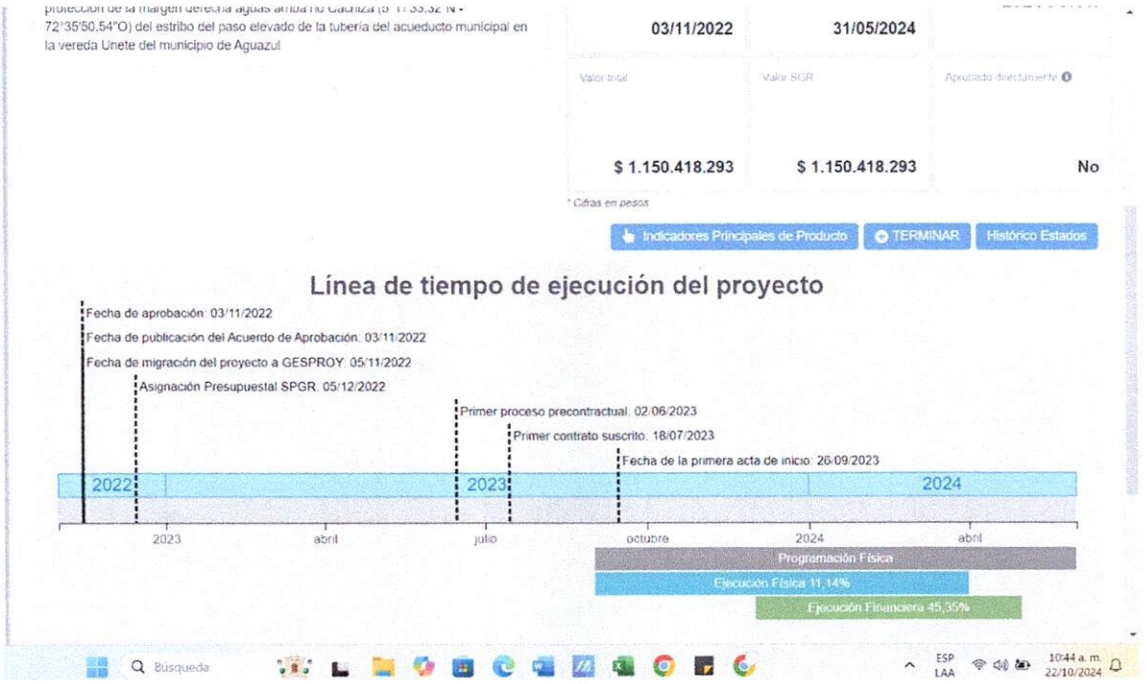

PROYECTOS TERMINADOS

Proyecto 1.

BPIN: 2018850100001
PROYECTO: CONSTRUCCIÓN DE PARQUE RECREODEPORTIVO Y CONEXIONES PEATONALES EN EL PREDIO DENOMINADO PARQUE DEL ARROZ DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL - CASANAR
ESTADO: TERMINADO
AVANCE FISICO: 99,30 reporte a febrero de 2022
AVANCE FINANCIERO: 99,27 Reporte a diciembre de 2023
AVANCE FINANCIERO: $ 9.179.844.769


OBSERVACIÓN: Revisar con hacienda los pagos realizados al proyecto, debido a que la alerta corresponde al módulo cuentas, por tal motivo no ha permito registrar las actas de liquidación del contrato de obra.

El contrato de interventora no está liquidado, según información registrada en secop 1

ALERTA: EJ -1-24 Proyectos terminados sin cerrar Nro. días: 967

EJ-2-27 Proyectos con pagos registrados con mayor valor por fuente de financiación al monto aprobado. Fuentes: Fte: ASIG. DIREC_2056 Dif: -$179,464,548.53;,esta alerta indica que realizando pagos de la fuente Asignaciones directas por mayor valor del asignado

IGPR SDO TRIMESTRE: 100

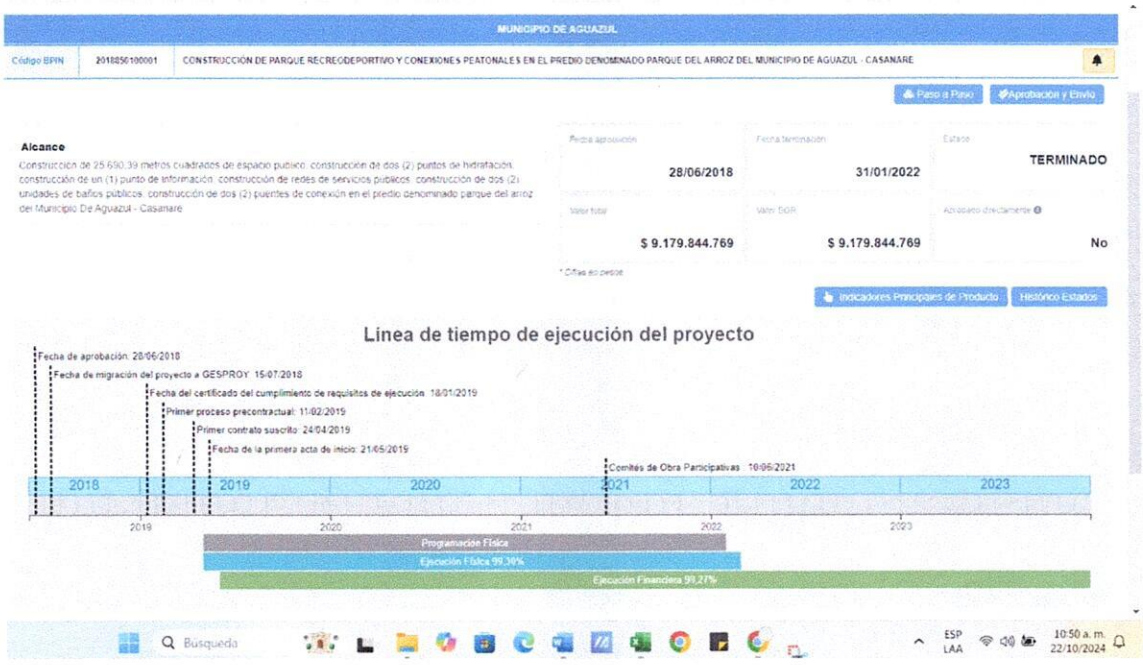

Proyecto 2.

BPIN: 2019850100002
PROYECTO: CONSTRUCCIÓN DE VÍA, PUENTE VEHICULAR SOBRE EL CAÑO AGUAZULERO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, PARA EL ACCESO AL PARQUE DEL ARROZ DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL, CASANARE
ESTADO: TERMINADO
AVANCE FISICO: 99,94 registrada a diciembre de 2022
AVANCE FINANCIERO: 89,53 registrada a diciembre de 2022
VALOR PROYECTO: $ 4.541.149.572

OBSERVACIÓN: Se evidencia en el aplicativo GESPROY la duplicidad del contrato principal N. 699-2019 de fecha 31 de diciembre de 2019 el cual fue registrado por aplicación, y el contrato N. 20190699 del 14 de octubre de 2020 creado por SPGR., (adjunto pantallazo).

Se procedió a eliminar la información registrada en el contrato N. 699-2019 registrado por aplicación, para dejar la información que migro del SPGR, sin embargo, al realizar el proceso de eliminación de los RP muestra un error, lo cual no ha permitido registrar el acta de liquidación.


Se reenvió el caso de duplicidad de contratos a la mesa de ayuda, mencionando el Ticket 263847 06 de noviembre de 2024 para hacerle seguimiento

ALERTA:

EJ-1-01: Proyectos: Contrato(s) sin póliza (amparo de cumplimiento) : 699-2019

EJ-1-24: Proyectos terminados sin cerrar Nro dias: 682

EJ-2-27: Proyectos con pagos registrados con mayor valor por fuente de financiaci¿n al monto aprobado. Fuentes: Fte: ASIG. DIREC_2056 Dif: -$1,460,431,104.72; **TRIMESTRE**: 100

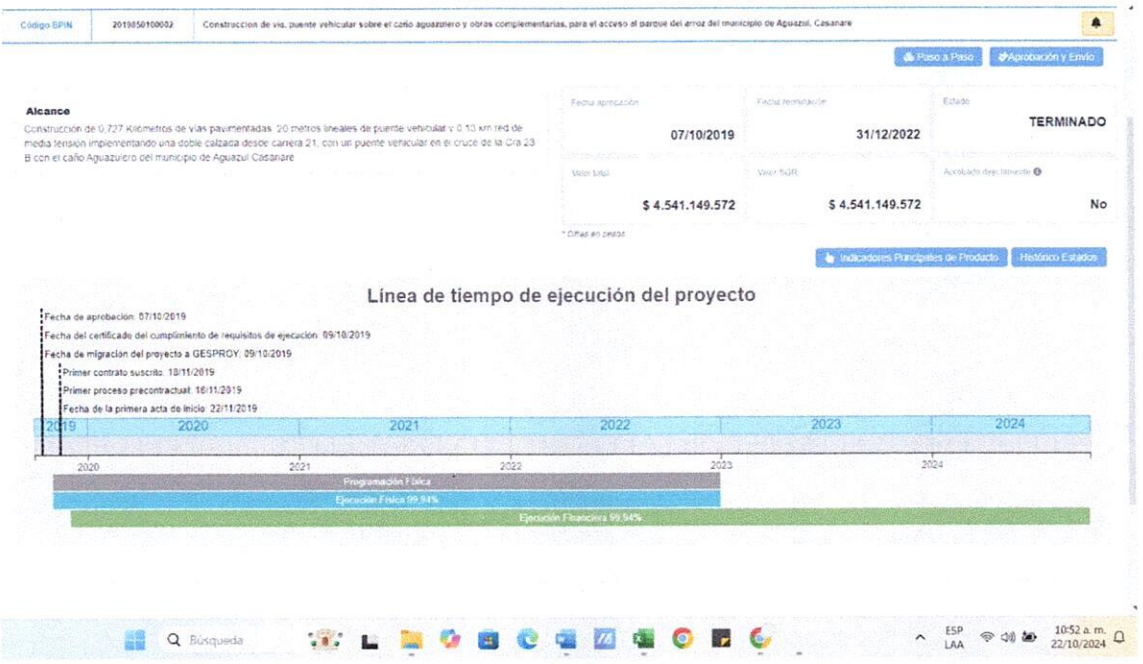

Proyecto 3.

BPIN: 2021850100006


PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LA ILUMINACIÓN DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS A TRAVÉS DE TECNOLOGÍAS LEDS Y SISTEMAS FOTOVOLTAICOS EN EL ÁREA URBANA Y RURAL DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL CASANARE
ESTADO: TERMINADO
AVANCE FISICO: 99,97 registrado a abril de 2023

AVANCE FINANCIERO: 85,23 registrado a marzo 2023
VALOR DEL PROYECTO: 1.823.834.445

OBSERVACIÓN: El proyecto tuvo programación de diciembre de 2021 a abril de 2023, aunque se encuentra en estado terminado, aun esta pendiente el acta de liquidación del contrato de interventoría N. **689-2021,** y el contrato de Obra **N. 659-2021**

ALERTA: EJ-1-24 Proyectos terminados sin cerrar Nro. días: 509

IGPR SDO TRIMESTRE: 100

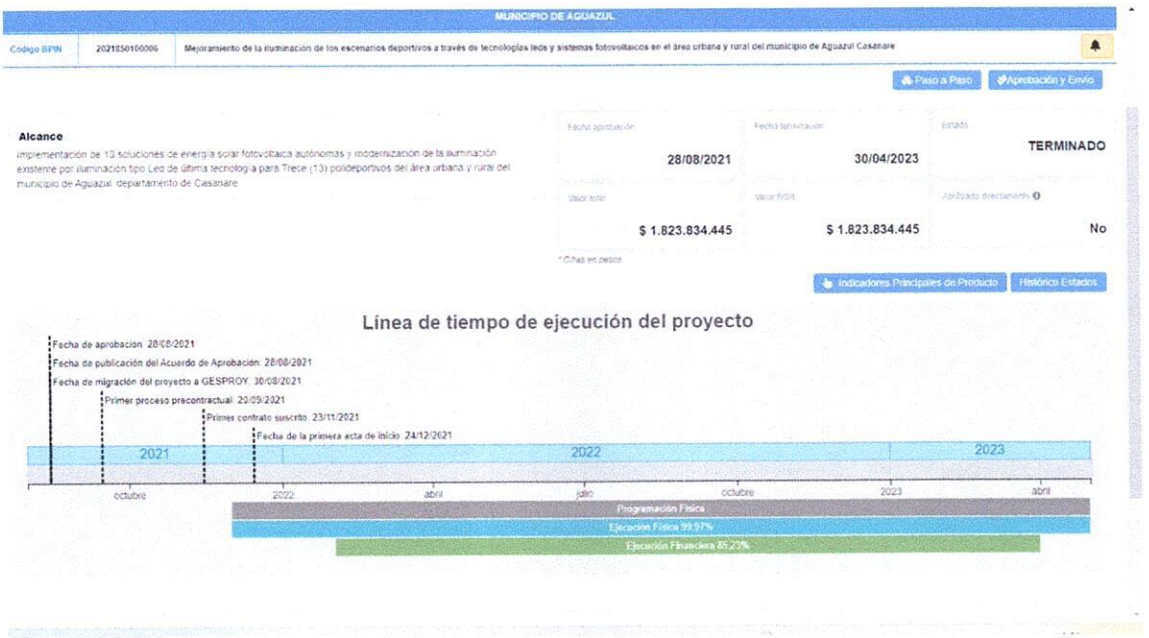

Proyecto 4.

BPIN: 2021850100024
PROYECTO: Mejoramiento y construcción de obras complementarias en los equipamientos institucionales deportivos del municipio de Aguazul departamento de Casanare
ESTADO: TERMINADO
AVANCE FISICO: 100 registrado a octubre de 2023
AVANCE FINANCIERO: 97,70 registrado a septiembre 2024
VALOR PROYECTO: $ $ 2.605.046.100

OBSERVACIÓN: El proyecto tuvo programación de septiembre de 2022 a octubre de 2023, esta pendiente de liquidación el contrato de Interventoría N. 304-2022.


El contrato de Obra N. 301-2022 ya cuenta con acta de liquidación registrada en secop 1 el día 20 de septiembre de 2024.

El valor del contrato de obra es de $2.394.725.760 y tiene pagos por valor de $1.703.076.313

Se registran pólizas con anexo 5 y 06 al contrato de OBRA n 301-2022

ALERTA: EJ-1-24 Proyectos terminados sin cerrar Nro. días: 373

IGPR SDO TRIMESTRE: 100

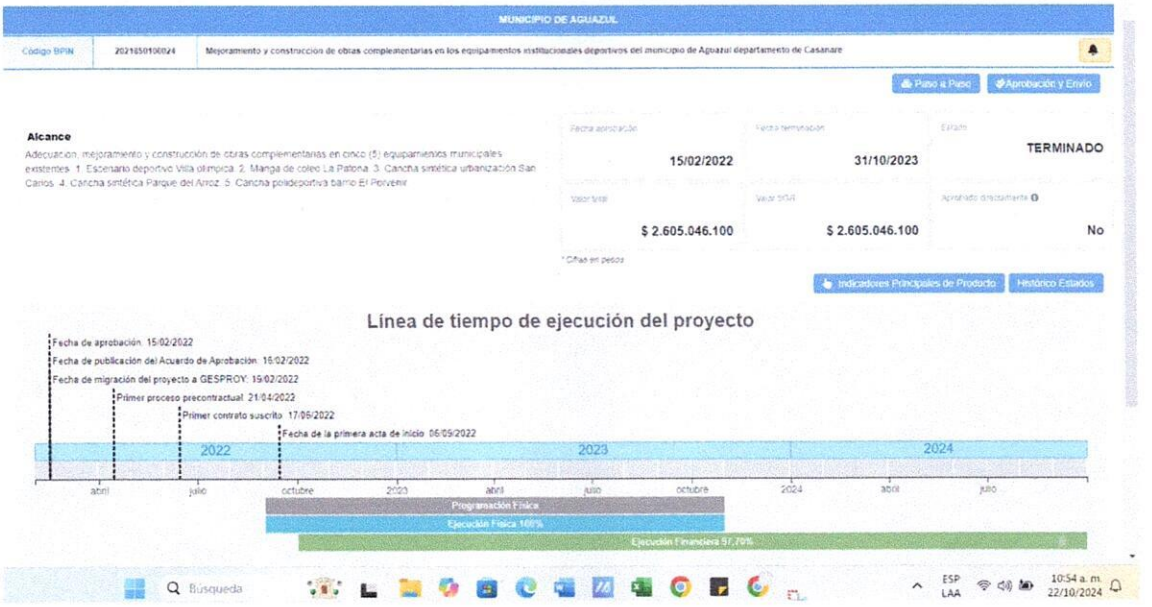

Proyecto 5.

BPIN: 2022850100011
PROYECTO: Mejoramiento y adecuación del equipamiento institucional urbano denominado Concha Acústica Alberto López en el Municipio de Aguazul Departamento de Casanare
ESTADO: TERMINADO
AVANCE FISICO: 100% Registrada a octubre de 2023
AVANCE FINANCIERO: 85,20% registrada a noviembre de 2023


OBSERVACIÓN:

El contrato de Interventoría N. 321-2022, no está liquidado. (le faltan pagos)

El contrato de obra N. 341-2022, no está liquidado. (le faltan pagos)

ALERTA: EJ-1-24 Proyectos terminados sin cerrar Nro. días:


IGPR SDO TRIMESTRE: 100

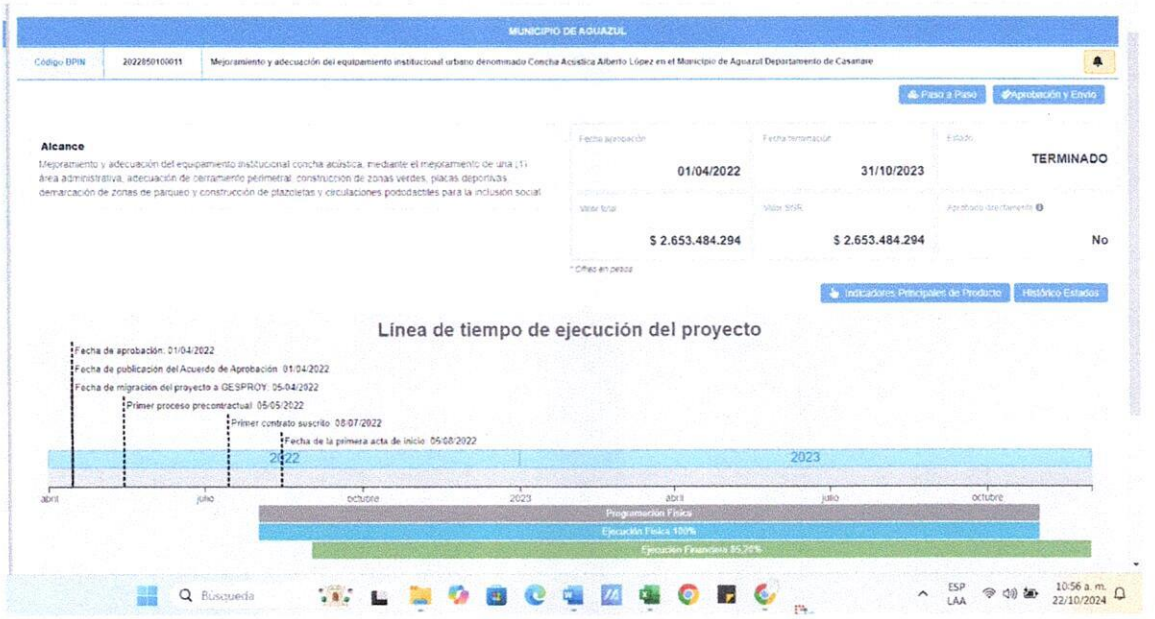

PROYECTOS PARA CIERRE

Proyecto 1.


BPIN: '2018850100004
PROYECTO: CONSTRUCCIÓN DE DOBLE CALZADA EN PAVIMENTO FLEXIBLE, CICLO VÍA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS ENTRE CARRERA SEGUNDA - VÍA ESCUELA ANTIGUO DAS (SECTOR GUADUALES) Y EMPALME CON LA INTERSECCIÓN GLORIETA VÍA MANÍ EN EL MUNICIPIO DE AGUAZUL - CASANARE
ESTADO: CERRADO
AVANCE FISICO: 92,89%
AVANCE FINANCIERO: 98,87
OBSERVACIÓN: CERRADO RESOLUCIÓN DE CIERRE N. 321.
ALERTA: No presenta alertas
IGPR SDO TRIMESTRE: NO FUE CALIFICADO

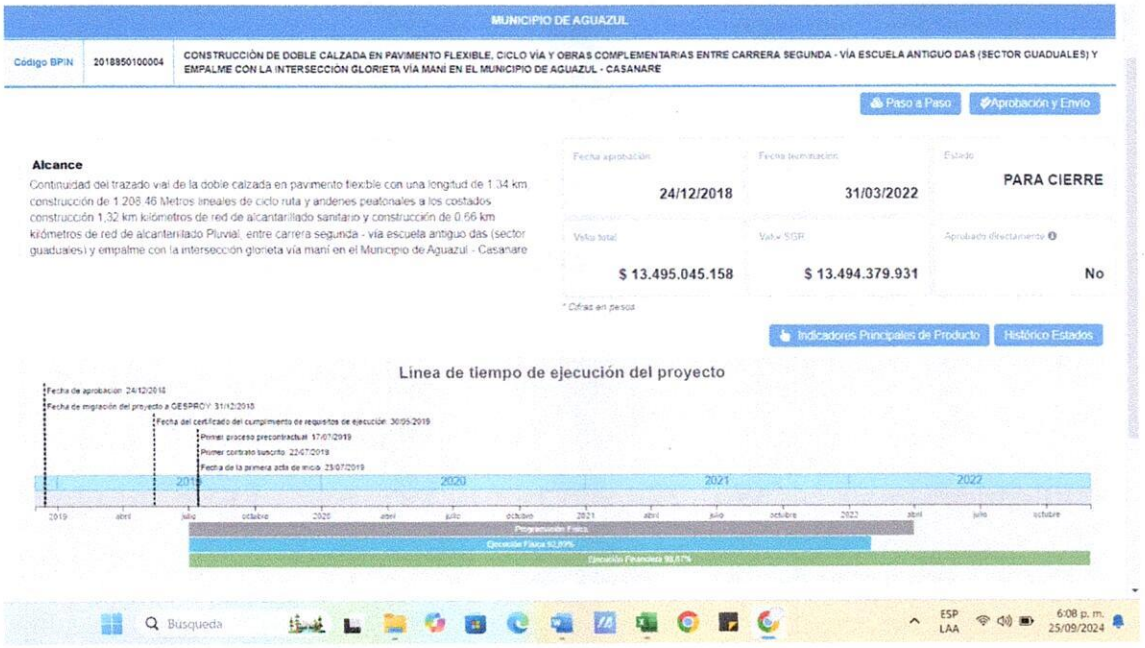

PROYECTOS PARA CIERRE

Proyecto 2.


BPIN: ' 2020850100008
PROYECTO: CONSTRUCCIÓN DE PLACA POLIDEPORTIVA CUBIERTA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL PARQUE DEL BARRIO SEVILLA EN EL MUNICIPIO DE AGUAZUL CASANARE
ESTADO: PARA CIERRE
AVANCE FISICO: 98,06%
AVANCE FINANCIERO: 99,85%
OBSERVACIÓN: Se está elaborando el acto administrativo de cierre y estamos esperando la certificación de saldo del proyecto por parte de Hacienda
ALERTA: No presenta alertas
IGPR SDO TRIMESTRE: NO FUE CALIFICADO

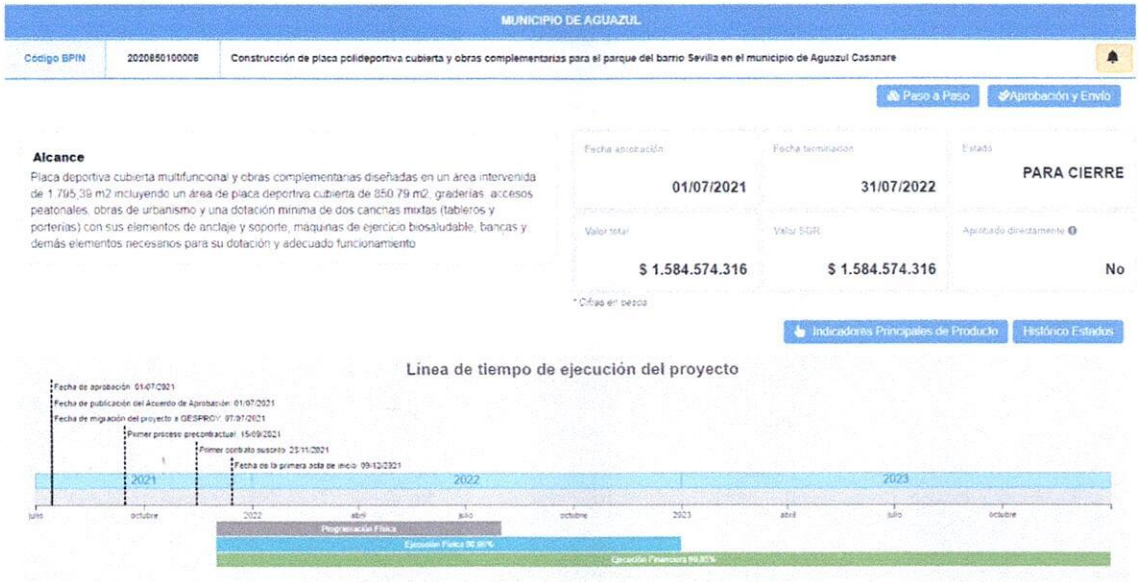

PROYECTOS PARA CIERRE


Proyecto 3.

BPIN: '2021850100002
PROYECTO: Construcción de placa polideportiva cubierta y obras complementarias para la Institución Educativa Jorge Eliecer Gaitán sede Cayaguas de lavereda Iguamena en el municipio de Aguazul Casanare
ESTADO: CERRADO
AVANCE FISICO: 90,55%
AVANCE FINANCIERO: 99,53%
OBSERVACIÓN: RESOLUCIÓN DE CIERRE N. 320,
ALERTA: No presenta alertas
IGPR SDO TRIMESTRE: 100

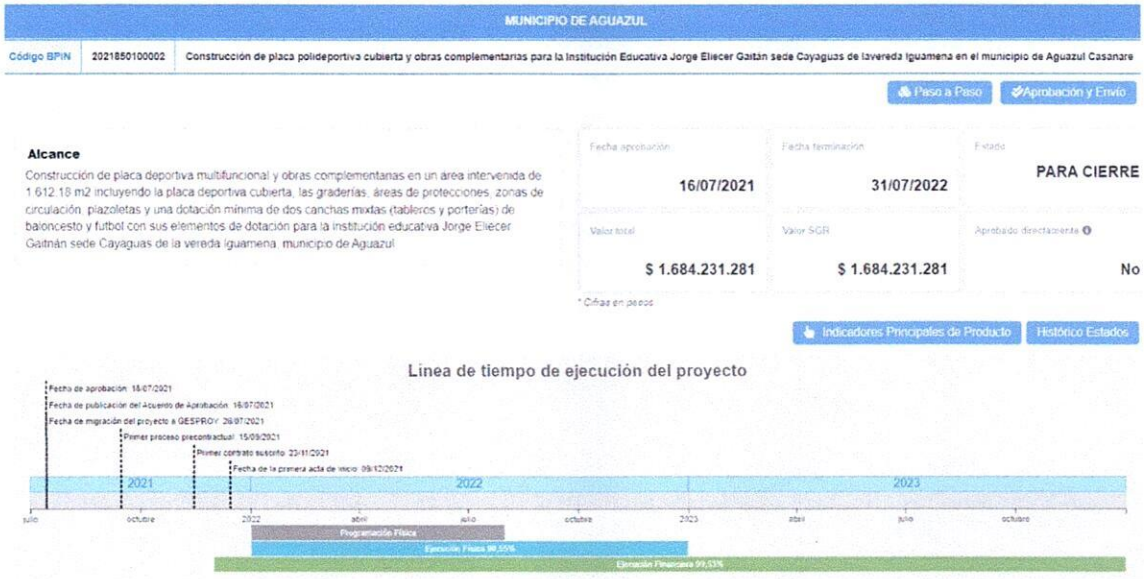


Proyecto 4.

BPIN: "2021850100005
PROYECTO: CONSTRUCCIÓN DE PARADOR CICLISTICO EN LA VEREDA SAN JOSE DEL BUBUY EN EL MUNICIPIO DE AGUAZUL DEPARTAMENTO DE CASANARE
ESTADO: CERRADO
AVANCE FISICO: 97,70%
AVANCE FINANCIERO: 99,70%
OBSERVACIÓN: RESOLUCIÓN DE CIERRE N. 322
ALERTA: No presenta alertas
IGPR SDO TRIMESTRE: No fue calificado

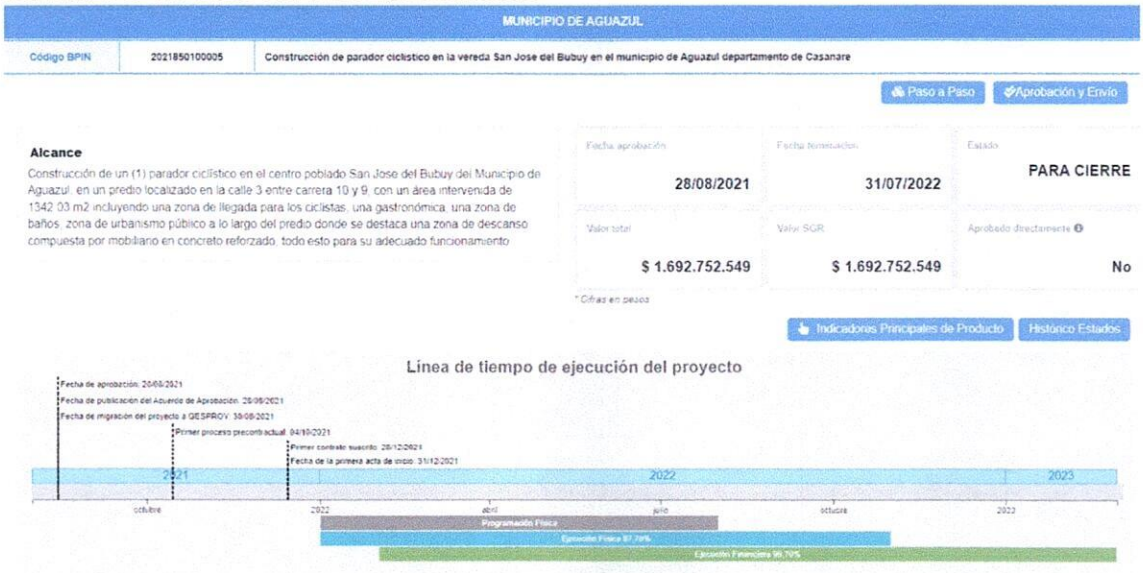


Proyecto 5.

BPIN: ' 2021850100007
PROYECTO: CONSTRUCCIÓN DE REDES DE GAS NATURAL PARA LAS VEREDAS LOS LIRIOS CUNAMA VOLCAN BLANCO PARAISO RINCON DEL VIJUA SAN IGNACIA Y RETIRO MILAGRO DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL DEPARTAMENTO DE CASANARE
ESTADO: CERRADO
AVANCE FISICO: 99,92
AVANCE FINANCIERO: 99,89
OBSERVACIÓN: RESOLUCIÓN DE CIERRE N. 323,
ALERTA: No presenta alertas
IGPR SDO TRIMESTRE: 90

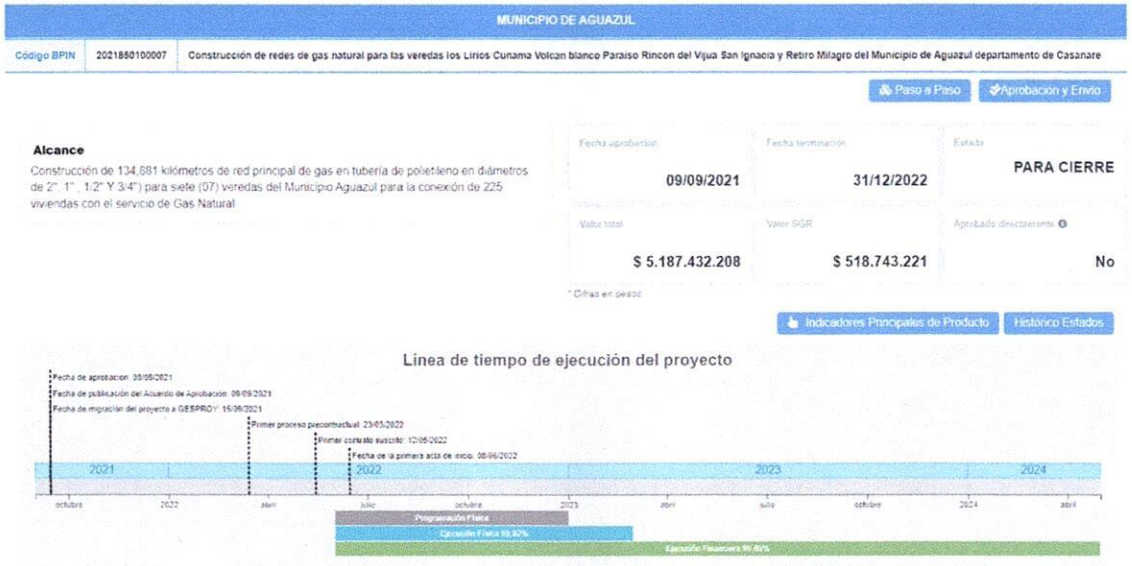

Proyecto 6


BPIN: ' 2021850100009
PROYECTO: Construcción del cerramiento y urbanismo para el instituto educativo Colegio Camilo Torres Restrepo sede primaria Antonio Nariño en el area urbana del municipio de Aguazul departamento de Casanare
ESTADO: PARA CIERRE
AVANCE FISICO: 99,92
AVANCE FINANCIERO: 99,89
OBSERVACIÓN: Se está elaborando el acto administrativo de cierre y estamos esperando la certificación de saldo del proyecto por parte de Hacienda
ALERTA: No presenta alertas
IGPR SDO TRIMESTRE: NO FUE CALIFICADO

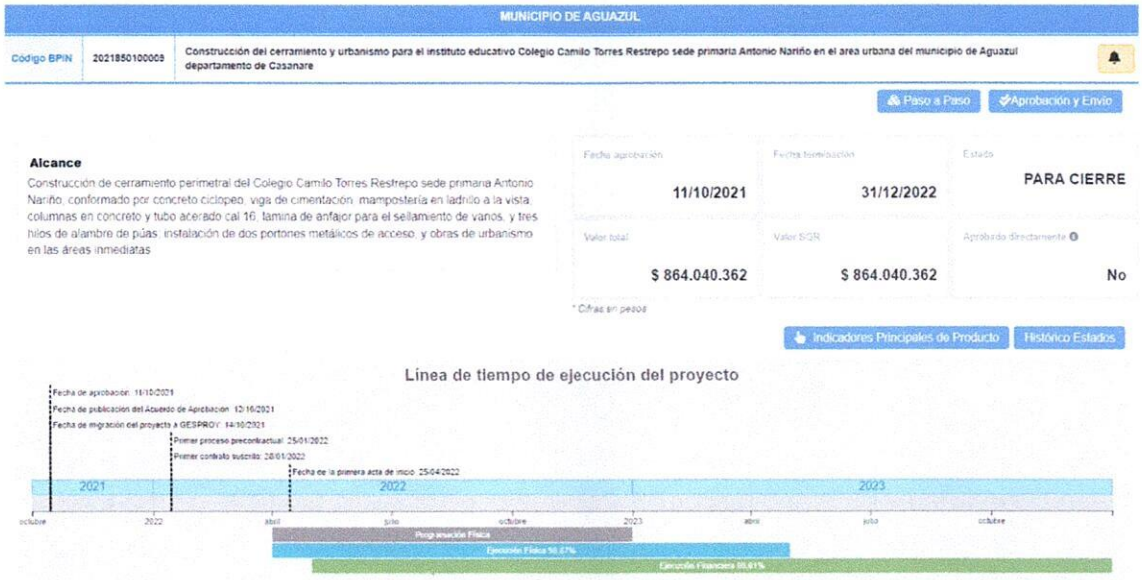


Proyecto 7

BPIN: 2022850100018
PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LA VÍA TERCIARIA A NIVEL DE PAVIMENTO FLEXIBLE DEL PR 9+900 AL PR 12+834 DEL ANILLO VIAL DE UNIÓN CHARTE CUPIAGUA EN EL MUNICIPIO DE AGUAZUL DEPARTAMENTO DE CASANARE
ESTADO: PARA CIERRE
AVANCE FISICO: 99,95 a febrero 2024
AVANCE FINANCIERO: 99,95 a septiembre de 2024
VALOR PROYECTO: $ 8.377.420.007,00
OBSERVACIÓN: El proyecto paso a estado PARA CIERRE., pendiente elaborar acto administrativo de cierre.
ALERTA: No presenta alertas
IGPR SDO TRIMESTRE: 19,5

ANTES DE REPROGRAMAR:

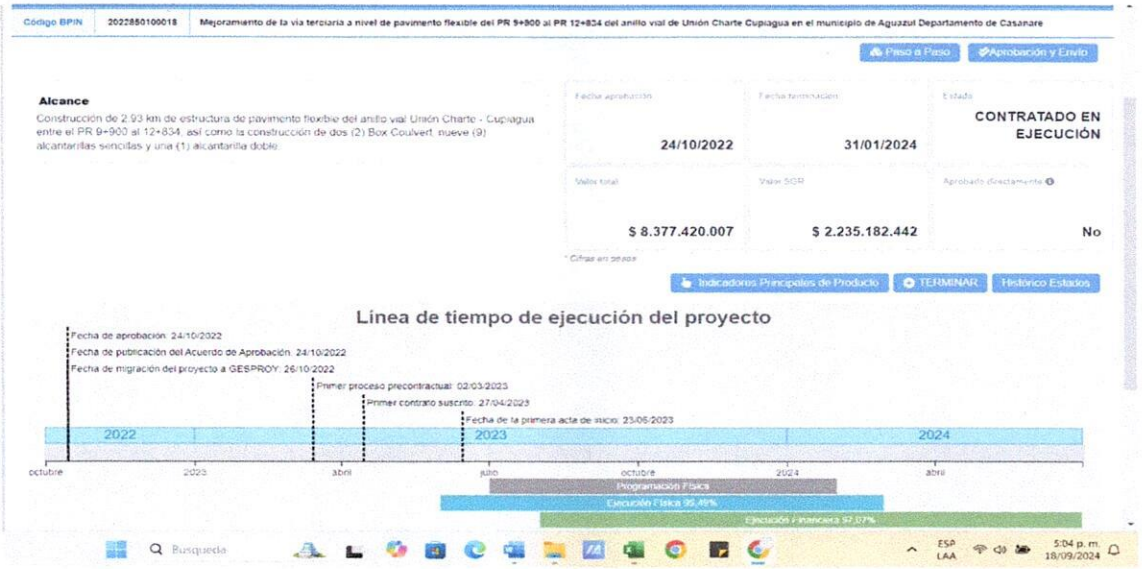

DESPUÉS DE REPROGRAMAR:

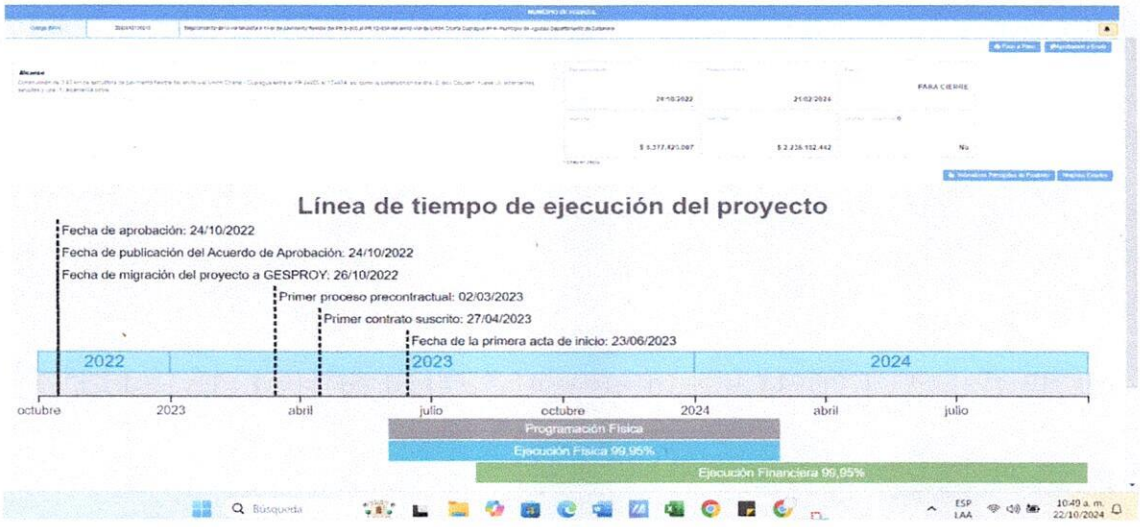

ELABORÓ:


ING. GENNY PAOLA SERRANO DELGADO
CONTRATO 0620 DEL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2024

ACTIVIDAD 3.


1. **Asistencia Profesional en la Gestión de Proyectos de Inversión** Brindar asistencia profesional a los responsables de proyectos de inversión en temas relacionados con conflictos en el manejo de la plataforma, reprogramaciones y/o el cargue de información. Esta asistencia incluye la resolución de alertas y la mejora del índice de gestión de los proyectos.

En Atención al cumplimiento de esta actividad y de acuerdo con la designación dada por el supervisor, se realizó el cargue de acta de liquidación del contrato N. 380-2023 901718256-CONSORCIO INTER UNION CHARTE del proyecto BPIN 2020850100007 **Implementación de sistemas solares fotovoltaicos individuales en zonas rurales no interconectadas del municipio de Aguazul Casanare,** se realizó borrado de ejecución con el fin de ajustar la actividad de interventoría la cual estaba en un porcentaje del 100, y en realidad va acorde al avance de la obra.




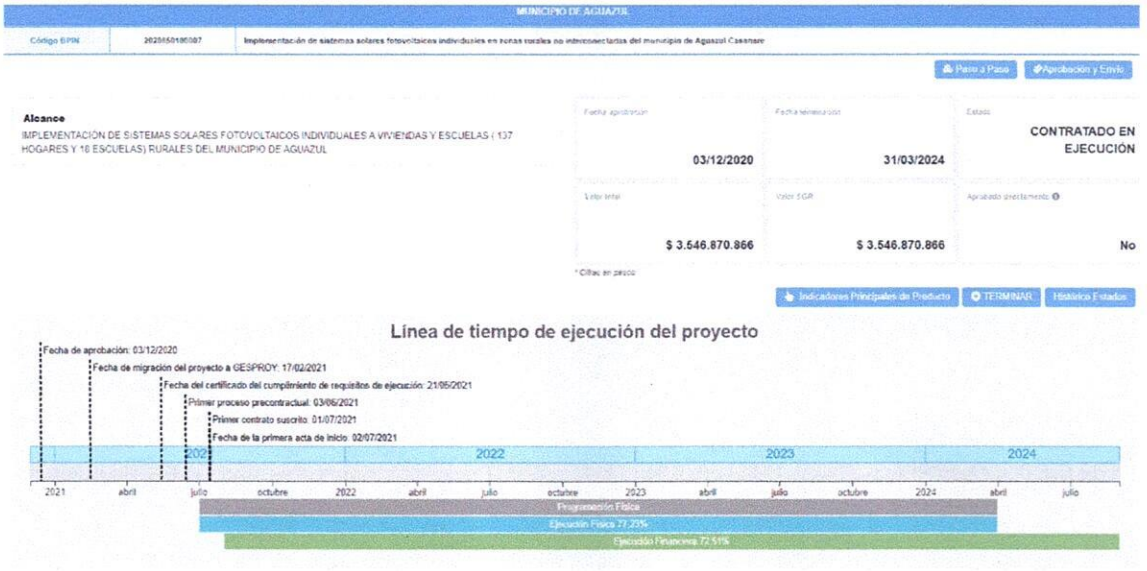

Al proyecto BPIN '2021005850074 denominado Mejoramiento A NIVEL DE PAVIMENTO DEL PR 2+900 AL PR 10+900 DEL ANILLO VIAL CUPIAGUA CUSIANA DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL DEPARTAMENTO DE Casanare, se realizo el registro de la ampliación a la suspensión al contrato de OBRA e INTERVENTORIA, se amplía la suspensión por un término de 25 días a partir del 16 de noviembre al 11 de diciembre de 2024.

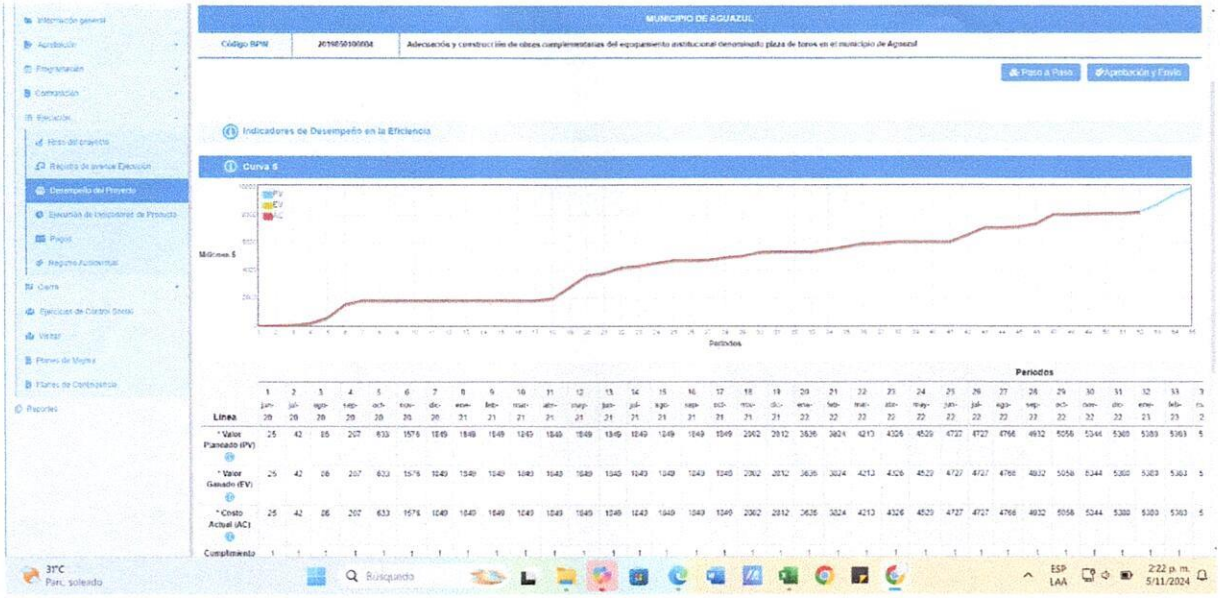

Al proyecto Bpin '2022005850010 denominado Construcción Parador y obras de urbanismo en el parque del arroz del municipio de Aguazul departamento de Casanare, se cargo Reporte de ejecución del mes de octubre de 2024, Ejecución Física 86,15%Ejecución Financiera 87,88%

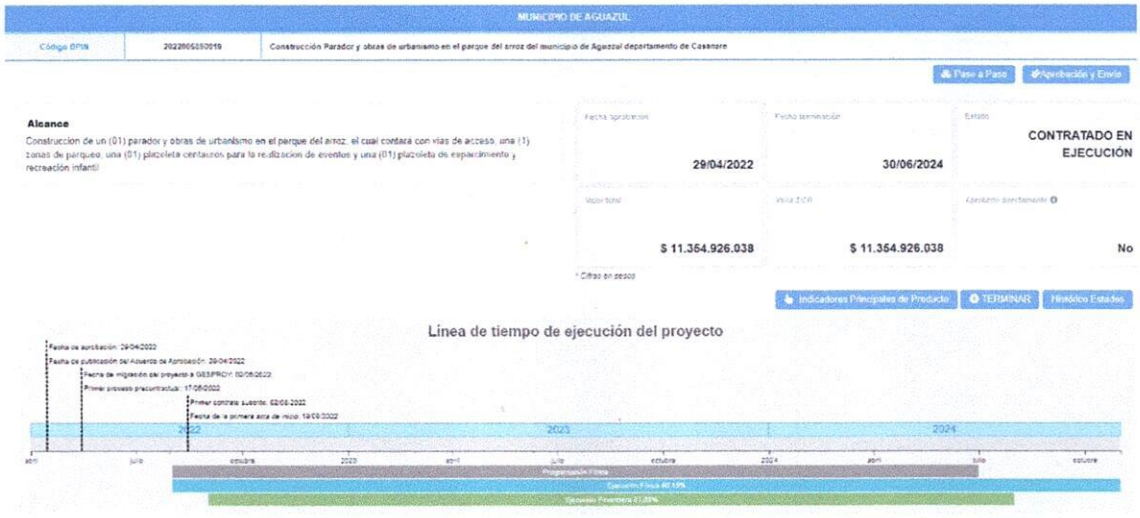


ELABORÓ:

ING. GENNY PAOLA SERRANO DELGADO
CONTRATO 0620 DEL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2024

ACTIVIDAD 4.- CARGUE DE INFORMACIÓN GESPROY

1. **Cargue Oportuno de Información en GESPROY 3.0**
   Realizar el cargue oportuno de la información resultante de la ejecución de los proyectos de inversión en la plataforma GESPROY 3.0, según lo establecido en el procedimiento E-GD-P-14: Seguimiento al Avance Físico de los Proyectos de Inversión Financiados con Recursos del SGR.

D/A: En Atención al cumplimiento de esta actividad y de acuerdo con la designación dada por el supervisor, se realizó el cargue de información del siguiente proyecto BPIN 2019850100004 ADECUACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL EQUIPAMIENTO INSTITUCIONAL DENOMINADO PLAZA DE TOROS EN EL MUNICIPIO DE AGUAZUL, se realizó reprogramación del proyecto, la nueva fecha de terminación es en diciembre, se reportó octubre 2024, se actualizo registro fotográfico etapa de ejecución.
Ejecución Física 83,91%
Ejecución Financiera 87,91%

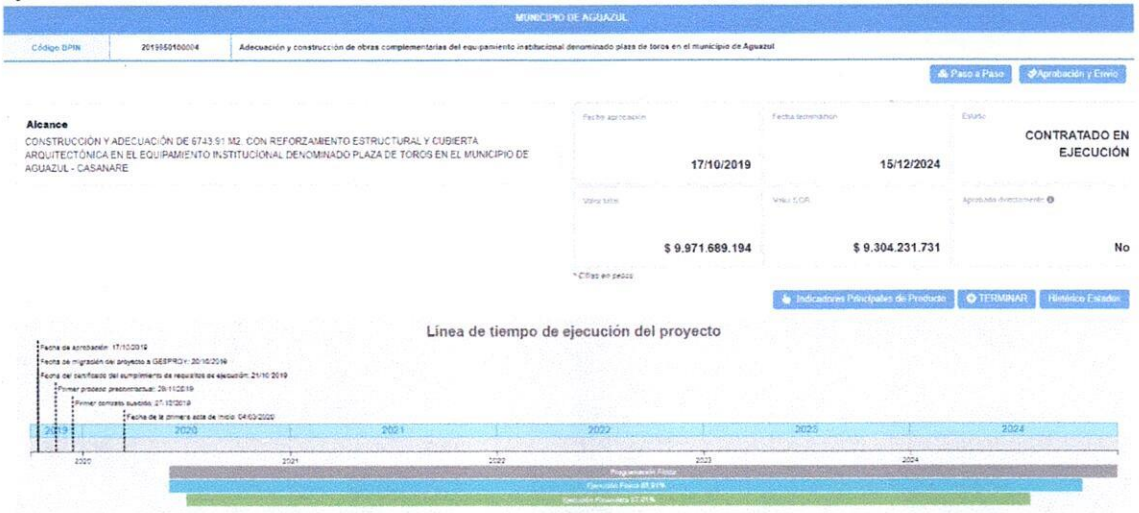

Actas del Contrato

Crear Actas del Contrato

Mostrar 10 registros por página

Buscar

	Acta No:	Tipo Acta	Fecha Acta	Detalle/Observaciones	Valor	Fecha de Acta Legalización	Causal de Suspensión	Otra Causal
	1	Acta de inicio	14/10/2022	Acta No. 1 de Inicio	0.00	22/11/2022		
	3	Acta menores y mayores cantidades de obra	19/12/2022	Acta No. 3 de mayores y menores	0.00	15/12/2022		
	4	Acta de suspensión	30/12/2022	Acta No 4 de Suspensión	0.00	30/12/2022	Condiciones Climáticas o de un tercero (imprevisibles)	
	5	Acta de reinicio	23/01/2023	Acta No. 5 de Reinicio	0.00	14/03/2023		
	8	Acta de suspensión	04/08/2023	Acta No. 8 de Suspersion No 2 del 4/8/2023	0.00	04/08/2023	Ajustes de diseños estudios o condiciones técnicas	
	11	Acta de reinicio	26/12/2023	Acta N°11 de Reinicio N°2	0.00	15/03/2024		
	13	Acta de suspensión	29/12/2023	Acta N°13 de suspensión N°3	0.00	15/03/2024	Condiciones Climáticas o de un tercero (imprevisibles)	
	15	Acta de reinicio	26/02/2024	Acta N°15 de Reinicio	0.00	15/03/2024		
	22	Acta de suspensión	17/10/2024	Acta de suspension N. 4 por un mes nueva fecha de reinicio 16 de noviembre de 2024. nueva fecha de terminacion segun acta 17 de noviembre	0.00	12/11/2024	Ajustes de diseños estudios o condiciones técnicas	
	23	Acta de suspensión	15/11/2024	SE AMPLIA LA SUSPENSIÓN POR UN TERMINO DE 25 DIAS A PARTIR DE L 16 DE NOVIEMBRE AL 11 DE DICIEMBRE DE 2024	0.00	28/11/2024	Ajustes de diseños estudios o condiciones técnicas	

Mostrando página 1 de 1

Anterior 1 Siguiente

Se realizo el registro de acta de liquidacion no requiere al contrato de APOYO A LA SUPERVISION N. 600-2022 7181366-EDGAR ENRIQUE LEGUIZAMON TOVA

Actas del Contrato

Mostrar 10 registros por página

Buscar

	Acta No:	Tipo Acta	Fecha Acta	Detalle/Observaciones	Valor	Fecha de Acta Legalización	Causal de Suspensión	Otra Causal
	1	Acta de inicio	22/09/2022	Acta No. 1 de Inicio	0.00	22/11/2022		
	5	Acta de suspensión	30/12/2022	Acta No. 5 de Suspensión	0.00	09/10/2023	Condiciones Climáticas o de un tercero (imprevisibles)	
	6	Acta de reinicio	23/01/2023	Acta No. 6 de Suspensión	0.00	09/10/2023		
	15	Acta de suspensión	04/08/2023	Acta No. 15 de Suspensión	0.00	04/08/2023	Ajustes de diseños estudios o condiciones técnicas	
	16	Acta de suspensión	03/11/2023	Acta N°16 ampliación de la suspensión	0.00	21/03/2024	Ajustes de diseños estudios o condiciones técnicas	
	17	Acta de suspensión	01/12/2023	Acta N°17 ampliación 2 a la suspensión 2	0.00	01/12/2023	Ajustes de diseños estudios o condiciones técnicas	
	18	Acta de reinicio	26/02/2024	Acta N°18 Reinicio	0.00	26/03/2024		
	29	Acta de Terminación	22/08/2024	acta de terminacion	0.00	12/11/2024		
	29	Acta de liquidación no requiere	22/08/2024		70.036.736,00	28/11/2024		

Registro de pólizas contrato de interventoría n. 566-2022 900426155-PROYECTISTAS ASOCIADOS SAS

Documento aprobación

Documento	N. Amparo	Fecha
Oficio	ANEXO 22-23-24	30/10/2024

Cubrimientos de la Modificación del Amparo

Crear Cubrimientos de la Modificación del Amparo

			Vigencia				
	Tipo Cubrimiento	Valor	porcentaje	Fecha inicial	Fecha Final	Observación
1	Calidad	268.589.643,90	30,00	18/10/2024	18/10/2029	POLIZA CON ANEXO 22-23-24. CON FRORROGA 04 DEL 01 DE OCTUBRE DE 2024
2	Cumplimiento	268.589.643,90	30,00	21/09/2022	18/10/2025	POLIZA CON ANEXO 22-23-24. CON FRORROGA 04 DEL 01 DE OCTUBRE DE 2024
3	Salarios y prestaciones	89.529.881,30	10,00	21/09/2022	18/10/2027	POLIZA CON ANEXO 22-23-24. CON FRORROGA 04 DEL 01 DE OCTUBRE DE 2024

Documento aprobación

Documento	N. Amparo	Fecha

ELABORÓ:

ING. GENNY PAOLA SERRANO DELGADO
CONTRATO 0620 DEL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2024

ACTIVIDAD 5.

Las demás designadas por el supervisor que sean inherentes al objeto contractual


D/A: En Atención al cumplimiento de esta actividad y de acuerdo con la designación dada por el supervisor, se cargaron al aplicativo gesproy las siguientes resoluciones que dan cierre a los proyectos BPIN que a continuación se mencionan;

BPIN	NOMBRE PROYECTO
2020850100008	Construcción de placa polideportiva cubierta y obras complementarias para el parque del barrio Sevilla en el municipio de Aguazul Casanare . RESOLUCION DE CIERRE 421 DEL 25 DE NOVIEMBRE DE 2024
2021850100009	Construcción del cerramiento y urbanismo para el instituto educativo Colegio Camilo Torres Restrepo sede primaria Antonio Nariño en el area urbana del municipio de Aguazul departamento de Casanare. RESOLUCION DE CIERRE 420 DEL 25 DE NOVIEMBRE DE 2024
2022850100018	Mejoramiento de la vía terciaria a nivel de pavimento flexible del PR 9+900 al PR 12+834 del anillo vial de Unión Charte Cupiagua en el municipio de Aguazul Departamento de Casanare. RESOLUCION DE CIERRE 425 DEL 25 DE NOVIEMBRE DE 2024

Se realizo asistencia virtual junto al enlace del DNP dra DIANA QUIROGA, con el fin de revisar los casos de duplicidad de contratos de los proyectos

BPIN. '2019850100002 CONSTRUCCIÓN DE VÍA, PUENTE VEHICULAR SOBRE EL CAÑO AGUAZULERO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, PARA EL ACCESO AL PARQUE DEL ARROZ DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL, CASANARE. presenta duplicidad en el contrato de obra n. 20190699 y n. 699-2019 (se envio caso a mesa de ayuda del dnp, indicando que se realizo la modificación de los rp asociados al contrato 699-2019 y se pasaron al 20190699) a la fecha no se ha evidenciado la solución.

BPIN '2019850100004 ADECUACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL EQUIPAMIENTO INSTITUCIONAL DENOMINADO PLAZA DE TOROS EN EL MUNICIPIO DE AGUAZUL. presenta duplicidad del contrato N.º 220-2020 y N.º 20200220 (apoyo a la supervisión). Se modificaron los RP del contrato N.º 220-2020 y se trasladaron al contrato N.º 20200220. Sin embargo, no se evidencia la solución. Ticket 263847Adecuación y construcción de obras complementarias del equipamiento institucional denominado plaza de toros en el municipio de Aguazul

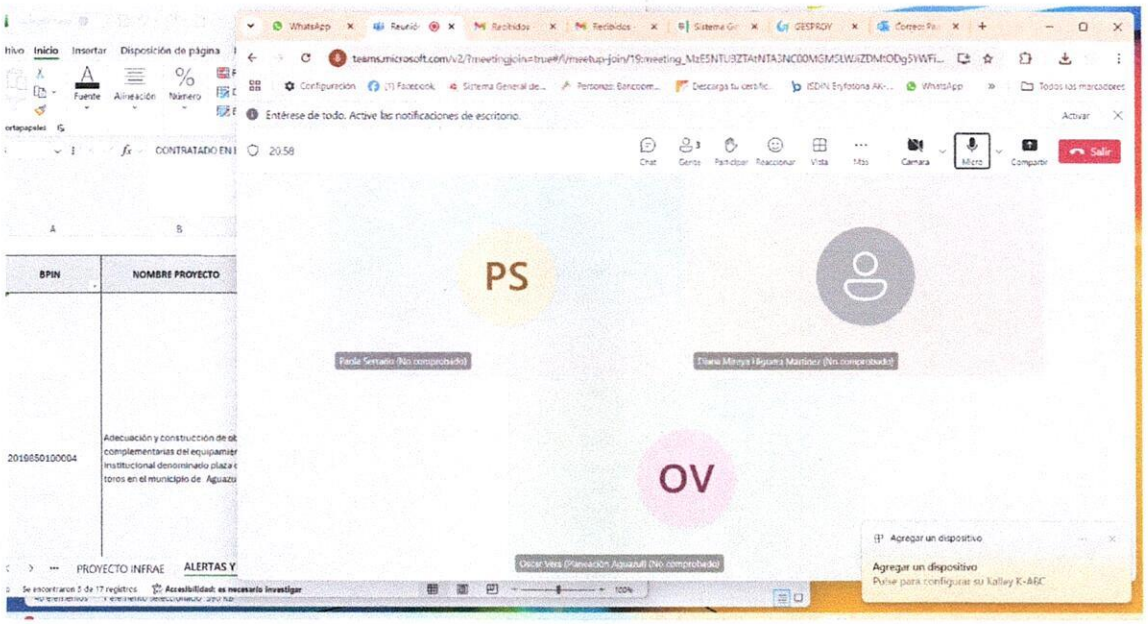

ELABORÓ:

ING. GENNY PAOLA SERRANO DELGADO
CONTRATO 0620 DEL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2024

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

BBVA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	47442426
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:			GENNY PAOLA SERRANO DELGADO
CIUDAD/MUNICIPIO:	YOPAL	DEPARTAMENTO:	CASANARE
DIRECCIÓN:	CL 31B 43 21	TELÉFONO:	3212900
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades de desarrollo de sistemas informático
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	7945649563			TIPO DE PLANILLA:	I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES noviembre	AÑO	2024	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES noviembre AÑO 2024
DÍAS DE MORA:	0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2024/11/12			NÚMERO AUTORIZACIÓN:	104047815

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
25-14	25-14 COLPENSIONES	1	$ 326.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 326.400	$ 0	$ 326.400
SUBTOTALES:										**$ 326.400**	**$ 0**	**$ 326.400**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 255.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 255.000	$ 0	$ 0	$ 255.000
SUBTOTALES:													**$ 255.000**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 255.000**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 10.700	$ 10.700	$ 0	$ 0	$ 10.700
SUBTOTALES:									**$ 10.700**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 10.700**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES																				SEGURIDAD SOCIAL																				PARAFISCALES						
																														PENSIÓN								SALUD						ARP					CCF		SENA	ICBF	ESAP	MINEDU
N°	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	RESIDENTE TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
1	CC 47442426	SERRANO DELGADO GENNY PAOLA	INDEPENDIENTE CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS		$ 1.300.000				NO									01-30								25-14 COLPENSIONES	30	$ 2.040.000	$ 326.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 326.400	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 2.040.000	$ 255.000	$ 0	$ 255.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 2.040.000	$ 47442426	$ 10.700	$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL	$ 592.100
