Tema o Asunto:	Comité de seguimiento ambiental y SST				**Reunión Número:**	43
Fecha:	20-Junio-2024	**Hora:**	2:00 p.m.	**Lugar:**	Virtual	
Nombre y cargo de quien organiza la reunión:	Loly Vanegas B. - Profesional SSTMA de Interventoría					
Archivada en:	Carpeta SSTMA					

1. ORDEN DEL DÍA

1. Cumplimiento de compromisos acta anterior.
2. Documentación contractual de obra.
3. Presentación de informes semanales.
4. Presentación de informes mensuales de obra.
5. Presentación de informes mensuales de Interventoría.
6. Relación de % de aprovechamiento a la fecha.
7. Relación de GCR a la fecha.
8. Varios.

2. DESARROLLO

2.1 Seguimiento a compromisos adquiridos en reuniones anteriores

Acciones acordadas	Responsable	Fecha Comprometida	Estado (Sin iniciar, en ejecución, Finalizada)
Informe final áreas ambiental y SST	Contratista	18-jun-24	NO cumplido
Informe final áreas ambiental y SST	Interventoría	24-jun-24	Pendiente
Informe mensual Ambiental # 10	Contratista	14-jun-24	Cumplido
Informe mensual SST # 10	Contratista	14-jun-24	Cumplido

2.2 Desarrollo de la reunión

1. Compromisos del acta anterior: Se hace lectura de los compromisos y su cumplimiento, en cuanto a la no entrega de los compromisos, estos se relacionan en el numeral 3 de la presente acta.

2. Documentación contractual del Contratista: No hay pendientes a la fecha respecto al personal del proyecto.

3. Informes semanales: Se han remitido a la fecha los requeridos. La CVP indica que los informes semanales están aprobados por parte de la CVP hasta el # 44.

4. Informes mensuales del Contratista:

   *Informe mensual Ambiental y SST N. 1 y 2: Aprobados por la Interventoría y aceptados por la entidad. Remitidos a la entidad en físico.

   *Informe mensual Ambiental y SST N. 3 V2: Aprobados por la Interventoría y aceptados por la entidad. Remitidos a la entidad en físico.

   *Informe mensual Ambiental y SST N. 4 V2: Aprobados por la Interventoría y aceptados por la entidad. Remitidos a la entidad en físico.

   *Informe mensual Ambiental y SST N. 5: Aprobados por la Interventoría y aceptados por la entidad. Remitidos a la entidad en físico.

   *Informe mensual Ambiental y SST N. 6: Aprobados por la Interventoría y aceptados por la entidad. Remitidos a la entidad en físico.

   *Informe mensual Ambiental y SST N. 7: Aprobados por la Interventoría y aceptados por la entidad. Remitidos a la entidad en físico.

   *Informe mensual Ambiental y SST N. 8: Aprobados por la Interventoría y aceptados por la entidad. Remitidos a la entidad en físico.

   *Informe mensual Ambiental y SST N. 9: Componente Ambiental: Aprobado por la Interventoría y aceptado por la entidad. Remitido a la entidad en físico.

   En cuanto al informe SST se tiene que el Contratista realizo las aclaraciones requeridas frente a los pagos y paz y salvos de especialistas Oscar Zabaleta y Jose Javier Niño; la CVP realizó observaciones por lo que se están atendiendo por parte del Contratista.

   *Informe mensual Ambiental y SST N. 10: Se remitieron por parte del Contratista el pasado 14 de Junio; por lo que se considera que el Informe Ambiental cumple con lo requerido y se dio aprobación del mismo, la CVP remitió observaciones.

   Respecto al informe mensual SST N. 10, se tiene que se dio atención a la gran mayoría de las observaciones sin embargo se evidencia la falta del paz y salvo de Stephany Soler por lo que no se encuentra aprobado.

   *Respecto al informe N. 11 tanto ambiental como SST: Aún no se han remitido por parte del Contratista, por lo que por ahora no es posible el envío a la entidad.

*Informe final del Contrato de obra: Esta pendiente la entrega del mismo. Se presume que la entrega del mismo sería para el próximo 3 de Julio de 2024 en cumplimiento del anexo SSTMA.

5. Informe mensual de Interventoría: El estado corresponde a:

   *Informe mensual Ambiental y SST N. 1 y 2: Aprobados por la CVP, remitidos a la entidad en físico.

   *Informe mensual Ambiental y SST N. 3: Aprobados por la CVP, remitidos a la entidad en físico.

   *Informe mensual Ambiental y SST N. 4: Aprobados por la CVP, remitidos a la entidad en físico.

   *Informe mensual Ambiental y SST N. 5: Aprobados por la CVP, remitidos a la entidad en físico.

   *Informe mensual Ambiental y SST N. 6: Aprobados por la CVP, remitidos a la entidad en físico.

   *Informe mensual Ambiental y SST N. 7: Aprobados por la CVP, remitidos a la entidad en físico.

   *Informe mensual Ambiental y SST N. 8: Aprobados por la CVP, remitidos a la entidad en físico.

   *Informe mensual Ambiental y SST N. 9: Aprobados por la CVP, remitidos a la entidad en físico.

   *Informe mensual Ambiental y SST N. 10: Se remitió por parte de la CVP observaciones a los mismos, y dado a que el Informe Ambiental cumple con lo requerido, se remitió en físico a la entidad se cuenta con el visto bueno; respecto al informe SST esta pendiente de la revisión de la Versión 2 del mismo por parte de la CVP, en caso que no se cuente con el faltante del Contratista, se procederá a la radicación ante la CVP.

   *Informe mensual Ambiental y SST N. 11: Dado que aún no se cuenta con el informe del Contratista no es posible cumplir con la entrega de los mismos para el próximo 3 de Julio de 2024, sin embargo si se tiene la información se remitirán lo antes posible.

   *Informe final Ambiental y SST de Interventoría: Esta pendiente por entrega.

6. Relación de % de aprovechamiento de RCD a la fecha: Se realizó el respectivo cargue por parte de la CVP de la información del informe trimestral # 1 del año 2024, no se presentaron novedades.


https://drive.google.com/drive/folders/1Xi2W9WxiNLyZELpqmQQoMynDC5OMgHT1?usp=drive_link

Con respecto a la entrega del Informe Trimestral #2 del año 2024 y final de RCD, el Contratista deberá hacer entrega el próximo 3 de Julio de 2024.

7. Relación de GCR a la fecha: Una vez revisado el informe para el 2 semestre del año 2023, se remitió a la CVP debidamente aprobado por lo que se remite la información a la SDA mediante radicado 2024ER60352 del 15 de marzo de 2024, adicionalmente se remite oficio con radicado 202415000043061 solicitando el estado de implementación de GCR. Por parte de la Interventoría se remitió el oficio GMC-130-181-2024 del 18 de abril de 2024 a la CVP solicitud formal interinstitucional con la SDA respecto a estado de informe de GCR.

8. Varios

   - El Contrato de obra finalizó el pasado 13 de Junio de 2024.
   - Seguimiento PMT: En el presente periodo se recibieron observaciones por parte de la SDM mediante oficio 202431206265091 recibido el 18 de Junio de 2024, las cuales están siendo atendidas por el Contratista.

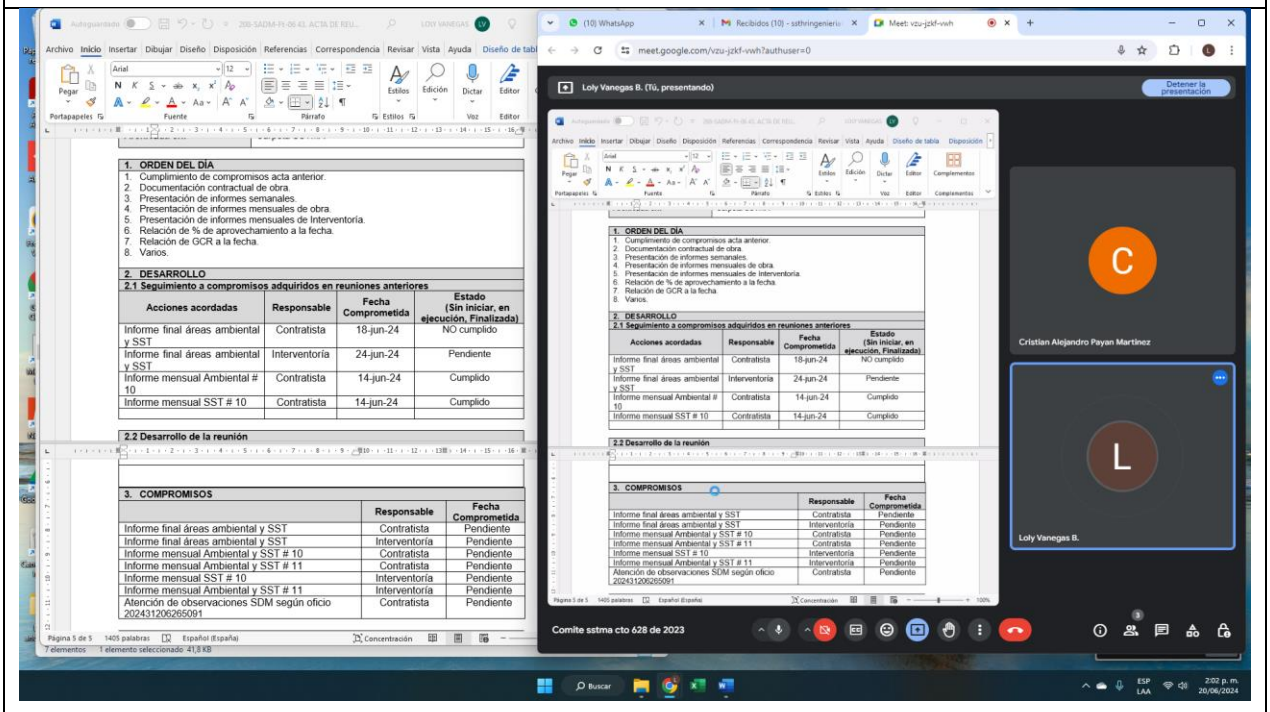

3. COMPROMISOS

	Responsable	Fecha Comprometida
Informe final áreas ambiental y SST	Contratista	Pendiente
Informe final áreas ambiental y SST	Interventoría	Pendiente
Informe mensual Ambiental y SST # 10	Contratista	27-06-24
Informe mensual Ambiental y SST # 11	Contratista	27-06-24
Informe mensual SST # 10	Interventoría	27-06-24
Informe mensual Ambiental y SST # 11	Interventoría	03-06-24
Atención de observaciones SDM según oficio 202431206265091	Contratista	27-06-24

Observaciones:
N/A

4. REGISTRO DE ASISTENTES

Nombre	Dependencia	Firma
Loly Vanegas ssthringenieria@gmail.com Tel: 3112130769	Interventoría	
Cristian Alejandro Payan Martínez cpayanm@cajadeviviendapopular.gov.co Tel: 3186907594	Supervisor SSTMA CVP	
